LUGAR:	Virtual				
CONVOCANTE:	PRAN CONSTRUCCIONES SAS				
FECHA:	2026/06/19	**HORA INICIO:**	4:00 PM	**HORA FIN:**	4:50 PM

OBJETIVO

CONTRATO REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FOREMSES. CONTRATO 152-SG -2025 SEDE PALMIRA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
RICARDO POVEDA	19317845	3214472561	DIRECTOR INTERVENTORIA	PRAN CONSTRUCCIONES	pran.medicinalegal.cali@gmail.com	SI	Asistencia Virtual
JOSE ESTEBAN QUINTERO G.	93118997	3108501245	RESIDENTE INTERVENTORIA	PRAN CONSTRUCCIONES	pranmedicinalegalpalmira5@gmail.com	SI	
LEIDY JHOANA SALAZAR CAPOTE	1.144.195.664	3168025895	PROFESIONAL SST	ASIRCON	salazarjhoana628@gmail.com		Asistencia Virtual
ANTONIO SALCEDO	1.140.896.506	3043770208	DIRECTOR DE OBRA	ASIRCON	antoniojsm11@gmail.com	SI	Asistencia Virtual
FELIPE YEPES	94.331.561	3007821569	RESIDENTE DE OBRA	ASIRCON	ing.felipeyepes@hotmail.com	SI	
JOEL DIMITRI QUINTERO		3246846524	PROFESIONAL SST	PRAN CONSTRUCCIONES	Dimitri7526@hotmail.com		Asistencia Virtual

AUSENTES

Entidad / Unidad Organizacional	Nombres y Apellidos	Cargo


AGENDA

1. Presentación de los asistentes
2. Verificación de compromisos
3. % de obra ejecutada vs % de obra programada
4. Actividades ejecutadas en el periodo
5. Informe SST
6. Varios.

TEMAS TRATADOS

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

1. **Presentación de los Asistentes. OK.**

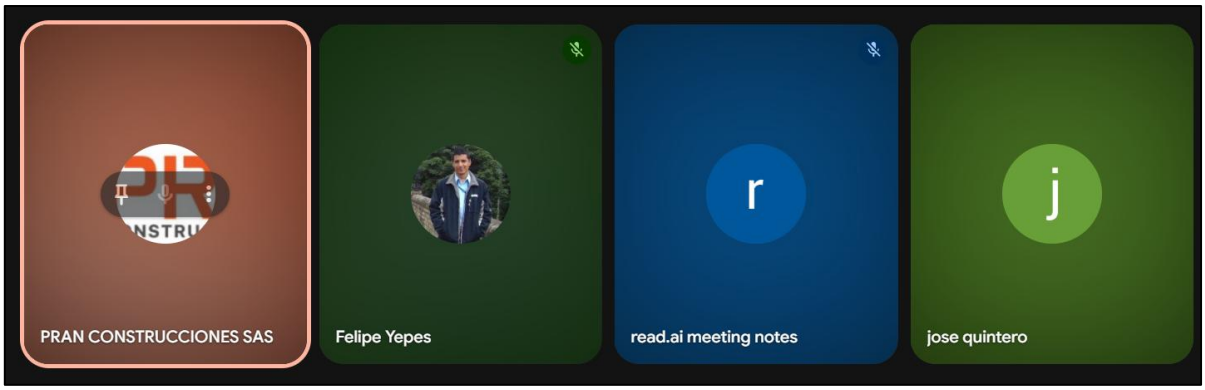

2. **Verificación de Compromisos.**

- Presentar la Programación y el balance de cantidades de obra al igual que las actividades no previstas para revisión y aprobación. – **Rta. ASIRCON informa que esta realizando ajustes al Balance debido a la visita hecha por parte del ing. Eléctrico y técnicos de la parte de ventilación, el Balance se presenta el próximo lunes 22 de junio de 2026, La interventoría y el supervisor de Interventoría Ing. Wilson Torres informan que el plazo para la entrega del Balance es hasta el martes 23 de junio de 2026.**
  El 18 de junio de 2026 ASIRCON hace entrega de la Programación ajustada con la directriz que se inician actividades en la morgue área de necropsias hasta después del 21 de junio de 2026.

- Iniciar las adecuaciones de cerramiento provisional y las instalaciones hidrosanitarias en el área de acceso a sala de patología. – **Rta. Ya se están realizando actividades en este sector, se ha presentado una suspensión provisional de actividades debido a organización por parte de medicina legal, de ubicación de algunos cuerpos los cuales estaban muy cerca al area de labores del personal de Asircon.**

- Iniciar la entrega a la interventoría de actividades ejecutadas y terminadas por parte de ASIRCON con las memorias correspondientes. **Rta. ASIRCON ya está realizando la entrega a la Interventoría, las actividades debidamente terminadas soportadas con memorias de medición.**

3. **% de obra ejecutada vs % de obra programada**

- De acuerdo a la aprobación de la **prórroga N°2** la cual está por 60 días contados a partir del 15 de mayo hasta el 14 de julio de 2026, el 18 de junio de 2026 ASIRCON presenta el cronograma Versión 7 ajustado con la directriz que se inician actividades en la morgue área de necropsias hasta después del 21 de junio de 2026, se realiza corte de avance de obra con la programación Versión 7, donde se visualiza qué, el **Porcentaje ejecutado es del (13.01%)** y lo **programado (33.0%),** identificando un atraso del 19.99 % se hace énfasis en el marcado atraso que presenta la obra, se recomienda que se debe realizar un plan de contingencia para mitigar el atraso.
- A continuación, se presenta cuadro resumen del control semanal de avance de obra.

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

CONTROL SEMANAL DE AVANCE DE OBRA.

SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO	RENDIMIENDO
PRORROGA N°2 DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JULIO DE 2026					
0	16/05/2026	9,87%	9,87%	0,00%	0,00%
1	22/05/2026	19,88%	9,87%	-10,01%	0,00%
2	29/05/2026	24,00%	12,72%	-11,28%	2,85%
3	5/06/2026	26,00%	12,80%	-13,20%	0,08%
4	12/06/2026	28,00%	12,95%	-15,05%	0,15%
5	19/06/2026	33,00%	13,01%	-19,99%	0,06%
RENDIMIENTO PROMEDIO SEMANAL					**0,52%**

La Interventoría informa que han trascurrido 5 SEMANAS de la PRORROGA N° 2 el rendimiento promedio semanal es del 0,52**% hasta el 19 de junio de 2026**, El contratista para cumplir con la nueva fecha de terminación al 14 de julio de 2026 faltando el 87% por ejecutar y 4 semanas, debe rendir un 22% semanal, el rendimiento promedio es del 0,52% semanal muy bajo para lograr la terminación al 14 de julio de 2026.

- **Se aclara que por valor de obra ejecutada a la fecha por $140.000.000 el % de avance por valor ejecutado es de (140.000.000/ 534.123.813) = 26%**

4. Actividades ejecutadas en el periodo

- Durante esta semana se trabaja en Pintura y Mantenimiento muros, cielo raso, funcionalidad de baños area de sala de espera y oficinas administración y patología, armada y fundida de piso y anden de acceso al area de contenedores, armada de acero para los dados de soporte de contenedores.

5. Informe SST.

- El profesional SST de la Interventoría nuevamente solicita al contratista entregar copia del pago de planillas de seguridad del personal administrativo de ASIRCON ya que se vencieron el 02 de junio de 2026.
- La profesional SST de ASIRCON presenta informe referente a la gestión SST en el desarrollo de las actividades, se realiza inspección de herramientas, validación de materiales, entrega de EPP al personal operativo, diligenciamiento de formatos, se realiza inducción al personal nuevo, solicitud de ingreso de personal operativo, supervisión de trabajo seguro en alturas, gestionar permisos para autorización de horario extendido para ejecutar actividades.

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA (aaaa-mm-dd)
Presentar el balance de cantidades de obra al igual que las actividades no previstas para revisión y aprobación.	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	2026-06-22
Terminar las adecuaciones de las instalaciones hidrosanitarias en el área de acceso a sala de patología, pintura y mantenimiento áreas de oficinas y consultorios area administrativa.	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	2026-06-27
Terminar la armada y fundida de los dados de soporte de contenedores	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	2026-06-27
Continuar la entrega a la interventoría de actividades ejecutadas y terminadas por parte de ASIRCON con las memorias correspondientes.	ASIRCON CONTRATISTAS y PRAN CONSTRUCIONES	2026-06-27

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 19 -06-2026 VIRTUAL

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2026



CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PROVISIONAL AREA DE ACCESO VEHICULAR EN PATOLOGIA



CONTINUA MANTENIMIENTO AREAS DE OFICINAS SECTOR ADMINISTRATIVO Y RECEPCION AREA DE MORGUE

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

CIELO RASO PVC
PSIAQUIATRIA PISO 2



LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION POR PARTE DE MEDICINA LEGAL



ARMADA Y FUNDIDA DE ANDEN Y PISO AREA DE BAÑOS SECTOR CONTENEDORES.

FIRMA DEL CONVOCANTE

Vo. Bo. **RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL**

Elaboró: JOSE ESTEBAN QUINTERO G
RESIDENTE INTERVENTORIA – PALMIRA VALLE

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
