Cada actividad fue verificada mediante inspecciones en sitio, control de ubicación, medición de cantidades ejecutadas y registros fotográficos, asegurando la conformidad de los trabajos frente a las especificaciones del contrato. La documentación generada incluye bitácoras, formatos de control y evidencia gráfica, garantizando trazabilidad técnica en cada frente de trabajo.

Durante el periodo no se reportaron no conformidades ni observaciones técnicas relevantes. Las labores fueron ejecutadas de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos, asegurando la correcta disposición de los residuos generados y el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad operacional exigidas.

Se continuará con el monitoreo y control permanente en las actividades futuras, reforzando los mecanismos de supervisión técnica y documental para asegurar el cumplimiento integral de los estándares de calidad establecidos en el proyecto.

Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra.
Para el periodo de este informe no se tienen informes de revisión de materiales.

Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.
Para el periodo de este informe no se tienen ensayos de revisión de materiales.

Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.
Para el periodo de este informe no se tienen recomendaciones y/o observaciones de ensayos de revisión de materiales.

13.8 Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se ha llevado a cabo una gestión exhaustiva de la correspondencia tanto interna como externa. Se ha implementado un sistema de registro numerado para todos los comunicados, lo que garantiza la trazabilidad y control de la información. Este registro permite una ubicación rápida y un seguimiento efectivo de cada comunicación, asegurando una gestión eficiente de los documentos relacionados.

Correspondencia Enviada Interventoría

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
1/06/2026	CIMGAIN–745–2026 - Respuesta Oficio 427-2026 Informe SST MAYO 2026- TARQUI	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
1/06/2026	CIMGAIN–747–2026 - Respuesta comunicación 428-26 Entrega informe semanal No 068 Corresponde a la semana entre 23 y 29 de mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
1/06/2026	CIMGAIN–749–2026 - Respuesta oficio 430-26 Oficina Entrega Informe Ambiental No 15- Mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
1/06/2026	INFORME SEMANANL No. 68 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
1/06/2026	CIMGAIN–751–2026 - Respuesta oficio 431-26 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 15	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
1/06/2026	AJ CIMGAIN–738–2026 - Atención a MEMORANDO Radicado 2026362020018673 Id 2560600	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
1/06/2026	CIMGAIN–752–2026 - Respuesta oficio 429-26 Oficina Entrega del informe técnico mensual N°16 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	IDICOL
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	JML ENSAYOS E INGENIERIA
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	IMPASUEL
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	PSI INGENIERIA
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	GEOLAB
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
2/06/2026	CIMGAIN 756–2026 - Solicitud NOTAM cierre de calle de rodaje BRAVO por precaución	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/06/2026	APUs TALA ARBOLES	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/06/2026	CIMGAIN–748–2026 - Respuesta oficio 426-26 Oficina Remisión Informe de Calidad No 15–Mayo 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
3/06/2026	CIMGAIN–734–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 12 Abril Imga	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/06/2026	CIMGAIN–753–2026 - Respuesta oficio 432-26 Oficina Entrega Informe Ambiental No 15- V1 - Mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
3/06/2026	CIMGAIN–754–2026 - Respuesta oficio 433-26 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 15 - V2	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
3/06/2026	CIMGAIN–755–2026 - Respuesta oficio 434-26 Oficina Entrega del informe técnico mensual N°16 V2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
3/06/2026	REAJUSTE CONTRATO LADO AIRE E INTERVENTORIA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/06/2026	CIMGAIN–757–2026 - Respuesta oficio 437-26 Oficina Remisión Informe de Calidad No15 V2 – Mayo 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
4/06/2026	CIMGAIN–742–2026 - AJUSTE PLAN DE CARGAS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
5/06/2026	ACTA 12 CTO 24001241 H4 MTTO SKLT	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/06/2026	CIMGAIN 756–2026 - Solicitud NOTAM cierre de calle de rodaje BRAVO por precaución	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/06/2026	CIMGAIN–760–2026 - Solicitud reunión virtual Consorcio IMGA INGENIEROS, acta mes de abri	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/06/2026	INFORME SEMANAL No. 69 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/06/2026	CIMGAIN–761–2026 - Respuesta comunicación 439-26 Entrega informe semanal No 069 Corresponde a la semana entre 30 de mayo y 05 de junio de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
11/06/2026	CIERRE POR PRECAUCION CALLE DE RODAJE BRAVO	Correo electrónico	ADMINISTRACION AEROPUERTO
12/06/2026	Oficio 435-26 Oficina CERTIFICADOS DE CALIDAD MATERIALES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
12/06/2026	425_26 Oficina - PLANOS DE SEÑALIZACION AEROPUERTO LETICA	Correo electrónico	ESPECIALISTA

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
12/06/2026	oficio 328_26 Oficina SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE PLATAFORMA, PISTA Y CALLES DE RODAJE MANTENIMIENTO DE LUCES DE PLATAFORMA	Correo electrónico	ESPECIALISTA
12/06/2026	ACTA No. 12 CONSORCIO TARQUI LADO AIRE	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
12/06/2026	CIMGAIN–758–2026 - Radicación acta de obra No 13 Lado Aire, periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026 Consorcio Tarqu	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
14/06/2026	RV: CIERRE POR PRECAUCION CALLE DE RODAJE BRAVO	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
16/06/2026	CIMGAIN–766–2026 -Radicación informes mensuales mes de mayo 2026 IMGA Ingenieros	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
16/06/2026	REUNIÓN - ACTA MES ABRIL CTO24001242 H4	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/06/2026	INFORME No. 70 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/06/2026	CIMGAIN–768–2026 - Respuesta comunicación 442-26 Entrega informe semanal No 070 Corresponde a la semana entre 6 y 12 de junio de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
17/06/2026	CIMGAIN-765-2026 VIG FUTURAS IMGA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/06/2026	CIMGAIN764-2026 Solicitud de aprobación reajuste precios vigencias futuras CONSORCIO TARQUI	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
18/06/2026	Oficio 443-26 Solicitud de suspensión temporal y autorización de cesión de participación consorcial – Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024 (Consorcio Tarqui	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
18/06/2026	Oficio 444-26 OficinaProcedimiento constructivo de las actividades de obra no previstas y enmarcadas en el modificatorio No.1. Plan de control de calidad y ensayos de laboratorio. L	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
19/06/2026	CIMGAIN–769–2026 - Solicitud de aprobación laboratorio para ensayos de laboratorio para las muestras del CONSORCIO IMGA INGENIEROS (2	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
20/06/2026	APUs TALA ARBOLES	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
22/06/2026	CIMGAIN–673–2026 -Solicitud NOTAM bache pista	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
22/06/2026	INFORME SEMANAL LADO AIRE No. 71	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
22/06/2026	CIMGAIN–775–2026 - Concepto de aprobación – Plano General de Pista y Señalización	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
22/06/2026	CIMGAIN–774–2026 - Respuesta comunicación 446-26 Entrega informe semanal No 071 Corresponde a la semana entre 13 y 19 de junio de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
23/06/2026	CIMGAIN–776–2026 -Alerta no inicio de actividades de mantenimiento de losas de plataforma frente a calle de rodaje BRAVO	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
23/06/2026	CIMGAIN–734–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 12 Abril Imga	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
23/06/2026	CIMGAIN–772–2026 - Concepto suspensión LA Tarqui	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
23/06/2026	Oficio 444-26 OficinaProcedimiento constructivo de las actividades de obra no previstas y enmarcadas en el modificatorio No.1. Plan de control de calidad y ensayos de laboratorio. L	Correo electrónico	ESPECIALISTA
24/06/2026	CIMGAIN–779–2026 - Respuesta comunicación 447-26 del 23 de junio - Alerta por riesgo de retraso – Falta de aprobación de ajuste a planos de señalización horizontal	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
24/06/2026	CIMGAIN–780–2026 -Respuesta comunicación 444-26 Oficina Procedimiento constructivo de las actividades de obra no previstas y enmarcadas en el modificatorio No.1. Plan de control de calidad y ensayos de laboratorio fechado del 18 de junio de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
24/06/2026	CIMGAIN–769–2026 - Solicitud de aprobación laboratorio para ensayos de laboratorio para las muestras del CONSORCIO IMGA INGENIEROS (2)	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
25/06/2026	CIMGAIN–782–2026 - Nacionalización de materiales que se utilizaran en la ejecución de mantenimiento de losas de plataforma	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
25/06/2026	CIMGAIN–781–2026 - Solicitud de act señalización y demarcación	Correo electrónico	3B PROYECTOS SAS
25/06/2026	CIMGAIN–783–2026 - Suscripción de comunicaciones	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/06/2026	CIMGAIN–778–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 13 del periodo 01-05- 2026 al 31-05-2026	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/06/2026	CIMGAIN–758–2026 - Radicación acta de obra No 13 Lado Aire, periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026 Consorcio Tarqui	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
30/06/2026	INFORME SEMANAL No. 72 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA			
FECHA	**ASUNTO**	**CODIGO/TIPO**	**DIRIGIDO A**
30/06/2026	CIMGAIN-788-2026 Informe semanal 72 LA	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI

Tabla 40 Correspondencia enviada interventoría.

Comunicaciones Recibidas.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
1/06/2026	Correo electrónico	Oficio 433-26- Oficina - RESPUESTA CIMGAING 751_26 INFORME DE GERENCIA No.15 V2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/06/2026	Correo electrónico	CIMGAIN–734–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 12 Abril Imga	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/06/2026	Correo electrónico	Oficio 434-26 Oficina RESPUESTA CIMGAIN752_26 INFORME MENSUAL No.16 MAYO v2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/06/2026	Correo electrónico	OFICIO 436_26 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE NOTAM -CIERRE POR PREVENTIVO- CALLE DE RODAJE BRAVO POR ACTIVIDADES DE OBRA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/06/2026	Correo electrónico	Oficio 437-26-RESPUESTA CIMGAING 748-26INFORME DE CALIDAD No.15	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/06/2026	Correo electrónico	OFICIO 438 ACTA PARCIAL DE OBRA N.13 MAYO 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/06/2026	Correo electrónico	Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo Imga Ingenieros – Mayo 2026	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/06/2026	Correo electrónico	Informe SST Mayo 2026 - CONTRATISTAS TARQUI -OBRAS LA SABANA	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
6/06/2026	Correo electrónico	Oficio 439-26 Oficina INFORME SEMANAL N.69	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/06/2026	Correo electrónico	oficio 441-26 OFICINA PROGRAMACIÓN DE OBRA N.3	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/06/2026	Correo electrónico	Documentacion Faltante	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
12/06/2026	Correo electrónico	Fw: REAJSUTE PRECIOS - CTO MTTO LETICIA - 24001241 H4 Y 24001242 H3	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
12/06/2026	Correo electrónico	12062026LTC- SOLICITUD NOTAM - TWY B CLSD DUE WIP. MEN AND EQPT IN VICINITY	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
14/06/2026	Correo electrónico	Oficio 442 Oficina INFORME SEMANAL N.70	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
16/06/2026	Correo electrónico	Socialización NOTAM - TWY B CLSD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
16/06/2026	Correo electrónico	Solicitud de claridad sobre responsabilidad en la instalación de luces de la calle de rodaje Alpha	ADMINISTRACION AEROPUERTO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/06/2026	Correo electrónico	Oficio 444-26 OficinaProcedimiento constructivo de las actividades de obra no previstas y enmarcadas en el modificatorio No.1. Plan de control de calidad y ensayos de laboratorio. L	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/06/2026	Correo electrónico	445_26 Oficina - Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/06/2026	Correo electrónico	Oficio 443-26 Solicitud de suspensión temporal y autorización de cesión de participación consorcial – Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024 (Consorcio Tarqui)	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
19/06/2026	Correo electrónico	Comité seguimiento CTO MTTO - SKLT	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
20/06/2026	Correo electrónico	Oficio 446 Oficina INFORME SEMANAL N.71	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
23/06/2026	Correo electrónico	Oficio 447-26 Alerta por riesgo de retraso en ruta crítica – Falta de aprobación de ajuste a planos de señalización horizontal (Ítems 3.1 y 3.3). Contrato No. 24001241	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/06/2026	Correo electrónico	Revisión Procedimiento Constructivo Modificatorio N°1 (Oficio No. 444-26)	ESPECIALISTA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA	**CODIGO/TIPO**	**ASUNTO**	**ENVIADO POR**	**DIRIGIDO A**
26/06/2026	Correo electrónico	Oficio 448-26 Documentación proveedor de concreto - GRUPO AQ S.A.S	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/06/2026	Correo electrónico	Convocatoria sesión CDM – Socialización de solicitud de NOTAM - CIERRE DE PISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/06/2026	Correo electrónico	OficIo 450-26 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 14 ACTA DE OBRA. No.13 Mayo de 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/06/2026	Correo electrónico	OficIo 450-26 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 14 ACTA DE OBRA. No.13 Mayo de 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
29/06/2026	Correo electrónico	Oficio 451 Oficina INFORME SEMANAL N.72	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
30/06/2026	Correo electrónico	Oficio 452-26 Solicitud Formal De Suspensión Temporal Del Contrato De Obra No. 24001241 H4 De 2024	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Tabla 41 Correspondencia recibida interventoría

13.9 Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026, se llevó a cabo un seguimiento continuo a los principales riesgos identificados desde el inicio del proyecto, con especial atención a aquellos que podrían comprometer el cumplimiento del cronograma, el avance físico y la seguridad operacional del aeropuerto. A continuación, se destacan los factores de riesgo más relevantes durante el periodo:

- **Altos niveles de precipitación** registrados durante el mes, que dificultaron el acceso a zonas críticas, especialmente aquellas con presencia de humedales o acumulación de agua, reduciendo el rendimiento en campo.
- **Crecimiento acelerado de vegetación**, producto de las condiciones climáticas del entorno amazónico, lo cual generó la necesidad de intervenir nuevamente sectores ya tratados con actividades de rocería.
- **Demoras en la consolidación del diagnóstico estructural de pavimentos**, que limita la programación precisa de actividades correctivas en plataforma, pista y calles de rodaje.

Respuestas Implementadas

Frente a estos riesgos, y de acuerdo con el plan de gestión establecido para el contrato, se implementaron las siguientes acciones:

- **Frente a las condiciones climáticas adversas:** Se adaptó la operación mediante la redistribución de actividades hacia zonas con mejor acceso, priorizando tareas como la limpieza de canales, encoles y la recolección del material vegetal acumulado tras la rocería. Esta estrategia permitió mantener la continuidad operativa y mitigar los impactos del clima.
- **Respecto al crecimiento excesivo de vegetación:** Se ejecutó nuevamente la actividad de rocería en sectores previamente intervenidos que presentaban alturas de 20 a 30 cm, como las zonas VOR, RESA, terminal de carga, y sectores entre los hitos K0+000 y K0+700, asegurando así el cumplimiento de los estándares de seguridad en áreas operacionales.
- **En relación con la infraestructura existente:** Se continúan los trabajos de inspección y cuantificación de daños en pavimentos, cerramientos y estructuras hidráulicas, que permitirán en junio reprogramar el contrato en función de un diagnóstico actualizado. Asimismo, se están evaluando sectores como la plataforma antigua, donde se identificaron 171 losas con deterioro severo que representan riesgo operativo por generación de FOD (Foreign Object Debris), cuya atención prioritaria será determinada en función de los recursos disponibles y la validación técnica.

Estas medidas buscan mantener bajo control los riesgos identificados y garantizar que el desarrollo del contrato continúe en condiciones técnicas, financieras y operativas adecuadas, en favor de la seguridad y funcionalidad del aeropuerto.

13.10 Informe de monitoreo de riesgos.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026, se realizó el seguimiento al Plan de Gestión de Riesgos aprobado, centrando la atención en aquellos eventos de mayor impacto y probabilidad identificados desde la etapa inicial del proyecto. El monitoreo incluyó la verificación del estado actual de los riesgos activos, la validación de la efectividad de las respuestas implementadas y la identificación de nuevas condiciones derivadas del desarrollo de las actividades en campo.

Este proceso fue liderado por la gerencia del contratista en coordinación con la interventoría técnica, quedando consignado en los formatos establecidos y en la bitácora de obra.

Durante el mes de junio se hizo seguimiento a los siguientes riesgos:

- Evaluación Interventoría

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

INDICADORES SEGUIMIENTO TARQUI JUNIO DEL 2026				
DESCRIPCION INDICADOR	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**VARIACIÓN (%)**	**OBSERVACIONES**
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	505	94,6%	A CORTE 30 DE JUNIO DE 2026
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	2.274.869.977	2.284.493.365	100,4%	A CORTE 26 DE JUNIO DE 2026 (INFORME SEMANAL No, 72)
(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo del contrato) *100	16	16	100%	Se cumple con lo ofrecido
(Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / Actividades con especificación técnica) *100	10	5	50%	Rocería, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	10	6	60%	Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
Fecha definida para puesta en servicio – Fecha real de puesta en servicio	-	-		N/ EN ESTE PERIODO
(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas+ No. Actividades no previstas) *100	8	8	100%	Se identificaron 6 NPs - Capa de base de sub suelo - Demoliciones - Concreto MR45 acelerado plataforma - Concreto MR45 acelerado bache de pista - Armado y colocacion de acero - Corte de latizales
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	10	6	60%	Objetivos cumplidos Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-		NO SE PRESENTAN GARANTIAS, HASTA EL MOMENTO
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	2	2	100%	Objetivos cumplidos Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	2	2	100%	Actividad corresponden a Rocería, limpieza canales, limpieza descoles, limpieza cerramiento y fumigacion

El seguimiento de riesgos durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026 permitió identificar con precisión los factores que afectaron el desarrollo contractual.

También se aclara que unas reprogramaciones debidas a variaciones generadas por la suscripción de un contrato adicional en plazo y/o valor que no aplica para nuestro caso, por suspensiones del contrato que no

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

aplica y/o modificaciones de cantidades de obra producto de circunstancias especiales que lo justifique el cual es nuestro caso, la inclusión de cantidades de ítems no previstos que aplica para nuestro caso o cuando las partes así lo acuerden.

- Evaluación Consorcio TARQUI

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Indicador***	***Indicador (fórmula)***	***Fuente Información***
Tiempo de ejecución programado	Se refiere al tiempo de ejecución planeado para la ejecución de determinadas actividades, de acuerdo con el cronograma del proyecto.	Mes	93.63%	26 días/31 días * 100	Programa de trabajo y cronograma del proyecto.
Tiempo ejecución real	Hace referencia al tiempo real empleado para la ejecución de determinadas actividades.	Mes	93.63%		Informes de ejecución y acta de terminación
Costo Programado	Esta variable hace referencia al valor proyectado de costos en determinado tiempo.	Moneda (Pesos)	$ 366.308.3818,00 / $41.744.410,00 =	(Costo programado en el período/Costo real período) * 100	Programa de trabajo y Plan de inversión del proyecto.
Costo real	Esta variable hace referencia al valor real de costos en determinado tiempo.	Moneda (Pesos)	$ 2.284.493.365,00	59.77%	Facturas
Cantidad de personal contratado	Se refiere al personal mínimo exigido en el contrato.	Número de personas	15	(Cantidad de personal contratado/ Cantidad de personal mínimo del contrato) * 100	Contrato y estudios previos

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
Cantidad de personal utilizado	Hace referencia al personal contratado durante la ejecución y la totalidad del contrato	Número de personas	15	De acuerdo con las actividades que se realizaron no se requería tener todo el personal mínimo exigido, que está planeado que ingrese más adelante. Por lo tanto, se considera el indicador cumplido al 100%.	Informes de ejecución y acta de terminación
Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad	Hace referencia a la aceptación y aprobación de la interventoría de las actividades ejecutadas siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.	Numero de Reportes (no hay reportes)	100%	100% (aprobada)	Informes de ejecución y acta de terminación
Actividades con especificación técnicas	Hace referencia a las actividades del proyecto que cumplen el alcance planeado.	Número de Actividades	Actividades programadas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4 Actividades ejecutadas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.3, 4.4, 6.2	7	Contrato y Especificaciones técnicas
Cantidad de obra civil recibida por actividad	Se refiere al cumplimiento de las cantidades de obra civil recibida por la interventoría en las actividades a desarrollar	M2	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA		Informes de ejecución y Propuesta económica y presupuesto ajustado en cantidades del diagnóstico ejecutado en la
		Ha	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	10.80	
		Ha	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA	10.80	

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
			ORGANICO – FUMIGACION)		primera fase del contrato
		UN	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	6.00	
		ML	LIMPIEZA Y REACONDICIONA MIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	0.00	
		ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE LA INSTALACIÓN Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA, JUNTO CON TODOS SUS ACCESORIOS)	0.00	
		ML	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	1.489	
		UN	CORTE DE INDIVIDUOS LATIZALES DI`METRO 5 Y 10 CM, CON		

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
			ALTURA HASTA DE 5 A 10 M		
No. actividades no previstas	Se refiere al número de actividades aprobadas como no previstos durante el desarrollo del contrato.	0	0	0	Acta de recibo final del contrato de obra
No. actividades contratadas	Se refiere al número de actividades contratadas en la oferta económica del contrato.	20	0	(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas + No. De actividades no previstas) * 100	Acta de recibo final del contrato de obra
Objetivos específicos cumplidos	Se refiere al número de objetivos específicos cumplidos luego del desarrollo del proyecto.	59.77%	Se medirá al final de la obra, por lo tanto, no hay valor para el indicador en este mes.	Informe final de interventoría	
Objetivos específicos planteados	Se refiere al número de objetivos planteados en el estudio del sector del proyecto.	59.52%		Informe final de interventoría	
Requerimientos atendidos por garantía	Se refiere al número de requerimientos por garantía atendidos satisfactoriamente por el contratista de mantenimiento.	0	A la fecha no se han recibido requerimientos por garantía	Informes mensuales de interventoría e informes administración del aeropuerto.	
No. reportes solicitados por garantía	Se refiere al número de requerimientos por garantía solicitados por el interventor.	0		Informes mensuales de interventoría e informes administración	

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Indicador*	*Indicador (fórmula)*	*Fuente Información*
				del aeropuerto.	
Riesgos mitigados o tratados.	Se refiere al número de riesgos que fueron tratados y mitigados satisfactoriamente.	0	Actualmente ningún riesgo se encuentra activo	Informes mensuales de interventoría.	
Riesgos previstos	Se refiere al número de riesgos previsibles que se planificaron.	0		Informes mensuales de interventoría.	

- **Resultados del Monitoreo**

El seguimiento de riesgos durante el periodo del presente informe permitió identificar con precisión los factores

Pese a la presencia de lluvias y alta humedad, el contrato logró un avance mensual del 59.77%, que supero el valor programado del 59.52%, lo que refleja la efectividad de la redistribución de tareas hacia frentes de trabajo accesibles y la optimización de actividades como la limpieza de canales, encoles y zonas verdes, a pesar de no poder ejecutar dicha actividad por interferencia de otro contratista en zonas de seguridad.

El monitoreo también evidenció la necesidad de reforzar las acciones frente al crecimiento continuo de la vegetación, especialmente en sectores críticos operativos, así como la importancia de avanzar en el diagnóstico definitivo de los pavimentos, cuyo deterioro representa un riesgo operacional por generación de FOD (Foreign Object Debris).

En general, el seguimiento a los riesgos se consolida como herramienta fundamental para la toma de decisiones preventivas, permitiendo ajustar la planeación y priorizar intervenciones en función de las condiciones reales del proyecto.

13.11 Informe de gestión de la participación de los interesados.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026, se continuó con la gestión activa de los interesados clave del proyecto, enfocando los esfuerzos en mantener una comunicación efectiva, alinear expectativas y fortalecer la coordinación interinstitucional. Entre los principales grupos de interés identificados se encuentran:

- Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Dirección de Infraestructura (entidad contratante)
- Administración del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo
- Consorcio TARQUI (contratista de obra)
- Consorcio IMGA Ingenieros (interventoría)
- Consorcio Zeta, ACINCO

- Acciones de Participación y Comunicación

Durante el periodo se realizaron varias acciones orientadas a la **gestión efectiva de los interesados**, entre las que se destacan:

- Reuniones de seguimiento técnico-operativo semanales entre la interventoría y el contratista, con el fin de revisar avances, dificultades, decisiones operativas y próximos hitos.
- Coordinación permanente con la administración del aeropuerto para planificar las actividades de obra en armonía con la operación aérea, garantizando seguridad y continuidad en el servicio.

Estas acciones han permitido mantener informados a los actores clave del proyecto y facilitar la toma de decisiones conjuntas para responder a imprevistos.

- Manejo de Expectativas y Retroalimentación

La participación activa de los interesados ha contribuido a generar una atmósfera de colaboración y transparencia. Se ha promovido la recepción de retroalimentación de la interventoría y la administración aeroportuaria respecto a los tiempos de ejecución, afectación de operaciones y condiciones de seguridad, lo cual ha servido para ajustar las estrategias en campo.

No se registraron conflictos o quejas formales por parte de los interesados durante el mes de junio, lo cual evidencia un manejo adecuado de sus expectativas y una gestión efectiva de las relaciones.

La gestión de los interesados durante el contrato se ha desarrollado de manera proactiva y ordenada, permitiendo mantener una comunicación fluida y una coordinación operativa efectiva. Se continuará fortaleciendo este componente mediante la actualización del plan de comunicaciones, con el fin de asegurar una participación informada y comprometida de todos los actores del proyecto.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

14 ANEXOS.

Anexo 1. Presentaciones comités.

Anexo 2. Actas de comité.

Anexo 3. Libro de obra.

Anexo 4. Ordenes de trabajo.

Anexo 5. Informes semanales

Anexo 6. Informe climatológico

Anexo 7. Informe ambiental del CONSORCIO TARQUI

Elaboró: Ing. Hernan Alexis Villamil Vargas	**Revisó:** Ing. Julio Roberto Chaparro Fonseca	**Aprobó** Ing. Julio Roberto Chaparro Fonseca
Fecha: 21 de julio de 2026	**Fecha: 21 de julio de 2026**	**Fecha: 21 de julio de 2026**
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 
Cargo: Residente lado Aire	**Cargo**: Director de Interventoría	**Cargo:** Director de Interventoría

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

ANEXO 1. PRESENTACIONES COMITÉS.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

AGENDA

Orden del día Comité de seguimiento de obra No 61 del 28 de mayo de 2026:

1. Verificación del Quorum.
2. Datos del contrato.
3. Seguimiento de compromisos del acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Personal de obra e interventoría
6. Indicadores financieros
7. Planes de acción (Generación de Compromisos)

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO MANTENIMIENTO LADO AIRE	
NÚMERO DE CONTRATO	24001241 H4 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI.
OBJETO	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).
VALOR	$3.822.000.000 Incluye AIU.
FECHA DE INICIO	12/02/2025.
MODIFICATORIO No 1	Inclusión ítems no previstos y balance, sin adición de recursos ni plazo
FECHA TERMINACIÓN	31/07/2026.
PLAZO	hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero).
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

MANTENIMIENTO LADO AIRE







LADO AIRE

3. LECTURA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Balizas para calle de rodaje ALFA	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	30 ABR -2026	15 MAY 2026	Soporte técnico del aeropuerto ya instalo las balizas ya solo falta la conexión que también la realizara la parte técnica del aeropuerto , a la fecha de terminación de este periodo el consorcio tarqui no ha realizado la recepción de las balizas
2	CALLE CERRADA BRAVO	CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	05 MAY 2026	Las actividades de arreglo de calle de rodaje ALFA (cerrada) están en espera ya que el material para sello de fisuras no ha llegado a la obra, se ve con preocupación esta tema ya que el contratista no esta cumpliendo los compromisos pactados, el contratista nos informa que no tiene recursos para realizar las compras de los materiales, esto se debe a la demora en el pago de las actas mensuales. Contratista adquiere compromiso del 1 de junio entregar calle de rodaje alfa
3	TALA DE ARBOLES	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	20 ABR 2026	Se efectuó visita por parte de Corpozamazonia, en la cual negó la resolución por urgencia, ante esto nuevamente la Aerocivil efectuó un segundo requerimiento y se esta a la espera del pronunciamiento de Corpoamazonas
4	MESA DE TRABAJO DEMARCACION PISTA	SUPERVISION	15 MAYO 2026	20 MAYO 2026	Se realizo la mesa de trabajo donde se aceptaron los cambios que se pueden realizar y se queda a la espera que el CONTRATISTA realice la entrega formal para poder remitir información a aeronáutica para aprobación final; de igual forma se recibe propuesta de modelación de entrada aviones por calle de rodaje alfa antigua
5	MESA DE TRABAJO DE REAJUSTE	SUPERVISION INTERVENTORIA	21 MAYO 2026	22 MAYO 2026	Sw ewaliza mesa de trabajo y se solicita hacer entrega del reajuste de acuerdo amesa de trabajo, lo cual se realizó el mismo día. Se esta a la espera de concepto
6	CIERRE AEROPUERTO	CONSORCIO TARQUI	21 MAYO 2026	22 MAYO 2026	Se har+a entrega por parte del contratista de concepto de especisliata por no ejecución de actividades de bache en pista
7	ENTREGA PLANOS DE LEVANTAMIENTO DE REDES SECAS	CONSORCIO TARQUI	21 MAYO 2026	PROXIMO COMITE	Se solicita por parte de la Entidad la entrega de los planos de redes secas del aeropuerto entregadas con el plan de mantenimiento al inicio del proyecto

4. TEMAS A TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Mantenimiento de calle de rodaje ALFA	CONSORCIO TARQUI	Se evidencia que el consorcio Tarqui no ha hecho entrega, de acuerdo a compromiso de entrega del 5 mayo de acuerdo a los compromiso adquiridos y se notifica en el presente comité que este no cumplimiento generara atrasos en el cronograma, por cuanto en el mes de junio se tiene el inicio de ejecución de losas en plataforma.
2	Mantenimiento de Bache en pista	CONSORCIO TARQUI	El contratista tenia programado y aprobado el NOTAM para realizar los trabajos de mantenimiento del Bache que se encuentra en la pista, estos trabajos no se realizaron. Se solicita iniciar el tramite inmediato de solicitud de nuevo notam
3	Reajuste de preciso	Consorcios y supervisión	Se entregó a la supervisión la proyección del reajuste, se esta a la espera de la revisión y aprobación
4	Actas de costos de Interventoría y contratista	Supervisión	Se solicita a la supervisión el estado de las actas tanto de la interventoría como del contratista, esto con el fin de tener flujo de caja ya que el contratista esta informando que tiene muy poco flujo de caja para realizar las actividades que tiene programadas
5	Ingeniero Residente	Consorcio Tarqui	Se emite aprobación de Hoja de vida del nuevo residente
6	Señalización	Consorcios y supervisión	Se realizó reunión el día miércoles 20 de mayo, en la reunión se trataron los temas de la demarcación de pista y la plataforma de acuerdo a los planos ya aprobados por la autoridad, se quedaron en los compromisos de entrega de planos de parte de consorcio ZETA de nueva calle de rodaje de acuerdo a la aprobación que se dio en la mesa de trabajo y así consorcio Tarqui hará lo pertinente para su trámite

5. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA INGRESO**
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Diaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	**11**
No Profesionales	**6**
Total Personal	**22**
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %

PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	jhenaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente			
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	Consorciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	Jegg.construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara		

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE INTERVENTORIA

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112123780
11	CADENERA	ZAIRA YIRAINA AHUANARI MURCIA,	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3152803507

6. INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES DE AVANCE

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,68%	49,40%	(%) Ejecutado	1,88%	50,72%
Valor programado ($)	$64.091.719	$1.888.121.277	Valor ejecutado ($)	$71.730.535,84	$1.938.694.427
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	1,32%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 50.573.150,00

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 67

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	0,00	$ -
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	2,89	$ 2.903.863,330000
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	2,89	$ 682.025,550000
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	0,00	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
3,2	PINTURA PARA CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA	m2	$ 64.212,00	0,00	$ -
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 1,00	0,00	$ -
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	2123,54	$ 21.817.249,960000
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	0,00	$ -
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION SUELO CEMENTO	M3	$ 394.493,00	0,00	$ -
NP 2	DEMOLICIONES	M3	$ 359.306,00	0,00	$ -
NP 3	CONCRETO MR45 - FAST TRACK 24 HORAS	M3	$ 4.207.751,00	0,00	$ -
NP 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES	Unidad	$ 60.877,00	761,00	$ 46.327.397,000000
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 71.730.535,84**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 1.866.963.891,49
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 1.938.694.427,00


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INDICADORES DE AVANCE

AVANCE FÍSICO SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Programado Inicial	Ejecutado	Desviacion
24-ene	30-ene	12	51	64,45%	34,14%	-30,31%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,16%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%
Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Re-Programado	Ejecutado Reprogramacion	Desviacion
28-feb	6-mar		56	42,23%	42,03%	-0,20%
7-mar	13-mar		57	42,60%	42,61%	0,01%
14-mar	20-mar		58	42,98%	43,12%	0,14%
21-mar	27-mar		59	43,30%	44,12%	0,82%
28-mar	3-abr	14	60	43,49%	44,75%	1,26%
4-abr	10-abr		61	43,88%	45,28%	1,40%
11-abr	17-abr		62	44,20%	45,49%	1,29%
18-abr	24-abr		63	45,31%	45,75%	0,44%
25-abr	1-may	15	64	46,59%	47,55%	0,96%
2-may	8-may		65	47,13%	47,74%	0,61%
9-may	15-may		66	47,72%	48,85%	1,13%
16-may	22-may		67	49,40%	50,72%	1,32%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
24-ene	30-ene	12	51	2.463.412.460	1.304.830.800	-1.158.581.660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.390	1.458.475.200	-1.009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471.662.320	1.567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1.582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1.599.507.000	-880.405.180
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Re - Programado ($)	Ejecutado ($) - Reprogramacion	Pagado ($)
28-feb	6-mar		56	1.613.911.526	1.606.386.600	-7.524.926
7-mar	13-mar		57	1.628.351.320	1.628.554.200	202.880
14-mar	20-mar		58	1.642.791.114	1.648.046.400	5.255.286
21-mar	27-mar		59	1.654.926.908	1.686.266.400	31.339.492
28-mar	3-abr	14	60	1.662.351.262	1.710.345.000	47.993.738
4-abr	10-abr		61	1.677.037.885	1.730.601.600	53.563.715
11-abr	17-abr		62	1.689.420.507	1.738.627.800	49.207.293
18-abr	24-abr		63	1.731.625.432	1.748.654.801	17.029.369
25-abr	1-may	15	64	1.780.845.796	1.817.361.000	36.515.204
2-may	8-may		65	1.801.285.677	1.824.622.800	23.337.123
9-may	15-may		66	1.824.029.558	1.867.047.000	43.017.442
16-may	22-may		67	1.888.121.277	1.938.518.400	50.397.123

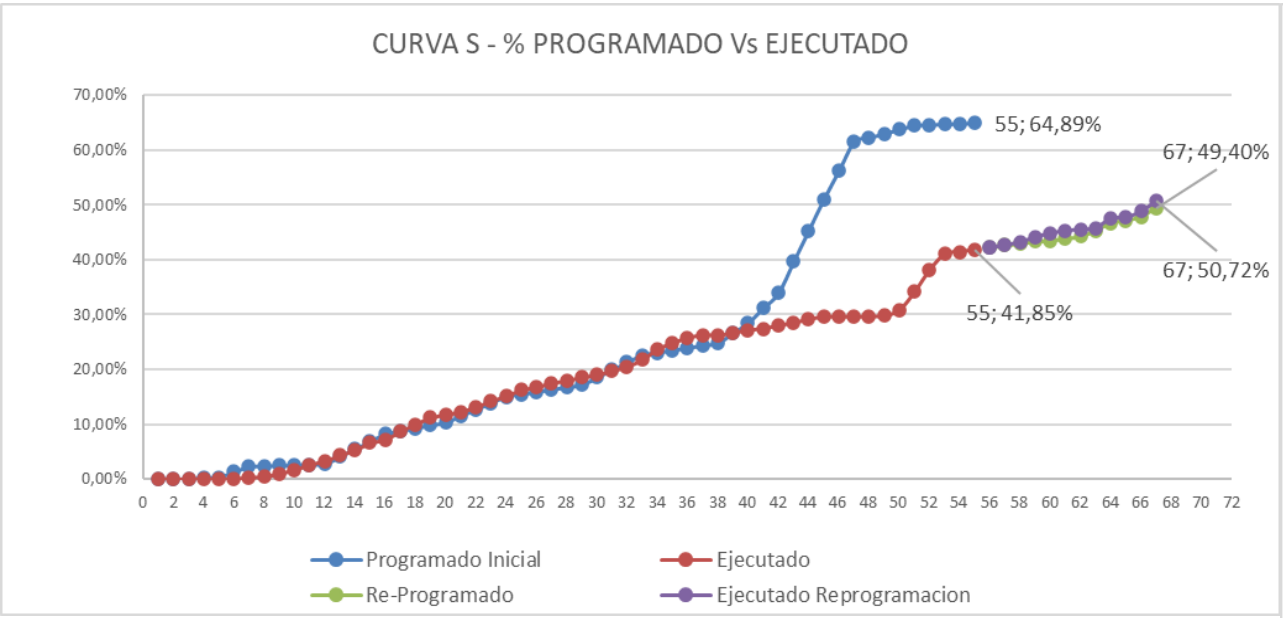

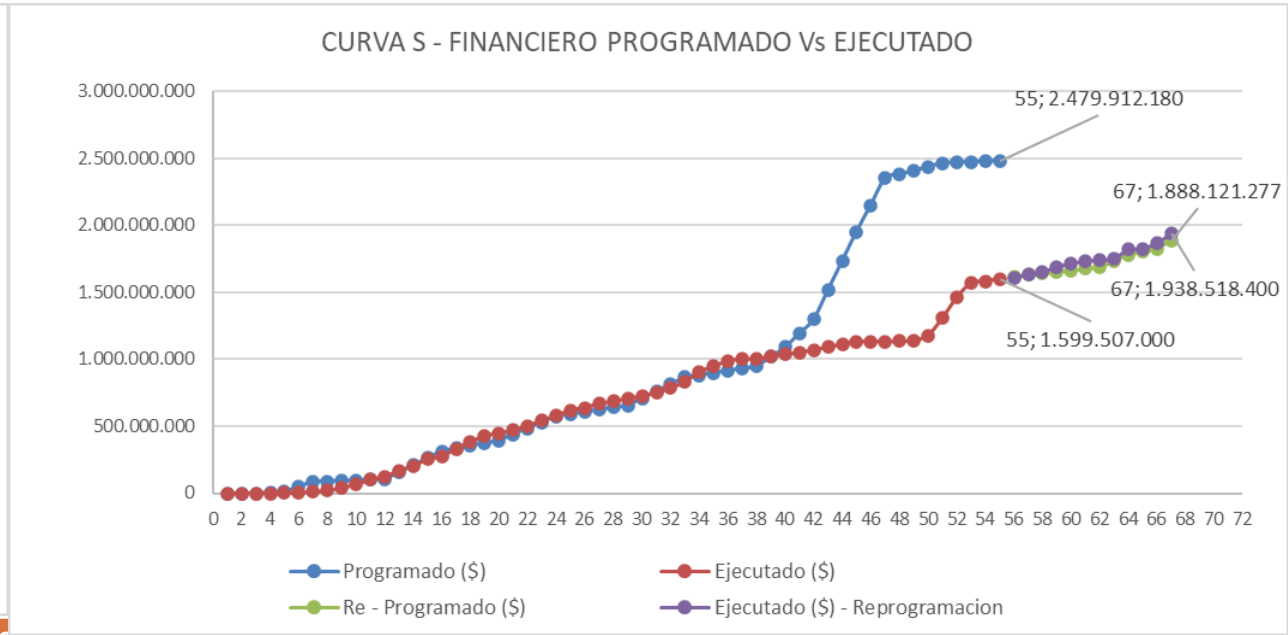

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 67

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 66	Cant. Acumulada	Cant. Contractual	% ejecutado
Localización, Replanteo M2	0,00	43.171,10	50.010,44	86,32%
Rocería Ha	2,89	306,69	324,26	93,35%
Fumigación Ha	2,89	255,53	324,26	78,80%
Limpieza canales Ml	0,00	11.564,61	11.564,61	100,00%
Limpieza encoles y descoles Un	0,00	177,00	200,00	88,50%
Pintura Calles de rodaje y plataforma M2	0,00	130,51	10.114,00	1,29%
Parcheo mezcla fría M3	0,00	0,09	1,00	9,00%
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	92.520,00	207.899,53	44,50%
Descontaminación por caucho	0,00	9.450,00	9,450,00	100,00%
Limpieza cerramiento perimetral Ml	2123,54	52,259,60	56.056,00	93,23%
Instalación de cerramiento Ml	0,00	100,00	100,00	100,00%
Suministro e instalación de suelo cemento	0,00	2,03	84	2,42%
Demoliciones	0,00	12,63	147	8,49%
Suministro e instalación de concreto MR 45 FAST TRACK	0,00	10,95	147	7,45%
Corte de individuos latizales UN	761,00	1742,00	2.028,00	85,90%


ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN



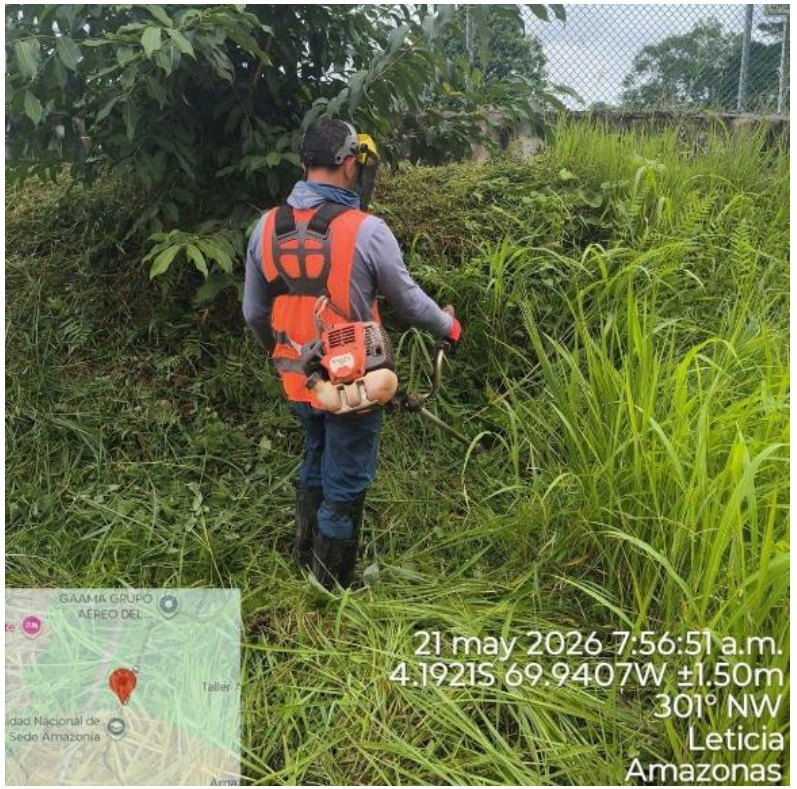

Realización de rocería

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

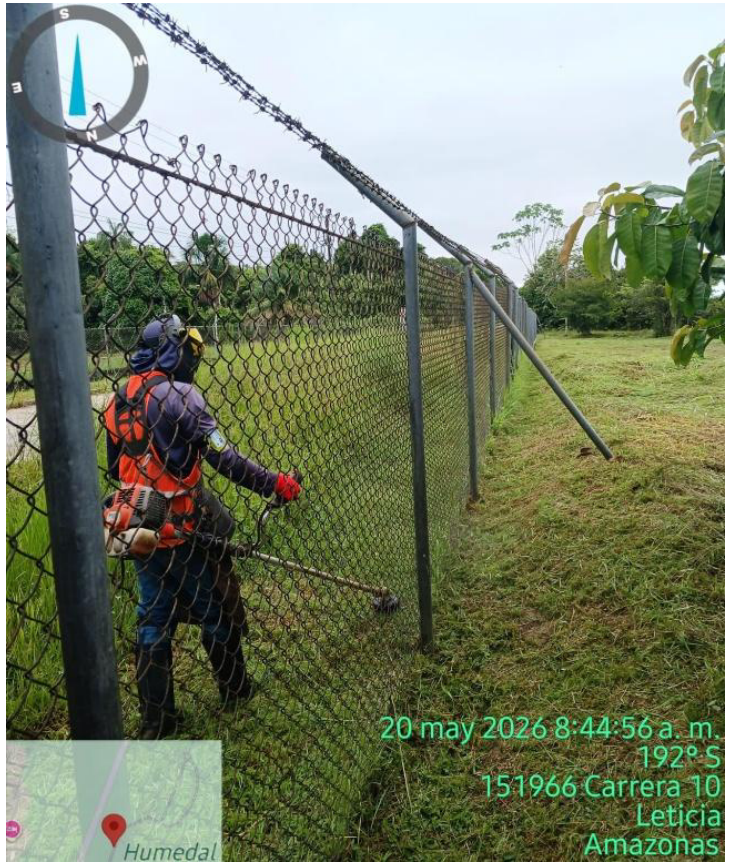



Realización limpieza perimetral de cerramiento

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN







Realización de corte de latizales

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN








Realización de sello de corte realizado al mantenimiento que se iba a realizar en bache de pista

PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO CON AREAS DE TRABAJO

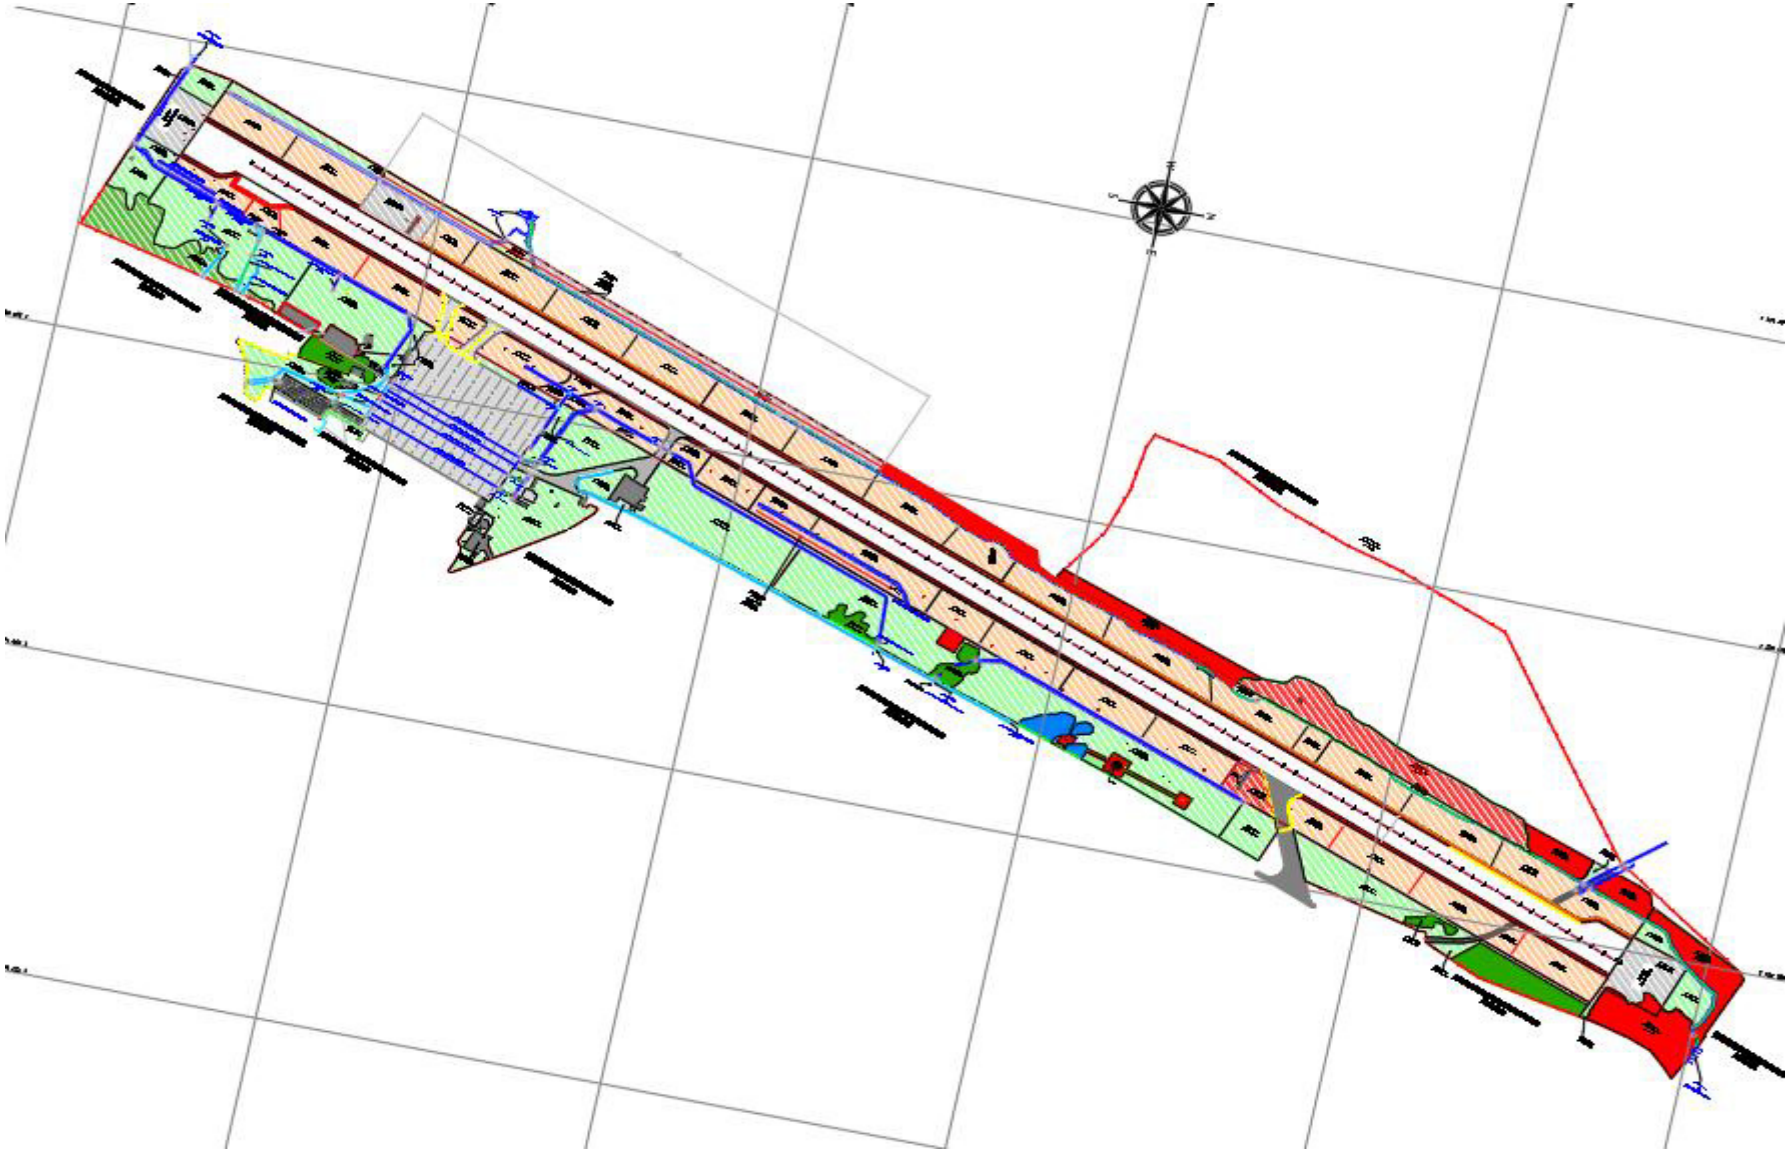

7. Planes de acción y/o Generación de Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1.		
2.		
3.		

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

AGENDA

Orden del día Comité de seguimiento de obra No 62 del 4 de junio de 2026:

1. Verificación del Quorum.
2. Datos del contrato.
3. Seguimiento de compromisos del acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Personal de obra e interventoría
6. Indicadores financieros
7. Planes de acción (Generación de Compromisos)

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO MANTENIMIENTO LADO AIRE	
NÚMERO DE CONTRATO	24001241 H4 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI.
OBJETO	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).
VALOR	$3.822.000.000 Incluye AIU.
FECHA DE INICIO	12/02/2025.
MODIFICATORIO No 1	Inclusión ítems no previstos y balance, sin adición de recursos ni plazo
FECHA TERMINACIÓN	31/07/2026.
PLAZO	hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero).
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

MANTENIMIENTO LADO AIRE





LADO AIRE

3. LECTURA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Balizas para calle de rodaje ALFA	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	30 ABR -2026	15 MAY 2026	Soporte técnico del aeropuerto ya instalo las balizas ya solo falta la conexión que también la realizara la parte técnica del aeropuerto , a la fecha de terminación de este periodo el consorcio tarqui no ha realizado la recepción de las balizas, se debe de realizar prueba de las balizas antes de realizar apertura de la calle de rodaje.
2	CALLE CERRADA BRAVO	CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	05 MAY 2026	Las actividades de arreglo de calle de rodaje ALFA (cerrada) están en espera ya que el material para sello de fisuras no ha llegado a la obra, se ve con preocupación esta tema ya que el contratista no esta cumpliendo los compromisos pactados, el contratista nos informa que no tiene recursos para realizar las compras de los materiales, el Contratista informa que el material de sello ya esta en la trasportadora hacia leticia y que la demora es que llegue y el realiza las actividades de sello de juntas en máximo 4 horas
3	REAJUSTE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	SUPERVISION INTERVENTORIA	29 MAYO 2026	05 JUNIO 2026	Pronunciamiento sobre la entrega de reajuste, para inicio de proceso de modificatorio
4	APROBACIÓN HOJA DE VIDA CADENERO IMGA	SUPERVISION	29 MAYO 2026	01 JUNIO 2026	El lunes 1 de junio hará el pronunciamiento la supervisión sobre hoja de vida, la cual se esta verificando que no se encuentre en otros contratos para no tener inconveniente con la dedicación
5	TALA DE ARBOLES	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	20 ABR 2026	Se continua a la espera del pronunciamiento de Corpoamazonas, la supervisión informará lo antes posible la directriz, respecto a la ejecución de dicha actividad

3. LECTURA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
6	MESA DE TRABAJO DEMARCACION PISTA	SUPERVISION	15 MAYO 2026	20 MAYO 2026	Se realizo recepción de los planos los cuales están siendo revisados para envió a la autoridad para aprobación final
7	MESA DE TRABAJO DE REAJUSTE	SUPERVISION INTERVENTORIA	21 MAYO 2026	22 MAYO 2026	Se hace entrega del reajuste de acuerdo a mesa de trabajo, Se esta a la espera de concepto por parte de la supervisión
8	CIERRE AEROPUERTO	CONSORCIO TARQUI	21 MAYO 2026	22 MAYO 2026	Se esta revisando concepto por parte del contratista por no ejecución de actividades de bache en pista
9	BUSCAR ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN BACHE PISTA POR TEMAS DE NUEVO CIERRE	SUPERVISION INTERVENTORIA CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	05 JUNIO 2026	Consorcio Tarqui a través de su especialista, buscará alternativa de solución de bache en pista, la cual será cotejada por el especialista de Interventoría

4. TEMAS A TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Mantenimiento de calle de rodaje ALFA	CONSORCIO TARQUI	Se evidencia que el consorcio Tarqui no ha hecho entrega de la calle de rodaje como se había comprometido que entregaba el 5 mayo; el no cumplimiento generara atrasos en el cronograma, por cuanto en el mes de junio se tiene el inicio de ejecución de losas en plataforma.
2	Mantenimiento de Bache en pista	CONSORCIO TARQUI	Se esta revisando por parte de la interventoría el informe sobre la no ejecución de los trabajos de bache de pista y se queda pendiente una nueva fecha para solicitud de un nuevo NOTAM, o en su defecto entrega por parte del contratista de una propuesta nueva de intervención
3	Reajuste de preciso	Consorcios y supervisión	Se entregó a la supervisión la proyección del reajuste, se esta a la espera de la revisión y aprobación
4	Actas de costos de Interventoría y contratista	Supervisión	Se solicita a la supervisión el estado de las actas tanto de la interventoría como del contratista, esto con el fin de tener flujo de caja ya que el contratista esta informando que tiene muy poco flujo de caja para realizar las actividades que tiene programadas
5	Señalización	Consorcios y supervisión	Los planos están en revisión por parte de los especialistas de la interventoría, se espera el aval para poder enviar a aprobación por parte de la autoridad

5. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA INGRESO**
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Diaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	**11**
No Profesionales	**6**
Total Personal	**22**
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %

PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	jhenaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	FABIAN PINEDO		
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	Consorciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	Jegg.construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara		

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE INTERVENTORIA

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112123780
11	CADENERA	En aprobación hoja de vida		

6. INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES DE AVANCE


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,53%	49,94%	(%) Ejecutado	7,96%	58,68%
Valor programado ($)	$20.439.881	$1.908.561.158	Valor ejecutado ($)	$304.054.647,20	$2.242.749.075
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	8,74%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 334.187.917,00


BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 68					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	0,00	$ -
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	0,00	$ -
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	0,00	$ -
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	10,00	$ 574.950,000000
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
3,2	PINTURA PARA CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA	m2	$ 64.212,00	0,00	$ -
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 1,00	0,00	$ -
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	609,80	$ 6.265.085,200000
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	7470,00	$ 279.803.790,000000
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION SUELO CEMENTO	M3	$ 394.493,00	0,00	$ -
NP 2	DEMOLICIONES	M3	$ 359.306,00	0,00	$ -
NP 3	CONCRETO MR45 - FAST TRACK 24 HORAS	M3	$ 4.207.751,00	0,00	$ -
NP 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES	Unidad	$ 60.877,00	286,00	$ 17.410.822,000000
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 304.054.647,20**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 1.938.694.427,33
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 2.242.749.075,00

INDICADORES DE AVANCE

AVANCE FÍSICO SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Programado Inicial	Ejecutado	Desviacion
24-ene	30-ene	12	51	64,45%	34,14%	-30,31%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,16%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%
Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Re-Programado	Ejecutado Reprogramacion	Desviacion
28-feb	6-mar		56	42,23%	42,03%	-0,20%
7-mar	13-mar		57	42,60%	42,61%	0,01%
14-mar	20-mar		58	42,98%	43,12%	0,14%
21-mar	27-mar		59	43,30%	44,12%	0,82%
28-mar	3-abr	14	60	43,49%	44,75%	1,26%
4-abr	10-abr		61	43,88%	45,28%	1,40%
11-abr	17-abr		62	44,20%	45,49%	1,29%
18-abr	24-abr		63	45,31%	45,75%	0,44%
25-abr	1-may	15	64	46,59%	47,55%	0,96%
2-may	8-may		65	47,13%	47,74%	0,61%
9-may	15-may		66	47,72%	48,85%	1,13%
16-may	22-may		67	49,40%	50,72%	1,32%
23-may	29-may	16	68	49,94%	58,68%	8,74%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
24-ene	30-ene	12	51	2.463.412.460	1.304.830.800	-1.158.581.660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.390	1.458.475.200	-1.009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471.662.320	1.567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1.582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1.599.507.000	-880.405.180
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Re - Programado ($)	Ejecutado ($) - Reprogramacio	Pagado ($)
28-feb	6-mar		56	1.613.911.526	1.606.386.600	-7.524.926
7-mar	13-mar		57	1.628.351.320	1.628.554.200	202.880
14-mar	20-mar		58	1.642.791.114	1.648.046.400	5.255.286
21-mar	27-mar		59	1.654.926.908	1.686.266.400	31.339.492
28-mar	3-abr	14	60	1.662.351.262	1.710.345.000	47.993.738
4-abr	10-abr		61	1.677.037.885	1.730.601.600	53.563.715
11-abr	17-abr		62	1.689.420.507	1.738.627.800	49.207.293
18-abr	24-abr		63	1.731.625.432	1.748.654.801	17.029.369
25-abr	1-may	15	64	1.780.845.796	1.817.361.000	36.515.204
2-may	8-may		65	1.801.285.677	1.824.622.800	23.337.123
9-may	15-may		66	1.824.029.558	1.867.047.000	43.017.442
16-may	22-may		67	1.888.121.277	1.938.518.400	50.397.123
23-may	29-may	16	68	1.908.561.158	2.242.749.600	334.188.442

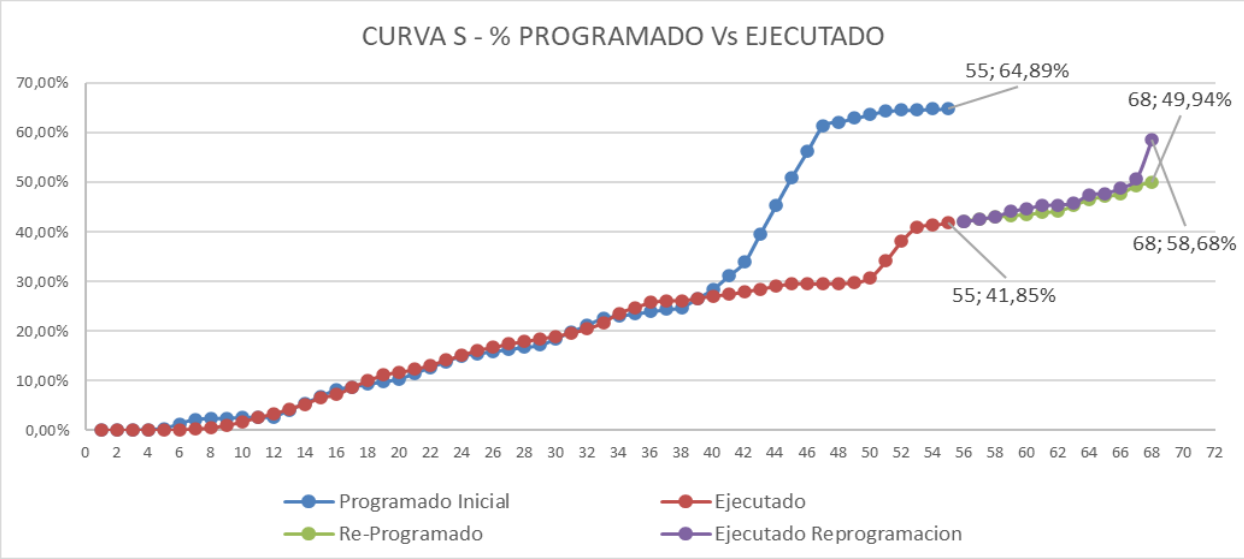

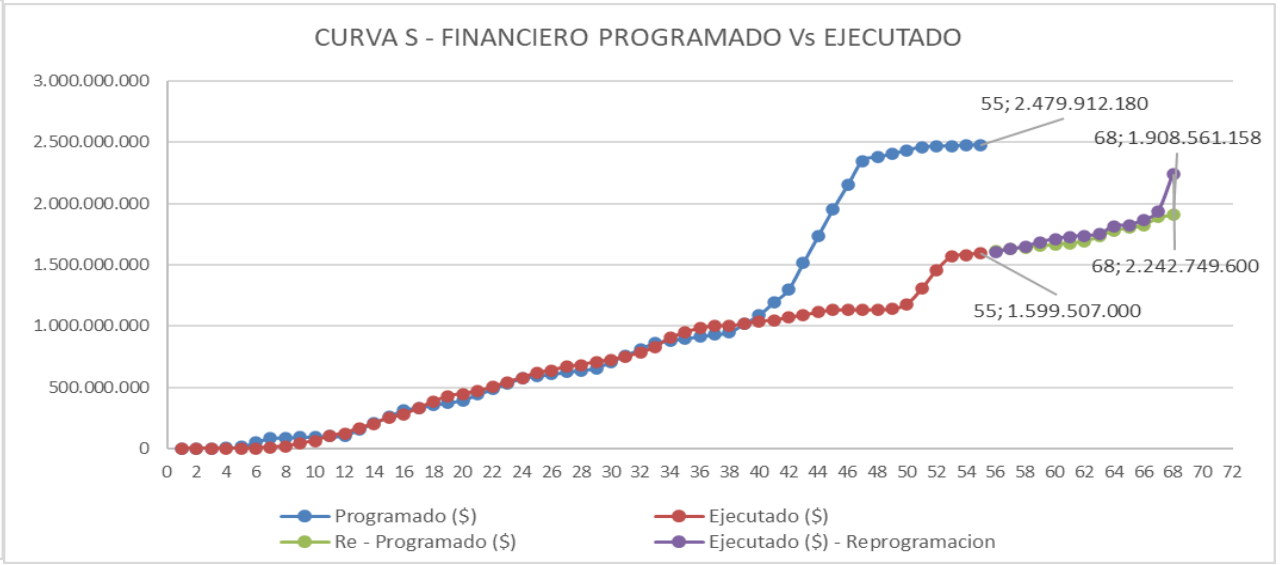

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 68

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 66	Cant. Acumulada	Cant. Contractual	% ejecutado
Localización, Replanteo M2	0,00	43.171,10	50.010,44	86,32%
Rocería Ha	0,00	306,69	324,26	93,35%
Fumigación Ha	0,00	255,53	324,26	78,80%
Limpieza canales Ml	0,00	11.564,61	11.564,61	100,00%
Limpieza encoles y descoles Un	10,00	187,00	200,00	93,50%
Pintura Calles de rodaje y plataforma M2	0,00	130,51	10.114,00	1,29%
Parcheo mezcla fría M3	0,00	0,09	1,00	9,00%
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	92.520,00	207.899,53	44,50%
Descontaminación por caucho	7470,00	16.920,00	16,920,00	100,00%
Limpieza cerramiento perimetral Ml	609,80	52,869,40	56.056,00	94,32%
Instalación de cerramiento Ml	0,00	100,00	100,00	100,00%
Suministro e instalación de suelo cemento	0,00	2,03	84	2,42%
Demoliciones	0,00	12,63	147	8,49%
Suministro e instalación de concreto MR 45 FAST TRACK	0,00	10,95	147	7,45%
Corte de individuos latizales UN	286,00	2028,00	2.028,00	100,00%

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN





Realización de rocería

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN








Realización de corte de latizales

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

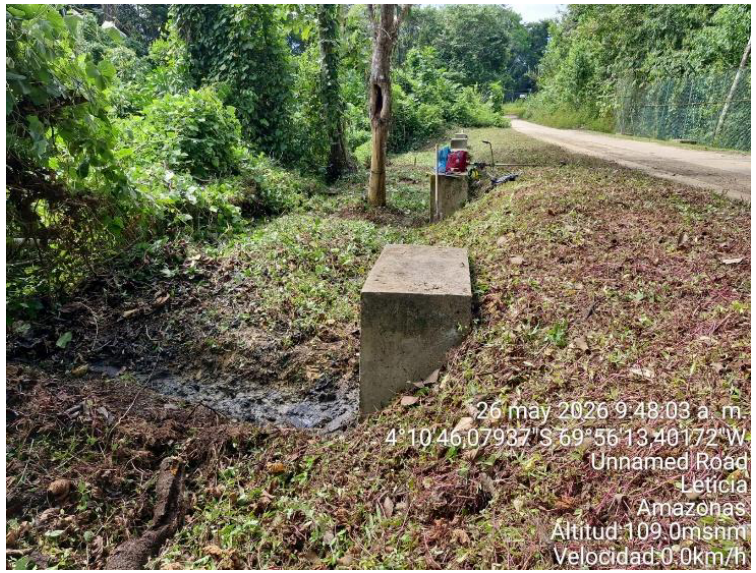






Realización de limpieza de encoles y descoles

PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO CON AREAS DE TRABAJO

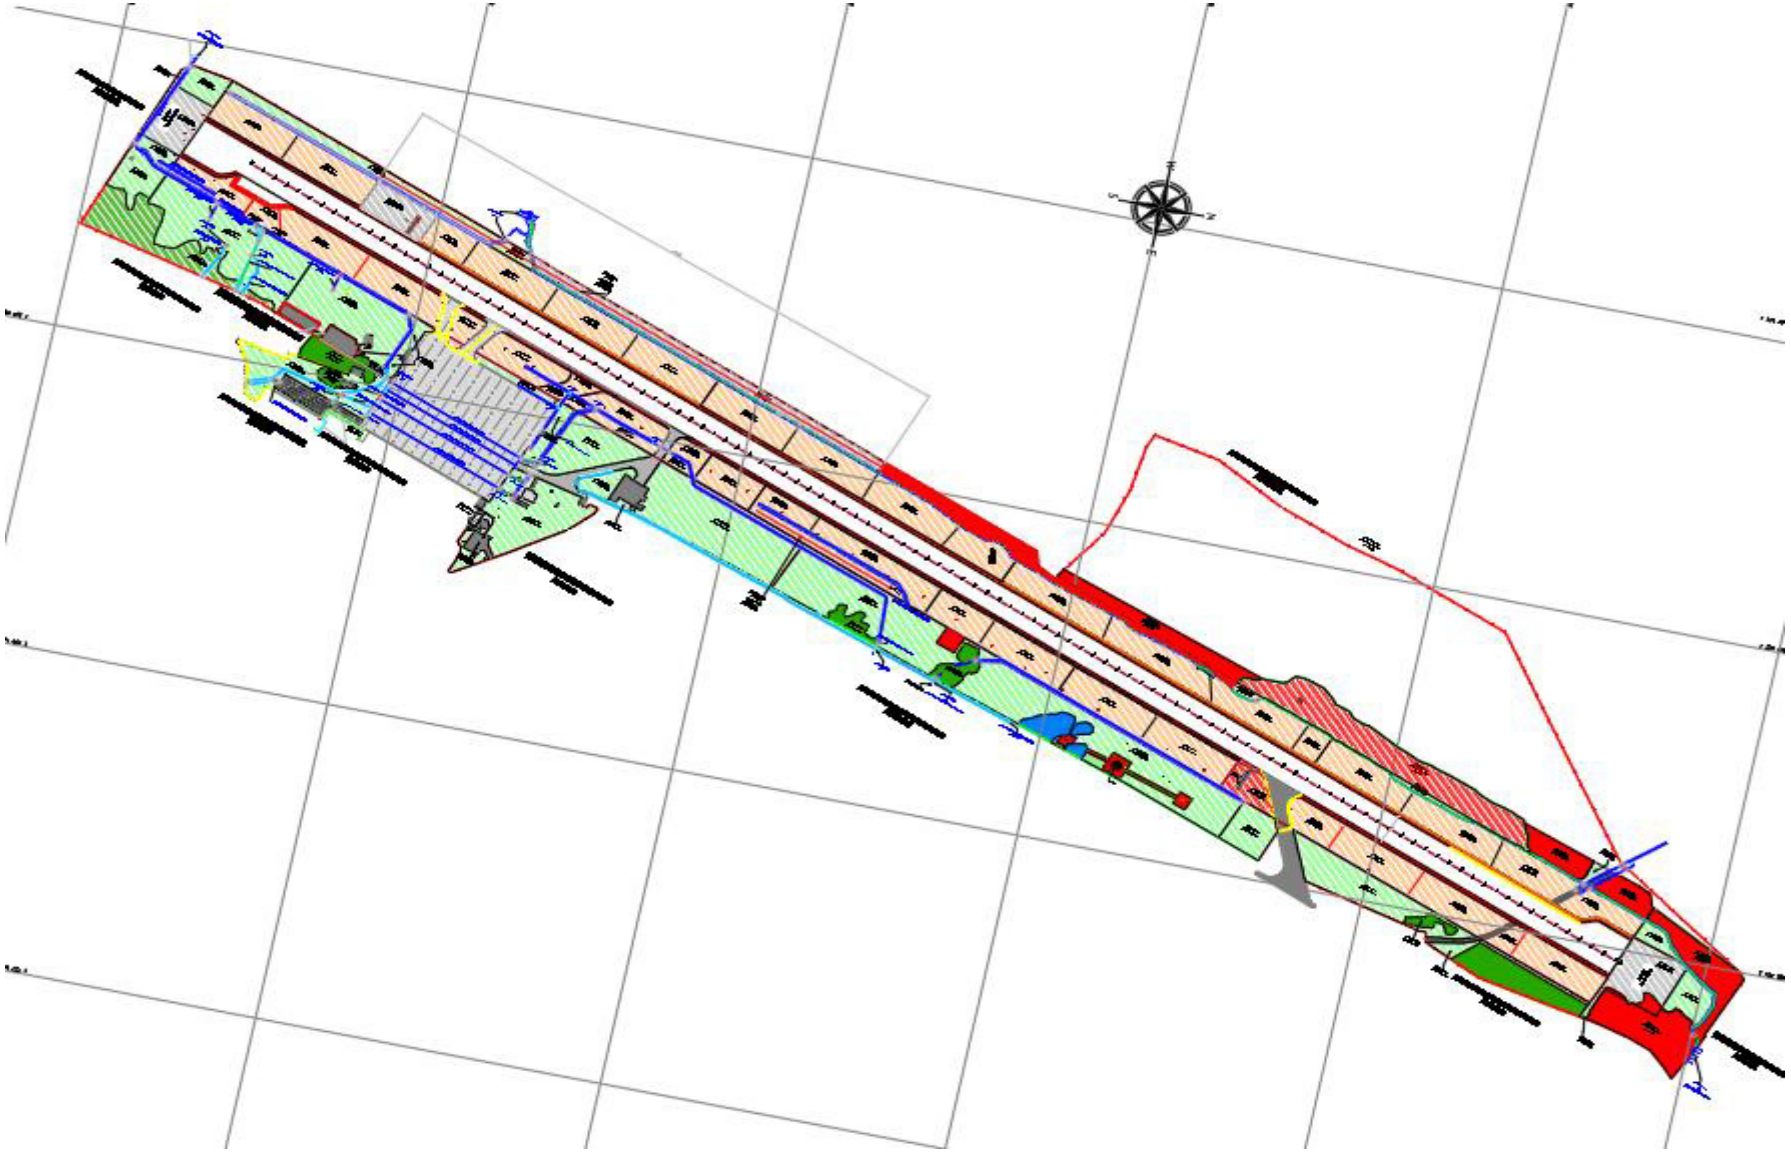

7. Planes de acción y/o Generación de Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1.		
2.		
3.		

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

AGENDA

Orden del día Comité de seguimiento de obra No 63 del 18 de junio de 2026:

1. Verificación del Quorum.
2. Datos del contrato.
3. Seguimiento de compromisos del acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Personal de obra e interventoría
6. Indicadores financieros
7. Planes de acción (Generación de Compromisos)

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO MANTENIMIENTO LADO AIRE	
NÚMERO DE CONTRATO	24001241 H4 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI.
OBJETO	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).
VALOR	$3.822.000.000 Incluye AIU.
FECHA DE INICIO	12/02/2025.
MODIFICATORIO No 1	Inclusión ítems no previstos y balance, sin adición de recursos ni plazo
FECHA TERMINACIÓN	31/07/2026.
PLAZO	hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero).
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

MANTENIMIENTO LADO AIRE





LADO AIRE

3. LECTURA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Balizas para calle de rodaje ALFA	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	30 ABR -2026	15 MAY 2026	Soporte técnico del aeropuerto ya instalo las balizas ya solo falta la conexión que soporte técnica del aeropuerto efectuará acompañamiento, el día lunes 15 de junio el consorcio tarqui en horas de la noche realizo la instalación de las luces de la calle de rodaje alfa (cerrada) para dejar la calle habilitada para uso normal de aeronaves, se evidencia que las balizas que están instaladas en el cierre de la calle de rodaje bravo no son suficientes ya que hay solo dos en funcionamiento.
2	CALLE CERRADA BRAVO	CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	05 MAY 2026	Las actividades de arreglo de calle de rodaje ALFA (cerrada) se terminaron el día 13 y se aprobó el Notam el día 15
3	REAJUSTE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	SUPERVISION INTERVENTORIA	29 MAYO 2026	05 JUNIO 2026	Ya se realizaron las respectivas entregas de los formatos sobre los reajustes para aprobación de la entidad, se está en proceso de radicación oficial
4	TALA DE ARBOLES	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	20 ABR 2026	la supervisión informará lo antes posible la directriz, respecto a la ejecución de dicha actividad de conformidad con la entrega de los APUs de tala
5	CIERRE AEROPUERTO	CONSORCIO TARQUI	21 MAYO 2026	22 MAYO 2026	Se esta revisando concepto por parte del contratista por no ejecución de actividades de bache en pista. Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta
6	ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN BACHE PISTA	SUPERVISION INTERVENTORIA CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	05 JUNIO 2026	Consorcio Tarqui a través de su especialista, buscará alternativa de solución de bache en pista, la cual será cotejada por el especialista de Interventoría Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta

4. TEMAS A TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Mantenimiento de calle de rodaje ALFA	CONSORCIO TARQUI	El Consorcio tarqui realizo el 15 de junio la entrega a los técnicos del aeropuerto la calle de rodaje ALFA (ANTIGUA) donde se evidencio el funcionamiento de las luces laterales de la calle de rodaje y se evidencio el no funcionamiento de algunos tableros informativos, se elevó solicitud a la Gerencia para revisión de estos tableros
2	Mantenimiento de Bache en pista	CONSORCIO TARQUI	Se esta revisando por parte de la interventoría el informe sobre la no ejecución de los trabajos de bache de pista y se queda pendiente una nueva fecha para solicitud de un nuevo NOTAM, o en su defecto entrega por parte del contratista de una propuesta nueva de intervención. Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta
4	Actas de costos de Interventoría y contratista	Supervisión	Se solicita a la supervisión el estado de las actas tanto de la interventoría como del contratista, esto con el fin de tener flujo de caja ya que el contratista esta informando que tiene muy poco flujo de caja para realizar las actividades que tiene programadas
5	Señalización	Consorcios y supervisión	Los planos están en revisión por parte de los especialistas de la interventoría, se espera el aval para poder enviar a aprobación por parte de la autoridad

5. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA INGRESO**
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Diaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	**11**
No Profesionales	**6**
Total Personal	**22**
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %

PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	jhenaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	FABIAN PINEDO		
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	Consorciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	Jegg.construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara		

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE INTERVENTORIA

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112123780
11	CADENERA	En aprobación hoja de vida		

6. INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES DE AVANCE


CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN


MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	3,02%	**53,54%**
Valor programado ($)	$115.427.377	**$2.046.319.224**

		Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado		0,39%	**59,21%**
Valor ejecutado ($)		$15.041.124,56	**$2.263.162.828**
Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso		**5,67%**
	Valor Adelanto/Atraso		**$ 216.843.604,00**

OBSERVACIONES

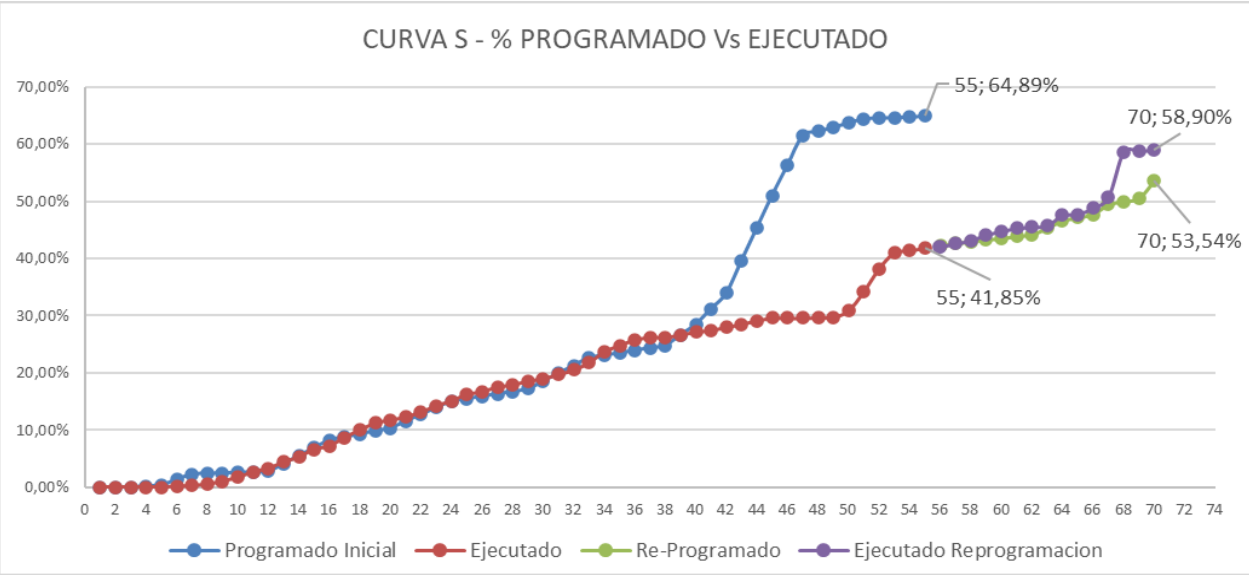

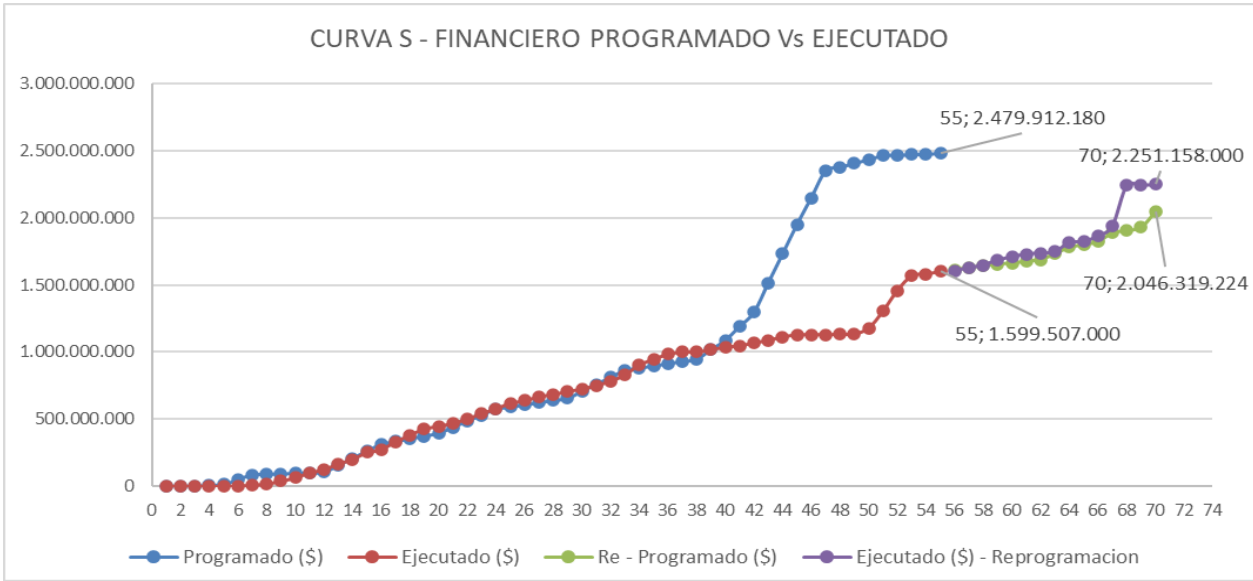

INDICADORES DE AVANCE

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 70

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	0,00	$ -
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	2,43	$ 2.441.656,7
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	2,43	$ 573.467,9
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	0,00	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
3,2	PINTURA PARA CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA	m2	$ 64.212,00	0,00	$ -
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 1,00	0,00	$ -
4,4	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO	ml	$ 6.013,00	2000,00	$ 12.026.000,0
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	0,00	$ -
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	0,00	$ -
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION SUELO CEMENTO	M3	$ 394.493,00	0,00	$ -
NP 2	DEMOLICIONES	M3	$ 359.306,00	0,00	$ -
NP 3	CONCRETO MR45 - FAST TRACK 24 HORAS	M3	$ 4.207.751,00	0,00	$ -
NP 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES	Unidad	$ 60.877,00	0,00	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 15.041.124,56**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 2.248.121.703,89
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 2.263.162.828,00

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 70

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 69	Cant. Acumulada	Cant. Contractual	% ejecutado
Localización, Replanteo M2	0,00	43.171,10	50.010,44	86,32%
Rocería Ha	2,43	309,45	324,26	95,43%
Fumigación Ha	2,43	262,29	324,26	80,89%
Limpieza canales Ml	0,00	11.564,61	11.564,61	100,00%
Limpieza encoles y descoles Un	0,00	187,00	200,00	93,50%
Pintura Calles de rodaje y plataforma M2	0,00	130,51	10.114,00	1,29%
Parcheo mezcla fría M3	0,00	0,09	1,00	9,00%
Sello de fisuras en pavimento asfáltico sin ruteo	2000,00	2000,00	2500,00	80,0%
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	92.520,00	207.899,53	44,50%
Descontaminación por caucho	0,00	16.920,00	16,920,00	100,00%
Limpieza cerramiento perimetral Ml	0,00	52,869,40	56.056,00	94,32%
Instalación de cerramiento Ml	0,00	100,00	100,00	100,00%
Suministro e instalación de suelo cemento	0,00	2,03	84	2,42%
Demoliciones	0,00	12,63	147	8,49%
Suministro e instalación de concreto MR 45 FAST TRACK	0,00	10,95	147	7,45%
Corte de individuos latizales UN	0,00	2028,00	2.028,00	100,00%

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN







Realización de rocería

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN












Sello de fisuras

PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO CON AREAS DE TRABAJO

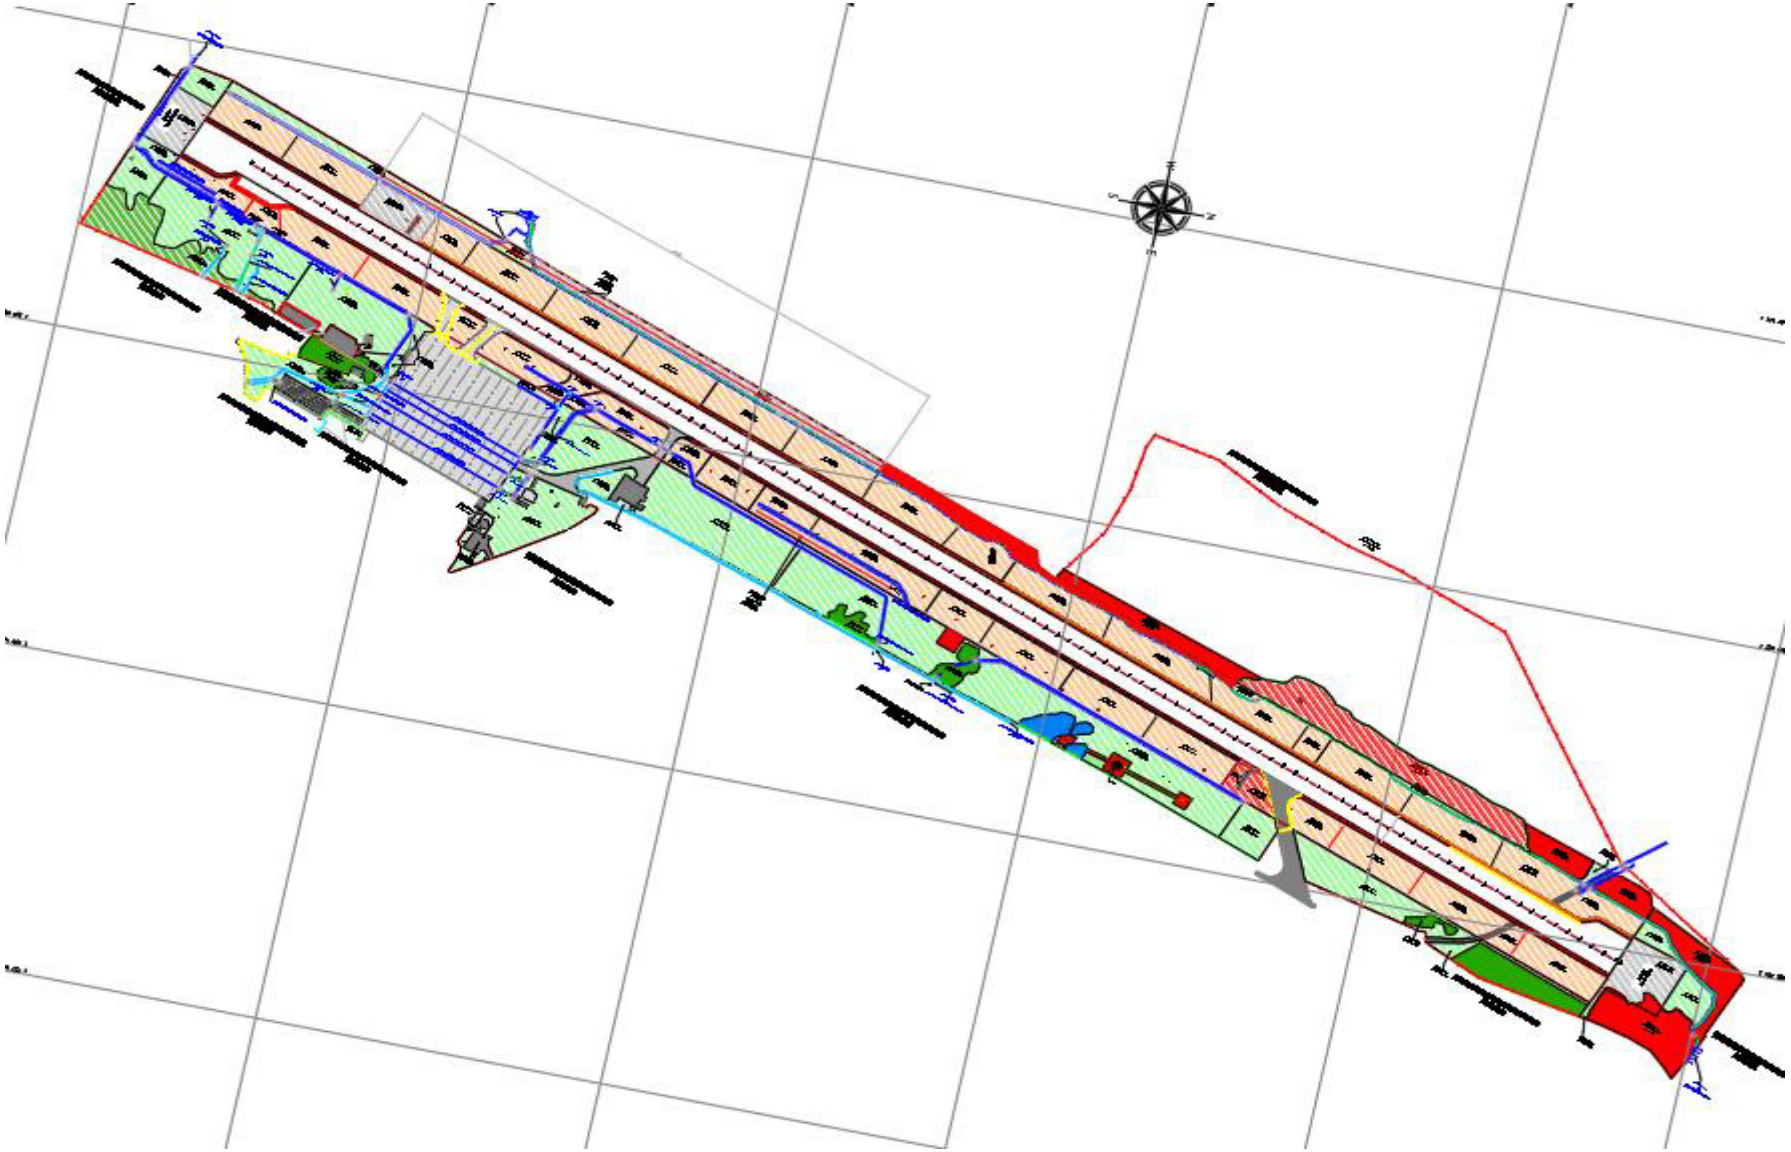

7. Planes de acción y/o Generación de Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1.		
2.		
3.		

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

AGENDA

Orden del día Comité de seguimiento de obra No 64 del 25 de junio de 2026:

1. Verificación del Quorum.
2. Datos del contrato.
3. Seguimiento de compromisos del acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Personal de obra e interventoría
6. Indicadores financieros
7. Planes de acción (Generación de Compromisos)

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO MANTENIMIENTO LADO AIRE	
NÚMERO DE CONTRATO	24001241 H4 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra.
CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI.
OBJETO	Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).
VALOR	$3.822.000.000 Incluye AIU.
FECHA DE INICIO	12/02/2025.
MODIFICATORIO No 1	Inclusión ítems no previstos y balance, sin adición de recursos ni plazo
FECHA TERMINACIÓN	31/07/2026.
PLAZO	hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero).
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

MANTENIMIENTO LADO AIRE





LADO AIRE

3. LECTURA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Balizas de iluminación para calle de rodaje BRAVO Y PLATAFORMA	CONSORCIO TARQUI	15 JUN 2026	25 JUN 2026	Queda pendiente la reposición de balizas a la calle de rodake Bravo, tan pronto finalice el mantenimiento de las losas en plataforma
2	REAJUSTE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	SUPERVISION INTERVENTORIA	29 MAYO 2026	25 JUNIO 2026	Ya se realizaron las respectivas entregas de los formatos sobre los reajustes para aprobación de la entidad, se está en espera de aprobación por la entidad
3	TALA DE ARBOLES O ARREGLO DE LOSAS	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	25 JUNIO 2026	Se esta a la espera que la supervisión de una directriz hacia que sector se debe de realizar la adición si hacia la tala de arboles o hacia la adecuación de losas de la plataforma. Interno a la Entidad se verificará el proceder y se notificará a la Interventoría
4	ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN BACHE PISTA	SUPERVISION INTERVENTORIA CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	25 JUNIO 2026	Consorcio Tarqui radico oficio con nuevas fechas para realizar el arreglo del bache de la pista, se esta en revisión de la interventoría para dar un concepto, Se efectuó solicitud de Notam, basado en que consorcio Zeta no hará cierre de aeropuerto

4. TEMAS A TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Mantenimiento de calles de rodaje a plataforma	CONSORCIO TARQUI	A pesar que el notam esta aprobado desde el 15 de junio a la fecha de corte de este informe el CONSORCIO TARQUI no ha iniciado labores de demolición, lo único que ha realizado es corte de juntas, la respuesta del CONSORCIO TARQUI del no realizar actividades es que no tiene recursos
2	Actas de costos de Interventoría y contratista	Supervisión	Se solicita a la supervisión el estado de las actas tanto de la interventoría como del contratista, esto con el fin de tener flujo de caja ya que el contratista esta informando que tiene muy poco flujo de caja para realizar las actividades que tiene programadas
3	Señalización	Consorcios y supervisión	Los planos están en revisión por parte de los especialistas de la interventoría, se espera el aval para poder enviar a aprobación por parte de la autoridad
4	Modificatorio	Consorcios y Supervisión	Se solicita la definición del alcance de los recursos, tala de árboles o mantenimiento de losas plataforma, máxime que estamos a un mes de finalizar el contrato

5. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA

REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA INGRESO**
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Diaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	**11**
No Profesionales	**6**
Total Personal	**22**
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %


PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	jhenaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	FABIAN PINEDO		
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	Consorciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	Jegg.construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara		


REGISTRO DE PERSONAL LADO AIRE INTERVENTORIA

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112123780
11	CADENERA	En aprobación hoja de vida		

6. INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES DE AVANCE

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO					
	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,96%	**56,50%**	(%) Ejecutado	0,33%	**59,54%**
Valor programado ($)	$113.123.376	**$2.159.442.600**	Valor ejecutado ($)	$12.519.174,81	**$2.275.682.003**
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	3,04%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 116.239.403,00

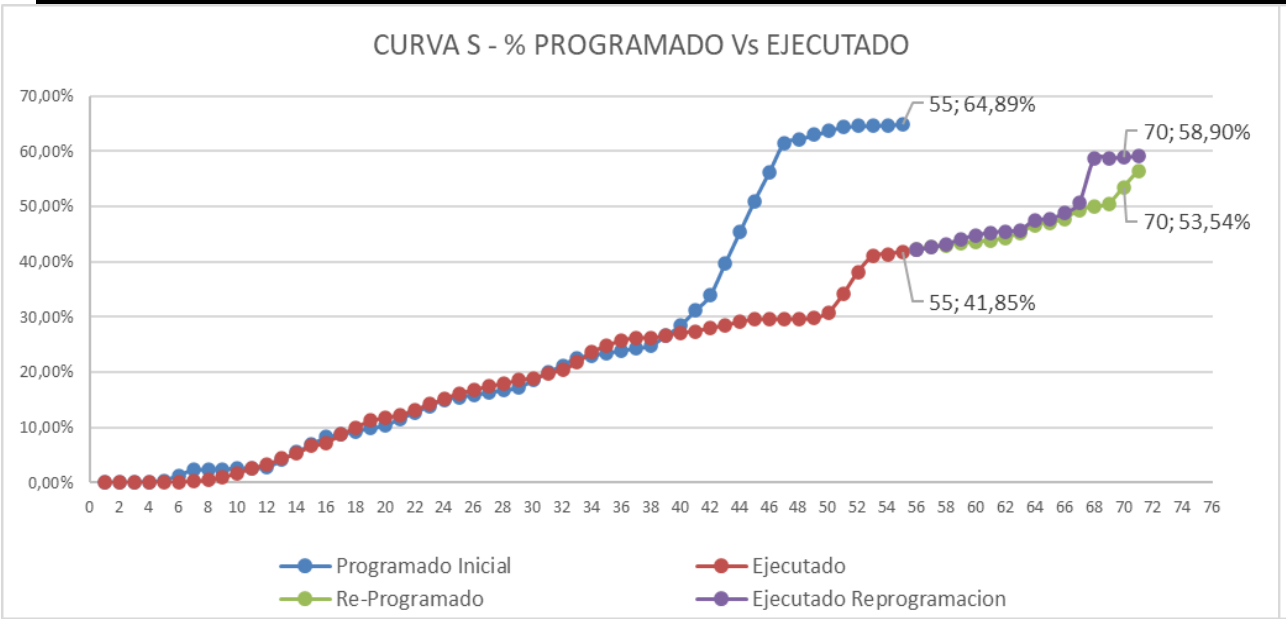

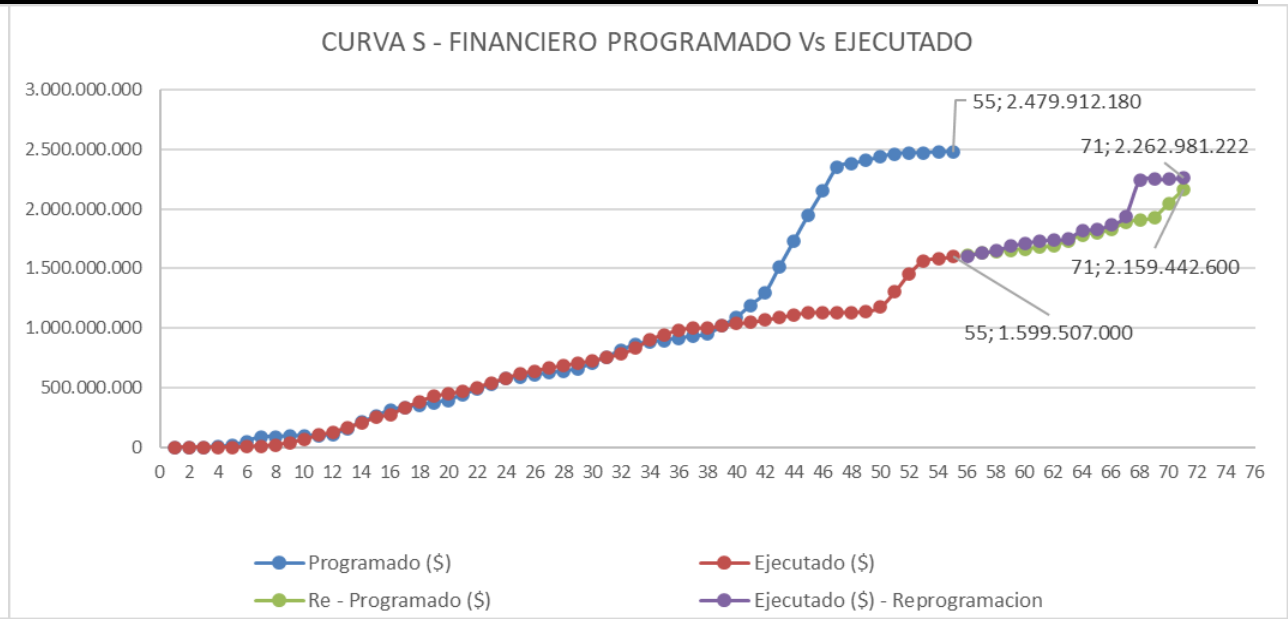

INDICADORES DE AVANCE

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 71					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR POR ACTIVIDAD**
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	0,00	$ -
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	4,04	$ 4.059.379,9
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	4,04	$ 953.419,8
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	0,00	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
3,2	PINTURA PARA CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA	m2	$ 64.212,00	0,00	$ -
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 7.497.573,00	0,09	$ 674.781,6
4,4	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO	ml	$ 6.013,00	0,00	$ -
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	664,94	$ 6.831.593,6
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	0,00	$ -
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION SUELO CEMENTO	M3	$ 394.493,00	0,00	$ -
NP 2	DEMOLICIONES	M3	$ 359.306,00	0,00	$ -
NP 3	CONCRETO MR45 - FAST TRACK 24 HORAS	M3	$ 4.207.751,00	0,00	$ -
NP 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES	Unidad	$ 60.877,00	0,00	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 12.519.174,81**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 2.275.682.003,00
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 2.288.201.178,00

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 71

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 69	Cant. Acumulada	Cant. Contractual	% ejecutado
Localización, Replanteo M2	0,00	43.171,10	50.010,44	86,32%
Rocería Ha	4,04	313,49	324,26	96,68%
Fumigación Ha	4,04	266,33	324,26	82,13%
Limpieza canales Ml	0,00	11.564,61	11.564,61	100,00%
Limpieza encoles y descoles Un	0,00	187,00	200,00	93,50%
Pintura Calles de rodaje y plataforma M2	0,00	130,51	10.114,00	1,29%
Parcheo mezcla fría M3	0,09	0,18	1,00	18,00%
Sello de fisuras en pavimento asfáltico sin ruteo	0,00	2000,00	2500,00	80,0%
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	92.520,00	207.899,53	44,50%
Descontaminación por caucho	0,00	16.920,00	16,920,00	100,00%
Limpieza cerramiento perimetral Ml	664,94	53,534,34	56.056,00	95,50%
Instalación de cerramiento Ml	0,00	100,00	100,00	100,00%
Suministro e instalación de suelo cemento	0,00	2,03	84	2,42%
Demoliciones	0,00	12,63	147	8,49%
Suministro e instalación de concreto MR 45 FAST TRACK	0,00	10,95	147	7,45%
Corte de individuos latizales UN	0,00	2028,00	2.028,00	100,00%

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN







Realización de rocería


ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN





Corte de losas

PLANO GENERAL DEL AEROPUERTO CON AREAS DE TRABAJO

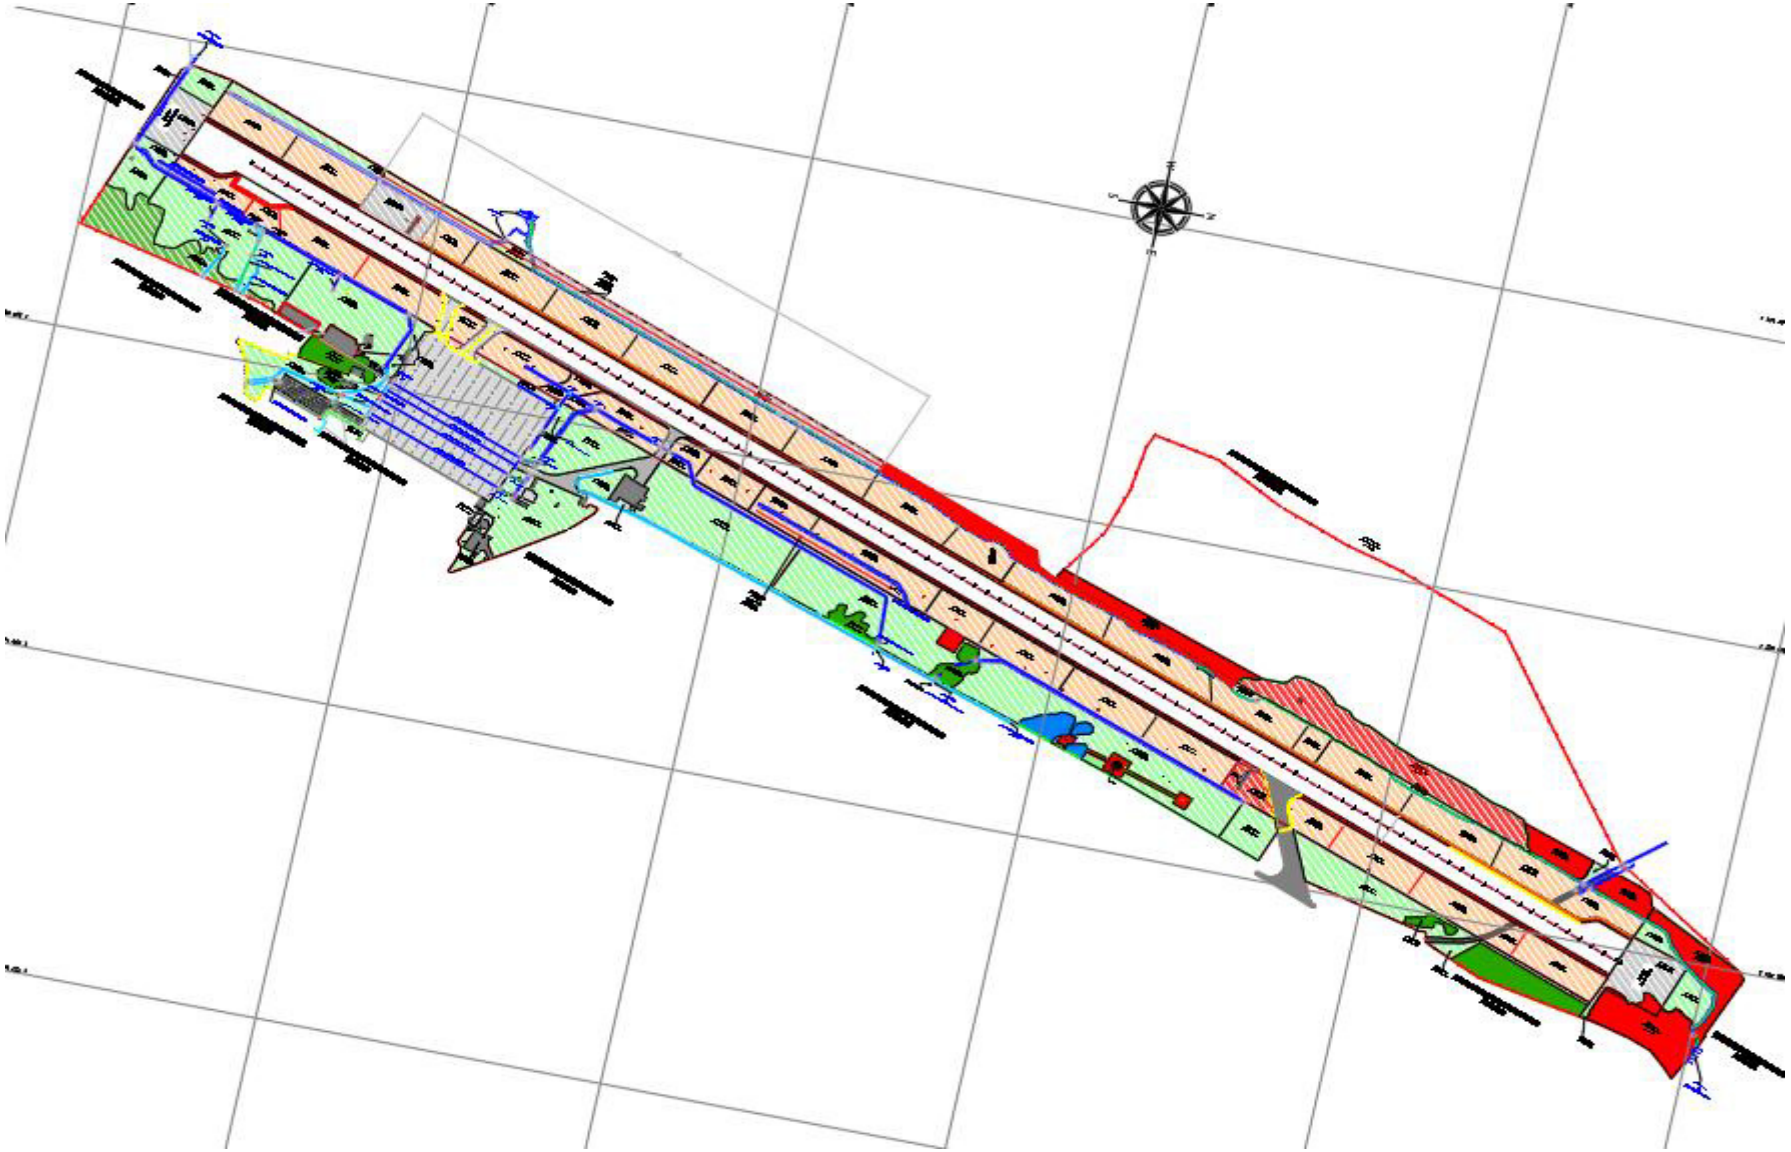

7. Planes de acción y/o Generación de Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1.		
2.		
3.		

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: ***57***

ÁREA:	*DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS*		**PROCESO:**	*24001241 H-4 2024*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*COMITÉ SEMANAL CONTRATO DE OBRA, No. 24001241 H4 DE 2024 LADO AIRE Y DE INTERVENTORIA 24001242 H3 DE 2024*				
LUGAR:	*OFICINA INTERVENTORIA LETICIA/AMAZONAS Y DE FORMA VIRTUAL (Teams)*				
FECHA:	*9 JUION 2026*	**HORA INICIO:**	*3:30 P.M.*	**HORA FINAL:**	*4:30 P. M.*

II. **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Revisar el desarrollo de los trabajos ejecutados frente al cronograma y las especificaciones técnicas del proyecto.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Seguimiento de los compromisos acta anterior
3. Temas a tratar
4. Personal 100% Aprobado
5. Avances De Obra
6. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se verifica mediante presentación de cada uno de los asistentes, la afluencia de representantes de los Contratistas de Obra, Interventoría de Obra y supervisión de la Interventoría en forma presencial, se da inicio al comité

MARÍA CONSUELO DURÁN CARO	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ CORONADO	APOYO A SUPERVISIÓN
JULIO CHAPARRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HERNAN VILLAMIL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LA
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI
FABIAN PINEDO WALDRON	RESIDENTE DE OBRA

2. SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ACTA ANTERIOR:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Balizas para calle de rodaje ALFA	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	30 ABR -2026	15 MAY 2026	Soporte técnico del aeropuerto ya instalo las balizas ya solo falta la conexión que también la realizara la parte técnica del aeropuerto , a la fecha de terminación de este periodo el consorcio tarqui no ha realizado la recepción de las balizas, se debe de realizar prueba de las balizas antes de realizar apertura de la calle de rodaje.
2	CALLE CERRADA BRAVO	CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	05 MAY 2026	Las actividades de arreglo de calle de rodaje ALFA (cerrada) están en espera ya que el material para sello de fisuras no ha llegado a la obra, se ve con preocupación esta tema ya que el contratista no esta cumpliendo los compromisos pactados, el contratista nos informa que no tiene recursos para realizar las compras de los materiales, el Contratista informa que el material de sello ya esta en la trasportadora hacia leticia y que la demora es que llegue y el realiza las actividades de sello de juntas en máximo 4 horas
3	REAJUSTE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	SUPERVISION INTERVENTORIA	29 MAYO 2026	05 JUNIO 2026	Pronunciamiento sobre la entrega de reajuste, para inicio de proceso de modificatorio
4	APROBACIÓN HOJA DE VIDA CADENERO IMGA	SUPERVISION	29 MAYO 2026	01 JUNIO 2026	El lunes 1 de junio hará el pronunciamiento la supervisión sobre hoja de vida, la cual se esta verificando que no se encuentre en otros contratos para no tener inconveniente con la dedicación
5	TALA DE ARBOLES	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	20 ABR 2026	Se continua a la espera del pronunciamiento de Corpoamazonas, la supervisión informará lo antes posible la directriz, respecto a la ejecución de dicha actividad

6	MESA DE TRABAJO DEMARCACION PISTA	SUPERVISION	15 MAYO 2026	20 MAYO 2026	Se realizo recepción de los planos los cuales están siendo revisados para envió a la autoridad para aprobación final
7	MESA DE TRABAJO DE REAJUSTE	SUPERVISION INTERVENTORIA	21 MAYO 2026	22 MAYO 2026	Se hace entrega del reajuste de acuerdo a mesa de trabajo, Se esta a la espera de concepto por parte de la supervisión
8	CIERRE AEROPUERTO	CONSORCIO TARQUI	21 MAYO 2026	22 MAYO 2026	Se esta revisando concepto por parte del contratista por no ejecución de actividades de bache en pista
9	BUSCAR ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN BACHE PISTA POR TEMAS DE NUEVO CIERRE	SUPERVISION INTERVENTORIA CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	05 JUNIO 2026	Consorcio Tarqui a través de su especialista, buscará alternativa de solución de bache en pista, la cual será cotejada por el especialista de Interventoría

Balizas para calle de rodaje ALFA: Por parte de la interventoría se realizó la consulta con los técnicos del aeropuerto, quienes informaron que no era necesario realizar el traslado de las luces de la calle bravo a la Alfa, ya que ellos tenían 10 balizas que se pueden utilizar, estas balizas fueron las que se retiraron de la calle ALFA antigua.

Por parte de la parte técnica del aeropuerto ya se instalaron las balizas, queda solo pendiente la conexión, se debe realizar recibo de las balizas por parte del CONSORCIO TARQUI ya que soporte técnico del aeropuerto ya las tiene instaladas; a la fecha de terminación de este periodo el consorcio Tarqui no ha realizado la recepción de las balizas

El consorcio Tarqui indica que a más tardar esta semana se comunicarán con los técnicos del aeropuerto para hacer la recepción de esas balizas, lo cual debe ser cuanto estén listas para la apertura de esta calle de rodaje Alfa y cierre de la Bravo, se harán pruebas

Calle cerrada bravo: Las actividades de arreglo de calle de rodaje ALFA (cerrada) están en espera ya que el material para sellar las fisuras no ha llegado a la obra, se ve con preocupación este tema ya que el contratista no está cumpliendo los compromisos pactados

El contratista indica que el material para el sello ya lo compro y está en Bogotá, que ya está en la transportadora que a más tardar el martes 2 de junio de 2026 estaría en leticia, y que para hacer las actividades de sello de fisura se llevaría máximo 4 horas; en contratista indica que la demora es que llegue el material y que ese mismo día realiza el sello de las fisuras

Reajuste contratos de obra e interventoría: Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se está a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de árboles o en mantenimiento de losas en plataforma

Aprobación hoja de vida cadenero IMGA: El lunes 1 de junio hará el pronunciamiento la supervisión sobre hoja de vida, la cual se esta verificando que no se encuentre en otros contratos para no tener inconveniente con la dedicación.

Tala de Árboles: Se continua a la espera del pronunciamiento de Corpoamazonas, la supervisión informará lo antes posible la directriz, respecto a la ejecución de dicha actividad.

La Interventoría solicita de la supervisión que esta información sea entregada lo antes posible, por cuanto esto esta afectando el progreso del modificatorio, a sabiendas que queda menos de dos meses para la finalización contractual,

Mesa de trabajo demarcación pista: Se realizo recepción de los planos los cuales están siendo revisados para envió a la autoridad para aprobación final.

Mesa de trabajo de reajuste: Se hace entrega del reajuste de acuerdo a mesa de trabajo, Se esta a la espera de concepto por parte de la supervisión

Cierre Aeropuerto: Se recibió por parte del contratista el concepto de especialista por no ejecución de actividades de bache en pista, el informe cuenta con los pormenores de la no ejecución de la actividad del bache de la pista, donde principalmente indican que no se pudo realizar por falta de tiempo para curado del fast track debido a la utilización de horario establecido para el proyecto por llegada del avión ambulancia, y debido a las pólizas de estabilidad no se arriesgan a ejecutar dicha labor.

Buscar alternativa de intervención bache pista por temas de nuevo cierre: Consorcio Tarqui a través de su especialista, buscará alternativa de solución de bache en pista, la cual será cotejada por el especialista de Interventoría

3. TEMAS PARA TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Mantenimiento de calle de rodaje ALFA	CONSORCIO TARQUI	Se evidencia que el consorcio Tarqui no ha hecho entrega de la calle de rodaje como se había comprometido que entregaba el 5 mayo; el no cumplimiento generara atrasos en el cronograma, por cuanto en el mes de junio se tiene el inicio de ejecución de losas en plataforma.
2	Mantenimiento de Bache en pista	CONSORCIO TARQUI	Se esta revisando por parte de la interventoría el informe sobre la no ejecución de los trabajos de bache de pista y se queda pendiente una nueva fecha para solicitud de un nuevo NOTAM, o en su defecto entrega por parte del contratista de una propuesta nueva de intervención
3	Reajuste de preciso	Consorcios y supervisión	Se entregó a la supervisión la proyección del reajuste, se esta a la espera de la revisión y aprobación
4	Actas de costos de Interventoría y contratista	Supervisión	Se solicita a la supervisión el estado de las actas tanto de la interventoría como del contratista, esto con el fin de tener flujo de caja ya que el contratista esta informando que tiene muy poco flujo de caja para realizar las actividades que tiene programadas
5	Señalización	Consorcios y supervisión	Los planos están en revisión por parte de los especialistas de la interventoría, se espera el aval para poder enviar a aprobación por parte de la autoridad

Mantenimiento de calle de rodaje ALFA: Se evidencio que el consorcio Tarqui no entrego la calle de rodaje el 5 de acuerdo a los compromisos adquiridos y se espera que se nos informe por parte del consorcio Tarqui la nueva fecha de entrega y se procederá a solicitar el cierre de calle de rodaje BRAVO para iniciar labores de mantenimiento de losas de plataforma. Se espera que el contratista nos confirme fecha de llegada del producto para sellar fisuras

Mantenimiento de Bache en pista: Se recibió por parte del contratista el concepto de especialista por no ejecución de actividades de bache en pista, el informe cuenta con los pormenores de la no ejecución de la actividad del bache de la pista, donde principalmente indican que no se pudo realizar por falta de tiempo para curado del fast track debido a la utilización de horario establecido para el proyecto por llegada del avión ambulancia, y debido a las pólizas

de estabilidad no se arriesgan a ejecutar dicha labor. y se queda pendiente una nueva fecha para solicitud de un nuevo NOTAM, o en su defecto entrega por parte del contratista de una propuesta nueva de intervención

Reajuste de precios: Se entregó a la supervisión la proyección del reajuste, se está a la espera de la revisión y aprobación, la supervisión indica que ya los documentos están en el área encargada de revisar la información que esta semana que viene tendrían una respuesta

Actas de costos de Interventoría y contratista: Se solicita a la supervisión el estado de las actas tanto de la interventoría como del contratista, esto con el fin de tener flujo de caja ya que el contratista está informando que tiene muy poco flujo de caja para realizar las actividades que tiene programadas, se piensa que el próximo miércoles ya estaría paga esa acta.

Señalización: Los planos están en revisión por parte de los especialistas de la interventoría, se espera el aval para poder enviar a aprobación por parte de la autoridad

4. **PERSONAL DE OBRA**

PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	jhenaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	FABIAN PINEDO WALDRON		
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	Consorciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	Jegg.construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara		

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA INGRESO**
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Diaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	**11**
No Profesionales	**6**
Total Personal	**22**
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
11	CADENERA	Pendiente aprobación		

5. AVANCES DE OBRA

ACTAS DE SEGUIMIENTO SEMANALES

Se hace referencia a las actas de seguimiento de cantidades de obras ejecutadas del Consorcio TARQUI, donde se evidencia los avances o atrasos que tienen de acuerdo a lo que se ejecuta semanalmente, lo cual debe quedar debidamente justificado en las actas semanales de obra con su Vo. Bo.

INDICADORES DE AVANCE SEMANA 67

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,53%	49,94%	(%) Ejecutado	7,96%	58,68%
Valor programado ($)	$20.439.881	$1.908.561.158	Valor ejecutado ($)	$304.054.647,20	$2.242.749.075
			Evaluación	Porcentaje Adelanto/Atraso	8,74%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 334.187.917,00

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 68

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	0,00	$ -
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	0,00	$ -
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	0,00	$ -
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	10,00	$ 574.950,000000
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
3,2	PINTURA PARA CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA	m2	$ 64.212,00	0,00	$ -
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 1,00	0,00	$ -
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	609,80	$ 6.265.085,200000
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	7470,00	$ 279.803.790,000000
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION SUELO CEMENTO	M3	$ 394.493,00	0,00	$ -
NP 2	DEMOLICIONES	M3	$ 359.306,00	0,00	$ -
NP 3	CONCRETO MR45 - FAST TRACK 24 HORAS	M3	$ 4.207.751,00	0,00	$ -
NP 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES	Unidad	$ 60.877,00	286,00	$ 17.410.822,000000
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					$ 304.054.647,20
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 1.938.694.427,33
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 2.242.749.075,00

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 68

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 66	Cant. Acumulada	Cant. Contractual	% ejecutado
Localización, Replanteo M2	0,00	43.171,10	50.010,44	86,32%
Rocería Ha	0,00	306,69	324,26	93,35%
Fumigación Ha	0,00	255,53	324,26	78,80%
Limpieza canales Ml	0,00	11.564,61	11.564,61	100,00%
Limpieza encoles y descoles Un	10,00	187,00	200,00	93,50%
Pintura Calles de rodaje y plataforma M2	0,00	130,51	10.114,00	1,29%
Parcheo mezcla fría M3	0,00	0,09	1,00	9,00%
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	92.520,00	207.899,53	44,50%
Descontaminación por caucho	7470,00	16.920,00	16,920,00	100,00%
Limpieza cerramiento perimetral Ml	609,80	52,869,40	56.056,00	94,32%
Instalación de cerramiento Ml	0,00	100,00	100,00	100,00%
Suministro e instalación de suelo cemento	0,00	2,03	84	2,42%
Demoliciones	0,00	12,63	147	8,49%
Suministro e instalación de concreto MR 45 FAST TRACK	0,00	10,95	147	7,45%
Corte de individuos latizales UN	286,00	2028,00	2.028,00	100,00%

Seguridad y salud en el trabajo:

- El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección personal e identificación del personal.
- Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
- Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
- Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
- Se realiza verificación de los kits de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos


6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Adecuación calle de rodaje ALFA (cerrada)	CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	2 JUNIO 2026	Llegado el producto para sello de juntas se arreglara la calle de rodaje ALFA (cerrada) para ponerla en servicio
2	Entrega planos de levantamiento de redes secas	CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	5 JUNIO 2026	Se adquirió el compromiso por parte del contratista a entregar los planos actualizados de las redes secas
3	Realizar pruebas a las balizas de calle de rodaje Alfa	CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	5 JUNIO 2026	Dicha actividad debe realizar las pruebas antes del cierre de la calle de rodaje Bravo
4	Reajuste contratos de obra e Interventoría	Supervisión	29 MAYO 2026	5 JUNIO 2026	Pronunciamiento sobre la entrega de reajuste, para inicio de proceso de modificatorio

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
5	Buscar alternativa de Intervención bache pista por temas de nuevo cierre	CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	5 JUNIO 2026	Consorcio Tarqui a través de su especialista, buscará alternativa de solución de bache en pista, la cual será cotejada por el especialista de Interventoría

V. FIRMAS:

Para constancia se firma en las ciudades de **Leticia y Bogotá D.C** a los 9 días del mes de julio del año **2026**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial y virtual.

COMITÉ SEMANAL No. 56 CONTRATO DE OBRA, No. 24001241 H4 DE 2024 LADO AIRE Y DE INTERVENTORIA 24001242 H3 DE 2024		
Nombre completo	**Cargo**	**Firma**
MARÍA CONSUELO DURÁN CARO	SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ CORONADO	APOYO A SUPERVISION	
JULIO CHAPARRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
HERNAN VILLAMIL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LA	
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI	
FABIAN PINEDO WALDRON	RESIDENTE DE OBRA	

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: ***58***

ÁREA:	*DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS*		**PROCESO:**	*24001241 H-4 2024*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*COMITÉ SEMANAL CONTRATO DE OBRA, No. 24001241 H4 DE 2024 LADO AIRE Y DE INTERVENTORIA 24001242 H3 DE 2024*				
LUGAR:	*OFICINA INTERVENTORIA LETICIA/AMAZONAS Y DE FORMA VIRTUAL (Teams)*				
FECHA:	*19 JUNIO 2026*	**HORA INICIO:**	*3:30 P.M.*	**HORA FINAL:**	*4:30 P. M.*

II. **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Revisar el desarrollo de los trabajos ejecutados frente al cronograma y las especificaciones técnicas del proyecto.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Seguimiento de los compromisos acta anterior
3. Temas a tratar
4. Personal 100% Aprobado
5. Avances De Obra
6. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se verifica mediante presentación de cada uno de los asistentes, la afluencia de representantes de los Contratistas de Obra, Interventoría de Obra y supervisión de la Interventoría en forma presencial, se da inicio al comité

MARÍA CONSUELO DURÁN CARO	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORÍA
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ CORONADO	APOYO A SUPERVISIÓN
JULIO CHAPARRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HERNAN VILLAMIL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LA
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI
FABIAN PINEDO WALDRON	RESIDENTE DE OBRA

2. SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ACTA ANTERIOR:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Balizas para calle de rodaje ALFA	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	30 ABR -2026	15 MAY 2026	Soporte técnico del aeropuerto ya instalo las balizas ya solo falta la conexión que soporte técnica del aeropuerto efectuará acompañamiento, el día lunes 15 de junio el consorcio tarqui en horas de la noche realizo la instalación de las luces de la calle de rodaje alfa (cerrada) para dejar la calle habilitada para uso normal de aeronaves, se evidencia que las balizas que están instaladas en el cierre de la calle de rodaje bravo no son suficientes ya que hay solo dos en funcionamiento.
2	CALLE CERRADA BRAVO	CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	05 MAY 2026	Las actividades de arreglo de calle de rodaje ALFA (cerrada) se terminaron el día 13 y se aprobó el Notam el día 15
3	REAJUSTE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	SUPERVISION INTERVENTORIA	29 MAYO 2026	05 JUNIO 2026	Ya se realizaron las respectivas entregas de los formatos sobre los reajustes para aprobación de la entidad, se está en proceso de radicación oficial
4	TALA DE ARBOLES	CONSORCIO IMGA CONSORCIO TARQUI	16 ABR -2026	20 ABR 2026	la supervisión informará lo antes posible la directriz, respecto a la ejecución de dicha actividad de conformidad con la entrega de los APUs de tala
8	CIERRE AEROPUERTO	CONSORCIO TARQUI	21 MAYO 2026	22 MAYO 2026	Se esta revisando concepto por parte del contratista por no ejecución de actividades de bache en pista. Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta
9	ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN BACHE PISTA	SUPERVISION INTERVENTORIA CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	05 JUNIO 2026	Consorcio Tarqui a través de su especialista, buscará alternativa de solución de bache en pista, la cual será cotejada por el especialista de Interventoría Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta

Balizas para calle de rodaje ALFA: Soporte técnico del aeropuerto ya instalo las balizas ya solo falta la conexión que soporte técnica del aeropuerto efectuará acompañamiento, el día lunes 15 de junio el consorcio tarqui en horas de la noche realizo la instalación de las luces de la calle de rodaje alfa (cerrada) para dejar la calle habilitada para uso normal de aeronaves, se evidencia que las balizas que están instaladas en el cierre de la calle de rodaje bravo no son suficientes ya que hay solo dos en funcionamiento.

Calle cerrada bravo: Las actividades de arreglo de calle de rodaje ALFA (cerrada) se terminaron el día 13 y se aprobó el Notam el día 15

Reajuste contratos de obra e interventoría: Ya se realizaron las respectivas entregas de los formatos sobre los reajustes para aprobación de la entidad, se está en proceso de radicación oficial

Aprobación hoja de vida cadenero IMGA: El lunes 1 de junio hará el pronunciamiento la supervisión sobre hoja de vida, la cual se está verificando que no se encuentre en otros contratos para no tener inconveniente con la dedicación.

Cierre Aeropuerto: Se está revisando concepto por parte del contratista por no ejecución de actividades de bache en pista. Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta

Alternativa de intervención bache pista: Consorcio Tarqui a través de su especialista, buscará alternativa de solución de bache en pista, la cual será cotejada por el especialista de Interventoría Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta

3. TEMAS PARA TRATAR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACION
1	Mantenimiento de calle de rodaje ALFA	CONSORCIO TARQUI	El Consorcio tarqui realizo el 15 de junio la entrega a los técnicos del aeropuerto la calle de rodaje ALFA (ANTIGUA) donde se evidencio el funcionamiento de las luces laterales de la calle de rodaje y se evidencio el no funcionamiento de algunos tableros informativos, se elevó solicitud a la Gerencia para revisión de estos tableros.
2	Mantenimiento de Bache en pista	CONSORCIO TARQUI	Se esta revisando por parte de la interventoría el informe sobre la no ejecución de los trabajos de bache de pista y se queda pendiente una nueva fecha para solicitud de un nuevo NOTAM, o en su defecto entrega por parte del contratista de una propuesta nueva de intervención. Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta
4	Actas de costos de Interventoría y contratista	Supervisión	Se solicita a la supervisión el estado de las actas tanto de la interventoría como del contratista, esto con el fin de tener flujo de caja ya que el contratista esta informando que tiene muy poco flujo de caja para realizar las actividades que tiene programadas
5	Señalización	Consorcios y supervisión	Los planos están en revisión por parte de los especialistas de la interventoría, se espera el aval para poder enviar a aprobación por parte de la autoridad

Mantenimiento de calle de rodaje ALFA: El Consorcio tarqui realizo el 15 de junio la entrega a los técnicos del aeropuerto la calle de rodaje ALFA (ANTIGUA) donde se evidencio el funcionamiento de las luces laterales de la calle de rodaje y se evidencio el no funcionamiento de algunos tableros informativos, se elevó solicitud a la Gerencia para revisión de estos tableros.

Mantenimiento de Bache en pista: Se esta revisando por parte de la interventoría el informe sobre la no ejecución de los trabajos de bache de pista y se queda pendiente una nueva fecha para solicitud de un nuevo NOTAM, o en su defecto entrega por parte del contratista de una propuesta nueva de intervención. Contratista informará si se acogen al Notam de cierre que solicitará Zeta

Actas de costos de Interventoría y contratista: Se solicita a la supervisión el estado de las actas tanto de la interventoría como del contratista, esto con el fin de tener flujo de caja ya que el contratista esta informando que tiene muy poco flujo de caja para realizar las actividades que tiene programadas
.

Señalización: Los planos están en revisión por parte de los especialistas de la interventoría, se espera el aval para poder enviar a aprobación por parte de la autoridad

4. **PERSONAL DE OBRA**

PERSONAL PROFESIONA CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	Representante Legal	Diego Mauricio Galán Echeverri	ingepros2012@hotmail.com	6015498600
2	Director de Obra	Jaime Andrés Henao Melo	jhenaomelo@gmail.com	3112115677
3	Ingeniero Residente	FABIAN PINEDO WALDRON		
4	Residente SST	MARLY TARACHE SOGAMOSO	Consorciotarqio293@gmail.com	3223451579
5	Inspector de Obra	Jesús Eduardo Gómez Gómez	Jegg.construcciones@gmail.com	3123603501
6	Especialista Aeroportuario	Pedro José Mora Grandas		
7	Especialista Eléctrico	Cesar Augusto Cubides		
8	Especialista de Pavimento	Manuel José Meza		
9	Topógrafo	ALEX ALBERTO RODAS WILCHES		
10	Cadenero	Jesús Gabriel Ortega		3002185374
11	Residente Eléctrico	Jhon Alexander Silvara		

PERSONAL MANO DE OBRA				
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA INGRESO**
1	Bertha Ines Macedo	Ayudante de Obra		
2	Gilberto Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	1.121.200.400	03/06/2024
3	Melanio Gutiérrez Leonardo	Ayudante de Obra	15.875.628	03/06/2025
4	Rubén Darío Rodríguez Balcázar	Ayudante de Obra	6.567.737	03/06/2025
5	Ismael Silva Fernández	Ayudante de Obra	1.121.213.927	03/06/2025
6	José Humberto Vasques Diaz	Conductor	12.190.713	16/06/2025

PERSONAL DEL CONTARTISTA	
Profesionales	**11**
No Profesionales	**6**
Total Personal	**22**
% Región No Prof.	100 %
% Mujeres	4,55 %
% Prof. Región	27,27 %

PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA				
ITEM	**PERSONAL INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELEFONO**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206318754
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO AIRE	HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3206223886
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA LADO TIERRA	CESAR AUGUSTO GUTIÉRREZ SUAREZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3112042720
4	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO O AEROPISTAS	CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
5	ESPECIALISTA ELECTRICO	OMARGEOVANNI OPAYOME PULIDO	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
6	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3212179758
7	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA GONZALEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3125849024
8	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3163707175
9	RESIDENTE SST	DORA LUCIA PINEDA	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	3213690614
10	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ	imgaingenierosconsorcio@gmail.com	
11	CADENERA	Pendiente aprobación		

5. AVANCES DE OBRA

ACTAS DE SEGUIMIENTO SEMANALES

Se hace referencia a las actas de seguimiento de cantidades de obras ejecutadas del Consorcio TARQUI, donde se evidencia los avances o atrasos que tienen de acuerdo a lo que se ejecuta semanalmente, lo cual debe quedar debidamente justificado en las actas semanales de obra con su Vo. Bo.

INDICADORES DE AVANCE SEMANA 70

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN					
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO					
	Semanal	**Acumulado**		**Semanal**	**Acumulado**
(%) Programado	3,02%	**53,54%**	**(%) Ejecutado**	0,39%	**59,21%**
Valor programado ($)	$115.427.377	**$2.046.319.224**	**Valor ejecutado ($)**	$15.041.124,56	**$2.263.162.828**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	5,67%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 216.843.604,00
OBSERVACIONES					

BALANCE EJECUTADO PRESENTE INFORME No. 70					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO	m2	$ 2.149,00	0,00	$ -
1,2	ROCERIA	Ha	$ 1.004.797,00	2,43	$ 2.441.656,7
1,3	APLICACIÓN DE INSECTICIDA	Ha	$ 235.995,00	2,43	$ 573.467,9
2,1	LIMP.ENCOLES Y DESCOLES	Unidad	$ 57.495,00	0,00	$ -
2,2	LIMPIEZA DE CANALES	m	$ 27.840,00	0,00	$ -
3,2	PINTURA PARA CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA	m2	$ 64.212,00	0,00	$ -
4,3	REPARCHEO MEZCLA FRIA	m3	$ 1,00	0,00	$ -
4,4	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO	ml	$ 6.013,00	2000,00	$ 12.026.000,0
6,1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO	ml	$ 534.498,00	0,00	$ -
6,2	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO	m	$ 10.274,00	0,00	$ -
5,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO	M2	$ 416,00	0,00	$ -
5,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	$ 37.457,00	0,00	$ -
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION SUELO CEMENTO	M3	$ 394.493,00	0,00	$ -
NP 2	DEMOLICIONES	M3	$ 359.306,00	0,00	$ -
NP 3	CONCRETO MR45 - FAST TRACK 24 HORAS	M3	$ 4.207.751,00	0,00	$ -
NP 6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES	Unidad	$ 60.877,00	0,00	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME					**$ 15.041.124,56**
VALOR EJECUTADO INFORMES ANTERIORES					$ 2.248.121.703,89
VALOR EJECUTADO TOTAL					$ 2.263.162.828,00

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas hasta el periodo del informe: Semana 70

- El contratista CONSORCIO TARQUI, continua las actividades correspondientes a:

ITEM	Cant. Semanal 69	Cant. Acumulada	Cant. Contractual	% ejecutado
Localización, Replanteo M2	0,00	43.171,10	50.010,44	86,32%
Rocería Ha	2,43	309,45	324,26	95,43%
Fumigación Ha	2,43	262,29	324,26	80,89%
Limpieza canales Ml	0,00	11.564,61	11.564,61	100,00%
Limpieza encoles y descoles Un	0,00	187,00	200,00	93,50%
Pintura Calles de rodaje y plataforma M2	0,00	130,51	10.114,00	1,29%
Parcheo mezcla fría M3	0,00	0,09	1,00	9,00%
Sello de fisuras en pavimento asfáltico sin ruteo	2000,00	2000,00	2500,00	80,0%
Medición de Coeficiente de rozamiento	0,00	92.520,00	207.899,53	44,50%
Descontaminación por caucho	0,00	16.920,00	16.920,00	100,00%
Limpieza cerramiento perimetral Ml	0,00	52.869,40	56.056,00	94,32%
Instalación de cerramiento Ml	0,00	100,00	100,00	100,00%
Suministro e instalación de suelo cemento	0,00	2,03	84	2,42%
Demoliciones	0,00	12,63	147	8,49%
Suministro e instalación de concreto MR 45 FAST TRACK	0,00	10,95	147	7,45%
Corte de individuos latizales UN	0,00	2028,00	2.028,00	100,00%

Seguridad y salud en el trabajo:

- El personal de consorcio Tarqui cuenta con toda la reglamentación de uso de protección personal e identificación del personal.
- Se ha inspeccionado las herramientas que utilizan y cumplen con el reglamento.
- Se realiza las inducciones correspondientes al personal del consorcio.
- Se verifican las planillas de acuerdo al reporte anterior
- Se realiza verificación de los kits de carreteras y elementos de seguridad en los vehículos

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA QUE SE ADQUIRIO EL COMPROMISO	FECHA PARA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y OBSERVACIONES
1	Entrega planos de levantamiento de redes secas	CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	5 JUNIO 2026	Se adquirió el compromiso por parte del contratista a entregar los planos actualizados de las redes secas
2	Reajuste contratos de obra e Interventoría	Supervisión	29 MAYO 2026	5 JUNIO 2026	Pronunciamiento sobre la entrega de reajuste, para inicio de proceso de modificatorio
3	Buscar alternativa de Intervención bache pista por temas de nuevo cierre	CONSORCIO TARQUI	29 MAYO 2026	5 JUNIO 2026	Consorcio Tarqui a través de su especialista, buscará alternativa de solución de bache en pista, la cual será cotejada por el especialista de Interventoría

V. FIRMAS:

Para constancia se firma en las ciudades de **Leticia y Bogotá D.C** a los 19 días del mes de junioo del año **2026**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial y virtual.

COMITÉ SEMANAL No. 56 CONTRATO DE OBRA, No. 24001241 H4 DE 2024 LADO AIRE Y DE INTERVENTORIA 24001242 H3 DE 2024		
Nombre completo	**Cargo**	**Firma**
MARÍA CONSUELO DURÁN CARO	SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ CORONADO	APOYO A SUPERVISION	
JULIO CHAPARRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
HERNAN VILLAMIL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LA	
ANDRES HENAO	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TARQUI	
FABIAN PINEDO WALDRON	RESIDENTE DE OBRA	

ANEXO 3. LIBRO DE OBRA.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

Lunes 01/06/2026

* Personal de Obra: 1 Director, 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SSST, 5 ayudantes, 1 conductor.
* Personal de La Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional Area SST.
* Equipo de Obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta Menor.
* Actividades realizadas: Se continuo con La Rocería y Limpieza Manual en el Sector 56 de acuerdo al plano de La Rocería y Fumigación.
* Estado del Tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde las 3:15 pm a 4:00 p.m

Yhobian Pinedo
Ingeniero Residente de Obra

Residente Interventoria

Martes 02/06/2026

* Personal de obra: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional S.S.T, 5 ayudantes, 1 conductor.
* Personal de La Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional Area S.S.T.
* Equipo de Obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta Manor.
- Actividades realizadas: Se continuo con La rocaria y Limpieza Manual en el Sector 56 de acuerdo al plano de La Rocería y Fumigación.
* Estado del Tiempo: Se presentaron fuertes lluvias en horas de La mañana y en horas de La Tarde Sumando 1 hora de Trabajo perdida.

Yhobian Pinedo
Ingeniero residente de Obra.

Residente Interventoria

Miercoles 03/06/2026

*Personal de obra: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional S.S.T, 5 ayudantes, 1 conductor.

* personal de La Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero Residente, 1 profesional Area SST

* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta Menor.

-Actividades realizadas: Se continuo con La recolla y Limpieza manual en el Sector 64 (Area de La Torre de control), e Insecticida Oxyunia

*Estado del Tiempo: Dia Soleado

Fabian Pinedo W

Ingeniero Residente de obra

Nota: Adicional del dia 03/06/2026, El contratista de obra realizo el borrado de Las X en La calle de Rodaje ALPHA con Pintura Gris, ademas Tambien Pinto La Linea Amarilla central en esta misma calle de Rodaje.

Fabian Pinedo W

Ingeniero Residente de obra.

Jueves 04/06/2026

*Personal de La Obra: 1 Ingeniero Residente, 1 director, 1 profesional Area S.S.T, 5 ayudantes, 1 conductor.

* personal de La Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional Area SST

* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 fumigador, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta Menor.

Scanned with CamScanner

- Actividades realizadas: Se trabajo en Rocería y Limpieza manual (incluyendo La disposición final), así como tambien La aplicación de insecticida organico en el Sector 62.
- Se realizo el Secado de Arena La cual sera utilizada en el sello de Fisuras en La Calle antigua ALPHA.

*Estado del Tiempo: Dia Soleado, No se presentaron lluvias durante La Jornada.

Fabian Pinedo
Ingeniero Residente de Obra.

Raiver Mendoza

Viernes 05/06/2026

* Personal de La obra: Ingeniero residente, 1 director, 1 profesional SST, 5 ayudantes, 1 conductor.
* personal de La Intervantaria: 1 Director, Ingeniero residente, 1 Profesional Area SST.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 Camioneta, 1 Herramienta Menor.

- Actividades realizadas: Se Termino La roceria y Limpieza manual en el area 56 (pendiente por Terminar, y se adelanto el 50% en el Area 57, Asi mismo de aplico insecticida en estas areas.
- El dia de hoy se Terminaron de definir Las 30 placas a Remplazar en el area Sur occidente de La plataforma, Las cuales se encuentran en mal estado, ademas se Les hizo La marcación con aerosol de Las placas. Dicha actividad fue realizada en conjunto con el residente de La Intervantoria.

* Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Fabian Pinedo
Ingeniero Residente Obra

Residente Interventoría

Sabado 06/06/2026

* Personal de Obra: 1 Director, 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional Area SST, 1 conductor, 5 ayudantes.
* Personal de La Interventoría: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional SST.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta Menor.

- Actividades realizadas: Se continuo con La rocería y Limpieza manual en el Sector 57, completandose un 80%, al igual se realizo La Aplicación de insecticida organico en dicho Sector.
- Se continuo con el Secado de Arena para el Sello de Fisuras de La calle de Rodaje Alpha (antigua).

* Estado del Tiempo: Dia soleado, durante La Jornada de Trabajo no Se presentaron lluvias.

Fabian Pinedo
Ingeniero residente de Obra.

Residente Interventoría

Domingo 07/06/2026

* NO Se realizaron actividades este dia.

Fabian Pinedo
Ingeniero residente de obra.

Residente Interventoría

Lunes 08/06/2026 (Festivo)

* NO Se realizaron actividades este dia.

Fabian Pinedo

Martes 09/06/2026

* Personal de obra: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 Profesional Area SST, 1 conductor, 5 ayudantes.
* Personal de interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 Profesional Area S.S.T.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta Menor.

- Actividades realizadas: Se Termino con La rocería y La limpieza manual en el sector 57 completandose el 100% de este Sector., asi mismo se le realizo La fumigación con insecticida organico en dicho sector.

* Estado del Tiempo: Se presentaron intensas lluvias de 7:00 am a 10:30 am, Dia humedo no se pudo realizar La actividad del sello de fisuras por lluvias. Se realizo Comite de obra.

Fabian Pinedo M
Ingeniero Residente de Obra.

Residente Interventoria

Miercoles 10/06/2026

* Personal de Obra: 1 Director de obra, 1 Ingeniero residente, 1 Profesional S.S.T, 1 conductor, 5 ayudantes.
* Personal de la Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 Profesional S.S.T.
* Equipo de Obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta Menor.

- Actividades realizadas: Se inicio La rocería en el area 68, Lograndose realizar un 70% a pesar de Las fuertes lluvias presentadas el dia de hoy.

* Estado del Tiempo: Se Presentaron fuertes lluvias en La mañana del dia

de hoy, dia humedo por lo tanto no se pudo realizar el sello de juntas en la calle antigua de rodadero alpha.

Fabian Pinedo — Ingeniero Residente de Obra. — Revisó interventoría

Jueves 11/06/2026

* Personal de obra: 1 Director de obra, 1 Ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 conductor 5 obreros.
* personal de Interventoría: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 profesional Area SST.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 Taladro, 1 Herramienta Menor.
- Actividades realizadas: Se continuo con la rocería y Limpieza manual en el Sector 68 Terminandose el 90% de La Actividad, asi mismo se Aplico Fumigación en el mismo Sector.
- Se Trabajo en el Sello de Fisuras en La calle de Rodadero Alpha, Antigua, realizandose el 50% de La actividad.
* Estado del Tiempo: Dia Soleado

Fabian Pinedo — Ingeniero residente de obra. — Revisó Interventoría.

Viernes 12/06/2026

* Personal de La obra: 1 Director de obra, 1 Ingeniero residente, 1 profesional Area SST 1 conductor, 5 obreros
* Personal de La Interventoria: 1 Director, 1 In-

Ingeniero residente de Obra. (Interventoria)

*Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora 1 motosierra, 1 camioneta, 1 Luminaria, Herramienta menor.

- Actividades realizadas: Se continuo con la rocería y Limpieza manual en el Sector 68 Completandose al 100% de la actividad, asi mismo se realizo la Aplicación de insecticida organico en ese mismo Sector.
- Se inicio la Rocería y Limpieza manual en el Sector 67, al igual que la aplicación de la Insecticida Organico, completandose de esas actividades el 20% en dicho Sector.
- Se Trabajo en el sello de Fisuras en la calle de Rodaje Alpha Vieja, Terminandose el 100% del Sello de Fisuras.
- Estado del Tiempo: parcialmente nublado y Leves lluvias que no afectaron la actividad.

Yabian Pinedo
Ingeniero Residente de Obra

NA
Tercera intervencion

Sabado 13/06/2026

*Personal de obra: 1 Director de obra, 1 Ingeniero residente, 1 profesional S.S.T, 1 conductor, 5 obreros.

*Personal de Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero residente.

*Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 Luminaria, Herramienta Menor.

- Actividades realizadas: Se continua con la rocería y Limpieza manual en el Sector 67, al igual que la aplicación del insecticida

organico, completandose el 40% de la actividad
- se realizo la limpieza de la Arena y Sucedad en la calle de Rodaze producto de la actividad de sello de Fisuras en dicha calle de Rodaze Alpha antigua.
* Estado del Tiempo: parcialmente nublado y presencia de lloviznas que no afectaron las actividades realizadas.

Fabian Pinedo
Ingeniero Fabian Pinedo — Residente Interventoria

Domingo 14/06/2026
Este día no se Ejecutaron actividades.

Fabian Pinedo
Residente Interventoria

Lunes 15/06/2026
Este dia no se Ejecutaron actividades, solo se Tinbuzo en la puesta en marcha de las Luces de la calle de Rodaze Alpha antigua y se cerro la calle Bravo con maletines y Balizas.

Fabian Pinedo
Ingeniero Residente de obra. — Residente Interventoria

Martes 16/06/2026
* Personal de obra: 1 Director de obra, 1 Ingeniero residente, 1 profesional SST, 5 obreros 1 conductor.
* personal de la Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero Residente.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadaña, 1

Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 Luminaria Herramienta Menor.

- Actividades Realizadas: se continuo con La Limpieza manual y Roleria en el Sector 67 completandose el 75% del sector.
- Se realizo La correccion en el sello de Fisuras en algunos puntos donde estaba muy espesa y Gruesa La capa, aplicando las asfalto en esos Sectores.

* Estado del Tiempo: No se presentaron lluvias Durante La jornada.

Fabian Pinedo
Ingeniero Residente Obra

Marcela interventora

Miercoles 17/06/2026

* Personal de obra: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 Profesional area SST, 5 obreros, 1 conductor.
* Personal de La interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero residente.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 Luminaria Herramienta Menor.

- Actividades realizadas: se continua con La Limpieza y Roleria en el Sector 67 completandose el 90% de La actividad
- Se termino de afinar el Sello de Fisuras en La calle de Rodaje, Retirando el exceso de Emulsion en algunos Sitios (puntuales).
- Se realiza parte de La medicion de Las Fisuras (Sello) en La calle de Rodaje Alpha.

*Estado del Tiempo: soleado

organico completandose

Fabian Pinedo
Inse. Residente obra.

Jueves 18/06/2026

* personal de obra: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional SST, 5 obreros, 1 conductor.
* personal de la Interventoria: 1 Director, 1 Ingeniero residente.
* Equipo de obra: 1 EPS, 3 Guadañas, 1 fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta menor.

- Actividades realizadas: Se termino la rocería en el Sector 67, completando el 100%, asi mismo se realizo la fumigación total en ese mismo Sector
- Se realizó Limpieza de la malla de cerramiento en partes de zona de carga realizandose 386,09 ml.
- Se realiza parte (continuacion) de la medición en el sitio de las Fisuras salientes en la calle de Rodaje Alpha antigua.

* Estado del Tiempo: Soleado

Fabian Pinedo
Ingeniero Residente Obra.

Viernes 19/06/2026

* personal de obra: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional S.S.T, 5 obreros 1 conductor.
* personal de la Interventoria: 1 Director,

1 Ingeniera Residente.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, Herramienta manor
* Equipo de Obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 Camioneta, Herramienta Menor
- Actividades realizadas: Se realizo limpieza de malla de cerramiento en el costado sur de la cabecera 21, con un total de 278,85, se termino de completar La Roceria y Limpieza manual que estaba pendiente de completar en el sector 62 y Sector 68, al igual que la fumigación en estos SITIOS.
* Estado del Tiempo: se presentaron lluvias de 1:00pm a 3:00pm (fuertes lluvias).
* Se realizo comite de obra con La Interventoria y Funcionarios de La Aeronautica civil. Se realiza comite.

Fabian Pinedo
Ingeniero residente de Obra.

Sabado 20/06/2026
* Personal de Obra: 1 Director, 1 Ingeniero residente, Profesional area SST. 5 obreros, 1 conductor.
* Personal de la Interventoria, 1 Director, 1 Ingeniero residente.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumisadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 Volqueta, 1 Bocoto, 1 cortadora para pavimento, Herramienta Manor.

- Actividades realizadas: se realizo La limpieza de La malla de cerramiento en La malla oriental vecina a La Torre y oficina de Los Técnicos hasta La puerta del Lince 344.94 mL.
- Se empieza Los Trabajos para La reposición de placas en La plataforma (placas de concreto) en el sector oriental calle de rodaje Alpha, Se realizaron Las actividades de señalización con malLetinos y Se inicio el corte de Las Losas para su posterior demoLicion.
- Se continuo con La medición de Las Fisuras en La calle de rodaje Alpha Antigua
*ESTado del tiempo: Se presentaron lluvias en horas de La Tarde lo que impidio seguir realizando Las Labores en horas de La Tarde.

Fabian Pinedo
Ingeniero de Obra.

Lunes 22/06/2026
*Personal de obra: 1 Director de obra, 1 Ingeniero residente, 1 Profesional SST, 5 obreros, 1 conductor.
* personal de la Interventoria: 1 Director 1 Ingeniero residente
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Gradañas, 1 Fresadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 cortadora de concreto, Herramienta menor.
- Actividades realizadas: Se realizo La limpieza de La malla de cerramiento

desde La puerta de Lince hacia el Norte en una extensión de 477,12 mL.
- Se continua con el corte de Losas de pavimento en La plataforma del aeropuerto, actividad previa a La Demolición de placas. Se continua con La medición de Las fisuras a Las cuales se Les realizo un sello en La calle de Rodaje Alpha Antigua.
* Estado del Tiempo: Soleado.

Fabian Pinedo W
Ingeniero residente de obra.

Rendel Interventoría

Martes 23/06/2026
* Personal de obra: 1 Director de obra, 1 Ingeniero residente, 1 Profesional SST, 5 obreros, 1 conductor.
* Personal de la interventoria; 1 Director, 1 Ingeniero residente.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 Camioneta, 1 cortadora de concreto.
- Actividades realizadas: Se realiza La Limpieza de seis descoles pendientes por hacer en las ordenes de Trabajo emitidas por La Interventoria para el mes de Junio de 2026
- Se Continúa con el corte de pavimento para La demolición de Las placas de La plataforma ubicadas en el Sector oriental de La calle de Rodaje Bravo.
- Se continua con La medición del sello de Fisuras en La calle de Rodaje Alpha.
* Estado del Tiempo: Dia soleado.

Fabian Pinedo W
Ingeniero Residente de obra

Rendel Interventoría

Miercoles 124-06-2026

* personal de obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 profesional SST 5 obreros, 1 conductor,
* personal de La Interventoria: 1 Director de interventoria, 1 Residente de Interventoria.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 cortadora de concreto

- Actividades realizadas: Se realiza La Limpieza de un canal anexo al hangar del contratista Z, Se realiza Tambien en el Canal por el costado izquierdo de La pista, donde resurgian unos pocos, actividad solicitada por el ingeniero Ambiental
- Se continua con el corte de Las Fisuras (Juntas de dilatación) para La demolición de Las placas de La plataforma del Aeropuerto
- Se continua con La medición de Las Fisuras en La Calle de Rodaje Alpha, actividad que no se ha podido realizar de forma continua, por La tanta operación de Las aeronaves en este aeropuerto.
* Estado del Tiempo: Se presentaron fuertes lluvias en horas de La tarde de 2:00 pm a 3:40 pm.

Fabian Pinedo
Ingeniero residente obra.

Ronald Interventor

Jueves 25-06/2026

* Personal de obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 profesional Area SST 5 obreros, 1 conductor.
* Personal de la Interventoria: 1 Director de Interventoria, 1 Residente de Interventoria.
* Equipo de obra: 1 Gps, 3 Gradañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 cortadora de concreto.

- Actividades realizadas: Se realiza Recova en areas Aledañas al Hangar donde se almacenan Los materiales del Consorcio Targui y Zeta.
- Se Termino con La medición de Fisuras en La calle de Rodaje Alpha Antigua.

* Estado del Tiempo: No se presentaron lluvias.

Fabian Pinedo
Inspector Residente Obra.

Vienes 26/06/2026

* personal de obra: 1 director de obra, 1 residente de Obra, 1 profesional Area SST, 1 conductor.
* Personal de La Interventoria: 1 Director de Interventoria, 1 Residente de Interventoria.
* Equipo de obra: 1 Gps, 3 Gradañas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 camioneta, 1 cortadora de concreto.

- Actividades realizadas: Se Trabaja en Los informes mensualos y Semanales.

NOTA1: El Consorcio Targui reporta un avance fisico Superior al 95% en el

frente de mantenimiento (Cocinas, Limpieza y cerramientos). Para optimizar los recursos en esta fase de cierre y Garantizar la sostenibilidad financiera, se programaron Vacaciones del personal para los días 26, 27 y 30 de junio y del 1 al 8 de julio de 2026, Seguidas de una Suspensión Contractual por Terminación de etapa del 9 al 12 de julio de 2026. El 5% de la obra remanente se ejecutara entre el 13 y el 31 de 2026. Tiempo Suficiente para culminar las actividades pendientes con proyección anticipada sin afectar la calidad del Cronograma General

NOTA 2: Por medio del OFICIO Nº 448-2026 el Consorcio Targui remite la documentación Legal y ambiental del proveedor que Suministrara Concreto Estructural MR-45 al Consorcio Targui para las obras de mejoramiento de la antigua plataforma del Aeropuerto Vasquez Cobo del Municipio de Leticia y para las demas requeridas como parte del cumplimiento del objeto del contrato de obra en referencia Nº 240012 41 H4 de 2024. El proveedor Seleccionado corresponde a la empresa Grupo AQ S.A.S identificada con NIT 900.406.385-9, quien realiza la importación del material petreo procedente del vecino país de Brasil, para su respectiva comercialización y producción.

NOTA 3: El consorcio Targui en conjunto con el Grupo AQ S.AS. esta realizando verificaciones del diseño de la Mezcla

del MR-45, mediante La Toma de Vigas para observar Las resistencias de Los concretos a producir por el grupo ACQ S.A.S.
* estado del Tiempo: Soleado

Fabian Pinedo
Ingeniero residente Obra.

Residente de Interventoria

Sabado 27/06/2026
* personal de obra: 1 Director, 1 Ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 conductor.
* personal de Interventoria: 1 Director de Interventoria, 1 Residente Interventoria.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Gruadtas, 1 Fumigadora, 1 motosierra, 1 Camioneta, 1 cortadora de concreto.
- Actividades realizadas: Se Trabaja en Los informes mensuales y Semanales. Se reporta un avance Fisico superior al 95% en el frente de mantenimiento (rocaria, Limpieza de Cerramiento y Fumigacion) para optimizar Los recursos en esta Fase y Garantizar La Sostenibilidad Financiera, se Programaron Vacaciones del personal para Los dias 26, 27 y 30 de Junio y del 1 al 8 Julio de 2026, Seguidas de una Suspansión contractual por Terminación de etapa del 9 al 12 de Julio 2026, el 5% de La obra romanente se ejecutara entre el 13 al 31 de julio de 2026, Tiempo suficiente para Terminar Las actividades pendientes con proyección anticipada sin afectar el cronograma general.

NOTA 2: Se repite o aplica La misma NOTA2 de La pagina 120 de esta BITACORA, con respecto a La actividad del mantenimiento de Losas de La plataforma.
NOTA 3; aplica La misma NOTA3 de La pagina 120 y 121 de esta BITACORA.
*Estado del Tiempo: NO se presentaron lluvias

Fabian Pinedo
Residente de obra.

Residente Interventoria

Domingo 28/06/2026
* No se Laboro

Fabian Pinedo
Residente de obra

Residente Interventoria

Lunes 29/06/2026 (FESTIVO)
* No se ~~Laboro~~

Fabian Pinedo

Residente interventoria

Martes 30/06/2026
* personal de obra: 1 Director de obra, 1 residente de obra, (1 auxiliar) profesional area SST, 1 conductor
* Personal de Interventoria: 1 Director de Interventoria, 1 residente de Interventoria.
* Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 motosierra, 1 fumigadora, 1 camioneta, 1 cortadora de concreto.
- Actividades realizadas: Se trabaja en Los informes mensuales y Semanales

NOTA 1, aplica La misma NOTA 1 de La pagina 119 de esta Bitacora.
NOTA 2, aplica La misma NOTA 2 de La pagina 120 de esta Bitacora.
NOTA 3, aplica La misma NOTA 3 de La pagina 120 de esta Bitacora.
*Estado del Tiempo: Se Presentaron lluvias en horas de La mañana y en horas de La Tarde

Fabian Pinedo
Residente de Obra

Residente de Interventoria

Miercoles 01/07/2026
* personal de obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 Profesional área SST, 1 conductor.
* personal de La Interventoria: 1 Director de interventoria, 1 Residente de interventoria.
*Equipo de obra: 1 GPS, 3 Guadañas, 1 motosierra, 1 Fumigadora, 1 camioneta, 1 cortadora de concreto
- Actividades realizadas: Se Trabaja en los informes Semanales, mensuales, y en los documentos Tecnicos y Legales para La Solicitud de Adicion y prorroga del contrato.
Siguen aplicando Las NOTAS 1 de La pagina 119 y NOTA 2 y NOTA 3 de la pagina 120 de La Presente Bitacora de obra.
* Estado del Tiempo: Soleado, Sin embargo se Presentaron llovizna en hora de La mañana.

Fabian Pinedo
Residente de obra.

ANEXO 4. ORDENES DE TRABAJO.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS	
AEROPUERTO VASQUEZ COBO	
LETICIA - AMAZONAS	
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024	
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	078	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	1.1. LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)		
SECTOR A INTERVENR	DONDE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES DE: • Rocería Y Limpieza Manual. • Suministro Y Aplicación De Insecticida Orgánico – Fumigación • Limpieza Manual De Encoles Y/O Descoles Y/O Disipadores Y/O Cámaras Y/O Alcantarillas Y/O Cajas De Inspección Y/O Pozos Y/O Box Coulvert. • Medición De Coeficiente De Rozamiento Incluye Movilización Del Equipo, Personal Y Análisis Del Informe. • Descontaminación Por Caucho Con Hidrolavado. • Suministro E Instalación De Cerramiento • Limpieza De Cercas Y/O Malla De Cerramiento Con Ancho Aferente De 1 Ml Con Equipo Manual Y/O mecánico		
EQUIPO A UTILIZAR	EQUIPO TOPOGRÁFICO (NIVEL DE PRECISIÓN, ESTACIÓN TOTAL, PLOMADAS, TRIPODES, ETC) • DURMIENTE ORDINARIO 0.04 X 0.04MT • ESTACAS CLAVOS Y DEMÁS ELEMENTOS • PUNTILLA COMÚN		
CANTIDAD	PARA ESTE PERIODO LA CANTIDAD DE LOCALIZACION SERA CERO (0) LA CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR SE DEJA PARA EL PERIODO FINAL DE LAS OBRAS		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	ESTE ITEM TIENE AVANCE DE ACUERDO AL ACUERDO ENTRE LOS DIRECTORES DE OBRA E INTERVENTORIA QUE PERMITE ADELANTAR LAS TAREAS DE ACUERDO AL % EJECUTADO Y AL MODIFICATORIO No. 2 APROBADO POR LA ENTIDAD A MEDIADOS DE MAYO		

	
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	079	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	1.2. ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)		
SECTOR A INTERVENR	Consiste en las labores de mantenimiento relacionadas con la limpieza de maleza, deshierbe y rocería del terreno mediante corte del césped de las zonas verdes de las franjas de seguridad de pista, cabeceras, calles de rodaje, plataformas y demás predios a cargo de la Aeronáutica Civil, con el fin de garantizar la altura máxima aceptable del prado de 10 -12 cm, y a dos (2) metros a cada lado del cerramiento perimetral. Incluye el retiro del material vegetal, el mismo día de corte y su disposición final. El sector a intervenir será el resultado de la visita de obra un día anterior de hacer la actividad, esta visita se hará en conjunto entre contratista e interventoría donde se verificaran las zonas donde se es necesario realizar la actividad		
EQUIPO A UTILIZAR	• Guadañadora. • Herramienta menor. • Vehículo de retiro material.		
CANTIDAD	10,79 HA		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS
AEROPUERTO VASQUEZ COBO
LETICIA - AMAZONAS
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	080	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	1.3. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION		
SECTOR A INTERVENIR	Consiste en las labores de mantenimiento relacionadas con Realizar fumigación con repelente orgánico una vez se haya realizado la rocería y limpieza, las zonas a intervenir son las mismas zonas donde se realizara el ítem 1.2. ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)		
EQUIPO A UTILIZAR	• Vehículo de transporte de materiales • Herramienta menor. • Fumigadora • Insecticida Repelente orgánico • Agua		
CANTIDAD	10,79 HA		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		





FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	081	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	2.1. LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)		
SECTOR A INTERVENIR	La limpieza y reacondicionamiento de la sección hidráulica de encoles, descoles, disipadores, cámaras, alcantarillas, cajas de inspección, pozos y box coulverts revestidos y no revestidos. El sector a intervenir sera el resultado de la visita de obra un dia anterior de hacer la actividad, esta visita se hara en conjunto entre contratista e interventoria donde se verificaran las zonas donde se es necesario realizar la actividad		
EQUIPO A UTILIZAR	• Vehículo de transporte de materiales • Herramienta menor		
CANTIDAD	6,0 UN		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	082	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	2,2 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)		
SECTOR A INTERVENIR	Realizar la limpieza de las redes (tuberías y box culvert) y estructuras del sistema de alcantarillado tales como sumideros, cámaras de inspección, acometidas, cajas y toda tubería superior a 3 pulgadas de diámetro que se encuentren taponadas completa o parcialmente, esto con el ánimo de permitir el adecuado flujo de agua por los sistemas de drenaje pluvial evitando reboses u obstrucciones. El sector a intervenir sera el resultado de la visita de obra un dia anterior de hacer la actividad, esta visita se hara en conjunto entre contratista e interventoria donde se verificaran las zonas donde se es necesario realizar la actividad		
EQUIPO A UTILIZAR	• Vehículo de transporte de materiales • Herramienta menor.		
CANTIDAD	0,0 UN (ESTE ITEM YA NO TIENE CANTIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR, ESTO SE DEBE A QUE EN EL BALANCE DEL MODIFICATORIO SE AJUSTARON UNAS CANTIDADES PERO NO FUERON SUFICIENTES PARA CONTINUAR CONSTANTEMENTE CON LA ACTIVIDAD)		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS

AEROPUERTO VASQUEZ COBO

LETICIA - AMAZONAS

CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024

REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	083	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS		
SECTOR A INTERVENIR	Esta actividad consiste en la aplicación de pintura 620-2.2 en pistas, calles de rodaje y plataformas y demás áreas donde se requiera con la aplicación de microesferas que cumplan con la norma correspondiente, para mejorar la visibilidad diurna y nocturna de acuerdo con las dimensiones y colores que establezca el Interventor.		
EQUIPO A UTILIZAR	- Herramienta menor - Camioneta D-300 o similar - Equipo para pintura (Compresor), Presión máxima de trabajo 3300 psi. - Iluminación - Compresor (barrido y soplado)		
CANTIDAD	3974,00 ML		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		





FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	084	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	3.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS		
SECTOR A INTERVENIR	Esta actividad consiste en la aplicación de pintura 620-2.2 en pistas, calles de rodaje y plataformas y demás áreas donde se requiera con la aplicación de microesferas que cumplan con la norma correspondiente, para mejorar la visibilidad diurna y nocturna de acuerdo con las dimensiones y colores que establezca el Interventor. Aplicación de pintura con microesfera a la señalización horizontal de pista, calles de rodaje, plataforma y demás áreas que requieran señalización horizontal en el aeropuerto, para mantener una buena información en las áreas de movimiento o circulación.		
EQUIPO A UTILIZAR	- Microesfera reflectiva, (perlas de vidrio - Pintura tipo tráfico de demarcación. - Disolvente ordenado o aceptado en la norma (en calles de rodaje y pista no se usarán solventes como thinner). - Imprimante - Herramienta menor - Camioneta D-300 o similar - Equipo de Pintura - Iluminación		
CANTIDAD	2528,50 ML		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS	
AEROPUERTO VASQUEZ COBO	
LETICIA - AMAZONAS	
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024	
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	072	FECHA SOLICITUD	30/04/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/05/2026	FECHA PREVISTA FIN	31/05/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	4.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)		
SECTOR A INTERVENIR	Realizar el sello de fisuras en pavimento asfáltico sin ruteo, en las zonas que se requiera.		
EQUIPO A UTILIZAR	- Herramienta menor - Compresor - Planta eléctrica - Emulsión (CRR-2) especificación INVIAS 466-13		
CANTIDAD	2500,00 ML		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Es responsabilidad del Constructor la conservación del sello de grietas hasta que el trabajo sea recibido a satisfacción por el Interventor.		
	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		

	
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS

AEROPUERTO VASQUEZ COBO

LETICIA - AMAZONAS

CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024

REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	085	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	6.2. LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 ml CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)
SECTOR A INTERVENIR	Consiste en realizar las labores de mantenimiento relacionadas con la limpieza de residuos y maleza, deshierbe y rocería de las cercas y cerramientos del aeropuerto, con el fin de mantener en optimo estado las condiciones físicas de las cercas y del cerramiento perimetral. Esta actividad incluye la poda y el retiro de los residuos vegetales, basuras y montículos de cualquier tipo de material ubicados hasta a un metro a lado y lado de estos cerramientos. El retiro y la disposición final del material vegetal se deberá realizar el mismo día que se realice el corte. El sector a intervenir sera el resultado de la visita de obra un dia anterior de hacer la actividad, esta visita se hara en conjunto entre contratista e interventoria donde se verificaran las zonas donde se es necesario realizar la actividad
EQUIPO A UTILIZAR	- Podadora de Altura - Guadañadora. - Herramienta menor. - Vehículo de retiro material.
CANTIDAD	1489,00 ML
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.





FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS
AEROPUERTO VASQUEZ COBO
LETICIA - AMAZONAS
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	086	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	NP-1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)		
SECTOR A INTERVENIR	Consiste en la excavación, retiro y disposición final del material existente, el suministro, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados establecidos por la Interventoría.		
EQUIPO A UTILIZAR	- Herramienta menor - Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 25 - Retrocargador - Compactador de rodillo - Torre de iluminación		
CANTIDAD	84,00 M3		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		





FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	087	FECHA SOLICITUD	29/05/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/06/2026	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	NP-2. DEMOLICIÓN VARIAS (PAVIMENTOS, SUELO CEMENTO)		
SECTOR A INTERVENIR	Se realiza un corte preciso del perímetro de la zona a demoler, siguiendo alineaciones rectas y con una profundidad mínima especificada para minimizar daños a estructuras adyacentes. Consultar y cumplir todas las normas para disposición de escombros establecidos por la entidad correspondiente. Realizar la demolición manualmente o con el equipo mecánico. Cortar acero de refuerzo si existe. Adecuar zonas de demolición para iniciar el proceso constructivo. Retirar sobrantes y escombros. Transportar material de desecho a los lugares dispuestos para ello.		
EQUIPO A UTILIZAR	Herramienta menor (10% M.O.) Compresor Retrocargador Luminaria Volqueta sencilla 7 m3		
CANTIDAD	147,00 M3		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AEROPUERTO VASQUEZ COBO	
LETICIA - AMAZONAS	
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024	
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	

NO. ORDEN DE TRABAJO	088	FECHA SOLICITUD	30/04/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/05/2026	FECHA PREVISTA FIN	31/05/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	NP3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA INCLUYE BARRAS DE TRANSFERENCIA		
SECTOR A INTERVENIR	• La formaleta como en todos los concretos estructurales a la vista será construida, en maderas de primera calidad, en espesores adecuados, cepilladas y canteadas, o con formaletas metálicas en adecuado estado de conservación que garanticen un acabado a la vista; deben tener rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes del vaciado se encuentran limpias, recubiertas con algún producto desencofrarte, rectas y firmemente aseguradas y apuntaladas. antes del vaciado y durante él, debe verificarse la orientación de sus caras, el plomado o verticalidad de los elementos y su posición con respecto a los ejes estructurales, los que el contratista habrá cimbrado previamente para su revisión. • Se utilizará concreto con resistencia a la flexión (MR) de 45, la mezcla será acelerada obteniendo resistencias del 90% a las 24 horas del suministro e instalación • Se requieren ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a la compresión y a la flexión del concreto. toma de vigas		
EQUIPO A UTILIZAR	- Herramienta menor. - Aspersor manual de 20 litros - Compresor (barrido y soplado) - Cortadora de pavimento - Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico. - Regla vibratoria de concreto / codal de 9 ml. - Vibrador de concreto - Torre de iluminación - Barras de transferencia - Barras de unión - Sello de poliuretano en cinta - Sello de silicona o sellador autonivelante. - Emulsión acuosa de parafina para curado de concreto - Concreto hidráulico para pavimento MR-45 Acelerado a 24 horas.C21		
CANTIDAD	147,0 M3		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Es responsabilidad del Constructor la conservación del CONCRETO hasta que el trabajo sea recibido a satisfacción por el Interventor.		
	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	075	FECHA SOLICITUD	30/04/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/05/2026	FECHA PREVISTA FIN	31/05/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	NP4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA		
SECTOR A INTERVENIR	El suministro de concreto enmarcado dentro de esta actividad solo puede corresponder a las actividades que se adelantan en la pista, plataformas y calles de rodaje del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo Bajo ningún concepto, el Contratista procederá a ejecutar tareas de reparación o mantenimiento sin contar con la previa autorización por escrito de la Interventoría.		
EQUIPO A UTILIZAR	- Herramienta menor. - Aspersor manual de 20 litros - Compresor (barrido y soplado) - Cortadora de pavimento - Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico - Regla vibratoria de concreto - Vibrador de concreto - Torre de iluminación - Barras de transferencia - Barras de unión - Sello de poliuretano en cinta - Sello de silicona o sellador autonivelante. - Emulsión acuosa de parafina para curado de concreto - Concreto hidráulico para pavimento.		
CANTIDAD	7,0 M3		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Es responsabilidad del Constructor la conservación del CONCRETO hasta que el trabajo sea recibido a satisfacción por el Interventor. DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		
			
FIRMA CONTRATISTA		FIRMA INTERVENTORIA	
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO		NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO	

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS
AEROPUERTO VASQUEZ COBO
LETICIA - AMAZONAS
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	076	FECHA SOLICITUD	30/04/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/05/2026	FECHA PREVISTA FIN	31/05/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	NP5. SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA		
SECTOR A INTERVENIR	El suministro del acero enmarcado dentro de esta actividad solo puede corresponder a las actividades que se adelantan en la pista del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo Bajo ningún concepto, el Contratista procederá a ejecutar tareas de reparación o mantenimiento sin contar con la previa autorización por escrito de la Interventoría.		
EQUIPO A UTILIZAR	- Herramienta menor. - Barras de transferencia - Barras de unión - Tronzadora - Segueta		
CANTIDAD	1115,0 KG		
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Es responsabilidad del Constructor la conservación del CONCRETO hasta que el trabajo sea recibido a satisfacción por el Interventor.		
	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.		





FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ORDEN DE TRABAJO

IMGA INGENIEROS

AEROPUERTO VASQUEZ COBO

LETICIA - AMAZONAS

CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024

REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	089	FECHA SOLICITUD	30/04/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI	CONTRATO	24001241 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3112115677	CORREO ELECTRONICO	consorciotarquileticia@hotmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JAIME ANDRES HENAO MELO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR LADO AIRE
FECHA PREVISTA INICIO	1/05/2026	FECHA PREVISTA FIN	31/05/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	JULIO ROBERTO CHAPARRO	CARGO RESPONSABLE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	NP 6 - CORTE DE INDIVUOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN
SECTOR A INTERVENIR	El sector a intervenir será el resultado de la visita de obra un día anterior de hacer la actividad, esta visita se hará en conjunto entre contratista e interventoría donde se verificaran las zonas donde se es necesario realizar la actividad Cortar con una motosierra de espada que permita cortar y picar los latizales que superen los 5 cm de DAP hasta 9 cm DAP. En cuanto a las clases diamétricas más pequeñas, se utilizarán herramientas menores como el machete y las guadañas para reducir aún más el tamaño del material (tallos, hojas, etc.), con el objetivo de que estos se desintegren naturalmente con el tiempo en el mismo sector. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Transportar material de desecho a los lugares dispuestos para ello.
EQUIPO A UTILIZAR	- Herramienta menor (machetes, lonas, limas) - (10% M.O.) - Motocierra - Guadaña - Volqueta sencilla 7 m3
CANTIDAD	1551,00 UN
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA INCLUIDA EN EL MODIFICATORIO NO. 2 A MEDIADOS DEL MES DE MAYO SE DEBE HACER LA ACTIVIDAD, SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE LA CANTIDAD A EJECUTAR SON LAS APROBADAS EN LAS ORDENES DE TRABAJO, EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS PODRÍA DESBALANCEAR EL CONTRATO.





FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JAIME ANDRES HENAO MELO	NOMBRE: JULIO ROBERTO CHAPARRO

ANEXO 5. INFORMES SEMANALES

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 08/MARZO/2020	Página: 1 de 5

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	6 de junio de 2026
Semana No.	69	**Del :**	30 de mayo de 2026	**al**	5 de junio de 2026
Plazo total		534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		479	días	**Tiempo restante**	55 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		89,70%			
Nombre del Supervisor :		MARIA CONSUELO DURAN CARO			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,53%	**50,52%**	**(%) Ejecutado**	0,14%	**58,82%**
Valor programado ($)	$20.439.881	**$1.930.891.847**	**Valor ejecutado ($)**	$5.372.629,36	**$2.248.121.704**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	**8,30%**
				Valor Adelanto/Atraso	**$ 317.229.857,00**

OBSERVACIONES

1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados

2) Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se esta a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de arboles o en mantenimiento de losas en plataforma

3) Se realiza reunión con la entidad sobre el reajuste de precios del contrato, según recomendación dadas por personal de la Aerocivil, la cual se ajusta y se envía nuevamente a la supervisión para revisión, se esta a la espera de la aprobacion por la aerocivil, máxime que quedan menos de dos meses para su termnación contractual

4) Se efectúa reajuste del contrato de Interventoría, el cual se envía a la supervisión para su concepto. Se esta a la espera de observaciones, lo anterior acorde a mesa de trabajo con la Entidad, se aclara que quedan menos de dos meses para la terminación contractual

5) Se recibió el Procedimiento Constructivo (Intervenciones Paliativas) para la Calle de Rodaje Alpha antigua del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia. Las obras contempladas tienen como finalidad poner nuevamente en operación la calle de rodaje mencionada y mejorar la transitabilidad aeroportuaria en este sector. Se envió al especialista de la interventoría el cual dio un concepto favorable sobre el procedimiento. Este concepto ya se envió al contratista de obra, ya hace varias semanas que se realizaron las primeras adecuaciones con arreglo de baches en losas de concreto, se ve con preocupación que el contratista a la fecha de terminación de este informe no ha continuado con los trabajos de sellado de fisuras, el contratista indica que no le ha llegado el producto que viene desde Bogotá. En comité anterior informo que llega el 2 de junio e inmediatamente se harán los trabajos de sello y a la fecha de corte del presente informe no se han realizado los trabajos

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO TARQUÍ	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001241 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 3.822.000.000,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 585.511.508	**Valor Anticipo:**	
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	20,00	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	20,00	**Plazo actualizado:**	20,00
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 3.822.000.000	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados

2) Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se esta a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de arboles o en mantenimiento de losas en plataforma

3) Se realiza reunión con la entidad sobre el reajuste de precios del contrato, según recomendación dadas por personal de la Aerocivil, la cual se ajusta y se envía nuevamente a la supervisión para revisión, se esta a la espera de la aprobacion por la aerocivil, máxime que quedan menos de dos meses para su termnación contractual

4) Se efectúa reajuste del contrato de Interventoría, el cual se envía a la supervisión para su concepto. Se esta a la espera de observaciones, lo anterior acorde a mesa de trabajo con la Entidad, se aclara que quedan menos de dos meses para la terminación contractual

5) Se recibió el Procedimiento Constructivo (Intervenciones Paliativas) para la Calle de Rodaje Alpha antigua del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia. Las obras contempladas tienen como finalidad poner nuevamente en operación la calle de rodaje mencionada y mejorar la transitabilidad aeroportuaria en este sector. Se envió al especialista de la interventoría el cual dio un concepto favorable sobre el procedimiento. Este concepto ya se envió al contratista de obra, ya hace varias semanas que se realizaron las primeras adecuaciones con arreglo de baches en losas de concreto, se ve con preocupación que el contratista a la fecha de terminación de este informe no ha continuado con los trabajos de sellado de fisuras, el contratista indica que no le ha llegado el producto que viene desde Bogotá. En comité anterior informo que llega el 2 de junio e inmediatamente se harán los trabajos de sello y a la fecha de corte del presente informe no se han realizado los trabajos

6) En el periodo se continuaron con las actividades de roceria y fumigacion

7) Se confirma por parte de la parte técnica del aeropuerto que ellos ya instalaron las balizas para la calle de rodaje ALFA (cerrada) que se pondría en servicio mientras se realiza el mantenimiento de la plataforma con el cambio de losas. Solo falta darles las indicaciones para que ellos realicen la debida conexión, la cual está supeditada al cierre de calle de rodaje bravo

8) En el periodo se realizo el repintado de las equis que estaban en la calle de rodaje ALFA (antigua) y tambien se realizo pintada de la linea amarilla central de la calle de rodaje ALFA (antigua).

OBRAS LADO AIRE

POBLACION BENEFICIADA

Según informes del DANE, la Ciudad de Leticia tiene una población de 55.000 habitantes y de acuerdo al Plan Maestro, el aeropuerto mueve alrededor de 280.000 personas al año, entre viajeros residentes de la ciudad y turistas, con una tasa de crecimiento del 3,43%. Las obras de mejoramiento y mantenimiento que se están ejecutando en el aeropuerto Vásquez Cobo permitirán potenciar el desarrollo del sector turístico y comercial de la región y del país, aportando así al desarrollo territorial.

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región. El PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se prevé que durante la etapa de mantenimiento se contará con cinco (5) profesionales y tres (3) especialistas como empleos directos, de acuerdo a la dedicación contemplada en el anexo técnico, más las cuadrillas de rocería, limpieza de cerramientos y canales, que de acuerdo a los ciclos de intervención, pueden representar entre 15 y 20 empleos directos mensuales. Durante la presente semana se contó con la presencia del Ingeniero Director de obra, el Ingeniero Residente de obra, y la Profesional SISOMA . Los empleos indirectos que se generan, están representados por las personas y/o lugares comerciales que se benefician de los empleados del Consorcio, como restaurantes, lavanderías, personas de servicios generales, etc.

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así: 1. Mantenimiento de las áreas del lado aire a fin de garantizar la seguridad aeroportuaria mediante l rocería de áreas verdes que pueden generar la aparición de fauna. 2. Mantenimiento de cerramientos que garantizaran la seguridad del aeropuerto y el ingreso de personal o animales al lado aire. 3. Mejoramiento del aterrizaje mediante la limpieza y retro de caucho. 4. Mejoramiento de la operación aérea mediante la señalización de las áreas de pista y plataforma. 5. Mejoramiento de descoles para garantizar el funcionamiento de los canales existentes.

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que generará beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria Liviana	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
		
Se cuenta con camioneta desde el 21 de marzo de 2025 / el contratista no cumple con la aplicación del manual de identidad de la Aerocivil	MOTOSIERRA	GUADAÑAS

El contratista a hecho entrega del listado de equipo mínimo requerido para las actividades; se le ha insistido que no debe ser el mismo que este siendo usado por otra contratista en el aeropuerto de Leticia

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de interventoría	Director de interventoría	1	HV aprobada
	Residente de interventoría LA	1	HV aprobada
	Residente de interventoría LT	1	HV aprobada
	Especialista en pavimentos	1	HV aprobada
	Especialista hidráulico	1	HV aprobada
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
	Residente sisoma de interventoría	1	HV aprobada
	Topógrafo interventoría	1	HV aprobada
	Cadenero interventoría	1	HV aprobada
Personal Contratista	Director de obra	1	HV aprobada
	Residente de obra	1	HV aprobada
	Residente eléctrico	1	HV aprobada
	Inspector SISOMA	1	HV aprobada
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
	Especialista de pavimentos	1	HV aprobada
	Especialista eléctrico	1	HV aprobada
	Técnico Eléctrico	3	HV aprobada
	Topógrafo contratista	1	Cambio
	Cadenero contratista	1	HV aprobada

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
1/06/2026	CIMGAIN–745–2026 - Respuesta Oficio 427-2026 Informe SST MAYO 2026- TARQUI	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
1/06/2026	CIMGAIN–747–2026 - Respuesta comunicación 428-26 Entrega informe semanal No 068 Corresponde a la semana entre 23 y 29 de mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
1/06/2026	CIMGAIN–749–2026 - Respuesta oficio 430-26 Oficina Entrega Informe Ambiental No 15- Mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
1/06/2026	INFORME SEMANANL No. 68 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
1/06/2026	CIMGAIN–751–2026 - Respuesta oficio 431-26 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 15	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
1/06/2026	AJ CIMGAIN–738–2026 - Atención a MEMORANDO Radicado 2026362020018673 Id 2560600	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
1/06/2026	CIMGAIN–752–2026 - Respuesta oficio 429-26 Oficina Entrega del informe técnico mensual N°16 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	IDICOL
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	JML ENSAYOS E INGENIERIA
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	IMPASUEL
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	PSI INGENIERIA
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	GEOLAB
2/06/2026	COTIZACION ENSAYOS DE LABORATORIO PARA CONCRETO MR-45 FASTRACK	Correo electrónico	SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
2/06/2026	CIMGAIN 756–2026 - Solicitud NOTAM cierre de calle de rodaje BRAVO por precaución	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
2/06/2026	APUs TALA ARBOLES	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/06/2026	CIMGAIN–748–2026 - Respuesta oficio 426-26 Oficina Remisión Informe de Calidad No 15– Mayo 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
3/06/2026	CIMGAIN–734–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 12 Abril Imga	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/06/2026	CIMGAIN–753–2026 - Respuesta oficio 432-26 Oficina Entrega Informe Ambiental No 15- V1 - Mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
3/06/2026	CIMGAIN–754–2026 - Respuesta oficio 433-26 Oficina Remisión Informe de Gerencia No 15 - V2	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
3/06/2026	CIMGAIN–755–2026 - Respuesta oficio 434-26 Oficina Entrega del informe técnico mensual N°16 V2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
3/06/2026	REAJUSTE CONTRATO LADO AIRE E INTERVENTORIA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
3/06/2026	CIMGAIN–757–2026 - Respuesta oficio 437-26 Oficina Remisión Informe de Calidad No15 V2 – Mayo 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
4/06/2026	CIMGAIN–742–2026 - AJUSTE PLAN DE CARGAS	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
5/06/2026	ACTA 12 CTO 24001241 H4 MTTO SKLT	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
1/06/2026	Correo electrónico	Oficio 433-26- Oficina -RESPUESTA CIMGAING 751_26 INFORME DE GERENCIA No.15 V2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
3/06/2025	Correo electrónico	CIMGAIN–734–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 12 Abril Imga	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/06/2026	Correo electrónico	Oficio 434-26 Oficina RESPUESTA CIMGAIN752_26 INFORME MENSUAL No.16 MAYO v2	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/06/2026	Correo electrónico	OFICIO 436_26 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE NOTAM -CIERRE POR PREVENTIVO- CALLE DE RODAJE BRAVO POR ACTIVIDADES DE OBRA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
2/06/2026	Correo electrónico	Oficio 437-26-RESPUESTA CIMGAING 748-26INFORME DE CALIDAD No.15	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/06/2026	Correo electrónico	OFICIO 438 ACTA PARCIAL DE OBRA N.13 MAYO 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/06/2026	Correo electrónico	Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo Imga Ingenieros – Mayo 2026	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
4/06/2026	Correo electrónico	Informe SST Mayo 2026 -CONTRATISTAS TARQUI -OBRAS LA SABANA	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
6/06/2026	Correo electrónico	Oficio 439-26 Oficina INFORME SEMANAL N.69	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA OBRA


ACTAS	Valor Acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	$ 276.711.682,00	$ 42.392.230,00	$ 234.319.452,00	$ 3.545.288.318,00	
No. 2	$ 173.373.959,00	$ 26.560.891,00	$ 146.813.068,00	$ 3.371.914.359,00	
No. 3	$ 163.712.529,00	$ 25.080.759,00	$ 138.631.770,00	$ 3.208.201.830,00	
No. 4	$ 100.080.821,00	$ 15.322.382,00	$ 84.758.439,00	$ 3.108.121.009,00	
No. 5	$ 170.365.538,00	$ 26.100.000,00	$ 144.265.538,00	$ 2.937.755.471,00	
No. 6	$ 117.514.503,00	$ 18.003.221,86	$ 99.511.281,14	$ 2.820.240.968,00	$ 3.822.000.000,00
No. 7	$ 70.014.385,00	$ 10.726.203,78	$ 59.288.181,22	$ 2.750.226.583,00	
No. 8	$ 58.566.700,00	$ 8.972.418,44	$ 49.594.281,56	$ 2.691.659.883,00	
No. 9	$ 76.133.576,00	$ 11.663.664,00	$ 64.469.912,00	$ 2.615.526.307,00	
No. 10	$ 392.998.040,00	$ 60.207.300,00	$ 332.790.740,00	$ 2.222.528.267,00	
No. 11	$ 110.902.235,00	$ 16.990.222,00	$ 93.912.013,00	$ 2.111.626.032,00	
No. 12	$ 106.976.552,00	$ 16.388.808,00	$ 90.587.744,00	$ 2.004.649.480,00	
	$ 1.817.350.520,00				

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

ACTA No. 1	Valor acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	$ 141.913.832,00		$ 141.913.832,00	$ 1.543.663.068,00	
No. 2	$ 42.847.431,00		$ 42.847.431,00	$ 1.500.815.637,00	
No. 3	$ 39.480.155,00		$ 39.480.155,00	$ 1.461.335.482,00	
No. 4	$ 18.177.753,00		$ 18.177.753,00	$ 1.443.157.729,00	
No. 5	$ 80.183.061,00		$ 80.183.061,00	$ 1.362.974.668,00	
No. 6	$ 59.145.081,00		$ 59.145.081,00	$ 1.303.829.587,00	$ 1.685.576.900,00
No. 7	$ 40.693.236,00		$ 40.693.236,00	$ 1.263.136.351,00	
No. 8	$ 66.513.342,00		$ 66.513.342,00	$ 1.196.623.009,00	
No. 9	$ 77.487.917,00		$ 77.487.917,00	$ 1.119.135.092,00	
No. 10	$ 108.812.851,00		$ 108.812.851,00	$ 1.010.322.241,00	
No. 11	$ 42.620.320,00		$ 42.620.320,00	$ 967.701.921,00	
No. 12	$ 54.071.614,00		$ 54.071.614,00	$ 913.630.307,00	
	$ 771.946.593,00				

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA

PRESENTACION DE LA PROGRAMACION APROBADA MEDIANTE COMUNICADO CIMGAIN-646-2026 (26-3-2026)

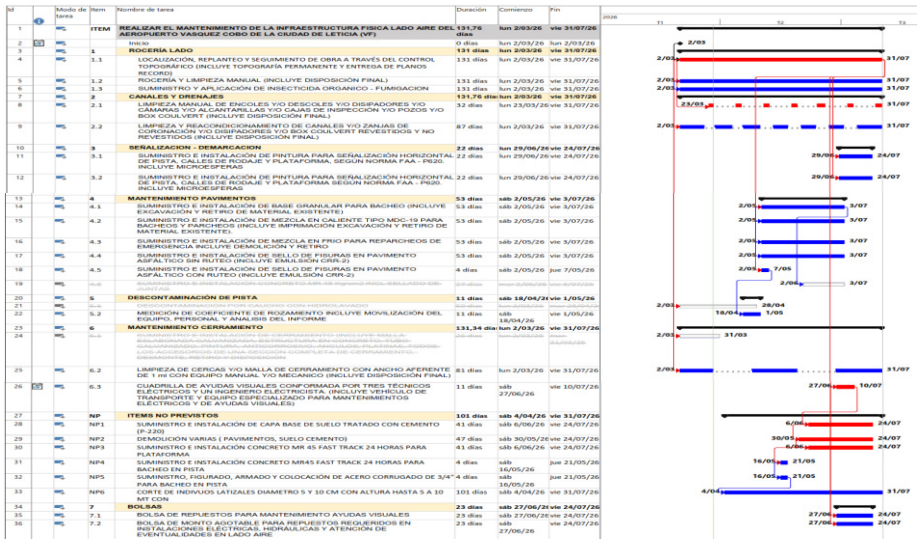


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		ITEM	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	131,76 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
2			Inicio	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26
3		1	ROCERÍA LADO	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
4		1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
5		1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
6		1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
7		2	CANALES Y DRENAJES	131,76 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
8		2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CANALES Y/O CUNETAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	32 días	lun 23/03/26	vie 31/07/26
9		2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	87 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
10		3	SEÑALIZACION - DEMARCACION	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
11		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
12		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
13		4	MANTENIMIENTO PAVIMENTOS	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
14		4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
15		4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
16		4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
17		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
18		4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	4 días	sáb 2/05/26	jue 7/05/26
19		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20		5	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
21		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22		5.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
23		6	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	131,34 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
24		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25		6.2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 mt CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	81 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
26		6.3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA. (INCLUYE VEHICULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	11 días	sáb 27/06/26	vie 10/07/26
27		NP	ITEMS NO PREVISTOS	101 días	sáb 4/04/26	vie 31/07/26
28		NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	41 días	sáb 6/06/26	vie 24/07/26
29		NP2	DEMOLICIÓN VARIAS (PAVIMENTOS, SUELO CEMENTO)	47 días	sáb 30/05/26	vie 24/07/26
30		NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA	41 días	sáb 6/06/26	vie 24/07/26
31		NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA	4 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26
32		NP5	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA	4 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26
33		NP6	CORTE DE INDIVIOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON	101 días	sáb 4/04/26	vie 31/07/26
34		7	BOLSAS	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26
35		7.1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26
36		7.2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26


AVANCE FISICO SEMANAL

Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Programado Inicial	Ejecutado	Desviacion
12-feb	14-feb		1	0,00%	0,00%	0,00%
15-feb	21-feb		2	0,00%	0,00%	0,00%
22-feb	28-feb		3	0,00%	0,00%	0,00%
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%
6-sep	12-sep		31	19,90%	19,71%	-0,20%
13-sep	19-sep		32	21,26%	20,49%	-0,77%
20-sep	26-sep		33	22,62%	21,75%	-0,87%
27-sep	3-oct	8	34	23,06%	23,65%	0,59%
4-oct	10-oct		35	23,49%	24,77%	1,28%
11-oct	17-oct		36	23,93%	25,76%	1,83%
18-oct	24-oct		37	24,37%	26,21%	1,84%
25-oct	31-oct	9	38	24,80%	26,21%	1,41%
1-nov	7-nov		39	26,65%	26,64%	-0,01%
8-nov	14-nov		40	28,49%	27,15%	-1,34%
15-nov	21-nov		41	31,21%	27,43%	-3,78%
22-nov	28-nov		42	33,93%	27,99%	-5,94%
29-nov	5-dic	10	43	39,63%	28,49%	-11,14%
6-dic	12-dic		44	45,33%	29,13%	-16,20%
13-dic	19-dic		45	51,03%	29,57%	-21,46%
20-dic	26-dic		46	56,25%	29,57%	-26,68%
27-dic	2-ene	11	47	61,46%	29,57%	-31,89%
3-ene	9-ene		48	62,21%	29,67%	-32,54%
10-ene	16-ene		49	62,96%	29,77%	-33,19%
17-ene	23-ene		50	63,71%	30,83%	-32,88%
24-ene	30-ene	12	51	64,45%	34,14%	-30,31%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,15%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%

Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Re-Programado	Ejecutado Reprogramacion	Desviacion
28-feb	6-mar		56	42,23%	42,03%	-0,20%
7-mar	13-mar		57	42,60%	42,61%	0,01%
14-mar	20-mar		58	42,98%	43,12%	0,14%
21-mar	27-mar		59	43,30%	44,12%	0,82%
28-mar	3-abr	14	60	43,49%	44,75%	1,26%
4-abr	10-abr		61	43,88%	45,28%	1,40%
11-abr	17-abr		62	44,20%	45,49%	1,29%
18-abr	24-abr		63	45,31%	45,75%	0,44%
25-abr	1-may	15	64	46,59%	47,55%	0,96%
2-may	8-may		65	47,13%	47,74%	0,61%
9-may	15-may		66	47,72%	48,85%	1,13%
16-may	22-may		67	49,40%	50,72%	1,32%
23-may	29-may	16	68	49,94%	58,68%	8,74%
30-may	5-jun		69	50,52%	58,82%	8,30%

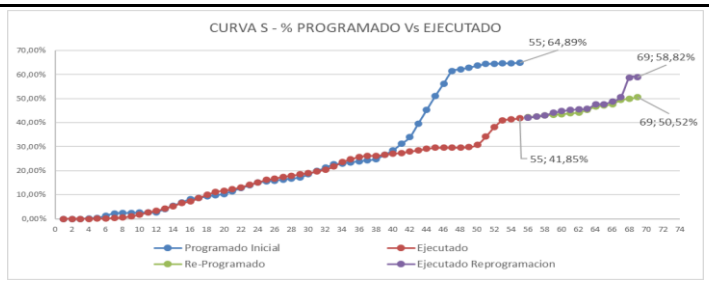

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
12-feb	14-feb		1	0	0	0
15-feb	21-feb		2	0	0	0
22-feb	28-feb		3	0	0	0
1-mar	7-mar	1	4	7.198.992	0	-7.198.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251271	3.368.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11636.671	-74.467.888
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201983.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261898.260	252.568.855	-9.329.405
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.438	-39.435.216
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.670.859	-1933.725
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381738.878	26.759.364
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.946.564	52.592.121
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.191.173	52.461799
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.791583	29.230.815
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.048.297	15.656.135
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.805.264	13.581709
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.316.258	2.261308
26-jul	1-ago	6	25	591354.894	619.696.077	28.341184
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.769	30.981931
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.606.286	44.651504
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.848.846	43.594.121
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.752	51662.083
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.056.842	16.471787
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.131660	-7.483.780
13-sep	19-sep		32	812.645.827	783.098.207	-29.547.620
20-sep	26-sep		33	864.676.212	831244.143	-33.432.069
27-sep	3-oct	8	34	881321.126	903.903.000	22.581874
4-oct	10-oct		35	897.966.040	946.709.400	48.743.360
11-oct	17-oct		36	914.610.954	984.547.200	69.936.246
18-oct	24-oct		37	931255.868	1001746.200	70.490.332
25-oct	31-oct	9	38	947.900.782	1001746.200	53.845.418
1-nov	7-nov		39	1018.372.148	1018. 180.800	-191348
8-nov	14-nov		40	1088.843.515	1037.673.000	-51.170.515
15-nov	21-nov		41	1.192.750.185	1048.374.600	-144.375.585
22-nov	28-nov		42	1296.656.856	1069.777.800	-226.879.056
29-nov	5-dic	10	43	1.514.617.506	1088.887.800	-425.729.706
6-dic	12-dic		44	1.732.578.157	1.113.348.600	-619.229.557
13-dic	19-dic		45	1950.538.807	1.130. 155.400	-820.373.407
20-dic	26-dic		46	2.149.812.846	1.130. 155.400	-1019.647.446
27-dic	2-ene	11	47	2.349.086.884	1.130. 155.400	-1218.921.484
3-ene	9-ene		48	2.377.668.278	1.133.987.400	-1243.680.878
10-ene	16-ene		49	2.406.249.672	1.137.809.400	-1268.440.272
17-ene	23-ene		50	2.434.831066	1.178.322.600	-1256.508.466
24-ene	30-ene	12	51	2.463.412.460	1.304.830.800	-1.158.581660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.390	1458.475.200	-1009.062. 190
7-feb	13-feb		53	2.471662.320	1567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1599.507.000	-880.405.180
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Re - Programado ($)	Ejecutado ($) - Reprogramacio	Pagado ($)
28-feb	6-mar		56	1.613.911526	1606.386.600	-7.524.926
7-mar	13-mar		57	1.628.351320	1628.554.200	202.880
14-mar	20-mar		58	1.642.791.114	1648.046.400	5.255.286
21-mar	27-mar		59	1.654.926.908	1686.266.400	31339.492
28-mar	3-abr	14	60	1.662.351262	1710.345.000	47.993.738
4-abr	10-abr		61	1.677.037.885	1730.601600	53.563.715
11abr	17-abr		62	1.689.420.507	1738.627.800	49.207.293
18-abr	24-abr		63	1.731625.432	1748.654.801	17.029.369
25-abr	1-may	15	64	1.780.845.796	1817.361000	36.515.204
2-may	8-may		65	1.801285.677	1824.622.800	23.337.123
9-may	15-may		66	1.824.029.558	1867.047.000	43.017.442
15-may	22-may		67	1.888.121277	1938.518.400	50.397. 123
23-may	29-may	16	68	1.908.561158	2.242.749.600	334.188.442
30-may	5-jun		69	1.930.891847	2.248.100.400	317.208.553

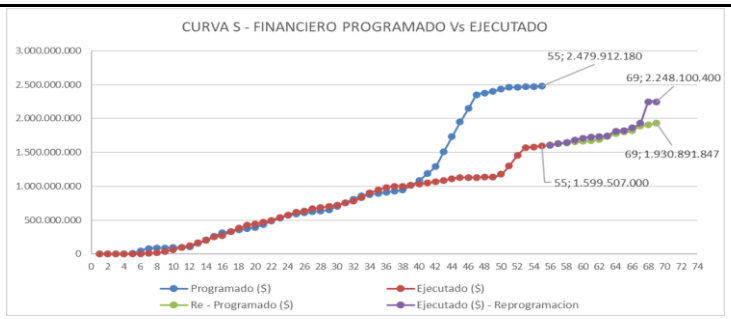

AVANCE TECNICO DE OBRA

Informe de Actividades Realizadas semana 69:

Durante la semana comprendida entre el 30 de mayo de 2026 y el 05 de junio de 2026, el consorcio tarqui realizo las siguientes actividades:

- Ejecución de labores de localización y replanteo en el costado occidental y oriental de pista, en 0,00 Ha
- Ejecución de labores de rocería en el costado occidental y oriental de pista, en 4,33 Ha
- Aplicación de insecticida mediante fumigación en las áreas intervenidas con rocería en 4,33 Ha.
- Realización descontaminación de pista 0,00 m2
- Tratamiento de juntas con asfalto frio 0,00 m3
- Suministro e instalación de pintura plataforma en 0,00 m2
- Limpieza de canales en 0,00 ml
- Limpieza de encoles y/o descoles en 0,00 un
- Limpieza de cerramiento perimetral en 0,00 ml
- Instalación de cerramiento 0,0 ml
- Suministro e instalación de suelo cemento 0,00 m3
- Demoliciones 00,00 m2
- Suministro e instacion concreto tipo MR45 00,00 m3
- Corte de individuos latizales 0,00 un

REGISTRO FOTOGRÁFICO



























SE EVIDENCIAN EN LAS FOTOS LA PINTADA DE LAS EQUIS DE LA CALLE DE RODAJE ALFA (CERRADA) AL IGUAL QUE DE LA LINEA AMARILLA CENTRAL







SE EVIDENCIAN EN LAS FOTOS LA REALIZACION DE ROCERIA

OBSERVACIONES	Ingeniero Residente de Interventoría
- Se Informa que el contratista CONSORCIO TARQUI no realizo las actividades de mantenimiento de bache en la pista, la no realización de la actividad el contratista la aduce a la falta de tiempo por la ventana operacional que se otorgo para un avión ambulancia - Se esta a la espera de concepto por parte de la supervisión sobre el tema del Reajuste del contrato de obra, de acuerdo a los compromisos de mesa de trabajo conjunto. - Se manifiesta y se deja claridad que a la fecha quedan menos de dos meses de tiempo, y no se ha definido por parte de la supervisión el alcance del contrato, en cuanto a si se debe incluir dentro del adicional la tala de árboles o continuar con el mantenimiento de losas y ciclos de mantenimiento en las demás actividades.	ING. HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 08/MARZO/2020	Página: 1 de 5

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	13 de junio de 2026
Semana No.	70	**Del :**	6 de junio de 2026	**al**	12 de junio de 2026
Plazo total		534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		486	días	**Tiempo restante**	48 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		91,01%			
Nombre del Supervisor :	MARIA CONSUELO DURAN CARO				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	3,02%	**53,54%**	**(%) Ejecutado**	0,39%	**59,21%**
Valor programado ($)	$115.427.377	**$2.046.319.224**	**Valor ejecutado ($)**	$15.041.124,56	**$2.263.162.828**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	**5,67%**
				Valor Adelanto/Atraso	**$ 216.843.604,00**

OBSERVACIONES

1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados

2) Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se esta a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de arboles o en mantenimiento de losas en plataforma

3) Se realiza reunión con la entidad sobre el reajuste de precios del contrato, según recomendación dadas por personal de la Aerocivil, la cual se ajusta y se envía nuevamente a la supervisión para aprobacion por la aerocivil, se ve con preocupacion que solo quedan dos meses para terminacion contractual del contrato.

4) Se efectúa reajuste del contrato de Interventoría, el cual se envía a la supervisión para su concepto. Se esta a la espera de aprobacion por parte de la aerocivil, se aclara que quedan menos de dos meses para la terminación contractual

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO TARQUÍ	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001241 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 3.822.000.000,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 585.511.508	**Valor Anticipo:**	
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	20,00	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	20,00	**Plazo actualizado:**	20,00
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 3.822.000.000	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados

2) Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se esta a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de arboles o en mantenimiento de losas en plataforma

3) Se realiza reunión con la entidad sobre el reajuste de precios del contrato, según recomendación dadas por personal de la Aerocivil, la cual se ajusta y se envía nuevamente a la supervisión para aprobacion por la aerocivil, se ve con preocupacion que solo quedan dos meses para terminacion contractual del contrato.

4) Se efectúa reajuste del contrato de Interventoría, el cual se envía a la supervisión para su concepto. Se esta a la espera de aprobacion por parte de la aerocivil, se aclara que quedan menos de dos meses para la terminación contractual

5) En el periodo se continuaron con las actividades de roceria y fumigacion

6) En el periodo se inician actividades de relleno de fisuras en la calle de rodaje ALFA (ANTIGUA)

OBRAS LADO AIRE

POBLACION BENEFICIADA

Según informes del DANE, la Ciudad de Leticia tiene una población de 55.000 habitantes y de acuerdo al Plan Maestro, el aeropuerto mueve alrededor de 280.000 personas al año, entre viajeros residentes de la ciudad y turistas, con una tasa de crecimiento del 3,43%. Las obras de mejoramiento y mantenimiento que se están ejecutando en el aeropuerto Vásquez Cobo permitirán potenciar el desarrollo del sector turístico y comercial de la región y del país, aportando así al desarrollo territorial.

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región. El PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se prevé que durante la etapa de mantenimiento se contará con cinco (5) profesionales y tres (3) especialistas como empleos directos, de acuerdo a la dedicación contemplada en el anexo técnico, más las cuadrillas de rocería, limpieza de cerramientos y canales, que de acuerdo a los ciclos de intervención, pueden representar entre 15 y 20 empleos directos mensuales. Durante la presente semana se contó con la presencia del Ingeniero Director de obra, el Ingeniero Residente de obra, y la Profesional SISOMA . Los empleos indirectos que se generan, están representados por las personas y/o lugares comerciales que se benefician de los empleados del Consorcio, como restaurantes, lavanderías, personas de servicios generales, etc.

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así: 1. Mantenimiento de las áreas del lado aire a fin de garantizar la seguridad aeroportuaria mediante l rocería de áreas verdes que pueden generar la aparición de fauna. 2. Mantenimiento de cerramientos que garantizaran la seguridad del aeropuerto y el ingreso de personal o animales al lado aire. 3. Mejoramiento del aterrizaje mediante la limpieza y retro de caucho. 4. Mejoramiento de la operación aérea mediante la señalización de las áreas de pista y plataforma. 5. Mejoramiento de descoles para garantizar el funcionamiento de los canales existentes.

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que generará beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria Liviana	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
		
Se cuenta con camioneta desde el 21 de marzo de 2025 / el contratista no cumple con la aplicación del manual de identidad de la Aerocivil	MOTOSIERRA	GUADAÑAS

El contratista a hecho entrega del listado de equipo mínimo requerido para las actividades; se le ha insistido que no debe ser el mismo que este siendo usado por otra contratista en el aeropuerto de Leticia

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de interventoría	Director de interventoría	1	HV aprobada
	Residente de interventoría LA	1	HV aprobada
	Residente de interventoría LT	1	HV aprobada
	Especialista en pavimentos	1	HV aprobada
	Especialista hidráulico	1	HV aprobada
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
	Residente sisoma de interventoría	1	HV aprobada
	Topógrafo interventoría	1	HV aprobada
	Cadenero interventoría	1	HV aprobada
Personal Contratista	Director de obra	1	HV aprobada
	Residente de obra	1	HV aprobada
	Residente eléctrico	1	HV aprobada
	Inspector SISOMA	1	HV aprobada
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
	Especialista de pavimentos	1	HV aprobada
	Especialista eléctrico	1	HV aprobada
	Técnico Eléctrico	3	HV aprobada
	Topógrafo contratista	1	Cambio
	Cadenero contratista	1	HV aprobada

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
5/06/2026	ACTA 12 CTO 24001241 H4 MTTO SKLT	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/06/2026	CIMGAIN 756–2026 - Solicitud NOTAM cierre de calle de rodaje BRAVO por precaución	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/06/2026	CIMGAIN–760–2026 - Solicitud reunión virtual Consorcio IMGA INGENIEROS, acta mes de abri	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/06/2026	INFORME SEMANAL No. 69 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
10/06/2026	CIMGAIN–761–2026 - Respuesta comunicación 439-26 Entrega informe semanal No 069 Corresponde a la semana entre 30 de mayo y 05 de junio de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
11/06/2026	CIERRE POR PRECAUCION CALLE DE RODAJE BRAVO	Correo electrónico	ADMINISTRACION AEROPUERTO
12/06/2026	Oficio 435-26 Oficina CERTIFICADOS DE CALIDAD MATERIALES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
12/06/2026	425_26 Oficina - PLANOS DE SEÑALIZACION AEROPUERTO LETICA	Correo electrónico	ESPECIALISTA
12/06/2026	oficio 328_26 Oficina SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE PLATAFORMA, PISTA Y CALLES DE RODAJE MANTENIMIENTO DE LUCES DE PLATAFORMA	Correo electrónico	ESPECIALISTA
12/06/2026	ACTA No. 12 CONSORCIO TARQUI LADO AIRE	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
12/06/2026	CIMGAIN–758–2026 - Radicación acta de obra No 13 Lado Aire, periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026 Consorcio Tarqu	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
6/06/2026	Correo electrónico	Oficio 439-26 Oficina INFORME SEMANAL N.69	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/06/2026	Correo electrónico	oficio 441-26 OFICINA PROGRAMACIÓN DE OBRA N.3	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10/06/2026	Correo electrónico	Documentacion Faltante	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
12/06/2026	Correo electrónico	Fw: REAJSUTE PRECIOS - CTO MTTO LETICIA - 24001241 H4 Y 24001242 H3	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
12/06/2026	Correo electrónico	12062026LTC- SOLICITUD NOTAM - TWY B CLSD DUE WIP. MEN AND EQPT IN VICINITY	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
14/06/2026	Correo electrónico	Oficio 442 Oficina INFORME SEMANAL N.70	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA OBRA


ACTAS	Valor Acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	$ 276.711.682,00	$ 42.392.230,00	$ 234.319.452,00	$ 3.545.288.318,00	
No. 2	$ 173.373.959,00	$ 26.560.891,00	$ 146.813.068,00	$ 3.371.914.359,00	
No. 3	$ 163.712.529,00	$ 25.080.759,00	$ 138.631.770,00	$ 3.208.201.830,00	
No. 4	$ 100.080.821,00	$ 15.322.382,00	$ 84.758.439,00	$ 3.108.121.009,00	
No. 5	$ 170.365.538,00	$ 26.100.000,00	$ 144.265.538,00	$ 2.937.755.471,00	
No. 6	$ 117.514.503,00	$ 18.003.221,86	$ 99.511.281,14	$ 2.820.240.968,00	
No. 7	$ 70.014.385,00	$ 10.726.203,78	$ 59.288.181,22	$ 2.750.226.583,00	$ 3.822.000.000,00
No. 8	$ 58.566.700,00	$ 8.972.418,44	$ 49.594.281,56	$ 2.691.659.883,00	
No. 9	$ 76.133.576,00	$ 11.663.664,00	$ 64.469.912,00	$ 2.615.526.307,00	
No. 10	$ 392.998.040,00	$ 60.207.300,00	$ 332.790.740,00	$ 2.222.528.267,00	
No. 11	$ 110.902.235,00	$ 16.990.222,00	$ 93.912.013,00	$ 2.111.626.032,00	
No. 12	$ 106.976.552,00	$ 16.388.808,00	$ 90.587.744,00	$ 2.004.649.480,00	
No. 13	$ 425.398.436,00	$ 148.889.453,00	$ 276.508.983,00	$ 1.579.251.044,00	
	$ 2.242.748.956,00				

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

ACTA No. 1	Valor acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	$ 141.913.832,00		$ 141.913.832,00	$ 1.543.663.068,00	
No. 2	$ 42.847.431,00		$ 42.847.431,00	$ 1.500.815.637,00	
No. 3	$ 39.480.155,00		$ 39.480.155,00	$ 1.461.335.482,00	
No. 4	$ 18.177.753,00		$ 18.177.753,00	$ 1.443.157.729,00	
No. 5	$ 80.183.061,00		$ 80.183.061,00	$ 1.362.974.668,00	
No. 6	$ 59.145.081,00		$ 59.145.081,00	$ 1.303.829.587,00	
No. 7	$ 40.693.236,00		$ 40.693.236,00	$ 1.263.136.351,00	$ 1.685.576.900,00
No. 8	$ 66.513.342,00		$ 66.513.342,00	$ 1.196.623.009,00	
No. 9	$ 77.487.917,00		$ 77.487.917,00	$ 1.119.135.092,00	
No. 10	$ 108.812.851,00		$ 108.812.851,00	$ 1.010.322.241,00	
No. 11	$ 42.620.320,00		$ 42.620.320,00	$ 967.701.921,00	
No. 12	$ 54.071.614,00		$ 54.071.614,00	$ 913.630.307,00	
	$ 771.946.593,00				

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA

PRESENTACION DE LA PROGRAMACION APROBADA MEDIANTE COMUNICADO CIMGAIN-646-2026 (26-3-2026)

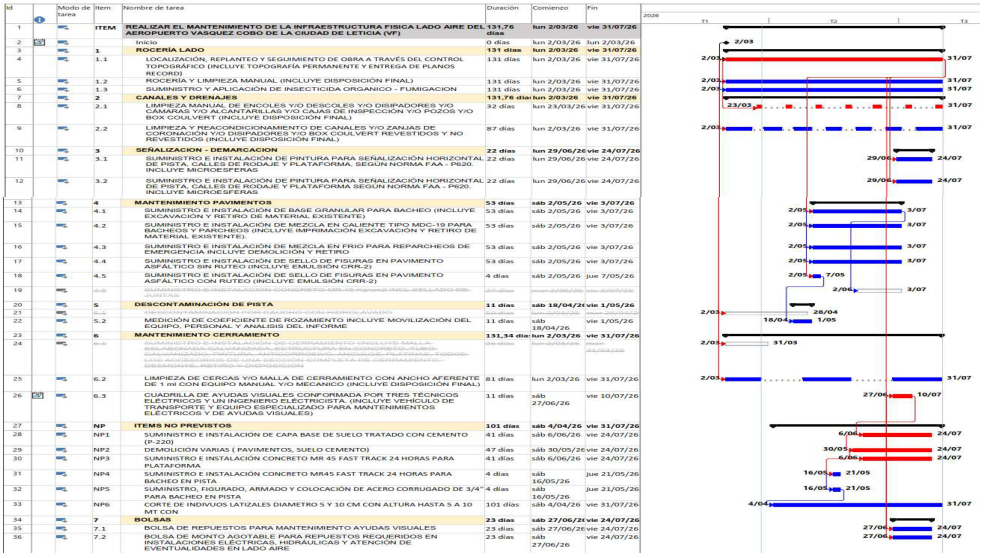


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		ITEM	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	131,76 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
2			Inicio	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26
3		1	ROCERÍA LADO	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
4		1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
5		1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
6		1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
7		2	CANALES Y DRENAJES	131,76 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
8		2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CAMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	32 días	lun 23/03/26	vie 31/07/26
9		2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	87 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
10		3	SEÑALIZACION - DEMARCACION	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
11		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
12		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
13		4	MANTENIMIENTO PAVIMENTOS	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
14		4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
15		4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
16		4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
17		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSION CRR-2)	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
18		4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO (INCLUYE EMULSION CRR-2)	4 días	sáb 2/05/26	jue 7/05/26
19		n.n	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 FAST TRACK INCL SELLADO DE JUNTAS	53 días	mar 2/06/26	vie 3/07/26
20		5	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
21		n.n	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22		5.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
23		6	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO	131,34 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
24		n.n	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, PLATINAS, TORNILLERIA, ALAMBRE DE PUAS, ACCESORIOS COMPLETOS DE CERRAMIENTO, EXCAVACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN	26 días	lun 2/06/26	mar 7/07/26
25		6.2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 mt CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	81 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
26		6.3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TECNICOS ELÉCTRICOS Y UN INGENIERO ELÉCTRICISTA, (INCLUYE VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	11 días	sáb 27/06/26	vie 10/07/26
27		NP	ITEMS NO PREVISTOS	101 días	sáb 4/04/26	vie 31/07/26
28		NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-220)	41 días	sáb 6/06/26	vie 24/07/26
29		NP2	DEMOLICIÓN VARIAS (PAVIMENTOS, SUELO CEMENTO)	47 días	sáb 30/05/26	vie 24/07/26
30		NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA	41 días	sáb 6/06/26	vie 24/07/26
31		NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA	4 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26
32		NP5	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA	4 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26
33		NP6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON	101 días	sáb 4/04/26	vie 31/07/26
34		7	BOLSAS	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26
35		7.1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26
36		7.2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26


AVANCE FISICO SEMANAL

Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Programado Inicial	Ejecutado	Desviacion
2-feb	8-feb		1	0,00%	0,00%	0,00%
9-feb	15-feb		2	0,00%	0,00%	0,00%
16-feb	22-feb		3	0,00%	0,00%	0,00%
23-feb	1-mar		4	0,19%	0,00%	-0,19%
2-mar	8-mar	1	5	0,38%	0,02%	-0,36%
9-mar	15-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
16-mar	22-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
23-mar	29-mar		8	2,35%	0,48%	-1,87%
30-mar	5-abr	2	9	2,45%	1,05%	-1,40%
6-abr	12-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
13-abr	19-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
20-abr	26-abr		12	2,74%	3,28%	0,54%
27-abr	3-may	3	13	4,11%	4,37%	0,26%
4-may	10-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
11-may	17-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
18-may	24-may		16	8,22%	7,19%	-1,03%
25-may	31-may	4	17	8,75%	8,70%	-0,05%
1-jun	7-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
8-jun	14-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
15-jun	21-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
22-jun	28-jun		21	11,53%	12,29%	0,76%
29-jun	5-jul	5	22	12,70%	13,11%	0,41%
6-jul	12-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
13-jul	19-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
20-jul	26-jul		25	15,47%	16,21%	0,74%
27-jul	2-ago	6	26	15,90%	16,71%	0,81%
3-ago	9-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
10-ago	16-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
17-ago	23-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
24-ago	30-ago		30	18,54%	18,97%	0,43%
31-ago	6-sep	7	31	19,90%	19,71%	-0,20%
7-sep	13-sep		32	21,26%	20,49%	-0,77%
14-sep	20-sep		33	22,62%	21,75%	-0,87%
21-sep	27-sep		34	23,06%	23,65%	0,59%
28-sep	4-oct	8	35	23,49%	24,77%	1,28%
5-oct	11-oct		36	23,93%	25,76%	1,83%
12-oct	18-oct		37	24,37%	26,21%	1,84%
19-oct	25-oct		38	24,80%	26,21%	1,41%
26-oct	1-nov	9	39	26,65%	26,64%	-0,01%
2-nov	8-nov		40	28,49%	27,15%	-1,34%
9-nov	15-nov		41	31,21%	27,43%	-3,78%
16-nov	22-nov		42	33,93%	27,99%	-5,94%
23-nov	29-nov		43	39,63%	28,49%	-11,14%
30-nov	6-dic	10	44	45,33%	29,13%	-16,20%
7-dic	13-dic		45	51,03%	29,57%	-21,46%
14-dic	20-dic		46	56,25%	29,57%	-26,68%
21-dic	27-dic		47	61,46%	29,57%	-31,89%
28-dic	3-ene	11	48	62,21%	29,67%	-32,54%
4-ene	10-ene		49	62,96%	29,77%	-33,19%
11-ene	17-ene		50	63,71%	30,83%	-32,88%
18-ene	24-ene		51	64,45%	34,14%	-30,31%
25-ene	31-ene	12	52	64,56%	38,16%	-26,40%
1-feb	7-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
8-feb	14-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
15-feb	21-feb		55	64,89%	41,85%	-23,04%

Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Re-Programado	Ejecutado Reprogramacion	Desviacion
28-feb	6-mar		56	42,23%	42,03%	-0,20%
7-mar	13-mar		57	42,60%	42,61%	0,01%
14-mar	20-mar		58	42,98%	43,12%	0,14%
21-mar	27-mar		59	43,30%	44,12%	0,82%
28-mar	3-abr	14	60	43,49%	44,75%	1,26%
4-abr	10-abr		61	43,88%	45,28%	1,40%
11-abr	17-abr		62	44,20%	45,49%	1,29%
18-abr	24-abr		63	45,31%	45,75%	0,44%
25-abr	1-may	15	64	46,59%	47,55%	0,96%
2-may	8-may		65	47,13%	47,74%	0,61%
9-may	15-may		66	47,72%	48,85%	1,13%
16-may	22-may		67	49,40%	50,72%	1,32%
23-may	29-may	16	68	49,94%	58,68%	8,74%
30-may	5-jun		69	50,52%	58,82%	8,30%
6-jun	12-jun		70	53,54%	58,90%	5,36%

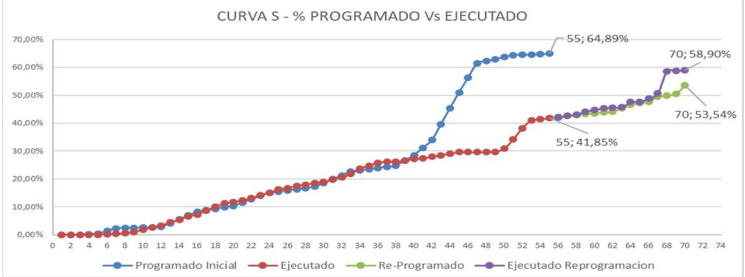

EJECUCION PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
12-feb	14-feb		1	0	0	0
15-feb	21-feb		2	0	0	0
22-feb	28-feb		3	0	0	0
1-mar	7-mar	1	4	7.198.992	0	-7.198.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.368.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11.636.671	-74.467.888
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101.870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201.983.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261.898.260	252.568.855	-9.329.405
24-may	30-may	4	16	314.229.554	274.794.438	-39.435.216
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.670.859	-1.933.725
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381.738.878	26.759.364
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.946.564	52.592.121
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.191.173	52.461.799
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.791.583	29.230.815
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501.048.297	15.656.135
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.805.264	13.581.709
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.316.258	2.261.308
26-jul	1-ago	6	25	591.354.894	619.696.077	28.341.184
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.769	30.981.931
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.606.286	44.651.504
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.848.846	43.594.121
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.752	51.662.083
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.056.842	16.471.787
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.131.660	-7.483.780
13-sep	19-sep		32	812.645.827	783.098.207	-29.547.620
20-sep	26-sep		33	864.676.212	831.244.143	-33.432.069
27-sep	3-oct	8	34	881.321.126	903.903.000	22.581.874
4-oct	10-oct		35	897.966.040	946.709.400	48.743.360
11-oct	17-oct		36	914.610.954	984.547.200	69.936.246
18-oct	24-oct		37	931.255.868	1.001.746.200	70.490.332
25-oct	31-oct	9	38	947.900.782	1.001.746.200	53.845.418
1-nov	7-nov		39	1.018.372.148	1.018.180.800	-191.348
8-nov	14-nov		40	1.088.843.513	1.037.673.000	-51.170.513
15-nov	21-nov		41	1.192.750.185	1.048.374.600	-144.375.585
22-nov	28-nov		42	1.296.656.856	1.069.777.800	-226.879.056
29-nov	5-dic	10	43	1.514.617.506	1.088.887.800	-425.729.706
6-dic	12-dic		44	1.732.578.157	1.113.348.600	-619.229.557
13-dic	19-dic		45	1.950.538.807	1.130.165.400	-820.373.407
20-dic	26-dic		46	2.149.812.846	1.130.165.400	-1019.647.446
27-dic	2-ene	11	47	2.349.086.884	1.130.165.400	-1218.921.484
3-ene	9-ene		48	2.377.668.278	1.133.987.400	-1243.680.878
10-ene	16-ene		49	2.406.249.672	1.137.809.400	-1268.440.272
17-ene	23-ene		50	2.434.831.066	1.178.322.600	-1256.508.466
24-ene	30-ene	12	51	2.463.412.460	1.304.830.800	-1158.581.660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.390	1.458.475.200	-1009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471.662.320	1.567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1.582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1.599.507.000	-880.405.180
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Re - Programado ($)	jecutado ($) - Reprogramacio	Pagado ($)
28-feb	6-mar		56	1.613.911.526	1.606.386.600	-7.524.926
7-mar	13-mar		57	1.628.351.320	1.628.554.200	202.880
14-mar	20-mar		58	1.642.791.114	1.648.046.400	5.255.286
21-mar	27-mar		59	1.654.926.908	1.686.266.400	31.339.492
28-mar	3-abr	14	60	1.662.351.262	1.710.345.000	47.993.738
4-abr	10-abr		61	1.677.037.885	1.730.601.600	53.563.715
11-abr	17-abr		62	1.689.420.507	1.738.627.800	49.207.293
18-abr	24-abr		63	1.731.625.432	1.748.654.801	17.029.369
25-abr	1-may	15	64	1.780.845.796	1.817.361.000	36.515.204
2-may	8-may		65	1.801.285.677	1.824.622.800	23.337.123
9-may	15-may		66	1.824.029.558	1.867.047.000	43.017.442
16-may	22-may		67	1.888.121.277	1.938.518.400	50.397.123
23-may	29-may	16	68	1.908.561.158	2.242.749.600	334.188.442
30-may	5-jun		69	1.930.891.947	2.248.100.400	317.208.553
6-jun	12-jun		70	2.046.319.224	2.251.158.000	204.838.776

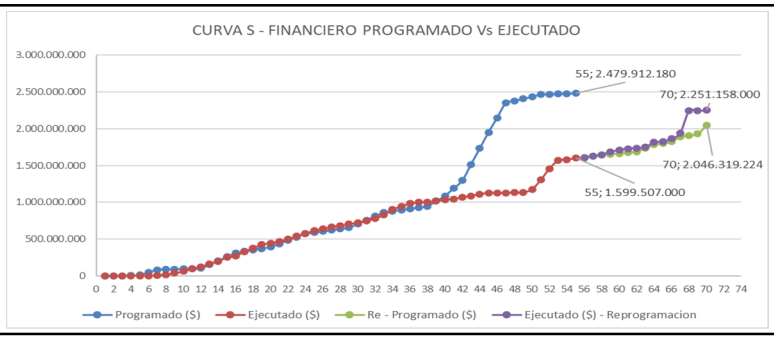

AVANCE TECNICO DE OBRA

Informe de Actividades Realizadas semana 70:

Durante la semana comprendida entre el 06 de junio de 2026 y el 12 de junio de 2026, el consorcio tarqui realizo las siguientes actividades:

- Ejecución de labores de localización y replanteo en el costado occidental y oriental de pista, en 0,00 Ha
- Ejecución de labores de rocería en el costado occidental y oriental de pista, en 2,43 Ha
- Aplicación de insecticida mediante fumigación en las áreas intervenidas con rocería en 2,43 Ha.
- Realización descontaminación de pista 0,00 m2
- Tratamiento de juntas con asfalto frio 0,00 m3
- Sello de fisuras 2000,00 ml
- Suministro e instalación de pintura plataforma en 0,00 m2
- Limpieza de canales en 0,00 ml
- Limpieza de encoles y/o descoles en 0,00 un
- Limpieza de cerramiento perimetral en 0,00 ml
- Instalación de cerramiento 0,0 ml
- Suministro e instalación de suelo cemento 0,00 m3
- Demoliciones 00,00 m2
- Suministro e instacion concreto tipo MR45 00,00 m3
- Corte de individuos latizales 0,00 un


REGISTRO FOTOGRÁFICO











SE EVIDENCIAN EN LAS FOTOS EL SELLO DE FISURAS REALIZADO EN LA CALLE DE RODAJE ALFA (CERRADA)

















SE EVIDENCIAN EN LAS FOTOS LA REALIZACION DE ROCERIA

OBSERVACIONES	Ingeniero Residente de Interventoria
- Se Informa que el contratista CONSORCIO TARQUI no realizo las actividades de mantenimiento de bache en la pista, la no realización de la actividad el contratista la aduce a la falta de tiempo por la ventana operacional que se otorgo para un avión ambulancia - Se esta a la espera de concepto por parte de la supervisión sobre el tema del Reajuste del contrato de obra y el conrato de interventoria. - Se manifiesta y se deja claridad que a la fecha quedan menos de dos meses de tiempo, y no se ha definido por parte de la supervisión el alcance del contrato, en cuanto a si se debe incluir dentro del adicional la tala de árboles o continuar con el mantenimiento de losas y ciclos de mantenimiento en las demás actividades.	ING. HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 08/MARZO/2020	Página: 1 de 5

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	20 de junio de 2026
Semana No.	71	**Del :**	13 de junio de 2026	**al**	19 de junio de 2026
Plazo total		534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		493	días	**Tiempo restante**	41 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		92,32%			
Nombre del Supervisor :		MARIA CONSUELO DURAN CARO			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,96%	**56,50%**	**(%) Ejecutado**	0,33%	**59,54%**
Valor programado ($)	$113.123.376	**$2.159.442.600**	**Valor ejecutado ($)**	$12.519.174,81	**$2.275.682.003**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	**3,04%**
				Valor Adelanto/Atraso	**$ 116.239.403,00**

OBSERVACIONES

1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados

2) Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se esta a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de arboles o en mantenimiento de losas en plataforma

3) Se realiza reunión con la entidad sobre el reajuste de precios del contrato, según recomendación dadas por personal de la Aerocivil, la cual se ajusta y se envía nuevamente a la supervisión para aprobacion por la aerocivil, se esta a la espera del oficio de aprobacion por parte de la aerocivil.

4) Se efectúa reajuste del contrato de Interventoría, el cual se envía a la supervisión para su concepto. Se esta a la espera de aprobacion por parte de la aerocivil, se aclara que quedan menos de dos meses para la terminación contractual

5) Se solicita Notam de cierre por precaución a partir del 15 de junio de la calle de rodaje Bravo, para inicio de actividades de mantenimiento de losas frente a esta calle.

6) Se lleva a cabo reunión presencial de Imga y Aerocivil para tratar temas de avance, ajuste de dedicaciones y actas parciañes de obra

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO TARQUÍ	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001241 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 3.822.000.000,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 585.511.508	**Valor Anticipo:**	
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	20,00	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	20,00	**Plazo actualizado:**	20,00
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 3.822.000.000	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados

2) Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se esta a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de arboles o en mantenimiento de losas en plataforma

3) Se realiza reunión con la entidad sobre el reajuste de precios del contrato, según recomendación dadas por personal de la Aerocivil, la cual se ajusta y se envía nuevamente a la supervisión para aprobacion por la aerocivil, se esta a la espera del oficio de aprobacion por parte de la aerocivil.

4) Se efectúa reajuste del contrato de Interventoría, el cual se envía a la supervisión para su concepto. Se esta a la espera de aprobacion por parte de la aerocivil, se aclara que quedan menos de dos meses para la terminación contractual

5) En el periodo se continuaron con las actividades de roceria, fumigacion y limpieza de cerca

6) Desde el 15 de junio se tiene aproado el notam de cierre de calle de rodaje BRAVO pero se ve con preocupacion que a la fecha de terminacion de este informe el contratista CONSORCIO TARQUI no ha iniciado actividades de demolicion de losas, lo unico que ha hecho en el area es unos cortes al rededor de las losas

7) Se recibio por parte del CONSORCIO TARQUI comunicado con nuevas fechas para nueva solicitud de Notam de cierre para arreglo de bache de pista, se esta revisando y estudiano las fechas propuestas por el contratista para poder dar un aval. Imga haráña solicitud de información a la Interventoría de Zeta, para saber si ellos van a solicitar Notam por desenergización del aeropuerto

OBRAS LADO AIRE

POBLACION BENEFICIADA

Según informes del DANE, la Ciudad de Leticia tiene una población de 55.000 habitantes y de acuerdo al Plan Maestro, el aeropuerto mueve alrededor de 280.000 personas al año, entre viajeros residentes de la ciudad y turistas, con una tasa de crecimiento del 3,43%. Las obras de mejoramiento y mantenimiento que se están ejecutando en el aeropuerto Vásquez Cobo permitirán potenciar el desarrollo del sector turístico y comercial de la región y del país, aportando así al desarrollo territorial.

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región. El PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se prevé que durante la etapa de mantenimiento se contará con cinco (5) profesionales y tres (3) especialistas como empleos directos, de acuerdo a la dedicación contemplada en el anexo técnico, más las cuadrillas de rocería, limpieza de cerramientos y canales, que de acuerdo a los ciclos de intervención, pueden representar entre 15 y 20 empleos directos mensuales. Durante la presente semana se contó con la presencia del Ingeniero Director de obra, el Ingeniero Residente de obra, y la Profesional SISOMA . Los empleos indirectos que se generan, están representados por las personas y/o lugares comerciales que se benefician de los empleados del Consorcio, como restaurantes, lavanderías, personas de servicios generales, etc.

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así: 1. Mantenimiento de las áreas del lado aire a fin de garantizar la seguridad aeroportuaria mediante l rocería de áreas verdes que pueden generar la aparición de fauna. 2. Mantenimiento de cerramientos que garantizaran la seguridad del aeropuerto y el ingreso de personal o animales al lado aire. 3. Mejoramiento del aterrizaje mediante la limpieza y retro de caucho. 4. Mejoramiento de la operación aérea mediante la señalización de las áreas de pista y plataforma. 5. Mejoramiento de descoles para garantizar el funcionamiento de los canales existentes.

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que generará beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria Liviana	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
		
Se cuenta con camioneta desde el 21 de marzo de 2025 / el contratista no cumple con la aplicación del manual de identidad de la Aerocivil	MOTOSIERRA	GUADAÑAS

El contratista a hecho entrega del listado de equipo mínimo requerido para las actividades; se le ha insistido que no debe ser el mismo que este siendo usado por otra contratista en el aeropuerto de Leticia

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoria	Director de interventoría	1	HV aprobada
	Residente de interventoría LA	1	HV aprobada
	Residente de interventoría LT	1	HV aprobada
	Especialista en pavimentos	1	HV aprobada
	Especialista hidráulico	1	HV aprobada
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
	Residente sisoma de interventoría	1	HV aprobada
	Topógrafo interventoría	1	HV aprobada
	Cadenero interventoría	1	HV aprobada
Personal Contratista	Director de obra	1	HV aprobada
	Residente de obra	1	HV aprobada
	Residente eléctrico	1	HV aprobada
	Inspector SISOMA	1	HV aprobada
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
	Especialista de pavimentos	1	HV aprobada
	Especialista eléctrico	1	HV aprobada
	Técnico Eléctrico	3	HV aprobada
	Topógrafo contratista	1	Cambio
	Cadenero contratista	1	HV aprobada

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
14/06/2026	RV: CIERRE POR PRECAUCION CALLE DE RODAJE BRAVO	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
16/06/2026	CIMGAIN–766–2026 -Radicación informes mensuales mes de mayo 2026 IMGA Ingenieros	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
16/06/2026	REUNIÓN - ACTA MES ABRIL CTO24001242 H4	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/06/2026	INFORME No. 70 LADO AIRE	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/06/2026	CIMGAIN–768–2026 - Respuesta comunicación 442-26 Entrega informe semanal No 070 Corresponde a la semana entre 6 y 12 de junio de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
17/06/2026	CIMGAIN-765-2026 VIG FUTURAS IMGA	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
17/06/2026	CIMGAIN764-2026 Solicitud de aprobación reajuste precios vigencias futuras CONSORCIO TARQUI	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
18/06/2026	Oficio 443-26 Solicitud de suspensión temporal y autorización de cesión de participación consorcial – Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024 (Consorcio Tarqui	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
18/06/2026	Oficio 444-26 OficinaProcedimiento constructivo de las actividades de obra no previstas y enmarcadas en el modificatorio No.1. Plan de control de calidad y ensayos de laboratorio. L	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
19/06/2026	CIMGAIN–769–2026 - Solicitud de aprobación laboratorio para ensayos de laboratorio para las muestras del CONSORCIO IMGA INGENIEROS (2	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
16/06/2026	Correo electrónico	Socialización NOTAM - TWY B CLSD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
16/06/2026	Correo electrónico	Solicitud de claridad sobre responsabilidad en la instalación de luces de la calle de rodaje Alpha	ADMINISTRACION AEROPUERTO	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/06/2026	Correo electrónico	Oficio 444-26 OficinaProcedimiento constructivo de las actividades de obra no previstas y enmarcadas en el modificatorio No.1. Plan de control de calidad y ensayos de laboratorio. L	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/06/2026	Correo electrónico	445_26 Oficina - Solicitud de Evaluación y Publicación de NOTAM para Intervención en Pista k0+840	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18/06/2026	Correo electrónico	Oficio 443-26 Solicitud de suspensión temporal y autorización de cesión de participación consorcial – Contrato de Obra No. 24001241 H4 de 2024 (Consorcio Tarqui)	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
19/06/2026	Correo electrónico	Comité seguimiento CTO MTTO - SKLT	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
20/06/2026	Correo electrónico	Oficio 446 Oficina INFORME SEMANAL N.71	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA OBRA


ACTAS	Valor Acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	$ 276.711.682,00	$ 42.392.230,00	$ 234.319.452,00	$ 3.545.288.318,00	
No. 2	$ 173.373.959,00	$ 26.560.891,00	$ 146.813.068,00	$ 3.371.914.359,00	
No. 3	$ 163.712.529,00	$ 25.080.759,00	$ 138.631.770,00	$ 3.208.201.830,00	
No. 4	$ 100.080.821,00	$ 15.322.382,00	$ 84.758.439,00	$ 3.108.121.009,00	
No. 5	$ 170.365.538,00	$ 26.100.000,00	$ 144.265.538,00	$ 2.937.755.471,00	
No. 6	$ 117.514.503,00	$ 18.003.221,86	$ 99.511.281,14	$ 2.820.240.968,00	
No. 7	$ 70.014.385,00	$ 10.726.203,78	$ 59.288.181,22	$ 2.750.226.583,00	$ 3.822.000.000,00
No. 8	$ 58.566.700,00	$ 8.972.418,44	$ 49.594.281,56	$ 2.691.659.883,00	
No. 9	$ 76.133.576,00	$ 11.663.664,00	$ 64.469.912,00	$ 2.615.526.307,00	
No. 10	$ 392.998.040,00	$ 60.207.300,00	$ 332.790.740,00	$ 2.222.528.267,00	
No. 11	$ 110.902.235,00	$ 16.990.222,00	$ 93.912.013,00	$ 2.111.626.032,00	
No. 12	$ 106.976.552,00	$ 16.388.808,00	$ 90.587.744,00	$ 2.004.649.480,00	
No. 13	$ 425.398.436,00	$ 148.889.453,00	$ 276.508.983,00	$ 1.579.251.044,00	
	$ 2.242.748.956,00				

CONTRATISTA INTERVENTORIA

ACTA No. 1	Valor acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	$ 141.913.832,00		$ 141.913.832,00	$ 1.543.663.068,00	
No. 2	$ 42.847.431,00		$ 42.847.431,00	$ 1.500.815.637,00	
No. 3	$ 39.480.155,00		$ 39.480.155,00	$ 1.461.335.482,00	
No. 4	$ 18.177.753,00		$ 18.177.753,00	$ 1.443.157.729,00	
No. 5	$ 80.183.061,00		$ 80.183.061,00	$ 1.362.974.668,00	
No. 6	$ 59.145.081,00		$ 59.145.081,00	$ 1.303.829.587,00	$ 1.685.576.900,00
No. 7	$ 40.693.236,00		$ 40.693.236,00	$ 1.263.136.351,00	
No. 8	$ 66.513.342,00		$ 66.513.342,00	$ 1.196.623.009,00	
No. 9	$ 77.487.917,00		$ 77.487.917,00	$ 1.119.135.092,00	
No. 10	$ 108.812.851,00		$ 108.812.851,00	$ 1.010.322.241,00	
No. 11	$ 42.620.320,00		$ 42.620.320,00	$ 967.701.921,00	
No. 12	$ 54.071.614,00		$ 54.071.614,00	$ 913.630.307,00	
	$ 771.946.593,00				

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA

PRESENTACION DE LA PROGRAMACION APROBADA MEDIANTE COMUNICADO CIMGAIN-646-2026 (26-3-2026)

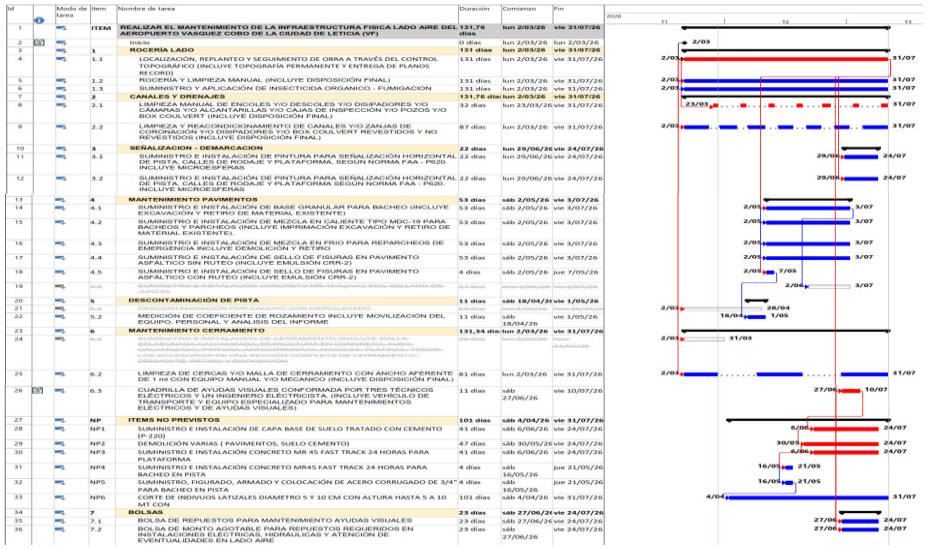


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		ITEM	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)**	131,76 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
2			Inicio	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26
3		1	**ROCERÍA LADO**	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
4		1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
5		1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
6		1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
7		2	**CANALES Y DRENAJES**	131,76 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
8		2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	32 días	lun 23/03/26	vie 31/07/26
9		2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	87 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
10		3	**SEÑALIZACION - DEMARCACION**	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
11		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
12		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
13		4	**MANTENIMIENTO PAVIMENTOS**	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
14		4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
15		4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
16		4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
17		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RIUTEO (INCLUYE EMULSION CRR-2)	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
18		4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RIUTEO (INCLUYE EMULSION CRR-2)	4 días	sáb 2/05/26	jue 7/05/26
19		4.6	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO MR 45 Kg/cm2 (INCL SELLADO DE JUNTAS	97 días	mar 2/06/26	vie 3/07/26
20		5	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
21		5.1	LIMPIEZA MANUAL CAUCHO CON HIDROLAVADO	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
22		5.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
23		6	**MANTENIMIENTO CERRAMIENTO**	131,34 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
24		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA, BELLOTINA, GAVIANDO, PUNTAL, ESTRIBO PARA ESQUINA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAJES, PLATINAS, CODO, LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO) DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN	48 días	lun 2/03/26	mar 5/05/26
25		6.2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 mt CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	81 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
26		6.3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELECTRICOS Y UN INGENIERO ELECTRICISTA (INCLUYE VEHÍCULO DE ASCENSO Y EL TIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	11 días	sáb 27/06/26	vie 10/07/26
27		NP	**ITEMS NO PREVISTOS**	101 días	sáb 4/04/26	vie 31/07/26
28		NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-230)	41 días	sáb 6/06/26	vie 24/07/26
29		NP2	DEMOLICIÓN VARIAS (PAVIMENTOS, SUELO CEMENTO)	47 días	sáb 30/05/26	vie 24/07/26
30		NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA	41 días	sáb 6/06/26	vie 24/07/26
31		NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA	4 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26
32		NP5	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA	4 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26
33		NP6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON	101 días	sáb 4/04/26	vie 31/07/26
34		7	**BOLSAS**	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26
35		7.1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26
36		7.2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26


AVANCE FISICO SEMANAL

Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Programado Inicial	Ejecutado	Desviacion
12-feb	14-feb		1	0,00%	0,00%	0,00%
15-feb	21-feb		2	0,00%	0,00%	0,00%
22-feb	28-feb		3	0,00%	0,00%	0,00%
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,31%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%
6-sep	12-sep		31	19,90%	19,71%	-0,20%
13-sep	19-sep		32	21,26%	20,49%	-0,77%
20-sep	26-sep		33	22,62%	21,75%	-0,87%
27-sep	3-oct	8	34	23,06%	23,65%	0,59%
4-oct	10-oct		35	23,49%	24,77%	1,28%
11-oct	17-oct		36	23,93%	25,76%	1,83%
18-oct	24-oct		37	24,37%	26,21%	1,84%
25-oct	31-oct	9	38	24,80%	26,21%	1,41%
1-nov	7-nov		39	26,65%	26,64%	-0,01%
8-nov	14-nov		40	28,49%	27,15%	-1,34%
15-nov	21-nov		41	31,27%	27,43%	-3,78%
22-nov	28-nov		42	33,93%	27,99%	-5,94%
29-nov	5-dic	10	43	39,63%	28,49%	-11,14%
6-dic	12-dic		44	45,33%	29,13%	-16,20%
13-dic	19-dic		45	51,03%	29,57%	-21,46%
20-dic	26-dic		46	56,25%	29,57%	-26,68%
27-dic	2-ene	11	47	61,46%	29,57%	-31,89%
3-ene	9-ene		48	62,21%	29,67%	-32,54%
10-ene	16-ene		49	62,96%	29,77%	-33,19%
17-ene	23-ene		50	63,71%	30,83%	-32,88%
24-ene	30-ene	12	51	64,45%	34,14%	-30,31%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,16%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%

Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Re-Programado	Ejecutado Reprogramacion	Desviacion
28-feb	6-mar		56	42,23%	42,03%	-0,20%
7-mar	13-mar		57	42,60%	42,61%	0,01%
14-mar	20-mar		58	42,98%	43,12%	0,14%
21-mar	27-mar		59	43,30%	44,12%	0,82%
28-mar	3-abr	14	60	43,49%	44,75%	1,26%
4-abr	10-abr		61	43,88%	45,28%	1,40%
11-abr	17-abr		62	44,20%	45,49%	1,29%
18-abr	24-abr		63	45,31%	45,75%	0,44%
25-abr	1-may	15	64	46,59%	47,55%	0,96%
2-may	8-may		65	47,13%	47,74%	0,61%
9-may	15-may		66	47,72%	48,85%	1,13%
16-may	22-may		67	49,40%	50,72%	1,32%
23-may	29-may	16	68	49,94%	58,68%	8,74%
30-may	5-jun		69	50,52%	58,82%	8,30%
6-jun	12-jun		70	53,54%	58,90%	5,36%
13-jun	19-jun		71	56,50%	59,21%	2,71%

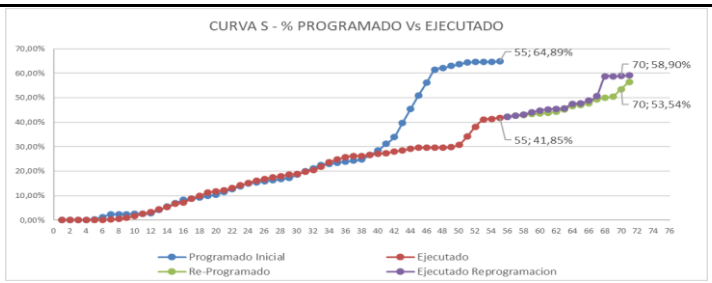

EJECUCION PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
12-feb	14-feb		1	0	0	0
15-feb	21-feb		2	0	0	0
22-feb	28-feb		3	0	0	0
1-mar	7-mar	1	4	7.198.992	0	-7.198.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251271	3.368.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11636.671	-74.467.888
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71.368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.414.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201983.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261898.260	252.568.855	-9.329.405
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.438	-39.435.216
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.670.859	-1933.725
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381738.878	26.759.364
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.946.564	52.592.121
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.191.173	52.461799
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.791583	29.230.815
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501048.297	15.656.135
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.805.264	13.581709
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.316.258	2.261308
26-jul	1-ago	6	25	591354.894	619.696.077	28.341184
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.769	30.981931
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.606.286	44.651504
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.848.846	43.594.121
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.752	51662.083
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.056.842	16.471787
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.131660	-7.483.780
13-sep	19-sep		32	812.645.827	783.098.207	-29.547.620
20-sep	26-sep		33	864.676.212	831244.143	-33.432.069
27-sep	3-oct	8	34	881321126	903.903.000	22.581874
4-oct	10-oct		35	897.966.040	946.709.400	48.743.360
11-oct	17-oct		36	914.610.954	984.547.200	69.936.246
18-oct	24-oct		37	931255.868	1001746.200	70.490.332
25-oct	31-oct	9	38	947.900.782	1001746.200	53.845.418
1-nov	7-nov		39	1018.372.148	1018. 180.800	-191348
8-nov	14-nov		40	1088.843.513	1037.673.000	-51170.513
15-nov	21-nov		41	1162.750.185	1048.374.600	-144.375.585
22-nov	28-nov		42	1296.656.856	1069.777.800	-226.879.056
29-nov	5-dic	10	43	1514.617.506	1088.887.800	-425.729.706
6-dic	12-dic		44	1732.578.157	1110.348.600	-619.229.557
13-dic	19-dic		45	1950.538.807	1.130. 155.400	-820.373.407
20-dic	26-dic		46	2.149.812.846	1.130. 155.400	-1019.647.446
27-dic	2-ene	11	47	2.349.086.884	1.130. 155.400	-1218.921484
3-ene	9-ene		48	2.377.668.278	1.133.987.400	-1243.680.878
10-ene	16-ene		49	2.406.249.672	1.197.809.400	-1268.440.272
17-ene	23-ene		50	2.434.831066	1.178.322.600	-1256.508.466
24-ene	30-ene	12	51	2.463.412.460	1.304.830.800	-1158.581660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.390	1458.475.200	-1009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471662.320	1567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1599.507.000	-880.405.180
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Re - Programado ($)	jecutado ($) - Reprogramacio	Pagado ($)
28-feb	6-mar		56	1613.911.526	1606.386.600	-7.524.926
7-mar	13-mar		57	1628.351320	1628.554.200	202.880
14-mar	20-mar		58	1642.791.114	1648.046.400	5.255.286
21-mar	27-mar		59	1654.926.908	1686.266.400	31339.492
28-mar	3-abr	14	60	1662.351262	1710.345.000	47.993.738
4-abr	10-abr		61	1677.037.885	1730.601600	53.563.715
11-abr	17-abr		62	1689.420.507	1738.627.800	49.207.293
18-abr	24-abr		63	1731625.432	1748.654.801	17.029.369
25-abr	1-may	15	64	1780.845.796	1817.361000	36.515.204
2-may	8-may		65	1801285.677	1824.622.800	23.337.123
9-may	15-may		66	1824.029.558	1867.047.000	43.017.442
16-may	22-may		67	1888.121277	1938.515.400	50.397.123
23-may	29-may	16	68	1908.561158	2.242.749.600	334.188.442
30-may	5-jun		69	1930.891847	2.248.100.400	317.208.553
6-jun	12-jun		70	2.046.319.224	2.251136.828	204.817.605
13-jun	19-jun		71	2.159.442.600	2.262.981222	103.538.622

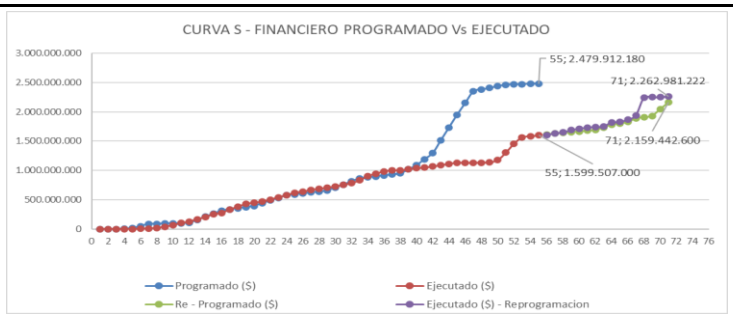

AVANCE TECNICO DE OBRA

Informe de Actividades Realizadas semana 71:

Durante la semana comprendida entre el 13 de junio de 2026 y el 19 de junio de 2026, el consorcio tarqui realizo las siguientes actividades:

- Ejecución de labores de localización y replanteo en el costado occidental y oriental de pista, en 0,00 Ha
- Ejecución de labores de rocería en el costado occidental y oriental de pista, en 4,04 Ha
- Aplicación de insecticida mediante fumigación en las áreas intervenidas con rocería en 4,04 Ha.
- Realización descontaminación de pista 0,00 m2
- Tratamiento de juntas con asfalto frio 0,09 m3
- Sello de fisuras 0,00 ml
- Suministro e instalación de pintura plataforma en 0,00 m2
- Limpieza de canales en 0,00 ml
- Limpieza de encoles y/o descoles en 0,00 un
- Limpieza de cerramiento perimetral en 664,94 ml
- Instalación de cerramiento 0,0 ml
- Suministro e instalación de suelo cemento 0,00 m3
- Demoliciones 00,00 m2
- Suministro e instacion concreto tipo MR45 00,00 m3
- Corte de individuos latizales 0,00 un

REGISTRO FOTOGRÁFICO












SE EVIDENCIAN EN LAS FOTOS EL INICIO DE CORTES DE JUNTAS EN LA ZONA DE LA PLATAFORMA A ADECUAR













SE EVIDENCIAN EN LAS FOTOS LA REALIZACION DE ROCERIA

OBSERVACIONES	Ingeniero Residente de Interventoría
- Se esta a la espera de concepto por parte de la supervisión sobre el tema del Reajuste del contrato de obra y el conrato de interventoria. - Se manifiesta y se deja claridad que a la fecha quedan menos de dos meses de tiempo, y no se ha definido por parte de la supervisión el alcance del contrato, en cuanto a si se debe incluir dentro del adicional la tala de árboles o continuar con el mantenimiento de losas y ciclos de mantenimiento en las demás actividades. - Se pactan precio de talas de árboles y se envía a la Entidad para su revisión y concepto. - Se solicita Notam de cierre por precaución a partir del 15 de junio de la calle de rodaje Bravo, para inicio de actividades de mantenimiento de losas frente a esta calle. - A la fecha del presente informe Cosnorcio Tarqui no ha iniciado actividades, sustentado en falta de recursos. - Se recibe comunicación por parte de Cosnorcio Tarqui, informando una inhabilidad sobreviniente de uno de sus consorciados y solicitan suspensión del contrato, mientras la Entidad emite pronunciamiento. De tal forma se toca el tema en comité técnico del día viernes 19 de junio de 2026, donde se aclara por parte de la Intervebtoría que los caminos son terminar el contrato o o evaluar si se aprueba el nuevo consorciado de acuerdo a los términos de la Licitación. Interventoría justifica técnicamente la no posibilidad de suspender el contrato, debido a las acciones que se han emprendido sobre el avance del mantenimiento de losas de plataforma.	 **ING. HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 08/MARZO/2020	Página: 1 de 5

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	27 de junio de 2026
Semana No.	72	**Del :**	20 de junio de 2026	**al**	26 de junio de 2026
Plazo total		534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		500	días	**Tiempo restante**	34 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		93,63%			
Nombre del Supervisor :	MARIA CONSUELO DURAN CARO				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	3,02%	**59,52%**	**(%) Ejecutado**	0,23%	**59,77%**
Valor programado ($)	$115.427.377	**$2.274.869.977**	**Valor ejecutado ($)**	$8.811.362,44	**$2.284.493.365**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	**0,25%**
				Valor Adelanto/Atraso	**$ 9.623.388,00**

OBSERVACIONES

1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados

2) Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se esta a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de arboles o en mantenimiento de losas en plataforma

3) Se realiza reunión con la entidad sobre el reajuste de precios del contrato, según recomendación dadas por personal de la Aerocivil, la cual se ajusta y se envía nuevamente a la supervisión para aprobacion por la aerocivil, se esta a la espera del oficio de aprobacion por parte de la aerocivil.

4) Se efectúa reajuste del contrato de Interventoría, el cual se envía a la supervisión para su concepto. Se esta a la espera de aprobacion por parte de la aerocivil, se aclara que queda un mes para la terminación de tiempo contractual

5) Se solicita Notam de cierre por precacución a partir del 15 de junio de la calle de rodaje Bravo, para inicio de actividades de mantenimiento de losas frente a esta calle y a la fecha de cierre de este informe el contratista no ha iniciado actividades de demolicion y suministro de MR-45 para las losas de la plataforma

6) Se solicita Notam de cierre del Aeropuerto para los días 25, 26 y 27 de julio de 2026 por temas de construcción de bache en la pista

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO TARQUÍ	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001241 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 3.822.000.000,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 585.511.508	**Valor Anticipo:**	
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	20,00	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	20,00	**Plazo actualizado:**	20,00
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 3.822.000.000	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1) Se firma la bitácora semanal con los avances de obras ejecutados

2) Se informo que se está estudiando la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato para continuar con los mantenimientos hasta el 31 de diciembre de 2026 y se solicitó presentar el acta de modificación de prorroga y adición, para revisión y solicitud de aprobación del área ejecutora. Se esta a la espera que la entidad nos confirme si la adición la enfocamos en tala de arboles o en mantenimiento de losas en plataforma

3) Se realiza reunión con la entidad sobre el reajuste de precios del contrato, según recomendación dadas por personal de la Aerocivil, la cual se ajusta y se envía nuevamente a la supervisión para aprobacion por la aerocivil, se esta a la espera del oficio de aprobacion por parte de la aerocivil.

4) Se efectúa reajuste del contrato de Interventoría, el cual se envía a la supervisión para su concepto. Se esta a la espera de aprobacion por parte de la aerocivil, se aclara que queda un mes para la terminación de tiempo contractual

5) Se solicita Notam de cierre por precacución a partir del 15 de junio de la calle de rodaje Bravo, para inicio de actividades de mantenimiento de losas frente a esta calle y a la fecha de cierre de este informe el contratista no ha iniciado actividades de demolicion y suministro de MR-45 para las losas de la plataforma

6) En el periodo se continuaron con las actividades de limpieza de encoles y descoles y limpieza de cerca

7) Se recibió por parte del CONSORCIO TARQUI comunicado con nuevas fechas para nueva solicitud de Notam de cierre para arreglo de bache de pista, el cual se solicita directamente la Entidad y se programa socialización con las diferentes instituciones de letica para el día martes 30 de junio

OBRAS LADO AIRE

POBLACION BENEFICIADA

Según informes del DANE, la Ciudad de Leticia tiene una población de 55.000 habitantes y de acuerdo al Plan Maestro, el aeropuerto mueve alrededor de 280.000 personas al año, entre viajeros residentes de la ciudad y turistas, con una tasa de crecimiento del 3,43%. Las obras de mejoramiento y mantenimiento que se están ejecutando en el aeropuerto Vásquez Cobo permitirán potenciar el desarrollo del sector turístico y comercial de la región y del país, aportando así al desarrollo territorial.

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región. El PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se prevé que durante la etapa de mantenimiento se contará con cinco (5) profesionales y tres (3) especialistas como empleos directos, de acuerdo a la dedicación contemplada en el anexo técnico, más las cuadrillas de rocería, limpieza de cerramientos y canales, que de acuerdo a los ciclos de intervención, pueden representar entre 15 y 20 empleos directos mensuales. Durante la presente semana se contó con la presencia del Ingeniero Director de obra, el Ingeniero Residente de obra, y la Profesional SISOMA . Los empleos indirectos que se generan, están representados por las personas y/o lugares comerciales que se benefician de los empleados del Consorcio, como restaurantes, lavanderías, personas de servicios generales, etc.

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así: 1. Mantenimiento de las áreas del lado aire a fin de garantizar la seguridad aeroportuaria mediante l rocería de áreas verdes que pueden generar la aparición de fauna. 2. Mantenimiento de cerramientos que garantizaran la seguridad del aeropuerto y el ingreso de personal o animales al lado aire. 3. Mejoramiento del aterrizaje mediante la limpieza y retro de caucho. 4. Mejoramiento de la operación aérea mediante la señalización de las áreas de pista y plataforma. 5. Mejoramiento de descoles para garantizar el funcionamiento de los canales existentes.

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que generará beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria Liviana	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
		
Se cuenta con camioneta desde el 21 de marzo de 2025 / el contratista no cumple con la aplicación del manual de identidad de la Aerocivil	MOTOSIERRA	GUADAÑAS

El contratista a hecho entrega del listado de equipo mínimo requerido para las actividades; se le ha insistido que no debe ser el mismo que este siendo usado por otra contratista en el aeropuerto de Leticia

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de interventoría	Director de interventoría	1	HV aprobada
	Residente de interventoría LA	1	HV aprobada
	Residente de interventoría LT	1	HV aprobada
	Especialista en pavimentos	1	HV aprobada
	Especialista hidráulico	1	HV aprobada
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
	Residente sisoma de interventoría	1	HV aprobada
	Topógrafo interventoría	1	HV aprobada
	Cadenero interventoría	1	HV aprobada
Personal Contratista	Director de obra	1	HV aprobada
	Residente de obra	1	HV aprobada
	Residente eléctrico	1	HV aprobada
	Inspector SISOMA	1	HV aprobada
	Especialista aeroportuario	1	HV aprobada
	Especialista de pavimentos	1	HV aprobada
	Especialista eléctrico	1	HV aprobada
	Técnico Eléctrico	3	HV aprobada
	Topógrafo contratista	1	Cambio
	Cadenero contratista	1	HV aprobada

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	ASUNTO	CODIGO/TIPO	DIRIGIDO A
20/06/2026	APUs TALA ARBOLES	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
22/06/2026	CIMGAIN–673–2026 -Solicitud NOTAM bache pista	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
22/06/2026	INFORME SEMANAL LADO AIRE No. 71	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
22/06/2026	CIMGAIN–775–2026 - Concepto de aprobación – Plano General de Pista y Señalización	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
22/06/2026	CIMGAIN–774–2026 - Respuesta comunicación 446-26 Entrega informe semanal No 071 Corresponde a la semana entre 13 y 19 de junio de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
23/06/2026	CIMGAIN–776–2026 -Alerta no inicio de actividades de mantenimiento de losas de plataforma frente a calle de rodaje BRAVO	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
23/06/2026	CIMGAIN–734–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 12 Abril Imga	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
23/06/2026	CIMGAIN–772–2026 - Concepto suspensión LA Tarqui	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
23/06/2026	Oficio 444-26 OficinaProcedimiento constructivo de las actividades de obra no previstas y enmarcadas en el modificatorio No.1. Plan de control de calidad y ensayos de laboratorio. L	Correo electrónico	ESPECIALISTA
24/06/2026	CIMGAIN–779–2026 - Respuesta comunicación 447-26 del 23 de junio - Alerta por riesgo de retraso – Falta de aprobación de ajuste a planos de señalización horizontal	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
24/06/2026	CIMGAIN–780–2026 -Respuesta comunicación 444-26 Oficina Procedimiento constructivo de las actividades de obra no previstas y enmarcadas en el modificatorio No.1. Plan de control de calidad y ensayos de laboratorio fechado del 18 de junio de 2026	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
24/06/2026	CIMGAIN–769–2026 - Solicitud de aprobación laboratorio para ensayos de laboratorio para las muestras del CONSORCIO IMGA INGENIEROS (2)	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
25/06/2026	CIMGAIN–782–2026 - Nacionalización de materiales que se utilizaran en la ejecución de mantenimiento de losas de plataforma	Correo electrónico	CONSORCIO TARQUI
25/06/2026	CIMGAIN–781–2026 - Solicitud de act señalización y demarcación	Correo electrónico	3B PROYECTOS SAS
25/06/2026	CIMGAIN–783–2026 - Suscripción de comunicaciones	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/06/2026	CIMGAIN–778–2026 - Acta de recibo parcial de interventoría No 13 del periodo 01-05-2026 al 31-05-2026	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
26/06/2026	CIMGAIN–758–2026 - Radicación acta de obra No 13 Lado Aire, periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026 Consorcio Tarqui	Correo electrónico	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
23/06/2026	Correo electrónico	Oficio 447-26 Alerta por riesgo de retraso en ruta crítica – Falta de aprobación de ajuste a planos de señalización horizontal (ítems 3.1 y 3.3). Contrato No. 24001241	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
24/06/2026	Correo electrónico	Revisión Procedimiento Constructivo Modificatorio N°1 (Oficio No. 444-26)	ESPECIALISTA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/06/2026	Correo electrónico	Oficio 448-26 Documentación proveedor de concreto - GRUPO AQ S.A.S	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/06/2026	Correo electrónico	Convocatoria sesión CDM – Socialización de solicitud de NOTAM - CIERRE DE PISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
26/06/2026	Correo electrónico	Oficio 450-26 Oficina FACTURA DE COBRO No. CTL 14 ACTA DE OBRA. No.13 Mayo de 2026	CONSORCIO TARQUI	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA OBRA


ACTAS	Valor Acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	$ 276.711.682,00	$ 42.392.230,00	$ 234.319.452,00	$ 3.545.288.318,00	
No. 2	$ 173.373.959,00	$ 26.560.891,00	$ 146.813.068,00	$ 3.371.914.359,00	
No. 3	$ 163.712.529,00	$ 25.080.759,00	$ 138.631.770,00	$ 3.208.201.830,00	
No. 4	$ 100.080.821,00	$ 15.322.382,00	$ 84.758.439,00	$ 3.108.121.009,00	
No. 5	$ 170.365.538,00	$ 26.100.000,00	$ 144.265.538,00	$ 2.937.755.471,00	
No. 6	$ 117.514.503,00	$ 18.003.221,86	$ 99.511.281,14	$ 2.820.240.968,00	
No. 7	$ 70.014.385,00	$ 10.726.203,78	$ 59.288.181,22	$ 2.750.226.583,00	$ 3.822.000.000,00
No. 8	$ 58.566.700,00	$ 8.972.418,44	$ 49.594.281,56	$ 2.691.659.883,00	
No. 9	$ 76.133.576,00	$ 11.663.664,00	$ 64.469.912,00	$ 2.615.526.307,00	
No. 10	$ 392.998.040,00	$ 60.207.300,00	$ 332.790.740,00	$ 2.222.528.267,00	
No. 11	$ 110.902.235,00	$ 16.990.222,00	$ 93.912.013,00	$ 2.111.626.032,00	
No. 12	$ 106.976.552,00	$ 16.388.808,00	$ 90.587.744,00	$ 2.004.649.480,00	
No. 13	$ 425.398.436,00	$ 148.889.453,00	$ 276.508.983,00	$ 1.579.251.044,00	
	$ 2.242.748.956,00				

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

ACTA No. 1	Valor acta	AMORTIZACION	VALOR ACTA	PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR CONTRACTUAL
No. 1	$ 141.913.832,00		$ 141.913.832,00	$ 1.543.663.068,00	
No. 2	$ 42.847.431,00		$ 42.847.431,00	$ 1.500.815.637,00	
No. 3	$ 39.480.155,00		$ 39.480.155,00	$ 1.461.335.482,00	
No. 4	$ 18.177.753,00		$ 18.177.753,00	$ 1.443.157.729,00	
No. 5	$ 80.183.061,00		$ 80.183.061,00	$ 1.362.974.668,00	
No. 6	$ 59.145.081,00		$ 59.145.081,00	$ 1.303.829.587,00	
No. 7	$ 40.693.236,00		$ 40.693.236,00	$ 1.263.136.351,00	$ 1.685.576.900,00
No. 8	$ 66.513.342,00		$ 66.513.342,00	$ 1.196.623.009,00	
No. 9	$ 77.487.917,00		$ 77.487.917,00	$ 1.119.135.092,00	
No. 10	$ 108.812.851,00		$ 108.812.851,00	$ 1.010.322.241,00	
No. 11	$ 42.620.320,00		$ 42.620.320,00	$ 967.701.921,00	
No. 12	$ 54.071.614,00		$ 54.071.614,00	$ 913.630.307,00	
	$ 771.946.593,00				

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA


PRESENTACION DE LA PROGRAMACION APROBADA MEDIANTE COMUNICADO CIMGAIN-646-2026 (26-3-2026)

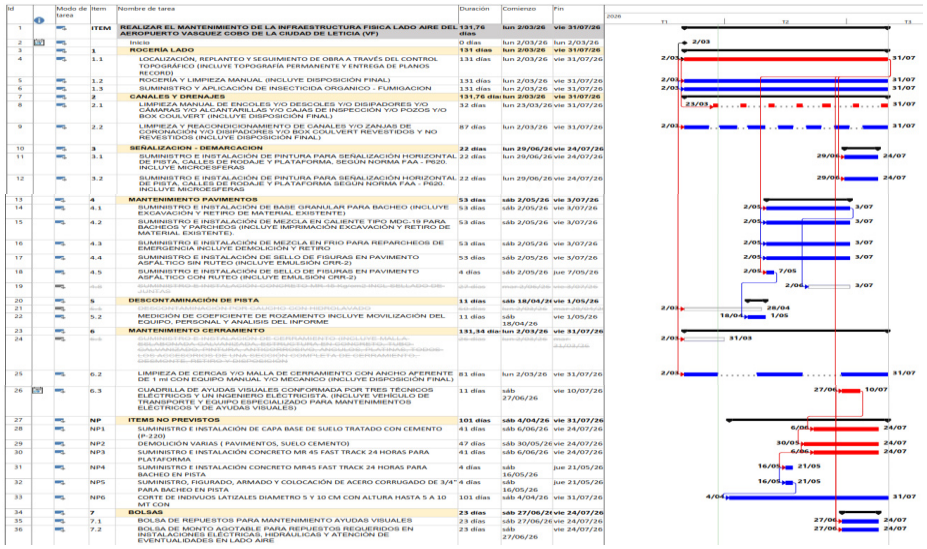


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		ITEM	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)**	131,76 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
2			Inicio	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26
3		1	**ROCERÍA LADO**	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
4		1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA A TRAVÉS DEL CONTROL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TOPOGRAFÍA PERMANENTE Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
5		1.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
6		1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSECTICIDA ORGANICO - FUMIGACION	131 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
7		2	**CANALES Y DRENAJES**	131,76 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
8		2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	32 días	lun 23/03/26	vie 31/07/26
9		2.2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	87 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
10		3	**SEÑALIZACION - DEMARCACION**	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
11		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
12		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620. INCLUYE MICROESFERAS	22 días	lun 29/06/26	vie 24/07/26
13		4	**MANTENIMIENTO PAVIMENTOS**	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
14		4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
15		4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
16		4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
17		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RIUTEO (INCLUYE EMULSION CRR-2)	53 días	sáb 2/05/26	vie 3/07/26
18		4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RIUTEO (INCLUYE EMULSION CRR-2)	4 días	sáb 2/05/26	jue 7/05/26
19		4.6	~~SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO MR 45 Kg/cm2 INCL SELLADO DE JUNTAS~~	~~17 días~~	~~mar 2/06/26~~	~~vie 3/07/26~~
20		5	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
21		5.1	~~LIMPIEZA MECANICA CON HIDROLAVADO~~	~~11 días~~	~~sáb 18/04/26~~	~~vie 1/05/26~~
22		5.2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	11 días	sáb 18/04/26	vie 1/05/26
23		6	**MANTENIMIENTO CERRAMIENTO**	131,34 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
24		6.1	~~SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, INTURA, ANTIOXIDANTE, ANGULOS, PLATINAS, CODO, LOS ACCESORIOS DE UNA SECCION COMPLETA DE CERRAMIENTO) DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION~~	~~46 días~~	~~lun 2/03/26~~	~~mar 21/04/26~~
25		6.2	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 mt CON EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	81 días	lun 2/03/26	vie 31/07/26
26		6.3	CUADRILLA DE AYUDAS VISUALES CONFORMADA POR TRES TÉCNICOS ELECTRICOS Y UN INGENIERO ELECTRICISTA. (INCLUYE VEHÍCULO DE ASCENSO Y EL TIPO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTOS ELECTRICOS Y DE AYUDAS VISUALES)	11 días	sáb 27/06/26	vie 10/07/26
27		NP	**ITEMS NO PREVISTOS**	101 días	sáb 4/04/26	vie 31/07/26
28		NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA BASE DE SUELO TRATADO CON CEMENTO (P-230)	41 días	sáb 6/06/26	vie 24/07/26
29		NP2	DEMOLICIÓN VARIAS (PAVIMENTOS, SUELO CEMENTO)	47 días	sáb 30/05/26	vie 24/07/26
30		NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR 45 FAST TRACK 24 HORAS PARA PLATAFORMA	41 días	sáb 6/06/26	vie 24/07/26
31		NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO MR45 FAST TRACK 24 HORAS PARA BACHEO EN PISTA	4 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26
32		NP5	SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO DE 3/4" PARA BACHEO EN PISTA	4 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26
33		NP6	CORTE DE INDIVUOS LATIZALES DIAMETRO 5 Y 10 CM CON ALTURA HASTA 5 A 10 MT CON	101 días	sáb 4/04/26	vie 31/07/26
34		7	**BOLSAS**	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26
35		7.1	BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AYUDAS VISUALES	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26
36		7.2	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRÁULICAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE	23 días	sáb 27/06/26	vie 24/07/26

AVANCE FISICO SEMANAL

Inicio sem	Fin de la	Mes	Semana	Programado Inicial	Ejecutado	Desviacion
12-feb	14-feb		1	0,00%	0,00%	0,00%
15-feb	21-feb		2	0,00%	0,00%	0,00%
22-feb	28-feb		3	0,00%	0,00%	0,00%
1-mar	7-mar	1	4	0,19%	0,00%	-0,19%
8-mar	14-mar		5	0,38%	0,02%	-0,36%
15-mar	21-mar		6	1,13%	0,09%	-1,23%
22-mar	28-mar		7	2,25%	0,30%	-1,95%
29-mar	4-abr	2	8	2,35%	0,48%	-1,87%
5-abr	11-abr		9	2,45%	1,05%	-1,40%
12-abr	18-abr		10	2,55%	1,69%	-0,86%
19-abr	25-abr		11	2,65%	2,67%	0,02%
26-abr	2-may	3	12	2,74%	3,29%	0,54%
3-may	9-may		13	4,11%	4,37%	0,26%
10-may	16-may		14	5,48%	5,28%	-0,20%
17-may	23-may		15	6,85%	6,61%	-0,24%
24-may	30-may	4	16	8,22%	7,19%	-1,03%
31-may	6-jun		17	8,75%	8,70%	-0,05%
7-jun	13-jun		18	9,29%	9,99%	0,70%
14-jun	20-jun		19	9,82%	11,20%	1,38%
21-jun	27-jun		20	10,35%	11,73%	1,37%
28-jun	4-jul	5	21	11,53%	12,29%	0,76%
5-jul	11-jul		22	12,70%	13,11%	0,41%
12-jul	18-jul		23	13,87%	14,23%	0,36%
19-jul	25-jul		24	15,05%	15,11%	0,06%
26-jul	1-ago	6	25	15,47%	16,21%	0,74%
2-ago	8-ago		26	15,90%	16,71%	0,81%
9-ago	15-ago		27	16,33%	17,49%	1,17%
16-ago	22-ago		28	16,75%	17,89%	1,14%
23-ago	29-ago		29	17,18%	18,53%	1,35%
30-ago	5-sep	7	30	18,54%	18,97%	0,43%
6-sep	12-sep		31	19,90%	19,71%	-0,20%
13-sep	19-sep		32	21,26%	20,49%	-0,77%
20-sep	26-sep		33	22,62%	21,75%	-0,87%
27-sep	3-oct	8	34	23,06%	23,65%	0,59%
4-oct	10-oct		35	23,49%	24,77%	1,28%
11-oct	17-oct		36	23,93%	25,76%	1,83%
18-oct	24-oct		37	24,37%	26,21%	1,84%
25-oct	31-oct	9	38	24,80%	26,21%	1,41%
1-nov	7-nov		39	26,65%	26,64%	-0,01%
8-nov	14-nov		40	28,49%	27,15%	-1,34%
15-nov	21-nov		41	31,21%	27,43%	-3,78%
22-nov	28-nov		42	33,93%	27,99%	-5,94%
29-nov	5-dic	10	43	39,63%	28,49%	-11,14%
6-dic	12-dic		44	45,33%	29,13%	-16,20%
13-dic	19-dic		45	51,03%	29,57%	-21,46%
20-dic	26-dic		46	56,25%	29,57%	-26,68%
27-dic	2-ene	11	47	61,46%	29,57%	-31,89%
3-ene	9-ene		48	62,21%	29,67%	-32,54%
10-ene	16-ene		49	62,96%	29,77%	-33,19%
17-ene	23-ene		50	63,71%	30,83%	-32,88%
24-ene	30-ene	12	51	64,45%	34,14%	-30,31%
31-ene	6-feb		52	64,56%	38,16%	-26,40%
7-feb	13-feb		53	64,67%	41,01%	-23,66%
14-feb	20-feb		54	64,78%	41,40%	-23,38%
21-feb	27-feb	13	55	64,89%	41,85%	-23,04%
Inicio sem	**Fin de la**	**Mes**	**Semana**	**Re-Programado**	**Ejecutado Reprogramacion**	**Desviacion**
28-feb	6-mar		56	42,23%	42,03%	-0,20%
7-mar	13-mar		57	42,60%	42,61%	0,01%
14-mar	20-mar		58	42,98%	43,12%	0,14%
21-mar	27-mar		59	43,30%	44,12%	0,82%
28-mar	3-abr	14	60	43,49%	44,75%	1,26%
4-abr	10-abr		61	43,88%	45,28%	1,40%
11-abr	17-abr		62	44,20%	45,49%	1,29%
18-abr	24-abr		63	45,31%	45,75%	0,44%
25-abr	1-may	15	64	46,59%	47,55%	0,96%
2-may	8-may		65	47,13%	47,74%	0,61%
9-may	15-may		66	47,72%	48,85%	1,13%
16-may	22-may		67	49,40%	50,72%	1,32%
23-may	29-may	16	68	49,94%	58,68%	8,74%
30-may	5-jun		69	50,52%	58,82%	8,30%
6-jun	12-jun		70	53,54%	59,26%	5,72%
13-jun	18-jun		71	56,50%	59,54%	3,04%
20-jun	26-jun		72	59,52%	59,77%	0,25%

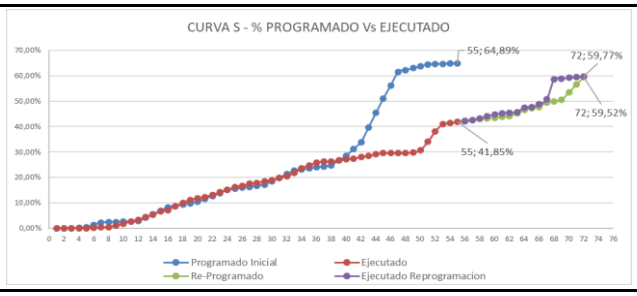

EJECUCION PRESUPUESTAL SEMANAL						
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Programado ($)	Ejecutado ($)	Pagado ($)
12-feb	14-feb		1	0	0	0
15-feb	21-feb		2	0	0	0
22-feb	28-feb		3	0	0	0
1-mar	7-mar	1	4	7.198.992	0	-7.198.992
8-mar	14-mar		5	14.397.984	699.958	-13.698.026
15-mar	21-mar		6	50.251.271	3.368.889	-46.882.382
22-mar	28-mar		7	86.104.558	11636.671	-74.467.888
29-mar	4-abr	2	8	89.864.462	18.496.354	-71368.108
5-abr	11-abr		9	93.624.366	40.237.107	-53.387.259
12-abr	18-abr		10	97.384.270	64.416.699	-32.969.571
19-abr	25-abr		11	101.144.174	101870.734	726.560
26-abr	2-may	3	12	104.904.078	125.626.545	20.722.467
3-may	9-may		13	157.235.472	167.126.259	9.890.787
10-may	16-may		14	209.566.866	201983.901	-7.582.965
17-may	23-may		15	261898.260	252.568.855	-9.329.405
24-may	30-may	4	16	314.229.654	274.794.438	-39.435.216
31-may	6-jun		17	334.604.584	332.670.859	-1933.725
7-jun	13-jun		18	354.979.514	381738.878	26.759.364
14-jun	20-jun		19	375.354.444	427.946.564	52.592.121
21-jun	27-jun		20	395.729.374	448.191.173	52.461799
28-jun	4-jul	5	21	440.560.768	469.791583	29.230.815
5-jul	11-jul		22	485.392.162	501048.297	15.656.135
12-jul	18-jul		23	530.223.556	543.805.264	13.581709
19-jul	25-jul		24	575.054.950	577.316.258	2.261308
26-jul	1-ago	6	25	591354.894	619.696.077	28.341.184
2-ago	8-ago		26	607.654.838	638.636.769	30.981931
9-ago	15-ago		27	623.954.782	668.606.286	44.651504
16-ago	22-ago		28	640.254.726	683.848.846	43.594.121
23-ago	29-ago		29	656.554.669	708.216.752	51662.083
30-ago	5-sep	7	30	708.585.055	725.056.842	16.471787
6-sep	12-sep		31	760.615.441	753.131660	-7.483.780
13-sep	19-sep		32	812.645.827	783.098.207	-29.547.620
20-sep	26-sep		33	864.676.212	831244.143	-33.432.069
27-sep	3-oct	8	34	881321.126	903.903.000	22.581.874
4-oct	10-oct		35	897.966.040	946.709.400	48.743.360
11-oct	17-oct		36	914.610.954	984.547.200	69.936.246
18-oct	24-oct		37	931255.868	1001746.200	70.490.332
25-oct	31-oct	9	38	947.900.782	1001746.200	53.845.418
1-nov	7-nov		39	1018.372.148	1018.180.800	-191348
8-nov	14-nov		40	1.088.843.513	1037.673.000	-51170.513
15-nov	21-nov		41	1.192.750.185	1048.374.600	-144.375.585
22-nov	28-nov		42	1296.656.856	1069.777.800	-226.879.056
29-nov	5-dic	10	43	1.514.617.506	1088.887.800	-425.729.706
6-dic	12-dic		44	1.732.578.157	1.113.348.600	-619.229.557
13-dic	19-dic		45	1.950.538.807	1.130.165.400	-820.373.407
20-dic	26-dic		46	2.149.812.846	1.130.165.400	-1019.647.446
27-dic	2-ene	11	47	2.349.086.884	1.130.165.400	-1218.921.484
3-ene	9-ene		48	2.377.668.278	1.133.987.400	-1243.680.878
10-ene	16-ene		49	2.406.249.672	1.137.809.400	-1268.440.272
17-ene	23-ene		50	2.434.831066	1.178.322.600	-1256.508.466
24-ene	30-ene	12	51	2.463.412.460	1.304.830.800	-1158.581.660
31-ene	6-feb		52	2.467.537.390	1458.475.200	-1009.062.190
7-feb	13-feb		53	2.471662.320	1567.402.200	-904.260.120
14-feb	20-feb		54	2.475.787.250	1582.308.000	-893.479.250
21-feb	27-feb	13	55	2.479.912.180	1599.507.000	-880.405.180
Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Re - Programado ($)	Ejecutado ($) - Reprogramacio	Pagado ($)
28-feb	6-mar		56	1613.911526	1606.386.600	-7.524.926
7-mar	13-mar		57	1628.351.320	1628.554.200	202.880
14-mar	20-mar		58	1642.791.114	1648.046.400	5.255.286
21-mar	27-mar		59	1654.926.908	1686.266.400	31339.492
28-mar	3-abr	14	60	1662.351262	1710.345.000	47.993.738
4-abr	10-abr		61	1677.037.885	1730.601600	53.563.715
11-abr	17-abr		62	1689.420.507	1738.627.800	49.207.293
18-abr	24-abr		63	1731625.432	1748.654.801	17.029.369
25-abr	1-may	15	64	1.780.845.796	1.817.361.000	36.515.204
2-may	8-may		65	1801285.677	1824.622.800	23.337.123
9-may	15-may		66	1824.029.558	1867.047.000	43.017.442
16-may	22-may		67	1888.121277	1938.518.400	50.397.123
23-may	29-may	16	68	1908.561.158	2.242.749.600	334.188.442
30-may	5-jun		69	1930.891847	2.248.100.400	317.208.553
6-jun	12-jun		70	2.046.319.224	2.265.031017	218.711794
13-jun	19-jun		71	2.159.442.600	2.275.682.003	116.239.403
20-jun	26-jun		72	2.274.869.976	2.284.409.400	9.539.424

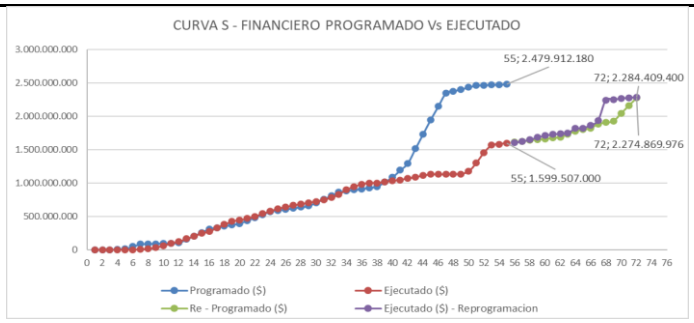


AVANCE TECNICO DE OBRA

Informe de Actividades Realizadas semana 72:


Durante la semana comprendida entre el 20 de junio de 2026 y el 26 de junio de 2026, el consorcio tarqui realizo las siguientes actividades:

- Ejecución de labores de localización y replanteo en el costado occidental y oriental de pista, en 0,00 Ha
- Ejecución de labores de rocería en el costado occidental y oriental de pista, en 0,00 Ha
- Aplicación de insecticida mediante fumigación en las áreas intervenidas con rocería en 0,00 Ha.
- Realización descontaminación de pista 0,00 m2
- Tratamiento de juntas con asfalto frio 0,00 m3
- Sello de fisuras 0,00 ml
- Suministro e instalación de pintura plataforma en 0,00 m2
- Limpieza de canales en 0,00 ml
- Limpieza de encoles y/o descoles en 6,00 un
- Limpieza de cerramiento perimetral en 824,06 ml
- Instalación de cerramiento 0,0 ml
- Suministro e instalación de suelo cemento 0,00 m3
- Demoliciones 00,00 m2
- Suministro e instacion concreto tipo MR45 00,00 m3
- Corte de individuos latizales 0,00 un

REGISTRO FOTOGRÁFICO













SE EVIDENCIAN EN LAS FOTOS LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA DE LA MALLA PERIMETRAL





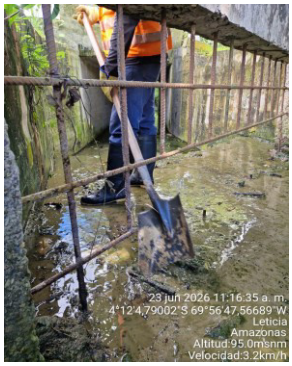SE EVIDENCIAN EN LAS FOTOS LA REALIZACION DE DE LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES

OBSERVACIONES	Ingeniero Residente de Interventoría
- Se esta a la espera de concepto por parte de la supervisión sobre el tema del Reajuste del contrato de obra y el conrato de interventoria. - Se manifiesta y se deja claridad que a la fecha queda un mes de tiempo, y no se ha definido por parte de la supervisión el alcance del contrato, en cuanto a si se debe incluir dentro del adicional la tala de árboles o continuar con el mantenimiento de losas y ciclos de mantenimiento en las demás actividades. - Se pactan precio de talas de árboles y se envía a la Entidad para su revisión y concepto. - Se solicita Notam de cierre por precaución a partir del 15 de junio de la calle de rodaje Bravo, para inicio de actividades de mantenimiento de losas frente a esta calle y a la fecha de cierre de este informe no se han iniciado actividades en esta zona por parte del contratista. - Se efectúa solicitud de Notam de cierre del aeropuerto drsde el 25 de julio 9 Pm hasta el día lunes 27 de julio 2 PM. Se hace incitación a los diferentes actores del amazonas para socialización de dicho Notma para el 30 de junio de 2026.	ING. HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS

ANEXO 6. INFORME CLIMATOLÓGICO

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO TARQUI NIT:901.896.571-7	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DEL AEROPUERTO ALFEDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA, AMAZONAS			
Contrato Obra No. 24001241 H4 DE 2024	Formato 01-H4-CC	**Control Climatológico**	Version 1	feb-25

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTROL DE VERSIONES

Elaboro:	Cargo	Firma		Aprobó	Cargo	Firma	
JAIME ANDRES HENAO MELO	Director de obra			Diego Mauricio Galan E.	Representante legal		

Dia	Periodo de lluvias			Tipo			Reinicio de actividades		Total horas laboradas dia	Observaciones
	De	A	Total	F	M	S	De	A		
1/07/2026	15:15	16:00	0:45						7:15	Fuertes lluvias
2/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	Lluvias moderadas
3/07/2026	15:15	16:00	0:45						7:15	Dia soleado
4/07/2026	0:00	0:00	0:00						4:00	
5/07/2026	0:00	0:00	0:00						0:00	
6/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
7/07/2026	14:00	15:00	1:00						7:00	
8/07/2026	10:00	11:00	1:00						7:00	
9/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
10/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
11/07/2026	0:00	0:00	0:00						4:00	
12/07/2026	0:00	0:00	0:00						0:00	
13/07/2026	0:00	0:00	0:00						0:00	
14/07/2026	0:00	0:00	0:00							
15/07/2026	12:30	13:30	1:00							
16/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
17/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
18/07/2026	0:00	0:00	0:00						4:00	
19/07/2026			0:00						0:00	
20/07/2026			0:00						0:00	
21/07/2026										
22/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
23/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
24/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
25/07/2026	0:00	0:00	0:00						4:00	
26/07/2026	0:00	0:00	0:00						0:00	
27/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
28/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
29/07/2026	0:00	0:00	0:00						8:00	
30/07/2026			0:00						8:00	
31/07/2026			0:00						8:00	
	TOTAL HORAS DE LLUVIA		**4:30:00**				**TOTAL HORAS LABORADAS**		**156:30:00**	

DURANTE EL MES, NO SE PUDIERON LABORAR EN HORARIO COMPLETO DÚRANTE 1,7 DÍAS DEBIDO AL FACTOR CLIMÁTICO.

Firma
Nombre FABIAN PINEDO WALDRON
Cargo Ingeniero residente de oba
Contratista Consorcio Tarqui

Firma
Nombre HERNAN ALEXIS VILLAMIL VARGAS
Cargo Ingeniero residente de interventoría
Contratista Consorcio Imga Ingenieros

ANEXO 7. INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO TARQUI

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 16

PERÍODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CONSORCIO TARQUI

CONTRATO DE OBRA NO. 24001241 H4 DE 2024

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)



INTERVENTORÍA


CONSORCIO IMGA INGENIEROS

LETICIA, JUNIO DE 2026

Versión	Fecha	Descripción de Modificación	Folios
Versión 01	01/07/2026	Presentación Inicial.	42
Versión 02	07/07/2026	Observaciones de Forma	42

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

CONSORCIO TARQUI		
Elaboró	Reviso	Aprobó
		
Ing. Laura Mejía Moreno	**Ing. Jaime Andrés Henao**	**Ing. Diego Mauricio Galán**
Profesional Ambiental	**Director de obra**	**Representante legal**
01/07/2026	**01/07/2026**	**01/07/2026**

INTERVENTORIA CONSORCIO IMGA INGENIEROS	
Revisó	Aprobó
	
Ing. Hernán Villamil	**Ing. Julio Roberto Chaparro**
Residente de Interventoría	**Director de Interventoría**

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto bajo responsabilidad del CONSORCIO TARQUI, consiste en contrato de obra No. 24001241 H4 DE 2024, cuyo objeto corresponde a "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)", por un valor de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.822.000.000) incluido AIU e IVA sobre la utilidad; para un plazo de (17,5) MESES. CONTADOS A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO del día 12 de febrero del 2025 hasta el día 31 de julio del 2026, incluyendo la fase de diagnóstico.

Respecto al componente ambiental del proyecto, es importante mencionar que el Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo del Municipio de Leticia, cuenta con **Resolución ANLA No. 0855 del 22 de Julio del 2015**, por medio de la cual se modifica la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente a la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, mediante la Resolución No. 671 del 19 de Julio del 2001 para el proyecto "*Ampliación en trescientos metros (300 m) de la cabecera veinte (20) de la pista existente del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia, Departamento del Amazonas".*

En este sentido, se cuenta con un plan de manejo ambiental por parte del Aeropuerto, el cual cuenta con programas de manejo ambiental, algunos de los cuales son implementados por el CONSORCIO TARQUI, de acuerdo con las condiciones particulares del contrato de obra. El período del presente informe corresponde del **1 al 30 de junio del 2026**.

1.1 Objetivo Principal

Realizar el seguimiento y control de la gestión ambiental realizada por el CONSORCIO TARQUI al contrato de obra No. 24001241 H4 DE 2024, cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)"

1.2 Objetivos Específicos

- Garantizar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo del Municipio de Leticia, autorizado mediante la Resolución ANLA No. Resolución ANLA No. 0855 del 22 de Julio del 2015.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente.
- Relacionar las actividades de gestión ambiental desarrolladas en el período.

- Gestionar de manera oportuna los procedimientos que tengan lugar, de acuerdo con las condiciones particulares del contrato de obra.

1.3 Información General del Contrato de Obra

A continuación, se describen las condiciones contractuales del CONSORCIO TARQUI:

Tabla 1 Descripción Inicial del Proyecto	
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

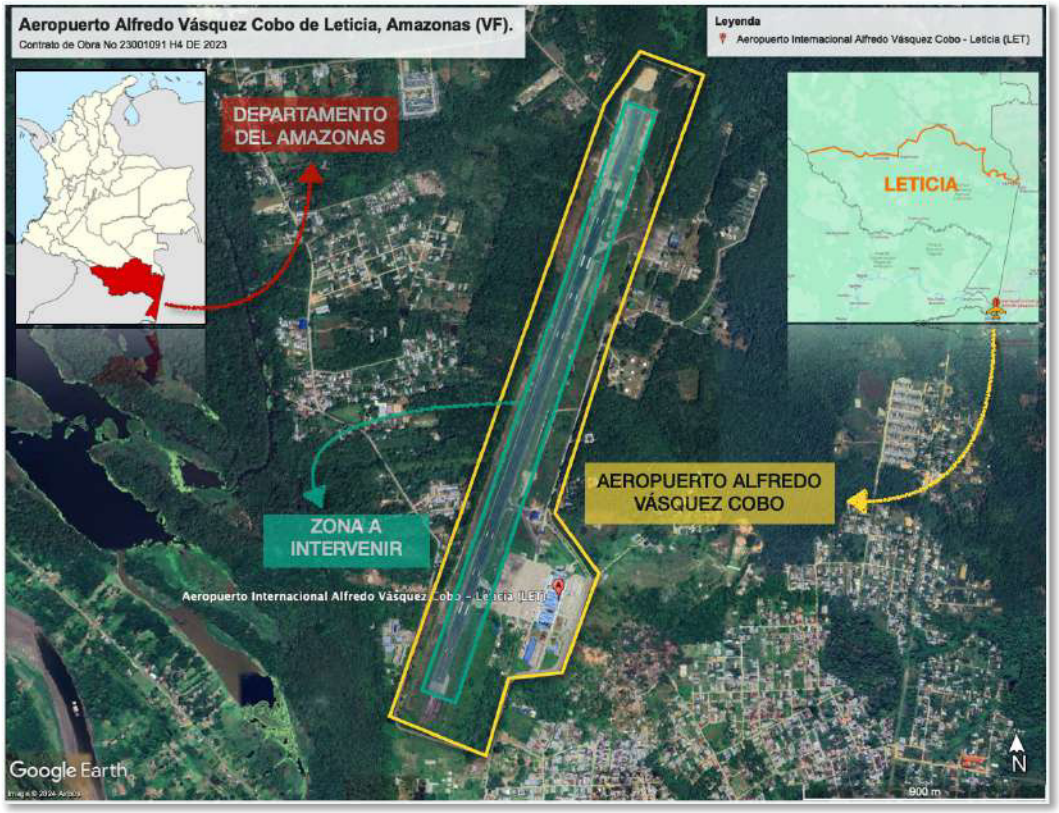


Imagen 1. Localización Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo del Municipio de Leticia.
Fuente. Consorcio Tarqui

CONTRATISTA	CONSORCIO TARQUI, identificado con NIT. 901.896.571-7
CONTRATO	Contrato de obra No. 24001241 H4 DE 2024
OBJETO	Realizar Mantenimiento de la Infraestructura Física Lado Aire del Aeropuerto Vásquez cobo de la ciudad de leticia (VF)
INTERVENTORÍA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
