Ingeniera
SIRLEY DABEIBA MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025

Respetada Ingeniera

De conformidad con lo establecido en la resolución 970 del 2 de abril de 2024, "(…) Por la cual se Adiciona al Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión de Contratos y Convenios (…)" y de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 denominado: OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, así:

"(…)3.1.33 Apoyar la Supervisión en la remisión al archivo de Gestión, de todos los documentos que se generen en el desarrollo del contrato o convenio e informar a este, en caso de requerirse su actualización, realizando el debido seguimiento o gestiones para mantener actualizado el mismo. De acuerdo con las políticas de seguridad y Privacidad de la Información, establecidas por la entidad (…)"

Y oficio **2024S-VBOG-005279 del 31 de enero de 2025**, mediante el cual se notifica DESIGNACIÓN como apoyo a la supervisión; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	4227 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA	**NIT:**	891.680.089-4
CONFORMACION:	No Aplica		
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXION CURUNDO SAN JOSE DEL PALMAR CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre 2024	**No. de Oficio:**	2024S-VBOG-091015

Valor Inicial:	$ 8.700.000.000,00
Valor Adiciones:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 8.700.000.000,00
Anticipo Entregado:	$ 4.350.000.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 4.350.000.000,00
Saldo por Amortizar:	$ 0 se debe solicitar a Subdirecciòn financiera memorando de constancia
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Prórroga 2:	Hasta el 30 de abril de 2026
Suspensión 1	N.A
Fecha de Fin:	30 de abril de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124124	14/11/2024	NACIÓN	10	$ 3.200.000.000	$ 2.763.322.024,00
		NACIÓN	10	$ 5.500.000.000	$ 1.053.778.000,00

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

CONTRATO 4227 DE 2024 - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

Acta No	PERIODO	VALOR BASICO	VALOR TOTAL ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO ANTICIPO
ANTICIPO			$	4.350.000.000,00		
1	dic-24	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00
2	ene-25	$ 96.222.000,00	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00
3	feb-25	$ 185.122.000,00	$ 185.122.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00
4	mar-25	$ 235.568.000,00	$ 235.568.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00
5	abr-25	$ 114.126.000,00	$ 114.126.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00
6	may-25	$ 182.492.000,00	$ 182.492.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00
7	jun-25	$ 156.047.952,00	$ 156.047.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00
8	jul-25	$ 266.818.400,00	$ 266.818.400,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00
9	ago-25	$ 1.958.563.885,74	$ 1.958.563.885,74	$ 979.281.942,87	$ 979.281.942,87	$ 2.704.408.881,13
10	sep-25	$ 873.915.077,01	$ 873.915.077,01	$ 349.566.030,80	$ 524.349.046,21	$ 2.354.842.850,33
11	oct-25	$ 3.042.224.041,15	$ 3.042.224.041,15	$ 1.216.889.616,46	$ 1.825.334.424,69	$ 1.137.953.233,87
12	nov-25	$ 947.717.873,90	$ 947.717.873,90	$ 710.788.405,43	$ 236.929.468,48	$ 427.164.828,44
13	dic-25	$ 544.960.770,20	$ 544.960.770,20	$ 427.164.828,44	$ 117.795.941,76	$ 0,00
TOTALES		**$ 8.700.000.000,00**	**$ 8.700.000.000,00**	**$ 4.350.000.000,00**	**$ 4.350.000.000,00**	**$ 427.164.828,44**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 99%
% Básico ejecutado acumulado: 99%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…diciembre	…1
…agosto	…2
…diciembre	…3

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 870.000.000	3002762 Anexo 5 – Prórroga 1	23/12/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 4.300.000.000		23/12/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 1.740.000.000		23/12/2024	01/01/2029
Calidad de los Servicios	$ 2.610.000.000		23/12/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4262 de 2024		
CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC	**NIT:**	891.800.330-1
CONFORMACIÓN:	N.A		
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		
Fecha de Inicio:	2 de diciembre de 2024	**No. Oficio:**	2024S-VBOG-087817
Valor Inicial:	$ 2.375.000.000,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 2.375.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 1.187.500.000,00		
Anticipo Amortizado:	$ 1.187.500.000,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2024		
Prórroga 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Prórroga 2:	Hasta el 30 de abril de 2026		
Suspensión 1	N.A		
Fecha de Fin:	30 de abril de 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
1124024	14/11/2024	NACIÓN	10	$2.300.000.000	$ 911.268.090,50
		NACIÓN	10	$75.000.000	$ 75.000.000

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

CONTRATO 4262 DE 2024 - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA						
Acta No	**PERIODO**	**VALOR BASICO**	**VALOR TOTAL ACTA**	**ANTICIPO AMORTIZADO**	**VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO			$	1.187.500.000,00		
1	dic-24	$ 45.222.400,00	$ 45.222.400,00	$ 22.611.200,00	$ 22.611.200,00	$ 1.164.888.800,00
2	ene-25	$ 6.159.800,00	$ 6.159.800,00	$ 3.079.900,00	$ 3.079.900,00	$ 1.161.808.900,00
3	feb-25	$ 84.109.000,00	$ 84.109.000,00	$ 42.054.500,00	$ 42.054.500,00	$ 1.119.754.400,00
4	mar-25	$ 114.346.000,00	$ 114.346.000,00	$ 57.173.000,00	$ 57.173.000,00	$ 1.062.581.400,00
5	abr-25	$ 35.970.200,00	$ 35.970.200,00	$ 17.985.100,00	$ 17.985.100,00	$ 1.044.596.300,00
6	may-25	$ 51.962.000,00	$ 51.962.000,00	$ 25.981.000,00	$ 25.981.000,00	$ 1.018.615.300,00
7	jun-25	$ 64.694.419,00	$ 64.694.419,00	$ 32.347.209,50	$ 32.347.209,50	$ 986.268.090,50
8	jul-25	$ 148.418.477,00	$ 148.418.477,00	$ 74.209.238,50	$ 74.209.238,50	$ 912.058.852,00
9	ago-25	$ 576.278.477,00	$ 576.278.477,00	$ 288.139.238,50	$ 288.139.238,50	$ 623.919.613,50
10	sep-25	$ 199.284.477,00	$ 199.284.477,00	$ 99.642.238,50	$ 99.642.238,50	$ 524.277.375,00
11	oct-25	$ 555.044.796,00	$ 555.044.796,00	$ 55.504.479,60	$ 499.540.316,40	$ 468.772.895,40
12	nov-25	$ 365.227.477,00	$ 365.227.477,00	$ 346.966.103,15	$ 18.261.373,85	$ 121.806.792,25
13	dic-25	$ 128.282.477,00	$ 128.282.477,00	$ 121.806.792,25	$ 6.475.684,75	$ -
TOTALES		**$ 2.375.000.000,00**	**$ 2.375.000.000,00**	**$ 1.187.500.000,00**	**$ 1.187.500.000,00**	**$ -**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…diciembre	…1
…agosto	…2
…diciembre	…3

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **Berkley International Seguros Colombia S.A** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento del Contrato	$ 237.500.000	83183 Anexo 4– Según Mod y y 2	12/11/2024	01/07/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 1.187.500.000		12/11/2024	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 475.000.000		12/11/2024	31/12/2028
Calidad de los Servicios	$ 712.500.000		12/11/2024	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVA

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

ASPECTOS TÉCNICOS:

Para el presente periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Componente Técnico:

La interventoría reporta que las actividades de exploración geotécnica y topográfica cuentan con un control técnico permanente que permite garantizar que la consultoría ejecute los trabajos conforme a las especificaciones y procedimientos establecidos por el INVIAS.

El acompañamiento al levantamiento de información arqueológica ha permitido mantener un riguroso cumplimiento de los lineamientos del ICANH y de la normativa vigente, asegurando que los entregables presentados por el equipo arqueológico cumplan con los estándares técnicos exigidos y se integren adecuadamente al desarrollo del proyecto.

La participación en mesas técnicas entre pares especialistas ha facilitado una articulación efectiva entre disciplinas y ha contribuido a la identificación temprana de observaciones, riesgos y oportunidades de mejora, fortaleciendo la coordinación técnica entre la interventoría y la consultoría. El seguimiento a la construcción de los lineamientos de consulta previa con el Consejo Comunitario COCOMAN – Nóvita garantiza que el proceso se desarrolle bajo criterios de enfoque diferencial, participación real y cumplimiento normativo.

La validación de productos asegura que estos sean pertinentes y funcionales para las etapas posteriores del proyecto.

La participación en los comités mensuales de seguimiento del INVIAS permite exponer de manera transparente los avances, dificultades y observaciones técnicas, así como realizar un control riguroso sobre los compromisos adquiridos por la consultoría, verificando su cumplimiento y fortaleciendo la gestión contractual.

Según solicito de adición y prorroga por parte de la consultoría se extiende el plazo contractual por 4 meses hasta el 30 de abril de 2026, en ese mismo sentido la interventoría hará acompañamiento con el fin de finalizar con los volúmenes definitivos que están ajustándose.

REGISTRO FOTOGRAFICO



11 de noviembre Lineamientos para la consulta previa comunidad de San Pedro de Ingara



11 de noviembre Lineamientos para la consulta previa comunidad de San Pedro de Ingara



11 de noviembre Lineamientos para la consulta previa comunidad de San Pedro de Ingara



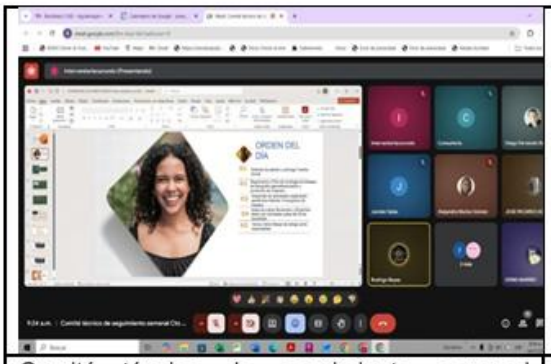
11 de noviembre Lineamientos para la consulta previa comunidad de San Pedro de Ingara



Visita técnica ambiental Socorro- Cruce Cairo, 5 de noviembre



Visita técnica ambiental Socorro- Cruce Cairo, 5 de noviembre



Comité técnico de seguimiento semanal 24/11/2025 interventoría, consultoría e INVIAS



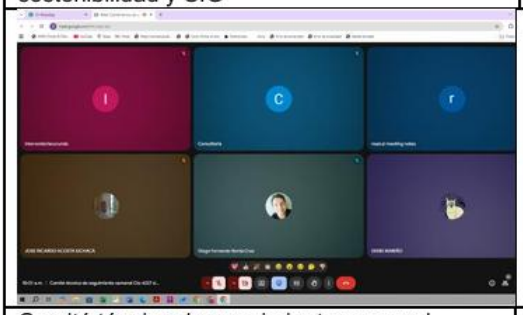
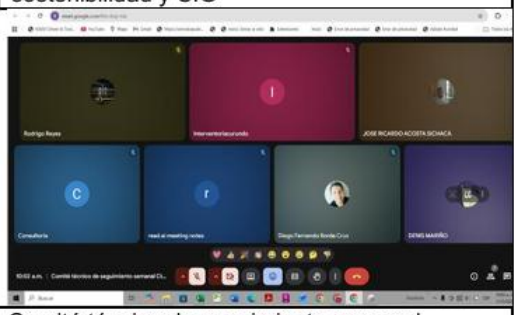
Mesa de trabajo componente ambiental y predial interventoría 25/11/2025



TRABAJO EN CAMPO DE TOPOGRAFÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA. DÍA 10 DE NOVIEMBRE



TRABAJO EN CAMPO DE TOPOGRAFÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA. DÍA 10 DE NOVIEMBRE

	
Mesa de trabajo componente ambienta, sostenibilidad y SIG	Mesa de trabajo componente ambienta, sostenibilidad y SIG
	
Comité técnico de seguimiento semanal	Comité técnico de seguimiento semanal

ASPECTOS JURÍDICOS.

Para el presente periodo no se adelantaron aspectos jurídicos.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Se encuentra al día en facturación tanto el contrato de consultoría como el de interventoría

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se realizaron comisiones durante el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No hay reporte para el presente periodo.

Cordialmente,

YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ
Apoyo a la supervisión
