
PROGRAMACION

OBRA - PUENTE

Id	ITEM DE PAGO	Nombre de tarea	UND	CANT	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
1		**PRESUPUESTO OFICIAL OBRA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**			**92 días**	**mar 15 sep '26**	**mar 15 dic '26**	
2	1	PRELIMINARES			18 días	mar 15 sep '26	vie 02 oct '26	
3	1.1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión	DIA	10,00	10 días	mar 15 sep '26	jue 24 sep '26	
4	1.2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	70,00	5 días	dom 20 sep '26	jue 24 sep '26	3CC+5 días
5	1.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	40,00	8 días	vie 25 sep '26	vie 02 oct '26	4
6	2	CONCRETOS			42 días	sáb 03 oct '26	vie 13 nov '26	
7	2.1	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.2M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	M	41,00	10 días	sáb 03 oct '26	lun 12 oct '26	5
8	2.2	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,00	6 días	mar 13 oct '26	dom 18 oct '26	7
9	2.3	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	18,80	10 días	lun 19 oct '26	mié 28 oct '26	8
10	2.4	CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	M3	8,00	6 días	jue 29 oct '26	mar 03 nov '26	9
11	2.5	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	18,80	10 días	mié 04 nov '26	vie 13 nov '26	10
12	3	ESTRUCTURA METALICA Y ACEROS			32 días	sáb 14 nov '26	mar 15 dic '26	
13	3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	6.368,00	15 días	sáb 14 nov '26	sáb 28 nov '26	11
14	3.2	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.580,00	10 días	dom 29 nov '26	mar 08 dic '26	13
15	3.3	BARANDAS DE CONCRETO DE 3000 PSI, H=1.05 M, D= 0.35 M	M	40,00	7 días	mié 09 dic '26	mar 15 dic '26	14

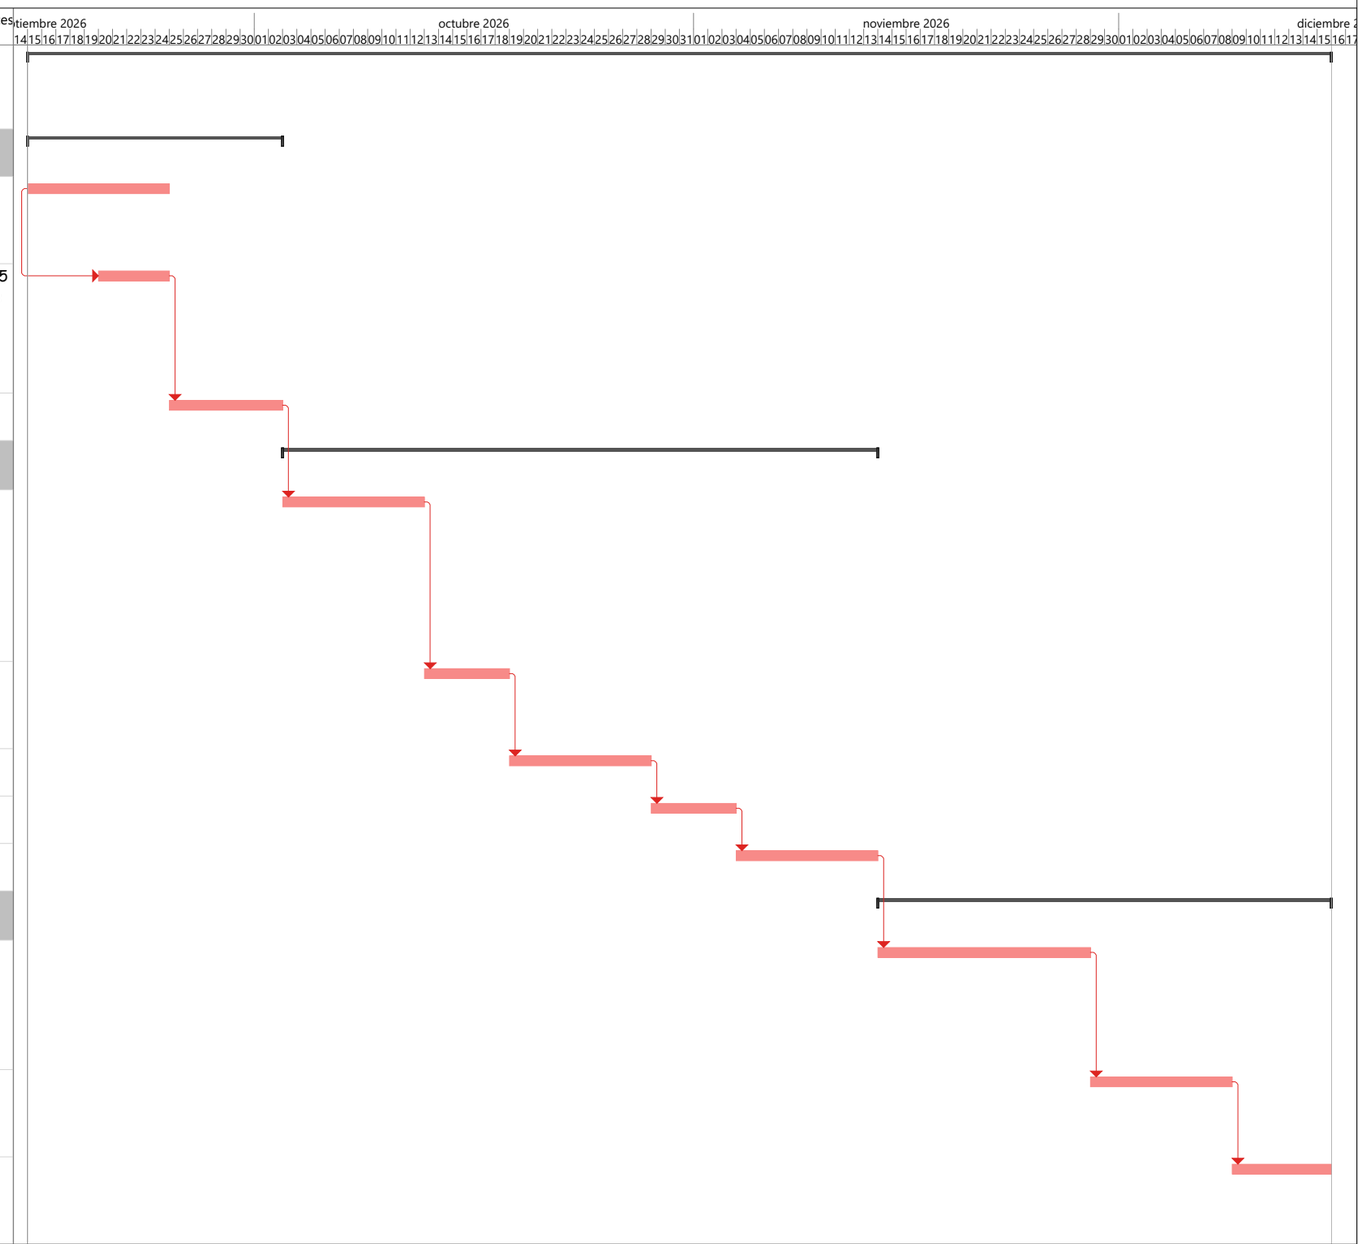

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Hito de línea base	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas		Resumen de línea base	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica		Progreso	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Línea base		Progreso manual	
