GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	**3**					
SUPERVISIÓN						
INTERVENTORÍA	**X**					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	[X]	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	1/06/2026	Hasta:	30/06/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/06/2026	Hasta:	30/06/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	[X]	**NÚMERO:**	25OO111B2823	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	10/02/2026	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			licitación publica	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16787	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			10/02/2026	
OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Infraestructura Física	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	CONSORCIO MAGDALENA 787. integrado por: - HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (90%) - SEINCOC E INGENIERIA S.A.S. (10%)	
		NIT	NIT 902.017.464-0	
VALOR [$]:		INICIAL:	Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un millones ochocientos mil novecientos veinte pesos 54.441.800.920 con un AIU=32,23%	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
				N/A / N/A
		VALOR TOTAL:	Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un millones ochocientos mil novecientos veinte pesos ($54.441.800.920) con un AIU=32,23%	

REGISTRO PRESUPUESTAL	VF NUMERO:	60000003342
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	9/06/2025
	VF NUMERO:	60000003343
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	9/06/2025
	VF NUMERO:	60000003344
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	9/06/2025
	VF NUMERO:	60000003345

	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		9/06/2025		
	RPC NUMERO:		4500066046		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		22/12/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			Ocho mil ciento sesenta y seis millones doscientos setenta mil ciento treinta y ocho pesos ($8.166.270.138). Equivalente al 15% del valor del contrato.		
PLAZO:	INICIAL		DIECISEIS (16) meses.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			10/02/2026	10/06/2027	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		10/06/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			**SI**		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Consorcio Interval Antioquia		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		20260064 de 2025		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			0,76%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			0,79%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

INFORME DE SEGUIMIENTO PARA PAGO DE ACTA DE OBRA No.3 – JUNIO DE 2026
A continuación, se describen las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1y el 30 de junio del 2026.

El Contratista ha venido cumplimiento con las obligaciones indicadas en el contrato y en los documentos contractuales, especialmente en el numera 2 de los Estudios y Documentos Previos.

- Se lleva el libro de bitácora de obra.

- Se verificó cumplimiento de aporte a seguridad social y parafiscales.

- Se han recibido oportunamente los informes mensuales exigidos.

- Se han cumplido a cabalidad obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitaciones, dotación.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Se está haciendo seguimiento periódico a las obligaciones del contrato en los aspectos técnico y administrativo. El cuadro 2.1.1 que se consigna a continuación contiene una relación de obligaciones del contratista con respecto actividades de campo que son evaluadas según cumplimiento y en el cuadro 2.1.2 seguimiento a obligación administrativo de reunión periódica en comités y visitas a la obra.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	0,76%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	0,79%

No presenta contratos derivados.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

A continuación, se presenta la matriz de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos del componente técnico del Contrato de Obra No. 25OO111B2823, correspondiente al período del mes de junio. En esta matriz se relacionan las principales actividades y obligaciones técnicas establecidas contractualmente, indicando su nivel de ejecución durante el período evaluado, el avance acumulado, los medios de verificación y las observaciones pertinentes, con el fin de evidenciar el seguimiento realizado por la supervisión al desarrollo del contrato.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Presentación y aprobación del cronograma de trabajo e inversión	100%	100%	Cronograma aprobado, acta de inicio y actas de comité.	Se presentó y aprobó el cronograma de ejecución del contrato.
Vinculación del personal profesional y técnico exigido contractualmente.	100%	100%	Hojas de vida aprobadas, acta de inicio e informes de interventoría.	El contratista dispuso del personal requerido para el inicio de la ejecución.
Desarrollo de actividades de topografía.	13,71%	68,52%	Informes topográficos, bases de datos, planos.	Total, Topografía 27 km Topografía: Levantamiento PR0 al PR27– (100%) Nivelaciones, contra nivelaciones y replanteo de eje

				PR 0 al PR 10+000– (37,04%)
Desarrollo de actividades caracterización vial y levantamiento de información.	N/A	N/A	Informes de laboratorio y actas técnicas	Esta obligación corresponde a la etapa final de ejecución
Ejecución de estudios de laboratorio	28,07%	74,07%	Informes de laboratorio y actas técnicas	Total, de kilómetros a ejecutar 27 Apiques del PR 0 al PR 15 – (74,07%) Procesamiento de muestras desde el PR0 al PR10– (74,07%)
Definición de la fórmula de trabajo.	N/A	N/A	Informes técnicos.	Fórmula de trabajo se encuentra en proceso por la disponibilidad de insumos técnicos requeridos.
Limpieza de alcantarillas de 36”	7,84%	7,84%	Registro en bitácora, informes semanales y registro fotográfico	Total, 51 alcantarillas Ejecutadas 4 7,84% En relación con la intervención de las alcantarillas de 36”, se conserva el avance de ejecución reportado, dado que durante el período se priorizaron las actividades de retiro de las alcantarillas de 24”, conforme a la programación y a las necesidades identificadas en el corredor vial. Una vez se avance en dichas actividades y se definan los frentes de intervención correspondientes, se continuará con la limpieza e inspección de las alcantarillas de 36”.
Limpieza de alcantarillas de 24”	14,74%	14,74%	Registro en bitácora, informes semanales y registro fotográfico	Total 95 Ejecutadas 14 14,74% De acuerdo con las directrices impartidas por la Gobernación de Antioquia, durante el desarrollo del proyecto se realizará la limpieza de las alcantarillas que se encuentren colmatadas, con el propósito de inspeccionar su condición estructural e hidráulica. Con base en los resultados de dicha inspección se definirá, en conjunto con la Interventoría y la Entidad, si las estructuras requieren únicamente actividades de mantenimiento o si es necesaria su intervención

				mediante reemplazo..
Retiro de alcantarilla de 24" inoperativas	36,36%	36,36%	Registro en bitácora, informes semanales y registro fotográfico	Tota a retirar 66 Ejecutadas 24 4,54% Continua las actividades de retiro de las alcantarillas de 24" inoperativas, priorizadas conforme a las necesidades identificadas en el corredor vial. Una vez se avance en dichas actividades, se continuará con la limpieza e inspección de las alcantarillas de 36".
Reemplazo de alcantarillas de 24" y 36"	50%	50%	Registro en bitácora, informes semanales y registro fotográfico	Ejecutada 4 – Pendientes estructuras de encole y descole Durante el período de seguimiento se continuó con las labores de limpieza e inspección de las obras hidráulicas del corredor vial. Como resultado de estas actividades, se identificaron cuatro (4) alcantarillas de 24 pulgadas que presentan fractura en la tubería, condición que compromete su funcionamiento y requiere su intervención mediante reemplazo
Inicio de las actividades de mantenimiento y estabilización de la vía.	N/A	N/A	Registro en bitácora, informes semanales y registro fotográfico.	Se encuentra pendiente la definición de la fórmula de trabajo
Construcción de filtros	N/A	N/A	Registro en bitácora, informes semanales y registro fotográfico	Se realizará posterior a la definición de estructura a estabilizar
Implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT	100%	100%	PMT aprobado, inspecciones y registro fotográfico	El contratista implementó la señalización temporal y las medidas de manejo del tránsito en los frentes de trabajo habilitados.
Implementación del Plan de Manejo Ambiental	100%	100%	Informes ambientales.	Se implementaron los programas ambientales, conforme a los documentos contractuales.
Implementación del Plan, Social	100%	100%	Informes sociales	Se implementaron los programas sociales
Implementación del Plan SST	100%	100%	Informes SST	Se implementaron los programas de salud en el trabajo conforme a los documentos contractuales.
Realización de comités técnicos y de seguimiento.	100%	100%	Actas de comité y listas de asistencia.	Se realizaron reuniones periódicas para el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

Mantenimiento de la bitácora de obra y registros técnicos	100%	100%	Bitácora de obra e informes diario	Se llevó el registro permanente de las actividades desarrolladas durante el período.
Atención de observaciones formuladas por la interventoría.	100%	100%	Oficios, actas e informes de seguimiento.	Las observaciones emitidas fueron atendidas oportunamente por el contratista
Utilización de materiales provenientes de fuentes autorizadas.	N/A	N/A	Certificados de origen, ensayos y remisiones.	Durante el período se inició la implementación de material de lleno en los sectores donde se efectuó el retiro de alcantarillas inoperativas. El material utilizado corresponde al requerido para la conformación y relleno de las excavaciones generadas, conforme a las condiciones identificadas en campo y a las especificaciones técnicas aplicables.
Elaboración de la relación de obras objeto de seguimiento postcontractual.	N/A	N/A	No aplica.	Esta obligación corresponde a la etapa final de ejecución y recibo de las obras, por lo que no aplica para el período febrero-abril.
TOTAL				

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El porcentaje de ejecución de cada actividad se calcula mediante la relación entre la cantidad ejecutada y la cantidad total prevista para su ejecución, aplicando la siguiente expresión:

% de ejecución = (Cantidad ejecutada / Cantidad total de la actividad) × 100

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Corredor Remedios – La Y de la Virgen

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026 se dio continuidad a las actividades del Plan de Gestión Social, fortaleciendo el relacionamiento con las comunidades del área de influencia y el acompañamiento a la ejecución del proyecto. Se mantuvieron 35 actas de vecindad y 34 permisos de intervención de predios, avanzando en las gestiones para la obtención de las firmas pendientes. Asimismo, se realizó la segunda reunión del Comité de Participación Comunitaria, se fortaleció la comunicación con la comunidad mediante avisos informativos y se consolidó una planta de 26 trabajadores, priorizando la contratación de mano de obra local. Durante el período no se registraron PQRS, evidenciando una adecuada gestión social y una comunicación efectiva con la comunidad.

Corredor La Ye - Yondó

Durante el período del 1 al 30 de junio de 2026, la gestión social estuvo orientada al inicio del proyecto, priorizando la socialización con las comunidades, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la comunicación permanente con los actores del área de influencia. Se realizó la reunión de inicio de obra, se conformó el Comité de Participación Comunitaria, se instalaron carteleras y buzones de sugerencias, y se promovió la contratación de mano de obra local. Asimismo, se adelantaron actividades preliminares

de reconocimiento del corredor vial, mientras que algunas acciones, como las actas de vecindad y de entorno, fueron reprogramadas debido a las condiciones operativas y climáticas. En general, las actividades desarrolladas permitieron establecer las bases para el adecuado desarrollo del proyecto.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Corredor Remedios – La Y de la Virgen

Durante el mes de junio se llevó a cabo la primera modificación del Plan de Manejo Ambiental, como resultado de la actualización de las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental, en concordancia con el avance de las actividades constructivas y las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto. Esta actualización incorporó ajustes relacionados con la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD), la definición y manejo de las zonas de depósito, así como otros aspectos técnicos derivados del desarrollo de la obra.
Como resultado de este proceso, el Plan de Manejo Ambiental fue actualizado a su segunda versión, la cual quedó debidamente aprobada conforme al control de cambios, con fecha 18 de junio de 2026, garantizando que el instrumento de gestión ambiental permaneciera alineado con las condiciones reales de ejecución del contrato y con los lineamientos establecidos por la Gobernación de Antioquia.

Corredor La Ye - Yondó

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, se avanzó en la formulación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el corredor vial La Ye – Yondó (Tramo E-2), mediante la socialización del proyecto con la comunidad y actores institucionales, la realización de recorridos de reconocimiento e inspección del corredor y el levantamiento de información para la caracterización ambiental.

En las visitas de campo se identificaron puntos críticos de la vía, afectaciones en la banca, procesos erosivos y deficiencias en las obras de drenaje, evidenciando que gran parte de las estructuras hidráulicas presentan obstrucciones por sedimentos y material vegetal, lo que reduce su capacidad de funcionamiento y hace necesaria su evaluación para definir las intervenciones requeridas.

Asimismo, se adelantó la estructuración de los programas que conformarán el PMA, incluyendo la gestión de residuos, manejo del recurso hídrico, biodiversidad, control de emisiones, manejo de campamentos y cumplimiento de la normativa ambiental. Para el siguiente período se proyecta culminar la caracterización ambiental, consolidar los diagnósticos técnicos y presentar el Plan de Manejo Ambiental a la interventoría para su revisión y aprobación, como requisito previo al inicio de las actividades constructivas

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Corredor Remedios – La Y de la Virgen

- Se tienen *programas de Salud Ocupacional – plan de seguridad*

Mediante el informe mensual remitido a la Interventoría, se presentó el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado por el Consorcio, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión preventiva y al cumplimiento de la normatividad vigente.
Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la Resolución 1401 de 2007, se remitió la investigación del accidente de trabajo asociado a una

picadura de abejas, junto con los soportes y anexos correspondientes, incluyendo el informe de investigación, el análisis de causas, el plan de acción y las evidencias de las medidas correctivas y preventivas adoptadas, con el fin de prevenir la recurrencia de eventos similares y fortalecer la gestión del riesgo en el proyecto.

Corredor La Ye - Yondó

- Plan de manejo de Tránsito.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), se realizó la instalación de la señalización preventiva de aproximación móvil en los frentes de trabajo, así como la implementación de controles viales mediante la ubicación de controladores de tráfico y la presencia del BOAL-SV aprobados por la interventoría, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y del personal que ejecuta las actividades, manteniendo condiciones seguras para la circulación vehicular y peatonal.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

En este numeral se presenta el seguimiento a las obligaciones y compromisos de carácter administrativo, legal y financiero del contrato, diferentes a la ejecución física de la obra. Para cada obligación se indica su estado de cumplimiento, los medios de verificación y las observaciones correspondientes. Cuando alguna obligación no sea objeto de seguimiento durante el período evaluado o su cumplimiento corresponda a un momento específico de la ejecución contractual, se dejará la respectiva constancia en el apartado de observaciones.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y previamente aprobado por el interventor.	CUMPLE	Cronograma aprobado, actas de comité y comunicaciones	Realiza la entrega del cronograma y subsana observaciones
Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue	CUMPLE	Hojas de vida aprobadas, comunicaciones e informes de interventoría.	Cuenta con todos los profesionales de acuerdo al anexo técnico

contratado.			
Realizar la caracterización vial objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicados dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 20243040058145 de 2024 y demás Normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte	N/A	N/A	Se debe ejecutar una vez finalicen las actividades contratadas
Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y diseños respecto de obras específicas, previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad y problemas estructurales.	N/A	N/A	
Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados.	CUMPLE	Visitas de campo, registros fotográficos e informes.	Cuenta con los equipos necesarios de acuerdo a la etapa de desarrollo del contrato
Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento y evaluación de las actividades.	CUMPLE	Actas de comité.	Realiza comités de seguimiento en las diferentes áreas que conforman el proyecto de acuerdo a las necesidades que se presenten.
Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).	CUMPLE	Inspecciones de campo y registro fotográfico.	
Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que puedan suceder en el (los) frente (s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro	CUMPLE	Bitácora	

no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos del contrato.			
Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, cuando de acuerdo con las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los documentos del Proceso y demás documentación anexa complementaria.	CUMPLE	Inspecciones de campo, Oficios, actas de comité,	El contratista ha acatado los requerimientos y observaciones impartidos por la interventoría, tanto en campo como mediante oficios, implementando los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y contractuales.
Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.	CUMPLE	Oficios e informes mensuales	Realiza la entrega de licencias, hojas de vida de las diferentes maquinarias requeridas en el proyecto y hojas de vida del personal en campo
Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.	CUMPLE	Evaluación de fuentes e informes técnicos.	Durante el período se identificaron las fuentes de materiales potenciales para el suministro de agregados requeridos en el proyecto, verificando su estado y la disponibilidad de la documentación correspondiente para su evaluación técnica y

			ambiental. No obstante, a la fecha no se han iniciado las actividades de estabilización.
Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la respectiva autoridad competente, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.	N/A	N/A	A la fecha no se han ejecutado actividades que requieran material de fuentes.
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.	N/A	N/A	Las obras de seguimiento postcontractual son las actividades que se realizan una vez finaliza la ejecución física y administrativa de un contrato de obra
El contratista deberá entregar, previo al inicio de labores, el cronograma de ejecución de obra, estimando detalladamente la demanda mensual de materiales para cada frente de trabajo y la necesidad de entrega parcial de los mismos, este cronograma deberá ser entregado a la interventoría para su aprobación.	N/A	N/A	A la fecha, no se han ejecutado actividades de estabilización
El Contratista realizará los ensayos de laboratorio bajo los lineamientos del Anexo Técnico, las normas vigentes y las especificaciones técnicas entregadas, y, con base en los resultados obtenidos y el Estudio de Tránsito entregado como insumo por el Departamento de Antioquia deberá determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de cemento y cal en el corredor a intervenir. Su aplicación se realizará una vez se haga la respectiva revisión y se cuente con la aprobación por parte de la Interventoría y la Entidad. Los ensayos de laboratorio presentados por el contratista deben cumplir con apego a las normas de ensayo que se relacionan en el Anexo Técnico del proceso, los cuales deben cumplir como mínimo con las condiciones de aseguramiento de calidad establecidos en la NORMA ISO 17025, para lo cual el laboratorio donde se desarrollarán los ensayos deberá expedir un documento en el que declare esta situación,	CUMPLE		Realiza apiques de acuerdo a las dimensiones requeridas para la caracterización del suelo. Realiza la extracción, transporte y almacenamiento de muestras de laboratorio a través de personal certificado

este debe ser verificado, aprobado y avalado por la Interventoría y remitido a la Entidad.			
El contratista remitirá a la Entidad, previa aprobación de la interventoría, entre los días lunes y miércoles de cada semana, las necesidades de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización de la semana inmediatamente siguiente. La N/A para este 17 confiabilidad de esta programación debe ser del OCHENTA POR CIENTO (80%),de acuerdo con el cumplimiento del avance de obra; si la confiabilidad es inferior a este porcentaje, la entrega quedará condicionada a la justificación, por parte del contratista, de las cantidades solicitadas	N/A	Visitas e inspecciones.	A la fecha se encuentra en la Etapa de estudio y diseño.
El contratista deberá indicar en la solicitud de entrega de materiales de la Entidad la fecha de entrega de acuerdo con la programación, además de indicar el lugar de entrega, que será que únicamente en la cabecera municipal más cercana al sitio de obra o en el almacén de obra. En el caso de que el contratista deba, por cualquier razón, cambiar la ubicación de su almacén de obra, informará oportunamente de ese hecho a la interventoría y a la Entidad, de tal manera que la logística de las entregas no se retrase.	N/A	N/A	A la fecha se encuentra en la Etapa de estudio y diseño.
El contratista organizará sus actividades de tal manera que garantice que cada solicitud de materiales sea por un mínimo de DIECISIETE (17) toneladas, las cuales serán entregadas en un vehículo tipo doble troque; no obstante, en casos excepcionales como por ejemplo el acceso de los vehículos al frente de trabajo, podrán hacerse entregas de DIEZ (10) toneladas en camión sencillo, siempre que dicha solicitud sea aprobada previamente por la interventoría y la Entidad en razón de las particularidades del proyecto.	N/A	N/A	A la fecha se encuentra en la Etapa de estudio y diseño.
Al momento de recibir los materiales entregados por la Entidad, el contratista deberá verificar el estado de los mismos, dejando las anotaciones que considere pertinentes en el formato que se le proporcione para tal fin; este podrá objetarlos, lo cual deberá dejarlo por escrito y justificarlo en términos de la calidad de los mismos. Una vez el contratista reciba a satisfacción los materiales, se entenderá para todos los fines, que estos fueron entregados en buen estado y, por lo tanto, el contratista será responsable de la adecuada conservación de los mismos, quedando obligado a reponerle a la Entidad el valor de aquellos materiales que se deterioren con posterioridad al momento en el cual sea recibidos condición que	N/A	N/A	A la fecha se encuentra en la Etapa de estudio y diseño.

desde ya manifiesta conocer y aceptar.			
El descargue de los materiales entregados por la Entidad, es responsabilidad exclusiva del contratista, para lo cual utilizará sus propios medios, el tiempo de descarga programado es de máximo DOS (2) horas por vehículo, en el caso en el cual la descarga no logre realizarse por causas imputables al contratista, este quedará obligado a reponer cualquier suma que deba asumir la Entidad por este concepto y le será descontada de la siguiente acta de pago; condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	N/A	N/A	A la fecha se encuentra en la Etapa de estudio y diseño.
El contratista registrará en los formatos que se le proporcionen para tal fin, correspondientes a la entrega de materiales por la Entidad, la hora de llegada del vehículo al lugar de entrega, la hora de inicio de descargue, la hora de terminación del mismo y la hora de salida del vehículo, esta información podrá ser contrastada, en cualquier momento, por la interventoría o la Entidad con los datos proporcionados por el GPS de los vehículos que transportan los materiales.	N/A	N/A	A la fecha se encuentra en la Etapa de estudio y diseño.
El contratista, contará con un almacén que cumpla con las condiciones idóneas para el adecuado almacenamiento de los materiales entregados por la Entidad, y asegurará la disponibilidad de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización del proyecto, donde se garantice un stock de producto que permita avanzar en el cronograma sin retraso en Realiza la localización de campamento, amplio, con condiciones estratégicas en su ubicación para el almacenamiento del material que entregará la entidad. las actividades de estabilización.	CUMPLE	Visitas e inspecciones.	Realiza la localización de campamento, amplio, con condiciones estratégicas en su ubicación para el almacenamiento del material que entregará la entidad.
Las partes pactan expresamente que, desde el momento en el cual el contratista recibe a satisfacción los materiales por parte de la Entidad, se obliga a responder ante el Departamento, incluso, por culpa levísima en el descargue, manejo, custodia, transporte a sitio de obra y vigilancia de los mismos; siendo así, el valor de los materiales deteriorados, dañados, perdidos o hurtados le será descontado al contratista de la siguiente acta de pago, condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	CUMPLE	Visitas e inspecciones.	Manifiesta conocer y aceptar con la suscripción del contrato.
El Contratista debe cumplir con la maquinaria solicitada y los lineamientos de los procesos constructivos dados por la Entidad, conforme el Anexo Técnico y documentos complementarios, del presente contrato.	CUMPLE	Visitas e inspecciones.	Envió documentos de la maquinaria mínima requerida, relacionada de

			en los pliegos de condiciones y/o anexo técnico.
Cuando el material estabilizado no alcance la resistencia conforme las especificaciones técnicas del proyecto, y sea objeto de rechazo por parte de la Interventoría, el Contratista deberá reconstruir el tramo. Situación en la cual, el Cemento y/o la Cal utilizada en esta labor será descontada del acta mensual del Contratista de Obra; conforme lo pagado por la Entidad en la relación contractual a través de la cual adquiere estos materiales.	N/A		A la fecha se encuentra en la Etapa de estudio y diseño.
Por ningún motivo los materiales entregados por la Entidad podrán utilizados por el contratista para actividades diferentes a las de estabilización; está prohibición incluye, pero no se limita a otras actividades del mismo proyecto, tales como obras complementarias.	CUMPLE	Visitas e inspecciones.	Manifiesta conocer y aceptar con la suscripción del contrato.
Presentar dentro de los primeros CINCO (5) días calendario del mes, informes parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social y SST, además, se debe anexar el informe mensual certificando las actividades ejecutadas y conciliadas con corte mes a mes para el pago respectivo. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.	CUMPLE	Informes radicados.	Ha radicado la información necesaria
Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, Filosofía e Imagen visual de la Gobernación de Antioquia y al Manual de Obra de la Secretaría de Infraestructura Física.	CUMPLE	Registro fotográfico e informes.	Se identifican junto con interventoría y supervisión puntos críticos de intervención
Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios	CUMPLE	Planillas PILA,	Se realiza

y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2022) que le corresponda.		desprendibles de nómina e informes SST.	entrega de desprendibles de nomina

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

A continuación, se presenta el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del Departamento de Antioquia durante el período comprendido entre febrero y junio de 2026. El cuadro resume el estado de cumplimiento de los compromisos contractuales, los medios de verificación utilizados y las observaciones derivadas del seguimiento realizado por la supervisión, con el fin de evidenciar la gestión adelantada por la Entidad para garantizar el adecuado desarrollo del Contrato de Obra No. 25OO111B2823.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	Acta de inicio, informes de supervisión, revisión documental y contractual.	El contrato se desarrolla conforme a las condiciones pactadas.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Cronograma aprobado, actas de comité y seguimiento al cronograma.	Se cuenta con cronograma aprobado y seguimiento periódico.
Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato.	CUMPLE	Acta parcial de obra No. 3, trámite de pago.	Durante el período se presentó tercera acta parcial de obra, encontrándose en trámite el pago correspondiente
Entregar al contratista las especificaciones e insumos técnicos correspondientes, la Cartilla de Obras de Drenaje del Departamento de Antioquia para la ejecución de las obras objeto del presente proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II.	CUMPLE	Información publicada en SECOP II, actas de entrega y comunicaciones.	La Entidad cumplió con la entrega al contratista de las especificaciones e insumos técnicos requeridos para la ejecución del proyecto, incluyendo la Cartilla de Obras de Drenaje y la demás información técnica disponible, conforme a lo establecido en los documentos del proceso y la información publicada en SECOP II. Estos insumos han permitido el desarrollo de los estudios, diseños y actividades técnicas

			previstas para el proyecto.
Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.	CUMPLE	CUMPLE	Se realiza seguimiento permanente al avance físico, técnico y administrativo del contrato.
Prestar toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del contrato.	CUMPLE	Actas de comité, oficios y reuniones de seguimiento.	La Entidad brinda acompañamiento técnico y administrativo durante la ejecución.
Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.	CUMPLE	Acta de inicio, actas de vecindad y registros de ingreso.	Se permitió el acceso del personal autorizado para el inicio de actividades.
Tener en cuenta, para el respectivo análisis, las observaciones y recomendaciones que el Contratista le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato.	CUMPLE	Oficios, actas de comité y respuestas emitidas.	Las observaciones presentadas son analizadas dentro de los comités de obra.
Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.	CUMPLE	Exigir, a través de la interventoría, el cumplimiento de los requisitos de calidad.	Se realiza seguimiento permanente al cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.	N/A	No aplica	Durante el período no se presentaron situaciones que dieran lugar a este procedimiento.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.	N/A	No aplica	Durante el período no se configuraron causales para la imposición de sanciones.
Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y oportunidad ofrecidas y señaladas por la Entidad Estatal.	CUMPLE	Informes de supervisión, visitas técnicas y registros fotográficos.	Se realizan inspecciones periódicas para verificar calidad y avance de las actividades ejecutadas.
Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demás obligaciones a su cargo.	CUMPLE	Informes de supervisión e interventoría.	Se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas.
Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos de bioseguridad y planes de gestión ambiental, gestión social y SST respectivos.	CUMPLE	Informes SST, ambientales, sociales y actas de seguimiento.	Se realiza seguimiento permanente al cumplimiento de los programas establecidos
Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados	N/A	No aplica	El contrato se encuentra en ejecución.

en el contrato y en la ley.			
Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se conserven, acorde a lo pactado y las particularidades del proyecto, las condiciones técnicas, económicas y financieras.	CUMPLE	Actas de comité, comunicaciones oficiales y seguimiento contractual.	Se realiza seguimiento continuo a las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato.
Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecución del contrato de obra, verificados por el interventor. Así mismo, deberá hacer los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidación del contrato, según defina la Entidad Estatal	N/A	No aplica.	Durante el período no se presentaron solicitudes de reconocimiento de imprevistos.
La Entidad entregará los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva) al Contratista, para la ejecución de las actividades de estabilización, conforme la demanda ajustada a la fórmula detrabajo y al cronograma de avance de obra presentado por el Contratista.	N/A	Solicitudes de materiales y actas de entrega.	Durante el período no se realizaron entregas de materiales por encontrarse pendiente la aprobación de la fórmula de trabajo.
La Entidad hará entregas parciales de los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva), necesarios para los trabajos de estabilización, esto de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista y aprobada por la Interventoría. Dicha entrega parcial de materiales del Departamento estará sujeta a la autorización previa y escrita por parte de la Interventoría y por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. Esto se hará mediante el formato establecido para tal fin, en el cual se detallarán las cantidades de cada uno de los materiales, lugar, fecha y hora de entrega.	N/A	Formatos de entrega, autorizaciones de interventoría.	No se presentaron solicitudes aprobadas para entrega de materiales.
Los materiales serán entregados en la cabecera municipal más cercana a la intervención o en el almacén de obra del contratista (conforme la solicitud de materiales que realice el contratista), siempre y cuando se garanticen las condiciones de accesibilidad y seguridad para los vehículos que los transportarán.	N/A	Actas de entrega.	No aplica para el período evaluado.
La Entidad hará entrega al Contratista, del Estudio de Tránsito como insumo técnico para que con los ensayos de laboratorio en campo (determinados en el Anexo Técnico), el Contratista determine la dosificación y/o fórmula de trabajo, dada por la relación	CUMPLE PARCIALMENTE	Comunicaciones oficiales y actas de comité.	La Entidad cumplió con la entrega del Estudio de Tránsito (TPD) al contratista, proporcionando el insumo técnico requerido para el desarrollo de los ensayos de laboratorio y la definición de la dosificación y/o fórmula de trabajo

Cemento/Cal en cada corredor a intervenir.			correspondiente a la relación cemento/cal en el corredor objeto de intervención.
La Entidad realizará la respectiva revisión y aprobación en conjunto con la Interventoría, de los ensayos de laboratorio entregados como insumo por el Contratista para determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de Cemento y Cal en el corredor a intervenir.	CUMPLE PARCIALMENTE	Informes de laboratorio, actas técnicas y conceptos de interventoría.	La actividad se encuentra en desarrollo.
La Entidad remitirá dentro de los primeros 10 días de cada mes al contratista y a la interventoría, el histórico de calidad y certificados correspondientes a los materiales entregados al Contratista.	N/A	Comunicaciones y certificados de calidad.	No se han efectuado entregas de materiales por parte de la Entidad
Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá realizar jornadas de capacitación virtuales a los diferentes que permitan fortalecer habilidades del primero en aspectos técnicos de los Materiales Granulares Tratados con Cemento (MGTC) y Cal, ventajas, desempeño, dosificación de mezclas y proceso constructivo.	N/A		Durante el período no se presentaron solicitudes de capacitación.
Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico de manera virtual, en cabeza de un profesional experto en diseño y construcción de subestructura en Material Granular Tratado con Cemento y Cal.	N/A	Actas de reunión y comunicaciones.	No se presentaron solicitudes por parte del contratista.
Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico eventual y focalizado para los comités de obra que requieran del mismo, debido a dudas técnicas relevantes. Este acompañamiento a las necesidades y dudas de obra, será preferentemente virtual, no obstante, de acuerdo con la relevancia de las necesidades o dudas podrá, eventualmente, ser presencial virtual y en determinadas ocasiones presencial, siempre que resulte indispensable.	N/A	Actas de comité.	No se requirió acompañamiento técnico especializado adicional.
Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	CUMPLE	Informes de supervisión, comunicaciones y actas de comité	La Entidad desarrolla las actuaciones administrativas y técnicas necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 54.441.800.920,00	0	0	$ 54.441.800.920,00
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 54.441.800.920,00	$ 0	$ 0	$ 54.441.800.920,00
4. Anticipos	$ 8.166.270.138,00	$ 0	$ 0	$ 8.166.270.138,00
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$ 0	$ 0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 8.166.270.138	$ 0	$ 0	$ 8.166.270.138,00
7. Recursos ejecutados	$ 8.537.163.461	$ 0	$ 0	$ 8.537.163.460,69
8. Recursos no ejecutados 3-7	$ 45.904.637.459	$ 0	$ 0	$ 45.904.637.459

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Durante el período se tramitó la primera acta parcial de obra, la cual se encontraba en proceso de revisión y aprobación para el correspondiente trámite de pago, razón por la cual no se reflejan recursos desembolsados por este concepto dentro del período objeto del presente informe.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
04/06/2026	Reunión técnica	Se generan compromisos relacionados en el acta de comité

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato. El CINCO POR CIENTO (5%) restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

Secretaría de Infraestructura Física (la Entidad) entregará un anticipo del QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	10/02/2026	$54.441.800.920		8.166.270.138		$46.275.530.782	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 feb - abril	07/06/2026		$8.953.584	$1.343.038	$7.610.546	$46.267.920.236	En trámite
Pago No.2 Mayo	14/07/2026		$8.875.831	$1.331.375	$7.544.456	$46.260.375.780	En trámite
Pago No.3 Junio	25/08/2026		$418.515.671,87	$62.777.351	$355.738.321,87	$45.904.637.459,31	En trámite
TOTALES		$54.441.800.920	$436.345.087	$65.451.764	$370.893.323		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. acta 03 al contratista, por valor de: $355.738.320,87 (TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON OCEHNTA Y SIETE CENTAVOS) el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado de pago de aportes parafiscales para el mes de Julio.

Adicionalmente, el interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Definición de la fórmula de trabajo	Posible afectación al cronograma por el tiempo requerido para la revisión y aprobación de la fórmula de trabajo con base en los ensayos de laboratorio.	Contratista, Interventoría y Entidad	La Entidad cumplió con la entrega del Estudio de Tránsito (TPD), mitigando el riesgo asociado a la disponibilidad de este insumo. El seguimiento se orienta a la revisión de los resultados de laboratorio y a la aprobación de la fórmula de trabajo por parte de la interventoría y la Entidad.	Durante el período, mediante comités técnicos, revisión de informes de laboratorio, reuniones de seguimiento y comunicaciones oficiales entre las partes.	Actas de comité, comunicaciones oficiales, informes de laboratorio e informe mensual.

Durante el período de seguimiento se realizó monitoreo a los riesgos identificados en la matriz de riesgos del contrato. Se evidenció que el riesgo asociado a la disponibilidad del Estudio de Tránsito (TPD) fue mitigado con la entrega de este insumo por parte de la Entidad. En consecuencia, el seguimiento se concentró en la revisión y aprobación de la fórmula de trabajo, así como en la definición del alcance de intervención de las obras hidráulicas, mediante comités técnicos, visitas de campo, revisión de informes y comunicaciones entre el contratista, la interventoría y la Entidad.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Durante el período de seguimiento correspondiente al mes de junio de 2026, no se evidenciaron incumplimientos contractuales que dieran lugar a la imposición de multas, sanciones, reclamaciones o a la adopción de acciones correctivas por parte de la Entidad.

No obstante, se mantuvo seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo, mediante la revisión de informes, realización de comités técnicos, visitas de campo, verificación de soportes documentales y seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.

Como aspectos relevantes del período, se verificó el cumplimiento de las directrices impartidas por la Gobernación de Antioquia y la interventoría respecto a la limpieza e inspección de las obras hidráulicas existentes, actividades que permitieron identificar cuatro (4) alcantarillas de 24 pulgadas con fractura en la tubería, las cuales requieren intervención mediante reemplazo. Asimismo, se dio continuidad a las

actividades de exploración geotécnica, levantamiento topográfico y ensayos de laboratorio para el desarrollo de los estudios y diseños del proyecto.

De igual manera, se verificó la entrega por parte de la Entidad del Estudio de Tránsito (TPD), insumo técnico que permitió continuar con el proceso de definición de la fórmula de trabajo y del diseño de pavimento. El contrato continúa ejecutándose bajo seguimiento permanente por parte de la interventoría y la Entidad, sin que durante el período se configuraran incumplimientos atribuibles al contratista..

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Durante el mes de junio de 2026 se dio continuidad a las actividades de ejecución y seguimiento del Contrato de Obra No. 2500111B2823, avanzando en la limpieza e inspección de las obras hidráulicas existentes, de conformidad con las directrices impartidas por la Gobernación de Antioquia y la interventoría. Como resultado de estas actividades, se identificaron cuatro (4) alcantarillas de 24 pulgadas que presentan fractura en la tubería, por lo que requieren intervención mediante reemplazo. Las demás estructuras continuarán siendo objeto de limpieza y evaluación para definir el alcance definitivo de las intervenciones.

Asimismo, durante el período se continuó con las actividades de exploración geotécnica, levantamientos topográficos, ensayos de laboratorio y consolidación de la información técnica necesaria para el desarrollo de los diseños del proyecto. De igual manera, la Entidad cumplió con la entrega del Estudio de Tránsito (TPD), insumo que permitió avanzar en la definición de la fórmula de trabajo y del diseño de pavimento, manteniéndose el seguimiento técnico para la adopción de los parámetros definitivos por parte de la interventoría.

Adicionalmente, se mantuvo la implementación de las medidas ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo, así como del Plan de Manejo de Tránsito, garantizando el desarrollo de las actividades bajo condiciones seguras y en cumplimiento de las obligaciones contractuales. El contrato continúa en ejecución con seguimiento permanente por parte de la interventoría y la Entidad, sin que durante el período se evidenciaran incumplimientos atribuibles al contratista.

9. ANEXOS

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Certificado parafiscales Consorcio magdalena 787
- Certificados parafiscales HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S
- Certificados parafiscales SEINCOC E INGENIERIA S.A.S.
- Planillas de pago de seguridad social integral
- Informes mensuales seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social

Para constancia, se firma la presente acta 04 SEP 2026

Nombre: Manuel Rozo
INTERVENTOR
CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	**CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

Medellin, 04 de Septiembre de 2026.

Señores
RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Cra 43 A # 19 - 127
Medellín – Antioquia

El suscrito, **Manuel Fernando Rozo Vasquez** identificado con cedula de ciudadanía **1.017.189.868**, quien actúa como representante legal del **CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA** identificado con Nit **902.021.514-6** a cargo del Contrato 20260064, Objeto: Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Magdalena Medio (Lote 4) a cargo del Departamento de Antioquia..

Hace constar que de acuerdo con la certificación entregada por **CONSORCIO MAGDALENA 787** con **NIT:902.017.464-0** Contrato 25OO111B2823 de 2025 , Objeto: "Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 4 magdalena medio)". Se encuentran al día con sus obligaciones del pago de los aportes de los empleados a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al servicio nacional de aprendizaje-SENA, instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF y cajas de compensación (Articulo 23 de la le 1150 de 2007) a la fecha.

Manuel Fernando Rozo Vasquez
C.C 1.017.189.868 de Medellín
Representante Legal
Consorcio Intervial Antioquia Nit. 902.021.514-6

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.396.987 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 214221-T SI, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO MAGDALENA 787,** identificada con NIT **902.017.464-0**, ejecutor del contrato de obra Pública No. 25OO111B2823 que tiene por objeto: *"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO)"*, con ocasión a la información allegada por el respectivo consorcio, certifico bajo la gravedad de juramento que el Consorcio ha cumplido y se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante el mes de junio de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en **BUCARAMANGA**, a los **02** días del mes de Septiembre de **2026.**

CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA
C.C. 13.724.202
Representante Legal
CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT. 902.017.464 – 0

CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ
TP. 214221-T
CONTADOR PÚBLICO
CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT. 902.017.464 - 0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.396.987 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 214221-T SI, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO MAGDALENA 787,** identificada con NIT **902.017.464-0**, ejecutor del contrato de obra Pública No. 25OO111B2823 que tiene por objeto: *"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO)"*, con ocasión a la información allegada por el respectivo consorcio, certifico bajo la gravedad de juramento que el Consorcio ha cumplido y se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante el mes de julio de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en **BUCARAMANGA**, a los **02** días del mes de Septiembre de **2026.**

CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA
C.C. 13.724.202
Representante Legal
CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT. 902.017.464 – 0

CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ
TP. 214221-T
CONTADOR PÚBLICO
CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT. 902.017.464 - 0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.396.987

GARAVITO RODRIGUEZ


APELLIDOS

CRISTIAN FERNANDO

NOMBRES

Cristian F G.

FIRMA

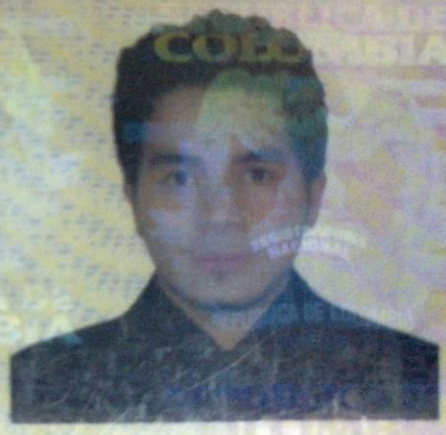



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-1994

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-OCT-2012 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00410716-M-1022396987-20121106 0031605646A 1 39120170

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214221-T



CRISTIAN FERNANDO
GARAVITO RODRIGUEZ
C.C. 1022396987

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 19/02/2016
UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 226284

217088

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5E7F4AC20A07FDE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022396987 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 214221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	**CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

Medellin, 04 de Septiembre de 2026.

Señores
RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Cra 43 A # 19 - 127
Medellín – Antioquia

El suscrito, **Manuel Fernando Rozo Vasquez** identificado con cedula de ciudadanía **1.017.189.868**, quien actúa como representante legal del **CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA** identificado con Nit **902.021.514-6** a cargo del Contrato 20260064, Objeto: Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Magdalena Medio (Lote 4) a cargo del Departamento de Antioquia..

Hace constar que de acuerdo con la certificación entregada por **CONSORCIO MAGDALENA 787** con **NIT:902.017.464-0** Contrato 25OO111B2823 de 2025 , Objeto: "Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 4 magdalena medio)". Se encuentran al día con sus obligaciones del pago de los aportes de los empleados a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al servicio nacional de aprendizaje-SENA, instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF y cajas de compensación (Articulo 23 de la le 1150 de 2007) a la fecha.

Manuel Fernando Rozo Vasquez
C.C 1.017.189.868 de Medellín
Representante Legal
Consorcio Intervial Antioquia Nit. 902.021.514-6

HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 901.262.851 - 3

CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con **C.C. 1.000.808.275** y tarjeta profesional **No. 317795 – T**, de **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS** identificada con **NIT. 901.262.851 – 3,** certifico bajo la gravedad de juramento que la citada sociedad ha cumplido y se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante el mes de junio de 2026.

Se expide en BOGOTA D.C., a los **02** días del mes de Septiembre de 2026.

Cordialmente,



Jeferson Andres Garcia Rodriguez
C.C. 1.000.808.275
Revisor Fiscal
TP. 317795 - T

HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 901.262.851 - 3

CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con **C.C. 1.000.808.275** y tarjeta profesional **No. 317795 – T**, de **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS** identificada con **NIT. 901.262.851 – 3,** certifico bajo la gravedad de juramento que la citada sociedad ha cumplido y se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante el mes de Julio de 2026.

Se expide en BOGOTA D.C., a los **02** días del mes de Septiembre de 2026.

Cordialmente,



Jeferson Andres Garcia Rodriguez
C.C. 1.000.808.275
Revisor Fiscal
TP. 317795 - T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.000.808.275

GARCIA RODRIGUEZ
APELLIDOS

JEFERSON ANDRES
NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-2002

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

24-ENE-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

317795-T



JEFERSON ANDRES
GARCIA RODRIGUEZ
C.C. 1000808275
RES. INSCRIPCION 465 DEL 01/11/2023
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

367671 **372379**

220341/0622

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7AAB9E9E8C985A63

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000808275 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 317795-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 57.441.023 de Santa Marta, y con tarjeta profesional No. 141168-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA E INGENIERIA S.A.S – SEINCOC INGENIERIA SAS**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el último mes, correspondiente a Junio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en **SANTA MARTA**, a los **02** días del mes de Septiembre de **2026.**




XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ
REVISORA FISCAL – SEINCOC INGENIERIA SAS
T.P No. 141168-T
C.C. No. 57.441.023 DE SANTA MARTA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 57.441.023 de Santa Marta, y con tarjeta profesional No. 141168-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA E INGENIERIA S.A.S – SEINCOC INGENIERIA SAS**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el último mes, correspondiente a Julio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en SANTA MARTA, a los **02** días del mes de Septiembre de 2026.



XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ
REVISORA FISCAL – SEINCOC INGENIERIA SAS
T.P No. 141168-T
C.C. No. 57.441.023 DE SANTA MARTA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 57.441.023
GUTIERREZ GONZALEZ
APELLIDOS
XIOMARA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA
USO EXCLUSIVO SEINCO
INGENIERIA SAS


FECHA DE NACIMIENTO 27-SEP-1973
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
11-NOV-1982 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
USO EXCLUSIVO SEI
INGENIERIA SAS
A-2100100-00556102-F-0057441023-20140
00377 02493A 1
4692797746

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141168-T



XIOMARA PATRICIA
GUTIERREZ GONZALEZ
C.C. 57441025
RESOLUCION INSCRIPCION 76 FECHA 16/04/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 151719

USO EXCLUSIVO SEINCOC INGENIERIA SAS

FIRMA DEL TITULAR 64797

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

USO EXCLUSIVO SEINCOC INGENIERIA SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7C2112D4E0BA73F1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 57441023 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 141168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 04.09.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000266548

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017308	**NIT:** 9020174640	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO MAGDALENA 787
Nro CONTRATO: 25OO111B2823	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066046 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	4	X	2-8115	1002382	VIA LA YE-YONDO 62AN29-1 RVT	418515671	UN	1,000	0%	1,0000	418.515.671,870

V/R TOTAL NETO	418.515.671,870
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	418.515.671,870

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o Integrantes de unión te tempora	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Melisa Suaza Moncada

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

VoBo

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Medellín, 4 de septiembre de 2026

AUTORIZACIÓN

Para el contrato 25OO111B2823 de 2025 que tiene por objeto: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).", se autoriza la amortización para el acta de pago No. 3, al contratista **CONSORCIO MAGDALENA 787**, con NIT 902.017.464-0 que asciende a la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 62.777.351)** de la siguiente manera:

RPC 4500066046 posición 4 fondo 2-8115.	**$ 62.777.351**

La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión.

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor

Vo Bo

Secretaría de Infraestructura
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)
Medellín - Colombia - Suramérica
Código Postal 050015

{PIE_CERTICAMARA}



CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT 902.017.464-0
CL 54 31 63 AP 202 BRR ANTIGUO CAMPESTRE
Tel: 3115100991
Bogotá - Colombia
administracionfinanciera@elementaling.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3

Señores	GOBERNACION DE ANTIOQUIA		
NIT	890.900.286-0	**Teléfono**	(604) 4099000
Dirección	CL 42 B # 52 - 106	**Ciudad**	Alpujarra - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/09/2026, 14:21
Expedición	04/09/2026, 14:22
Vencimiento	04/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA No. 3 CONTRATO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST QUE TIENE POR OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).	1.00	201,870,087.87
2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST - Circuito Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío, vía Las Flores (Puerto Berrío) - Bodegas - La Ye	1.00	6,045,013.00
3	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST - VIA LA YE-YONDO	1.00	1,328,582.00
4	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS	1.00	209,271,989.00

Total items: 4

Total Bruto	418,515,671.87
Copago / Anticipo	62,777,351.00
Total a Pagar	**355,738,320.87**

Valor en Letras: Trescientos cincuenta y cinco millones setecientos treinta y ocho mil trescientos veinte pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-04 por $ 355,738,320.87

Observaciones: AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $62.777.351

CONSORCIADOS:
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S. | NIT 901262851-3 | PART. 90%
SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIA S.A.S | NIT 819005874-4 | PART. 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108835502 aprobado en 20260423 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: beb876021328185259584088c05c0e5e06e06f386d28129fb3673a1438d0955a9fcb393ec320912cb3ba0e1953b2acee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal

Nº doc.	3000262119	Sociedad	GANT	Ejercicio	2026
Fe.docum.	09.09.2026	Fecha contab.	09.09.2026	Período	09

Calc.impuestos ☐
Referen. FE 3
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. PAGO#3 25OO111B2823


Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500317440	14.09.2026	31	2200017308	2401020000	CONSORCIO MAGDALENA	V0	361.806.802-			
*				31					361.806.802-			
4				50	4110610005	4110610005	Contribución especia		17.786.916-	0-2170		
5				50	2407220002	2407220002	Estampilla CBA		8.370.310-			
6				50	4105760019	4105760019	Estampilla IU-digita		1.674.063-			
7				50	4105760018	4105760018	Estampilla I.U.E		1.674.063-			
8				50	2407220003	2407220003	Estamp Prohospital		4.185.160-			
9				50	4105760013	4105760013	Estamp prodesarrollo		2.511.090-	0-2020		
10				50	4105760017	4105760017	Estampilla Politécni		1.674.063-			
11				50	2436260000	2436260000	Contratos de obra		8.370.313-	0-9001		
12				50	4105820000	4105820000	Tasa pro deporte y r		10.462.892-	0-2054		
*				50					56.708.870-			
3				70	9999999996	9999999996	000006002347 0007	V0	0	2-8115	4500066046	4
*				70					0			
2		200502966	11.09.2026	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	418.515.672	2-8115	4500066046	4
*				86					418.515.672			
**									0			

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 57.441.023 de Santa Marta, y con tarjeta profesional No. 141168-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA E INGENIERIA S.A.S – SEINCOC INGENIERIA SAS**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el último mes, correspondiente a Junio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en **SANTA MARTA**, a los **02** días del mes de Septiembre de **2026.**




XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ
REVISORA FISCAL – SEINCOC INGENIERIA SAS
T.P No. 141168-T
C.C. No. 57.441.023 DE SANTA MARTA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 57.441.023 de Santa Marta, y con tarjeta profesional No. 141168-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA E INGENIERIA S.A.S – SEINCOC INGENIERIA SAS**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el último mes, correspondiente a Julio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en SANTA MARTA, a los **02** días del mes de Septiembre de 2026.



XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ
REVISORA FISCAL – SEINCOC INGENIERIA SAS
T.P No. 141168-T
C.C. No. 57.441.023 DE SANTA MARTA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 57.441.023
GUTIERREZ GONZALEZ
APELLIDOS
XIOMARA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA
USO EXCLUSIVO SEINCO
INGENIERIA SAS


FECHA DE NACIMIENTO 27-SEP-1973
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
11-NOV-1982 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
USO EXCLUSIVO SEI
INGENIERIA SAS
A-2100100-00556102-F-0057441023-20140
00377 02493A 1
4692797746

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

141168-T



XIOMARA PATRICIA
GUTIERREZ GONZALEZ
C.C. 57441025
RESOLUCION INSCRIPCION 76 FECHA 16/04/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 151719

USO EXCLUSIVO SEINCOC INGENIERIA SAS

FIRMA DEL TITULAR 64797

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

USO EXCLUSIVO SEINCOC INGENIERIA SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7C2112D4E0BA73F1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **XIOMARA PATRICIA GUTIERREZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 57441023 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 141168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902017464-0	CONSORCIO MAGDALENA 787	CALLE 54 # 31-63	3115100	administracionfinanciera@elementaling.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93120659		36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$74,878,781	$23.074.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	392.500	0		0		0	0	0	0	392.500	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.500	0		0		0	0	0	0	72.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	230.100	0		0		0	0	0	0	230.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.510.000	0		0		0	0	0	0	1.510.000	20
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	91.200	0		0		0	0	0	0	91.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.536.200	0	0	0	0	0	0		1.536.200	6
230301	Porvenir	800224808-8	5.906.700	0	0	0	0	0	0		5.906.700	19
231001	Colfondos	800227940-6	1.240.200	0	0	0	0	0	0		1.240.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.298.800	0	0	0	0	0	0		3.298.800	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.099.700				5.099.700	0	0	5.099.700			50.997	5.099.700	36

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	82.100	0	0	82.100	3
CCF04	Comfama	890900841-9	2.774.200	0	0	2.774.200	31
CCF39	Cajasan	890200106-1	140.200	0	0	140.200	2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902017464-0	CONSORCIO MAGDALENA 787	CALLE 54 # 31-63	3115100	administracionfinanciera@elementaling.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93120659		36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$74,878,781	$23.074.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	2.996.500	2.996.500
Pensión	4	11.981.900	11.981.900
Riesgos Laborales	1	5.099.700	5.099.700
CCF	3	2.996.500	2.996.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	23.074.600	23.074.600

PAGADO 438473169

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	902017464-0	CONSORCIO MAGDALENA 787		CALLE 54 # 31-63	3115100	administracionfinanciera@elementaling.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 cot			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93120659		36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$74,878,781	$23.074.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001815494	SANCHEZ MORALES JHONATAN DAVID	1	0			S	X																230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS040	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	5	36.600	CCF03	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0
2	CC 1004805516	GELVEZ PEÑA DIANNY FERNANDA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1022324888	CASTILLO JAVIER ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF04	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
4	CC 1039678864	MOLINA GUTIERREZ JUAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1039681364	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE ELIECER	1	0			S	X																230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	5	89.400	CCF04	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
6	CC 1039685339	QUICENO JACOME EDDIER ALBERTO	1	0			S																	231001	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF04	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
7	CC 1039694176	TRUJILLO MARIN ELIUD YESID	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF04	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
8	CC 1039694751	SOTO BENITES ADRIAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS040	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 1039701269	CUELLO GARCIA WILFER JOSE	1	0			S	X																230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	5	89.400	CCF04	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
10	CC 1039702585	BETANCOURT LONDOÑO BRAYAN SMITH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1039704114	LONDOÑO HOLGUIN JUAN DAVID	1	0			S	X																230201	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	5	89.400	CCF04	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
12	CC 1039704115	GIRALDO ACEVEDO LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 1039704900	LOPEZ NISPERUZA DAVINSON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 1039705994	SUAREZ MARQUEZ DEICY YULISA	1	0			S	X																230201	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	5	89.400	CCF04	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
15	CC 1046429291	MADRID RODRIGUEZ EUSEBIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1046694340	ARCOS VASQUEZ JOSEPH DAVID	1	0			S	X																230201	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	5	89.400	CCF04	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
17	CC 1091659624	JACOME QUEVEDO YESENIA SORANY	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS041	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF04	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
18	CC 1096236972	ESCOBAR PRADA NIYIRETH	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS037	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF04	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
19	CC 1098694466	CASTRO MARIÑO JORGE ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1098695448	CARREÑO LIZCANO LIZETH TATIANA	1	0			S		X															25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF04	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
21	CC 1098752151	MACIAS GARCIA MARCELI CATERINE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 1099734282	BETANCOURT CORREA TATIANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF39	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
23	CC 1101698134	VELANDIA ARDILA OSCAR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
24	CC 1121925569	SANTAMARIA GONZALEZ DAVID ALEXANDER	1	0			S	X																230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS037	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	5	36.600	CCF03	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0
25	CC 13724202	HERNANDEZ ZAMORA CARLOS MAURICIO	1	0			S																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF04	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
26	CC 13854029	MADRID GOMEZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF04	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
27	CC 13892967	MACIAS GONZALEZ EUSEBIO	1	0			S																	25-14	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF04	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
28	CC 14138381	LEIVA PAEZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS002	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	5	243.600	CCF04	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902017464-0	CONSORCIO MAGDALENA 787	CALLE 54 # 31-63	3115100	administracionfinanciera@elementaling.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93120659		36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$74,878,781	$23.074.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
29	CC 24716035	OSPINA TIQUE JOHANNA ANDREA	1	0			S																	231001	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	5	243.600	CCF04	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
30	CC 28070484	VEGA SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF04	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
31	CC 71051907	RODRIGUEZ MEJIA LUIS HORACIO	1	0			S		X															25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF04	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
32	CC 71190192	VARGAS LEON DARIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
33	CC 71193076	CUERVO MARIN JOSE LEONARDO	1	0			S	X																230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	5	89.400	CCF04	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
34	CC 71211522	MONSALVE HENAO LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230201	996.667	13	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.667	13	39.900	14-11	996.667	13	5	69.400	CCF03	996.667	13	39.900	0	0	0	0	0
35	CC 80370346	SEGURA PRADO FAVIAN ENRIQUE	1	0			S																	25-14	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF04	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
36	CC 98325249	NARVAEZ RIVERA DILIO OSCAR	1	0			S																	25-14	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS041	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF04	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CONSORCIO
MAGDALENA 787

Contrato: 2SOO111B2823 DE 2025.
Objeto: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).
Valor contrato inicial: $54.441.800.920
Valor Adicional: -
Valor Total: $54.441.800.920
Plazo Inicial: 16 Meses

Contratista:
Consorcio Magdalena 787
Nit: 9020174640

Interventor:
Consocio Internial Antioquia
Nit: 9020215140

Acta de obra No.3

Fecha de corte: 25 de junio de 2026
Periodo: 25/05/2026 - 25/06/2026

Condiciones Originales del Contrato										Cambio de Obra Acta No 3						Obra Ejecutada								Saldo por ejecutar	
										OBRA QUE SE EJECUTA		OBRA QUE NO SE EJECUTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA No. 3 FECHA 27/07/2026		ACTA No.1		ACTA No.2 - Mayo		ACTA No.3 - Junio		Acumulado			
N.°	ÍTEM DE PAGO	CÓDIGO ICCCIV ANEXO 16.3 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
Circuito Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío, vía Las Flores (Puerto Berrío) - Bodegas - La Ye																									
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			Entregable	59,00 un																	
1	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	42,00	$ 242.062,00	$ 10.166.604,00		$ 0,00		$ 0,00	42,00	$ 10.166.604,00		-		-	11,93	2.887.800,00	11,93	2.887.800,00	30,07	7.278.804,00
2	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	54,00	$ 60.533,00	$ 3.268.782,00		$ 0,00		$ 0,00	54,00	$ 3.268.782,00		-		-		-		-	54,00	3.268.782,00
3	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.006,00	$ 55.525,00	$ 111.383.150,00		$ 0,00	- 453,19	($ 25.163.344)	1.552,81	$ 86.219.806,00		-		-		-		-	1.552,81	86.219.806,00
4	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, aceneo interno y compactación del material.	m3	649,00	$ 31.561,00	$ 20.483.089,00		$ 0,00		$ 0,00	649,00	$ 20.483.089,00		-	16,61	524.259,77	229,43	7.241.040,00	246,04	7.765.300,00	402,96	12.717.789,00
5	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	236,00	$ 112.153,00	$ 26.468.108,00	105,64	$ 11.847.843,00		$ 0,00	341,64	$ 38.315.951,00		-	13,23	1.483.784,19	328,41	36.832.166,73	341,64	38.315.951,00	-	-
6	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	59,00	$ 861.783,00	$ 50.845.197,00		$ 0,00		$ 0,00	59,00	$ 50.845.197,00		-		-		-		-	59,00	50.845.197,00
7	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	504,00	$ 1.269.382,00	$ 639.768.528,00		$ 0,00		$ 0,00	504,00	$ 639.768.528,00		-		-		-		-	504,00	639.768.528,00
8	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	882,00	$ 140.512,00	$ 123.931.584,00		$ 0,00		$ 0,00	882,00	$ 123.931.584,00		-		-	117,25	16.475.032,00	117,25	16.475.032,00	764,75	107.456.552,00
9	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36").	m	354,00	$ 2.552.782,00	$ 903.684.828,00		$ 0,00		$ 0,00	354,00	$ 903.684.828,00		-		-	29,89	76.302.654,00	29,89	76.302.654,00	324,11	827.382.174,00
10	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	28.556,00	$ 8.000,0	$ 228.448.000,00		$ 0,00		$ 0,00	28.556,00	$ 228.448.000,00		-		-		-		-	28.556,00	228.448.000,00
11	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	36.816,00	$ 1.450,00	$ 53.383.200,00		$ 0,00		$ 0,00	36.816,00	$ 53.383.200,00		-		-	29.349,78	42.557.181,00	29.349,78	42.557.181,00	7.466,22	10.826.019,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				**$ 2.171.831.070,00**		**$ 11.847.843,00**		**-$ 25.163.344,00**		**$ 2.158.515.569,00**		-		**2.008.043,96**		**182.295.873,73**		**184.303.918,00**		**1.974.211.651,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA			Entregable	25000,00 m																	
12	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	4.345,00	$ 55.525,00	$ 241.256.125,00		$ 0,00		$ 0,00	4.345,00	$ 241.256.125,00		-		-		-		-	4.345,00	241.256.125,00
13	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.000,00	$ 112.153,00	$ 224.306.000,00		$ 0,00		$ 0,00	2.000,00	$ 224.306.000,00		-		-		-		-	2.000,00	224.306.000,00
14	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2.500,00	$ 1.057.370,00	$ 2.643.425.000,00		$ 0,00		$ 0,00	2.500,00	$ 2.643.425.000,00		-		-		-		-	2.500,00	2.643.425.000,00
15	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	70.002,00	$ 8.000,0	$ 560.016.000,00		$ 0,00		$ 0,00	70.002,00	$ 560.016.000,00		-		-		-		-	70.002,00	560.016.000,00
16	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	312.000,00	$ 1.450,00	$ 452.400.000,00		$ 0,00		$ 0,00	312.000,00	$ 452.400.000,00		-		-		-		-	312.000,00	452.400.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**				**$ 4.121.403.125,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.121.403.125,00**		-		-		-		-		**4.121.403.125,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			Entregable	25000,00 m																	
17	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	25.000,00	$ 90.000	$ 2.250.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00	25.000,00	$ 2.250.000.000,00		-		-		-		-	25.000,00	2.250.000.000,00
18	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	1.404.000,00	$ 1.450,00	$ 2.035.800.000,00		$ 0,00		$ 0,00	1.404.000,00	$ 2.035.800.000,00		-		-		-		-	1.404.000,00	2.035.800.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**				**$ 4.285.800.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.285.800.000,00**		-		-		-		-		**4.285.800.000,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			Entregable	5000,00 m																	
19	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	400,00	$ 52.417,00	$ 20.966.800,00		$ 0,00		$ 0,00	400,00	$ 20.966.800,00		-		-	15,82	829.237,00	15,82	829.237,00	384,18	20.137.563,00
20	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	100,00	$ 112.153,00	$ 11.215.300,00		$ 0,00		$ 0,00	100,00	$ 11.215.300,00		-		-		-		-	100,00	11.215.300,00
21	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para sardineles, rebajos, entre otros	m	5.000,00	$ 115.514,00	$ 577.570.000,00		$ 0,00		$ 0,00	5.000,00	$ 577.570.000,00		-		-		-		-	5.000,00	577.570.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**				**$ 609.752.100,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 609.752.100,00**		-		-		**829.237,00**		**829.237,00**		**608.922.863,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			Entregable	44,00 un																	
22	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales	m3	231,00	$ 34.914,00	$ 8.065.134,00	381,38	$ 13.315.501,00		$ 0,00	612,380	$ 21.380.635,00		-	75,49	2.635.657,86	536,89	18.744.977,14	612,380	21.380.635,00	-	-
23	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E<0.05 m	m2	308,00	$ 42.198,00	$ 12.996.984,00		$ 0,00		$ 0,00	308,00	$ 12.996.984,00		-		-		-		-	308,00	12.996.984,00
24	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	264,00	$ 1.058.425,00	$ 279.424.200,00		$ 0,00		$ 0,00	264,00	$ 279.424.200,00		-		-		-		-	264,00	279.424.200,00
25	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170,00	$ 8.000,0	$ 1.360.000,00		$ 0,00		$ 0,00	170,00	$ 1.360.000,00		-		-		-		-	170,00	1.360.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**				**$ 301.846.318,00**		**$ 13.315.501,00**		**$ 0,00**		**$ 315.161.819,00**		-		**2.635.657,86**		**18.744.977,14**		**21.380.635,00**		**293.781.184,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			Entregable	25,00 Km																	
26	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.100,00	$ 18.545,00	$ 38.944.500,00		$ 0,00		$ 0,00	2.100,00	$ 38.944.500,00		-		-		-		-	2.100,00	38.944.500,00
27	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.100,00	$ 150.822,00	$ 316.726.200,00		$ 0,00		$ 0,00	2.100,00	$ 316.726.200,00		-		-		-		-	2.100,00	316.726.200,00
28	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	35.000,00	$ 59.334,00	$ 2.076.690.000,00		$ 0,00		$ 0,00	35.000,00	$ 2.076.690.000,00		-		-		-		-	35.000,00	2.076.690.000,00
29	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	5.750,00	$ 54.614,00	$ 314.030.500,00		$ 0,00		$ 0,00	5.750,00	$ 314.030.500,00		-		-		-		-	5.750,00	314.030.500,00
30	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	4.313,00	$ 25.361,00	$ 109.381.993,00		$ 0,00		$ 0,00	4.313,00	$ 109.381.993,00		-		-		-		-	4.313,00	109.381.993,00
31	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	4.313,00	$ 8.405,00	$ 36.250.765,00		$ 0,00		$ 0,00	4.313,00	$ 36.250.765,00		-		-		-		-	4.313,00	36.250.765,00
32	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	16.600,00	$ 88.552,00	$ 1.469.963.200,00		$ 0,00		$ 0,00	16.600,00	$ 1.469.963.200,00		-		-		-		-	16.600,00	1.469.963.200,00
33	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	125.000,00	$ 5.413,00	$ 676.625.000,00		$ 0,00		$ 0,00	125.000,00	$ 676.625.000,00		-		-		-		-	125.000,00	676.625.000,00
34	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	125.000,00	$ 21.000,00	$ 2.625.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00	125.000,00	$ 2.625.000.000,00		-		-		-		-	125.000,00	2.625.000.000,00
35	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	3.298.425,00	$ 1.450,00	$ 4.782.716.250,00		$ 0,00		$ 0,00	3.298.425,00	$ 4.782.716.250,00		-		-		-		-	3.298.425,00	4.782.716.250,00
36	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión)	m3-Km	31.500,00	$ 1.450,00	$ 45.675.000,00		$ 0,00		$ 0,00	31.500,00	$ 45.675.000,00		-		-		-		-	31.500,00	45.675.000,00
Subtotal					**TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**				**$ 12.492.003.408,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 12.492.003.408,00**		-		-		-		-		**12.492.003.408,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL			Entregable	25,00 Km																	
37	12.1	11607	INVIAS 760-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	75.000,00	$ 3.453,00	$ 258.975.000,00		$ 0,00		$ 0,00	75.000,00	$ 258.975.000,00		-		-		-		-	75.000,00	258.975.000,00
38	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un panel en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	125,00	$ 873.209,00	$ 109.151.125,00		$ 0,00		$ 0,00	125,00	$ 109.151.125,00		-		-		-		-	125,00	109.151.125,00
Subtotal					**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**				**$ 368.126.125,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 368.126.125,00**		-		-		-		-		**368.126.125,00**
Circuito Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío, vía Las Flores (Puerto Berrío) - Bodegas - La Ye									**24.350.762.146,00**		**25.163.344**		**- 25.163.344,00**		**24.350.762.146,00**				**4.643.701,82**		**201.870.087,87**		**206.513.790,00**		**24.144.248.356,00**
VIA LA YE-YONDO																									
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			ENTREGABLE	128,00 un				$ 0,00													
39	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	38,00	$ 242.062,00	$ 9.198.356,00		$ 0,00		$ 0,00	38,00	$ 9.198.356,00		-		-		-		-	38,00	9.198.356,00
40	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	48,00	$ 60.533,00	$ 2.905.584,00		$ 0,00		$ 0,00	48,00	$ 2.905.584,00		-		-		-		-	48,00	2.905.584,00
41	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	4.352,00	$ 55.525,00	$ 241.644.800,00		$ 0,00		$ 0,00	4.352,00	$ 241.644.800,00		-		-		-		-	4.352,00	241.644.800,00
42	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, aceneo interno y compactación del material.	m3	1.408,00	$ 31.561,00	$ 44.437.888,00		$ 0,00		$ 0,00	1.408,00	$ 44.437.888,00		-		-		-		-	1.408,00	44.437.888,00
43	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	512,00	$ 112.153,00	$ 57.422.336,00		$ 0,00		$ 0,00	512,00	$ 57.422.336,00		-		-		-		-	512,00	57.422.336,00
44	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	128,00	$ 861.783,00	$ 110.308.224,00		$ 0,00		$ 0,00	128,00	$ 110.308.224,00		-		-		-		-	128,00	110.308.224,00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia

CONSORCIO MAGDALENA 787

Contrato: 2SDO1118282823 DE 2025

Objeto: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).

Valor contrato inicial: $54.441.800.920

Valor Adicional: -

Valor Total: $54.441.800.920

Plazo Inicial: 16 Meses

Contratista:
Consorcio Magdalena 787
Nit: 9020174564-0

Interventor:
Consocio Interviial Antioquia
Nit: 9020221514

Acta de obra No.3

Fecha de corte: 25 de junio de 2026
Periodo: 25/05/2026 - -25/06/2026

Cambio de Obra Acta No 3

Condiciones Originales del Contrato										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA No. 3 FECHA 27/07/2026				Obra Ejecutada								Saldo por ejecutar	
										OBRA QUE SE EJECUTA		OBRA QUE NO SE EJECUTA		ACTA No.1		ACTA No.2 - Mayo		ACTA No.3 - Junio		Acumulado			
N.°	ÍTEM DE PAGO	CÓDIGO ICDCIV ANEXO 16.3 - 16.13	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
45	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipatores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	1.093,00	$ 1.269.382,00	$ 1.387.434.526,00		$ 0,00		$ 0,00	1.093,00	$ 1.387.434.526,00							1.093,00	1.387.434.526,00
46	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	450,00	$ 140.512,00	$ 63.230.400,00		$ 0,00		$ 0,00	450,00	$ 63.230.400,00							450,00	63.230.400,00
47	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	768,00	$ 2.552.782,00	$ 1.960.536.576,00		$ 0,00		$ 0,00	768,00	$ 1.960.536.576,00							768,00	1.960.536.576,00
48	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	61.952,00	$ 8.000,0	$ 495.616.000,00		$ 0,00		$ 0,00	61.952,00	$ 495.616.000,00							61.952,00	495.616.000,00
49	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento)	m3-Km	38.400,00	$ 1.450,00	$ 55.680.000,00		$ 0,00		$ 0,00	38.400,00	$ 55.680.000,00							38.400,00	55.680.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**				**$ 4.428.414.690,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**						-		-		**4.428.414.690,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		**ENTREGABLE**	**30000,00**	m														
50	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	5.214,00	$ 55.525,00	$ 289.507.350,00		$ 0,00		$ 0,00	5.214,00	$ 289.507.350,00							5.214,00	289.507.350,00
51	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensaeo del Proctor modificado.	m3	2.400,00	$ 112.153,00	$ 269.167.200,00		$ 0,00		$ 0,00	2.400,00	$ 269.167.200,00							2.400,00	269.167.200,00
52	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	3.000,00	$ 1.057.370,00	$ 3.172.110.000,00		$ 0,00		$ 0,00	3.000,00	$ 3.172.110.000,00							3.000,00	3.172.110.000,00
53	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	84.002,00	$ 8.000,0	$ 672.016.000,00		$ 0,00		$ 0,00	84.002,00	$ 672.016.000,00							84.002,00	672.016.000,00
54	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento)	m3-Km	180.000,00	$ 1.450,00	$ 261.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00	180.000,00	$ 261.000.000,00							180.000,00	261.000.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCIÓN DE CUNETA**				**$ 4.663.800.550,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.663.800.550,00**				-		-		**4.663.800.550,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		**ENTREGABLE**	**30000,00**	m														
55	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	30.000,00	$ 90.000	$ 2.700.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00	30.000,00	$ 2.700.000.000,00							30.000,00	2.700.000.000,00
56	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	810.000,00	$ 1.450,00	$ 1.174.500.000,00		$ 0,00		$ 0,00	810.000,00	$ 1.174.500.000,00							810.000,00	1.174.500.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**				**$ 3.874.500.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.874.500.000,00**				-		-		**3.874.500.000,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		**Entregable**	**6000,00**	m														
57	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	480,00	$ 52.417,00	$ 25.160.160,00		$ 0,00		$ 0,00	480,00	$ 25.160.160,00							480,00	25.160.160,00
58	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensaeo del Proctor modificado.	m3	120,00	$ 112.153,00	$ 13.458.360,00		$ 0,00		$ 0,00	120,00	$ 13.458.360,00							120,00	13.458.360,00
59	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para contravano, relleno, entre otros	m	6.000,00	$ 115.514,00	$ 693.084.000,00		$ 0,00		$ 0,00	6.000,00	$ 693.084.000,00							6.000,00	693.084.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**				**$ 731.702.520,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 731.702.520,00**				-		-		**731.702.520,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		**ENTREGABLE**	**66,00**	un														
60	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	504,00	$ 34.914,00	$ 17.596.656,00		$ 0,00		$ 0,00	504,00	$ 17.596.656,00							504,00	17.596.656,00
61	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	672,00	$ 42.198,00	$ 28.357.056,00		$ 0,00		$ 0,00	672,00	$ 28.357.056,00							672,00	28.357.056,00
62	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	576,00	$ 1.058.425,00	$ 609.652.800,00		$ 0,00		$ 0,00	576,00	$ 609.652.800,00							576,00	609.652.800,00
63	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	3.262,00	$ 8.000,0	$ 26.096.000,00		$ 0,00		$ 0,00	3.262,00	$ 26.096.000,00							3.262,00	26.096.000,00
Subtotal					**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**				**$ 681.702.512,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 681.702.512,00**				-		-		**681.702.512,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		**ENTREGABLE**	**30,00**	Km														
64	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.520,00	$ 18.545,00	$ 46.733.400,00		$ 0,00		$ 0,00	2.520,00	$ 46.733.400,00							2.520,00	46.733.400,00
65	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.520,00	$ 150.822,00	$ 380.071.440,00		$ 0,00		$ 0,00	2.520,00	$ 380.071.440,00							2.520,00	380.071.440,00
66	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	42.000,00	$ 59.334,00	$ 2.492.028.000,00		$ 0,00		$ 0,00	42.000,00	$ 2.492.028.000,00							42.000,00	2.492.028.000,00
67	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	6.900,00	$ 54.614,00	$ 376.836.600,00		$ 0,00		$ 0,00	6.900,00	$ 376.836.600,00							6.900,00	376.836.600,00
68	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y transporte del material al sitio de acopio autorizado.	m3	5.520,00	$ 25.361,00	$ 139.992.720,00		$ 0,00		$ 0,00	5.520,00	$ 139.992.720,00							5.520,00	139.992.720,00
69	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	5.520,00	$ 8.405,00	$ 46.395.600,00		$ 0,00		$ 0,00	5.520,00	$ 46.395.600,00							5.520,00	46.395.600,00
70	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	18.960,00	$ 88.552,00	$ 1.678.945.920,00		$ 0,00		$ 0,00	18.960,00	$ 1.678.945.920,00							18.960,00	1.678.945.920,00
71	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carretanque.	m2	150.000,00	$ 5.413,00	$ 811.950.000,00		$ 0,00		$ 0,00	150.000,00	$ 811.950.000,00							150.000,00	811.950.000,00
72	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	150.000,00	$ 21.000,00	$ 3.150.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00	150.000,00	$ 3.150.000.000,00							150.000,00	3.150.000.000,00
73	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento)	m3-Km	534.937,50	$ 1.450,00	$ 775.659.375,00		$ 0,00		$ 0,00	534.937,50	$ 775.659.375,00							534.937,50	775.659.375,00
74	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de esponjamiento)	m3-Km	37.800,00	$ 1.450,00	$ 54.810.000,00		$ 0,00		$ 0,00	37.800,00	$ 54.810.000,00							37.800,00	54.810.000,00
Subtotal					**TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**				**$ 9.953.423.055,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 9.953.423.055,00**				-		-		**9.953.423.055,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		**ENTREGABLE**	**30,00**	Km														
75	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	90.000,00	$ 3.453,00	$ 310.770.000,00		$ 0,00		$ 0,00	90.000,00	$ 310.770.000,00							90.000,00	310.770.000,00
76	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un panal en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/4"	Und	150,00	$ 873.209,00	$ 130.981.350,00		$ 0,00		$ 0,00	150,00	$ 130.981.350,00							150,00	130.981.350,00
Subtotal					**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**				**$ 441.751.350,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 441.751.350,00**				-		-		**441.751.350,00**
									$ 24.775.294.677,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 24.775.294.677,00**				-		-		**24.775.294.677,00**
					SUBTOTAL OBRAS				**$ 49.126.006.923,00**		**$ 25.163.344,00**		**-$ 25.163.344,00**		**$ 49.126.006.923,00**		**4.643.701,82**		**201.870.087,57**		**206.513.790,00**		**48.919.543.033,00**

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES																							
										$ -													
Circuito Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío, vía Las Flores (Puerto Berrío) - Bodegas - La Ye																							
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado				$ 218.336.960,00				$ 218.336.960,00					$ 218.336.960,00	$ 8.953.584,00	$ 4.232.129,00	$ 6.045.013,00	$ 19.230.726,00		$ 199.106.234,00	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado				$ 223.237.641,00				$ 223.237.641,00					$ 223.237.641,00						$ 223.237.641,00	
CARACTERIZACION VIAL	Km	25,00	$ 1.055.961,00		$ 26.399.025,00									$ 26.399.025,00						$ 26.399.025,00	
VIA LA YE-YONDO																							
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado				$ 274.547.283,00				$ 274.547.283,00					$ 274.547.283,00			$ 1.328.582,00	$ 1.328.582,00		$ 273.218.701,00	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado				$ 264.473.841,00				$ 264.473.841,00					$ 264.473.841,00				$ -		$ 264.473.841,00	
CARACTERIZACION VIAL	Km	30,00	$ 1.055.961,00		$ 31.678.830,00									$ 31.678.830,00						$ 31.678.830,00	
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS	estimado				$ 460.006.797,00				$ 460.006.797,00					$ 460.006.797,00			$ 209.271.989,00	$ 209.271.989,00		$ 250.734.808,00	
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	estimado				$ 3.817.063.720,00				$ 3.817.063.720,00					$ 3.817.063.720,00				$ -		$ 3.817.063.720,00	
VALOR TOTAL					**$ 54.441.800.920,00**		**$ 25.163.344,00**		**-$ 25.163.344,00**		**$ 54.441.800.920,00**		**$ 8.953.584,00**		**$ 8.875.830,82**		**$ 418.515.671,87**		**$ 436.345.087,00**		**$ 54.005.455.833,00**	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			**19%**		**$ 8.166.270.138,00**		**$ 3.774.502,00**		**-$ 3.774.502,00**		**$ 8.166.270.138,00**		**$ 1.343.038,00**		**$ 1.331.375,00**		**$ 62.777.351,00**		**$ 65.451.764,00**		**$ 8.100.818.374,00**	
VALOR DE ACTA A FACTURAR					**$ 46.275.530.782,00**		**$ 21.388.842,00**		**-$ 21.388.842,00**		**$ 46.275.530.782,00**		**$ 7.610.546,00**		**$ 7.544.455,82**		**$ 355.738.320,87**		**$ 370.893.323,00**		**$ 45.904.637.459,00**	

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**ADMINISTRACION**	**A=**	20,23%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del	**UTILIDAD**	**I=**	1,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**U=**	5,00%
NOTA 4: El valor de los ítems denominados "estimados" no podrá ser modificado por el proponente.	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	32,23%
NOTA 5: El VALOR TOTAL de cada ítem deberá ser ajustado al peso sea por exceso o por defecto así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a			
NOTA 6: Conozco y acepto que el valor total aquí consignado debe coincidir con el valor total de la oferta económica contenido en el cuestionario de lista de precios.			

VALOR		%
VALOR ANTICIPO OTORGADO	$ 8.166.270.138,00	**100,0%**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE	$ 62.777.351,00	**0,77%**
VALOR AMORTIZADO	$ 65.451.764,00	**0,80%**
VALOR SALDO POR AMORTIZAR	$ 8.100.818.374,00	**99,20%**

CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA
C.C. No. 13.724.202 DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MAGDALENA 787

MANUEL ARMANDO ROZO VÁSQUEZ
C.C. No. 1.017.169.960
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAL MAGDALENA

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**	**UNIDAD**		**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

		Actividad					**Total**
		Social					$ 1.091.800,00
		Ambiental					$ 4.085.135,00
		SST					$ 868.078,00

Subtotal	**$ 6.045.013,00**
Vienen	**13.185.713,00**
TOTAL	**$ 19.230.726,00**

YESENIA JACOME QUEVEDO
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)**	**UNIDAD**		**UBICACIÓN**	**Yondo**

		Actividad					**Total**
		Social junio					$ 1.328.582,00

Subtotal	**$ 1.328.582,00**
Vienen	**-**
TOTAL	**$ 1.328.582,00**

Residente de obra
Consorcio Magdalena 787


Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**1**	**Item**	**2.8**	**Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

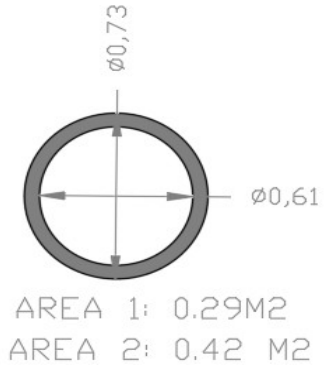

OBRA	Ficha	PR	Lado 1 (m)	Lado 2 (m)	Altura	Area	Espesor/Longitud	Descripción	Volumen
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA									
Alcantarilla	2		0,90	0,90		0,81	0,2	Demolición de muro caido en	0,16
DEMOLICIÓN DE CAJAS DE ENCOLE ALCATARILLAS RETIRADAS									
Alcantarilla	8		1,70		1,85	3,15	0,50	Demolición de muro frontal	1,57
Alcantarilla	8					0,42	0,50	Descuento de tubería	-0,21
Alcantarilla	8		0,90		1,15	1,04	0,40	Muro izquierdo	0,41
Alcantarilla	8		0,90		1,15	1,04	0,40	Muro derecho	0,41
Alcantarilla	8		1,70		1,15	1,96	0,40	Muro posterior	0,78
Alcantarilla	8		1,70	1,80		3,06	0,40	Piso	1,22
Alcantarilla	6		1,60		2	3,20	0,35	Demolición de muro frontal	1,12
Alcantarilla	6					0,42	0,35	Descuento de tubería	-0,15
Alcantarilla	6		1,00		1,6	1,60	0,30	Muro izquierdo	0,48
Alcantarilla	6		1,00		1,6	1,60	0,30	Muro derecho	0,48
Alcantarilla	6		1,60		1,6	2,56	0,30	Muro posterior	0,77
Alcantarilla	6		1,65	1,60		2,64	0,30	Piso	0,79
CAMBIO DE TUBERÍA DE 24" A 36"									
Alcantarilla	14		0,20	0,50	1,8	0,63	1,40	Demolición de cabezote de descole	0,88
Alcantarilla	14					0,29	0,35	Menos Diametro interno de tubo 24 " de descole	-0,10
Alcantarilla	14					1,00	0,40	Ampliación de muro para tubo de 36" caja de encole	0,40
Alcantarilla	15					1,00	0,40	Ampliación de muro para tubo de 36" caja de descole	0,40
Alcantarilla	15					1,00	0,40	Ampliación de muro para tubo de 36" caja de encole	0,40
Alcantarilla	17		1,40	0,35		0,49	1,80	Demolición de cabezote de descole	0,88

CONSORCIO MAGDALENA 787

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

Hoja 1 de 1

FECHA	25-jun-26	CORTE No.	3	Elaboró	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	NIT	902021514-6	CONTRATO No.	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	NIT	902017464-0	CONTRATO No.	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	No	1	Item	2.8	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	Puerto Berrio

Alcantarilla	17					0,29	0,35	Menos Diametro interno de tubo 24 " de descole		-0,10
Alcantarilla	17		1,40	0,30		0,42	1,50	Demolición de cabezote de encole		0,63
Alcantarilla	17					0,29	0,30	Menos Diametro interno de tubo 24 " de encole		-0,09
Alcantarilla	18					1,00	0,40	Ampliación de muro para tubo de 36" caja de descole		0,40
Alcantarilla	18					1,00	0,40	Ampliación de muro para tubo de 36" caja de encole		0,40

Zona de receptor margaritas PR 0+070
Distnacia desde cantera a punto Cero 82 km

Subtotal	11,93
Vienen	0
TOTAL	11,93

YESENIA JACOME QUEVEDO
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**1**	**Item**	**2.8**	**Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

REGISTRO FOTOGRAFICO



ALCANTARILLA - FICHA 2



ALCANTARILLA - FICHA 8



ALCANTARILLA - FICHA 8



ALCANTARILLA - FICHA 8



ALCANTARILLA - FICHA 6



ALCANTARILLA - FICHA 6



ALCANTARILLA - FICHA 6

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**4**	**Item**	**4.2.2**	**Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

OBRA	Ficha	PR	Base 1 (m)	Base 2 (m)	Altura	Area (m2)	Longitud (m)	Descripción	Volumen
RETIRO DE ALCANTARILLAS									
Alcantarilla	1A		1	1,65	1,67	2,21	6	Lleno inferior con material de excavación	13,28
Alcantarilla	1A							cobrado en Acta 2	-16,61
Alcantarilla	6		0,8	0,97	1,13	1,00	7,40	Lleno inferior con material de excavación	7,40
Alcantarilla	16		1,4	1,93	1,15	1,91	5,79	Lleno inferior con material de excavación	11,09
Alcantarilla	20		1,5	1,9	1,21	2,06	6,80	Lleno inferior con material de excavación	13,99
Alcantarilla	23A		1,4	1,63	0,57	0,86	7,40	Lleno inferior con material de excavación	6,39
Alcantarilla	24A		1,25	1,35	0,19	0,25	7,70	Lleno inferior con material de excavación	1,90
Alcantarilla	30		1,5	1,85	1,25	2,09	7,05	Lleno inferior con material de excavación	14,76
Alcantarilla	33		1,3	1,66	0,96	1,42	6,90	Lleno inferior con material de excavación	9,80
Alcantarilla	37		1,3	1,73	1,18	1,79	6,00	Lleno inferior con material de excavación	10,73
Alcantarilla	38		1,6	2,15	1,4	2,63	7,80	Lleno inferior con material de excavación	20,48
Alcantarilla	39		2	2,12	1,25	2,58	6,60	Lleno inferior con material de excavación	17,00

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**4**	**Item**	**4.2.2**	**Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

Alcantarilla	39A		1,6	1,8	0,6	1,02	6,10	Lleno inferior con material de excavación		6,22
Alcantarilla	44		1,5	1,8	0,92	1,52	6,70	Lleno inferior con material de excavación		10,17
Alcantarilla	49		1,5	1,78	0,8	1,31	6,70	Lleno inferior con material de excavación		8,79
Alcantarilla	54		1,5	1,89	1,1	1,86	7,30	Lleno inferior con material de excavación		13,61
Alcantarilla	59		1,4	1,72	0,6	0,94	8,00	Lleno inferior con material de excavación		7,49
Alcantarilla	69		1,5	1,95	1,15	1,98	7,00	Lleno inferior con material de excavación		13,89
Alcantarilla	78A		1,2	1,45	0,4	0,53	7,20	Lleno inferior con material de excavación		3,82
Alcantarilla	86		1,4	1,73	0,82	1,28	5,75	Lleno inferior con material de excavación		7,38
Alcantarilla	94		1,5	1,98	1,02	1,77	5,10	Lleno inferior con material de excavación		9,05
Alcantarilla	103		1,9	2,31	1,3	2,74	7,10	Lleno inferior con material de excavación		19,43
Alcantarilla	106		1,3	1,55	0,4	0,57	6,70	Lleno inferior con material de excavación		3,82
DEMOLICIÓN DE CAJAS DE ENCOLE ALCATARILLAS RETIRADAS										
Alcantarilla	8		2	2,15		4,30	1,45	Lleno de caja por retiro para dejar paso al filtros		6,24
Alcantarilla	6		1,65	2,4		3,96	2,35	Lleno de caja por retiro para dejar paso al filtros		9,31

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**4**	**Item**	**4.2.2**	**Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

Se realiza

Subtotal	**229,43**
Vienen	**16,61**
TOTAL	**246,04**

YESENIA JACOME *QUEVEDO*
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025


CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**4**	**Item**	**4.2.2**	**Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

REGISTRO FOTOGRAFICO







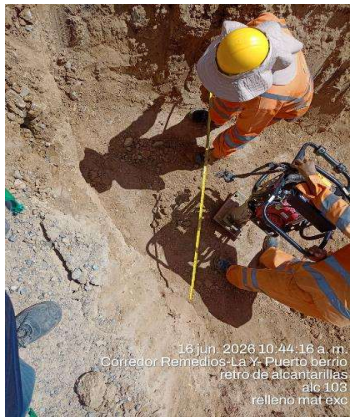





CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**5**	**Item**	**5.1.7**	**Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

OBRA	Ficha	PR	Base 1 (m)	Base 2 (m)	Altura	Area (m2)	Longitud (m)	Descripción	Volumen
RETIRO DE ALCANTARILLAS									
Alcantarilla	1A		1,65	2	0,9	1,64	6	Relleno superior	9,86
Alcantarilla	1A							cobrado en Acta 2	-13,23
Alcantarilla	16		1,93	2,35	0,9	1,93	5,79	Relleno superior	11,15
Alcantarilla	19		1,3	2,4	0,95	1,76	6,40	Relleno completo	11,25
Alcantarilla	20		1,9	2,2	0,9	1,85	6,80	Relleno superior	12,55
Alcantarilla	23A		1,63	2	0,9	1,63	7,40	Relleno superior	12,09
Alcantarilla	24A		1,35	1,85	0,9	1,44	7,70	Relleno superior	11,09
Alcantarilla	30		1,85	2,1	0,9	1,78	7,05	Relleno superior	12,53
Alcantarilla	33		1,66	2	0,9	1,65	6,90	Relleno superior	11,36
Alcantarilla	37		1,73	2,05	0,9	1,70	6,00	Relleno superior	10,21
Alcantarilla	38		2,15	2,5	0,9	2,09	7,80	Relleno superior	16,32
Alcantarilla	39		2,12	2,2	0,9	1,94	6,60	Relleno superior	12,83
Alcantarilla	39A		1,8	2,1	0,9	1,76	6,10	Relleno superior	10,71
Alcantarilla	44		1,8	2,1	0,9	1,76	6,70	Relleno superior	11,76
Alcantarilla	49		1,78	2,1	0,9	1,75	6,70	Relleno superior	11,70
Alcantarilla	54		1,89	2,2	0,9	1,84	7,30	Relleno superior	13,44
Alcantarilla	59		1,72	2,2	0,9	1,76	8,00	Relleno superior	14,11
Alcantarilla	69		1,95	2,3	0,9	1,91	7,00	Relleno superior	13,39
Alcantarilla	78A		1,45	2	0,9	1,55	7,20	Relleno superior	11,18
Alcantarilla	86		1,73	2,1	0,9	1,72	5,75	Relleno superior	9,91
Alcantarilla	94		1,98	2,4	0,9	1,97	5,10	Relleno superior	10,05
Alcantarilla	103		2,31	2,6	0,9	2,21	7,10	Relleno superior	15,69
Alcantarilla	106		1,55	1,8	0,4	0,67	6,70	Relleno superior	4,49
CAMBIO DE TUBERIA									
Alcantarilla	14	Acta 4	1,2		0,15	0,18	7,14	Cama de tubería	1,29
Alcantarilla	14	Acta 4	1,2	3,2	1,65	3,63	7,14	LLeno	25,92
Alcantarilla	14	Acta 4				0,79	7,14	Tubo	-5,61
Alcantarilla	15	Acta 4	2		0,15	0,30	6,76	Cama de tubería	2,03
Alcantarilla	15	Acta 4	2	3,5	1,7	4,68	6,76	LLeno	31,60
Alcantarilla	15	Acta 4				0,79	6,76	Tubo	-5,34
Alcantarilla	17	Acta 4	1,6		0,1	0,16	7,00	Cama de tubería	1,12
Alcantarilla	17	Acta 4	1,6	3,2	1,2	2,88	7,00	LLeno	20,16

CONSORCIO MAGDALENA 787

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**

INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**5**	**Item**	**5.1.7**	**Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.**			**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

Alcantarilla	17	Acta 4				0,79	7,00	Tubo	-5,53
Alcantarilla	18	Acta 4	1,6		0,15	0,24	6,69	Cama de tubería	1,61
Alcantarilla	18	Acta 4	1,6	3,1	1,4	3,29	6,69	LLeno	22,01
Alcantarilla	18	Acta 4				0,79	6,69	Tubo	-5,29

Subtotal	**328,41**
Vienen	**13,23**
TOTAL	**341,64**

YESENIA JACOME QUEVEDO
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**5**	**Item**	**5.1.7**	**Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

REGISTRO FOTOGRAFICO

















CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**8**	**Item**	**8.1**	**Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.**	**UNIDAD**	**m**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

OBRA	Ficha	PR					Lontigtud (m)	Descripción	Volumen
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA									
Alcantarilla	2						8	Tubería	8,00
Alcantarilla	3						7,50	Tubería	7,50
Alcantarilla	4						8,00	Tubería	8,00
Alcantarilla	5						7,60	Tubería	7,60
Alcantarilla	21						7,30	Tubería	7,30
Alcantarilla	29						7,50	Tubería	7,50
Alcantarilla	36						6,20	Tubería	6,20
Alcantarilla	40						8,20	Tubería	8,20
Alcantarilla	45						8,10	Tubería	8,10
Alcantarilla	50						15,00	Tubería	15,00
Alcantarilla	61						8,40	Tubería	8,40
Alcantarilla	62						7,45	Tubería	7,45
Alcantarilla	67						18,00	Tubería	18,00

Zona de receptor margaritas PR 0+070
Distnacia desde cantera a punto Cero 82 km

Subtotal	**117,25**
Vienen	**0**
TOTAL	**117,25**

YESENIA JACOME QUEVEDO
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**8**	**Item**	**8.1**	**Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.**	**UNIDAD**	**m**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

REGISTRO FOTOGRAFICO



ALCANTARILLA - FICHA 2



ALCANTARILLA - FICHA 62



ALCANTARILLA - FICHA 29




ALCANTARILLA - FICHA 40



ALCANTARILLA - FICHA 36



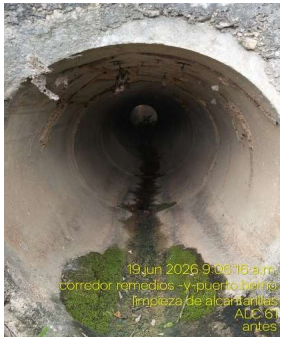

ALCANTARILLA - FICHA 61



ALCANTARILLA - FICHA 67



ALCANTARILLA - FICHA 67

CONSORCIO MAGDALENA 787

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

Hoja 1 de 1

FECHA	25-jun-26	CORTE No.	3	Elaboró	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	NIT	902021514-6	CONTRATO No.	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	NIT	902017464-0	CONTRATO No.	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	No	9	Item	8.27	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	UNIDAD	m	UBICACIÓN	Puerto Berrio

OBRA	Ficha	PR					Longitud (m)	Descripción	Volumen
CAMBIO DE TUBERIA									
Alcantarilla	14						7,69	Tubería	7,69
Alcantarilla	15						7,31	Tubería	7,31
Alcantarilla	17						7,65	Tubería	7,65
Alcantarilla	18						7,24	Tubería	7,24
								Subtotal	29,89
								Vienen	0
								TOTAL	29,89

YESENIA JACOME QUEVEDO
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

REGISTRO FOTOGRAFICO









CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**11**	**Item**	**13.1**	**Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).**	**UNIDAD**	**m3-Km**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

OBRA	**Ficha**	**PR**	**Volumen**	**Distancia**				**Descripción**	**m3 -Km**
RETIRO DE ALCANTARILLAS									
Alcantarilla	1A	K0+161	9,86	82,16				Relleno sub base superior	810,11
Alcantarilla	16	K1+454	11,15	83,45				Relleno sub base superior	930,51
Alcantarilla	19	K1+629	11,25	83,63				Relleno sub base superior	940,83
Alcantarilla	20	K1+807	12,55	83,81				Relleno sub base superior	1051,78
Alcantarilla	23A	K2+162	12,09	84,16				Relleno sub base superior	1017,52
Alcantarilla	24A	K2+242	11,09	84,24				Relleno sub base superior	934,24
Alcantarilla	30	K2+985	12,53	84,98				Relleno sub base superior	1064,86
Alcantarilla	33	K3+353	11,36	85,35				Relleno sub base superior	969,61
Alcantarilla	37	K3+930	10,21	85,93				Relleno sub base superior	877,34
Alcantarilla	38	K4+070	16,32	86,07				Relleno sub base superior	1404,66
Alcantarilla	39	K4+136	12,83	86,14				Relleno sub base superior	1105,12
Alcantarilla	39A	K4+170	10,71	86,17				Relleno sub base superior	922,88
Alcantarilla	44	K4+955	11,76	86,95				Relleno sub base superior	1022,59
Alcantarilla	49	K5+281	11,70	87,28				Relleno sub base superior	1021,18
Alcantarilla	54	K5+531	13,44	87,53				Relleno sub base superior	1176,42

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**11**	**Item**	**13.1**	**Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).**	**UNIDAD**	**m3-Km**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

Alcantarilla	59	K5+850	14,11	87,85				Relleno sub base superior		1239,56
Alcantarilla	69	K6+600	13,39	88,60				Relleno sub base superior		1186,35
Alcantarilla	78A	K7+510	11,18	89,51				Relleno sub base superior		1000,72
Alcantarilla	86	K8+250	9,91	90,25				Relleno sub base superior		894,38
Alcantarilla	94	K9+010	10,05	91,01				Relleno sub base superior		914,65
Alcantarilla	103	K9+950	15,69	91,95				Relleno sub base superior		1442,70
Alcantarilla	106	K10+300	4,49	92,30				Relleno sub base superior		414,43
CAMBIO DE TUBERIA										
Alcantarilla	14	K1+376	1,29	83,38				Material de sub base item 5.1.7 Cama de tubería		107,55
Alcantarilla	14	K1+376	25,92	83,38				Material de sub base item 5.1.7 LLeno		2161,10
Alcantarilla	14	K1+376	-5,61	83,38				Material de sub base item 5.1.7 Tubo		-467,74
Alcantarilla	15	K1+423	2,03	83,42				Material de sub base item 5.1.7 Cama de tubería		169,35
Alcantarilla	15	K1+423	31,60	83,42				Material de sub base item 5.1.7 LLeno		2636,18
Alcantarilla	15	K1+423	-5,34	83,42				Material de sub base item 5.1.7 Tubo		-445,48

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**11**	**Item**	**13.1**	**Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).**	**UNIDAD**	**m3-Km**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

Alcantarilla	17	K1+480	1,12	83,48				Material de sub base item 5.1.7 Cama de tubería		93,50
Alcantarilla	17	K1+480	20,16	83,48				Material de sub base item 5.1.7 LLeno		1682,97
Alcantarilla	17	K1+480	-5,53	83,48				Material de sub base item 5.1.7 Tubo		-461,65
Alcantarilla	18	K1+555	1,61	83,56				Material de sub base item 5.1.7 Cama de tubería		134,52
Alcantarilla	18	K1+555	22,01	83,56				Material de sub base item 5.1.7 LLeno		1839,05
Alcantarilla	18	K1+555	-5,29	83,56				Material de sub base item 5.1.7 Tubo		-442,01
								Subtotal		**29.349,78**
								Vienen		**0**
								TOTAL		**29.349,78**

YESENIA JACOME QUEVEDO
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26		**CORTE No.**	3		**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**11**	**Item**	**13.1**	**Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).**	**UNIDAD**	**m3-Km**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

CONSORCIO MAGDALENA 787

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**19**	**Item**	**4.1.2**	**Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

OBRA	Ficha	PR	Base 1 (m)	Base 2 (m)	Altura	Area	Espesor/Longitud	Descripción	Volumen
DEMOLICIÓN DE CAJAS DE ENCOLE ALCATARILLAS RETIRADAS									
Alcantarilla	8		1,20	2,50	0,5	0,93	1,30	Excavación detrás de caja	1,20
Alcantarilla	8		0,90	0,90		0,81	1,15	Excavación dentro de caja	0,93
Alcantarilla	6		3,00	0,75		2,25	2,35	Excavación detrás de caja	5,29
Alcantarilla	6		1,00	1,00		1,00	2,35	Excavación dentro de caja	2,35
CAMBIO DE TUBERÍA DE 24" A 36"									
Alcantarilla	14		1,20	0,15		0,18	7,14	Cama de tubería	1,29
Alcantarilla	15		2,00	0,15		0,30	6,76	Cama de tubería	2,03
Alcantarilla	17		1,60	0,10		0,16	7,00	Cama de tubería	1,12
Alcantarilla	18		1,60	0,15		0,24	6,69	Cama de tubería	1,61

Subtotal	**15,82**
Vienen	**0**
TOTAL	**15,82**

YESENIA JACOME QUEVEDO
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**


FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025


CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**19**	**Item**	**4.1.2**	**Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**

REGISTRO FOTOGRAFICO



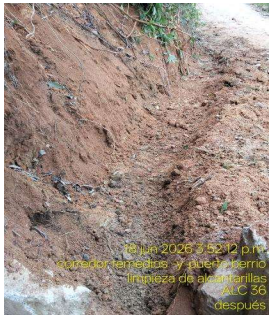



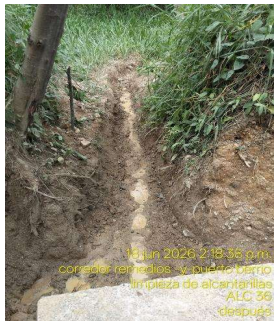









CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**19**	**Item**	**4.1.2**	**Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**









CONSORCIO MAGDALENA 787 | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, República de Colombia


MEMORIAS DE CÁLCULO

Hoja 1 de 1

FECHA	25-jun-26		CORTE No.	3		Elaboró	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	NIT	902021514-6	CONTRATO No.	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	NIT	902017464-0	CONTRATO No.	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	No	22	Item	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	Puerto Berrio

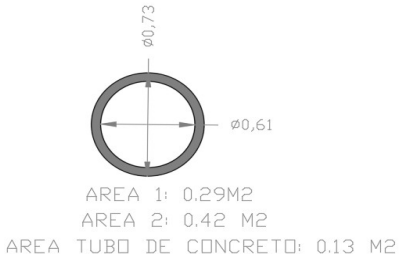

OBRA	Ficha	PR	Base 1 (m)	Base 2 (m)	Altura	Area (m2)	Longitud (m)	Descripción	Volumen
RETIRO DE ALCANTARILLAS									
Alcantarilla	1A		1	2	2,57	3,86	6		23,13
Alcantarilla	1A					0,13	6,00	tubo de concreto	-0,78
Alcantarilla	1A							Crobrado en Acta 2	-29,84
Alcantarilla	6		0,8	1,1	2,03	1,93	7,40		14,27
Alcantarilla	6					0,13	7,40	tubo de concreto	-0,96
Alcantarilla	8		0,8	1	1,15	1,04	6,67		6,90
Alcantarilla	8					0,13	6,67	tubo de concreto	-0,87
Alcantarilla	16		1,4	2,35	2,05	3,84	5,79		22,26
Alcantarilla	16					0,13	5,79	tubo de concreto	-0,75
Alcantarilla	19		1,3	2,4	0,95	1,76	6,40		11,25
Alcantarilla	19					0,13	6,40	tubo de concreto	-0,83
Alcantarilla	20		1,5	2,2	2,11	3,90	6,80		26,54
Alcantarilla	20					0,13	6,80	tubo de concreto	-0,88
Alcantarilla	23A		1,4	2	1,47	2,50	7,40		18,49
Alcantarilla	23A					0,13	7,40	tubo de concreto	-0,96
Alcantarilla	24A		1,25	1,85	1,09	1,69	7,70		13,01
Alcantarilla	24A					0,13	7,70	tubo de concreto	-1,00
Alcantarilla	30		1,5	2,1	2,15	3,87	7,05		27,28
Alcantarilla	30					0,13	7,05	tubo de concreto	-0,92
Alcantarilla	33		1,3	2	1,86	3,07	6,90		21,18
Alcantarilla	33					0,13	6,90	tubo de concreto	-0,90
Alcantarilla	37		1,3	2,05	2,08	3,48	6,00		20,90
Alcantarilla	37					0,13	6,00	tubo de concreto	-0,78

CONSORCIO MAGDALENA 787 | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

Hoja 1 de 1

FECHA	25-jun-26		CORTE No.	3		Elaboró	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	NIT	902021514-6	CONTRATO No.	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	NIT	902017464-0	CONTRATO No.	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	No	22	Item	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	Puerto Berrio

Alcantarilla	38		1,6	2,5	2,3	4,72	7,80			36,78
Alcantarilla	38					0,13	7,80	tubo de concreto		-1,01
Alcantarilla	39		2	2,2	2,15	4,52	6,10			27,54
Alcantarilla	39					0,13	6,10	tubo de concreto		-0,79
Alcantarilla	39A		1,6	2,1	1,5	2,78	6,10			16,93
Alcantarilla	39A					0,13	6,10	tubo de concreto		-0,79
Alcantarilla	44		1,5	2,1	1,82	3,28	6,70			21,95
Alcantarilla	44					0,13	6,70	tubo de concreto		-0,87
Alcantarilla	49		1,5	2,1	1,7	3,06	6,70			20,50
Alcantarilla	49					0,13	6,70	tubo de concreto		-0,87
Alcantarilla	54		1,5	2,2	2	3,70	7,30			27,01
Alcantarilla	54					0,13	7,30	tubo de concreto		-0,95
Alcantarilla	59		1,4	2,2	1,5	2,70	8,00			21,60
Alcantarilla	59					0,13	8,00	tubo de concreto		-1,04
Alcantarilla	69		1,5	2,3	2,05	3,90	7,00			27,27
Alcantarilla	69					0,13	7,00	tubo de concreto		-0,91
Alcantarilla	78A		1,2	2	1,3	2,08	7,20			14,98
Alcantarilla	78A					0,13	7,20	tubo de concreto		-0,94
Alcantarilla	86		1,4	2,1	1,72	3,01	5,75			17,31
Alcantarilla	86					0,13	5,75	tubo de concreto		-0,75
Alcantarilla	94		1,5	2,4	1,92	3,74	5,10			19,09
Alcantarilla	94					0,13	5,10	tubo de concreto		-0,66
Alcantarilla	103		1,9	2,6	2,2	4,95	7,10			35,15
Alcantarilla	103					0,13	7,10	tubo de concreto		-0,92
Alcantarilla	106		1,3	1,8	0,8	1,24	6,70			8,31
Alcantarilla	106					0,13	6,70	tubo de concreto		-0,87
CAMBIO DE TUBERIA										
Alcantarilla	14		1,2	3,2	1,65	3,63	7,14	Cuerpo de tuberia		25,92
Alcantarilla	14					0,42	7,14	Tubería de 24"		-3,00
Alcantarilla	15		2	3,5	1,7	4,68	6,76	Cuerpo de tuberia		31,60

CONSORCIO MAGDALENA 787 | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

Hoja 1 de 1

FECHA	25-jun-26	CORTE No.	3	Elaboró	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	NIT	902021514-6	CONTRATO No.	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	NIT	902017464-0	CONTRATO No.	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	No	22	Item	4.1.9	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	Puerto Berrio

Alcantarilla	15					0,42	6,76	Tubería de 24"	-2,84
Alcantarilla	17		1,6	3,2	1,2	2,88	7,00	Cuerpo de tuberia	20,16
Alcantarilla	17					0,42	7,00	Tubería de 24"	-2,94
Alcantarilla	18		1,6	3,1	1,4	3,29	6,69	Cuerpo de tuberia	22,01
Alcantarilla	18					0,42	6,69	Tubería de 24"	-2,81

El volumen de excavación fue estimado mediante aproximación geométrica tipos sección trapezoidal

Subtotal	536,89
Vienen	75,49
TOTAL	612,38

YESENIA JACOME *QUEVEDO*
Residente de obra
Consorcio Magdalena 787

MARÍA ISABEL CAUSIL PÉREZ
Residente de interventoría
Consorcio Intervial Magdalena

CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**

FECHA	25-jun-26	**CORTE No.**	3	**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo


OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025

CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**22**	**Item**	**4.1.9**	**Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**


REGISTRO FOTOGRAFICO




ALCANTARILLA - FICHA 1A




ALCANTARILLA - FICHA 6




ALCANTARILLA - FICHA 33




ALCANTARILLA - FICHA 59

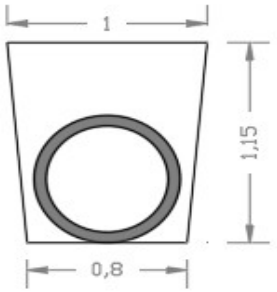


ALCANTARILLA - FICHA 8

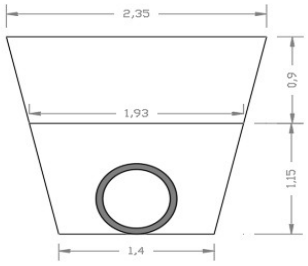

ALCANTARILLA - FICHA 16

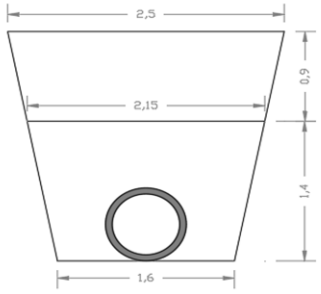



ALCANTARILLA - FICHA 38



ALCANTARILLA - FICHA 78A










CONSORCIO MAGDALENA 787	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**MEMORIAS DE CÁLCULO**	**Hoja 1 de 1**


FECHA	25-jun-26		**CORTE No.**	3		**Elaboró**	Yesenia Jácome Quevedo

OBJETO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).**				
INTERVENTOR	Consorcio Intervial Antioquia	**NIT**	902021514-6	**CONTRATO No.**	20260064 de 2025
CONTRATISTA	Consorcio Magdalena 787	**NIT**	902017464-0	**CONTRATO No.**	2500111B2823 de 2025


CAPÍTULO	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**	**No**	**22**	**Item**	**4.1.9**	**Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.**	**UNIDAD**	**m3**	**UBICACIÓN**	**Puerto Berrio**




ALCANTARILLA - FICHA 19




ALCANTARILLA - FICHA 20




ALCANTARILLA - FICHA 39A




ALCANTARILLA - FICHA 94

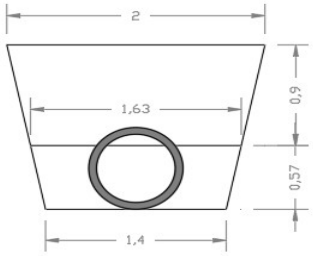


ALCANTARILLA - FICHA 23A



ALCANTARILLA - FICHA 24A

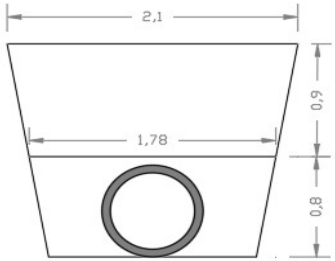

ALCANTARILLA - FICHA 49



ALCANTARILLA - FICHA 37

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.396.987 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 214221-T SI, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO MAGDALENA 787,** identificada con NIT **902.017.464-0**, ejecutor del contrato de obra Pública No. 25OO111B2823 que tiene por objeto: *"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO)"*, con ocasión a la información allegada por el respectivo consorcio, certifico bajo la gravedad de juramento que el Consorcio ha cumplido y se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante el mes de junio de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en **BUCARAMANGA**, a los **02** días del mes de Septiembre de **2026.**

CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA
C.C. 13.724.202
Representante Legal
CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT. 902.017.464 – 0

CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ
TP. 214221-T
CONTADOR PÚBLICO
CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT. 902.017.464 - 0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.396.987 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 214221-T SI, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO MAGDALENA 787,** identificada con NIT **902.017.464-0**, ejecutor del contrato de obra Pública No. 25OO111B2823 que tiene por objeto: *"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO)"*, con ocasión a la información allegada por el respectivo consorcio, certifico bajo la gravedad de juramento que el Consorcio ha cumplido y se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante el mes de julio de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en **BUCARAMANGA**, a los **02** días del mes de Septiembre de **2026.**

CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA
C.C. 13.724.202
Representante Legal
CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT. 902.017.464 – 0

CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ
TP. 214221-T
CONTADOR PÚBLICO
CONSORCIO MAGDALENA 787
NIT. 902.017.464 - 0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.396.987

GARAVITO RODRIGUEZ


APELLIDOS

CRISTIAN FERNANDO

NOMBRES

Cristian F G.

FIRMA

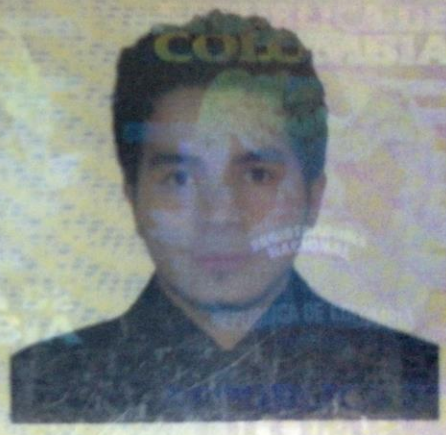



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-1994

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-OCT-2012 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00410716-M-1022396987-20121106 0031605646A 1 39120170

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214221-T



CRISTIAN FERNANDO
GARAVITO RODRIGUEZ
C.C. 1022396987

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 19/02/2016
UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 226284

217088

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5E7F4AC20A07FDE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022396987 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 214221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA	**CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

Medellin, 04 de Septiembre de 2026.

Señores
RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Cra 43 A # 19 - 127
Medellín – Antioquia

El suscrito, **Manuel Fernando Rozo Vasquez** identificado con cedula de ciudadanía **1.017.189.868**, quien actúa como representante legal del **CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA** identificado con Nit **902.021.514-6** a cargo del Contrato 20260064, Objeto: Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal al contrato de actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías en la Subregión Magdalena Medio (Lote 4) a cargo del Departamento de Antioquia..

Hace constar que de acuerdo con la certificación entregada por **CONSORCIO MAGDALENA 787** con **NIT:902.017.464-0** Contrato 25OO111B2823 de 2025 , Objeto: "Actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de las vías a cargo del departamento de Antioquia (lote 4 magdalena medio)". Se encuentran al día con sus obligaciones del pago de los aportes de los empleados a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al servicio nacional de aprendizaje-SENA, instituto colombiano de bienestar familiar -ICBF y cajas de compensación (Articulo 23 de la le 1150 de 2007) a la fecha.

Manuel Fernando Rozo Vasquez
C.C 1.017.189.868 de Medellín
Representante Legal
Consorcio Intervial Antioquia Nit. 902.021.514-6

HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 901.262.851 - 3

CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con **C.C. 1.000.808.275** y tarjeta profesional **No. 317795 – T**, de **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS** identificada con **NIT. 901.262.851 – 3,** certifico bajo la gravedad de juramento que la citada sociedad ha cumplido y se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante el mes de junio de 2026.

Se expide en BOGOTA D.C., a los **02** días del mes de Septiembre de 2026.

Cordialmente,



Jeferson Andres Garcia Rodriguez
C.C. 1.000.808.275
Revisor Fiscal
TP. 317795 - T

HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 901.262.851 - 3

CERTIFICACIÓN

El suscrito Revisor Fiscal **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con **C.C. 1.000.808.275** y tarjeta profesional **No. 317795 – T**, de **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS** identificada con **NIT. 901.262.851 – 3,** certifico bajo la gravedad de juramento que la citada sociedad ha cumplido y se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante el mes de Julio de 2026.

Se expide en BOGOTA D.C., a los **02** días del mes de Septiembre de 2026.

Cordialmente,



Jeferson Andres Garcia Rodriguez
C.C. 1.000.808.275
Revisor Fiscal
TP. 317795 - T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.000.808.275

GARCIA RODRIGUEZ
APELLIDOS

JEFERSON ANDRES
NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-2002

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

24-ENE-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

317795-T



JEFERSON ANDRES
GARCIA RODRIGUEZ
C.C. 1000808275
RES. INSCRIPCION 465 DEL 01/11/2023
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

367671 **372379**

220341/0622

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7AAB9E9E8C985A63

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000808275 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 317795-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

1

27/07/2026
(Día / Mes / Año)

ORGANISMO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** DESARROLLO FÍSICO

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 2500111B2823 de 2025

OBJETO:
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO).

CONTRATISTA: CONSORCIO MAGDALENA 787

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 20260064 de 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

PLAZO INICIAL: 16 meses 16 meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10-feb-26 16-jun-26

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 42,275,630,782.00 $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 42,275,630,782.00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	CÓDIGO ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR		ACTA ACTA No. FECHA	PRESENTES			
		ANEXO 16.3 - 16.13	GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR		
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**Entregable**	**59.00 un**								
1	2.8	11601	INVIAS 201-22	m3	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	42.00	$ 242,062.00	$ 10,166,604.00	42.00	$ 10,166,604.00	+			42.00	$ 10,166,604
2	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	m	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	54.00	$ 60,533.00	$ 3,268,782.00	54.00	$ 3,268,782.00	+			54.00	$ 3,268,782
3	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	m3	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2,006.00	$ 55,525.00	$ 111,383,150.00	2,006.00	$ 111,383,150.00	-	- 453.19	($ 25,163,344.00)	1,552.81	$ 86,219,806
4	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	m3	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	649.00	$ 31,561.00	$ 20,483,089.00	649.00	$ 20,483,089.00	+			649.00	$ 20,483,089
5	5.1.7	11103	N.A	m3	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	236.00	$ 112,153.00	$ 26,468,108.00	236.00	$ 26,468,108.00	+	105.64	$ 11,847,843.00	341.64	$ 38,315,951
6	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	m3	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	59.00	$ 861,783.00	$ 50,845,197.00	59.00	$ 50,845,197.00	+			59.00	$ 50,845,197
7	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	m3	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	504.00	$ 1,269,382.00	$ 639,768,528.00	504.00	$ 639,768,528.00	+			504.00	$ 639,768,528
8	8.1	11604	N.A	m	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	882.00	$ 140,512.00	$ 123,931,584.00	882.00	$ 123,931,584.00	+			882.00	$ 123,931,584
9	8.27	11604	INVIAS 663-22	m	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	354.00	$ 2,552,782.00	$ 903,684,828.00	354.00	$ 903,684,828.00	+			354.00	$ 903,684,828
10	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	28,556.00	$ 8,000.0	$ 228,448,000.00	28,556.00	$ 228,448,000.00	+			28,556.00	$ 228,448,000
11	13.1	11608	INVIAS 900-22	m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	36,816.00	$ 1,450.00	$ 53,383,200.00	36,816.00	$ 53,383,200.00	+			36,816.00	$ 53,383,200
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 2,171,831,070.00**		**$ 2,171,831,070.00**		-	**-$ 13,315,501.00**		**$ 2,158,515,569.00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		**Entregable**	**25000.00 m**								
12	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	m3	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	4,345.00	$ 55,525.00	$ 241,256,125.00	4,345.00	$ 241,256,125.00	+			4,345.00	$ 241,256,125
13	5.1.7	11605	N.A	m3	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2,000.00	$ 112,153.00	$ 224,306,000.00	2,000.00	$ 224,306,000.00	+			2,000.00	$ 224,306,000
14	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	m3	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	2,500.00	$ 1,057,370.00	$ 2,643,425,000.00	2,500.00	$ 2,643,425,000.00	+			2,500.00	$ 2,643,425,000
15	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	70,002.00	$ 8,000.0	$ 560,016,000.00	70,002.00	$ 560,016,000.00	+			70,002.00	$ 560,016,000
16	13.1	11608	INVIAS 900-22	m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	312,000.00	$ 1,450.00	$ 452,400,000.00	312,000.00	$ 452,400,000.00	+			312,000.00	$ 452,400,000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 4,121,403,125.00**		**$ 4,121,403,125.00**			**$ 0.00**		**$ 4,121,403,125.00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		**Entregable**	**25000.00 m**				-	-		
17	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	m	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	25,000.00	$ 90,000	$ 2,250,000,000.00	25,000.00	$ 2,250,000,000.00	+			25,000.00	$ 2,250,000,000
18	13.9	11608	INVIAS 900-22	m3-km	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	1,404,000.00	$ 1,450.00	$ 2,035,800,000.00	1,404,000.00	$ 2,035,800,000.00	+			1,404,000.00	$ 2,035,800,000.00
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 4,285,800,000.00**		**$ 4,285,800,000.00**			**$ 0.00**		**$ 4,285,800,000.00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		**Entregable**	**5000.00 m**								
19	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	m3	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	400.00	$ 52,417.00	$ 20,966,800.00	400.00	$ 20,966,800.00	+			400.00	$ 20,966,800
20	5.1.7	11605	N.A	m3	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	100.00	$ 112,153.00	$ 11,215,300.00	100.00	$ 11,215,300.00	+			100.00	$ 11,215,300
21	14.3	11605	INVIAS 672-22	m	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	5,000.00	$ 115,514.00	$ 577,570,000.00	5,000.00	$ 577,570,000.00	+			5,000.00	$ 577,570,000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 609,752,100.00**		**$ 609,752,100.00**			**$ 0.00**		**$ 609,752,100.00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		**Entregable**	**44.00 un**					-	$ -		
22	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	m3	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	231.00	$ 34,914.00	$ 8,065,134.00	231.00	$ 8,065,134.00	+	381.38	$ 13,315,501.00	612.38	$ 21,380,635
23	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	m2	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	308.00	$ 42,198.00	$ 12,996,984.00	308.00	$ 12,996,984.00				308.00	$ 12,996,984
24	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	m3	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclóoeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	264.00	$ 1,058,425.00	$ 279,424,200.00	264.00	$ 279,424,200.00	+			264.00	$ 279,424,200
25	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170.00	$ 8,000.0	$ 1,360,000.00	170.00	$ 1,360,000.00				170.00	$ 1,360,000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 301,846,318.00**		**$ 301,846,318.00**			**$ 13,315,501.00**		**$ 315,161,819.00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		**Entregable**	**25.00 Km**						$ -		
26	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	m3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2,100.00	$ 18,545.00	$ 38,944,500.00	2,100.00	$ 38,944,500.00	+			2,100.00	$ 38,944,500
27	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	m3	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2,100.00	$ 150,822.00	$ 316,726,200.00	2,100.00	$ 316,726,200.00	+			2,100.00	$ 316,726,200
28	5.2.16	11602	N.A	m3	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	35,000.00	$ 59,334.00	$ 2,076,690,000.00	35,000.00	$ 2,076,690,000.00	+			35,000.00	$ 2,076,690,000
29	5.2.13	11602	N.A	m3	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	5,750.00	$ 54,614.00	$ 314,030,500.00	5,750.00	$ 314,030,500.00	+			5,750.00	$ 314,030,500
30	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	m3	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	4,313.00	$ 25,361.00	$ 109,381,993.00	4,313.00	$ 109,381,993.00	+			4,313.00	$ 109,381,993
31	4.3.8	11605	N.A	m3	Disposición de material para conformación de la calzada. Incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	4,313.00	$ 8,405.00	$ 36,250,765.00	4,313.00	$ 36,250,765.00	+			4,313.00	$ 36,250,765
32	5.1.15	11602	N.A	m3	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	16,600.00	$ 88,552.00	$ 1,469,963,200.00	16,600.00	$ 1,469,963,200.00	+			16,600.00	$ 1,469,963,200
33	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	m2	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie impermeabilizante según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	125,000.00	$ 5,413.00	$ 676,625,000.00	125,000.00	$ 676,625,000.00	+			125,000.00	$ 676,625,000
34	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	m2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	125,000.00	$ 21,000.00	$ 2,625,000,000.00	125,000.00	$ 2,625,000,000.00	+			125,000.00	$ 2,625,000,000
35	13.1	11608	INVIAS 900-22	m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	3,298,425.00	$ 1,450.00	$ 4,782,716,250.00	3,298,425.00	$ 4,782,716,250.00	+			3,298,425.00	$ 4,782,716,250
36	13.2	11608	INVIAS 900-22	m3-Km	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	31,500.00	$ 1,450.00	$ 45,675,000.00	31,500.00	$ 45,675,000.00	+			31,500.00	$ 45,675,000
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 12,492,003,408.00**		**$ 12,492,003,408.00**			**$ 0.00**		**$ 12,492,003,408.00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL		**Entregable**	**25.00 Km**						$ -		
37	12.1	11607	INVIAS 700-22	m	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	75,000.00	$ 3,453.00	$ 258,975,000.00	75,000.00	$ 258,975,000.00	+			75,000.00	$ 258,975,000
38	12.9	11607	INVIAS 710-22	Und	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	125.00	$ 873,209.00	$ 109,151,125.00	125.00	$ 109,151,125.00	+			125.00	$ 109,151,125
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 368,126,125.00**		**$ 368,126,125.00**			**$ 0.00**		**$ 368,126,125.00**
Sub total Circuito Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío, vía Las Flores (Puerto Berrío) - Bodegas - La Ye									**24,350,762,146.00**		**24,350,762,146.00**			**-**		**24,350,762,146.00**
					VÍA LA YE-YONDO											
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		**ENTREGABLE**	**128.00 un**								
39	2.8	11601	INVIAS 201-22	m3	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	38.00	$ 242,062.00	$ 9,198,356.00	38.00	$ 9,198,356.00	+			38.00	$ 9,198,356
40	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	m	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	48.00	$ 60,533.00	$ 2,905,584.00	48.00	$ 2,905,584.00	+			48.00	$ 2,905,584
41	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	m3	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	4,352.00	$ 55,525.00	$ 241,644,800.00	4,352.00	$ 241,644,800.00	+			4,352.00	$ 241,644,800
42	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	m3	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección. acarreo interno y compactación del material.	m3	1,408.00	$ 31,561.00	$ 44,437,888.00	1,408.00	$ 44,437,888.00	+			1,408.00	$ 44,437,888
43	5.1.7	11103	N.A	m3	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	512.00	$ 112,153.00	$ 57,422,336.00	512.00	$ 57,422,336.00	+			512.00	$ 57,422,336
44	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	m3	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	128.00	$ 861,783.00	$ 110,308,224.00	128.00	$ 110,308,224.00	+			128.00	$ 110,308,224
45	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	m3	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	1,093.00	$ 1,269,382.00	$ 1,387,434,526.00	1,093.00	$ 1,387,434,526.00				1,093.00	$ 1,387,434,526
46	8.1	11604	N.A	m	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	450.00	$ 140,512.00	$ 63,230,400.00	450.00	$ 63,230,400.00	+			450.00	$ 63,230,400
47	8.27	11604	INVIAS 663-22	m	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	768.00	$ 2,552,782.00	$ 1,960,536,576.00	768.00	$ 1,960,536,576.00				768.00	$ 1,960,536,576
48	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	61,952.00	$ 8,000.0	$ 495,616,000.00	61,952.00	$ 495,616,000.00	+			61,952.00	$ 495,616,000

27/07/2026
(Día / Mes / Año)

49	13.1	11608	INVIAS 900-22	m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	38,400.00	$ 1,450.00	$ 55,680,000.00	38,400.00	$ 55,680,000.00	+			38,400.00	$ 55,680,000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS				**$ 4,428,414,690.00**		**$ 4,428,414,690.00**			**$ 0.00**		**$ 4,428,414,690.00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA	**ENTREGABLE**	**30000.00**	**m**								
50	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	m3	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	5,214.00	$ 55,525.00	$ 289,507,350.00	5,214.00	$ 289,507,350.00	+			5,214.00	$ 289,507,350
51	5.1.7	11605	N.A	m3	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2,400.00	$ 112,153.00	$ 269,167,200.00	2,400.00	$ 269,167,200.00	+			2,400.00	$ 269,167,200
52	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	m3	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	3,000.00	$ 1,057,370.00	$ 3,172,110,000.00	3,000.00	$ 3,172,110,000.00	+			3,000.00	$ 3,172,110,000
53	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	84,002.00	$ 8,000.0	$ 672,016,000.00	84,002.00	$ 672,016,000.00	+			84,002.00	$ 672,016,000
54	13.1	11608	INVIAS 900-22	m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	180,000.00	$ 1,450.00	$ 261,000,000.00	180,000.00	$ 261,000,000.00	+			180,000.00	$ 261,000,000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA				**$ 4,663,800,550.00**		**$ 4,663,800,550.00**			**$ 0.00**		**$ 4,663,800,550.00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	**ENTREGABLE**	**30000.00**	**m**				-				
55	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	m	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	30,000.00	$ 90,000	$ 2,700,000,000.00	30,000.00	$ 2,700,000,000.00				30,000.00	$ 2,700,000,000
56	13.9	11608	INVIAS 900-22	m3-km	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	810,000.00	$ 1,450.00	$ 1,174,500,000.00	810,000.00	$ 1,174,500,000.00	+			810,000.00	$ 1,174,500,000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS				**$ 3,874,500,000.00**		**$ 3,874,500,000.00**			**$ 0.00**		**$ 3,874,500,000.00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	**Entregable**	**6000.00**	**m**	**m**							**$ -**
57	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	m3	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	480.00	$ 52,417.00	$ 25,160,160.00	480.00	$ 25,160,160.00				480.00	$ 25,160,160
58	5.1.7	11605	N.A	m3	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	120.00	$ 112,153.00	$ 13,458,360.00	120.00	$ 13,458,360.00	+			120.00	$ 13,458,360
59	14.3	11605	INVIAS 672-22	m	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	6,000.00	$ 115,514.00	$ 693,084,000.00	6,000.00	$ 693,084,000.00	+			6,000.00	$ 693,084,000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS				**$ 731,702,520.00**		**$ 731,702,520.00**			**$ 0.00**		**$ 731,702,520.00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	**ENTREGABLE**	**96.00**	**un**	**un**							**$ -**
60	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	m3	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	504.00	$ 34,914.00	$ 17,596,656.00	504.00	$ 17,596,656.00	+			504.00	$ 17,596,656
61	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	m2	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	672.00	$ 42,198.00	$ 28,357,056.00	672.00	$ 28,357,056.00			$ 0.00	672.00	$ 28,357,056
62	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	m3	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	576.00	$ 1,058,425.00	$ 609,652,800.00	576.00	$ 609,652,800.00	+		$ 0.00	576.00	$ 609,652,800
63	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	kg	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	3,262.00	$ 8,000.0	$ 26,096,000.00	3,262.00	$ 26,096,000.00			$ 0.00	3,262.00	$ 26,096,000
					TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES				**$ 681,702,512.00**		**$ 681,702,512.00**	-		**$ 0.00**		**$ 681,702,512.00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR	**ENTREGABLE**	**30.00**	**Km**	**Km**							
64	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	m3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2,520.00	$ 18,545.00	$ 46,733,400.00	2,520.00	$ 46,733,400.00				2,520.00	$ 46,733,400
65	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	m3	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2,520.00	$ 150,822.00	$ 380,071,440.00	2,520.00	$ 380,071,440.00	+			2,520.00	$ 380,071,440
66	5.2.16	11602	N.A	m3	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	42,000.00	$ 59,334.00	$ 2,492,028,000.00	42,000.00	$ 2,492,028,000.00	+			42,000.00	$ 2,492,028,000
67	5.2.13	11602	N.A	m3	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de la cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	6,900.00	$ 54,614.00	$ 376,836,600.00	6,900.00	$ 376,836,600.00	+			6,900.00	$ 376,836,600
68	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	m3	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	5,520.00	$ 25,361.00	$ 139,992,720.00	5,520.00	$ 139,992,720.00	+			5,520.00	$ 139,992,720
69	4.3.8	11605	N.A	m3	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	5,520.00	$ 8,405.00	$ 46,395,600.00	5,520.00	$ 46,395,600.00				5,520.00	$ 46,395,600
70	5.1.15	11602	N.A	m3	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	18,960.00	$ 88,552.00	$ 1,678,945,920.00	18,960.00	$ 1,678,945,920.00	+			18,960.00	$ 1,678,945,920
71	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	m2	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	150,000.00	$ 5,413.00	$ 811,950,000.00	150,000.00	$ 811,950,000.00				150,000.00	$ 811,950,000
72	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	m2	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	150,000.00	$ 21,000.00	$ 3,150,000,000.00	150,000.00	$ 3,150,000,000.00	+			150,000.00	$ 3,150,000,000
73	13.1	11608	INVIAS 900-22	m3-Km	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	534,937.50	$ 1,450.00	$ 775,659,375.00	534,937.50	$ 775,659,375.00	+			534,937.50	$ 775,659,375
74	13.2	11608	INVIAS 900-22	m3-Km	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, rellenos, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	37,800.00	$ 1,450.00	$ 54,810,000.00	37,800.00	$ 54,810,000.00				37,800.00	$ 54,810,000
					TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR				**$ 9,953,423,055.00**		**$ 9,953,423,055.00**			**$ 0.00**		**$ 9,953,423,055.00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL	**ENTREGABLE**	**30.00**	**Km**	**Km**			+				
75	12.1	11607	INVIAS 700-22	m	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	90,000.00	$ 3,453.00	$ 310,770,000.00	90,000.00	$ 310,770,000.00	+			90,000.00	$ 310,770,000
76	12.9	11607	INVIAS 710-22	Und	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8".	Und	150.00	$ 873,209.00	$ 130,981,350.00	150.00	$ 130,981,350.00	+			150.00	$ 130,981,350
					TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL				**$ 441,751,350.00**		**$ 441,751,350.00**			**$ 0.00**		**$ 441,751,350.00**
Sub total VIA LA YE-YONDO									**$ 24,775,294,677.00**		**$ 24,775,294,677.00**			**$ 0.00**		**$ 24,775,294,677.00**
								SUBTOTAL OBRAS	**$ 49,126,056,823.00**	**$ -**	**$ 49,126,056,823.00**			**$ -**		**$ 49,126,056,823.00**

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							
Circuito Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío, vía Las Flores (Puerto Berrío) - Bodegas - La Ye							
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 218,336,960.00	$ 218,336,960.00	$ -	$ 218,336,960.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 223,237,641.00	$ 223,237,641.00	$ -	$ 223,237,641.00
CARACTERIZACION VIAL	Km	25.00	$ 1,055,961.00	$ 26,399,025.00	$ 26,399,025.00	$ 0.00	$ 26,399,025.00
VIA LA YE-YONDO							
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 274,547,283.00	$ 274,547,283.00	$ -	$ 274,547,283.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 264,473,841.00	$ 264,473,841.00	$ -	$ 264,473,841.00
CARACTERIZACION VIAL	Km	30.00	$ 1,055,961.00	$ 31,678,830.00	$ 31,678,830.00	$ 0.00	$ 31,678,830.00
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS	estimado			$ 460,006,797.00	$ 460,006,797.00	$ -	$ 460,006,797.00
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	estimado			$ 3,817,063,720.00	$ 3,817,063,720.00	$ -	$ 3,817,063,720.00
VALOR TOTAL				**$ 54,441,800,920.00**	**$ 54,441,800,920.00**	**$ -**	**$ 54,441,800,920.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de

La presente modificación corresponde a una variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, derivadas de las condiciones reales identificadas durante la ejecución del inventario hidráulico y las inspecciones técnicas efectuadas en el corredor Remedios – La Y de la Virgen – Puerto Berrío.

Como resultado de dichas actividades se evidenció que el estado del sistema de drenaje transversal difiere de las cantidades inicialmente estimadas, identificándose un mayor número de alcantarillas de 24 pulgadas que requieren labores de limpieza, descolmatación y mantenimiento, así como estructuras que, debido a su avanzado estado de deterioro e inoperatividad, requieren ser reemplazadas para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico del corredor y preservar la futura estructura de estabilización de la vía.

En consecuencia, se hace necesario ajustar las cantidades de los ítems contractuales asociados a estas actividades, redistribuyendo las cantidades de obra conforme a las necesidades reales encontradas en campo.

La presente modificación no genera adición de recursos ni modifica el valor total del contrato, correspondiendo únicamente a un ajuste de cantidades de obra que permite optimizar la ejecución del proyecto y atender las condiciones efectivamente identificadas durante su desarrollo.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre:
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787 **CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE** **BUCARAMANGA** **SANTANDER** **NIT: 9020174640** **Teléf. 3115100991**	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

MEDELLÍN, 06/01/2026.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0029229 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CONSORCIO MAGDALENA 787 **CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE** **BUCARAMANGA** **SANTANDER** **NIT: 9020174640** **Teléf. 3115100991**	**TERCEROS AFECTADOS**

NEGOCIO NUEVO

CODIGO DE VERIFICACION :
060002922900002MED202601060813315

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 7.248.963,00	COP 10.000,00	COP 1.379.203,00	COP 8.638.166,00	05/02/2026

INTERMEDIARIOS :
RAVE, AGENCIA DE SEGUROS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 201401

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátul

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85



Firma Autorizada



EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO N° 25OO111B2823 DE 2025 CUYO OBJETO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO)

CONSORCIO MAGDALENA 787. CONFORMADO POR:
* HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT 901.262.851-3 (PATICIPACIÓN DEL 90%)
* SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIA S.A.S | NIT 819.005.874-4 (PATICIPACIÓN DEL 10%)

ASEGURADO: SE ACEPTA AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON NIT 890.900.286-0 COMO ASEGURADO ADICIONAL UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA Y A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON NIT 890.900.286-0 SERÁ CONSIDERADO COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCEROS, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

==========
RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :
==========

AMPARO BASICO---------- COP 2.722.090.046,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :
==========
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 2.722.090.046,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 2722090046

** GASTOS MEDICOS:
- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 272.209.005,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 272209005

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 544418009
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 544.418.009,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:
- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 544.418.009,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 544418009

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
- OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00
- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 544.418.009,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 544418009

%* EXCLUSIÓN DE SUSTANCIAS TOTALES DE PERFLUOROALQUILO Y POLIFLUOROALQUILO (PFAS)

Este endoso modifica el seguro provisto bajo la póliza.

A. La siguiente exclusión se agrega a todas las coberturas incluidas en esta póliza:

1. Este seguro no aplica a:
(i) "Lesiones corporales", "Daños a la propiedad", "Lesiones personales y publicitarias", gastos médicos, daños (incluyendo, pero no limitado a, daños punitivos o daños ejemplares), pérdida, sanciones, multas, honorarios, costos o gastos, o cualquier otra compensación, de cualquier tipo; y/o

(ii) Cualquier reclamo, demanda, obligación, solicitud, investigación, notificación, orden, acción, acuerdo, decreto de consentimiento, acuerdo, programa de remediación, demanda o procedimiento, de cualquier tipo,

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

incluyendo, pero no limitado a, civiles, penales, administrativos o regulatorios, interpuestos por o en nombre de una "Autoridad gubernamental", persona física, empresa, organización u otra entidad; real o presuntamente, y directa o indirectamente, que surja de, sea causado por, se base en, sea atribuible a, esté relacionado con, contribuya a o involucre de alguna manera, total o parcialmente:

(a) "PFAS", incluidos, entre otros, los reales, presuntos, amenazantes, potenciales o sospechosos:
i. Incumplimiento de un deber, incumplimiento de las normas de cuidado, acto, error, omisión, falta de actuación adecuada, falta de ejecución adecuada de cualquier servicio o servicio profesional, o violación de cualquier ley, estatuto o reglamento en relación con los "PFAS";

ii. Inhalación, ingestión, absorción, consumo, descarga, dispersión, manipulación, prueba, descascarillado, fuga, lixiviación, friabilidad, migración, filtración, liberación, escape, contacto con, exposición a, existencia o presencia de "PFAS";

iii. Uso, incluido, entre otros, cualquier uso obligatorio, sancionado, autorizado, permitido o sugerido, desarrollo, fabricación, producción, procesamiento, incorporación, envasado, diseño, distribución, venta, reventa, cambio de marca, manipulación, transporte, reemplazo, comercialización o publicidad de "PFAS" o cualquier cosa que contenga "PFAS"; o

iv. Advertencias, avisos o instrucciones con respecto a "PFAS" o cualquier cosa que contenga "PFAS" o no proporcionar advertencias, avisos o instrucciones con respecto a "PFAS" o cualquier cosa que contenga "PFAS";

(b) Investigar, reducir, analizar, monitorear, limpiar, eliminar, contener, estudiar, remediar, mitigar, desechar, tratar, desintoxicar, neutralizar o, de cualquier manera, responder, abordar o evaluar los "PFAS" y/o los efectos o la presencia reales, presuntos, amenazantes, potenciales o sospechados de "PFAS", ya sea en el medio ambiente, en la propiedad, en un ser humano, animal o cualquier otra cosa viva o no viva o de otro modo; o

(c) Garantías o representaciones hechas en cualquier momento con respecto a "PFAS" o cualquier cosa que contenga "PFAS", incluyendo, entre otras, la seguridad, aptitud, calidad, durabilidad, rendimiento, toxicidad o persistencia ambiental de "PFAS" o cualquier cosa que contenga "PFAS", o garantías o representaciones hechas en cualquier momento con respecto a cualquier cosa descrita en A.1.(a) o A.1.(b) anteriormente.

2. Las disposiciones anteriores se aplican:

(a) Independientemente de si cualquier otra causa, evento, material, sustancia, compuesto, bien o producto

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	29229 / 0
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE BUCARAMANGA SANTANDER	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 Teléf. 3115100991	NUMERO DE FACTURA	06 - 0029229 / 000

CARATULA

(incluyendo, entre otros, "su producto"), contribuyó de manera concurrente o en cualquier secuencia a cualquier "Lesión corporal", "Daño a la propiedad", "Lesión personal y publicitaria", gastos médicos, daños (incluyendo, entre otros, daños punitivos o daños ejemplares), pérdida, sanciones, multas, honorarios, costos o gastos o cualquier otra compensación, de cualquier tipo;

(c) A cualquier obligación asumida por usted o cualquier otro asegurado en virtud de un "contrato asegurado" o cualquier otro acuerdo;

(d) Independientemente de si se aplica el "riesgo de operaciones completadas con productos";

(e) Independientemente de si existía un permiso, autorización o requisito para usar "PFAS", incorporar "PFAS" en su producto o liberar "PFAS" al medio ambiente, o si cualquier uso, incorporación o liberación era legalmente permisible o cumplía con los niveles permisibles establecidos por una "Autoridad Gubernamental";

(f) A cualquier exposición en el lugar de trabajo o exposición ocupacional a "PFAS" o enfermedad ocupacional real o presuntamente atribuible a "PFAS"; y

(g) Excluir la cobertura de la totalidad del reclamo, demanda, obligación, solicitud, investigación, notificación, orden, acción, acuerdo, decreto de consentimiento, acuerdo, programa de remediación, demanda o procedimiento, cuando solo una parte de lo anterior involucre o se refiera a "PFAS" o cualquier cosa que contenga "PFAS", incluso si cualquier otra parte hubiera estado cubierta por esta Póliza o se hubiera debido un deber de defensa en ausencia de "PFAS".

B. Se añaden las siguientes definiciones a la Política:
1. "PFAS" significa:

(a) Cualquier sustancia química fluorada que contenga al menos un átomo de carbono total o parcialmente fluorado, ya sea polímero o no polímero, incluyendo, entre otros: cualquier sustancia perfluoroalquilo y polifluoroalquilo, ácido(s) perfluoroalquilo, ácido(s) perfluorooctanosulfónico(s), perfluoroalcano, ácido(s) de óxido de hexafluoropropileno-dímero, ácido(s) perfluorobutanosulfónico(s), ácido(s) perfluorohexanosulfónico(s), sulfonamidas de perfluoroalcano, ácido(s) carboxílico(s) de éter perfluoroalquilo (incluidos, entre otros, los ácidos perfluorobutanoico, perfluorohexanoico, perfluorooctanoico, perfluorononanoico y perfluorodecanoico), sustancias fluorotelómeras, sustancias perfluoroalcanosulfonamidas, fluoruros de perfluoroalcanosulfonilo, sulfonato de perfluorodecano, perfluorooctanoato de amonio, sulfonato de perfluoroalquilo, sulfonato de perfluorodecano, sulfonato de perfluorooctanoato de amonio, sulfonato de perfluoroalquilo, sulfonato de

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	29229 / 0
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE BUCARAMANGA SANTANDER	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 Teléf. 3115100991	NUMERO DE FACTURA	06 - 0029229 / 000

CARATULA

perfluorodecano, sulfonato de perfluoroalcano, sulfonato de perfluorodecano, sulfonato de perfluorooctanoato de amonio, sulfonato de perfluorodecano, sulfonato de perfluoroalcano, sulfonato de perfluorode ... yoduros, sustancias basadas en perfluoroalquil éter y polifluoroalquil éter, fluoropolímeros, polímeros fluorados de cadena lateral, perfluoropoliéteres, sales de ácido perfluorosulfónico, sales de perfluorosulfonato, sales de ácido perfluorocarboxílico, sales de perfluorocarboxilato, todos los anteriores por cualquier nombre conocido, incluidos, entre otros, nombres químicos, nombres comerciales (por ejemplo, "GenX" o "ADONA") o cualquier otro nombre o descriptor (por ejemplo, "C8");

(b) Cualquier sustancia química que esté o pueda estar relacionada o sea similar a los elementos contenidos en B.1(a), incluidos, entre otros, los identificados en (i) cualquiera de las listas de sustancias químicas de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU., (ii) la lista de sustancias perfluoroalquilo y polifluoroalquilo sujetas a informes de liberación de sustancias químicas tóxicas de conformidad con la sección 313 de la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad de los EE. UU. ("EPCRA"), 42 U.S.C. § 11001 et seq., incluidas las que estén o puedan estar incluidas en 40 C.F.R. § 372.65, o (iii) cualquier estatuto, ley, reglamento, norma o norma propuesta por escrito, documento de orientación, lista o boletín emitido, adoptado o mantenido por cualquier "Autoridad Gubernamental";

(c) Cualquier polímero, oligómero, monómero, sustancia química no polimérica, homólogo, isómero, telómero, sal, éster, alcohol, ácido, precursor, degradante, derivado y producto de descomposición o subproducto asociado con cualquier sustancia o sustancia química descrita en los párrafos B.1(a) o B.1(b) de esta definición; o

(d) Cualquier bien, producto, sustancia, mezcla, alimento, líquido, suplemento y/o medicamento, incluidos los contenedores, materiales, partes, equipos o empaques suministrados en relación con dicho bien, producto, sustancia, mezcla, alimento, líquido, suplemento y/o medicamento, que consista en o contenga algo de lo descrito en los párrafos B.1(a), B.1(b) o B.1(c) de esta definición.

2. "Autoridad gubernamental" significa cualquier gobierno nacional, nacional, internacional, extranjero, federal, estatal, provincial, local o tribal u otra subdivisión política del mismo, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos, y cualquier agencia, organismo, unidad, entidad o cualquier otro instrumento del mismo, que ejerza funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias o administrativas del gobierno.
Todos los demás términos y condiciones de la Política permanecen sin cambios.

Todos los demás términos y condiciones de la Póliza permanecen sin cambios.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:
EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 50.000.000,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

==========
CLAUSULAS Y ANEXOS :
==========
GASTOS MÉDICOS:

BERKLEY INDEMNIZARÁ HASTA EL SUBLÍMITE INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y/O EN SUS CONDICIONES PARTICULARES LOS GASTOS MÉDICOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO, PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS PARA ESTABILIZAR AL TERCERO (SERVICIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, DE AMBULANCIA, DE HOSPITAL, DE ENFERMERÍA Y MEDICAMENTOS), COMO CONSECUENCIA DE LESIONES PERSONALES CAUSADAS A TERCEROS (DISTINTOS A EMPLEADOS DEL ASEGURADO) DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ASEGURADO ESPECÍFICAMENTE INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y/O EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

LOS PAGOS QUE POR DICHO CONCEPTO SE REALICEN NO REQUIEREN QUE EL ASEGURADO HAYA DEMOSTRADO SU RESPONSABILIDAD, Y EN NINGÚN CASO PUEDEN SER INTERPRETADOS COMO ACEPTACIÓN TÁCITA DE RESPONSABILIDAD. AL PRESENTE AMPARO NO SE APLICA DEDUCIBLE ALGUNO.

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

De acuerdo con el límite indicado en la carátula de la póliza, BERKLEY indemnizará los perjuicios derivados de la responsabilidad civil a cargo del asegurado como consecuencia directa de daños materiales, lesiones personales y/o muerte causados a los terceros que le sean imputables al asegurado, por daños causados por los contratistas o subcontratistas en desarrollo de las actividades para las cuales fueron contratados.

Incluye la responsabilidad civil solidaria que recae sobre el asegurado por daños causados por los contratistas o subcontratistas en desarrollo de las actividades para las cuales fueron contratados.

El presente amparo operará en exceso de las pólizas de seguro de responsabilidad civil que deba tener el asegurado. En caso de no tenerlas suscritas, la cobertura opera en exceso de acuerdo con lo definido en las condiciones particulares.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

1. EXCLUSIONES

Además de lo que al respecto se consigna en las exclusiones generales, quedan excluidos de cobertura la responsabilidad civil generados por las reclamaciones de terceros basadas total o parcialmente en o resultantes de:

1.1 Se excluye la cobertura de patronal.
1.2. Se excluye la responsabilidad civil cruzada entre contratistas y/o subcontratistas.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

De acuerdo con el límite indicado en la carátula de la póliza, BERKLEY indemnizará los perjuicios que deba pagar el asegurado debido a la responsabilidad civil que le sea imputable por los accidentes de trabajo que sufran los trabajadores a su servicio en el desarrollo de actividades asignadas a ellos con ocasión de la ejecución del contrato.

El presente amparo operará en exceso de las prestaciones sociales consignadas en el código del trabajo o en el régimen propio de la seguridad social.

1. EXCLUSIONES

Además de lo que al respecto se consigna en las exclusiones generales, quedan excluidos de cobertura los perjuicios o la responsabilidad civil generados por las reclamaciones de terceros basadas total o parcialmente en o resultantes de:

1.1. Enfermedades profesionales, endémicas o epidémicas o pandémicas.
2.2. Accidentes de trabajo que hayan sido provocados deliberadamente o por culpa grave del trabajador.
1.3. Daños materiales a bienes propiedad de los trabajadores.
1.4. Se excluyen a los contratistas y subcontratistas.
1.5. Prestaciones en dinero pagadas por el sistema de riesgos laborales.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**	**29229 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2027.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**06 - 0029229 / 000**

CARATULA

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

De acuerdo con el límite indicado en la carátula de la póliza, BERKLEY indemnizará los perjuicios derivados de la responsabilidad civil que le sea imputable al asegurado, como consecuencia directa de daños materiales, lesiones personales y/o muerte que se ocasionen a terceros con vehículos propios o no propios que estén al servicio del asegurado en el giro normal de las actividades especificadas en la carátula o en anexo de esta póliza.

Opera en exceso de la cobertura de RCE de la póliza de automóviles que debe tener contratada y siempre vigente cada vehículo, la cual deberá tener contratado el límite mínimo expresado en la caratula o según lo estipulado en las condiciones particulares.

En caso de lesiones a terceras personas, también se afectará previamente el seguro obligatorio SOAT.

En el evento de que los vehículos no cuenten con alguna de estas pólizas, o que la cobertura bajo las mismas sea inferior al deducible o de que el riesgo no se encuentre amparado, el límite del presente amparo sólo operará en exceso de los límites establecidos anteriormente.

Para efectos del presente amparo, se entenderá por vehículos no propios todo automotor de transporte terrestre, que sea tomado por el asegurado en calidad de arrendamiento, usufructo, comodato o a cualquier otro título no traslaticio de dominio y que utilice para el desarrollo normal de las actividades amparadas en la póliza.

1. EXCLUSIONES

Además de lo que al respecto se consigna en las exclusiones generales, quedan excluidos de cobertura los perjuicios o la responsabilidad civil generados por las reclamaciones de terceros basadas total o parcialmente en o resultantes de:

1.1. Los daños causados por vehículos mientras operen en labores de servicio público.
1.2. Los daños y/o pérdidas a los objetos transportados en los vehículos.
1.3. Los daños causados por los vehículos de los socios, funcionarios o trabajadores al servicio del asegurado.


CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
12122025-1347-P-06-000000RCGCUEST03-D00I y 12122025-1347-NTP-06-0000000000RCG008

Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

CERTIFICACIÓN PAGO DE PRIMA

Berkley International Seguros Colombia S.A., con NIT 900-814-916-1, hace constar que la prima correspondiente a la póliza de **CUMPLIMIENTO No 00101053** se encuentra recaudada, siendo su estado *PAGADA*

Se expide la presente certificación en BOGOTÁ, D.C. a los 04 días del mes de Junio de 2026.



OSCAR ANDRES COGUA B.
Gerente Financiero
Berkley International Seguros Colombia S.A.
NIT.900.814.916-1


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley Colombia Seguros
| a Berkley Company

CERTIFICACIÓN PAGO DE PRIMA

Berkley International Seguros Colombia S.A., con NIT 900-814-916-1, hace constar que la prima correspondiente a la póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL No 00029229** se encuentra recaudada, siendo su estado *PAGADA*

Se expide la presente certificación en BOGOTÁ, D.C. a los 05 días del mes de Junio de 2026.



OSCAR ANDRES COGUA B.
Gerente Financiero
Berkley International Seguros Colombia S.A.
NIT.900.814.916-1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.638.166,00

Número de aprobación
00452322

Motivo
6-29229

Fecha del pago
03/02/2026

Referencia 1
10535128

Hora del pago
02:49 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1698

Referencia 3
9008149161

Destino del pago
Berkley International Seguros Colombia SA

Código único CUS
33452322

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 83.708.796,00

Número de aprobación
00316741

Motivo
5-101053 6-29229 cuota 1

Fecha del pago
24/02/2026

Referencia 1
11053628

Hora del pago
04:26 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6055

Referencia 3
9008149161

Destino del pago
Berkley International Seguros Colombia SA

Código único CUS
87316741

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.231.257,00

Número de aprobación
00770559

Motivo
2da cuota 5_101053_0

Fecha del pago
24/03/2026

Referencia 1
11808180

Hora del pago
03:02 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6055

Referencia 3
9008149161

Destino del pago
Berkley International Seguros Colombia SA

Código único CUS
164770559

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.231.257,00

Número de aprobación
00337060

Motivo
Cuota abril 5_101053_0 6_29229_0

Fecha del pago
11/05/2026

Referencia 1
13347210

Hora del pago
05:11 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********5818

Referencia 3
9008149161

Destino del pago
Berkley International Seguros Colombia SA

Código único CUS
300337060

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.231.257,00

Número de aprobación
00110584

Motivo
4ta cuota 5_101053_0 6_29229_0

Fecha del pago
21/05/2026

Referencia 1
13687559

Hora del pago
06:42 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********5818

Referencia 3
9008149161

Destino del pago
Berkley International Seguros Colombia SA

Código único CUS
327110584

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.231.256,00

Número de aprobación
00483805

Motivo
Saldo 5_101053_0

Fecha del pago
03/06/2026

Referencia 1
14102995

Hora del pago
05:35 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********5818

Referencia 3
9008149161

Destino del pago
Berkley International Seguros Colombia SA

Código único CUS
362483805

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787 **CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE** **BUCARAMANGA** **SANTANDER** **NIT: 9020174640** **Teléf. 3115100991**	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**101053 / 0**

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2032.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0101053 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **CALLE 42B NO. 52-106 PISO 10, PISO 3** **MEDELLÍN** **ANTIOQUIA** **NIT: 8909002860**	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **CALLE 42B NO. 52-106 PISO 10, PISO 3** **MEDELLÍN** **ANTIOQUIA** **NIT: 8909002860**

NEGOCIO NUEVO

CODIGO DE VERIFICACION :

050010105300001MED202601060813012

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 168.589.851,00	COP 10.000,00	COP 32.033.972,00	COP 200.633.823,00	05/02/2026

INTERMEDIARIOS :

RAVE, AGENCIA DE SEGUROS LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 201401

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85



Firma Autorizada



EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**101053 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2032.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0101053 / 000**

CARATULA

==========

OBJETO DEL CONTRATO

==========

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO N° 25OO111B2823 DE 2025 CUYO OBJETO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 4 MAGDALENA MEDIO)

CONSORCIO MAGDALENA 787 CONFORMADO POR:
* HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT 901.262.851-3 (PATICIPACIÓN DEL 90%)
* SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIA S.A.S | NIT 819.005.874-4 (PATICIPACIÓN DEL 10%)

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON NIT 890.900.286-0

LA GARANTIA DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 12.521.614.211,60
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 23/12/2025, hasta las 0 hs del 23/10/2027
Prima de la Cobertura : COP 34.425.863,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 8.166.270.138,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 23/12/2025, hasta las 0 hs del 23/10/2027
Prima de la Cobertura : COP 22.451.650,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 2.722.090.046,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 23/12/2025, hasta las 0 hs del 23/04/2030
Prima de la Cobertura : COP 17.697.314,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 12.521.614.211,60

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO MAGDALENA 787	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**101053 / 0**
CALLE 54 #31-63, APTO 202, BARRIO ANTIGUO CAMPESTRE **BUCARAMANGA** **SANTANDER**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** MEDELLÍN, 06/01/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 23/12/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 23/04/2032.	
NIT: 9020174640 **Teléf. 3115100991**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0101053 / 000**

CARATULA

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 23/04/2027, hasta las 0 hs del 23/04/2032
Prima de la Cobertura : COP 94.015.024,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)

ÍNDICE

SECCIÓN I. AMPAROS

1. SERIEDAD DE LA OFERTA 3
2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 3
3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO 4
4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4
5. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 4
6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 4
7. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 5
8. CALIDAD DEL SERVICIO 5

SECCIÓN II. EXCLUSIONES

1. CAUSA EXTRAÑA – FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 5
2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LO BIENES DE LA ENTIDAD 5
3. USO INDEBIDO O FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5
4. DETERIORO NORMAL 5

SECCIÓN III. CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA 6
2. SUMA ASEGURADA 6
3. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA 6
4. COMPENSACIÓN 7

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

5. PAGO DEL SINIESTRO 7
6. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN 8
7. SUBROGACIÓN 8
8. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 8
9. PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO 8
10. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD 8
11. NOTIFICACIONES Y RECURSOS 9
12. NATURALEZA DEL SEGURO 9
13. CLAUSULAS INCOMPATIBLES 9
14. COEXISTENCIA DE SEGUROS 9
15. COASEGURO 9
16. PRESCRIPCIÓN 9
17. DOMICILIO 9

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad legalmente Establecida en Colombia y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para operar en el país, la cual en lo sucesivo se denominará la aseguradora, en consideración a la solicitud presentada por el tomador y al previo pago de la prima correspondiente, con sujeción a los términos y condiciones generales contenidas en el presente contrato de seguro, cubre a la entidad estatal contratante de las sanciones derivadas del incumplimiento de la seriedad de oferta y de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato garantizado que sean imputables al contratista, conforme los amparos descritos en la Carátula de la póliza y las condiciones que a continuación se señalan.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones que a continuación se estipulan:

SECCIÓN I. AMPAROS

1. SERIEDAD DE LA OFERTA

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

.

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:
2.1 LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
2.2 EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO.
2.3 LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

3. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

POR MEDIO DE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

4.1 EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.
4.2 EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.
4.3 LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES.
4.4 EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

LA PRESENTE COBERTURA OPERA RESPECTO DE LOS EVENTOS EN QUE PUEDA PREDICARSE LA SOLIDARIDAD PATRONAL DEL ASEGURADO, DE CONFORMIDAD CON LO CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA ASEGURADORA REALIZARÁ LOS PAGOS EN LA MEDIDA EN QUE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES ACREDITE ANTE EL ASEGURADO SU DERECHO. EL VALOR ASEGURADO SE IRÁ DISMINUYENDO EN LA MEDIDA EN QUE SE HAGAN LOS PAGOS, HASTA AGOTARLO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

ESTE AMPARO EN NINGÚN CASO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL CONTRATISTA BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO.

6. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RELACIONADAS CON EL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

SECCIÓN II. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN EL PRESENTE SEGURO NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTÁ OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

SECCIÓN III. CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar bajo los lineamientos del Decreto 1082 de 2015 y constaran en la carátula de la misma o mediante cláusulas o anexos, según la naturaleza de cada uno de ellos.

2. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de LA ASEGURADORA, respecto de cada amparo, no excederá, en ningún caso, la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza para cada uno de ellos, los cuales son independientes uno de otro respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros, los cuales no son acumulables y son excluyentes entre sí.

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de la póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.

3. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en los Artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, en concordancia con lo previsto en el acto administrativo en firme, la entidad estatal contratante asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y del garante de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de la siguiente forma:

3.1 En caso de caducidad, mediante la notificación en debida forma conforme a la ley aplicable, del correspondiente acto administrativo en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio, y a ordenar su pago tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo en firme de caducidad constituye el siniestro.

3.2 En caso de aplicación de multas, mediante la notificación en debida forma conforme a la ley aplicable, del correspondiente acto administrativo en el cual impondrá la multa y ordenará su pago, tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo en firme correspondiente constituye el siniestro.

3.3 En los demás casos de incumplimiento, mediante la notificación en debida forma conforme la ley aplicable, del correspondiente acto administrativo en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada en el contrato y a ordenar su pago tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo en firme correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

4. COMPENSACION

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a este o del resultado de la liquidación del contrato y anterior al pago de la indemnización, fuere deudora del contratista por cualquier concepto, se

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los Artículos 1714 y subsiguientes del Código Civil.

Igualmente, se disminuirá del valor de la indemnización, el valor correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada haya obtenido del contratista, sea judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por medio del presente seguro.

5. PAGO DEL SINIESTRO

LA ASEGURADORA pagará el valor del siniestro, así:

5.1 Para el caso previsto en el numeral 3.1, con el acto administrativo ejecutoriado y el acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición cuarta de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

5.2 Para el caso del numeral 3.2, con el acto administrativo ejecutoriado y el acta de liquidación del contrato, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición cuarta de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

5.3 Para el caso presentado en el numeral 3.3, con el acto administrativo ejecutoriado y el acta de liquidación del contrato que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición cuarta de este clausulado o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

PARAGRAFO 1: La entidad estatal agotará los mecanismos alternativos de solución de conflictos pactados por las partes en el contrato estatal antes de hacer efectivo el presente seguro.

PARAGRAFO 2: De conformidad con el artículo 1110 del Código de Comercio LA ASEGURADORA podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización o continuando la ejecución de la obligación garantizada.

6. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, si LA ASEGURADORA acepta tal modificación, expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

7. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el Artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 203 del Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, LA ASEGURADORA se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante asegurada tenga contra el contratista garantizado.

8. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

8.1 LA ASEGURADORA tiene derecho a ejercer la vigilancia sobre el contratista garantizado en la ejecución del contrato, para lo cual la entidad estatal contratante asegurada le prestará la colaboración necesaria.

8.2 De conformidad con la regulación aplicable, corresponde a la entidad estatal contratante asegurada ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere.

9. PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el Artículo 887 del Código de Comercio, no se considerará válida la cesión o transferencia del presente contrato de seguro sin el consentimiento previo por escrito de LA ASEGURADORA. El incumplimiento de la anterior disposición acarreará las consecuencias establecidas en la regulación aplicable.

10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

El presente seguro no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocado unilateralmente.

11. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

La entidad estatal contratante asegurada deberá notificar a LA ASEGURADORA los actos administrativos expedidos con la finalidad de afectar el presente seguro, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y el garante.

12. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía que se otorga por medio de este seguro, así como sus certificados de modificación, no es solidaria ni incondicional y su afectación está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación, en los términos señalados en la ley y en este contrato.

13. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares del presente seguro y las del contrato garantizado, prevalecerán las segundas. Si la incongruencia se presenta entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las primeras.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre las aseguradoras en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

15. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el Artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre las aseguradoras en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

16. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre contrato de seguro especialmente por lo consagrado en el artículo 1081.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá Distrito Capital.

Fecha inicial de uso	Tipo y número de la Entidad	Tipo de documento	Ramo	Identificación Interna	Canal de comercialización
19/09/2024	1347	P	05	0000000000CUES09	0001
19/09/2024	1347	NT-P	05	0000000000CUES08	0001

Berkley International Seguros Colombia S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la Póliza No. 5 - 101053 / 0 cuyo Afianzado es:
CONSORCIO MAGDALENA 787


Asegurado es:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Beneficiario es:
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

expedida por la compañía el día 06/01/2026 no expirará por falta de pago de la prima de la póliza, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en Bogotá el día 06/01/2026

Firma autorizada



Berkley International Seguros Colombia S.A.
Calle 75 No. 5-88, Piso 3°
Teléfono 6013572727
Bogotá D.C
