F51 – INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 331/14/06/16

Datos generales

Asunto:	**INFORME DE SUPERVISIÓN**
Fecha:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Clase de contrato:	CONTRATO DE OBRA
No. de contrato:	Nº 199-SAMC-2025
Fecha de celebración:	20DE OCTUBRE DE 2025
CDP MUNICIPIO:	No.482 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
RP MUNICIPIO:	No.1394 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ.**
Plazo:	El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de **DOS (02) meses** contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.
Cuantía Inicial:	**DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($266.316.904.00) M/CTE.**
Forma de pago:	El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que será el equivalente al valor económico de la oferta seleccionada. El Municipio, establece como forma de pago de la siguiente manera. **ANTICIPO:** un primer desembolso equivalente al 50% del valor del contrato, el cual se cancelará a manera de anticipo, previo perfeccionamiento, y cumplimiento de los requisitos de ejecución, legalización del contrato. Pagos parciales por **avance de obra** hasta el 90%, debidamente comprobado mediante actas parciales de pago al contratista de obra. Un 10% final, cuando el contrato de obra se haya ejecutado en su totalidad con el recibo a satisfacción. Para el trámite de cada acta parcial el contratista previamente deberá presentar la factura comercial, informe de interventoría con todos sus anexos y demás documentos que evidencien la ejecución del contrato, aportes a seguridad social del periodo ejecutado. Por parte del supervisor, presentación del informe de supervisión, y Acta de cumplimiento y liquidación expedida por el supervisor, en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

	satisfacción.	
Póliza:	**SEGUROS MUNDIAL** PÓLIZA CUMPLIMIENTO Nº CT- CT-100005555 R.C Nª CT-100001376 ANEXO 2 – ACTA DE INICIO	**SEGUROS MUNDIAL** PÓLIZA CUMPLIMIENTO Nº CT-100005555-3 ANEXO 3 – ESTABILIDAD
Aprobación de la póliza:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Contratista:	**ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS**	
C.C. o NIT:	NIT. 901.714.962-3	
Representante Legal:	**Jorge Andrés Moncada Suaza**	
C.C. o NIT:	C.C. No. 5.819.666 de Ibagué.	
Dirección del contratista:	Calle 7a N° 4A-51 La Montañita - Caquetá	
Celular del contratista:	3132678225	
Correo electrónico:	andoriaconstrucciones@gmail.com	
Supervisor o interventor:	TERESA DEL CARMEN CARBONÓ PACHECO	
Cargo:	SUPERVISORA	

Plazo del contrato

Plazo inicial	El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de **DOS (02)** meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.				**Fecha del acta de inicio**	04 de Noviembre de 2025			
Suspensión 1	**Desde**	**N/A**	**Hasta**	**N/A**	**Suspensión 2**	**Desde**	**N/A**	**Hasta**	**N/A**
Reinicio 1	**Desde**	**N/A**			**Reinicio 2**	**Desde**	**N/A**		
Fecha de Finalización	**31 de Diciembre de 2025**								
Fecha de Terminación de obra	**31 de Diciembre de 2025**								

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

Ítems de la obra

1. Cantidades iniciales.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	ML	150	$ 3.229,00	$ 484.350,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	M3	70,000	$ 66.151,00	$ 4.630.570,00
1.3	Rellenos con material de excavacion	M3	34,400	$ 37.020,00	$ 1.273.488,00
II	**DEMOLICIONES**				
2	Demolicion de estructura Existente	UN	1,000	$ 3.131.136,00	$ 3.131.136,00
2,2	Retiro de material sobrante	M3	42,000	$ 270.805,00	$ 11.373.810,00
III	**SISTEMA PTAR**				
3.1	Suministro e intalacion de sistema séptico Integrado (Recamara septica de 8750L + Recamara FAFA 3750 L) = 12500 Litros	UN	1,000	$ 29.100.390,00	$ 29.100.390,00
3,2	Suministro e instalacion tuberia con filtro de D=4"	ML	25,000	$ 1.806,00	$ 45.150,00
3,3	Placa piso E=0.10M R-21MPA con malla electrosoldada para soporte del tanque septico integrado de 12500 Lt	M2	15,000	$ 291.825,00	$ 4.377.375,00
3,4	Caja de inspección Concreto 3000PSI reforzada de 0,70 x 0,70 M, h=1.20m (incluye tapa tipo rejilla marco en Angulo de 1 1/4" y varilla 1/2")	UN	2,000	$ 806.365,00	$ 1.612.730,00
3,5	Construccion campo de Infiltracion en tuberia de filtro de d=4", encamisada con filtro no tejido	UN	1,000	$ 2.163.959,00	$ 2.163.959,00
3,6	Filtro en gravilla lavada tamaño D=3/4",en altura de 0,5	M3	8,000	$ 250.197,00	$ 2.001.576,00
IV	**CERRAMIENTO PTAR**				
4,1	Excavacion en material comun H<2.00	M3	14,000	$ 66.151,00	$ 926.114,00
4,2	Viga de cimentacion 15X25	ML	30,000	$ 122.805,00	$ 3.684.150,00
4,3	Suministro e instalación Cerramiento en malla eslabonada de h=2.00 metros.	ML	28,000	$ 162.662,00	$ 4.554.536,00
4,4	Murete en concreto simple para cerramiento altura h=0.50 metros, E=0.12 m	M2	14,000	$ 234.690,00	$ 3.285.660,00
4,5	Puerta En malla eslabonada de 2.00x1.00 en tubo galvanizado D=2"	UN	1,000	$ 724.196,00	$ 724.196,00
4,6	Suministro e instalacion de tuberia galvanizada D=2, con altura 3.00 metros.	UN	12,000	$ 162.154,00	$ 1.945.848,00
4,7	Columna en concreto de 0.20x0.20 en concreto de 3000 Psi, acero de 1/2 PDR60	ML	7,000	$ 211.975,00	$ 1.483.825,00

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

V	**MANTENIMIENTO DE POZOS DE INSPECCION Y RED DE ALCANTARILLADO**				$ -
5.1	Destaponamiento de tubería D=8" con agua a presión a traves de Sistema Vactor o similar	ML	600,000	$ 37.014,00	$ 22.208.400,00
	CASERIO SAN ISIDRO INSPECCION UNION PENEYA				
ITEM	DESCRIPCION				
I	**PRELIMINARES**				
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	M2	400,000	$ 8.100,00	$ 3.240.000,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	M3	34,000	$ 96.710,00	$ 3.288.140,00
1.3	Roceria, limpieza, retiro, paisajismo y disposicion final de material sobrante	M3	180,000	$ 52.005,00	$ 9.360.900,00
II	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR)				
2,1	Pintura para tolva, barandas y escaleras	M2	51,938	$ 64.114,00	$ 3.329.952,00
2,2	Mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, tipo compacto con capacidad de 0,5 LPS, incluye transporte, Suministro e instalacion de tuberia hidrahulica y accesorios y electrica a 0 metros, suministro e instalacion de equipos electricos (tablero de mando, bomba y soplador) incluye tratamiento de desechos existentes.	UND	1,000	$ 48.137.043,00	$ 48.137.043,00
III	**MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN**				
3.1	Suministro e instalación de cubierta metálica master mil calibre 28, color a sugerir.	M2	0,000	$ 139.497,00	$ -
3,2	Suministro e instalacion de Lavaplatos inoxidable Submontar 55x43 Cm Con Griferia Advance Satin Y Canastillacon sus accesorios	UND	1,000	$ 555.291,00	$ 555.291,00
3,3	Pintura en vinilo tipo 1	M2	84,000	$ 39.152,00	$ 3.288.768,00
3,4	Pintura para ornamentacion metalica	M2	5,000	$ 54.112,00	$ 270.560,00
3,5	Instalacion de lampara led de 18w a 110 v y cerradura de puerta	UND	1,000	$ 174.538,00	$ 174.538,00
IV	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO				$ -
4,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6"	ML	24,000	$ 73.745,00	$ 1.769.880,00
4,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6" perforada	ML	20,000	$ 87.580,00	$ 1.751.600,00
4,3	suministro e instalacion de grava E= 0,25	M3	1,000	$ 660.047,00	$ 660.047,00
4,4	suministro e instalacion de arena E= 0,10	M3	1,000	$ 560.529,00	$ 560.529,00
4,5	Pintura para cubierta de lechos de secado	M2	12,250	$ 64.112,00	$ 785.372,00
V	**INSTALACION DE PORTON**				$ -
5,1	Suministro e instalacion de porton de 2x2,	UND	1,000	$ 1.433.874,00	$ 1.433.874,00

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

	incluye transporte				
5,2	Columna de 0,20x 0,20 incluye acero	ML	5,600	$ 252.570,00	$ 1.414.392,00
VI	**SISTEMA ELÉCTRICO**		0,000		$ -
6,1	Acometida trifasica subterranea, suministro e instalacion de cofre de inspeccion para medidor y sistema puesta tierra, suministro e instalacion de Transformador de 10 KVA incluye sistema de proteccion, suministro e instalacion de acometida parcial tablero de distribucion de 12 circuitos en ducto de 1", suministro e instalacion de tablero de control para 2 motores a 110 v y 2 a 220 v con proteccion de rele y supresor de picos general con señales semi automatico, dos salidas de conexion electrica para motores, salida electrica a 110 vincluye transporte	UND	1,000	$ 18.976.984,00	$ 18.976.984,00
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$198.005.133,00**
				ADMINISTRACIÓN 28,50%	$56.431.463,00
				IMPREVISTOS 1%	$1.980.051,00
				UTILIDAD 5%	$9.900.257,00
				VALOR TOTAL CONTRATO	**$266.316.904,00**

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

2. Cantidades finales, autorizadas, ejecutadas, verificadas y sus valores.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						CONDICIONES ACTUALES OBRA CONSTRUIDA			
						ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**								
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	ML	150	$ 3.229,00	$ 484.350,00	150,00	$ 484.350,00	0,00	$ 0,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	M3	70,000	$ 66.151,00	$ 4.630.570,00	70,00	$ 4.630.570,00	0,00	$ 0,00
1.3	Rellenos con material de excavacion	M3	34,400	$ 37.020,00	$ 1.273.488,00	34,40	$ 1.273.488,00	0,00	$ 0,00
II	**DEMOLICIONES**								
2	Demolicion de estructura Existente	UN	1,000	$ 3.131.136,00	$ 3.131.136,00	1,00	$ 3.131.136,00	0,00	$ 0,00
2,2	Retiro de material sobrante	M3	42,000	$ 270.805,00	$ 11.373.810,00	42,00	$ 11.373.810,00	0,00	$ 0,00
III	**SISTEMA PTAR**								
3.1	Suministro e intalacion de sistema séptico Integrado (Recamara septica de 8750L + Recamara FAFA 3750 L) = 12500 Litros	UN	1,000	$ 29.100.390,00	$ 29.100.390,00	1,00	$ 29.100.390,00	0,00	$ 0,00
3,2	Suministro e instalacion tuberia con filtro de D=4"	ML	25,000	$ 1.806,00	$ 45.150,00	25,00	$ 45.150,00	0,00	$ 0,00
3,3	Placa piso E=0.10M R-21MPA con malla electrosoldada para soporte del tanque septico integrado de 12500 Lt	M2	15,000	$ 291.825,00	$ 4.377.375,00	15,00	$ 4.377.375,00	0,00	$ 0,00
3,4	Caja de Inspección Concreto 3000PSI reforzada de 0,70 x 0,70 M, h=1.20m (Incluye tapa tipo rejilla marco en Angulo de 1 1/4" y varilla 1/2")	UN	2,000	$ 806.365,00	$ 1.612.730,00	2,00	$ 1.612.730,00	0,00	$ 0,00
3,5	Construccion campo de Infiltracion en tuberia de filtro de d=4", encamisada con filtro no tejido	UN	1,000	$ 2.163.959,00	$ 2.163.959,00	1,00	$ 2.163.959,00	0,00	$ 0,00
3,6	Filtro en gravilla lavada tamaño D=3/4",en altura de 0,5	M3	8,000	$ 250.197,00	$ 2.001.576,00	8,00	$ 2.001.576,00	0,00	$ 0,00
IV	**CERRAMIENTO PTAR**								
4,1	Excavacion en material comun H<2.00	M3	14,000	$ 66.151,00	$ 926.114,00	14,00	$ 926.114,00	0,00	$ 0,00
4,2	Viga de cimentacion 15X25	ML	30,000	$ 122.805,00	$ 3.684.150,00	30,00	$ 3.684.150,00	0,00	$ 0,00
4,3	Suministro e instalación Cerramiento en malla eslabonada de h=2.00 metros.	ML	28,000	$ 162.662,00	$ 4.554.536,00	28,00	$ 4.554.536,00	0,00	$ 0,00
4,4	Murete en concreto simple para cerramiento altura h=0.50 metros, E=0.12 m	M2	14,000	$ 234.690,00	$ 3.285.660,00	14,00	$ 3.285.660,00	0,00	$ 0,00
4,5	Puerta En malla eslabonada de 2.00x1.00 en tubo	UN	1,000	$ 724.196,00	$ 724.196,00	1,00	$ 724.196,00	0,00	$ 0,00

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

	galvanizado D=2"									
4,6	Suministro e instalacion de tuberia galvanizada D=2, con altura 3.00 metros.	UN	12,000	$ 162.154,00	$ 1.945.848,00	12,00	$ 1.945.848,00		$ 0,00
4,7	Columna en concreto de 0.20x0.20 en concreto de 3000 Psi, acero de 1/2 PDR60	ML	7,000	$ 211.975,00	$ 1.483.825,00	7,00	$ 1.483.825,00	0,00	$ 0,00
V	**MANTENIMIENTO DE POZOS DE INSPECCION Y RED DE ALCANTARILLADO**				$ -				
5.1	Destaponamiento de tubería D=8" con agua a presión a traves de Sistema Vactor o similar	ML	600,000	$ 37.014,00	$ 22.208.400,00	600,00	$ 22.208.400,00	0,00	$ 0,00
	CASERIO SAN ISIDRO INSPECCION UNION PENEYA								
ITEM	DESCRIPCION								
I	**PRELIMINARES**								
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	M2	400,000	$ 8.100,00	$ 3.240.000,00	400,00	$ 3.240.000,00	0,00	$ 0,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	M3	34,000	$ 96.710,00	$ 3.288.140,00	34,00	$ 3.288.140,00	0,00	$ 0,00
1.3	Rocería, limpieza, retiro, paisajismo y disposicion final de material sobrante	M3	180,000	$ 52.005,00	$ 9.360.900,00	180,00	$ 9.360.900,00	0,00	$ 0,00
II	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR)								
2,1	Pintura para tolva, barandas y escaleras	M2	51,938	$ 64.114,00	$ 3.329.952,00	51,94	$ 3.329.952,00	0,00	$ 0,00
2,2	Mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, tipo compacto con capacidad de 0,5 LPS, incluye transporte, Suministro e instalacion de tuberia hidrahulica y accesorios y electrica a 0 metros, suministro e instalacion de equipos electricos (tablero de mando, bomba y soplador) incluye tratamiento de desechos existentes.	UND	1,000	$ 48.137.043,00	$ 48.137.043,00	1,00	$ 48.137.043,00	0,00	$ 0,00
III	**MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN**								
3.1	Suministro e instalación de cubierta metálica master mil calibre 28, color a sugerir.	M2	0,000	$ 139.497,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	Suministro e instalacion de Lavaplatos inoxidable Submontar 55x43 Cm Con Grifería Advance Satín Y Canastillacon sus accesorios	UND	1,000	$ 555.291,00	$ 555.291,00	1,00	$ 555.291,00	0,00	$ 0,00
3,3	Pintura en vinilo tipo 1	M2	84,000	$ 39.152,00	$ 3.288.768,00	84,00	$ 3.288.768,00	0,00	$ 0,00
3,4	Pintura para ornamentacion metalica	M2	5,000	$ 54.112,00	$ 270.560,00	5,00	$ 270.560,00		$ 0,00
3,5	Instalacion de lampara led de 18w a 110 v y cerradura de	UND	1,000	$ 174.538,00	$ 174.538,00	1,00	$ 174.538,00	0,00	$ 0,00

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

	puerta								
IV	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO				$ -	0,00		0,00	$ 0,00
4,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6"	ML	24,000	$ 73.745,00	$ 1.769.880,00	24,00	$ 1.769.880,00	0,00	$ 0,00
4,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6" perforada	ML	20,000	$ 87.580,00	$ 1.751.600,00	20,00	$ 1.751.600,00	0,00	$ 0,00
4,3	suministro e instalacion de grava E= 0,25	M3	1,000	$ 660.047,00	$ 660.047,00	1,00	$ 660.047,00	0,00	$ 0,00
4,4	suministro e instalacion de arena E= 0,10	M3	1,000	$ 560.529,00	$ 560.529,00	1,00	$ 560.529,00	0,00	$ 0,00
4,5	Pintura para cubierta de lechos de secado	M2	12,250	$ 64.112,00	$ 785.372,00	12,25	$ 785.372,00	0,00	$ 0,00
V	**INSTALACION DE PORTON**				$ -	0,00			
5,1	Suministro e instalacion de porton de 2x2, incluye transporte	UND	1,000	$ 1.433.874,00	$ 1.433.874,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.433.874,00
5,2	Columna de 0,20x 0,20 incluye acero	ML	5,600	$ 252.570,00	$ 1.414.392,00	0,00	$ 0,00	5,60	$ 1.414.392,00
VI	**SISTEMA ELECTRICO**		0,000		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,1	Acometida trifasica subterranea, suministro e instalacion de cofre de inspeccion para medidor y sistema puesta tierra, suministro e instalacion de Transformador de 10 KVA incluye sistema de proteccion, suministro e instalacion de acometida parcial tablero de distribucion de 12 circuitos en ducto de 1", suministro e instalacion de tablero de control para 2 motores a 110 v y 2 a 220 v con proteccion de rele y supresor de picos general con señales semi automatico, dos salidas de conexion electrica para motores, salida electrica a 110 vincluye transporte	UND	1,000	$ 18.976.984,00	$ 18.976.984,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 18.976.984,00
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$198.005.133,00**		**$ 176.179.883,00**		**$ 21.825.250,00**
				ADMINISTRACIÓN 28,50%	$56.431.463,00		$ 50.211.267,00	**A**	$ 6.220.196,00
				IMPREVISTOS 1%	$1.980.051,00		$ 1.761.799,00	**I**	$ 218.252,00
				UTILIDAD 5%	$9.900.257,00		$ 8.808.994,00	**U**	$ 1.091.263,00
				VALOR TOTAL CONTRATO	**$266.316.904,00**		**$ 236.961.943,00**		**$ 29.354.961,00**

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

F51 – INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 331/14/06/16

Verificación de cumplimiento de las obligaciones con el SGSS y parafiscales

ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.714.962

No.	CEDULA	NOMBRE
1	1119580294	JHONNIER AMAWRI BUITRAGO BUITRAGO
2	17676307	BERLEY BUITRAGO CONDE
3	5819666	JORGE ANDRES MONCADA SUAZA
4	6803195	RAUL SANCHEZ GOMEZ
5	96342634	JOSE LIBARDO SALAZAR POLO

	MES	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
1	**No. Planilla**	**4634807434**	**4634364362**
2	Valor Pensión	911.200	827.800
3	Valor Salud	228.000	207.100
4	Valor ARL	396.500	360.200
5	COMFACA	228.000	207.100
	Valor total de la seguridad	**$1.763.700**	**$1.602.200**

Periodo: mes de noviembre y diciembre de 2025	SS	Si	X	No	PF	Si	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en salud:					Si	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión:					Si	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales:					Si	X	No	
	Presenta paz y salvo de parafiscales					Si	X	No	

CRISTOBAL ESPINOZA
C.C. 14.295.255

	MES	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
1	**No. Planilla**	**9494313255**	**9495968774**
2	Valor Pensión	432.000	352.200
3	Valor Salud	337.500	275.000
4	Valor ARL	14.100	11.500
5	COMFACA	0	0
	Valor total de la seguridad	**783.600**	**$638.500**

Periodo: mes de noviembre y diciembre de 2025	SS	Si	X	No	PF	Si	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en salud:					Si	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión:					Si	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales:					Si	X	No	
	Presenta paz y salvo de parafiscales					Si	X	No	

+57 3183066726 www.lamontanita-caqueta.gov.co ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal.

Amortización del anticipo

INVERSIÓN SEGÚN PLAN	VALOR	SE INVIRTIÓ?		SOPORTES DE LA INVERSIÓN	ACTA EN LA QUE SE AMORTIZA	VALOR PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN
		SI	NO			
Pago de salarios y jornales	$ 33.289.613,00	X		Comprobantes	Acta Final 31/12/2025	0
Compra de materiales (cemento, hierro, material de playa, sistema integrado 12500 Litros, malla electro soldada, malla para Cerramiento)	$ 86.552.994,00	X		Factura electrónica		0
transporte y alquiler de maquinaria (material de playa, mezcladoras,)	$ 13.315.845,00	X		Comprobantes		0
Saldo por amortizar						**0**

Estado financiero del contrato

Cuantía del contrato	**$ 266.316.904,00**	
Cuantía adicional:	0	
Cuantía definitiva:	**$ 487.195.017,00**	
Pagos realizados:		
Anticipo		$ 133.158.452,00
Acta parcial No. 01:		**$ 236.961.943,00**
Valor amortizado Acta parcial No. 01		$ 118.480.971,50
Acta final:		**$ 29.354.961,00**
Valor amortizado Acta final		$ 14.677.480,50
Valor por pagar al Contratista		**$ 14.677.480,50**
Saldos a favor del municipio		$ 00,00


Consideraciones del supervisor

Una vez ejecutadas en su totalidad las actividades por parte del contratista, se recibe a satisfacción de acuerdo a las cantidades autorizadas y ejecutadas con un un porcentaje final del **100,00%,** cumpliendo con el objeto del presente contrato.

+57 3183066726 www.lamontanita-caqueta.gov.co ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal.


Registro fotográfico


ACTIVIDAD EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H<2.00

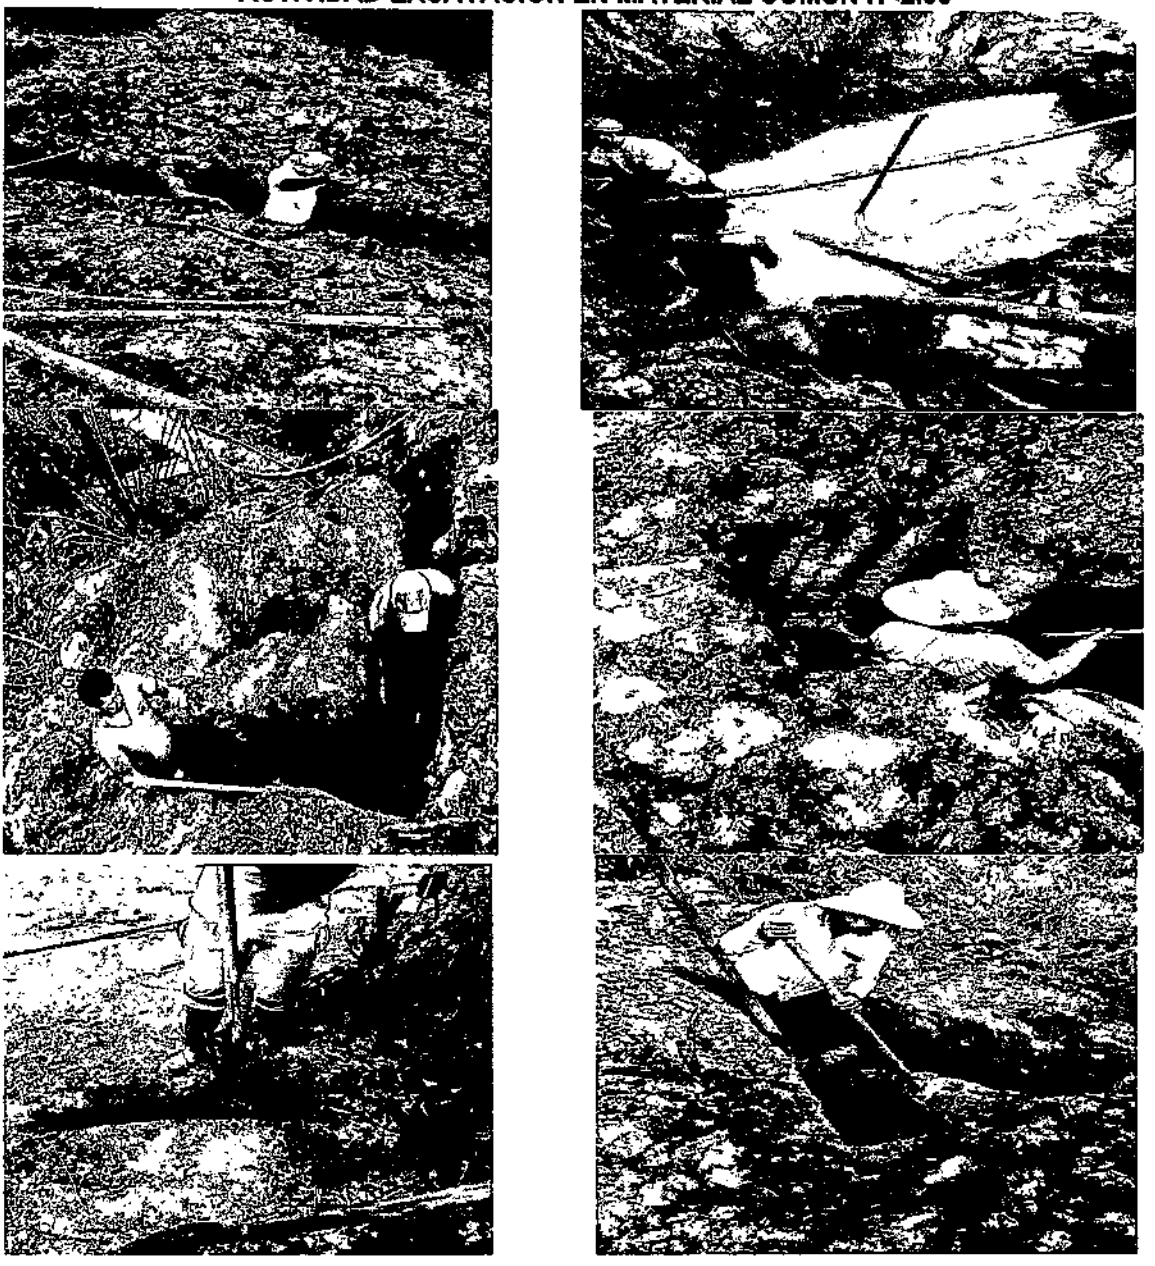

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal


ACTIVIDAD DE RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION

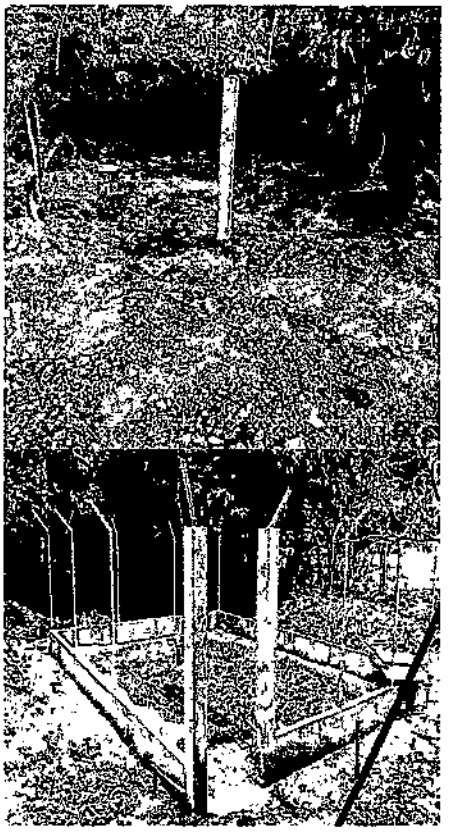

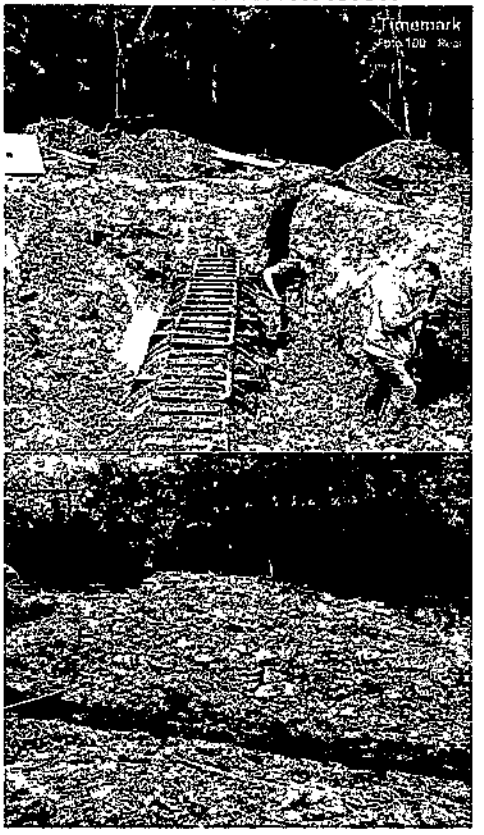

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO (RECAMARA SEPTICA DE 8750L + RECAMARA FAFA 3750 L) = 12500 LITROS



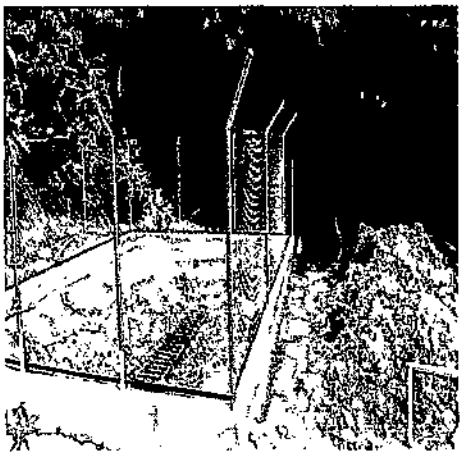


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CON FILTRO DE D=4"








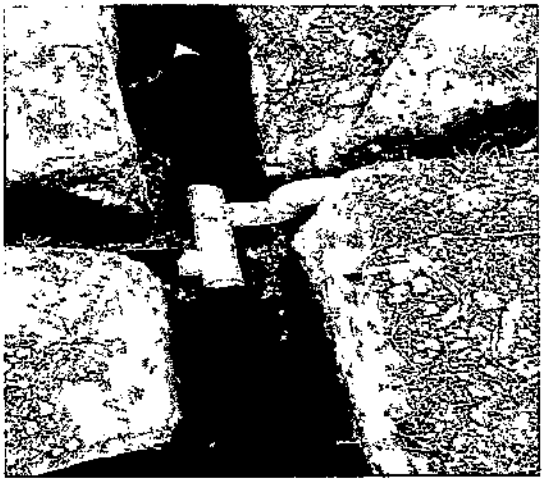


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.



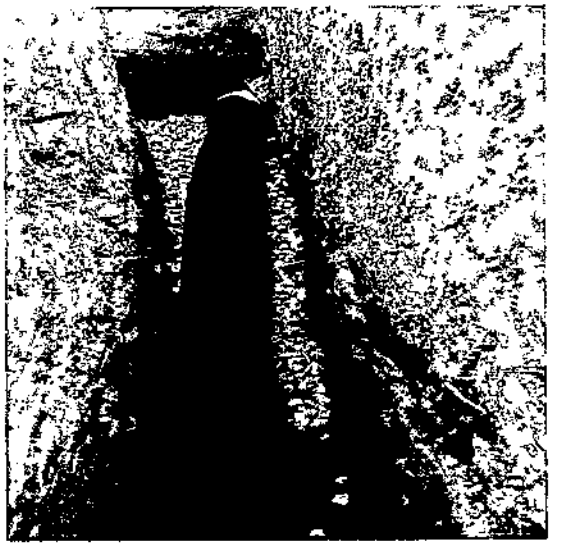

PLACA PISO E=0.10M R-21MPA CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA SOPORTE DEL TANQUE SEPTICO INTEGRADO DE 12500 LT

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

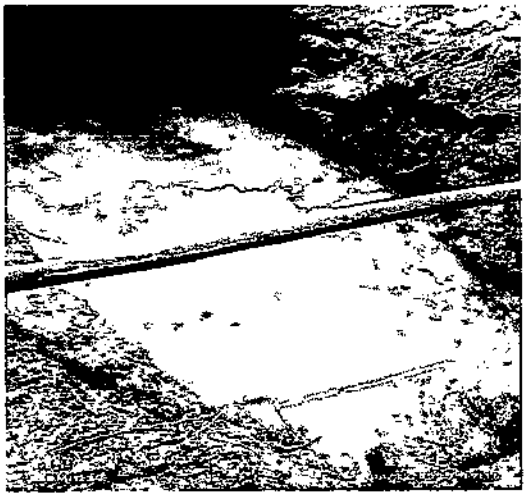




CONSTRUCCION CAMPO DE INFILTRACION EN TUBERIA DE FILTRO DE D=4", ENCAMISADA CON FILTRO NO TEJIDO






+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.


FILTRO EN GRAVILLA LAVADA TAMAÑO D=3/4",EN ALTURA DE 0,5

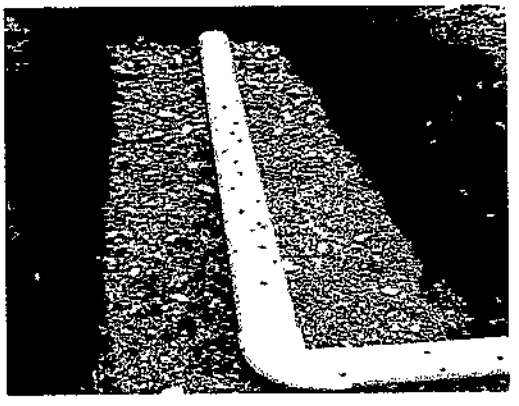



VIGA DE CIMENTACION 15X25

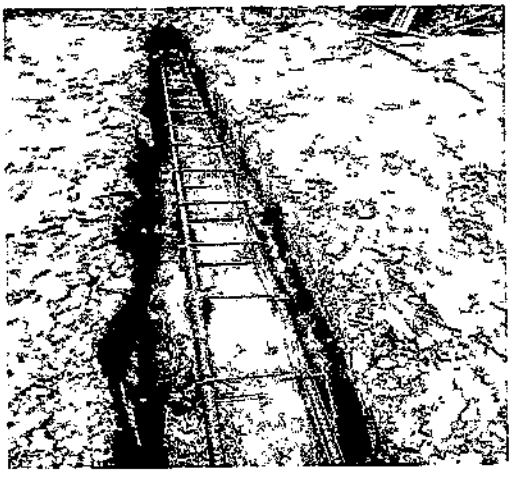


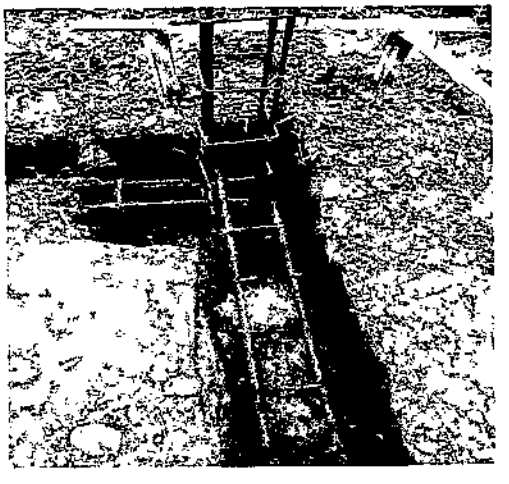


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal


SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE H=2.00 METROS.



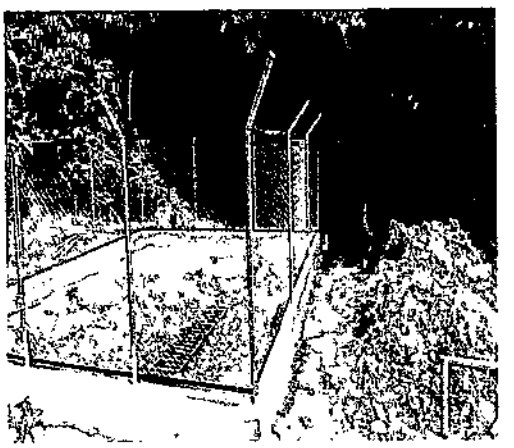


MURETE EN CONCRETO SIMPLE PARA CERRAMIENTO ALTURA H=0.50 METROS, E=0.12 M

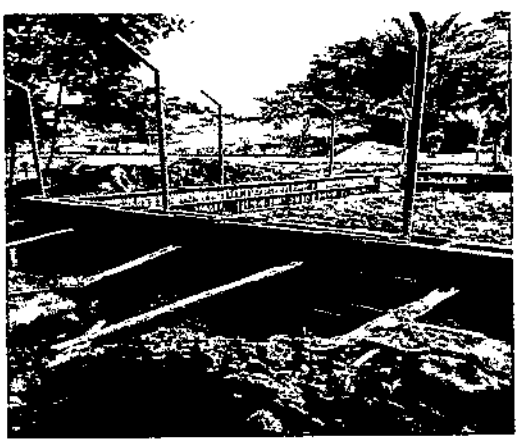


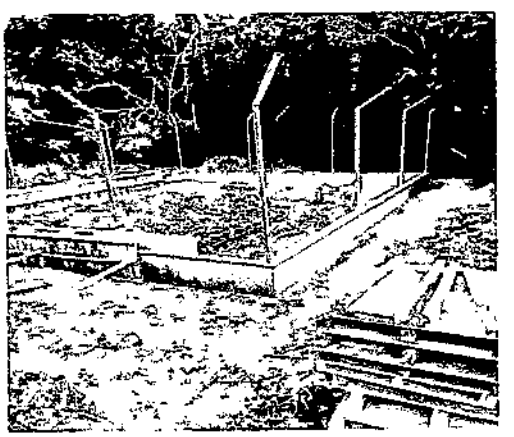


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal


PUERTA EN MALLA ESLABONADA DE 2.00X1.00 EN TUBO GALVANIZADO D=2"

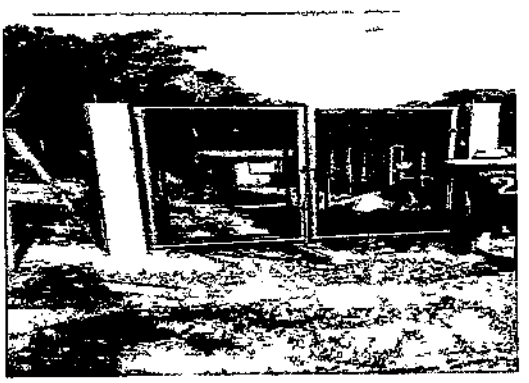

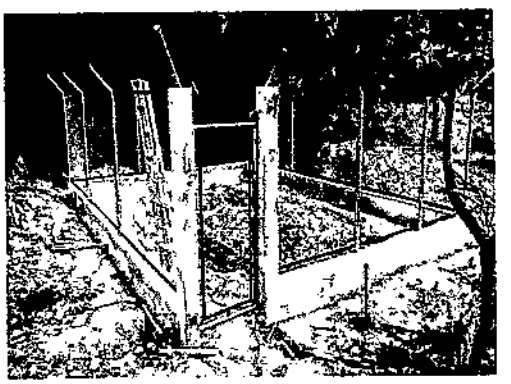


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA D=2, CON ALTURA 3.00 METROS.

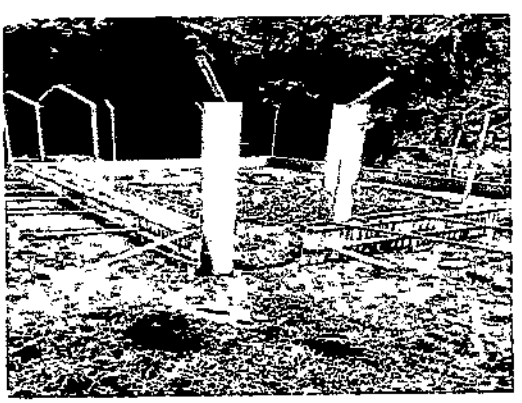


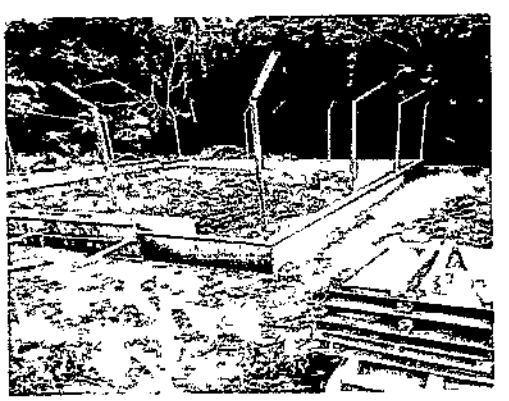


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.


COLUMNA EN CONCRETO DE 0.20X0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE 1/2 PDR60

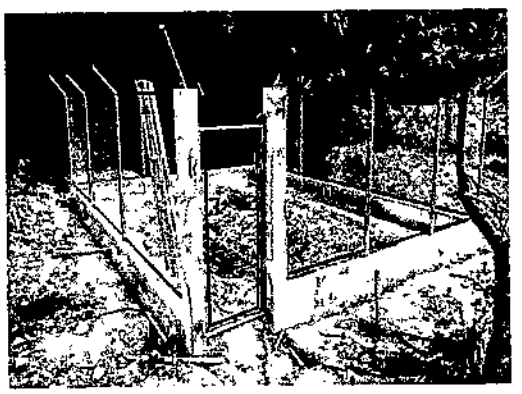

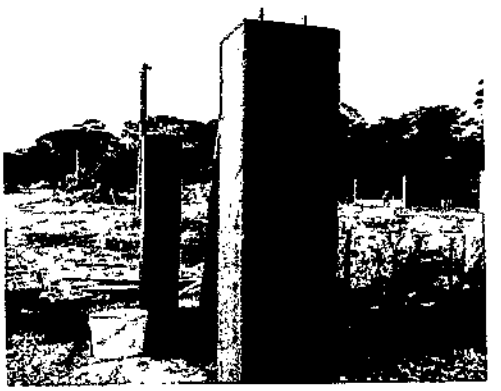

DESTAPONAMIENTO DE TUBERÍA D=8" CON AGUA A PRESIÓN A TRAVES DE SISTEMA VACTOR O SIMILAR

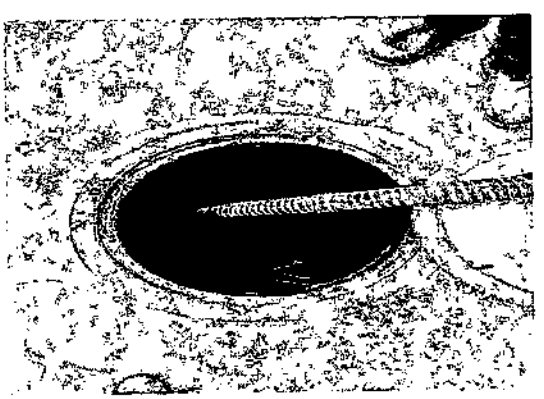


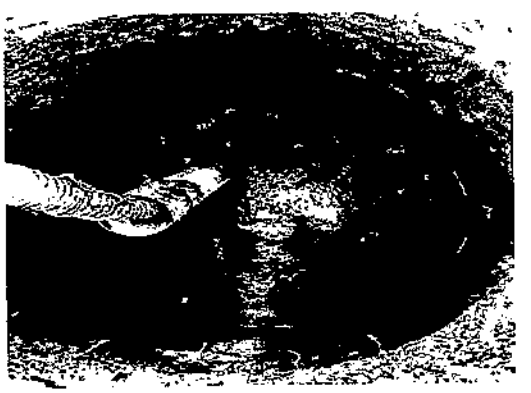







+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

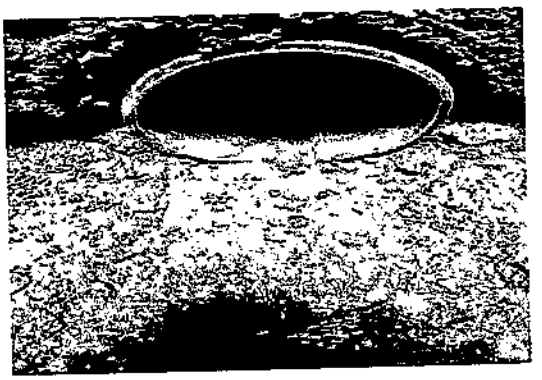

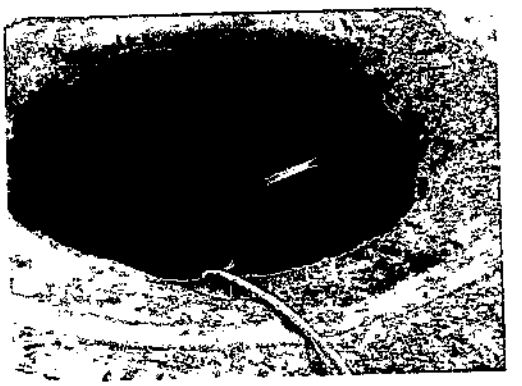

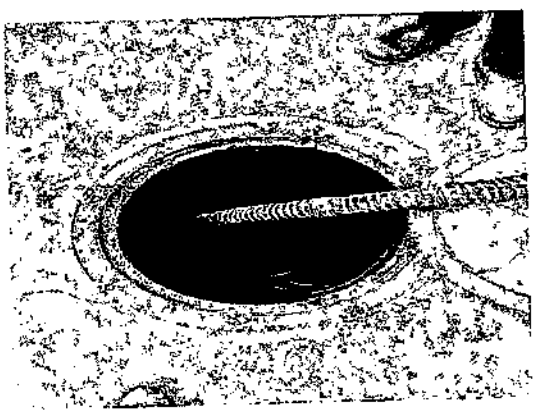




ROCERIA, LIMPIEZA, RETIRO, PAISAJISMO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE







+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.



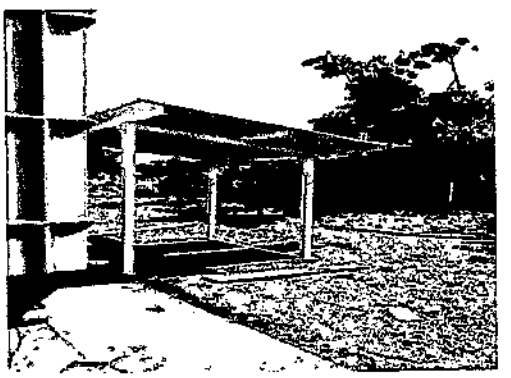


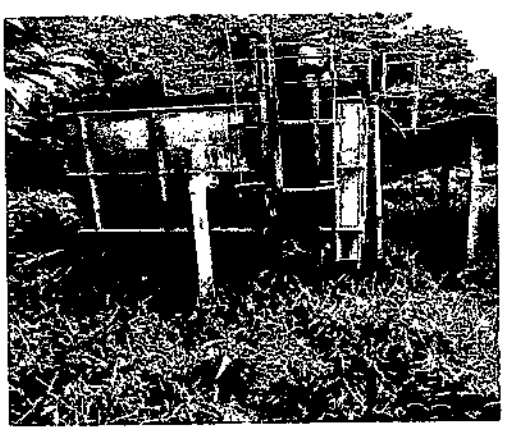

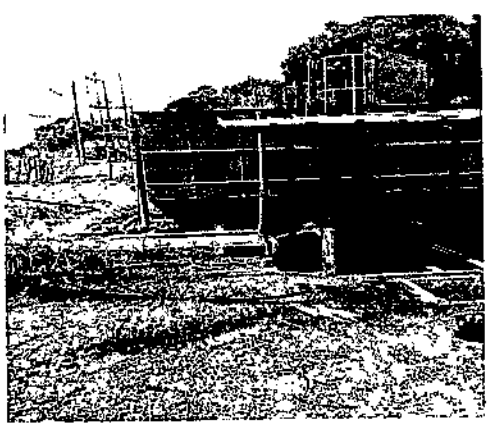


PINTURA PARA TOLVA, BARANDAS Y ESCALERAS




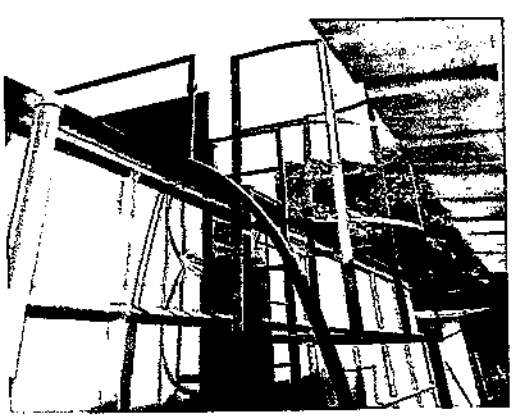



+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, TIPO COMPACTO CON CAPACIDAD DE 0,5 LPS, INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAHULICA Y ACCESORIOS Y ELECTRICA A 0 METROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS (TABLERO DE MANDO, BOMBA Y SOPLADOR) INCLUYE TRATAMIENTO DE DESECHOS EXISTENTES.

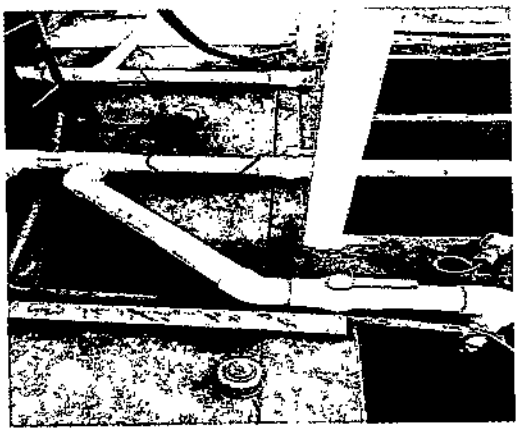

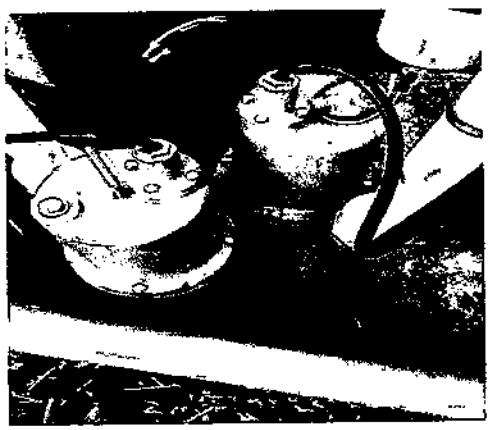


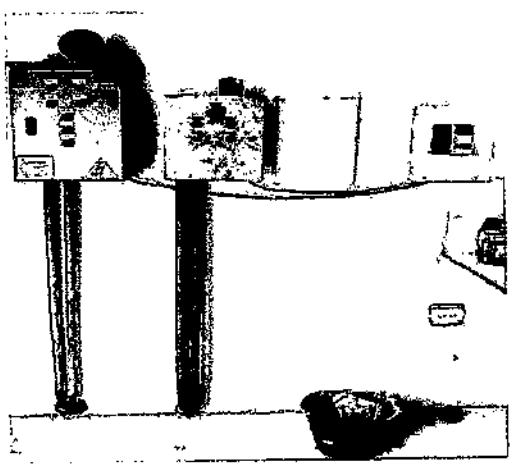


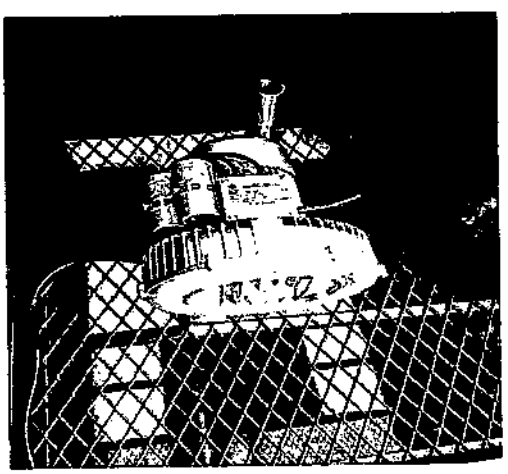

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.


SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INOXIDABLE SUBMONTAR 55X43 CM CON GRIFERÍA ADVANCE SATÍN Y CANASTILLACON SUS ACCESORIOS

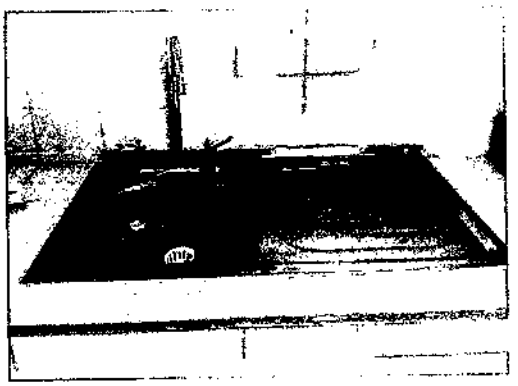

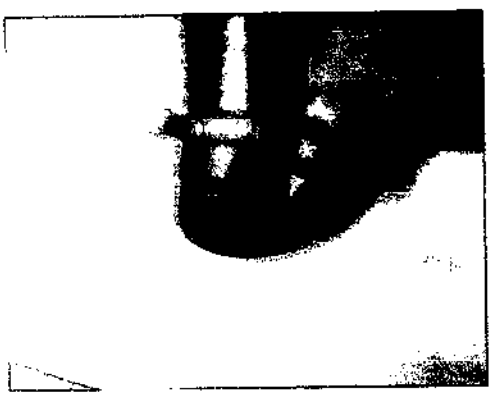


PINTURA EN VINILO TIPO 1



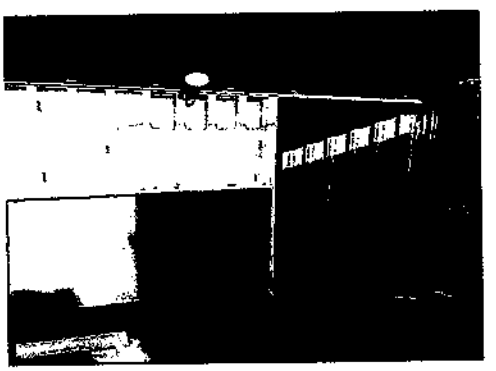


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

PINTURA PARA ORNAMENTACION METALICA

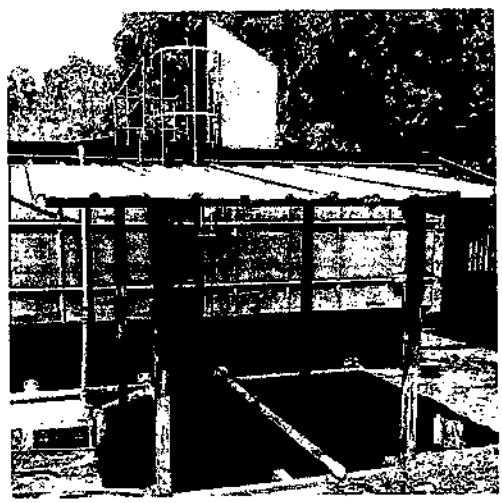




INSTALACION DE LAMPARA LED DE 18W A 110 V Y CERRADURA DE PUERTA

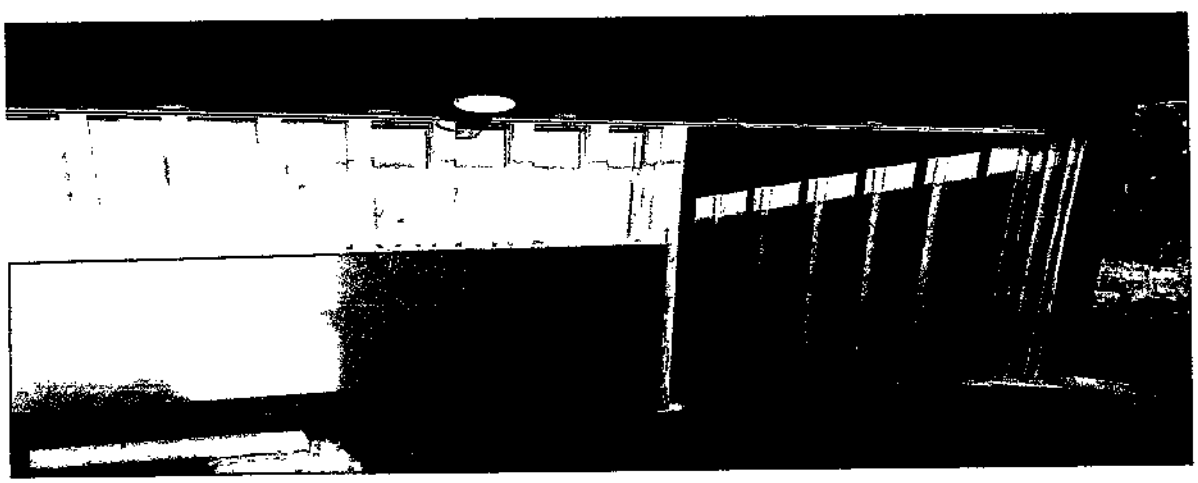


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"

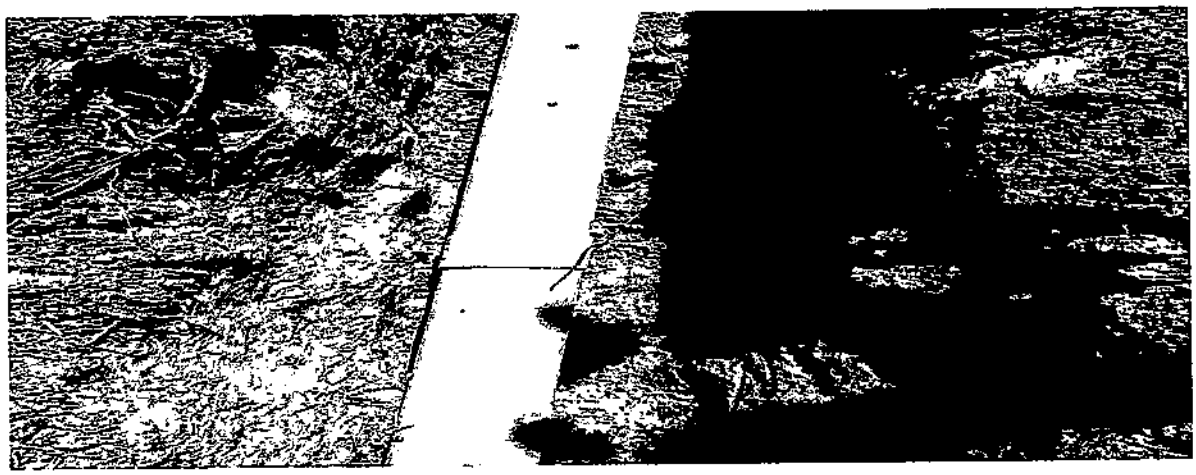


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" PERFORADA

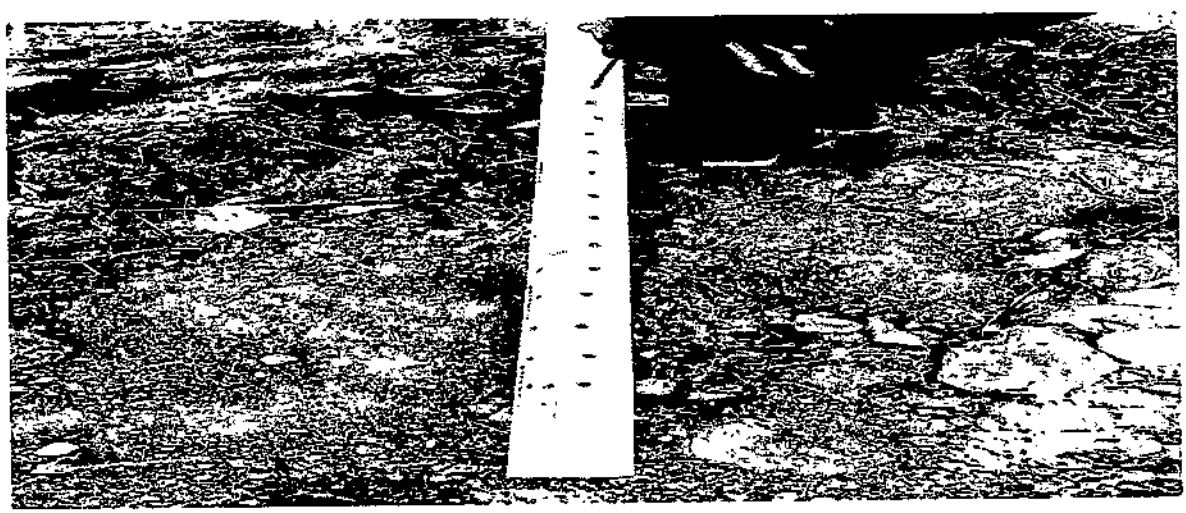


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

PINTURA PARA CUBIERTA DE LECHOS DE SECADO

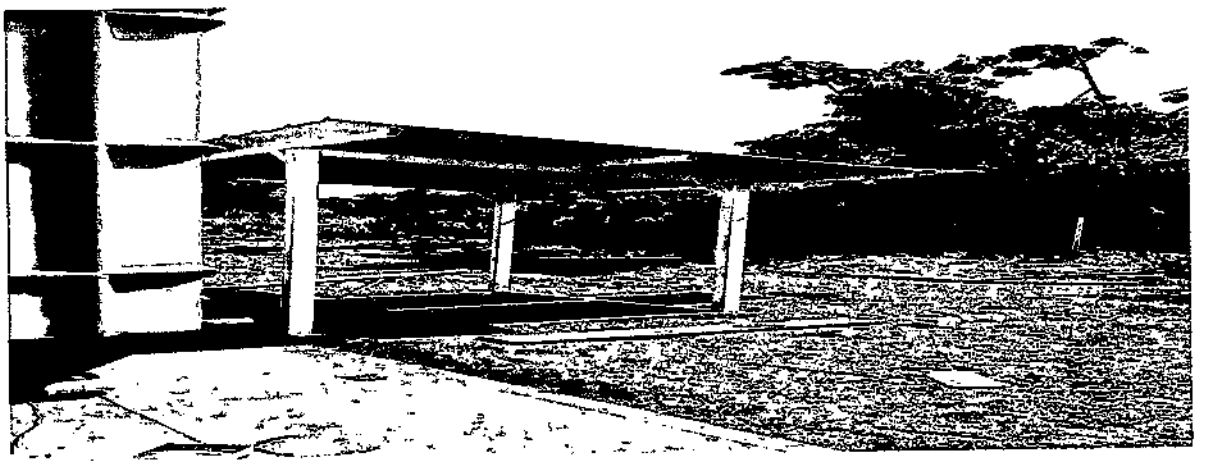



SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE 2X2, INCLUYE TRANSPORTE

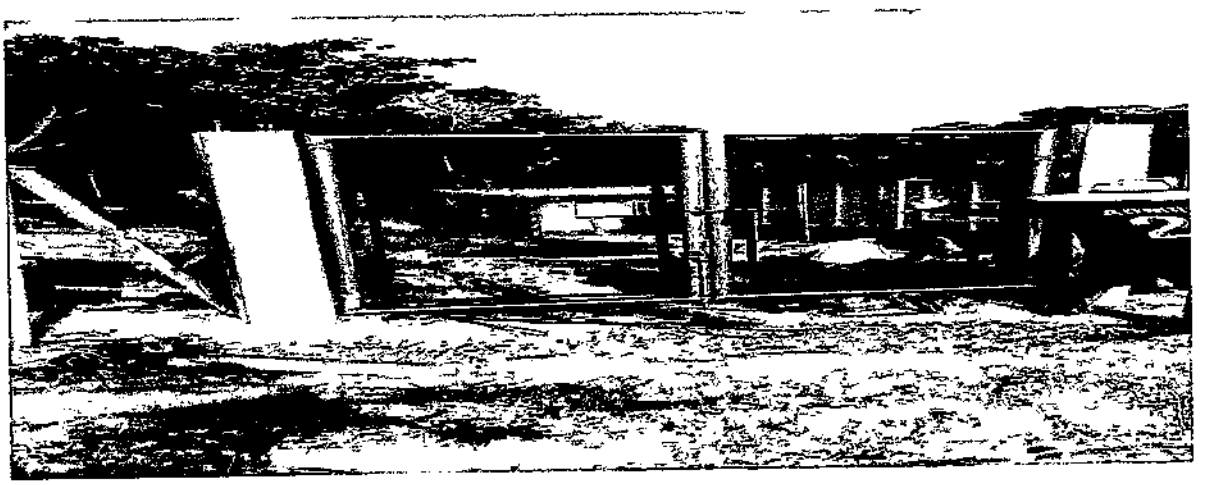

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

COLUMNA DE 0,20X 0,20 INCLUYE ACERO

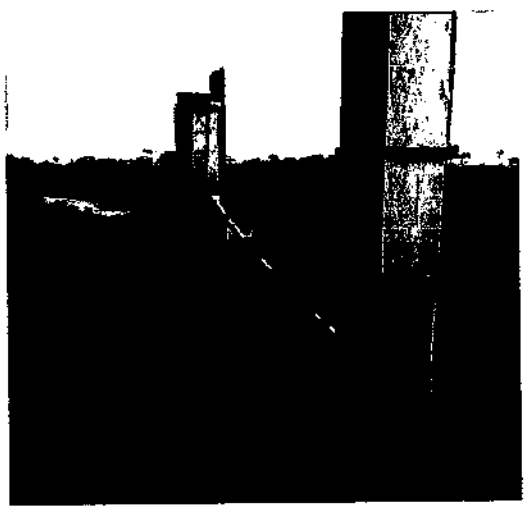

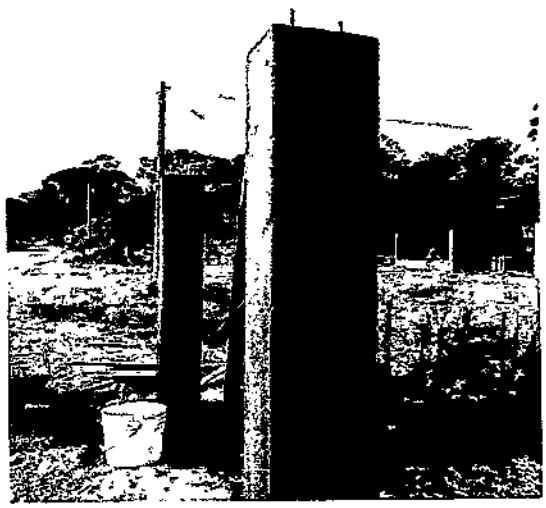


ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA, SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE DE INSPECCION PARA MEDIDOR Y SISTEMA PUESTA TIERRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS EN DUCTO DE 1", SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 MOTORES A 110 V Y 2 A 220 V CON PROTECCION DE RELE Y SUPRESOR DE PICOS GENERAL CON SEÑALES SEMI AUTOMATICO, DOS SALIDAS DE CONEXION ELECTRICA PARA MOTORES, SALIDA ELECTRICA A 110 VINCLUYE TRANSPORTE







+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal



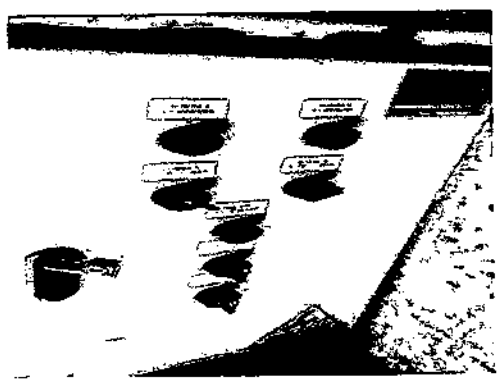



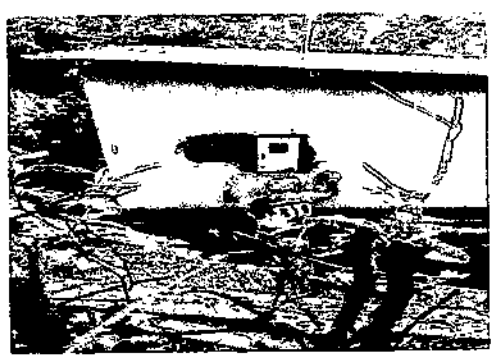

[1] Para una mejor comprensión, **ver registro fotográfico aportado por el Contratista a la Supervisión.**

CONCLUSIÓN - El contratista ejecutó a satisfacción las actividades previstas en el contrato de obra.

TERESA DEL CARMEN CARBONÓ PACHECO
Supervisora

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

F52 – ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS	Versión 2.0
	Adopción: resolución 331/14/06/16

Asunto:	RECIBO FINAL DE OBRAS		
Fecha:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	**Hora:**	8:30 a.m
Lugar:	OFICINA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC		
Contrato:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 199-SAMC-2025		
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ.**		
Contratista:	ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT:	NIT. 901.714.962-3		
Representante Legal:	Jorge Andrés Moncada Suaza C.C. No. 5.819.666 de Ibagué.		
Supervisor:	TERESA DEL CARMEN CARBONÓ PACHECO		

Plazo del contrato

Plazo inicial	El servicio objeto de la futura contratación deberá contarse por un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES** en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista.				**Fecha del acta de inicio**	04 DE NOVIEMBRE DE 2025			
Suspensión 1	**Desde**	**N/A**	**Hasta**	**N/A**	**Suspensión 2**	**Desde**	**N/A**	**Hasta**	**N/A**
Reinicio 1	**Desde**	**N/A**			**Reinicio 2**	**Desde**	**N/A**		
Fecha de Finalización	**31 de Diciembre de 2025**								
Fecha de Terminación de obra	**31 de Diciembre de 2025**								

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal

Ítems de la obra

1. Cantidades iniciales.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I	**PRELIMINARES**				
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	ML	150	$ 3.229,00	$ 484.350,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	M3	70,000	$ 66.151,00	$ 4.630.570,00
1.3	Rellenos con material de excavacion	M3	34,400	$ 37.020,00	$ 1.273.488,00
II	**DEMOLICIONES**				
2	Demolicion de estructura Existente	UN	1,000	$ 3.131.136,00	$ 3.131.136,00
2,2	Retiro de material sobrante	M3	42,000	$ 270.805,00	$ 11.373.810,00
III	**SISTEMA PTAR**				
3,1	Suministro e intalacion de sistema séptico Integrado (Recamara septica de 8750L + Recamara FAFA 3750 L) = 12500 Litros	UN	1,000	$ 29.100.390,00	$ 29.100.390,00
3,2	Suministro e instalacion tuberia con filtro de D=4"	ML	25,000	$ 1.806,00	$ 45.150,00
3,3	Placa piso E=0.10M R-21MPA con malla electrosoldada para soporte del tanque septico integrado de 12500 Lt	M2	15,000	$ 291.825,00	$ 4.377.375,00
3,4	Caja de Inspección Concreto 3000PSI reforzada de 0,70 x 0,70 M, h=1.20m (incluye tapa tipo rejilla marco en Angulo de 1 1/4" y varilla 1/2")	UN	2,000	$ 806.365,00	$ 1.612.730,00
3,5	Construccion campo de Infiltracion en tuberia de filtro de d=4", encamisada con filtro no tejido	UN	1,000	$ 2.163.959,00	$ 2.163.959,00
3,6	Filtro en gravilla lavada tamaño D=3/4",en altura de 0,5	M3	8,000	$ 250.197,00	$ 2.001.576,00
IV	**CERRAMIENTO PTAR**				
4,1	Excavacion en material comun H<2.00	M3	14,000	$ 66.151,00	$ 926.114,00
4,2	Viga de cimentacion 15X25	ML	30,000	$ 122.805,00	$ 3.684.150,00
4,3	Suministro e instalación Cerramiento en malla eslabonada de h=2.00 metros.	ML	28,000	$ 162.662,00	$ 4.554.536,00
4,4	Murete en concreto simple para cerramiento altura h=0.50 metros, E=0.12 m	M2	14,000	$ 234.690,00	$ 3.285.660,00
4,5	Puerta En malla eslabonada de 2.00x1.00 en tubo galvanizado D=2"	UN	1,000	$ 724.196,00	$ 724.196,00
4,6	Suministro e instalacion de tuberia galvanizada	UN	12,000	$ 162.154,00	$ 1.945.848,00

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

	D=2, con altura 3.00 metros.				
4,7	Columna en concreto de 0.20x0.20 en concreto de 3000 Psi, acero de 1/2 PDR60	ML	7,000	$ 211.975,00	$ 1.483.825,00
V	**MANTENIMIENTO DE POZOS DE INSPECCION Y RED DE ALCANTARILLADO**				$ -
5.1	Destaponamiento de tubería D=8" con agua a presión a traves de Sistema Vactor o similar	ML	600,000	$ 37.014,00	$ 22.208.400,00
	CASERIO SAN ISIDRO INSPECCION UNION PENEYA				
ITEM	DESCRIPCION				
I	**PRELIMINARES**				
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	M2	400,000	$ 8.100,00	$ 3.240.000,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	M3	34,000	$ 96.710,00	$ 3.288.140,00
1.3	Roceria, limpieza, retiro, paisajismo y disposicion final de material sobrante	M3	180,000	$ 52.005,00	$ 9.360.900,00
II	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR)				
2,1	Pintura para tolva, barandas y escaleras	M2	51,938	$ 64.114,00	$ 3.329.952,00
2,2	Mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, tipo compacto con capacidad de 0,5 LPS, incluye transporte, Suministro e instalacion de tuberia hidrahulica y accesorios y electrica a 0 metros, suministro e instalacion de equipos electricos (tablero de mando, bomba y soplador) incluye tratamiento de desechos existentes.	UND	1,000	$ 48.137.043,00	$ 48.137.043,00
III	**MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN**				
3.1	Suministro e instalación de cubierta metálica master mil calibre 28, color a sugerir.	M2	0,000	$ 139.497,00	$ -
3,2	Suministro e instalacion de Lavaplatos inoxidable Submontar 55x43 Cm Con Grifería Advance Satín Y Canastillacon sus accesorios	UND	1,000	$ 555.291,00	$ 555.291,00
3,3	Pintura en vinilo tipo 1	M2	84,000	$ 39.152,00	$ 3.288.768,00
3,4	Pintura para ornamentacion metalica	M2	5,000	$ 54.112,00	$ 270.560,00
3,5	Instalacion de lampara led de 18w a 110 v y cerradura de puerta	UND	1,000	$ 174.538,00	$ 174.538,00
IV	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO				$ -
4,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6"	ML	24,000	$ 73.745,00	$ 1.769.880,00

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

4,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6" perforada	ML	20,000	$ 87.580,00	$ 1.751.600,00
4,3	suministro e instalacion de grava E= 0,25	M3	1,000	$ 660.047,00	$ 660.047,00
4,4	suministro e instalacion de arena E= 0,10	M3	1,000	$ 560.529,00	$ 560.529,00
4,5	Pintura para cubierta de lechos de secado	M2	12,250	$ 64.112,00	$ 785.372,00
V	**INSTALACION DE PORTON**				$ -
5,1	Suministro e instalacion de porton de 2x2, incluye transporte	UND	1,000	$ 1.433.874,00	$ 1.433.874,00
5,2	Columna de 0,20x 0,20 incluye acero	ML	5,600	$ 252.570,00	$ 1.414.392,00
VI	**SISTEMA ELÉCTRICO**		0,000		$ -
6,1	Acometida trifasica subterranea, suministro e instalacion de cofre de inspeccion para medidor y sistema puesta tierra, suministro e instalacion de Transformador de 10 KVA incluye sistema de proteccion, suministro e instalacion de acometida parcial tablero de distribucion de 12 circuitos en ducto de 1", suministro e instalacion de tablero de control para 2 motores a 110 v y 2 a 220 v con proteccion de rele y supresor de picos general con señales semi automatico, dos salidas de conexion electrica para motores, salida electrica a 110 vincluye transporte	UND	1,000	$ 18.976.984,00	$ 18.976.984,00
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$198.005.133,00**
				ADMINISTRACIÓN 28,50%	$56.431.463,00
				IMPREVISTOS 1%	$1.980.051,00
				UTILIDAD 5%	$9.900.257,00
				VALOR TOTAL CONTRATO	**$266.316.904,00**

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

2. Cantidades finales, autorizadas, ejecutadas, verificadas y sus valores.

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						CONDICIONES ACTUALES OBRA CONSTRUIDA			
						ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**								
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	ML	150	$ 3.229,00	$ 484.350,00	150,00	$ 484.350,00	0,00	$ 0,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	M3	70,000	$ 66.151,00	$ 4.630.570,00	70,00	$ 4.630.570,00	0,00	$ 0,00
1.3	Rellenos con material de excavacion	M3	34,400	$ 37.020,00	$ 1.273.488,00	34,40	$ 1.273.488,00	0,00	$ 0,00
II	**DEMOLICIONES**								
2	Demolicion de estructura Existente	UN	1,000	$ 3.131.136,00	$ 3.131.136,00	1,00	$ 3.131.136,00	0,00	$ 0,00
2,2	Retiro de material sobrante	M3	42,000	$ 270.805,00	$ 11.373.810,00	42,00	$ 11.373.810,00	0,00	$ 0,00
III	**SISTEMA PTAR**								
3.1	Suministro e intalacion de sistema séptico Integrado (Recamara septica de 8750L + Recamara FAFA 3750 L) = 12500 Litros	UN	1,000	$ 29.100.390,00	$ 29.100.390,00	1,00	$ 29.100.390,00	0,00	$ 0,00
3,2	Suministro e instalacion tuberia con filtro de D=4"	ML	25,000	$ 1.806,00	$ 45.150,00	25,00	$ 45.150,00	0,00	$ 0,00
3,3	Placa piso E=0.10M R-21MPA con malla electrosoldada para soporte del tanque septico integrado de 12500 Lt	M2	15,000	$ 291.825,00	$ 4.377.375,00	15,00	$ 4.377.375,00	0,00	$ 0,00
3,4	Caja de Inspección Concreto 3000PSI reforzada de 0,70 x 0,70 M, h=1,20m (incluye tapa tipo rejilla marco en Angulo de 1 1/4" y varilla 1/2")	UN	2,000	$ 806.365,00	$ 1.612.730,00	2,00	$ 1.612.730,00	0,00	$ 0,00
3,5	Construccion campo de Infiltracion en tuberia de filtro de d=4", encamisada con filtro no tejido	UN	1,000	$ 2.163.959,00	$ 2.163.959,00	1,00	$ 2.163.959,00	0,00	$ 0,00
3,6	Filtro en gravilla lavada tamaño D=3/4",en altura de 0,5	M3	8,000	$ 250.197,00	$ 2.001.576,00	8,00	$ 2.001.576,00	0,00	$ 0,00
IV	**CERRAMIENTO PTAR**								
4,1	Excavacion en material comun H<2.00	M3	14,000	$ 66.151,00	$ 926.114,00	14,00	$ 926.114,00	0,00	$ 0,00

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

4,2	Viga de cimentacion 15X25	ML	30,000	$ 122.805,00	$ 3.684.150,00	30,00	$ 3.684.150,00	0,00	$ 0,00
4,3	Suministro e instalación Cerramiento en malla eslabonada de h=2.00 metros.	ML	28,000	$ 162.662,00	$ 4.554.536,00	28,00	$ 4.554.536,00	0,00	$ 0,00
4,4	Murete en concreto simple para cerramiento altura h=0.50 metros, E=0.12 m	M2	14,000	$ 234.690,00	$ 3.285.660,00	14,00	$ 3.285.660,00	0,00	$ 0,00
4,5	Puerta En malla eslabonada de 2.00x1.00 en tubo galvanizado D=2"	UN	1,000	$ 724.196,00	$ 724.196,00	1,00	$ 724.196,00	0,00	$ 0,00
4,6	Suministro e instalacion de tuberia galvanizada D=2, con altura 3.00 metros.	UN	12,000	$ 162.154,00	$ 1.945.848,00	12,00	$ 1.945.848,00		$ 0,00
4,7	Columna en concreto de 0.20x0.20 en concreto de 3000 Psi, acero de 1/2 PDR60	ML	7,000	$ 211.975,00	$ 1.483.825,00	7,00	$ 1.483.825,00	0,00	$ 0,00
V	**MANTENIMIENTO DE POZOS DE INSPECCION Y RED DE ALCANTARILLADO**				$ -				
5.1	Deslaponamiento de tubería D=8" con agua a presión a traves de Sistema Vactor o similar	ML	600,000	$ 37.014,00	$ 22.208.400,00	600,00	$ 22.208.400,00	0,00	$ 0,00
	CASERIO SAN ISIDRO INSPECCION UNION PENEYA								
ITEM	DESCRIPCION								
I	**PRELIMINARES**								
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	M2	400,000	$ 8.100,00	$ 3.240.000,00	400,00	$ 3.240.000,00	0,00	$ 0,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	M3	34,000	$ 96.710,00	$ 3.288.140,00	34,00	$ 3.288.140,00	0,00	$ 0,00
1.3	Roceria, limpieza, retiro, paisajismo y disposicion final de material sobrante	M3	180,000	$ 52.005,00	$ 9.360.900,00	180,00	$ 9.360.900,00	0,00	$ 0,00
II	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR)								
2,1	Pintura para tolva, barandas y escaleras	M2	51,938	$ 64.114,00	$ 3.329.952,00	51,94	$ 3.329.952,00	0,00	$ 0,00
2,2	Mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, tipo compacto con capacidad de 0,5 LPS, incluye transporte, Suministro e instalacion de tuberia hidrahulica y accesorios y electrica a 0 metros, suministro e instalacion de equipos electricos (tablero de mando, bomba y soplador) incluye tratamiento de	UND	1,000	$ 48.137.043,00	$ 48.137.043,00	1,00	$ 48.137.043,00	0,00	$ 0,00

+57 3183066726 www.lamontanita-caqueta.gov.co ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal.

	desechos existentes.								
III	**MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN**								
3,1	Suministro e instalación de cubierta metálica master mil calibre 28, color a sugerir.	M2	0,000	$ 139.497,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	Suministro e instalacion de Lavaplatos inoxidable Submontar 55x43 Cm Con Grifería Advance Satín Y Canastillacon sus accesorios	UND	1,000	$ 555.291,00	$ 555.291,00	1,00	$ 555.291,00	0,00	$ 0,00
3,3	Pintura en vinilo tipo 1	M2	84,000	$ 39.152,00	$ 3.288.768,00	84,00	$ 3.288.768,00	0,00	$ 0,00
3,4	Pintura para ornamentacion metalica	M2	5,000	$ 54.112,00	$ 270.560,00	5,00	$ 270.560,00		$ 0,00
3,5	Instalacion de lampara led de 18w a 110 v y cerradura de puerta	UND	1,000	$ 174.538,00	$ 174.538,00	1,00	$ 174.538,00	0,00	$ 0,00
IV	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO				$ -	0,00		0,00	$ 0,00
4,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6"	ML	24,000	$ 73.745,00	$ 1.769.880,00	24,00	$ 1.769.880,00	0,00	$ 0,00
4,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6" perforada	ML	20,000	$ 87.580,00	$ 1.751.600,00	20,00	$ 1.751.600,00	0,00	$ 0,00
4,3	suministro e instalacion de grava E= 0,25	M3	1,000	$ 660.047,00	$ 660.047,00	1,00	$ 660.047,00	0,00	$ 0,00
4,4	suministro e instalacion de arena E= 0,10	M3	1,000	$ 560.529,00	$ 560.529,00	1,00	$ 560.529,00	0,00	$ 0,00
4,5	Pintura para cubierta de lechos de secado	M2	12,250	$ 64.112,00	$ 785.372,00	12,25	$ 785.372,00	0,00	$ 0,00
V	**INSTALACION DE PORTON**				$ -	0,00			
5,1	Suministro e instalacion de porton de 2x2, incluye transporte	UND	1,000	$ 1.433.874,00	$ 1.433.874,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.433.874,00
5,2	Columna de 0,20x 0,20 incluye acero	ML	5,600	$ 252.570,00	$ 1.414.392,00	0,00	$ 0,00	5,60	$ 1.414.392,00
VI	**SISTEMA ELÉCTRICO**		0,000		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,1	Acometida trifasica subterranea, suministro e instalacion de cofre de inspeccion para medidor y sistema puesta tierra, suministro e instalacion de Transformador de 10 KVA incluye sistema de proteccion, suministro e instalacion de acometida parcial tablero de distribucion de 12 circuitos en ducto de 1", suministro e instalacion de tablero de control para 2 motores a 110 v y 2 a 220 v con	UND	1,000	$ 18.976.984,00	$ 18.976.984,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 18.976.984,00

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal.

	proteccion de rele y supresor de picos general con señales semi automatico, dos salidas de conexion electrica para motores, salida electrica a 110 vincluye transporte							
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	$198.005.133,00		$ 176.179.883,00		$ 21.825.250,00
			ADMINISTRACIÓN	28,50%	$56.431.463,00		$ 50.211.267,00	A	$ 6.220.196,00
			IMPREVISTOS	1%	$1.980.051,00		$ 1.761.799,00	I	$ 218.252,00
			UTILIDAD	5%	$9.900.257,00		$ 8.808.994,00	U	$ 1.091.263,00
			VALOR TOTAL CONTRATO		$266.316.904,00		$ 236.961.943,00		$ 29.354.961,00

Consideraciones técnicas del supervisor o interventor


Una vez finalizada las actividades por parte del contratista, se recibe a satisfacción de acuerdo a las cantidades autorizadas y ejecutadas, observándose el buen funcionamiento de la misma, cumpliendo con el objeto del presente Contrato de Obra.

+57 3183066726 www.lamontanita-caqueta.gov.co ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal.

Registro fotográfico

ACTIVIDAD EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H<2.00



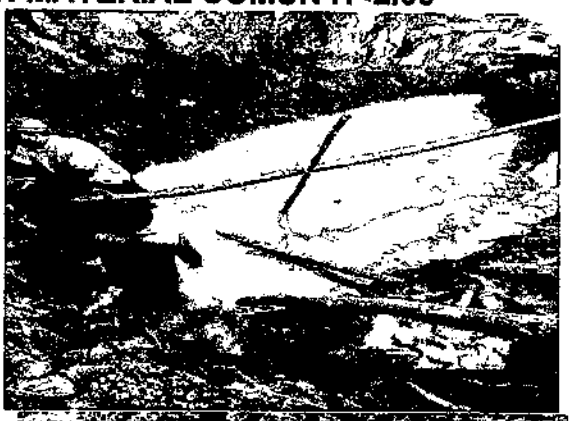




+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.





ACTIVIDAD DE RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION

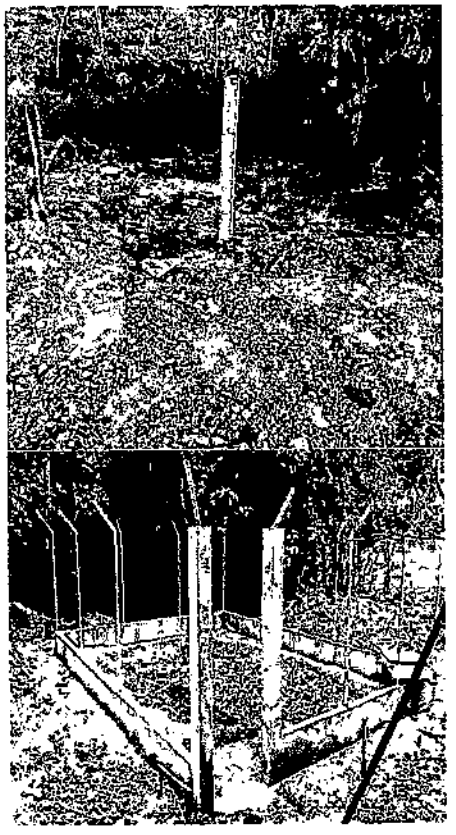




+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

ACTIVIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO (RECAMARA SEPTICA DE 8750L + RECAMARA FAFA 3750 L) = 12500 LITROS



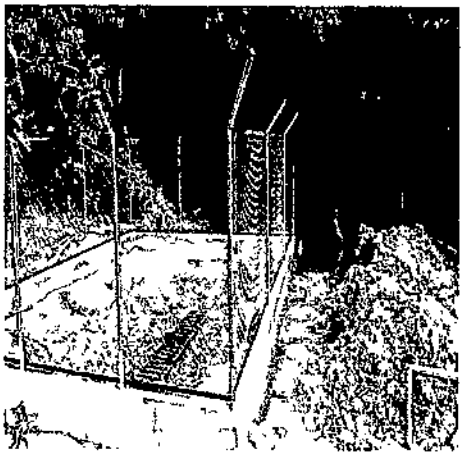


SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CON FILTRO DE D=4"






+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal.



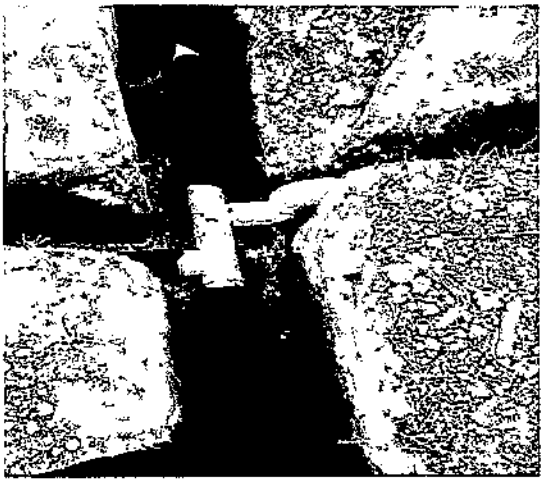



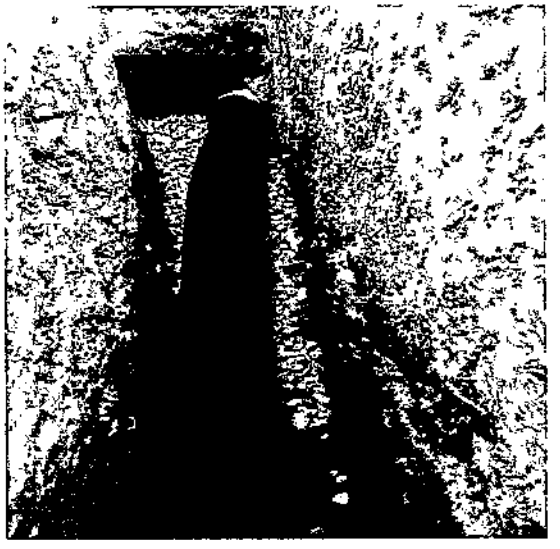

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal


PLACA PISO E=0.10M R-21MPA CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA SOPORTE DEL TANQUE SEPTICO INTEGRADO DE 12500 LT






CONSTRUCCION CAMPO DE INFILTRACION EN TUBERIA DE FILTRO DE D=4", ENCAMISADA CON FILTRO NO TEJIDO



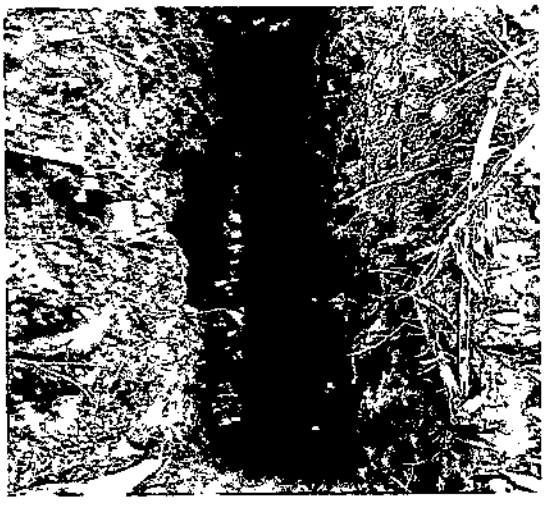


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.


FILTRO EN GRAVILLA LAVADA TAMAÑO D=3/4",EN ALTURA DE 0,5

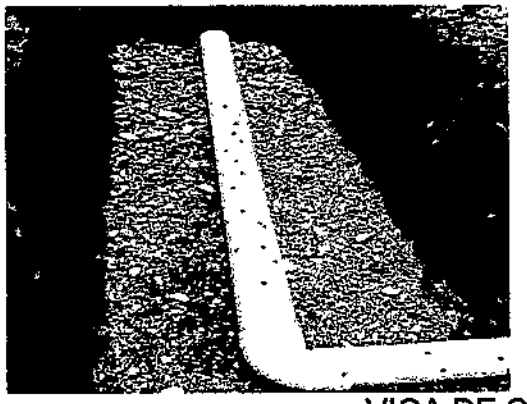




VIGA DE CIMENTACION 15X25

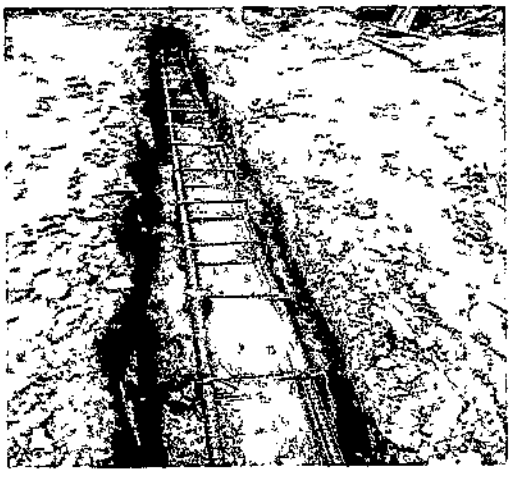


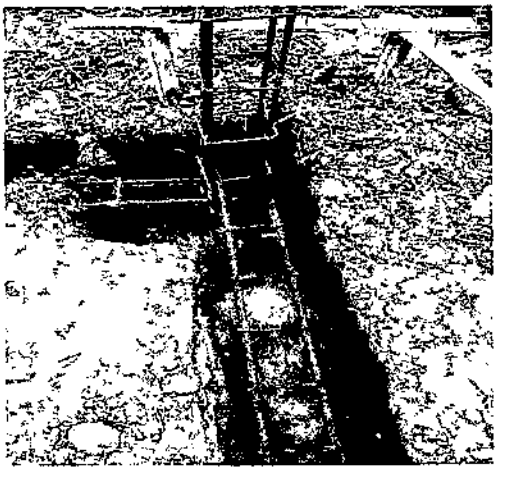


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal


SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE H=2.00 METROS.

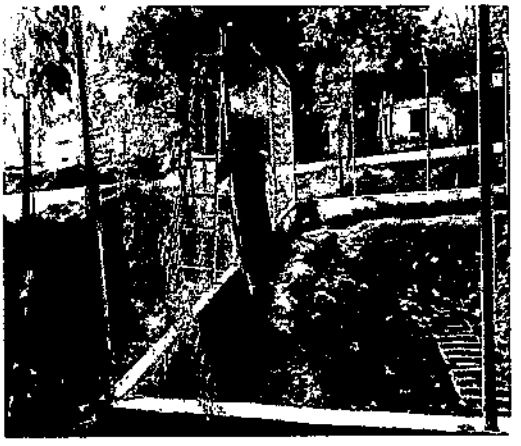

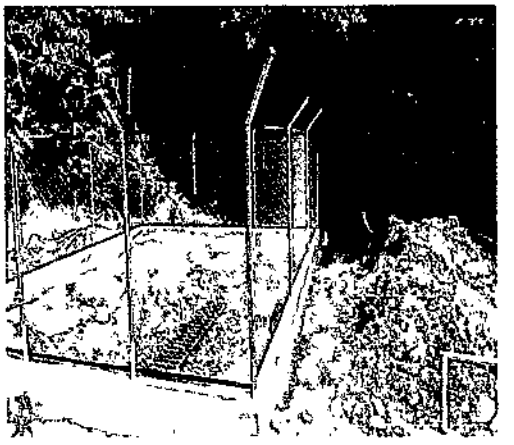


MURETE EN CONCRETO SIMPLE PARA CERRAMIENTO ALTURA H=0.50 METROS, E=0.12 M

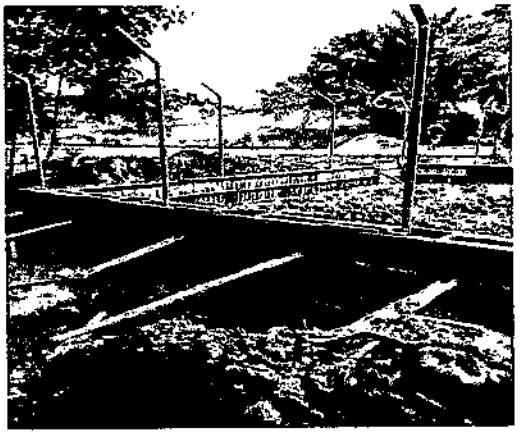


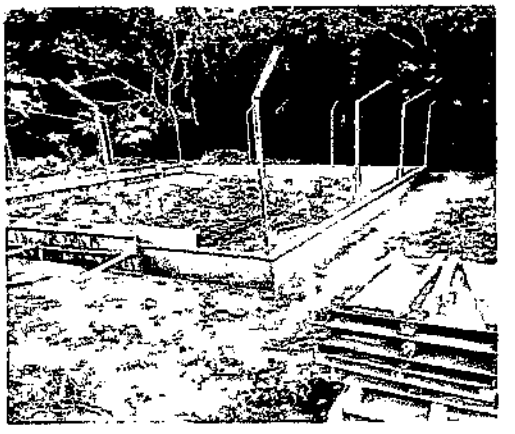


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal


PUERTA EN MALLA ESLABONADA DE 2.00X1.00 EN TUBO GALVANIZADO D=2"

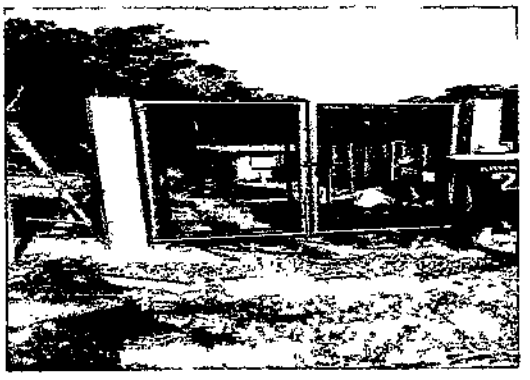

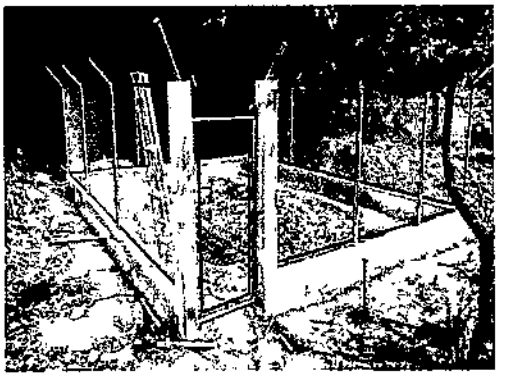


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA D=2, CON ALTURA 3.00 METROS.

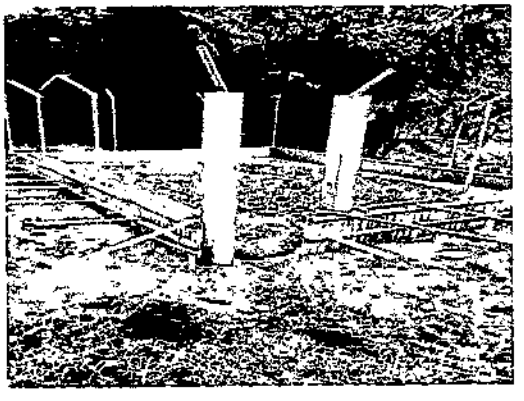


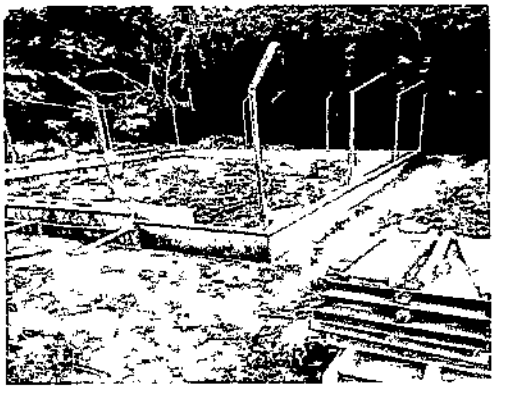


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.


COLUMNA EN CONCRETO DE 0.20X0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE 1/2 PDR60

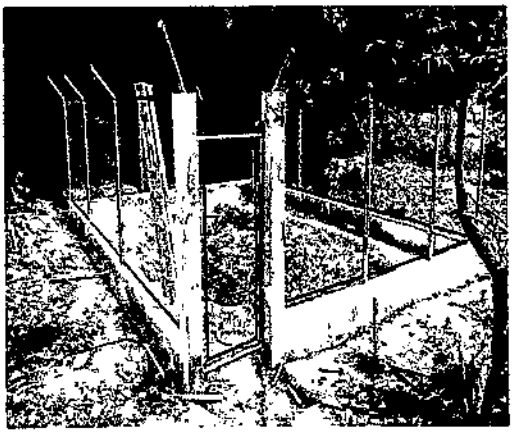

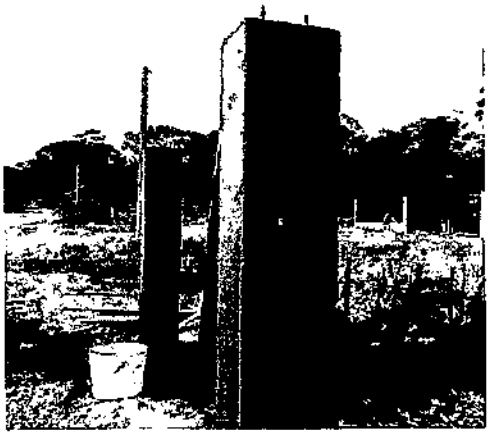


DESTAPONAMIENTO DE TUBERÍA D=8" CON AGUA A PRESIÓN A TRAVES DE SISTEMA VACTOR O SIMILAR

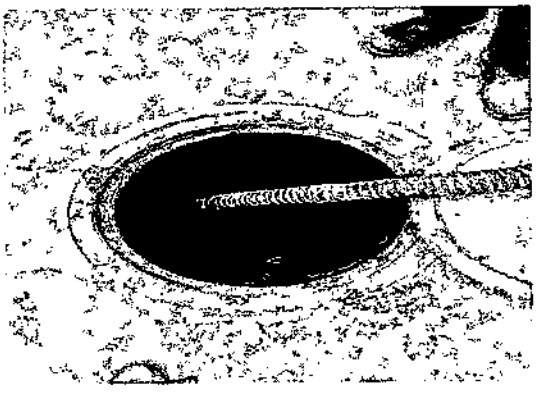


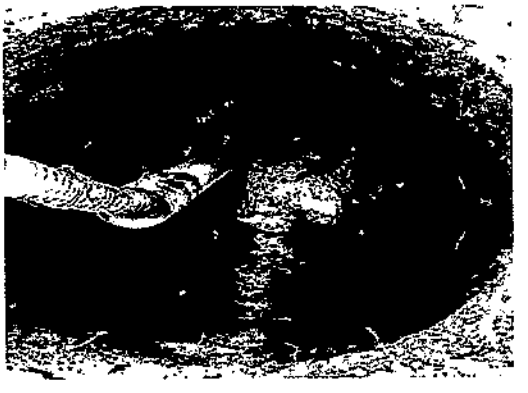



+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.



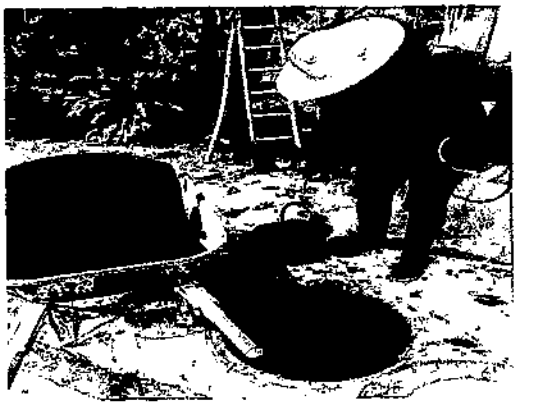

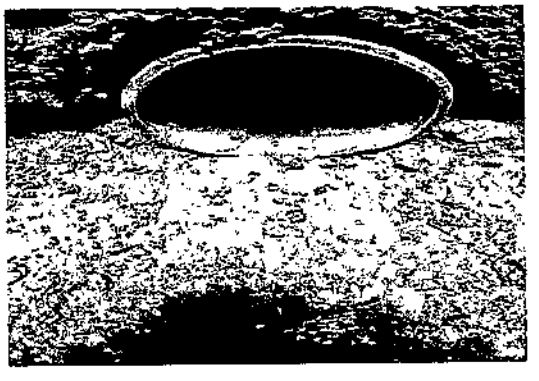

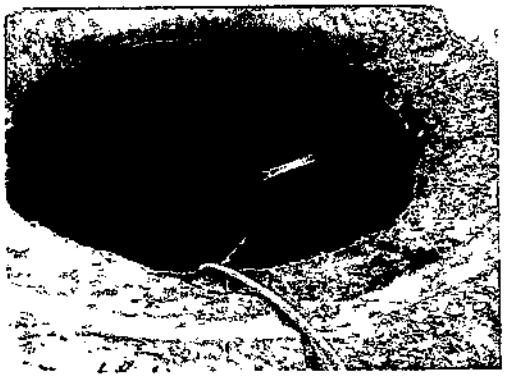

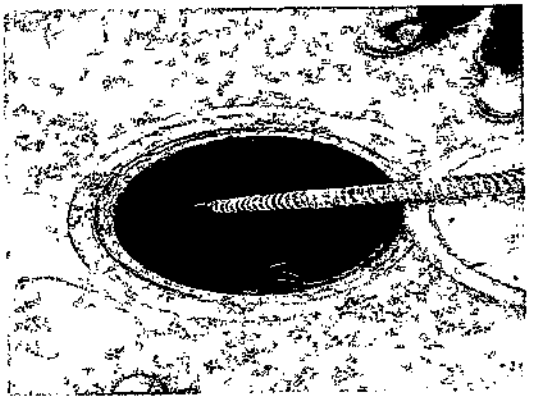




+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.


ROCERIA, LIMPIEZA, RETIRO, PAISAJISMO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE








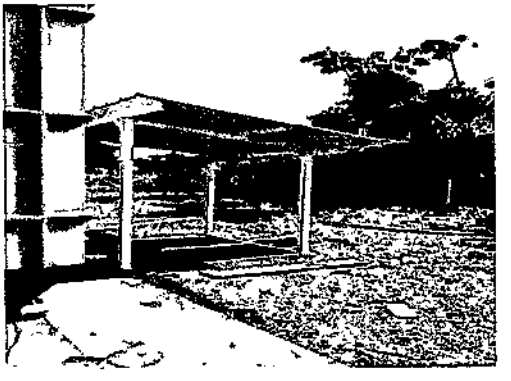

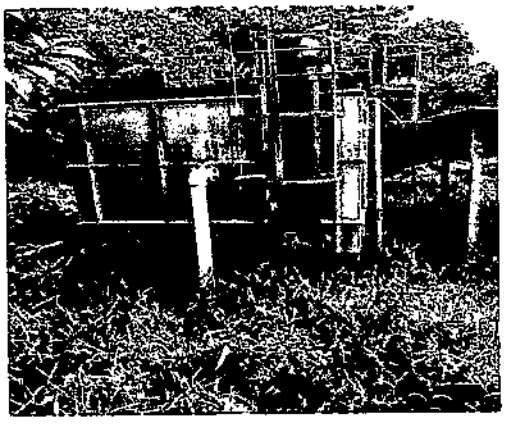

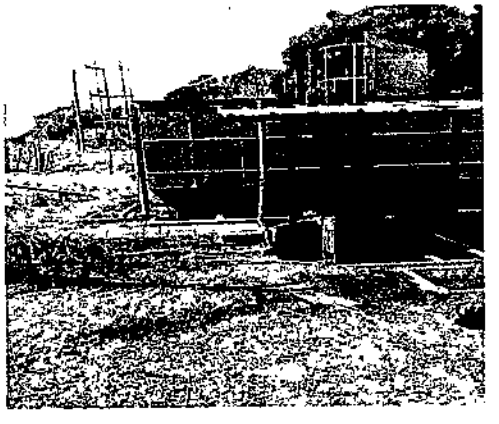


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

PINTURA PARA TOLVA, BARANDAS Y ESCALERAS







MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, TIPO COMPACTO CON CAPACIDAD DE 0,5 LPS, INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAHULICA Y ACCESORIOS Y ELECTRICA A 0 METROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS (TABLERO DE MANDO, BOMBA Y SOPLADOR) INCLUYE TRATAMIENTO DE DESECHOS EXISTENTES.

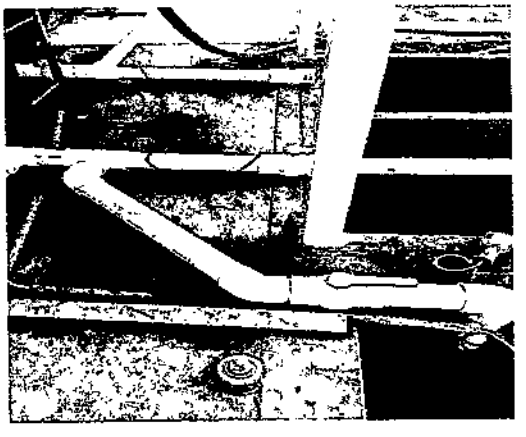





+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

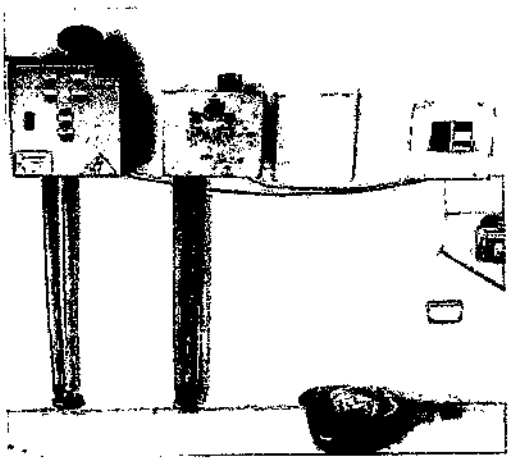

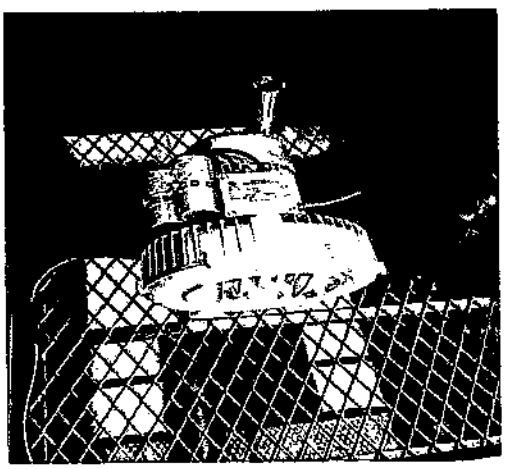


SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INOXIDABLE SUBMONTAR 55X43 CM CON GRIFERÍA ADVANCE SATÍN Y CANASTILLACON SUS ACCESORIOS

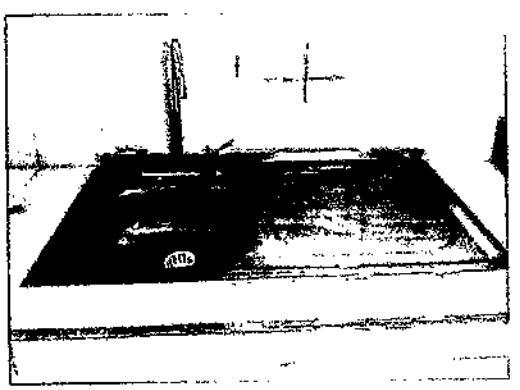


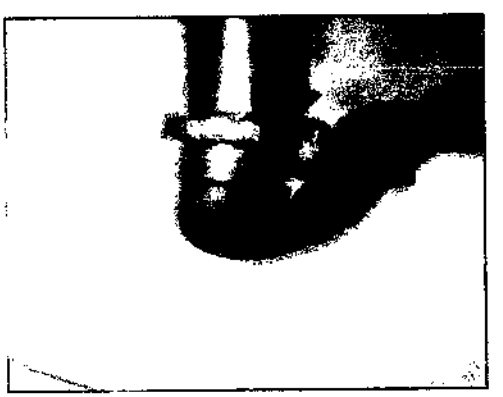


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

PINTURA EN VINILO TIPO 1

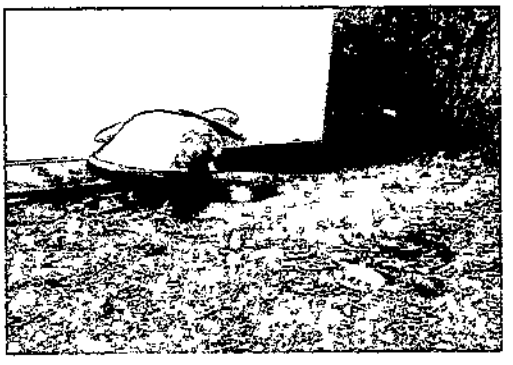

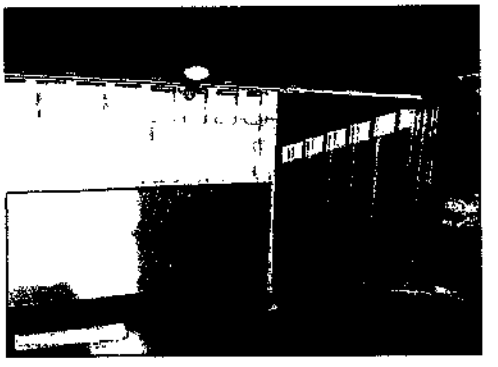


PINTURA PARA ORNAMENTACION METALICA

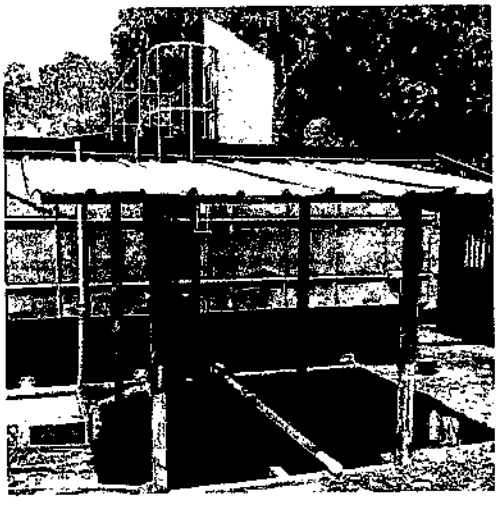




+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

INSTALACION DE LAMPARA LED DE 18W A 110 V Y CERRADURA DE PUERTA

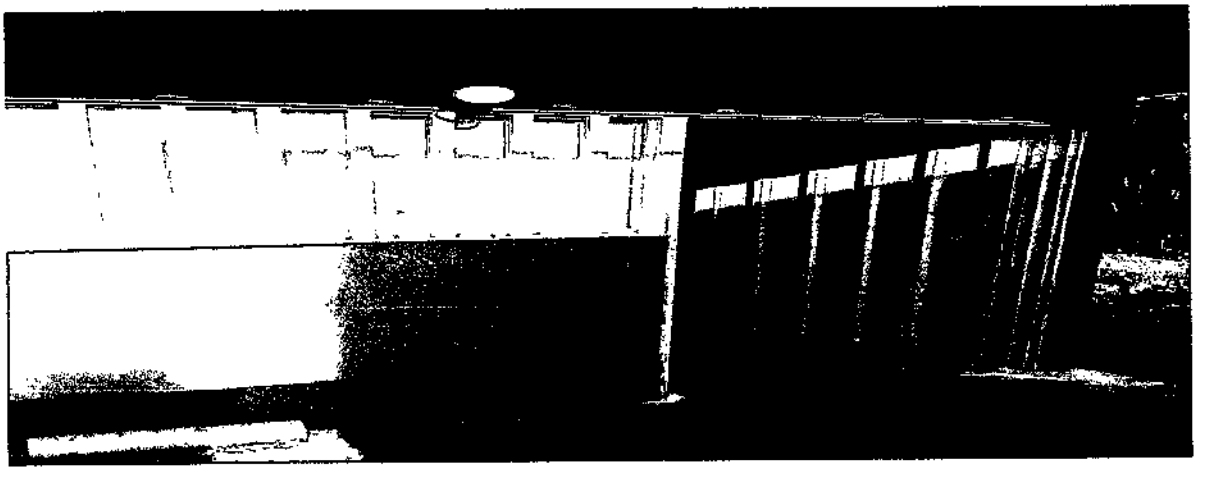


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"

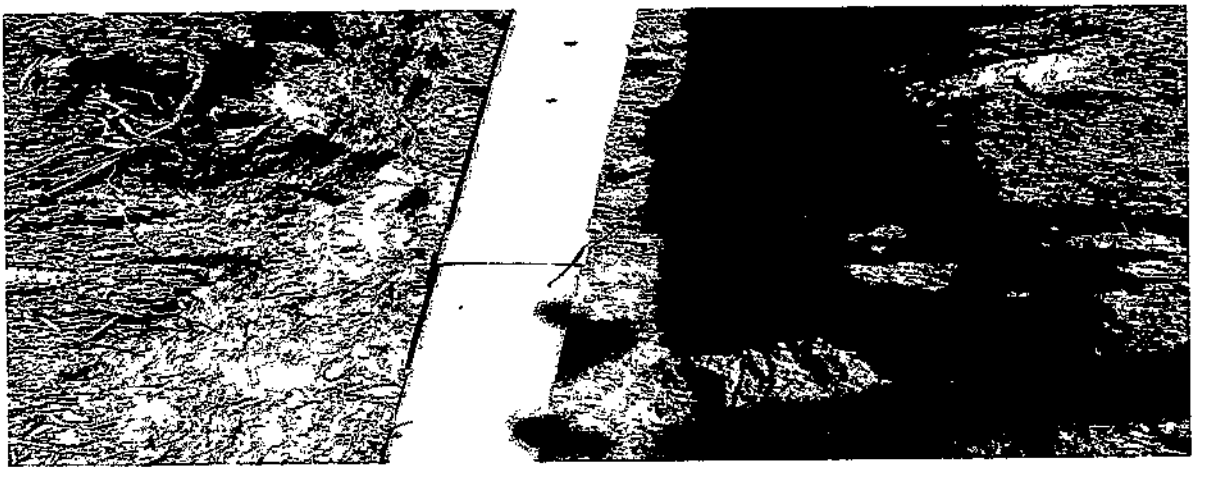


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" PERFORADA

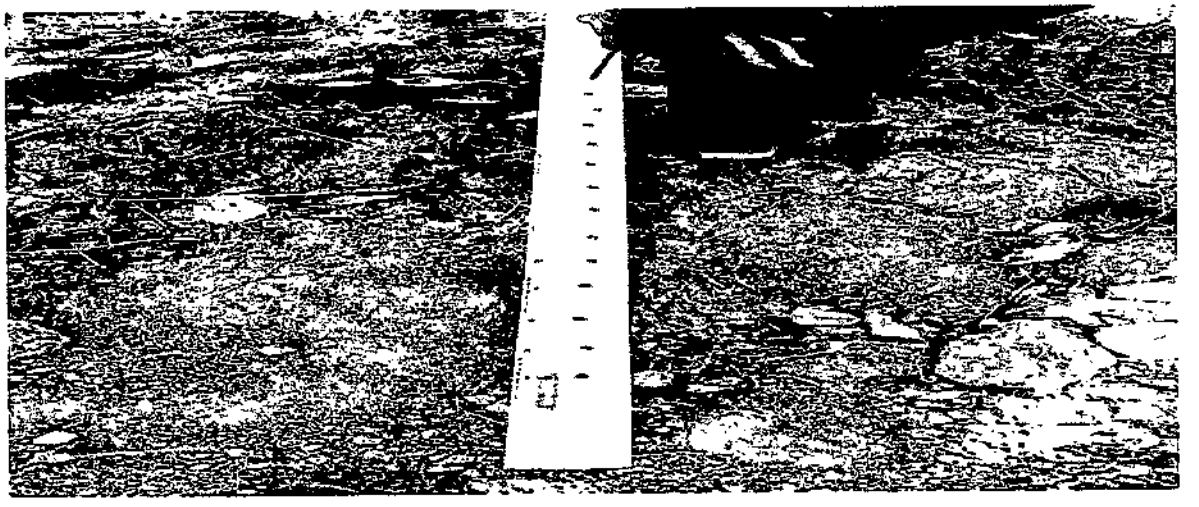


PINTURA PARA CUBIERTA DE LECHOS DE SECADO

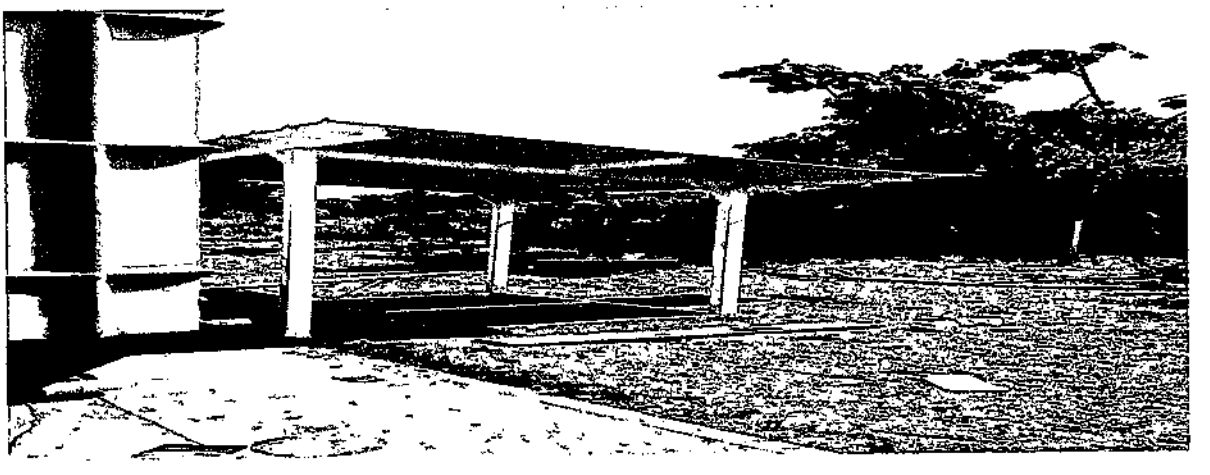



+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE 2X2, INCLUYE TRANSPORTE

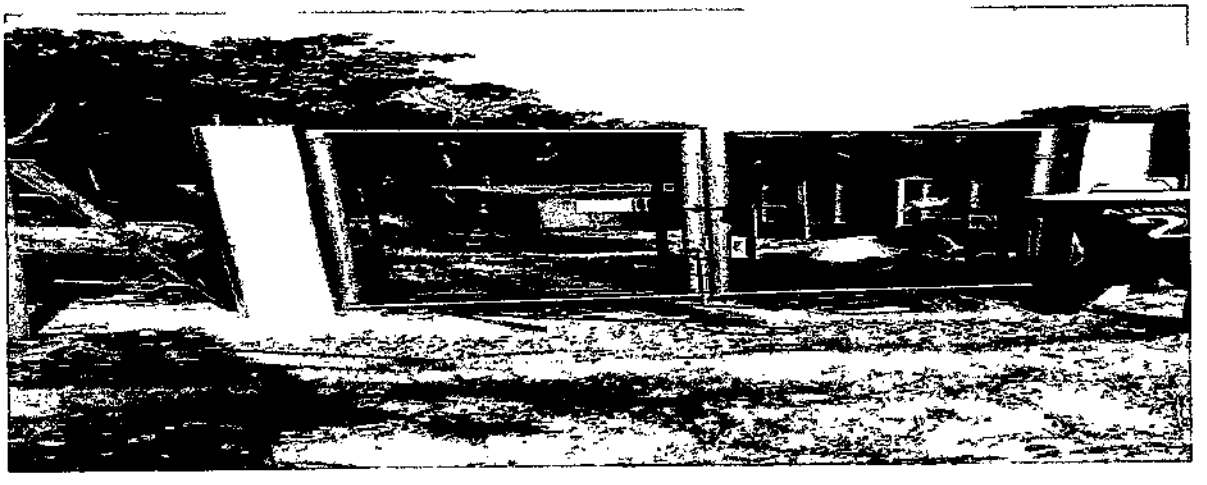

COLUMNA DE 0,20X 0,20 INCLUYE ACERO

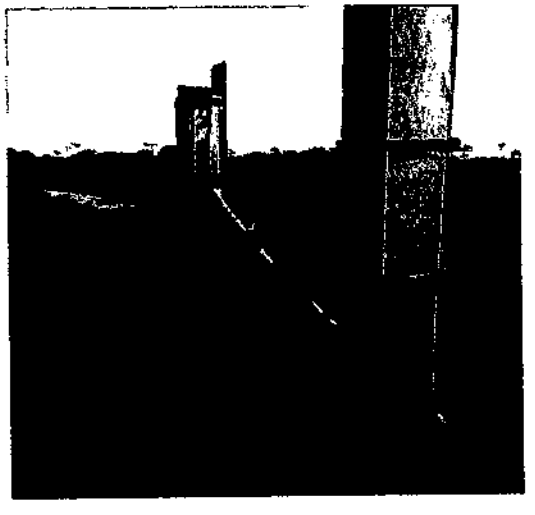

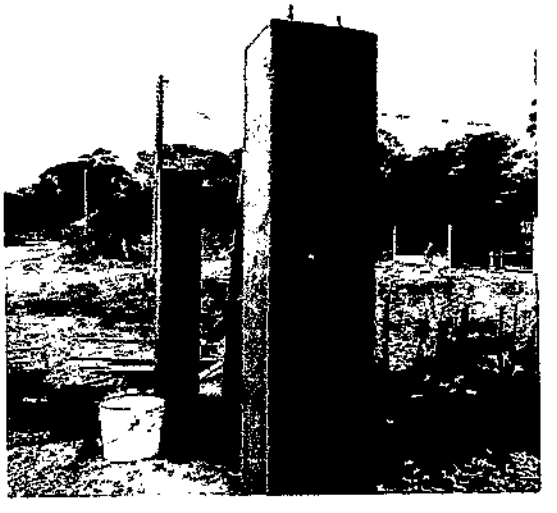


+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.

ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA, SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE DE INSPECCION PARA MEDIDOR Y SISTEMA PUESTA TIERRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARCIAL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS EN DUCTO DE 1", SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 MOTORES A 110 V Y 2 A 220 V CON PROTECCION DE RELE Y SUPRESOR DE PICOS GENERAL CON SEÑALES SEMI AUTOMATICO, DOS SALIDAS DE CONEXION ELECTRICA PARA MOTORES, SALIDA ELECTRICA A 110 VINCLUYE TRANSPORTE









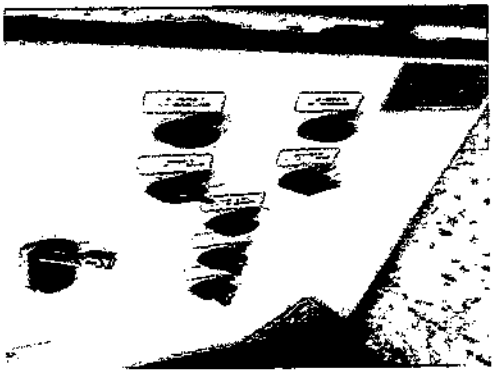

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal.



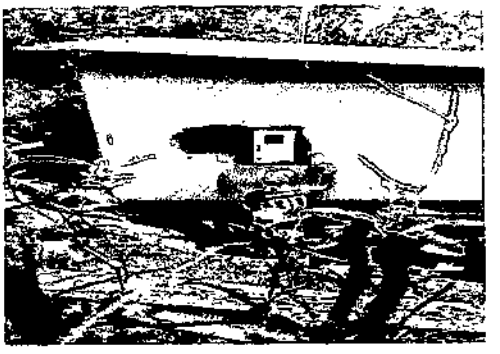

Para una mejor comprensión, **ver registro fotográfico aportado por el Contratista.**

No siendo más el motivo de la diligencia, se termina a las 11:40 a.m. del 31 de Diciembre de 2025 y se firma por quienes intervienen.

ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS	FEDERICO ALVIZ TRUJILLO	TERESA DEL CARMEN CARBONÓ PACHECO
Rep. Legal – Jorge Andres Moncada Suaza Contratista	VoBo Alcalde	Supervisor

Proyecto: Arq. Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Reviso: Ing. Teresa del Carmen Carbonó Pacheco

+57 3183065726 www.lamontanita-caqueta.gov.co ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal

DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ACTA FINAL DE 2025

Plazo inicial	DOS (02) MESES	FECHA PRESENTE ACTA	
Fecha Inicio	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	31/12/2025	
Fecha terminacion Inicial	03 DE ENERO DE 2026		
Fecha terminacion Ajustada	N/A		
Fecha de suspensión	N/A		
Fecha Reinicio	N/A	VALOR ACTA FINAL	
Adicion tiempo	N/A		
Adicion Presupuestal	N/A	$29.354.961,00	
Localizacion	Zona Rural municipio de la Montañita		

CONTRATO No.	199-SAMC-2025	Vr.Contrato Inicial	$268.316.984,00		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS	LOCALIZACION:	ZONA RURAL MUNICIPIO LA MONTAÑITA		
INTERVENTORIA:	N/A	FECHA CONTRATO	20 DE OCTUBRE 2025		
REP. LEGAL	JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	PLAZO ADICIONAL	N/A		

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						CONDICIONES ACTUALES OBRA CONSTRUIDA				ACUMULADO FINAL	
						ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES										
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	IML	150	$ 3.229,00	$ 484.350,00	150,00	$ 484.350,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	IM3	70,000	$ 66.151,00	$ 4.630.570,00	70,00	$ 4.630.570,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3	Rellenos con material de excavacion	IM3	34,400	$ 37.020,00	$ 1.273.488,00	34,40	$ 1.273.488,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
II	DEMOLICIONES										
2	Demolicion de estructura Existente	UN	1,000	$ 3.131.136,00	$ 3.131.136,00	1,00	$ 3.131.136,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.2	Retiro de material sobrante	IM3	42,000	$ 270.805,00	$ 11.373.810,00	42,00	$ 11.373.810,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
III	SISTEMA PTAR										
3.1	Suministro e intalacion de sistema séptico integrado (Recamara septica de 8750L + Recamara FAFA 3750 L) = 12500 Litros	UN	1,000	$ 29.100.390,00	$ 29.100.390,00	1,00	$ 29.100.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.2	Suministro e instalacion tuberia con filtro de D=4"	ML	25,000	$ 1.806,00	$ 45.150,00	25,00	$ 45.150,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.3	Placa piso E=0.10M R-21MPA con malla electrosoldada para soporte del tanque septico integrado de 12500 Lt	M2	15,000	$ 291.825,00	$ 4.377.375,00	15,00	$ 4.377.375,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.4	Caja de Inspección Concreto 3000PSI reforzada de 0,70 x 0,70 M, h=1.20m (incluye tapa tipo rejilla marco en Angulo de 1 1/4" y varilla 1/2")	UN	2,000	$ 806.365,00	$ 1.612.730,00	2,00	$ 1.612.730,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.5	Construccion campo de Infiltracion en tuberia de filtro de d=4", encamisada con filtro no tejido	UN	1,000	$ 2.163.959,00	$ 2.163.959,00	1,00	$ 2.163.959,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.6	Filtro en gravilla tavada tamaño D=3/4",en altura de 0,5	IM3	8,000	$ 250.197,00	$ 2.001.576,00	8,00	$ 2.001.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
IV	CERRAMIENTO PTAR										
4.1	Excavacion en material comun H<2.00	IM3	14,000	$ 66.151,00	$ 926.114,00	14,00	$ 926.114,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2	Viga de cimentacion 15X25	ML	30,000	$ 122.805,00	$ 3.684.150,00	30,00	$ 3.684.150,00	0,00	$ 0,00	$0,00	$0,00
4.3	Suministro e instalación Cerramiento en malla eslabonada de h=2.00 metros.	ML	28,000	$ 162.662,00	$ 4.554.536,00	28,00	$ 4.554.536,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	Murete en concreto simple para cerramiento altura h=0.50 metros, E=0.12 m	M2	14,000	$ 234.690,00	$ 3.285.660,00	14,00	$ 3.285.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
4.5	Puerta En malla eslabonada de 2.00x1.00 en tubo galvanizado D=2"	UN	1,000	$ 724.196,00	$ 724.196,00	1,00	$ 724.196,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.6	Suministro e instalacion de tuberia galvanizada D=2, con altura 3.00 metros.	UN	12,000	$ 162.154,00	$ 1.945.848,00	12,00	$ 1.945.848,00		$ 0,00	0,00	$0,00
4.7	Columna en concreto de 0.20x0.20 en concreto de 3000 Psi, acero de 1/2 PDR60	ML	7,000	$ 211.975,00	$ 1.483.825,00	7,00	$ 1.483.825,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
V	MANTENIMIENTO DE POZOS DE INSPECCION Y RED DE ALCANTARILLADO				$ -						
5.1	Destaponamiento de tuberia D=8" con agua a presión a traves de Sistema Vactor o similar	ML	600,000	$ 37.014,00	$ 22.208.400,00	600,00	$ 22.208.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	CASERIO SAN ISIDRO INSPECCION UNION PENEYA										
ITEM	DESCRIPCION										
I	PRELIMINARES										
1.1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	M2	400,000	$ 8.100,00	$ 3.240.000,00	400,00	$ 3.240.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.2	Excavacion en material comun H<2.00	IM3	34,000	$ 96.710,00	$ 3.288.140,00	34,00	$ 3.288.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.3	Roceria, limpieza, retiro, paisajismo y disposicion final de material sobrante	IM3	180,000	$ 52.005,00	$ 9.360.900,00	180,00	$ 9.360.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ACTA FINAL DE 2025

Plazo inicial	DOS (02) MESES	FECHA PRESENTE ACTA	
Fecha Inicio	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	31/12/2025	
Fecha terminacion Inicial	03 DE ENERO DE 2026		
Fecha terminacion Ajustada	N/A		
Fecha de suspensión	N/A		
Fecha Reinicio	N/A	VALOR ACTA FINAL	
Adicion tiempo	N/A		
Adicion Presupuestal	N/A	$29.354.961,00	
Localizacion	Zona Rural municipio de la Montañita		

CONTRATO No.	199-SAMC-2025	Vr.Contrato Inicial	$266.316.904,00
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS	LOCALIZACION:	ZONA RURAL MUNICIPIO LA MONTAÑITA
INTERVENTORIA:	N/A	FECHA CONTRATO	20 DE OCTUBRE 2025
REP. LEGAL	JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	PLAZO ADICIONAL	N/A

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						CONDICIONES ACTUALES OBRA CONSTRUIDA				ACUMULADO FINAL	
						ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
II	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR)										
2,1	Pintura para tolva, barandas y escaleras	M2	51,938	$ 64.114,00	$ 3.329.952,00	51,94	$ 3.329.952,00	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
2,2	Mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, tipo compacto con capacidad de 0,5 LPS, incluye transporte, Suministro e instalacion de tuberia hidraulica y accesorios y electrica a 0 metros, suministro e instalacion de equipos electricos (tablero de mando, bomba y soplador) incluye tratamiento de desechos existentes.	UND	1,000	$ 48.137.043,00	$ 48.137.043,00	1,00	$ 48.137.043,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
III	MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN										
3,1	Suministro e instalación de cubierta metálica master mil calibre 28, color a sugerir.	M2	0,000	$ 139.497,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	Suministro e instalacion de Lavapatatos inoxidable Submontar 55x43 Cm Con Griferia Advance Salin Y Canastillacon sus	UND	1,000	$ 555.291,00	$ 555.291,00	1,00	$ 555.291,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3	Pintura en vinilo tipo 1	M2	84,000	$ 39.152,00	$ 3.288.768,00	84,00	$ 3.288.768,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,4	Pintura para ornamentacion metalica	M2	5,000	$ 54.112,00	$ 270.560,00	5,00	$ 270.560,00		$ 0,00		$0,00
3,5	Instalacion de lampara led de 18w a 110 v y cerradura de puerta	UND	1,000	$ 174.538,00	$ 174.538,00	1,00	$ 174.538,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
IV	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO				$ -	0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6"	ML	24,000	$ 73.745,00	$ 1.769.880,00	24,00	$ 1.769.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00
4,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6" perforada	ML	20,000	$ 87.580,00	$ 1.751.600,00	20,00	$ 1.751.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,3	suministro e instalacion de grava E= 0,25	M3	1,000	$ 660.047,00	$ 660.047,00	1,00	$ 660.047,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,4	suministro e instalacion de arena E= 0,10	M3	1,000	$ 560.529,00	$ 560.529,00	1,00	$ 560.529,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,5	Pintura para cubierta de lechos de secado	M2	12,250	$ 64.112,00	$ 785.372,00	12,25	$ 785.372,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
V	INSTALACION DE PORTON				$ -	0,00					
5,1	Suministro e instalacion de porton de 2x2, incluye transporte	UND	1,000	$ 1.433.874,00	$ 1.433.874,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.433.874,00	0,00	$ 0,00
5,2	Columna de 0,20x 0,20 incluye acero	ML	5,600	$ 252.570,00	$ 1.414.392,00	0,00	$ 0,00	5,60	$ 1.414.392,00	0,00	$ 0,00
VI	SISTEMA ELÉCTRICO		0,000		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,1	Acometida trifasica subterranea, suministro e instalacion de cofre de inspeccion para medidor y sistema puesta tierra, suministro e instalacion de Transformador de 10 KVA incluye sistema de proteccion, suministro e instalacion de acometida parcial tablero de distribucion de 12 circuitos en ducto de 1", suministro e instalacion de tablero de control para 2 motores a 110 v y 2 a 220 v con proteccion de rele y supresor de picos general con señales semi automatico, dos salidas de conexion electrica para motores, salida electrica a 110 vincluye transporte	UND	1,000	$ 18.976.984,00	$ 18.976.984,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 18.976.984,00	0,00	$ 0,00
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	$193.005.133,00		$ 178.179.883,00		$ 21.825.250,00		$0,00
				ADMINISTRACIÓN 28,50%	$56.431.463,00		$ 50.211.267,00	A	$ 6.220.196,00		$0,00
				IMPREVISTOS 1%	$1.980.051,00		$ 1.761.799,00	I	$ 218.252,00		$0,00
				UTILIDAD 5%	$9.900.257,00		$ 8.808.994,00	U	$ 1.091.263,00		$0,00
				VALOR TOTAL CONTRATO	$266.316.904,00		$ 236.961.943,00		$ 29.354.961,00		$0,00

DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ACTA FINAL DE 2025

				Plazo inicial	DOS (02) MESES	FECHA PRESENTE ACTA	
				Fecha Inicio	04 DE NOVIEMBRE DE 2025		
				Fecha terminacion inicial	03 DE ENERO DE 2026	31/12/2025	
				Fecha terminacion Ajustada	N/A		
				Fecha de suspensión	N/A		
CONTRATO No.	199-SAMC-2025	Vr.Contrato Inicial	$266.316.904,00	Fecha Reinicio	N/A		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ			Adicion tiempo	N/A	VALOR ACTA FINAL	
CONTRATISTA:	ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS	LOCALIZACION:	ZONA RURAL MUNICIPIO LA MONTAÑITA	Adicion Presupuestal	N/A	$29.354.961,00	
INTERVENTORIA:	N/A	FECHA CONTRATO	20 DE OCTUBRE 2025	Localizacion	Zona Rural muncipio de la Montañita		
REP. LEGAL	JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	PLAZO ADICIONAL	N/A				

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO						CONDICIONES ACTUALES OBRA CONSTRUIDA				ACUMULADO	
						ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL		FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATADO INICIALMENTE	$ 266.316.904,00
VALOR ADICIONES	-
VALOR TOTAL CONTRATO 100%	$ 266.316.904,00
BALANCE DE PAGOS	
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO	$ 133.158.452,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 236.961.943,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 29.354.961,00
VALOR EJECUTADO - ANTICIPO AMORTIZADO	$ 14.677.480,50
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,00
SUMA TOTAL CONTRATO ORIGINAL	$ 266.316.904,00

ESTADO DEL ANTICIPO	VR. ANTICIPO	VR DESCONTADO	% DESCONTADO	VR FALTANTE A DESCONTAR	% FALTANTE A DESCONTAR
VR. ANTICIPO - 50%	$ 133.158.452,00				
VR. AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	$ 118.480.971,50	$ 118.480.971,50	88,98%		
VR. AMORTIZADO FINAL	$ 14.677.480,50	$ 14.677.480,50	11,02%		
VR AMORTIZADO SEGÚN ACTAS	$ 133.158.452,00	$ 133.158.452,00	100,00%		
SALDO DEL CONTRATO POR AMORTIZAR				$ 0,00	0,00%

VALOR ACTA FINAL	$29.354.961,00
VALOR AMORTIZACION S/ANTICIPO	$14.677.480,50
SALDO A PAGAR A FAVOR CONTRATISTA	$14.677.480,50

VR. PRESENTE ACTA: $ 29.354.961,00	NETO A GIRAR:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/TE ($14.677.480,50)

TERESA DEL CARMEN CARBONÓ PACHECO
Supervisora de Obra
Secretaria de planeacion Municipal infraestructura y TIC

JORGE ANDRES MONCADA SUAZA
Rep Legal Firma Contratista
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

FEDERICO ALVIZ TRUJILLO
Vo/Bo
Alcalde municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA


DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA

MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	**ÍTEM:**	1,1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	**UNIDAD:**	M2

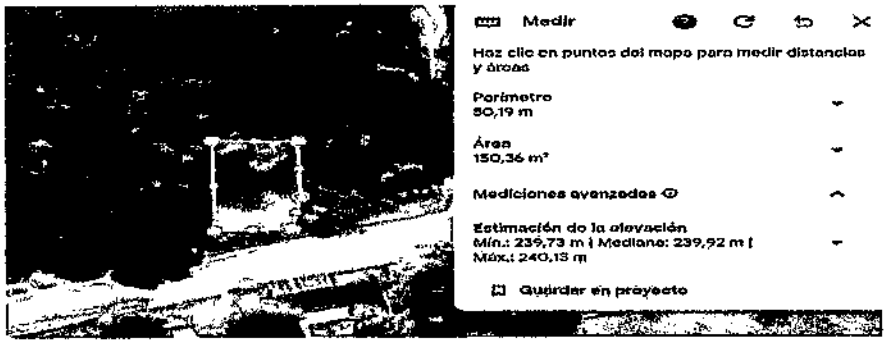

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
PTAR TRIUNFO	10		15		150,00

OBSERVACIONES:

Subtotal:	150,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	150,00


Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA

ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona


Apoyo Profesional

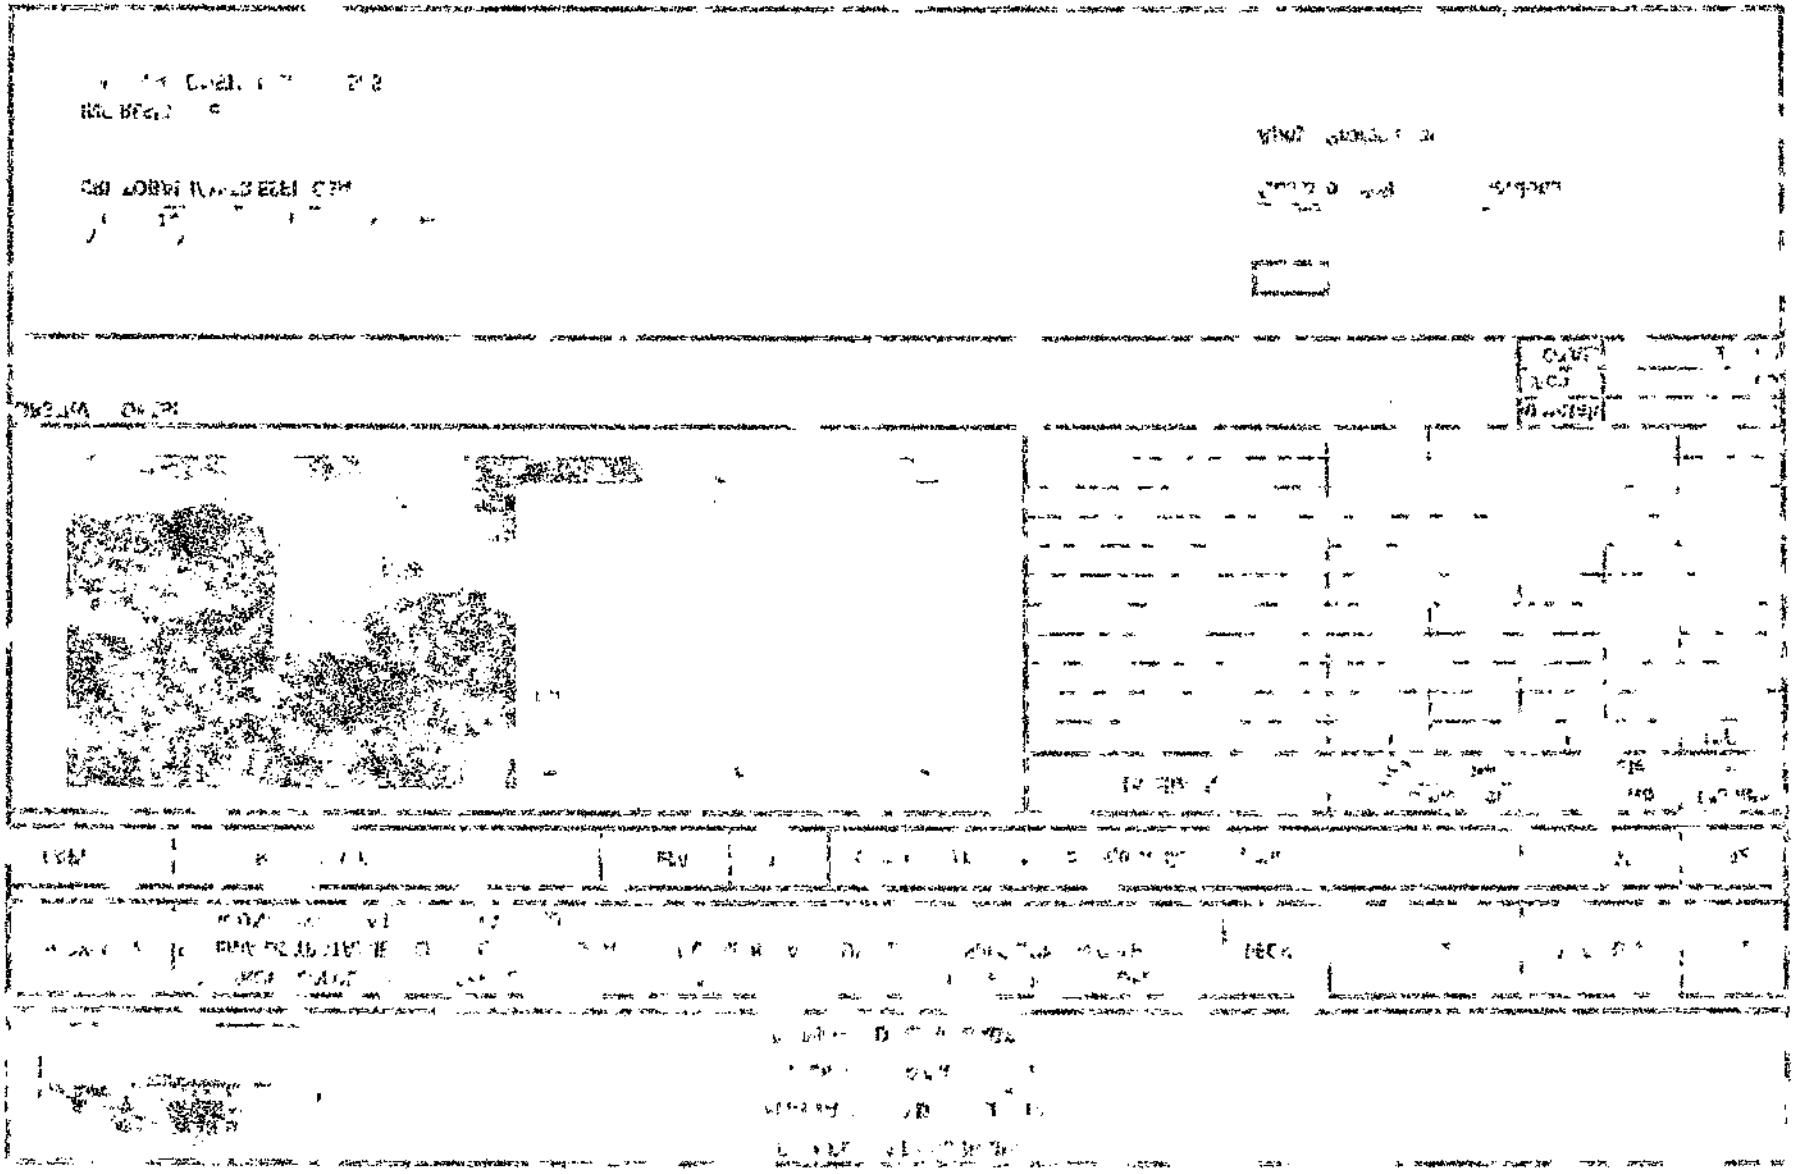


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	**ÍTEM:**	1.2	Excavacion en material comun H<2.00	**UNIDAD:**	M3

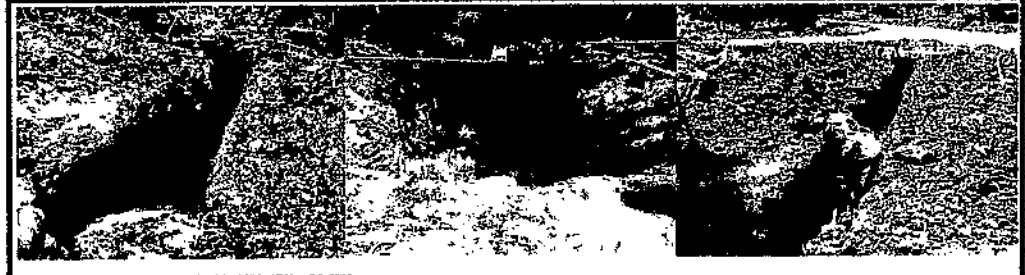

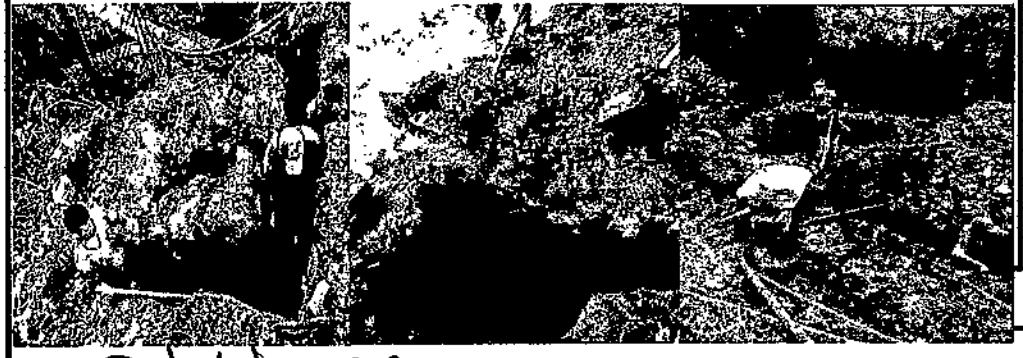

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
excavacion para tanque	4	2,5	10		100,00
excavacion tuberia filtro	15	0,4	0,3		1,80
excavacion caja de ispeccion	1	1	1	2	2,00
excavacion placa en concreto	2,2	0,1	5		1,10
excavacion capa vegetal existente	5	0,3	11		16,50
			Subtotal:		120,30
			TOTAL:		120,30


Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA

ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona


Apoyo Profesional

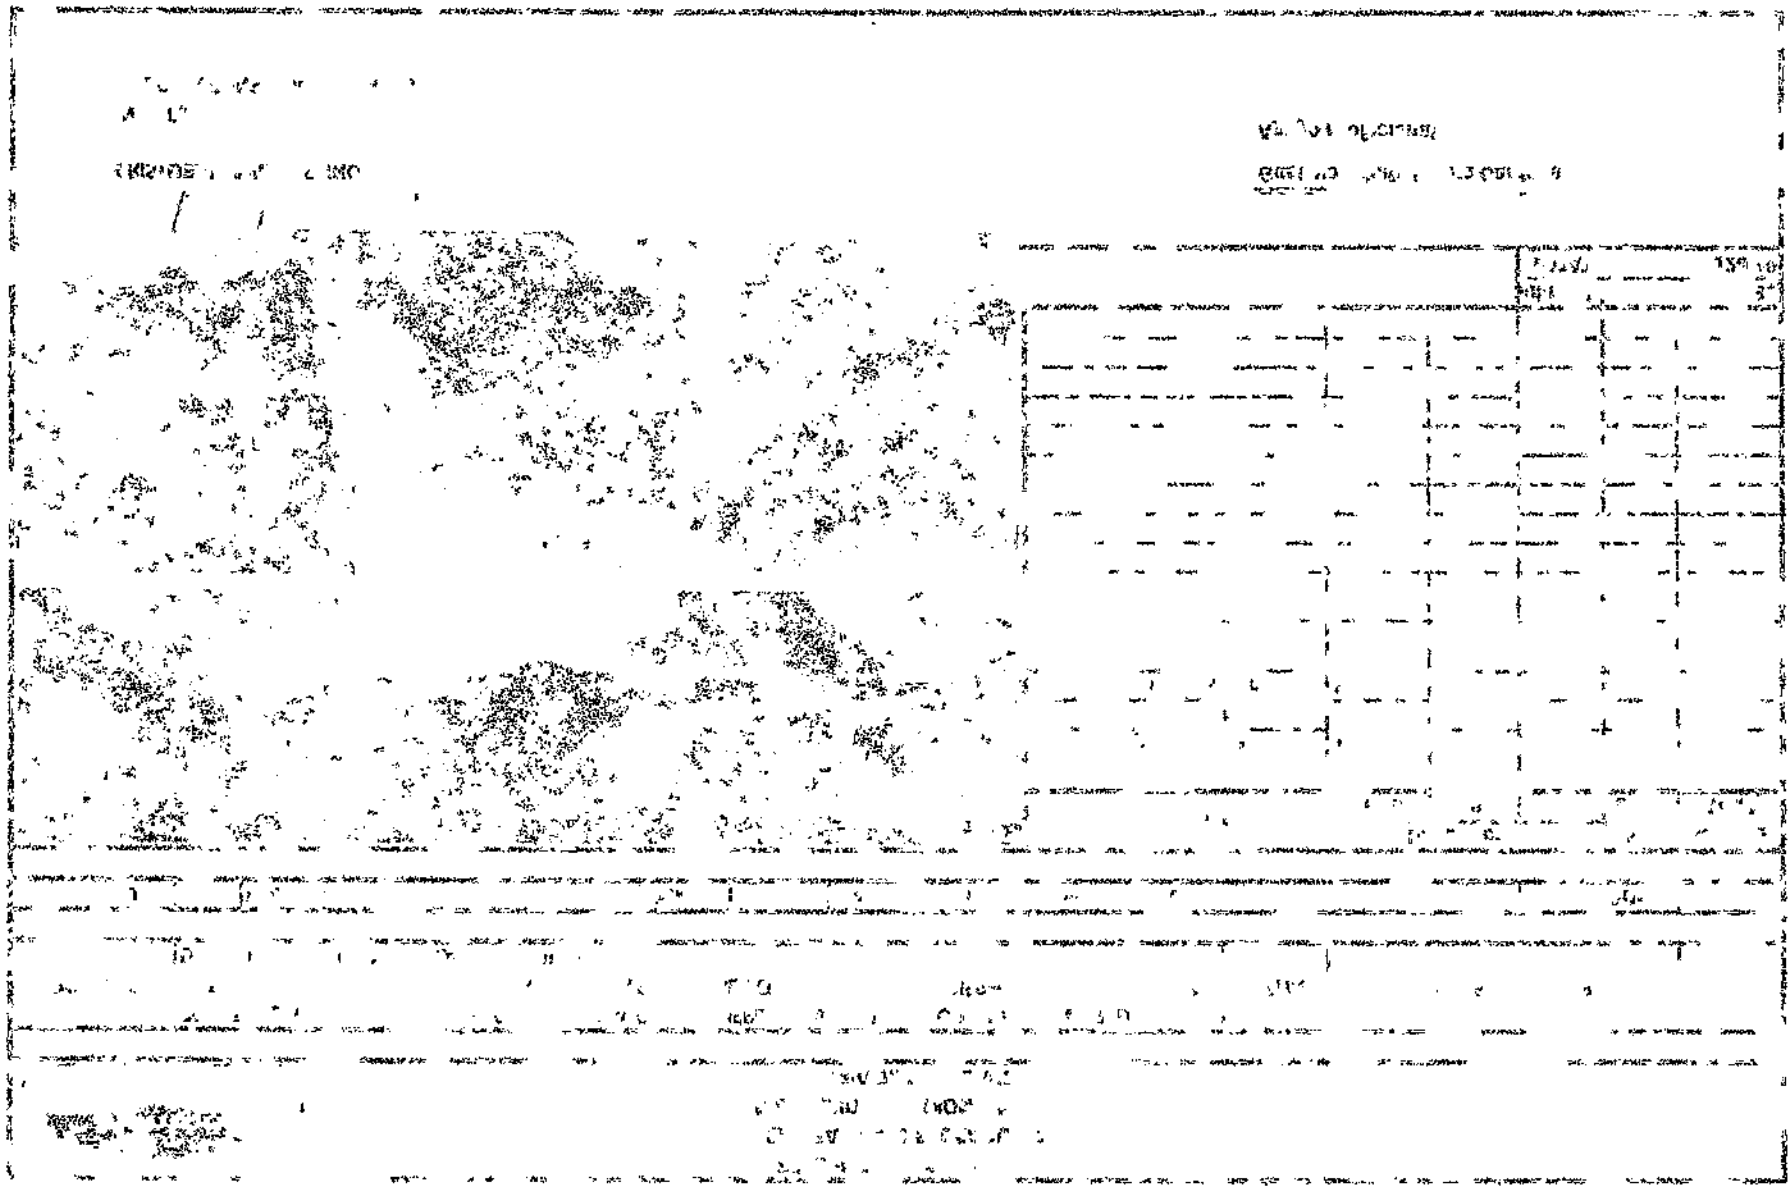


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	**ÍTEM:**	1,3	Rellenos con material de excavacion	**UNIDAD:**	M3

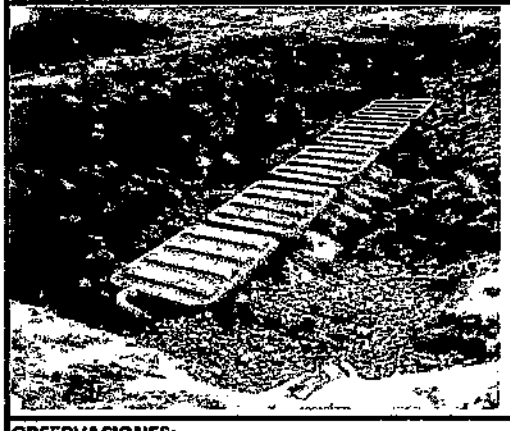

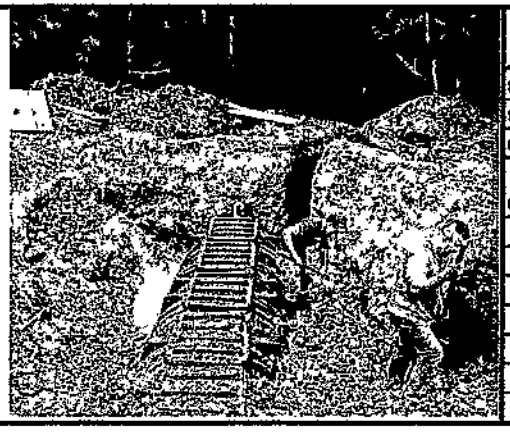

Localización	Dimensiones			AREA TUBO	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
relleno para tanque	3	1,5	10		45,00
relleno para tuberia filtro	15	0,5	0,3		2,25
relleno para caja de inspeccion	1	0,5	1	2	1
excavacion placa en concreto	2,2	0,5	7		7,7

OBSERVACIONES:

Subtotal:	55,95
Vienen:	0,00
TOTAL:	55,95

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE

ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	2	DEMOLICIONES	**ÍTEM:**	2	Demolicion de estructura Existente	**UNIDAD:**	UND



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
demolicion estructura existente					1,00

OBSERVACIONES:

Subtotal:	1,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA

ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona

Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	2	DEMOLICIONES	**ÍTEM:**	2,1	Retiro de material sobrante	**UNIDAD:**	M2



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
material sobrante	7,00	2,20	2,00		31
	25,00	0,30	0,40		3
	1,00	0,90	0,90		1
	7,00	2,20	0,10		2
	5,00	4,00	0,30		6

OBSERVACIONES:

Subtotal:	42,15
Vienen:	0,00
TOTAL:	42,15

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA

ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona


Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	SISTEMA PTAR	**ÍTEM:**	3,1	Suministro e intalacion de sistema séptico integrado (Recamara septica de 8750L + Recamara FAFA 3750 L) = 12500 Litros	**UNIDAD:**	UND



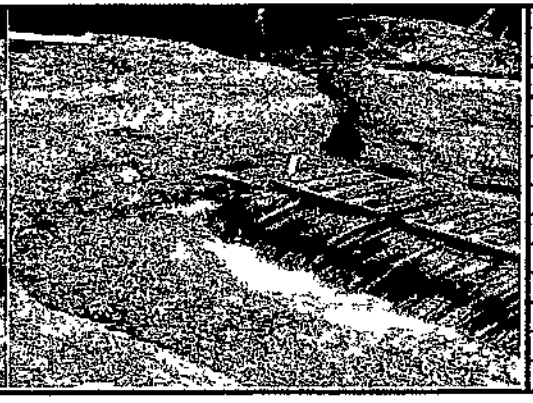

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
Tanque septico 12500 litros					1

OBSERVACIONES:

Subtotal:	1,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	SISTEMA PTAR	**ÍTEM:**	3,2	Suministro e instalacion tuberia con filtro de D=4"	**UNIDAD:**	ML



Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
Suministro e instalacion tuberia con filtro de D=4"					25


OBSERVACIONES:

Subtotal:	25,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	25,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

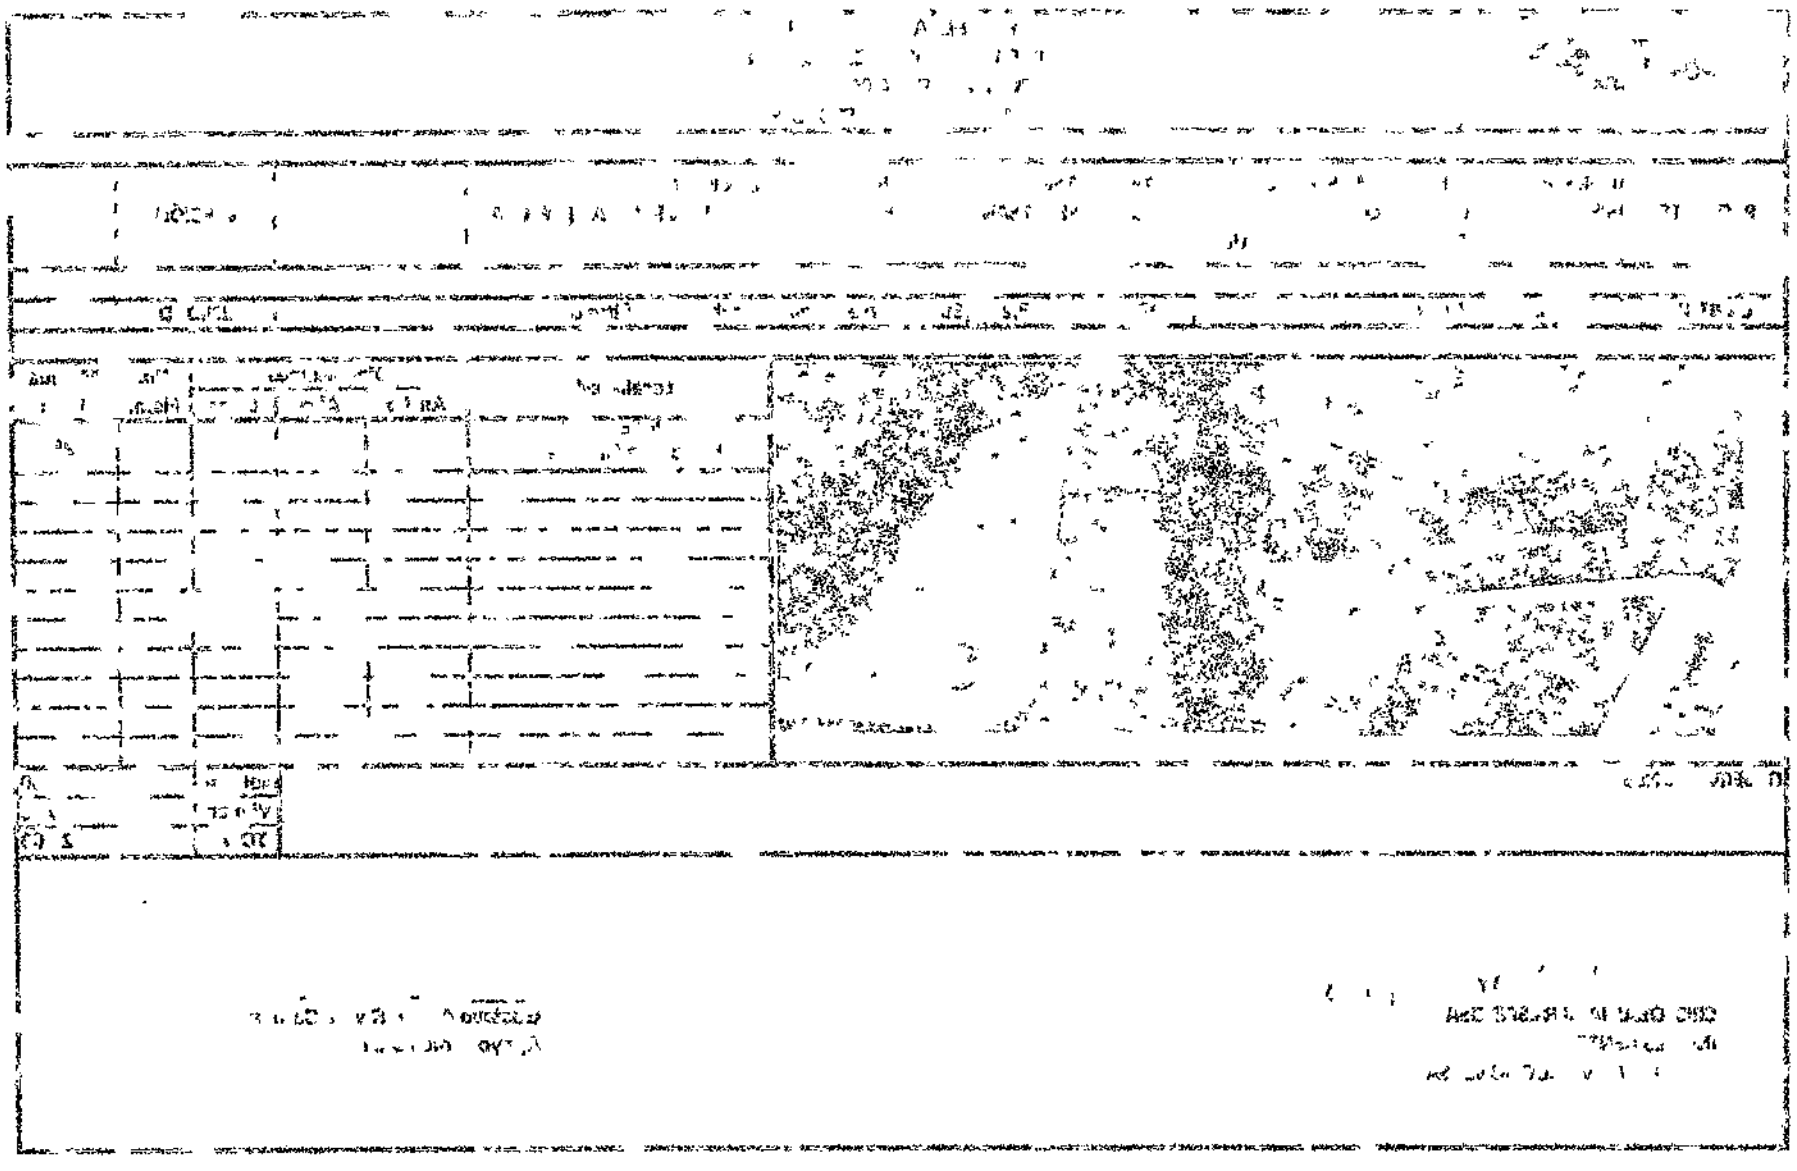

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	SISTEMA PTAR	**ÍTEM:**	3,3	Placa piso E=0.10M R-21MPA con malla electrosoldada para soporte del tanque septico integrado de 12500 Lt	**UNIDAD:**	M2



Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
placa piso tanque	3,00		5,00		15


OBSERVACIONES:

Subtotal:	15,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	**15,00**

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

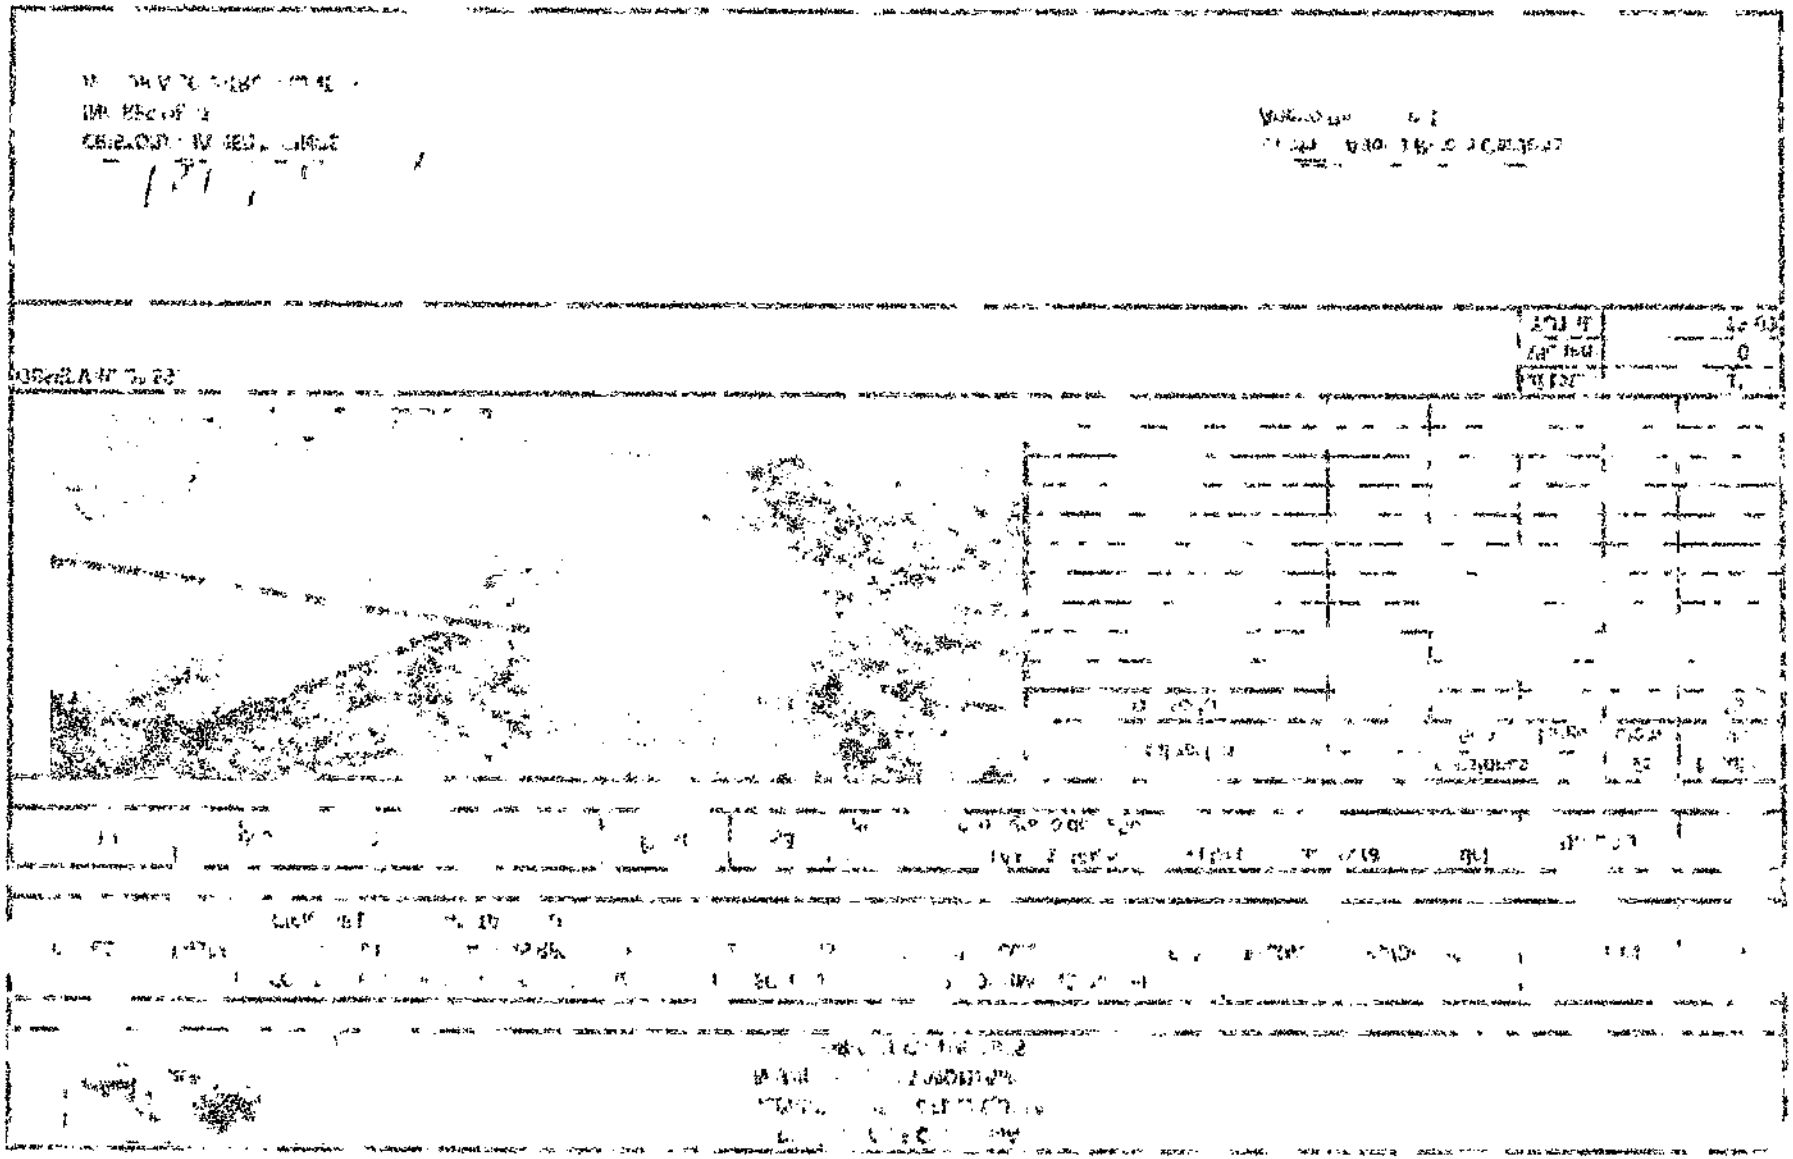

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCION DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	SISTEMA PTAR	**ÍTEM:**	3,4	Caja de Inspección Concreto 3000PSI reforzada de 0,70 x 0,70 M, h=1.20m (incluye tapa tipo rejilla marco en Angulo de 1 1/4" y varilla 1/2")	**UNIDAD:**	UND



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
Caja de inspeccion					2

OBSERVACIONES:

Subtotal:	2,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	**2,00**

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	SISTEMA PTAR	**ÍTEM:**	3,5	Construccion campo de infiltracion en tuberia de filtro de d=4", encamisada con filtro no tejido	**UNIDAD:**	UND





Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
Campo de filtracion					1


OBSERVACIONES:

Subtotal:	1,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

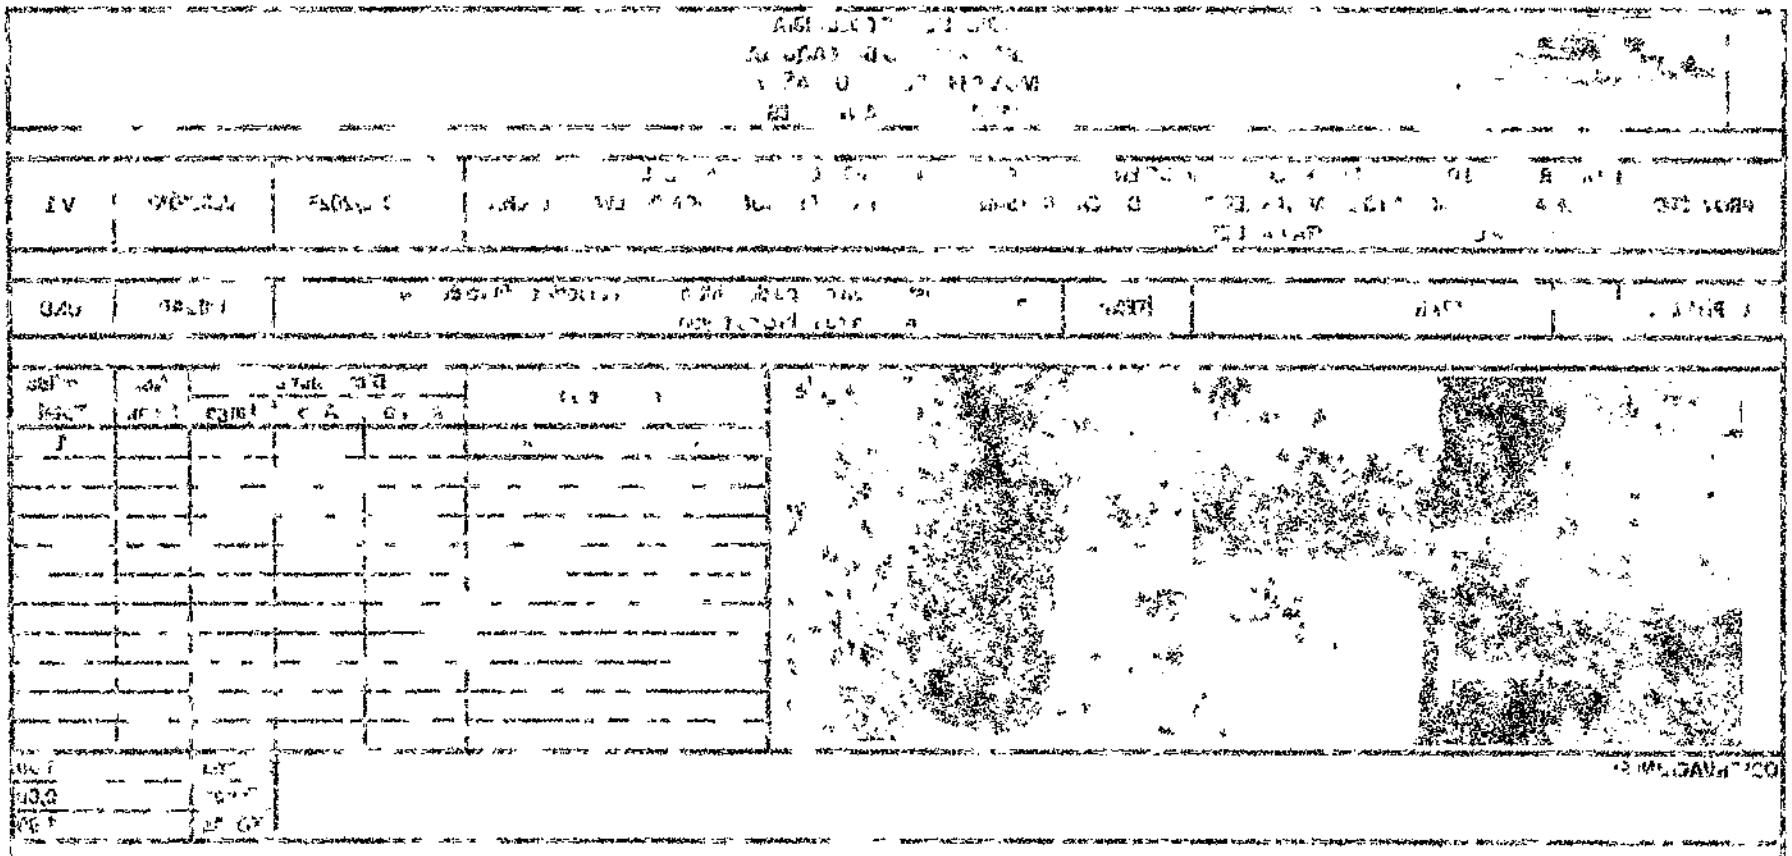

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	SISTEMA PTAR	**ÍTEM:**	3,6	Filtro en gravilla lavada tamaño D=3/4",en altura de 0,5	**UNIDAD:**	M3

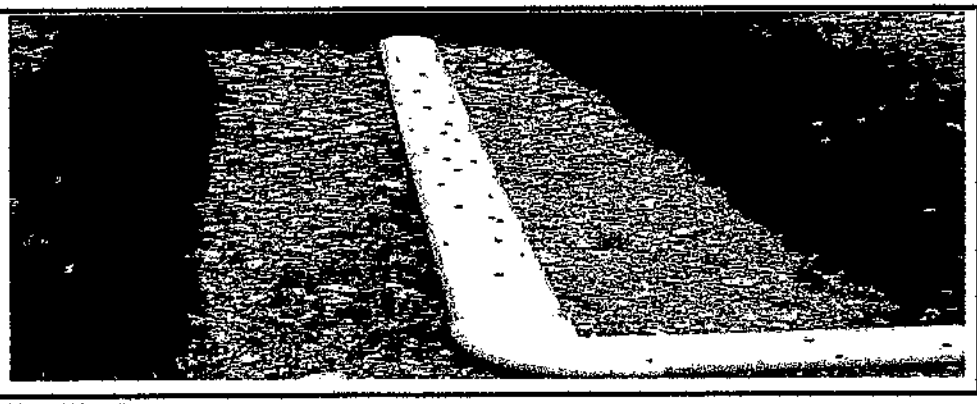

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
Gravilla	0,6	0,4	16		4
	0,60	0,50	6,00		2
	0,60	0,50	4,00		1
	0,60	0,50	4,00		1
					0


OBSERVACIONES:

Subtotal:	8,04
Vienen:	0,00
TOTAL:	**8,04**

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

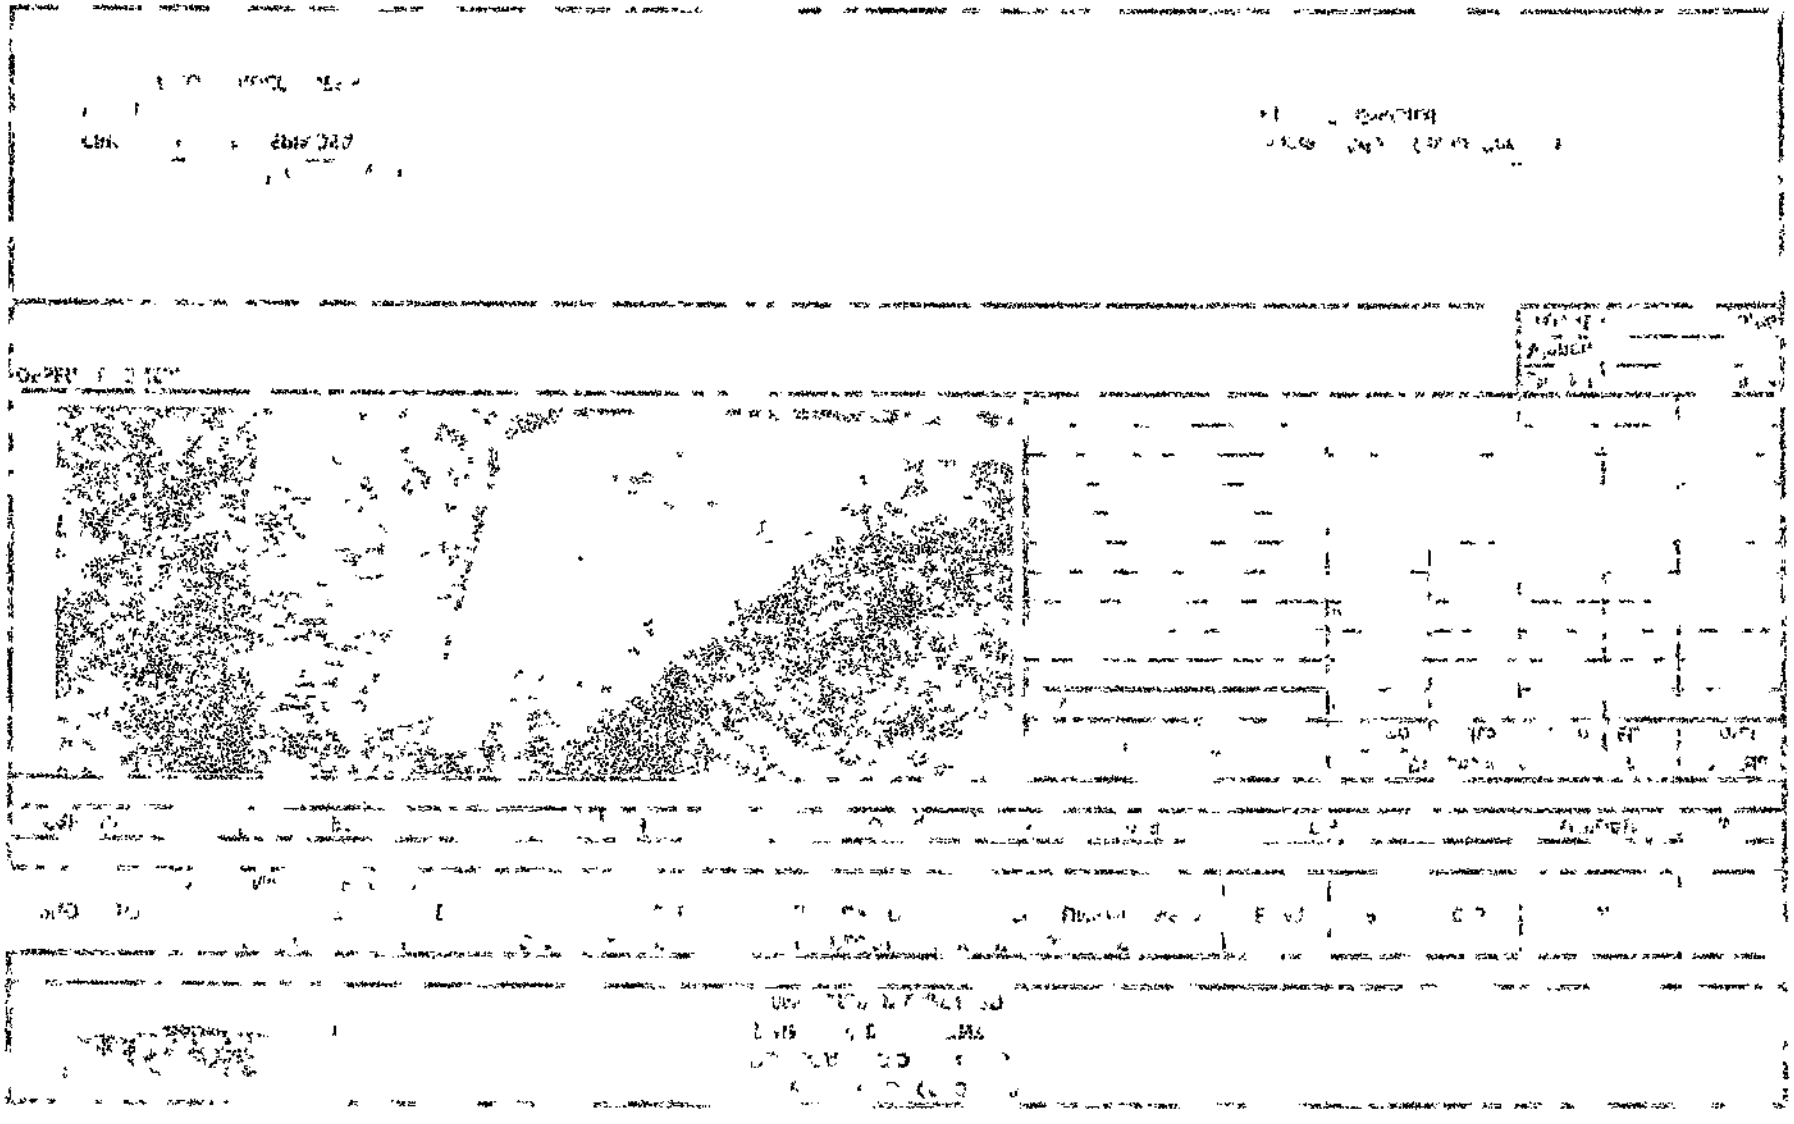

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	4	CERRAMIENTO PTAR	ÍTEM:	4,1	Excavacion en material comun H<2.00	UNIDAD:	M3

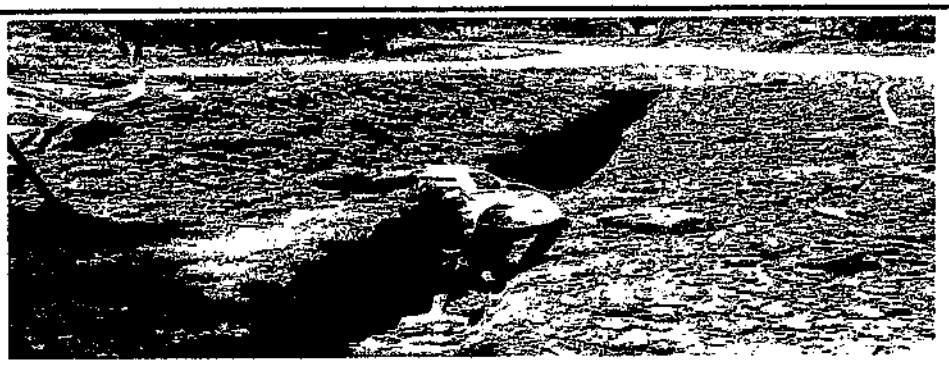


Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
cimentacion	0,6	0,4	30		7
zapatas	0,80	0,40	0,80	4,00	1
sobre excavacion	0,6	0,4	24		6

OBSERVACIONES:

Subtotal:	14,0
Vienen:	0,0
TOTAL:	14,0

Cristobal Javier Espinosa
CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

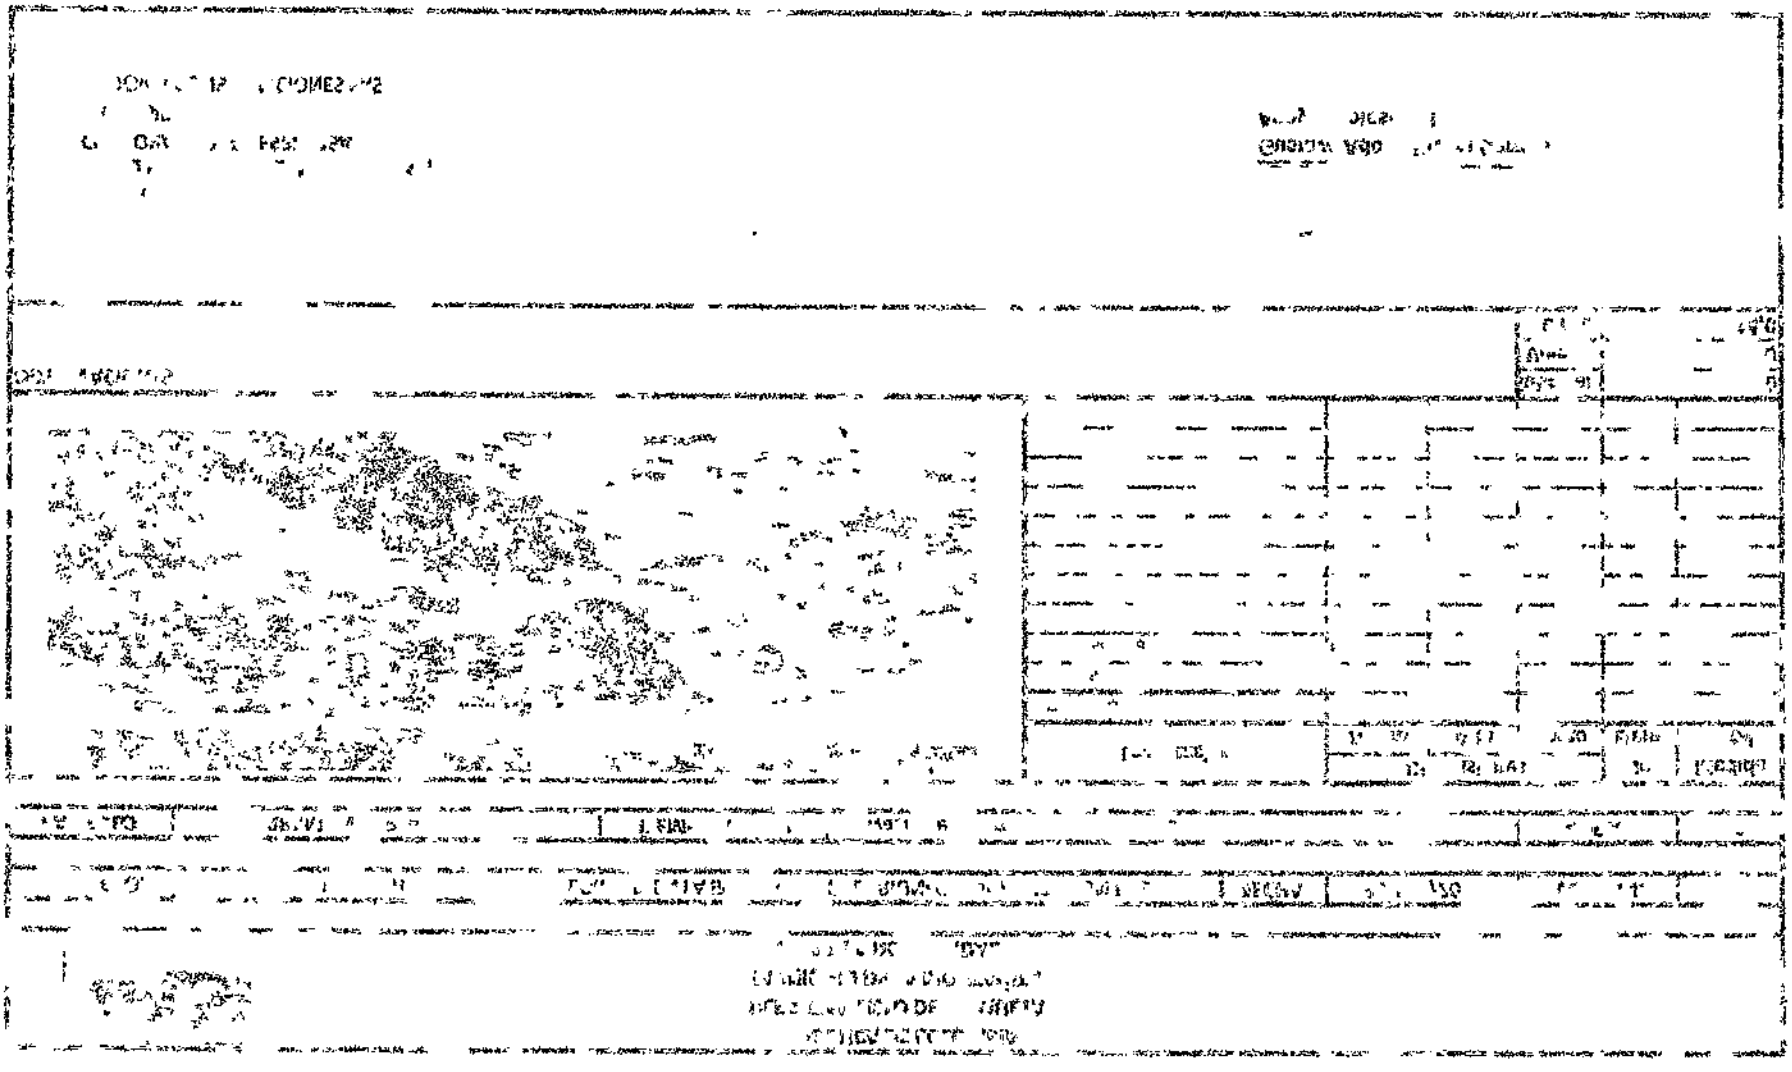

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	4	CERRAMIENTO PTAR	ÍTEM:	4,2	Viga de cimentacion 15X25	UNIDAD:	ML

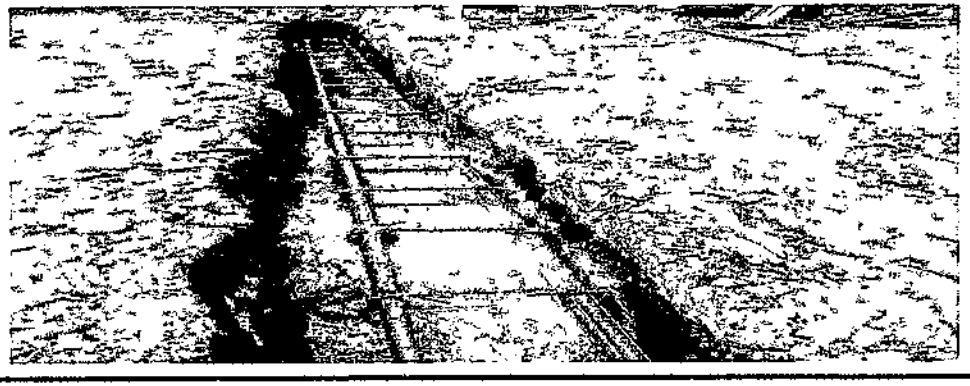

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
cimentacion					30

OBSERVACIONES:

Subtotal:	30,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	30,00


Cristobal Javier Espinosa
CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	4	CERRAMIENTO PTAR	ÍTEM:	4,3	Suministro e instalación Cerramiento en malla eslabonada de h=2.00	UNIDAD:	ML

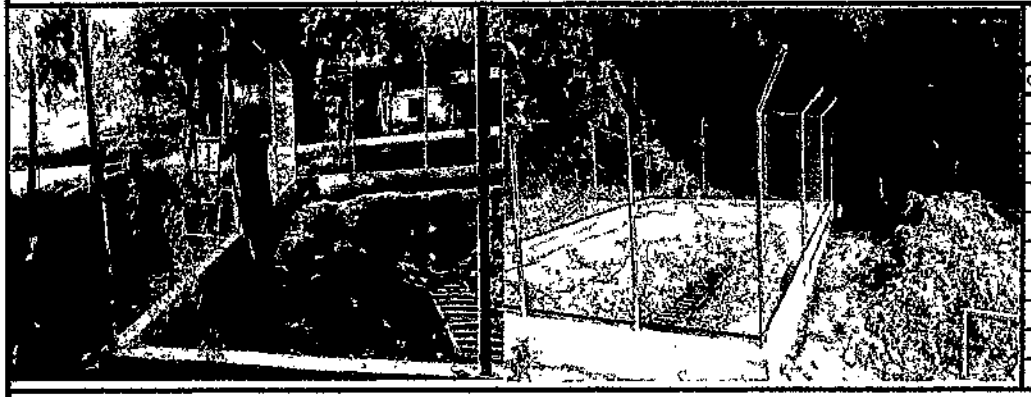

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
cerramiento malla eslabonada					30

OBSERVACIONES:


Subtotal:	30,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	30,00

Cristobal Javier Espinosa
CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL				**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:** V.1
CAPÍTULO:	4	CERRAMIENTO PTAR	**ÍTEM:**	4,4	Murete en concreto simple para cerramiento altura h=0.50 metros, E=0.12	**UNIDAD:**	M2

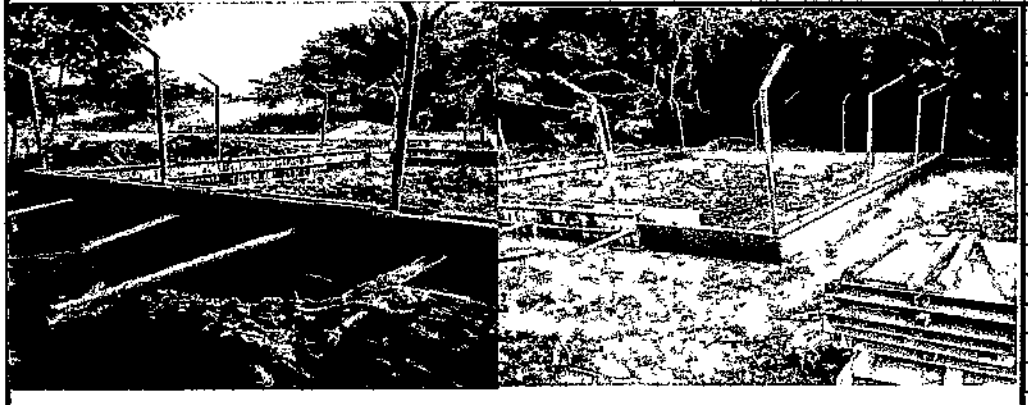

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
cerramiento altura h=0.50 metros,		28	0,5		14


OBSERVACIONES:

Subtotal:	14,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	14,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

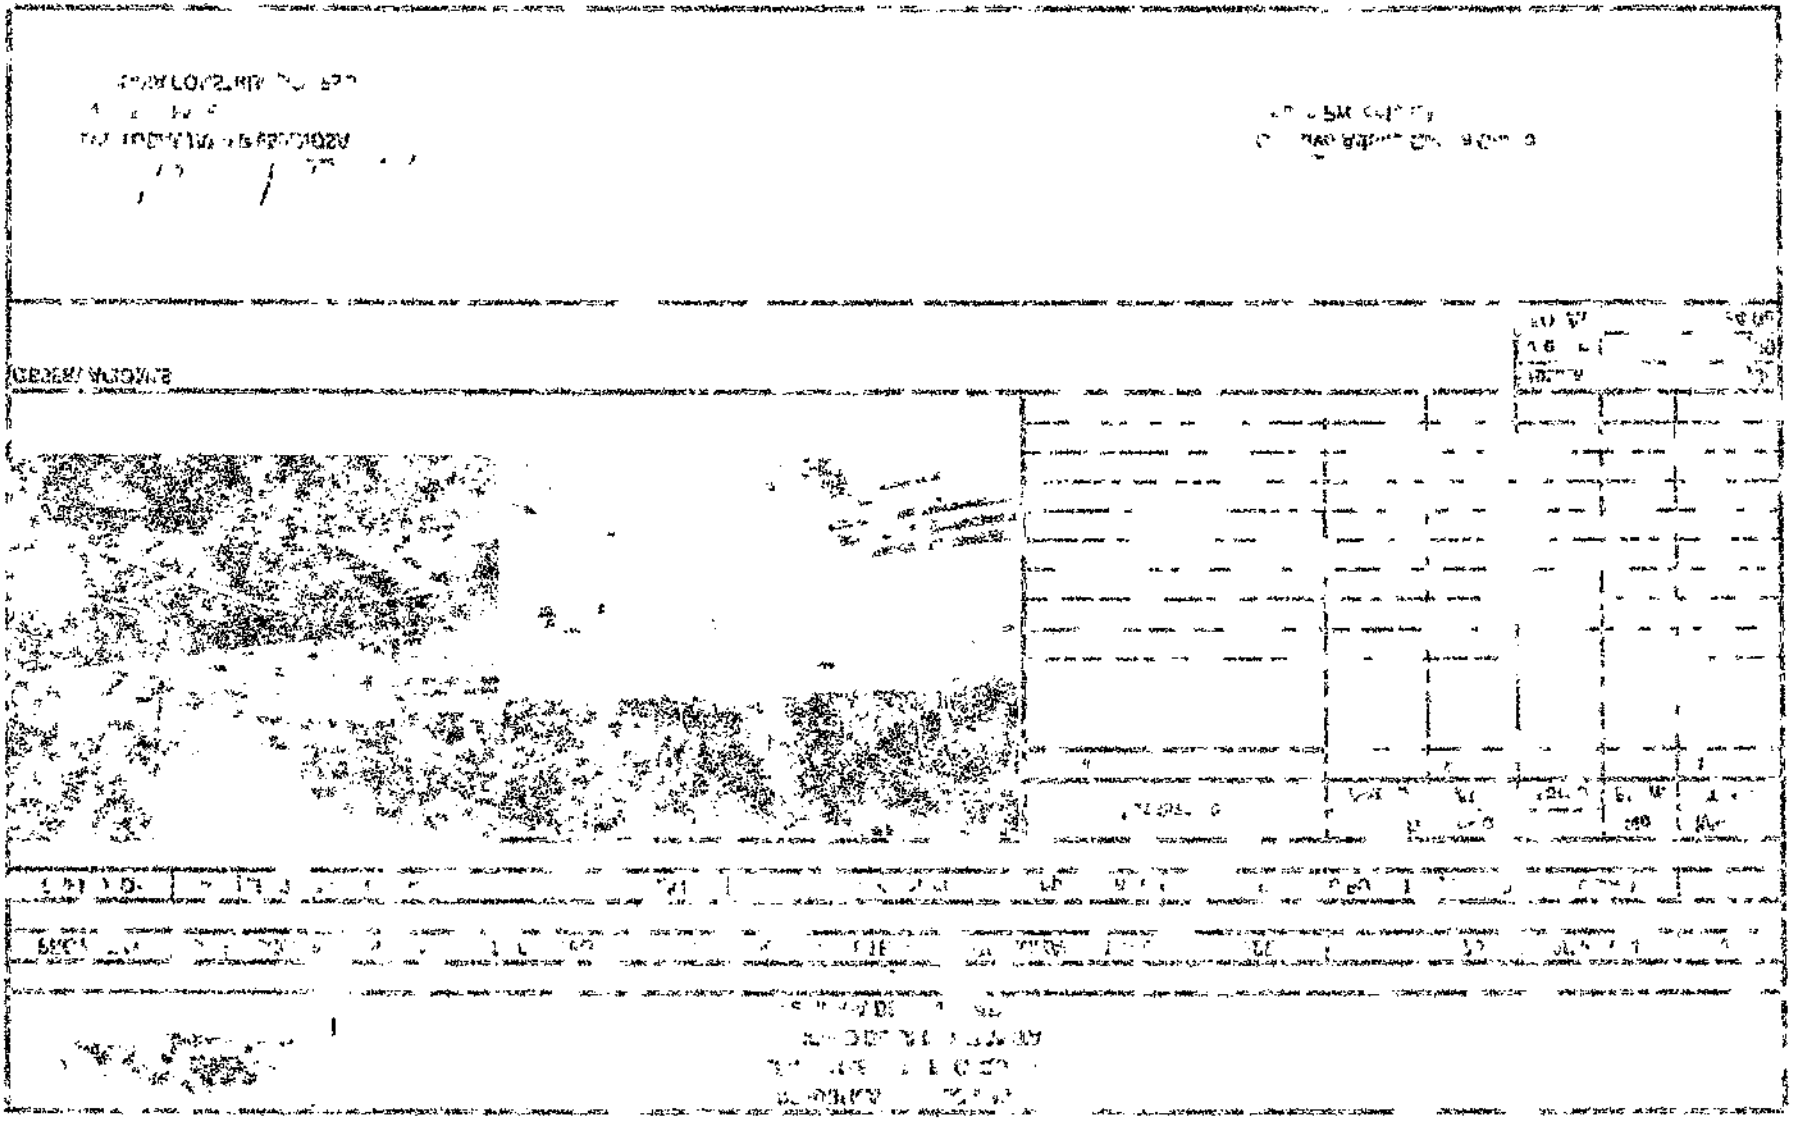


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	4	CERRAMIENTO PTAR	ÍTEM:	4,5	Puerta En malla eslabonada de 2.00x1.00 en tubo galvanizado D=2"	UNIDAD:	UND

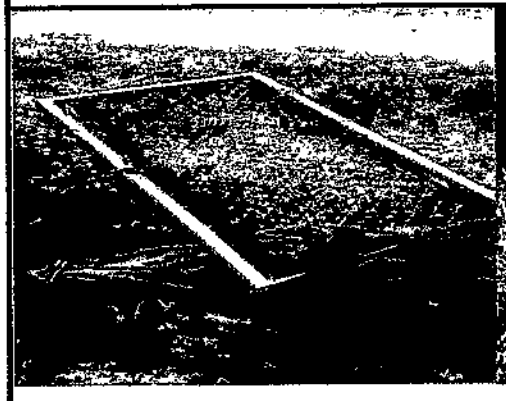

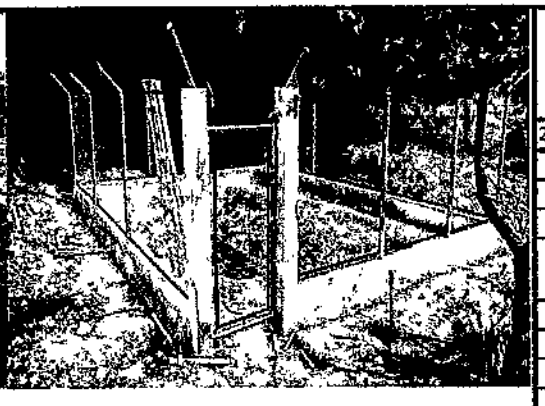


Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
2.00x1.00 en tubo galvanizado D=2"					1

OBSERVACIONES:

Subtotal:	1,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa
CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

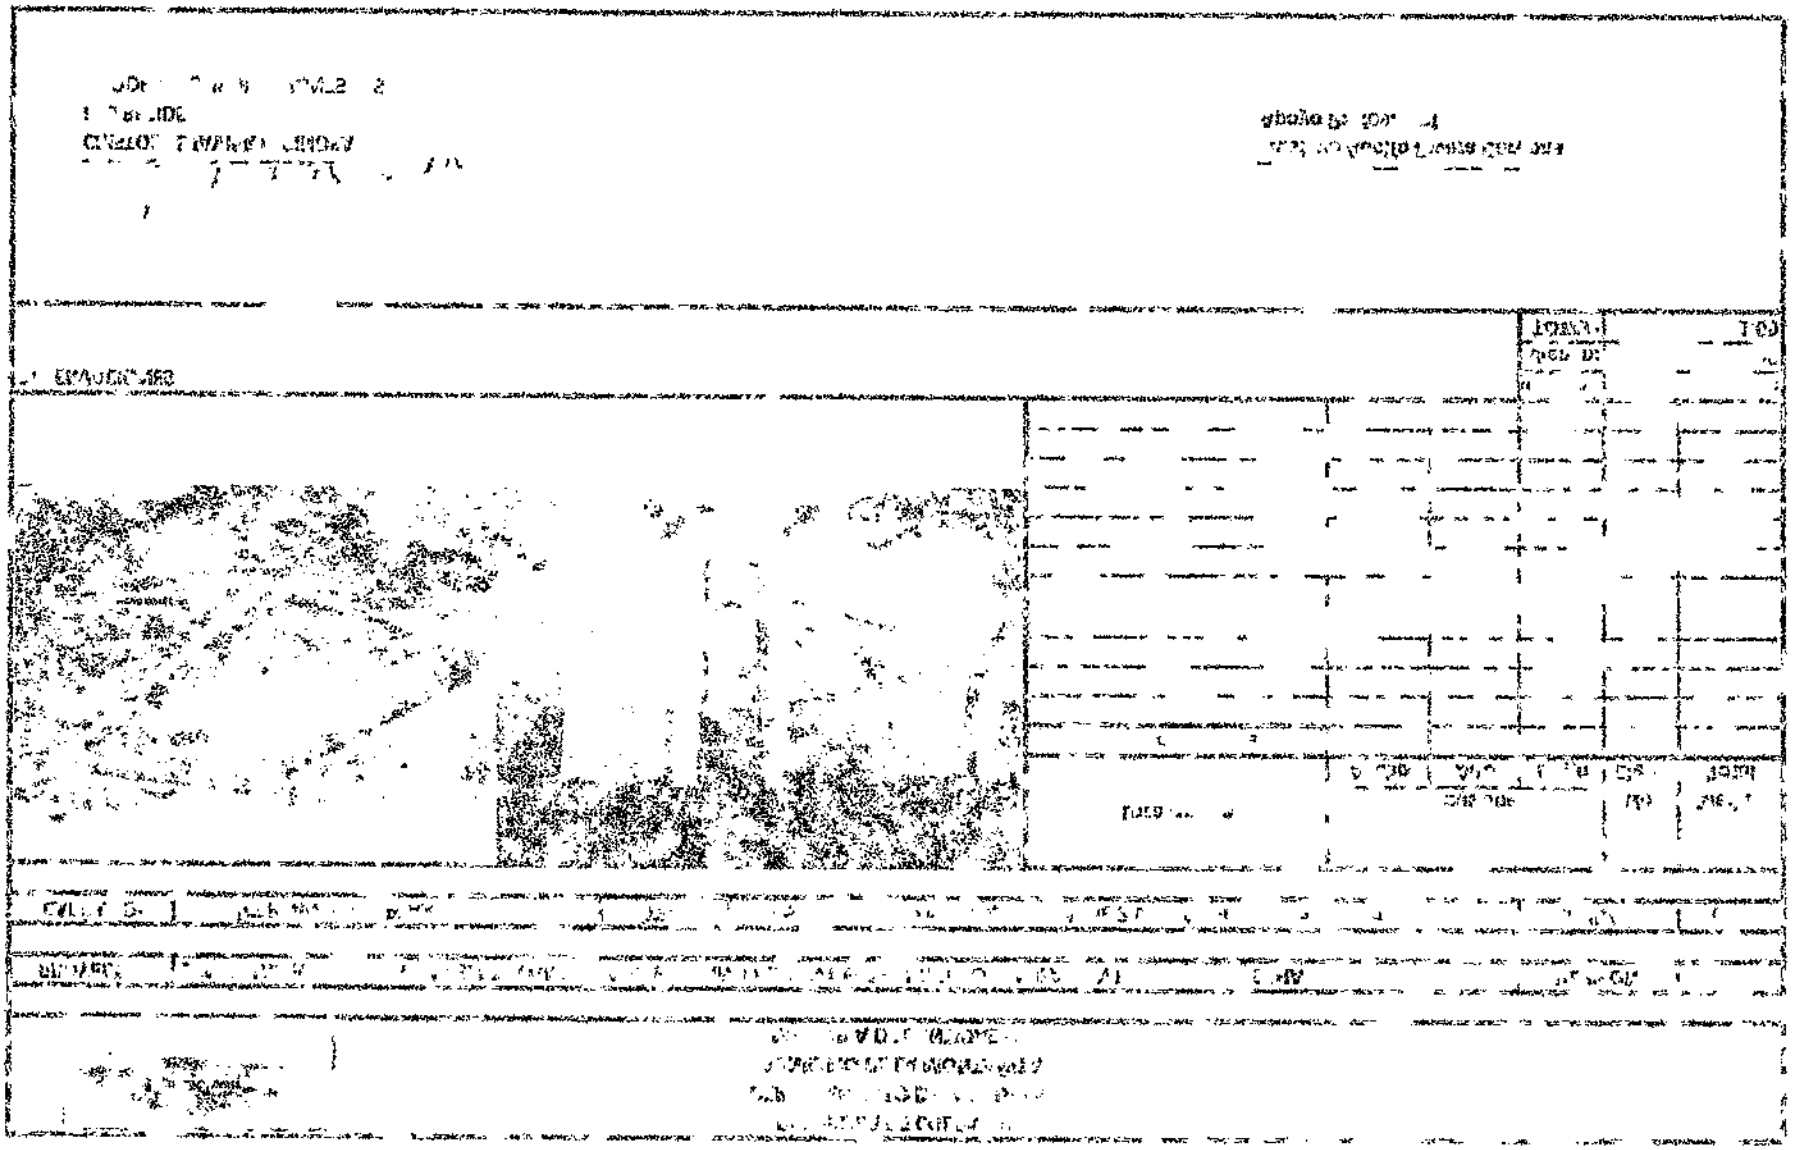


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	4	CERRAMIENTO PTAR	ÍTEM:	4,6	Suministro e Instalacion de tuberia galvanizada D=2, con altura 3.00	UNIDAD:	UND

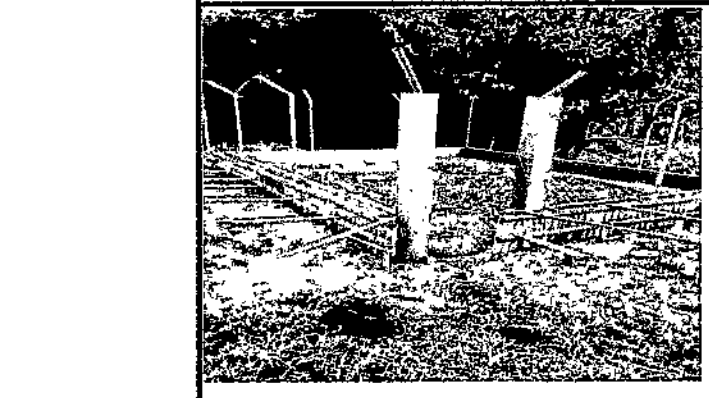

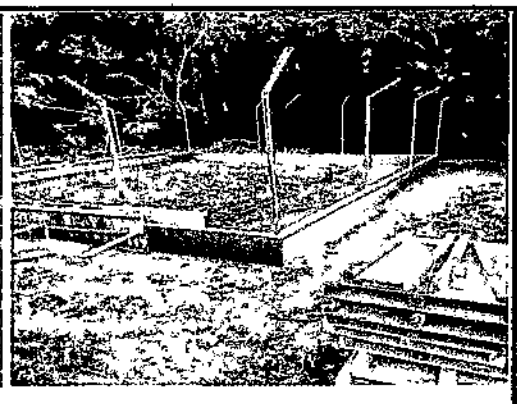

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
galvanizada D=2, con altura 3.00					12


OBSERVACIONES:

Subtotal:	12,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	12,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

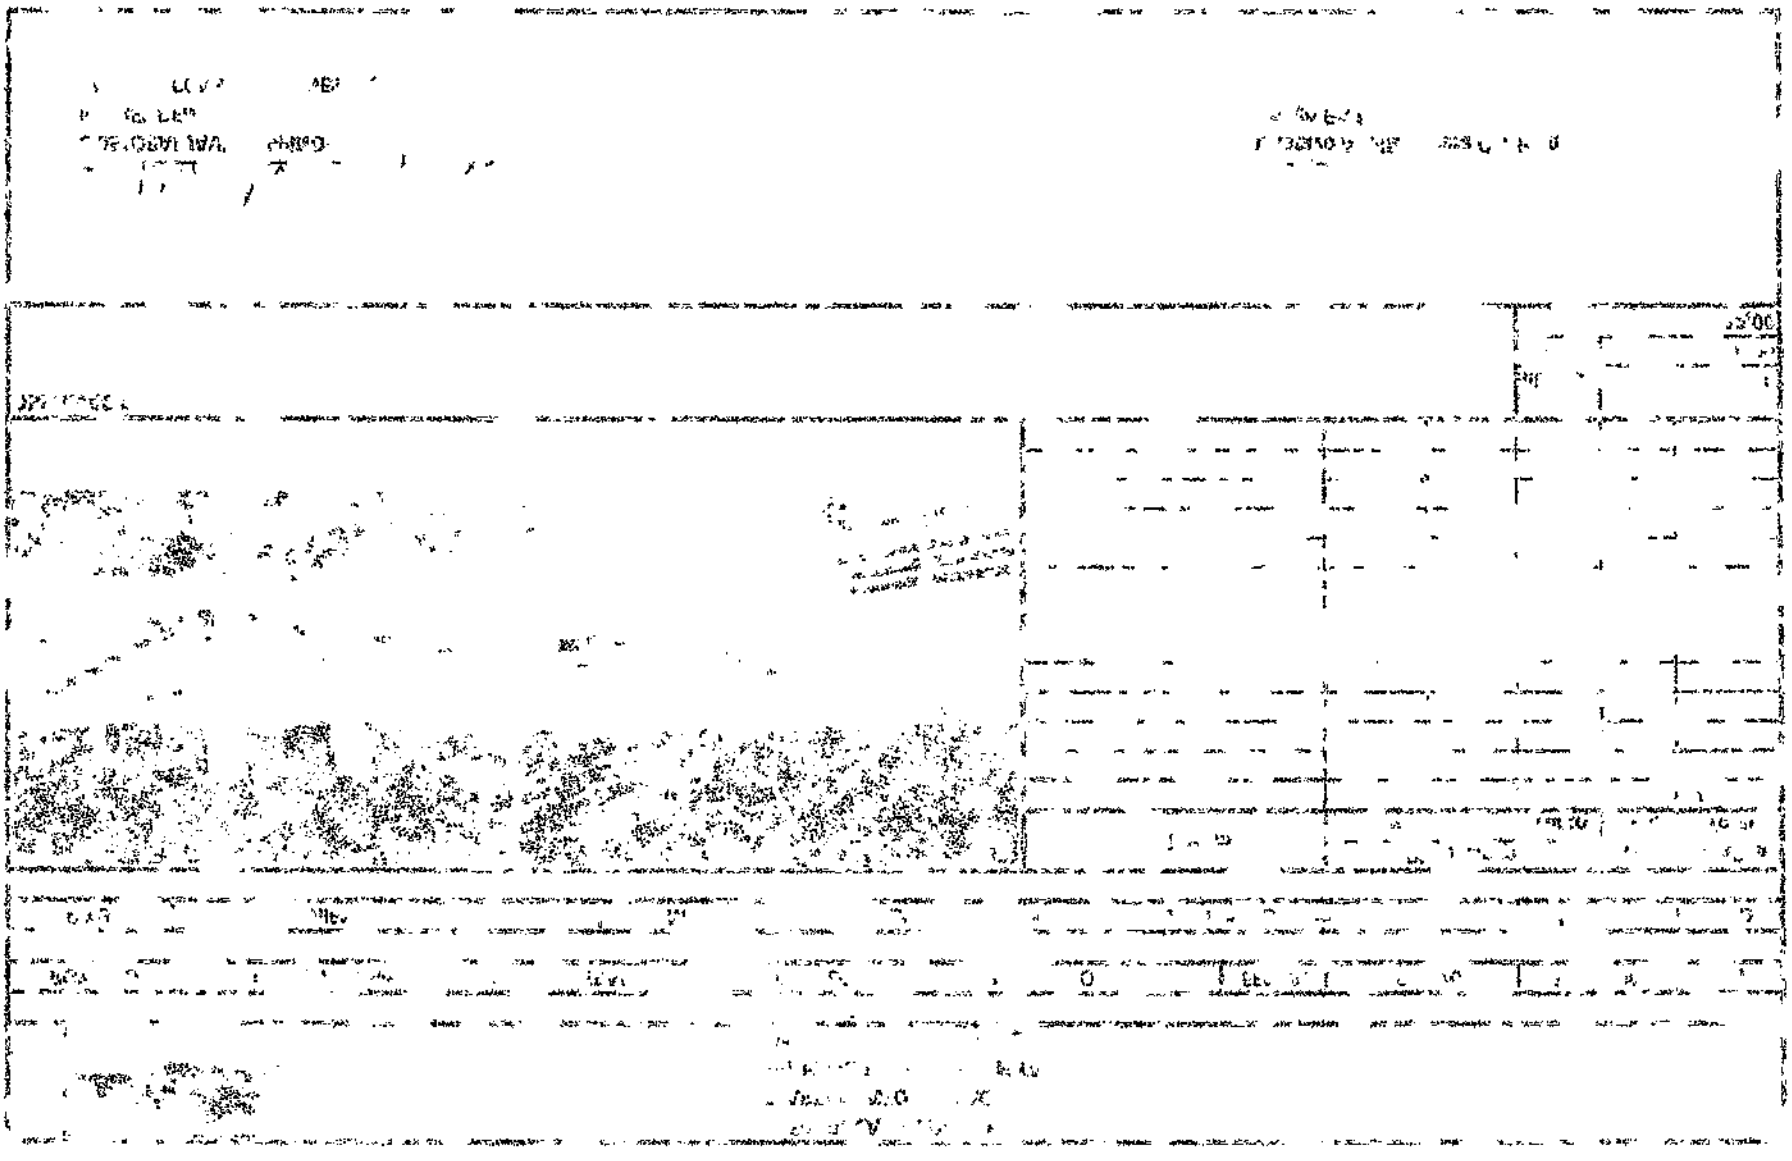

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	4	CERRAMIENTO PTAR	ÍTEM:	4,7	Columna en concreto de 0.20x0.20 en concreto de 3000 Psi, acero de 1/2	UNIDAD:	ML

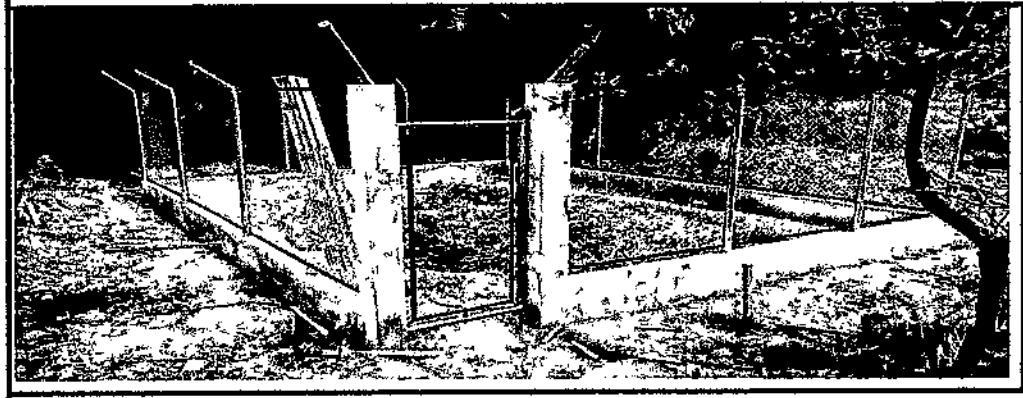

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
en concreto de 3000 Psi, acero de					7

Subtotal:	7,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	7,00

OBSERVACIONES:

Cristobal Javier Espinosa


CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	5	MANTENIMIENTO DE POZOS DE	ÍTEM:	5,1	Destaponamiento de tubería D=8" con agua a presión a traves de Sistema	UNIDAD:	ML

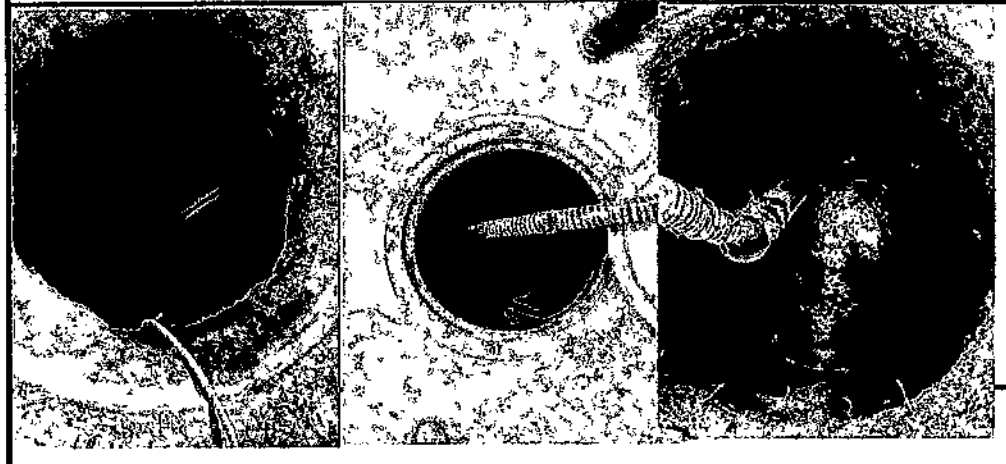

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
con agua a presión a traves de					600

Subtotal:	600,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	600,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

SAN ISIDRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	ÍTEM:	1,1	Localizacion y replanteo con equipo de topografia	UNIDAD:	M2



Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
Localización	20		20		400
			TOTAL:		400,00

Cristobal Javier Espinosa
CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA

ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona

Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	FECHA:	30/Dec/2025	VERSIÓN:	V.1

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	ÍTEM:	1,2	Excavacion en material comun H<2.00	UNIDAD:	M3





Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
	2,50	2,00	6,80		34

OBSERVACIONES:

Subtotal:	34,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	34,00


Cristobal Javier Espinosa
CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	**ÍTEM:**	1,3	Roceria, limpieza, retiro, paisajismo y disposicion final de material	**UNIDAD:**	M3

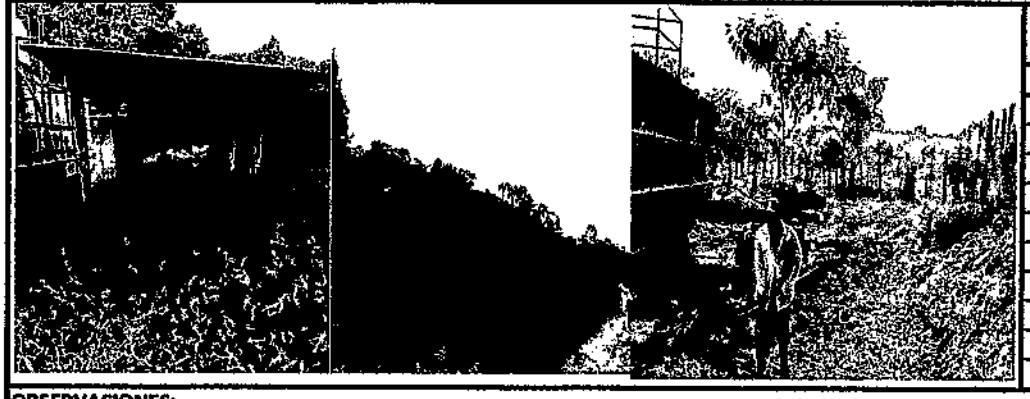

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
	9,00	2,00	10,00		180

OBSERVACIONES:

Subtotal:	180,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	180,00


CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	2	PRELIMINARES	**ÍTEM:**	2,1	Pintura para tolva, barandas y escaleras	**UNIDAD:**	M2

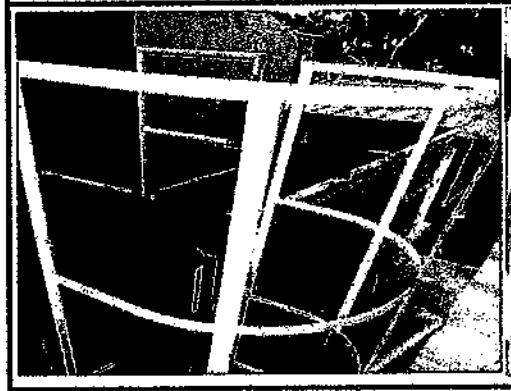

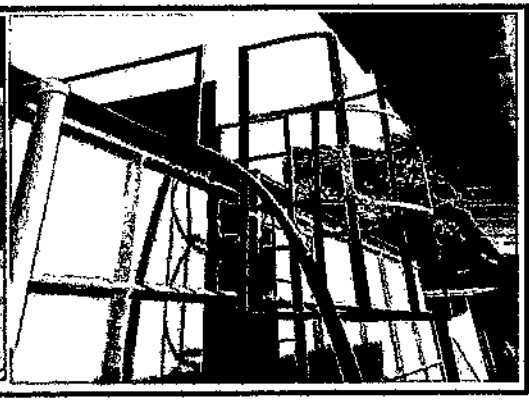

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
	7,00		7,00		49


OBSERVACIONES:

Subtotal:	49,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	49,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

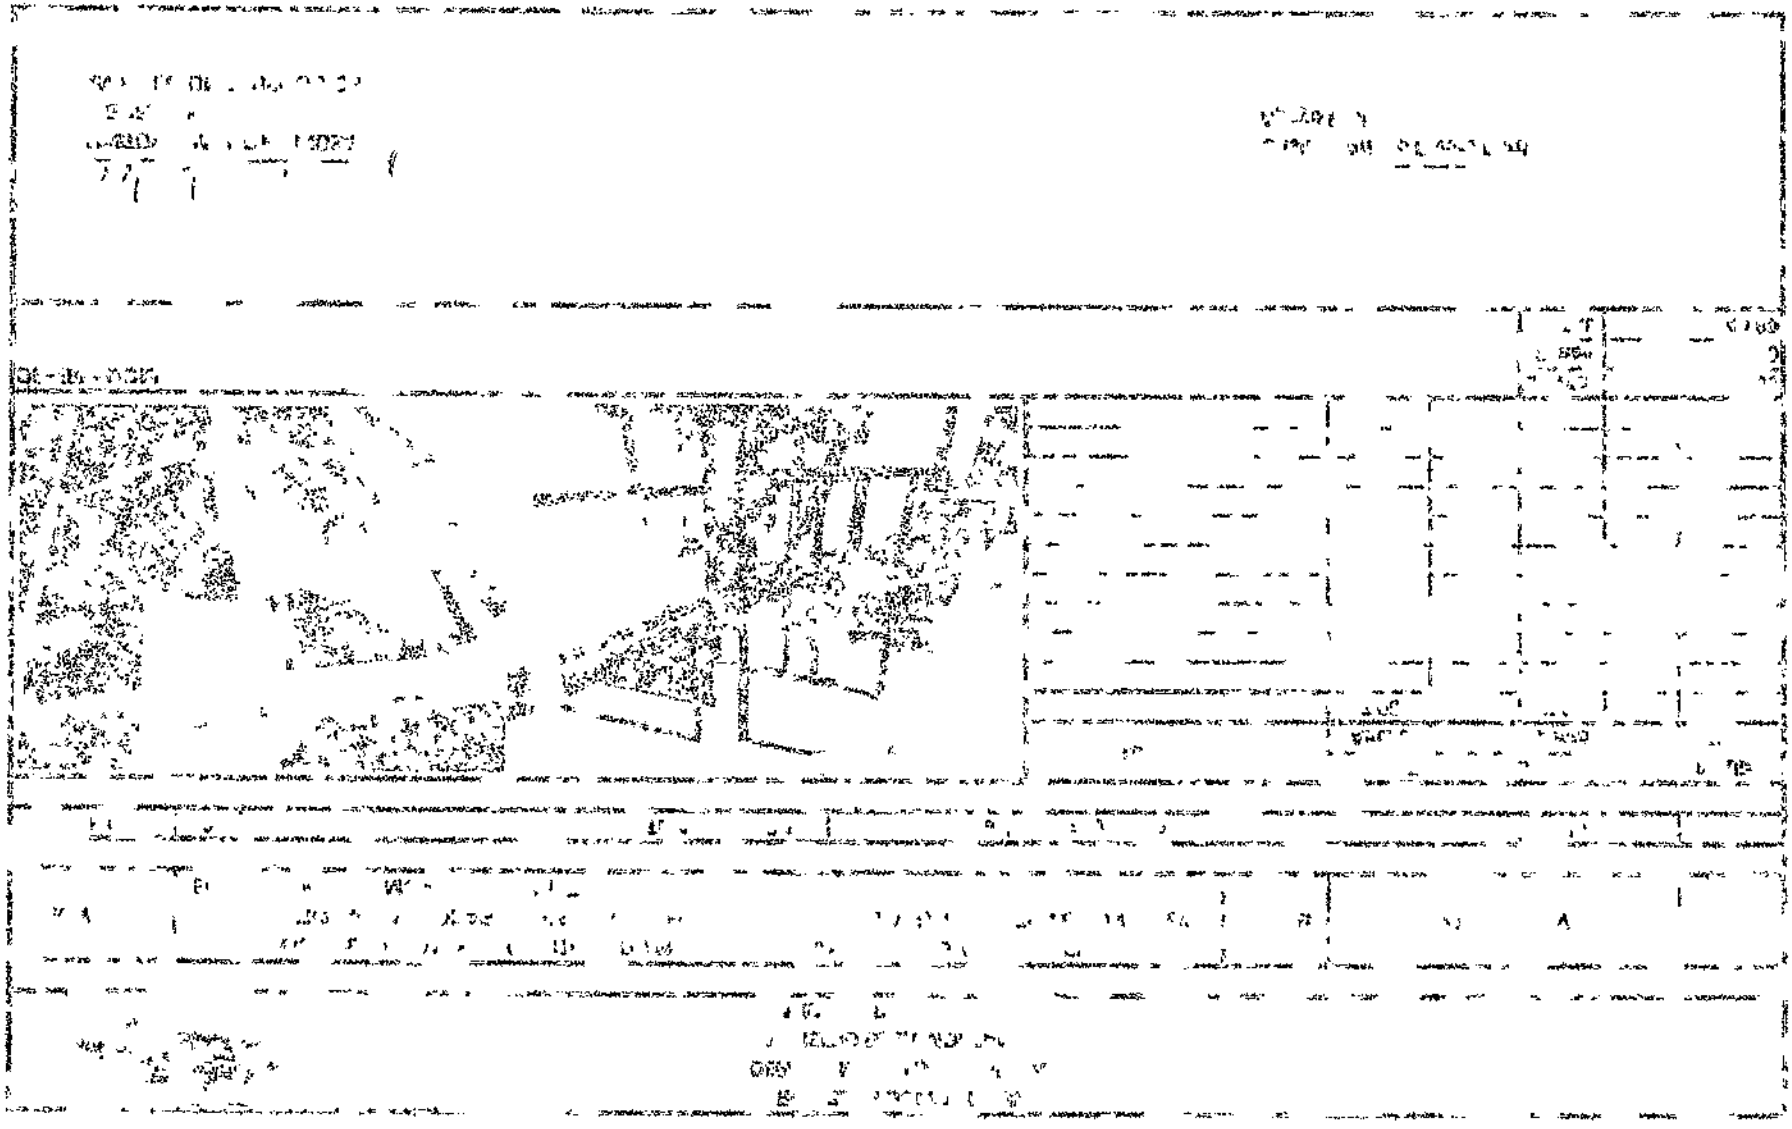

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	2	PRELIMINARES	**ÍTEM:**	2,2	Mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas, tipo compacto con capacidad de 0,5 LPS, incluye transporte, Suministro e instalacion de tuberia hidrahulica y accesorios y electrica a 0 metros, suministro e instalacion de equipos electricos (tablero de mando, bomba y soplador) incluye tratamiento de desechos existentes.	**UNIDAD:**	UND

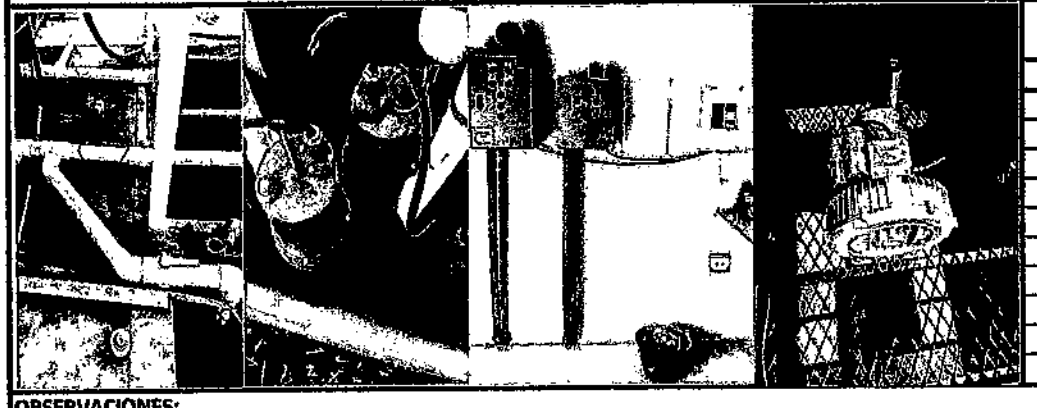

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
					1
				Subtotal:	1,00
				TOTAL:	1,00

OBSERVACIONES:

Cristobal Javier Espinosa


CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCION DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN	**ÍTEM:**	3,2	Suministro e instalacion de Lavaplatos inoxidable Submontar 55x43 Cm Con Grifería Advance Satín Y Canastillacon sus accesorios		UND

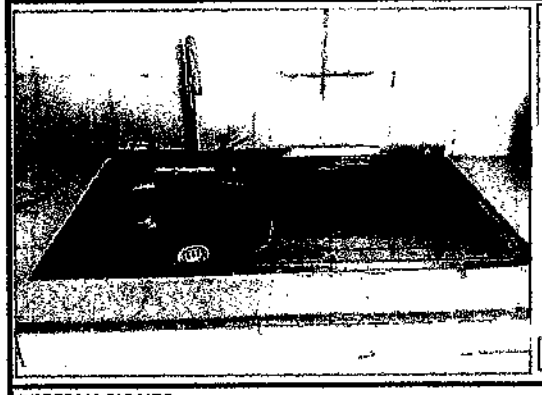

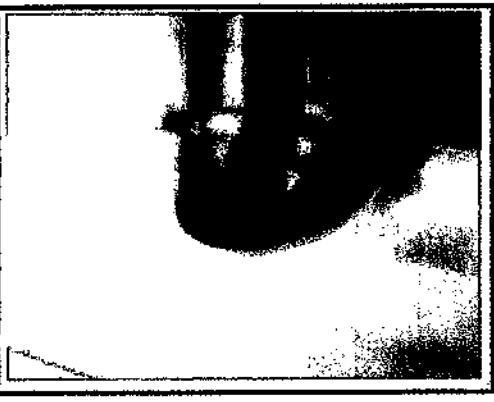

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
					1

OBSERVACIONES:

Subtotal:	1,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa


CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCION DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN	**ÍTEM:**	3,3	Pintura en vinilo tipo 1	**UNIDAD:**	M2

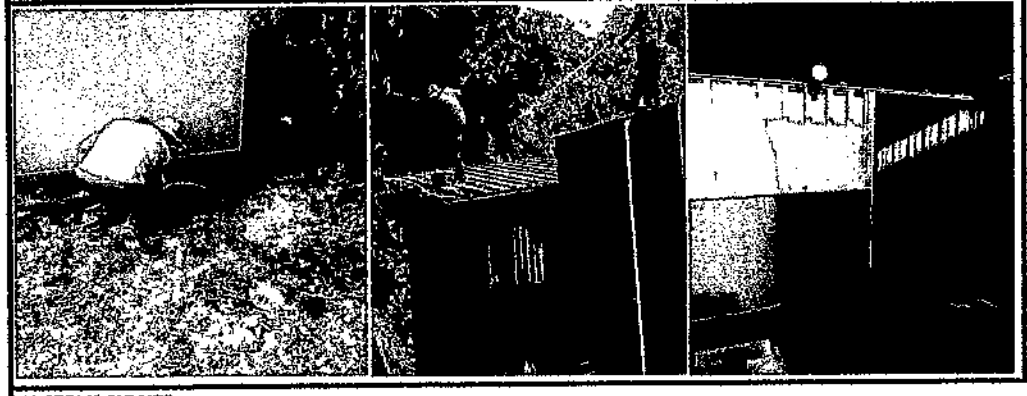

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
	9,00		9,33		84


OBSERVACIONES:

Subtotal:	84
Vienen:	0
TOTAL:	84

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

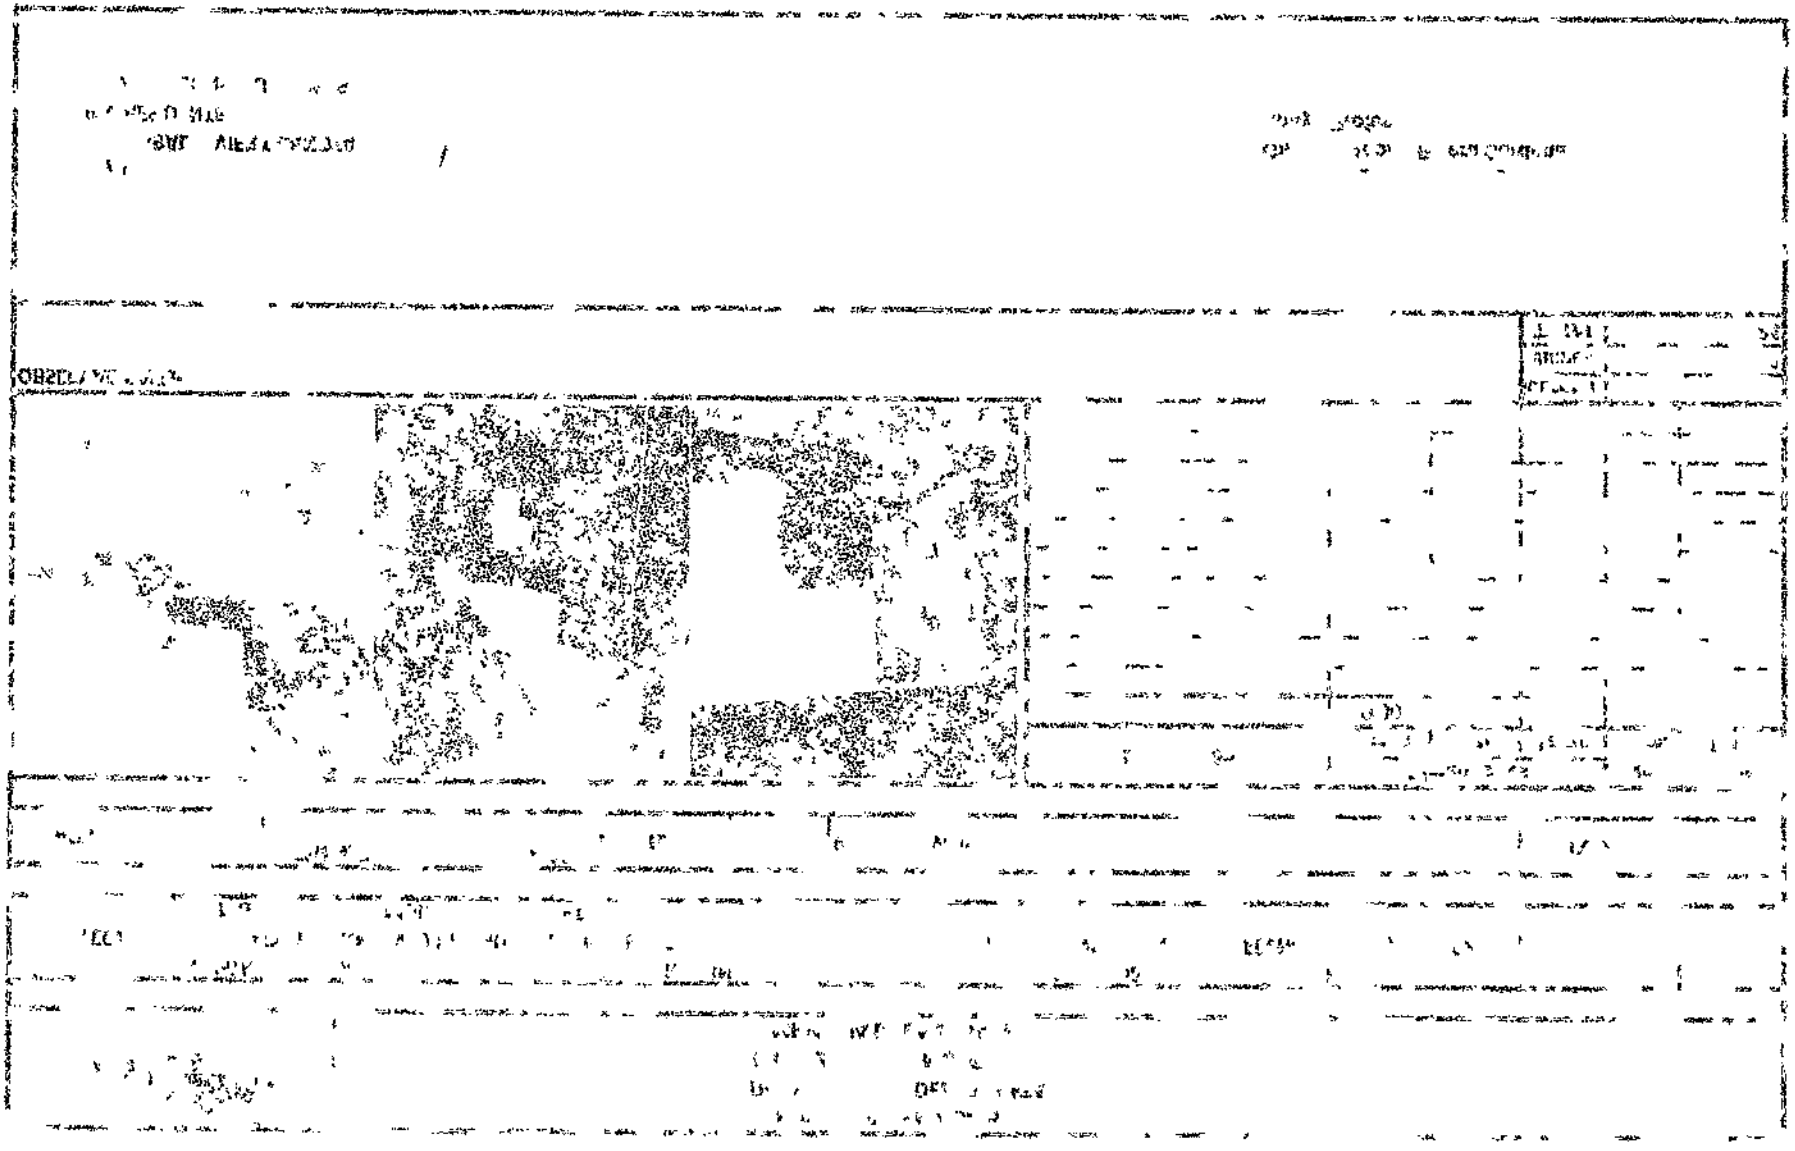

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN	**ÍTEM:**	3,4	#¡REF!	**UNIDAD:**	M2

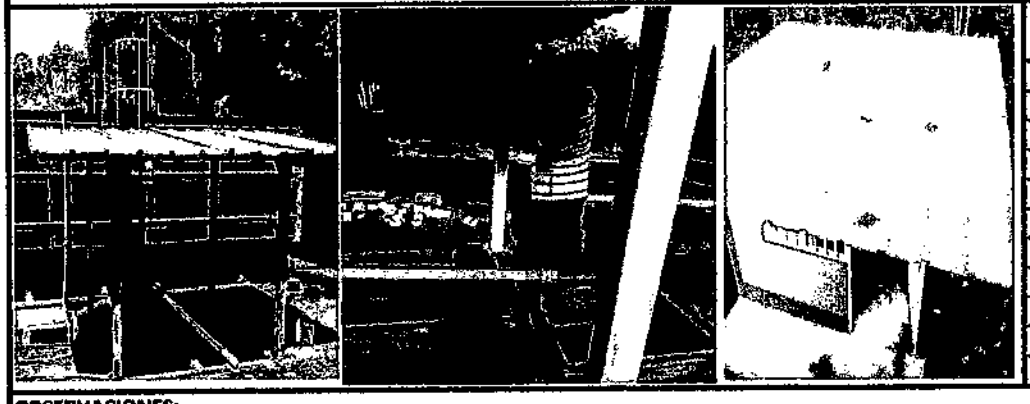

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
	2,00		2,50		5


OBSERVACIONES:

Subtotal:	5,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	5,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

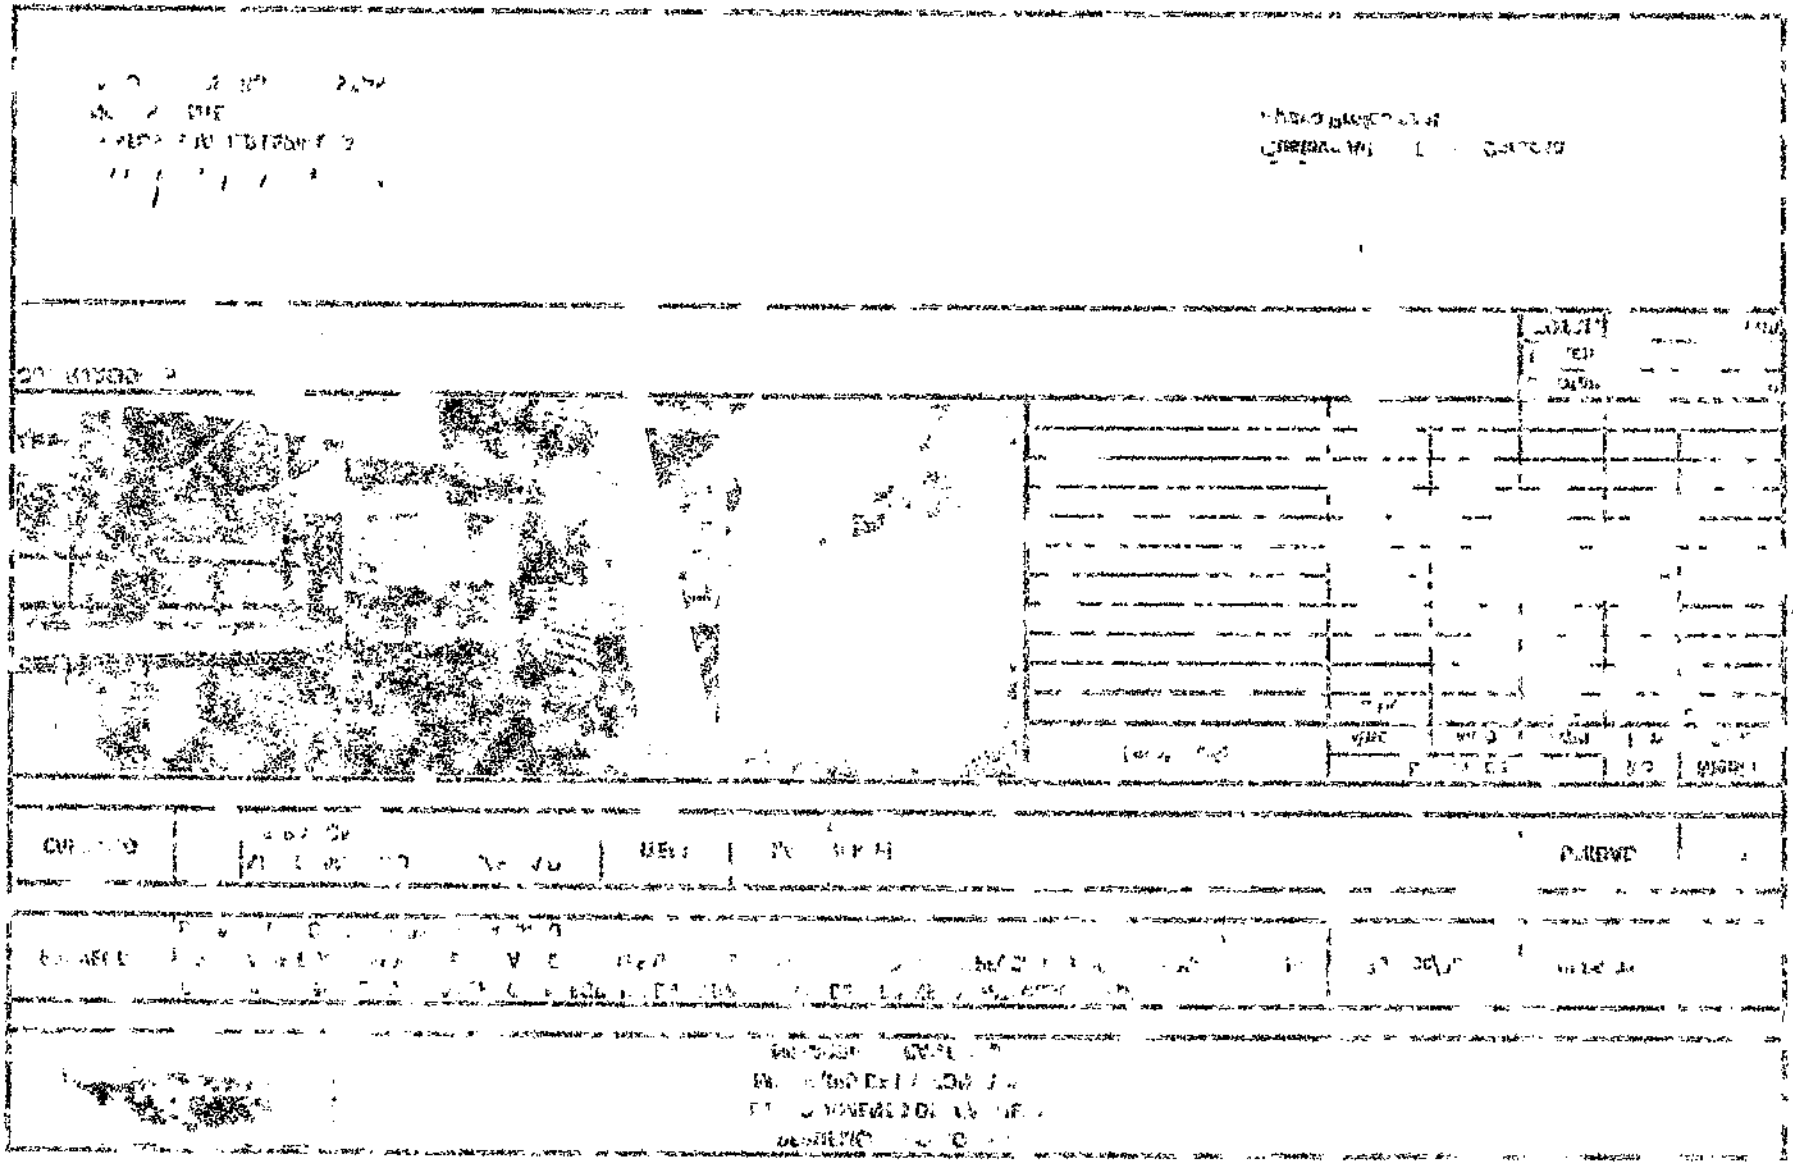

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	3	MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE OPERACIÓN	**ÍTEM:**	3,5	Instalacion de lampara led de 18w a 110 v y cerradura de puerta	**UNIDAD:**	UND

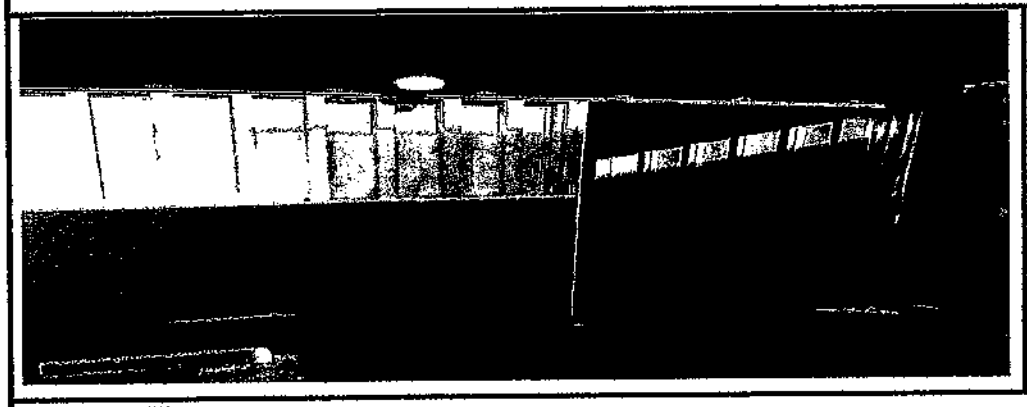

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
					1


Subtotal:	1,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	1,00

OBSERVACIONES:

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

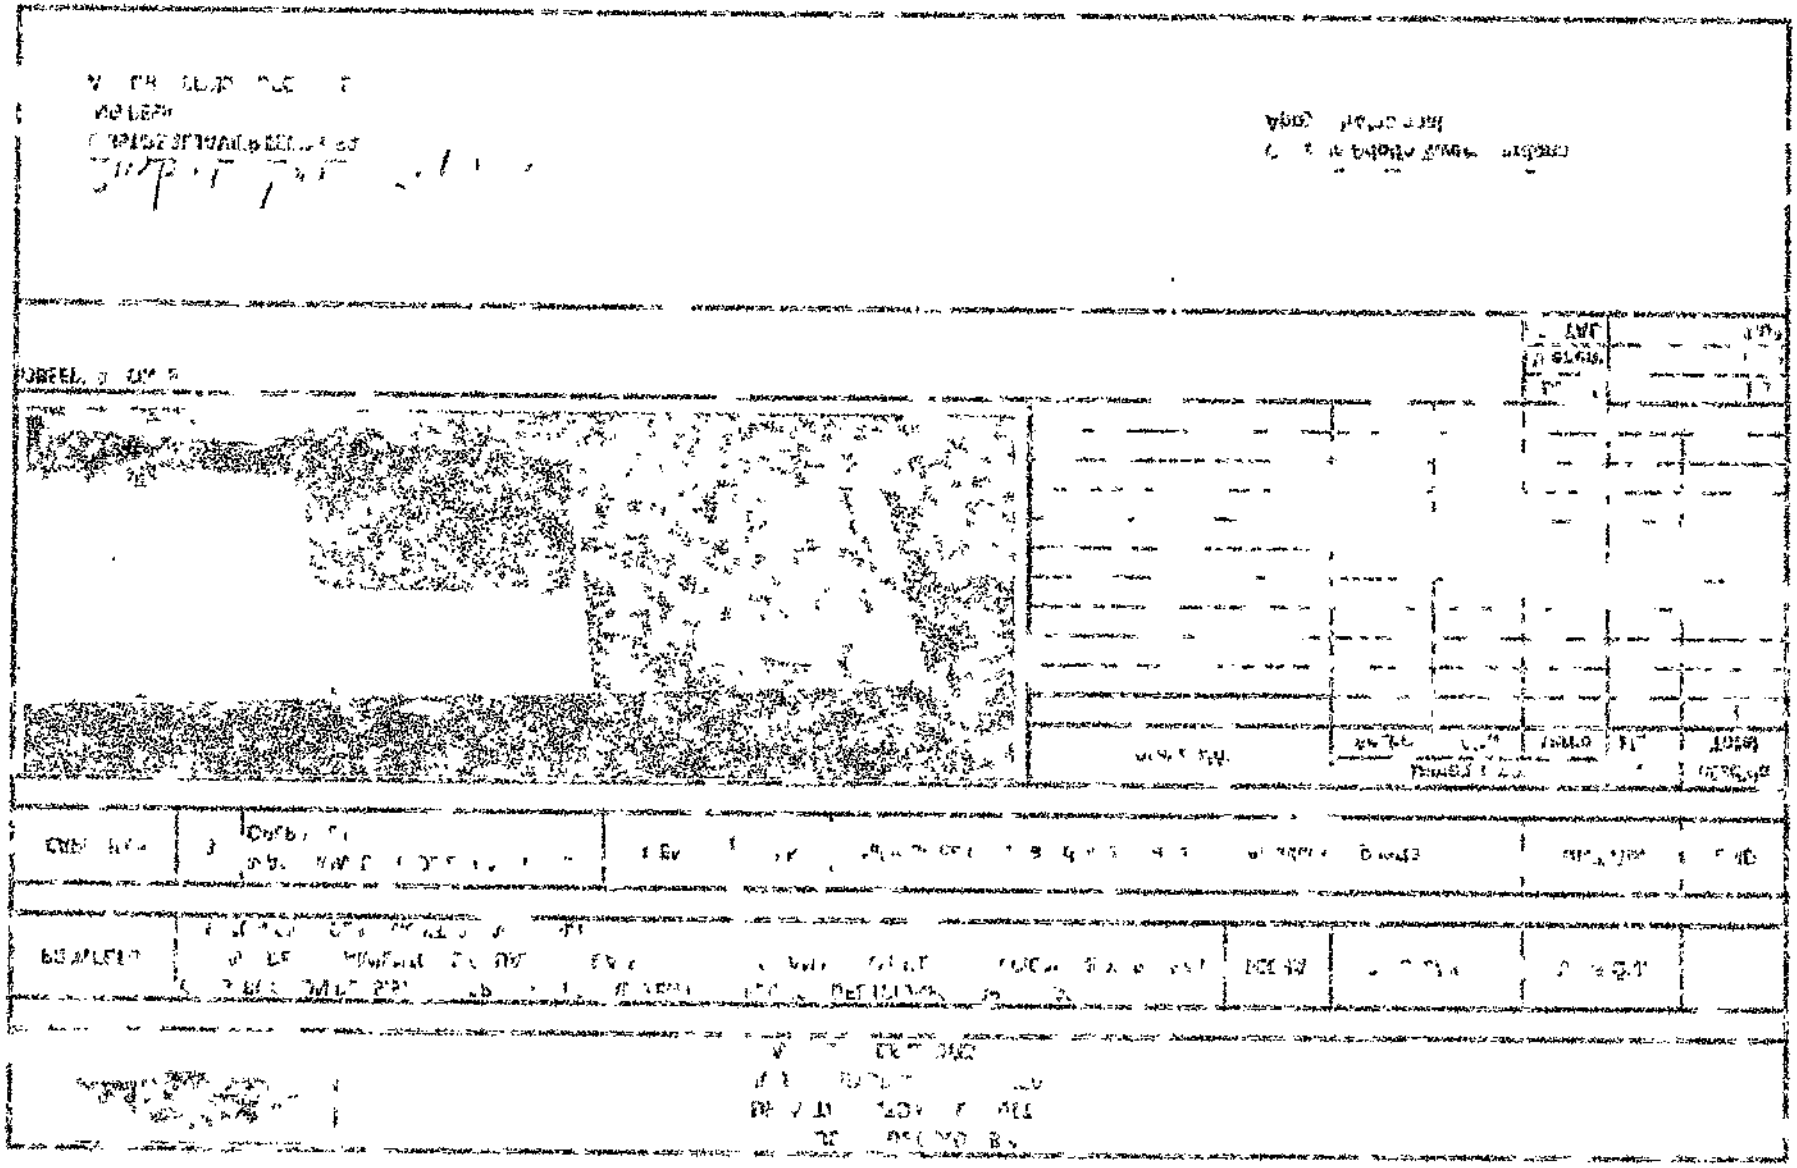

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO	**ÍTEM:**	4,1	#¡REF!	**UNIDAD:**	ML

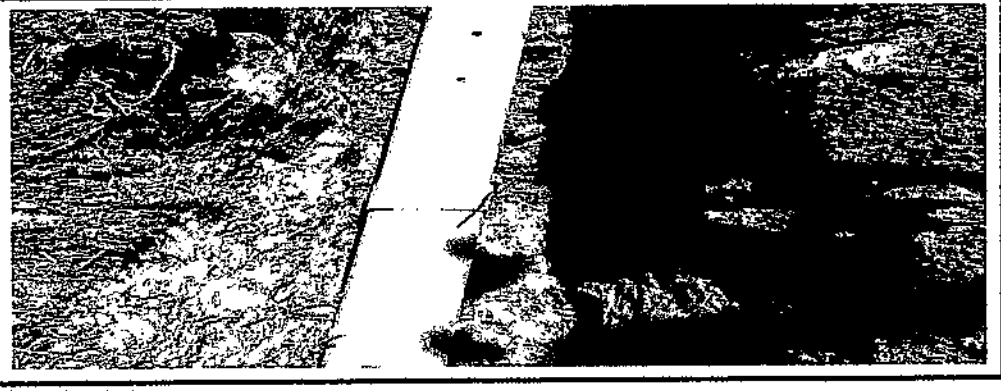

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
					24


OBSERVACIONES:

Subtotal:	24,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	24,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS


Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

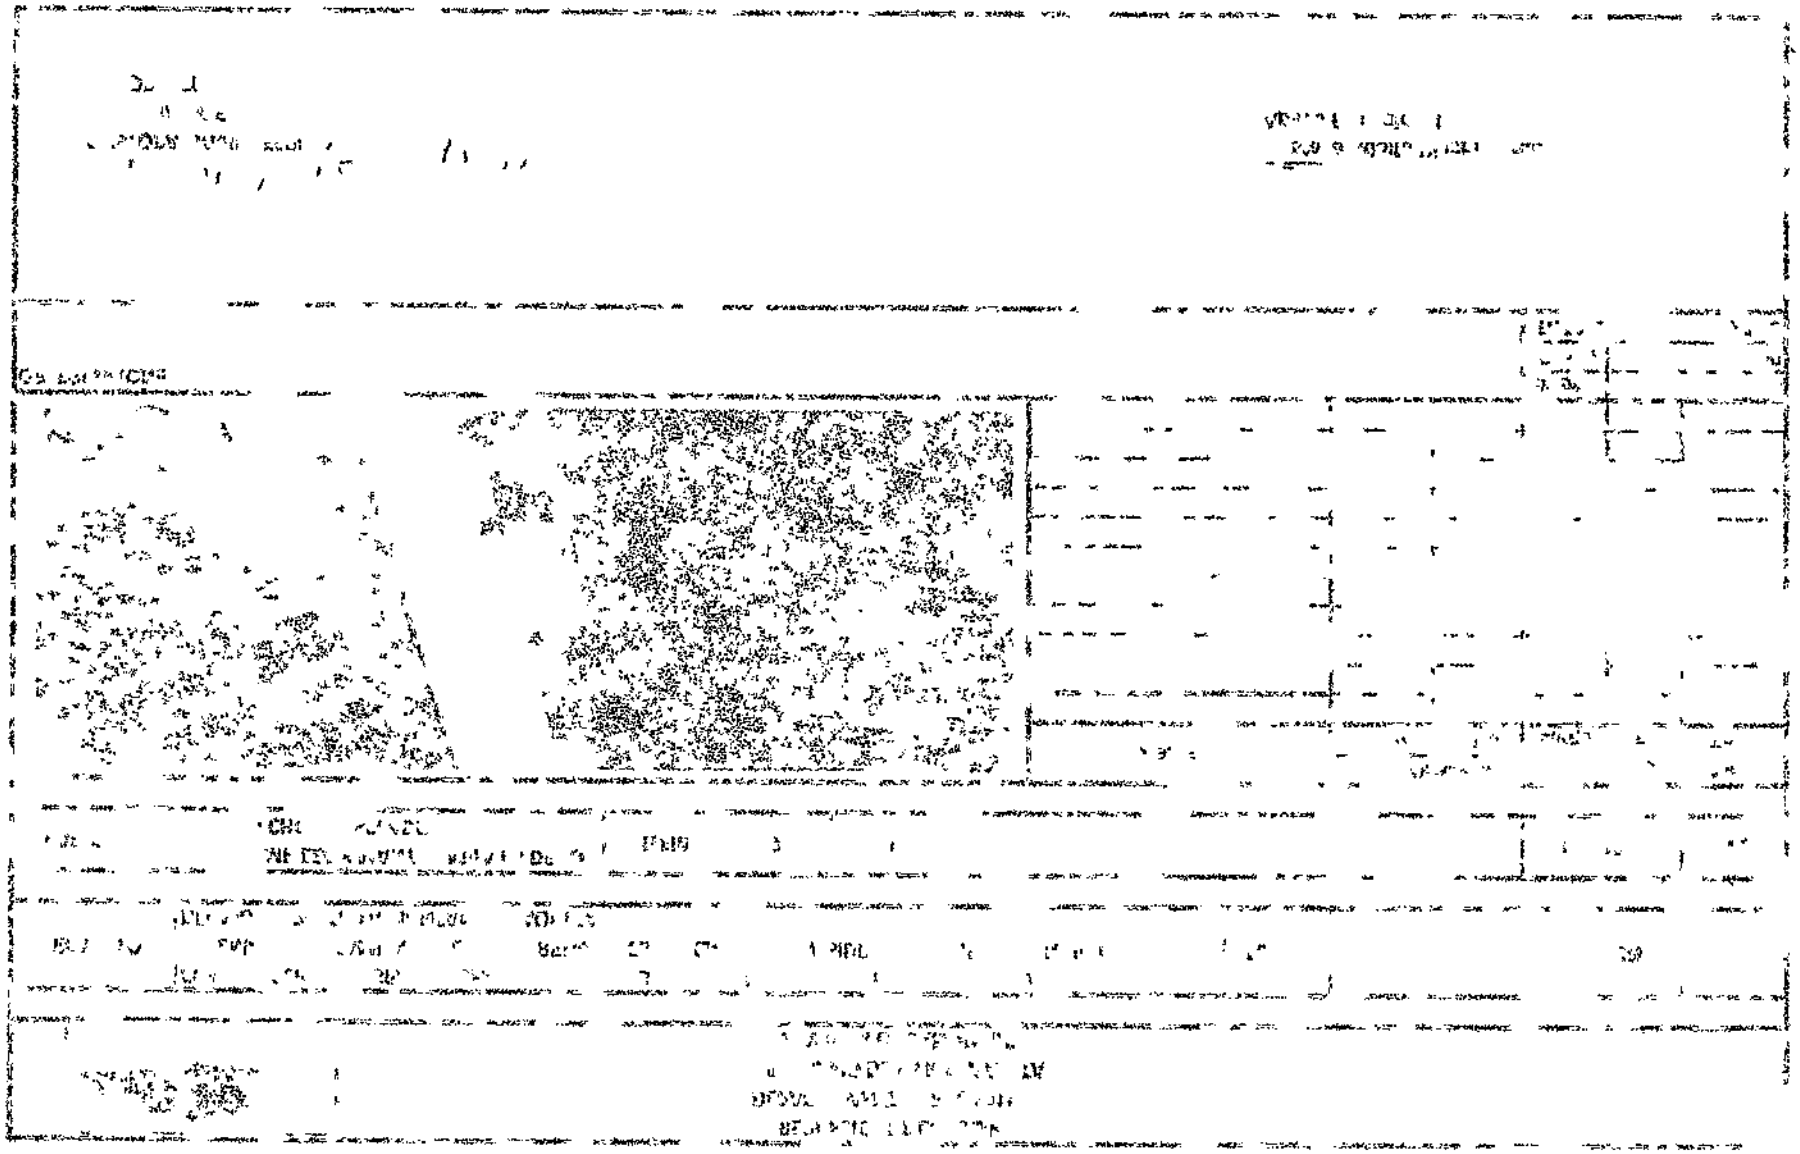

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO	**ÍTEM:**	4,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6" perforada	**UNIDAD:**	ML

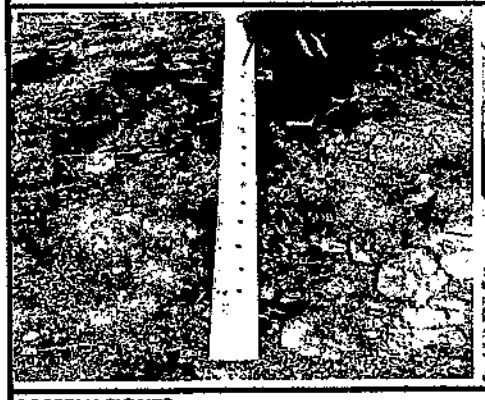



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
					20

OBSERVACIONES:

Subtotal:	20,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	20,00

Cristobal Javier Espinosa


CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO	**ÍTEM:**	4,3	suministro e instalacion de grava E= 0,25	**UNIDAD:**	M3

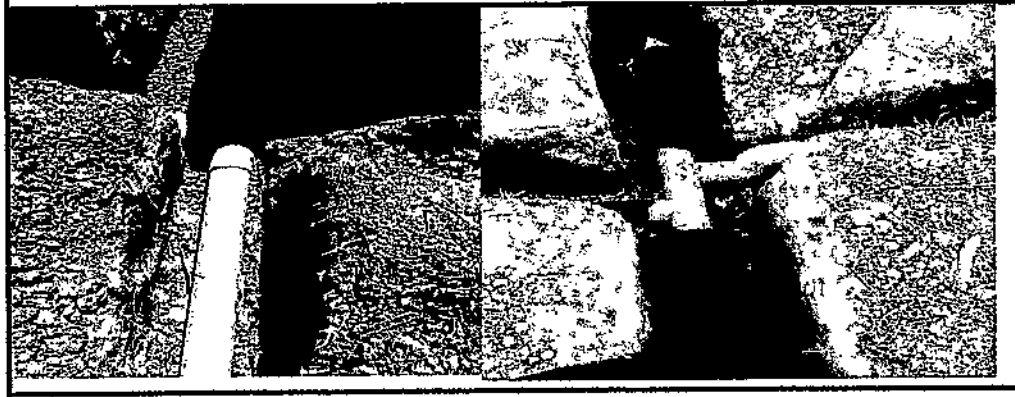

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
					1

OBSERVACIONES:

Subtotal:	1,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa


CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO	**ÍTEM:**	4,4	suministro e instalacion de arena E= 0,10	**UNIDAD:**	M3

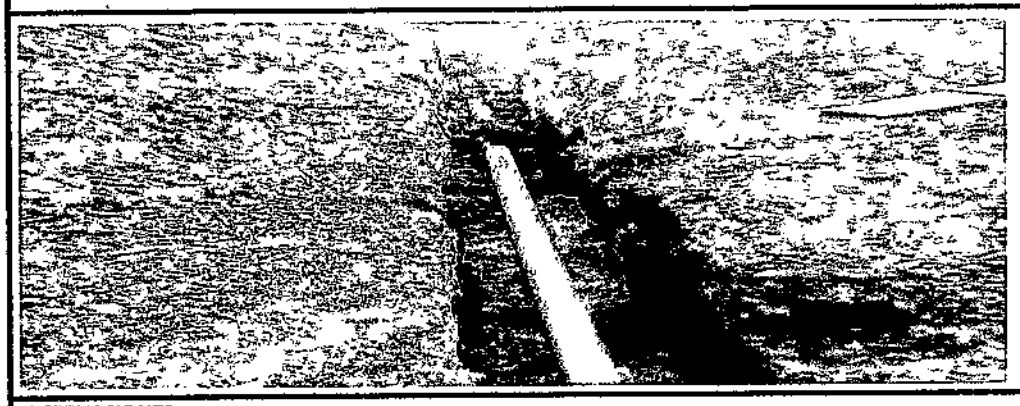

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
					1

OBSERVACIONES:

Subtotal:	1,00
Vienen:	0,00
TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa


CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO	**ÍTEM:**	4,5	Pintura para cubierta de lechos de secado	**UNIDAD:**	ML

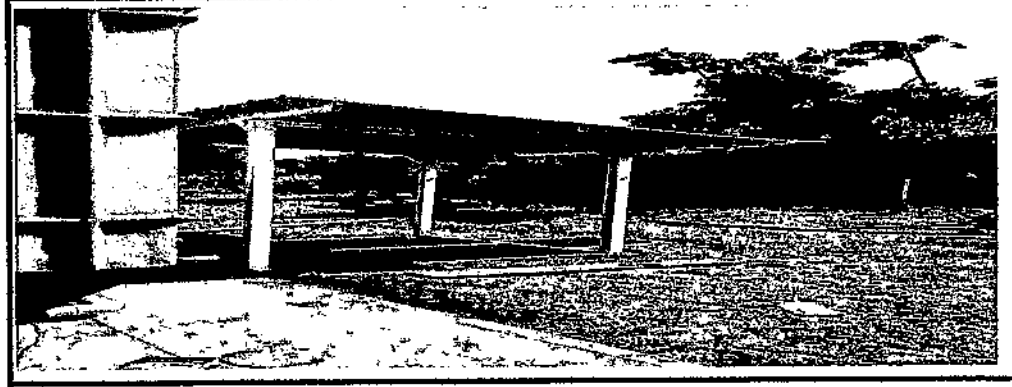

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
	6,15		2,00		12,30

OBSERVACIONES:

Subtotal:	12,30
Vienen:	0,00
TOTAL:	**12,30**

Cristobal Javier Espinosa


CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	5	INSTALACION DE PORTON	**ÍTEM:**	5,1	Suministro e instalacion de porton de 2x2, incluye transporte	**UNIDAD:**	UND

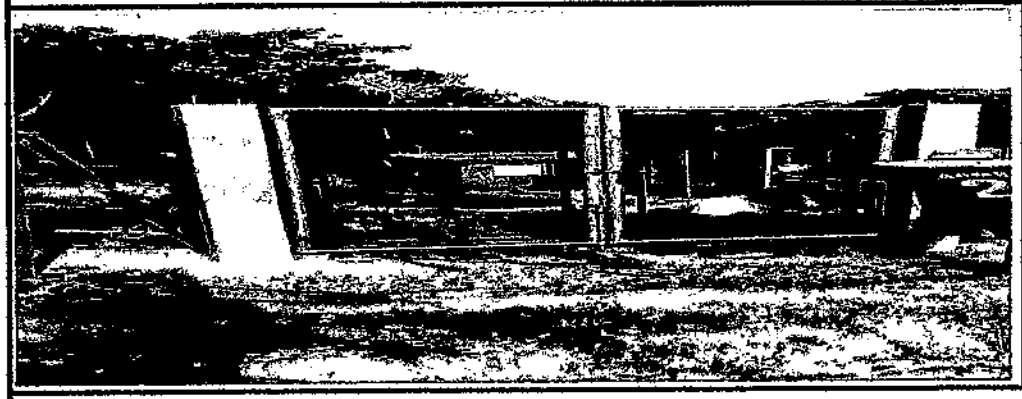

Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
					1

OBSERVACIONES:	**Subtotal:**	1,00
	Vienen:	0,00
	TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ	**FECHA:**	30/Dec/2025	**VERSIÓN:**	V.1

CAPÍTULO:	5	INSTALACION DE PORTON	**ÍTEM:**	5,2	Columna de 0,20x 0,20 incluye acero	**UNIDAD:**	UND



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Largo		
					6

Subtotal:	5,60
Vienen:	0,00
TOTAL:	5,60

OBSERVACIONES:

CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
MEMORIA DE CANTIDADES

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ				**FECHA:**	#¡REF!	**VERSIÓN:** V.1
CAPÍTULO:	6	SISTEMA ELÉCTRICO	**ÍTEM:**	6,1	Acometida trifasica subterranea, suministro e instalacion de cofre de inspeccion para medidor y sistema puesta tierra, suministro e instalacion de Transformador de 10 KVA incluye sistema de proteccion, suministro e instalacion de acometida parcial tablero de distribucion de 12 circuitos en ducto de 1", suministro e instalacion de tablero de control para 2 motores a 110 v y 2 a 220 v con proteccion de rele y supresor de picos general con señales semi automatico, dos salidas de conexion electrica para motores, salida electrica a 110 vincluye transporte	**UNIDAD:**	UND




Localización	Dimensiones			No.	Medida
	Ancho	Alto	Largo	Elem.	Total
					1

OBSERVACIONES:

Subtotal:	1,00
TOTAL:	1,00

Cristobal Javier Espinosa
CRISTOBAL JAVIER ESPINOSA
ING RESIDENTE
ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS

Gustavo Adolfo Rivera Cardona
Apoyo Profesional

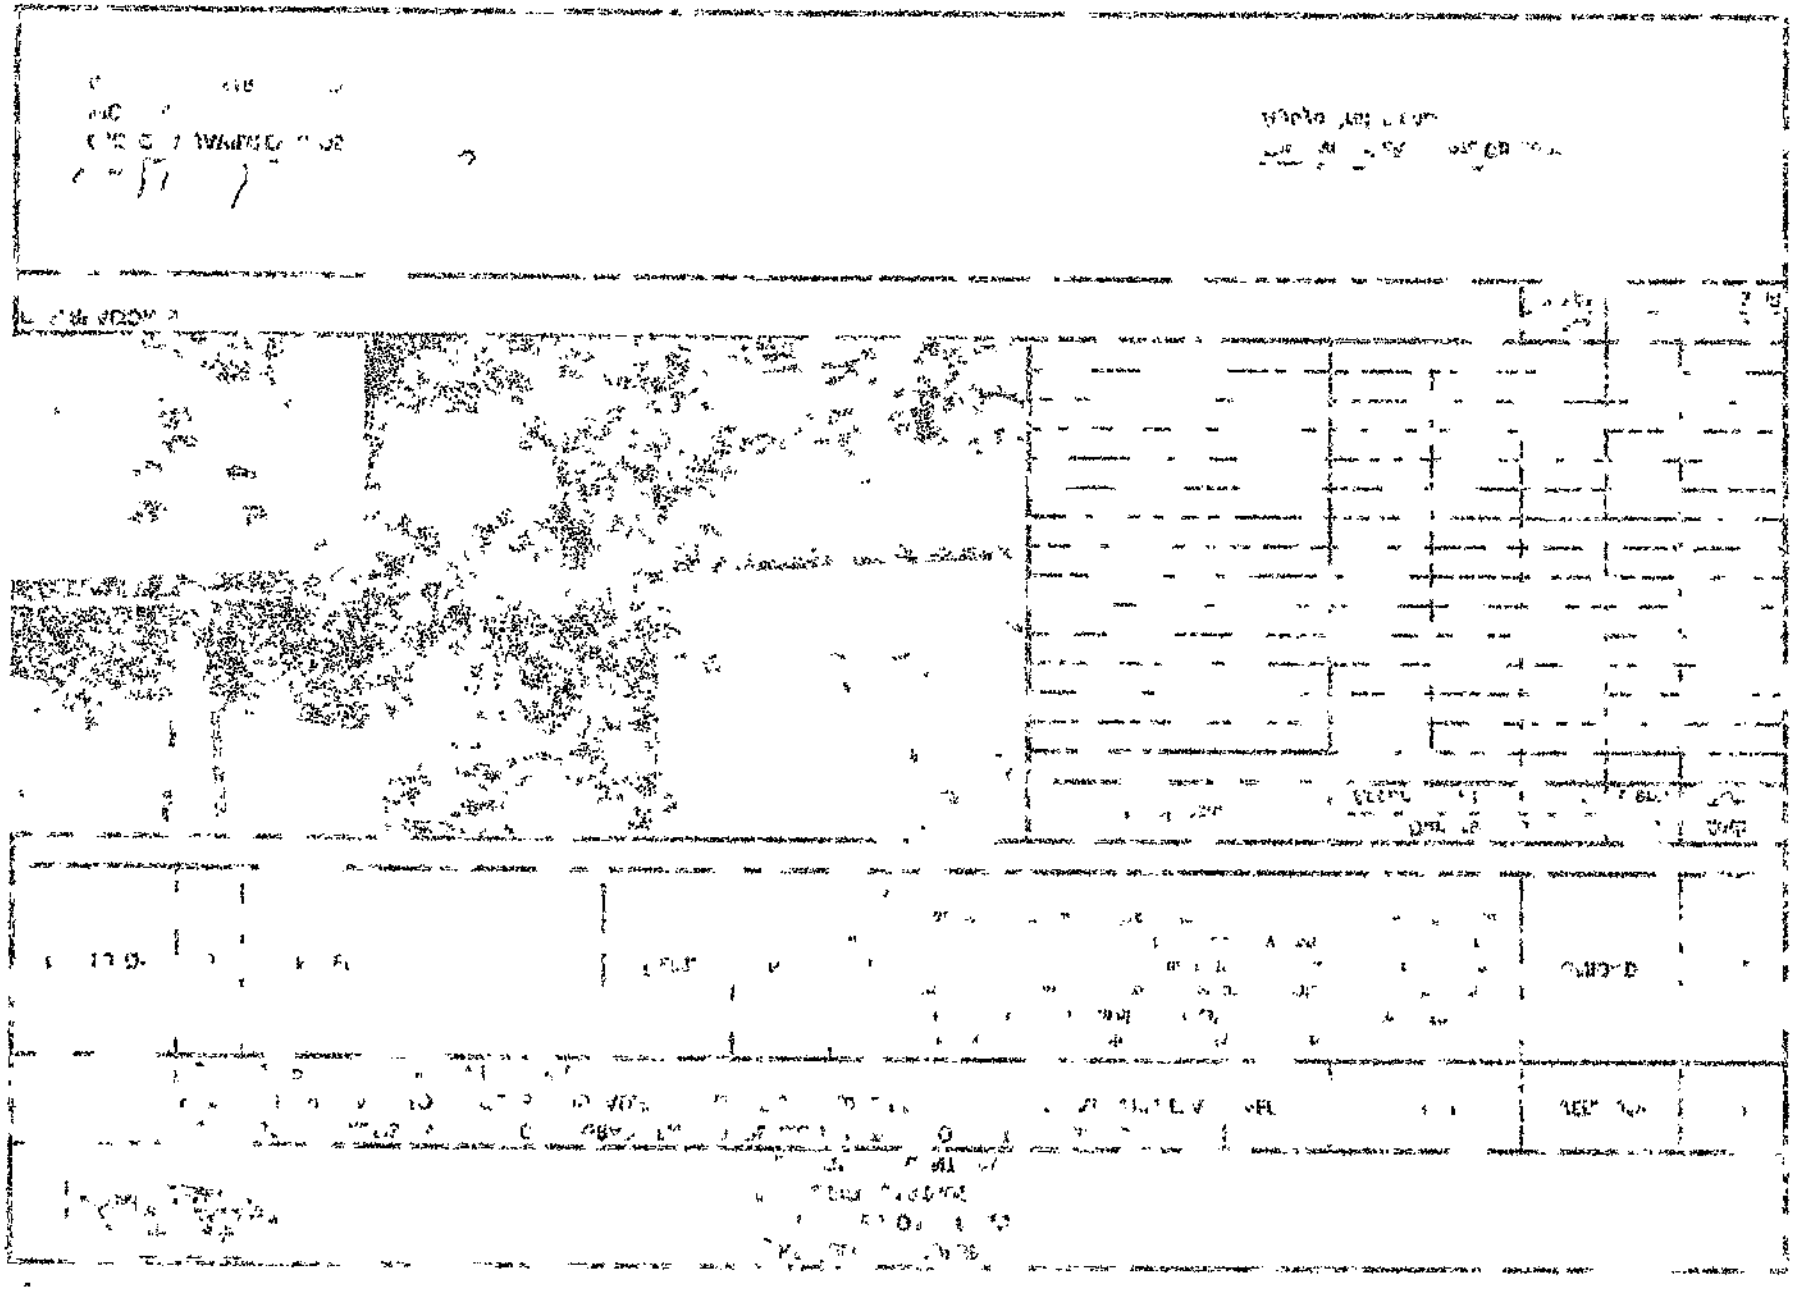

FORMATO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA COMUNIDAD

La comunidad beneficiada de la Inspección [ ] Vereda [ ] Caserío [ ] Otro [ ]

Nombre: CASERIO SAN ISIDRO Y INSPECCION EL TRIUNFO
CERTIFICA que el contratista: ANDORIA CONSTRUCCIONES SAS, Identificado con NIT N°: 901.714.962-3 Cumplió con el Objeto del: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA INSPECCIÓN DEL TRIUNFO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO SAN ISIDRO DE LA INSPECCION UNION PENEYA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ

A) CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	N°199- SAMC _____de 2025
B) ACEPTACIÓN DE OFERTA	N°_____de 2025
C) CONVENIO SOLIDARIO	N°_____de 2025
D) CONVENIO DE APOYO	N°_____de 2025
E) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	N°_____de 2025

El cual se recibe a **ENTERA SATISFACCIÓN.**

Para constancia firman, los miembros de la comunidad beneficiada. En su caso el comité de Veeduría a los 30 Días del mes de diciembre de 2025.

Miembro Comité de Veeduría
C.C. N° 40 088777

Miembro Comité de Veeduría
C.C. N°

Miembro Comité de Veeduría
C.C. N° 96341 600
