CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	feb-26
PÁGINA:	1 de 6

1. FECHA DE ELABORACIÓN	25	8	2026	**2. INFORME No.**	28	**3. SEMANA No.**	29	**4. PERIODO:**	17	AGOSTO	al	23	AGOSTO

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA	**6. NIT:**	902.016.365-5

7. CONTRATO No.	1330-2025	**8. FECHA CONTRATO:**	22/12/2025	**9. VALOR DEL CONTRATO:**	$1752.539.631
10. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**11. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**12. PLAZO:**	21 meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	Consorcio Construhábitat 001	**16. NIT:**	902.005.653-4

17. CONTRATO No.	1269-2025	**18. FECHA CONTRATO:**	27/11/2025	**19. VALOR DEL CONTRATO:**	$16´415.325.538
20. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**21. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**22. PLAZO:**	21 meses

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

Valor Inicial	$16´415.325.538	Valor Inicial	$1752.539.631
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses	Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación		Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1		Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1		Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1		Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027	Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027	Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

CONTRATO DE OBRA

VR. CONTRATO	$	16,415,325,538.00
VR. ETAPA 1	$	947,833,365.00
VR. ETAPA 2	$	15,467,492,173.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO	$	1,752,539,631.00
VR. ETAPA 1	$	422,876,893.00
VR. ETAPA 2	$	1,329,662,738.00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$189.480.993,00	0	21/05/2026
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$189.480.993,00		

VALOR EJECUTADO ET1	$189.480.993,00	% Ave.	
VALOR POR EJECUTAR ET1		% Falt.	100.00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Ave.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2		% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA		% Ave.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 14,272,095.00	$246.696,00	13/04/2026
Acta No. 2	$ 15,857,883.00		16/06/2026
Acta No. 3	$ 42,287,689.00		16/06/2026
Acta No. 4	$ 15,857,883.00		7/07/2026
Acta No. 5	$ 15,857,883.00		22/07/2026
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$ 104,133,433.00		

VALOR EJECUTADO ET1	$	104,133,433.00	% Ave.	24.62%
VALOR POR EJECUTAR ET1	$	318,743,460.00	% Falt.	75.38%
VALOR EJECUTADO ET2			% Ave.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	$	1,329,662,738.00	% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA			% Ave.	
VALOR POR DEDUCCIÓN			% Falt.	


ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado Anterior	80.00%	79.00%	1.00%
Durante la semana	2.00%	2.00%	0.00%
Actual Acumulado	82.00%	81.00%	1.00%


Valor Etapa 1	

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		

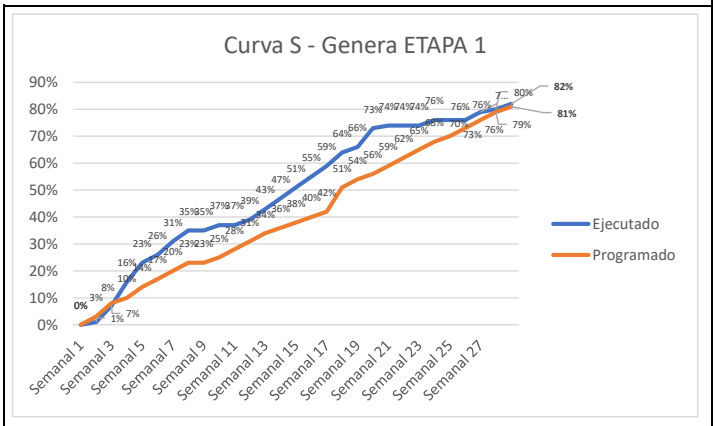

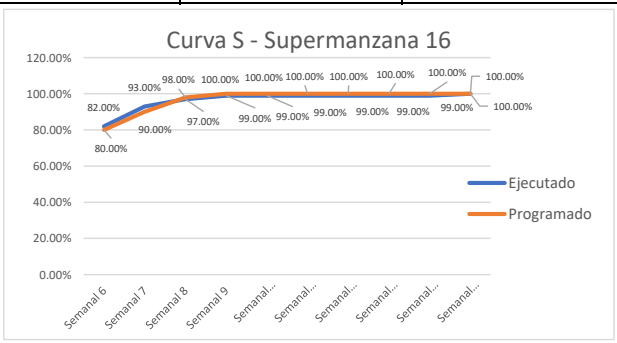


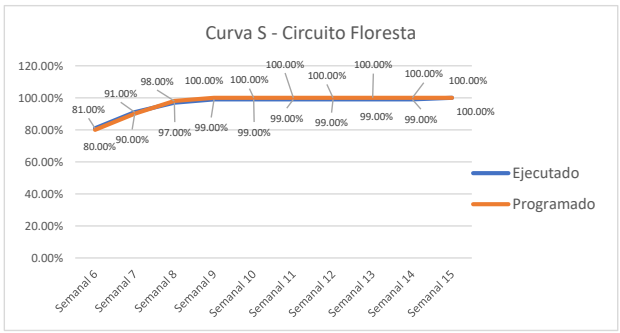


PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

Resumen de la semana	**SUPERMANZANA 16**	**100%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
	Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
	Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%
	CIRCUITO FLORESTA	**100%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
	Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%

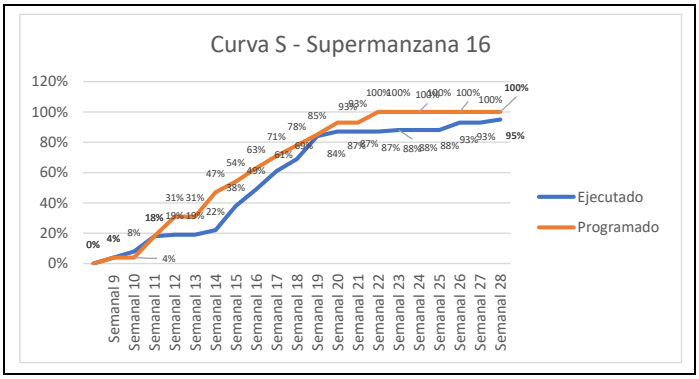

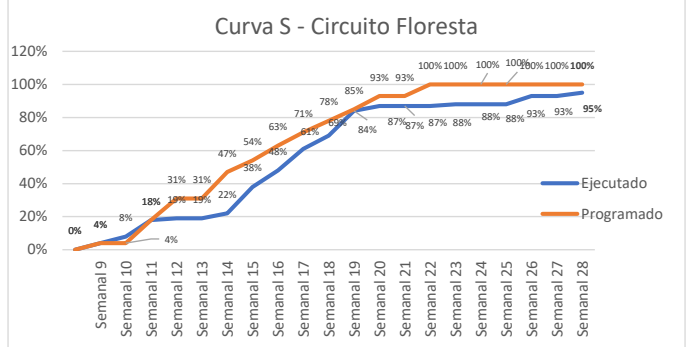

Estado de cronograma por componente FASE II

Resumen de la semana	**SUPERMANZANA 16**	**95%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano Atraso	100%	100%
	Vías transporte y movilidad Atraso	100%	100%
	Redes Hidráulicas	85%	100%
	Redes Secas	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma	90%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos	100%	100%
	Estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	90%	100%
	Social	100%	100%
	Componente BIM	85%	100%
	CIRCUITO FLORESTA SUR	**95%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas	85%	100%
	Redes Secas	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma	90%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos	100%	100%
	Estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	90%	100%
	Social	100%	100%
	Componente BIM	85%	100%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana

Durante la semana comprendida entre el 17/08/2026 y el 23/08/2026
Comité de seguimiento BIM
Mesa de trabajo presupuestos - Presencial
Comité de Seguimiento Semanal N29

CIRCUITO FLORESTA

Actividades ejecutado	Actividades programado
18/08/2026 Comité de seguimiento BIM 18/08/2026 Mesa de trabajo del componente de presupuesto 20/08/2026 Comité de Seguimiento Semanal N29 - Presencial	24/08/2026 Mesa de trabajo componente Redes Hidrosanitarias 24/08/2026 Mesa de trabajo del cronograma - Presencial 26/08/2026 SUDS Reunion virtual - SDA 27/08/2026 Comité de seguimiento N° 30 - Virtal 27/08/2026 Reunion mi habitat en Supermanzana 16 28/08/2026 Mesa de trabajo con ETB 27/08/2026 Reunion mi habitat en Supermanzana 16

KENNEDY SUPERMANZANA 16

Actividades ejecutado	Actividades programado
18/08/2026 Comité de seguimiento BIM 18/08/2026 Mesa de trabajo del componente de presupuesto 20/08/2026 Comité de Seguimiento Semanal N29 - Presencial	24/08/2026 Mesa de trabajo componente Redes Hidrosanitarias 24/08/2026 Mesa de trabajo del cronograma - Presencial 25/08/2026 Reunion presencial en circuito floresta sur 26/08/2026 SUDS Reunion virtual - SDA 26/08/2026 Reunion mi habitat - Circuito Floresta sur 27/08/2026 Comité de seguimiento N° 30 - Virtal 28/08/2026 Mesa de trabajo con ETB

		1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 dias	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	81%	82%	81%	1%
		1.1	ETAPA 1	162 dias	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 947.833.395,99	81%	82%	81%	1%
✓		1.1.1	Acta de inicio	0 dias	4 febrero 2026 9:	4 febrero 2026 9:0	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 dias	5 febrero 2026 7:	5 febrero 2026 7:0	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 dias	6 febrero 2026 9:	10 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.4	Ajuste de observaciones	2 dias	11 febrero 2026 8	12 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 dias	11 febrero 2026 7	11 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 dias	12 febrero 2026 8	16 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.7	Ajuste de observaciones	2 dias	17 febrero 2026 8	18 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 dias	13 febrero 2026 7:00 p. m.	13 febrero 2026 7:00 p. m.	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 dias	16 febrero 2026 8	18 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓		1.1.10	Ajuste de observaciones	2 dias	19 febrero 2026 8	20 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
		1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 dias	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 473.916.712,99	81%	82%	81%	1%
✓		1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dias	4 febrero 2026 9	6 abril 2026 7:00	$ 105.304.281,00	100%	100%	100%	0%
		1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	100%	95%	100%	-5%
		1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dias	3 julio 2026 7:00	2 octubre 2026 7:	$ 210.655.964,00	52%	21%	52%	-31%
		1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 dias	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 473.916.683,00	81%	82%	81%	1%
✓		1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dias	4 febrero 2026 9	6 abril 2026 7:00	$ 105.304.281,00	100%	100%	100%	0%
		1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.438,00	100%	95%	100%	-5%
		1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dias	3 julio 2026 7:00	2 octubre 2026 7:	$ 210.655.964,00	52%	21%	52%	-31%

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST	COMPONENTE AMBIENTAL
El 20 de agosto se envio aprobacion al informe N5 - SST	El 18 de agosto se entregó el informe mensual 6 de Interventoría. El 20 de agosto se asistió a comité integral virtual. El 20 de agosto se inició con la revisión del informe mensual 6 V2.

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".	
TIPO DE DOCUMENTO	**CONTRATO No Y NOMBRE**
INFORME SEMANAL No 28	Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025□

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES — **PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 28 DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2026**□

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 20/04/2026	20/04/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social llega comunicado de aprobación con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026.
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social El contratista remite mediante oficio CCH-001-SDHT-1269-258 encuesta de caracterización para revisión y aprobación.	09/03/2026 07/05/2026	12/03/2026 07/05/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha límite de entrega el 22 de junio del 2026. Se realiza verificación del documento y encuesta, por lo que al remitir se verifica que sea el mismo para dar ella correspondiente aprobación por parte de la interventoría para su aplicación.
	Se recibe avance de caracterización social por parte del contratista	23/06/2023	23/06/2026 al 25/06/2026	Se realiza revisión de documento al cual se le emiten observaciones y reenvía con copia a la entidad para revisión y concepto.
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS	Se recibe documento de matriz de impacto para revisión de la interventoría	NA	NA	Se remite mediante oficio,SDH-1330-2025-0314, las observaciones al documento correspondiente a la matriz de impactos y el documento se encuentra en subsanación.
	Se recibe metodología del programa de identificación de impactos sociales, el cual se da aprobación, para su implementación, actualmente se encuentra en aplicación a la comunidad por parte del contratista	21/05/2026	21/05/2026 al 23/05/2026	Se da aprobación a la metodología y a las herramientas de el plan de evaluación e identificación de impactos para su aplicación.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	Se recibe metodología de comité mi Habitat de circuito floresta sur	13/08/2026	13/08/2026	Se emite concepto positivo a la metodología, se remite a la entidad para concepto
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se recibe oficio de primeros diseños de Vallas y pendones para etapa de Obra Fase II	10/08/2026	10/08/2026	Se remiten observaciones a las piezas, teniendo en cuenta los requerimientos contractuales de la entidad
	Mesa de trabajo entre entidad, contratista e interventoría- Ecobarrios	19/08/2026	19/08/2026	Se realiza mesa de trabajo con la finalidad de llegar a acuerdos en mesa de trabajo
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se asiste al comité técnico N° 29	20/08/2026	20/08/2026	Se asiste al comité técnico # 29 en donde se indican los avances del proyecto
	Se inicia a realizar actividad de elaboración de informe mensual de interventoría	18/08/2026	18/08/2026	Se inicia proceso de elaboración de informe mensual de julio del 2026.
CORRESPONDENCIA	Se recibe informe semanal N° 27 del contratista	18/08/2026	19/08/2026	Se realiza verificación al informe al cual se le da aprobación, con remisión a la entidad
	Se remite informe semanal N 27 de la interventoría a la entidad	17/08/2026	17/08/2026	se remite informe semanal N 27 a la entidad para fines pertinentes.
	Se recibe concepto de visto bueno de la entidad al informe semanal 24	21/08/2026	21/08/2026	Se recibe visto bueno de informe semanal 24 por parte de la entidad
	Se recibe concepto de visto bueno de la entidad al informe semanal 25	21/08/2026	21/08/2026	Se recibe visto bueno de informe semanal 25 por parte de la entidad
	Se recibe concepto de de observado por parte de la entidad al informe semanal 26	21/08/2026	21/08/2026	Se recibe concepto de observado al informe semanal 26 por parte de la entidad

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN ALISTAMIENTO	

TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO	

TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	

N/A

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

32. PERSONAL INTERVENTORÍA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARÍA**	**CANT.**	**UBICACIÓN**	**DÍA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR CONSULTORÍA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1				**ESTADO**		
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1				**LLUVIOSO (L)**		
		AFORADOR PARA MOV. 1	1				**FAVORABLE (F)**		
		AFORADOR PARA MOV. 2	1				**SOLEADO (S)**		

TOTAL DE PERSONAL	**16**	**TOTAL DE PERSONAL**	**25**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	

36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

38. OBSERVACIONES

Se continúan adelantando mesas de trabajo, reuniones de coordinación y espacios de revisión con los diferentes componentes y actores involucrados, con el propósito de atender las observaciones pendientes, realizar los ajustes requeridos y consolidar los productos necesarios para el cierre de la Fase II. Estas actividades se desarrollan como parte del proceso de seguimiento y verificación requerido para garantizar la culminación de la fase y avanzar oportunamente hacia las etapas posteriores del proyecto.

39. RECOMENDACIONES

Durante el periodo objeto del presente informe, se adelantaron reuniones y jornadas de presentación del proyecto con las diferentes entidades involucradas, con el fin de socializar los alcances y componentes del proyecto, atender las observaciones y requerimientos correspondientes y gestionar las aprobaciones necesarias para dar continuidad al proceso y avanzar hacia el inicio de la etapa de construcción.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
