CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	feb-26
PÁGINA:	1 de 7

1. FECHA DE ELABORACIÓN	1	9	2026	**2. INFORME No.**	29	**3. SEMANA No.**	30	**4. PERIODO:**	24	AGOSTO	al	31	AGOSTO

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA	**6. NIT:**	902.016.365-5

7. CONTRATO No.	1330-2025	**8. FECHA CONTRATO:**	22/12/2025	**9. VALOR DEL CONTRATO:**	$1752.539.631
10. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**11. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**12. PLAZO:**	21 meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	Consorcio Construhábitat 001	**16. NIT:**	902.005.653-4

17. CONTRATO No.	1269-2025	**18. FECHA CONTRATO:**	27/11/2025	**19. VALOR DEL CONTRATO:**	$16´415.325.538
20. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**21. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**22. PLAZO:**	21 meses

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

Valor Inicial	$16´415.325.538
Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

Valor Inicial	$1752.539.631
Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

CONTRATO DE OBRA

VR. CONTRATO	$ 16,415,325,538.00
VR. ETAPA 1	$ 947,833,365.00
VR. ETAPA 2	$ 15,467,492,173.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO	$ 1,752,539,631.00
VR. ETAPA 1	$ 422,876,893.00
VR. ETAPA 2	$ 1,329,662,738.00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$189.480.993,00	0	21/05/2026
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$189.480.993,00		

VALOR EJECUTADO ET1	$189.480.993,00	% Avc.	
VALOR POR EJECUTAR ET1		% Falt.	100.00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2		% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 14,272,095.00	$246.696,00	13/04/2026
Acta No. 2	$ 15,857,883.00		16/06/2026
Acta No. 3	$ 42,287,689.00		16/06/2026
Acta No. 4	$ 15,857,883.00		7/07/2026
Acta No. 5	$ 15,857,883.00		22/07/2026
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$ 104,133,433.00		

VALOR EJECUTADO ET1	$ 104,133,433.00	% Avc.	24.62%
VALOR POR EJECUTAR ET1	$ 318,743,460.00	% Falt.	75.38%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	$ 1,329,662,738.00	% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	


ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado Anterior	82.00%	81.00%	1.00%
Durante la semana	2.00%	4.00%	-2.00%
Actual Acumulado	84.00%	85.00%	-1.00%


Valor Etapa 1	

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		

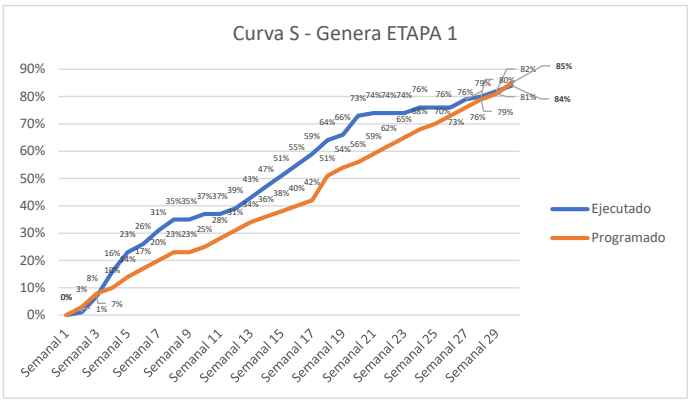

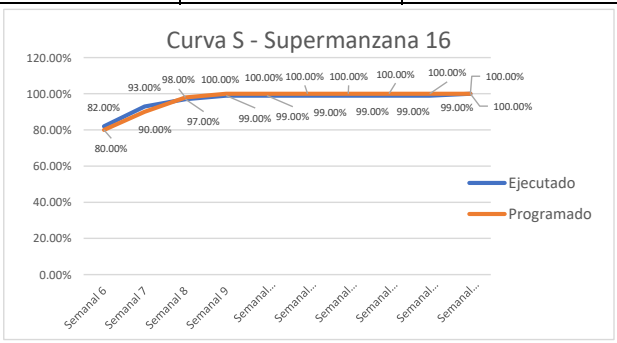


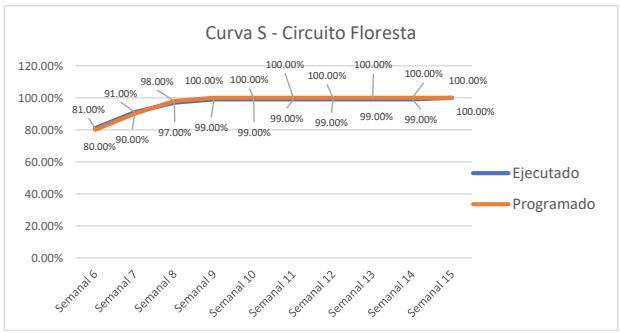


PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

Resumen de la semana	**SUPERMANZANA 16**	**100%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
	Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
	Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%
	CIRCUITO FLORESTA	**100%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
	Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%

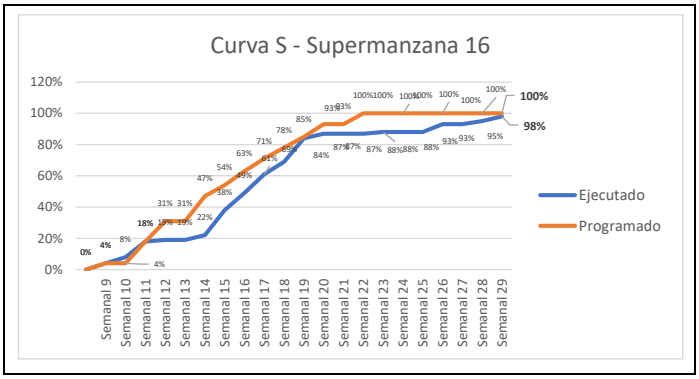

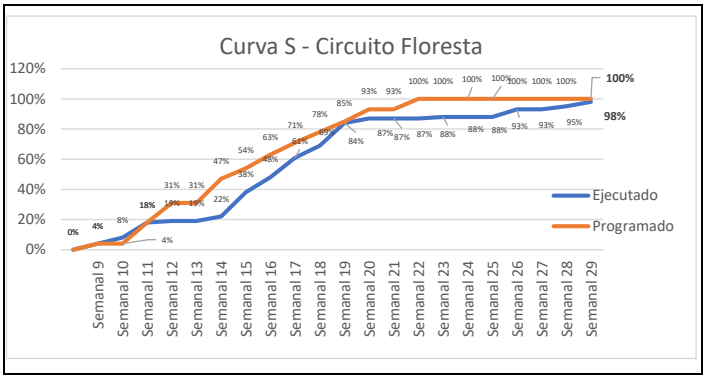

Estado de cronograma por componente FASE II

Resumen de la semana	**SUPERMANZANA 16**	**98%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano Atraso	100%	100%
	Vías transporte y movilidad Atraso	100%	100%
	Redes Hidráulicas	85%	100%
	Redes Secas	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos	100%	100%
	Estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%
	Componente BIM	85%	100%
	CIRCUITO FLORESTA SUR	**98%**	**100%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
	Topografía	100%	100%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
	Vías transporte y movilidad	100%	100%
	Redes Hidráulicas	85%	100%
	Redes Secas	100%	100%
	Arqueología:	100%	100%
	Presupuesto y cronograma	100%	100%
	Geotecnia	100%	100%
	Pavimentos	100%	100%
	Estructuras	100%	100%
	Ambiental y SST	100%	100%
	Social	100%	100%
	Componente BIM	85%	100%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana

Durante la semana comprendida entre el 24/08/2026 y el 30/08/2026
Mesa de componete de Redes hidrosanitarias
Mesa de trabajo revision del cronograma
Reunion presencial - Circuito floresta
Reunion con SDA - SUDS
Comité mi habitat No. 6 Circuito floresta sur.
Comité de seguimiento No. 30 - Virtual
Comité mi habitat No. 6 Supermanzana 16
Mesa de trabajo presencial ETB

CIRCUITO FLORESTA

Actividades ejecutado	Actividades programado
24/08/2026 Mesa de trabajo componente Redes Hidrosanitarias 24/08/2026 Mesa de trabajo del cronograma - Presencial 26/08/2026 SUDS Reunion virtual - SDA 27/08/2026 Comité de seguimiento N° 30 - Virtal 27/08/2026 Reunion mi habitat en Supermanzana 16 28/08/2026 Mesa de trabajo con ETB 27/08/2026 Reunion mi habitat en Supermanzana 16	01/09/2026 Comité de seguimiento BIM 03/09/2026 Comité de seguimiento semanal N31 - Presencial 03/09/2026 Reunion de Eco Barios

KENNEDY SUPERMANZANA 16

Actividades ejecutado	Actividades programado
24/08/2026 Mesa de trabajo componente Redes Hidrosanitarias 24/08/2026 Mesa de trabajo del cronograma - Presencial 25/08/2026 Reunion presencial en circuito floresta sur 26/08/2026 SUDS Reunion virtual - SDA 26/08/2026 Reunion mi habitat - Circuito Floresta sur 27/08/2026 Comité de seguimiento N° 30 - Virtal 28/08/2026 Mesa de trabajo con ETB	01/09/2026 Comité de seguimiento BIM 03/09/2026 Comité de seguimiento semanal N31 - Presencial 03/09/2026 Reunion de Eco Barios

Modo de	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	%PROGRAMADO	% COMPLETADO	%PROGRAMADO	%DIFE
	1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 dias	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	85%	84%	85%	-1%
	1.1	ETAPA 1	162 dias	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 947.833.395,99	85%	84%	85%	-1%
✓	1.1.1	Acta de inicio	0 dias	4 febrero 2026 9:	4 febrero 2026 9:0	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 dias	5 febrero 2026 7:	5 febrero 2026 7:0	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 dias	6 febrero 2026 9:	10 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.4	Ajuste de observaciones	2 dias	11 febrero 2026 9	12 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 dias	11 febrero 2026 7	11 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 dias	12 febrero 2026 9	16 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.7	Ajuste de observaciones	2 dias	17 febrero 2026 9	18 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 dias	13 febrero 2026 7:00 p. m.	13 febrero 2026 7:00 p. m.	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 dias	16 febrero 2026 9	18 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
✓	1.1.10	Ajuste de observaciones	2 dias	19 febrero 2026 9	20 febrero 2026 7:	$ 0,00	100%	100%	100%	0%
	1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 dias	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 473.916.712,99	85%	84%	85%	-1%
✓	1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dias	4 febrero 2026 9	6 abril 2026 7:00	$ 105.304.281,00	100%	100%	100%	0%
	1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.467,99	100%	98%	100%	-2%
	1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dias	3 julio 2026 7:00	2 octubre 2026 7:	$ 210.655.964,00	60%	24%	60%	-36%
	1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 dias	4 febrero 2026 9	2 octubre 2026 7:	$ 473.916.683,00	85%	84%	85%	-1%
✓	1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dias	4 febrero 2026 9	6 abril 2026 7:00	$ 105.304.281,00	100%	100%	100%	0%
	1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dias	7 abril 2026 9:00	3 julio 2026 7:00	$ 157.956.438,00	100%	98%	100%	-2%
	1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dias	3 julio 2026 7:00	2 octubre 2026 7:	$ 210.655.964,00	60%	24%	60%	-36%

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST	COMPONENTE AMBIENTAL
El 27 de agosto se recibio el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-447 con la subsanacion al informe mensual N6 V2	El 24 de agosto se envió oficio SDH-1330-2025-0429 con la aprobación del informe mensual 6 - Julio V2 El 26 de agosto se asistió a reunión SUDS con Martha Molina El 26 de agosto se asistió a mesa de trabajo del POC con supervisión, contratista e interventoría El 27 de agosto se asistió a comité integral virtual El 27 de agosto se envió oficio SDH-1330-2025-0439 con la aprobación del Plan de Gestión de Riesgos V5

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".	
TIPO DE DOCUMENTO	CONTRATO No Y NOMBRE
INFORME SEMANAL No 29	Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025□

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 29 DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2026□	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 20/04/2026	20/04/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social llega comunicado de aprobación con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026.
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social El contratista remite mediante oficio CCH-001-SDHT-1269-258 encuesta de caracterización para revisión y aprobación.	09/03/2026 07/05/2026	12/03/2026 07/05/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha limite de entrega el 22 de junio del 2026. Se realiza verificación del documento y encuesta, por lo que al remitir se verifica que sea el mismo para dar el correspondiente aprobación por parte de la interventoría para su aplicación.
	Se recibe avance de caracterización social por parte del contratista	23/06/2023	23/06/2026 al 25/06/2026	Se realiza revisión de documento al cual se le emiten observaciones y reenvía con copia a la entidad para revisión y concepto.
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS	Se recibe documento de matriz de impacto para revisión de la interventoría	NA	NA	Se remite mediante oficio,SDH-1330-2025-0314, las observaciones al documento correspondiente a la matriz de impactos y el documento se encuentra en subsanación.
	Se recibe metodología del programa de identificación de impactos sociales, el cual se da aprobación, para su implementación, actualmente se encuentra en aplicación a la comunidad por parte del contratista	21/05/2026	21/05/2026 al 23/05/2026	Se da aprobación a la metodología y a las herramientas de el plan de evaluación e identificación de impactos para su aplicación.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	Se realiza seguimiento a los PSI y PAC	26/08/2026	26/08/2026 al 27/08/2026	Se realiza seguimiento a los puntos de atención a la comunidad
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se recibe metodología del sexto comité Mi Hábitat polígono supermanzana 16	24/08/2026	24/08/2026 al 27/08/2026	Se da aprobación a la metodología para su aplicación.
	Se recibe metodología de comité mi Habitat de circuito floresta sur	24/08/2026	24/08/2026 al 27/08/2026	Se da aprobación a la metodología para su aplicación.
	Se realiza el sexto comité mi Hábitat de circuito floresta sur	26/08/2026	26/08/2026	Se realiza comité mi Hábitat en donde se trabaja el tema de seguridad para etapa 2 de construcción y se dan avances de la pase 3
	Se realiza el sexto comité mi Hábitat de Parque ciudad Kennedy Oriental - Supermanzana 16□	27/08/2026	27/08/2026	Se realiza comité mi Hábitat en donde se trabaja el tema de Ecobarrios para etapa 2 de construcción y se dan avances de la pase 3
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se asiste al comité técnico N° 29	20/08/2026	20/08/2026	Se asiste al comité técnico # 29 en donde se indican los avances del proyecto
	Se continua en la elaboración del informe mensual de interventoría	24/08/2026	24/08/2026 al 30/08/2026	Se continúa con proceso de elaboración de informe mensual de julio del 2026.
CORRESPONDENCIA	Se recibe informe semanal N° 28 del contratista	25/08/2026	25/08/2026 al 27/08/206	Se realiza verificación al informe al cual se le da aprobacion, con remisión a la entidad
	Se remite informe semanal N 28 de la interventoría a la entidad	24/08/2026	24/085/2026	se remite informe semanal N 28 a la entidad para fines pertinentes.
	Se remite aprobación al informe mensual social 6 del contratista	24/08/2026	24/08/2026	Se da aprobación al informe mensual social 6 del contratista bajo radicado SDH-1330-2025-430
	Se remite solicitud de concepto a la entidad a las piezas informativas remitidas por el contratista	24/08/2026	24/08/2026	Se remite piezas informativas a la entidad para concepto de la misma
	Se recibe concepto de observado por parte de la entidad al informe semanal 26	21/08/2026	21/08/2026	Se recibe concepto de observado al informe semanal 26 por parte de la entidad

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN ALISTAMIENTO	

TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO	

TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	

N/A

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

32. PERSONAL INTERVENTORÍA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARÍA**	**CANT.**	**UBICACIÓN**	**DÍA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR CONSULTORÍA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1				**ESTADO**		
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1				**LLUVIOSO (L)**		
		AFORADOR PARA MOV. 1	1				**FAVORABLE (F)**		
		AFORADOR PARA MOV. 2	1				**SOLEADO (S)**		

TOTAL DE PERSONAL	**16**	**TOTAL DE PERSONAL**	**25**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	

36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

38. OBSERVACIONES

A la fecha, se encuentran dos componentes en proceso de revisión y ajuste, como parte de las actividades requeridas para obtener la aprobación y formalizar el cierre de la Fase II, permitiendo así dar continuidad a las actividades previstas en el contrato.
En este sentido, se han desarrollado y continúan programándose mesas de trabajo y jornadas de revisión técnica con los profesionales y especialistas correspondientes, con el propósito de atender las observaciones pendientes, realizar los ajustes requeridos y avanzar hacia el cierre y aprobación definitiva de los componentes.

39. RECOMENDACIONES

Durante el periodo objeto del presente informe, se adelantaron reuniones y jornadas de presentación del proyecto con las diferentes entidades involucradas, con el fin de socializar los alcances y componentes del proyecto, atender las observaciones y requerimientos correspondientes y gestionar las aprobaciones necesarias para dar continuidad al proceso y avanzar hacia el inicio de la etapa de construcción.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Descripción: Comité mi Habitat N6 - Circuito Floresta Sur	Descripción: Comité mi Habitat N6 - Supermanzana 16	Descripción: Mesa de trabajo ETB
		
Descripción:	Descripción:	Descripción:
