ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

CONTRATO N°	MRAM-SAMC-013-2024
FECHA DEL CONTRATO	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2024
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL	1658 DEL CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT: 891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS R/L PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA C.C 7.185.919 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ
VALOR INICIAL	OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($84.657.202) M/CTE
VALOR ADICIÓN NO. 001	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PRESOS ($41.992.483) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($126.649.685)
PLAZO	VEINTE (20) DIAS
FECHA PRORROGA No. 001	CINCO (05) DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO PRORROGA No. 001	CUARETA (40) DÍAS
FECHA PRORROGA NO. 002	DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2025.
TIEMPO PRORROGA NO. 002	TREINTA DIAS (30) DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVENTA (90) DÍAS
PÓLIZA NO.	N° 39-44-101167630 DE CUMPLIMIENTO Y N° 39-40-101043865 DE RCE
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	RESOLUCIÓN N°582 DEL ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD URBANA; ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO
FECHA DE INICIO	ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 001	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE REINICIO	VEINIOCHO (28) DE ENERO DE 2025.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 002	VEINTICINCO (25) DE MARZO 2025.

FECHA ACTA DE REINICIO NO. 002	TREINTA (30) DE JULIO 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DEL 2025

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De acuerdo al contrato MRAM-SAMC-013-2024, las actividades a ejecutar son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120HP Y MAX 215 HP.2HR/KM	HR	168	$190.600	$32.020.800
2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	130	$133.500	$17.355.000
3	ALQUILER VOLQUETA VIAJE HASTA 5KM	M3/KM	14000	$1.850	$25.900.000
				SUBTOTAL	$75.275.800
				IVA (19%)	$9.381.402
				COSTO TOTAL	**84.657.202**

Se realiza documento de adición No. 001 el día cinco (05) de febrero de 2025, por un valor de cuarenta y un millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos ($41.992.483), el cual se discrimina a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120HP Y MAX 215 HP.2HR/KM	HR	63	$ 190.600,00	$12.007.800,00
2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	50	$ 133.500,00	$6.675.000,00
3	ALQUILER VOLQUETA VIAJE HASTA 5KM	M3/KM	2800	$ 1.850,00	$5.180.000,00
4	ALQUILER RETROEXCAVADORA	HR	90	$ 136.134,00	$12.252.060,00
SUBTOTAL					$36.114.860,00

IVA (19%)	$5.877.623,40
COSTO TOTAL	**$ 41.992.483**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realiza las actividades según las especificaciones solicitadas en el proceso de contratación número MRAM-SAMC-013-2024, y documento de adición No. 001 de fecha cinco de febrero de 2025, las cuales se especifican a continuación, de acuerdo a lo ejecutado, lo cual presentó cambios, esto según las necesidades finales establecidas en campo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120HP Y MAX 215 HP.2HR/KM	HR	243	$190.600	$46.315.800
2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	247	$133.500	$32.974.500
3	ALQUILER VOLQUETA VIAJE HASTA 5KM	M3/KM	13.937,7	$1.850	$25.784.745
4	Retro excavadora	HR	40	$136.134	$5.445.360
				SUBTOTAL	$110.520.405
				IVA (19%)	$16.099.775,40
				COSTO TOTAL	**$126.620.180,40**

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se muestra el registro fotográfico que demuestra lo realizado por el contratista.

CUADRO DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES.

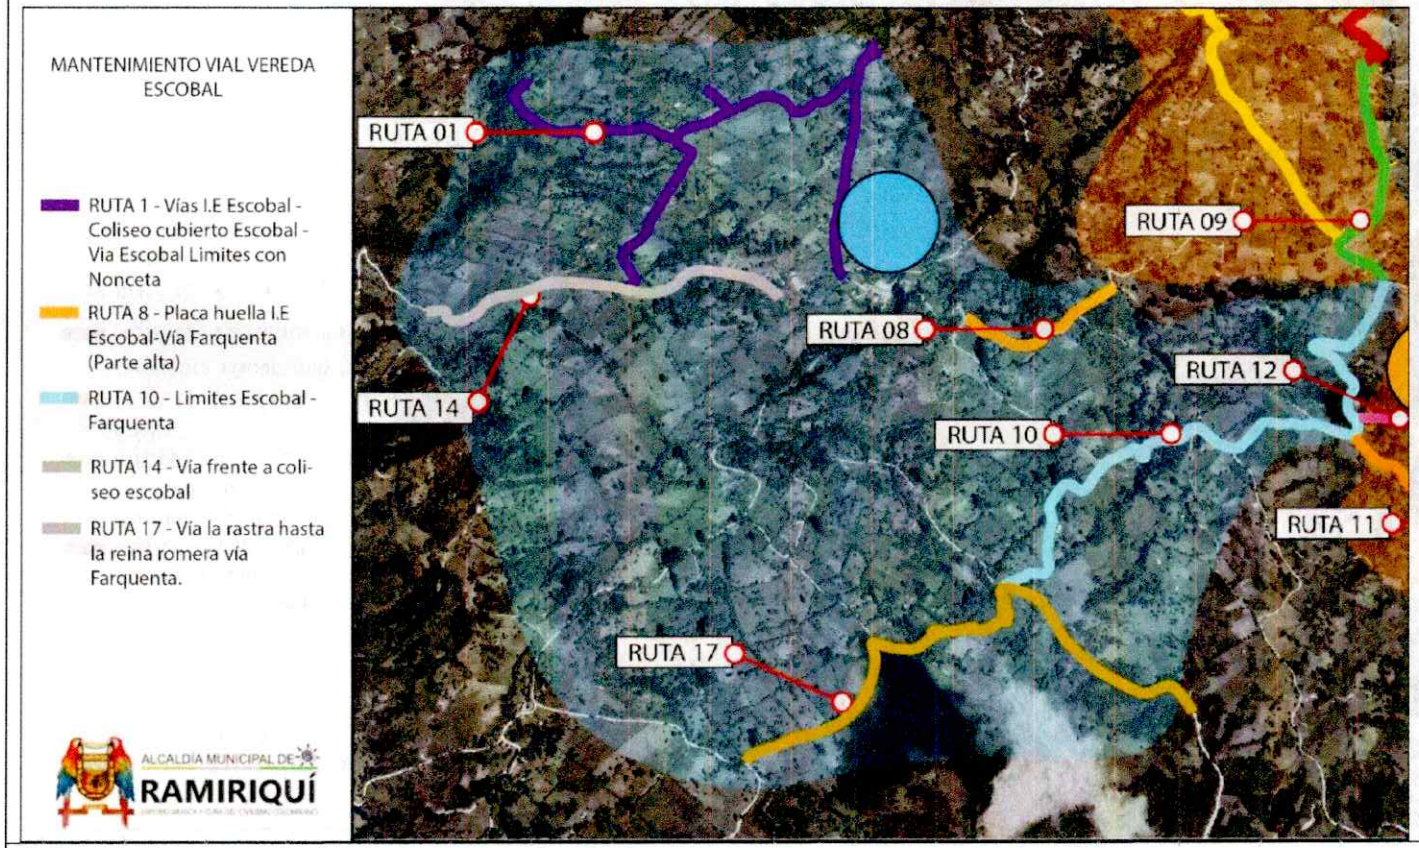
Para la ejecución del presente contrato, se intervinieron algunas de las vías de las veredas de Guacamayas, Farquentá, Pantano Largo, Escobal, los Tunos (sector) y Naguata, veredas en las cuales se realizo mantenimiento de las principales vías y/o las que se encontraban con mayor afectación.

NUMERO RUTA	VEREDA
RUTA 1	Vías I.E Escobal Coliseo cubierto Escobal – Vía Escobal límites con Nonceta

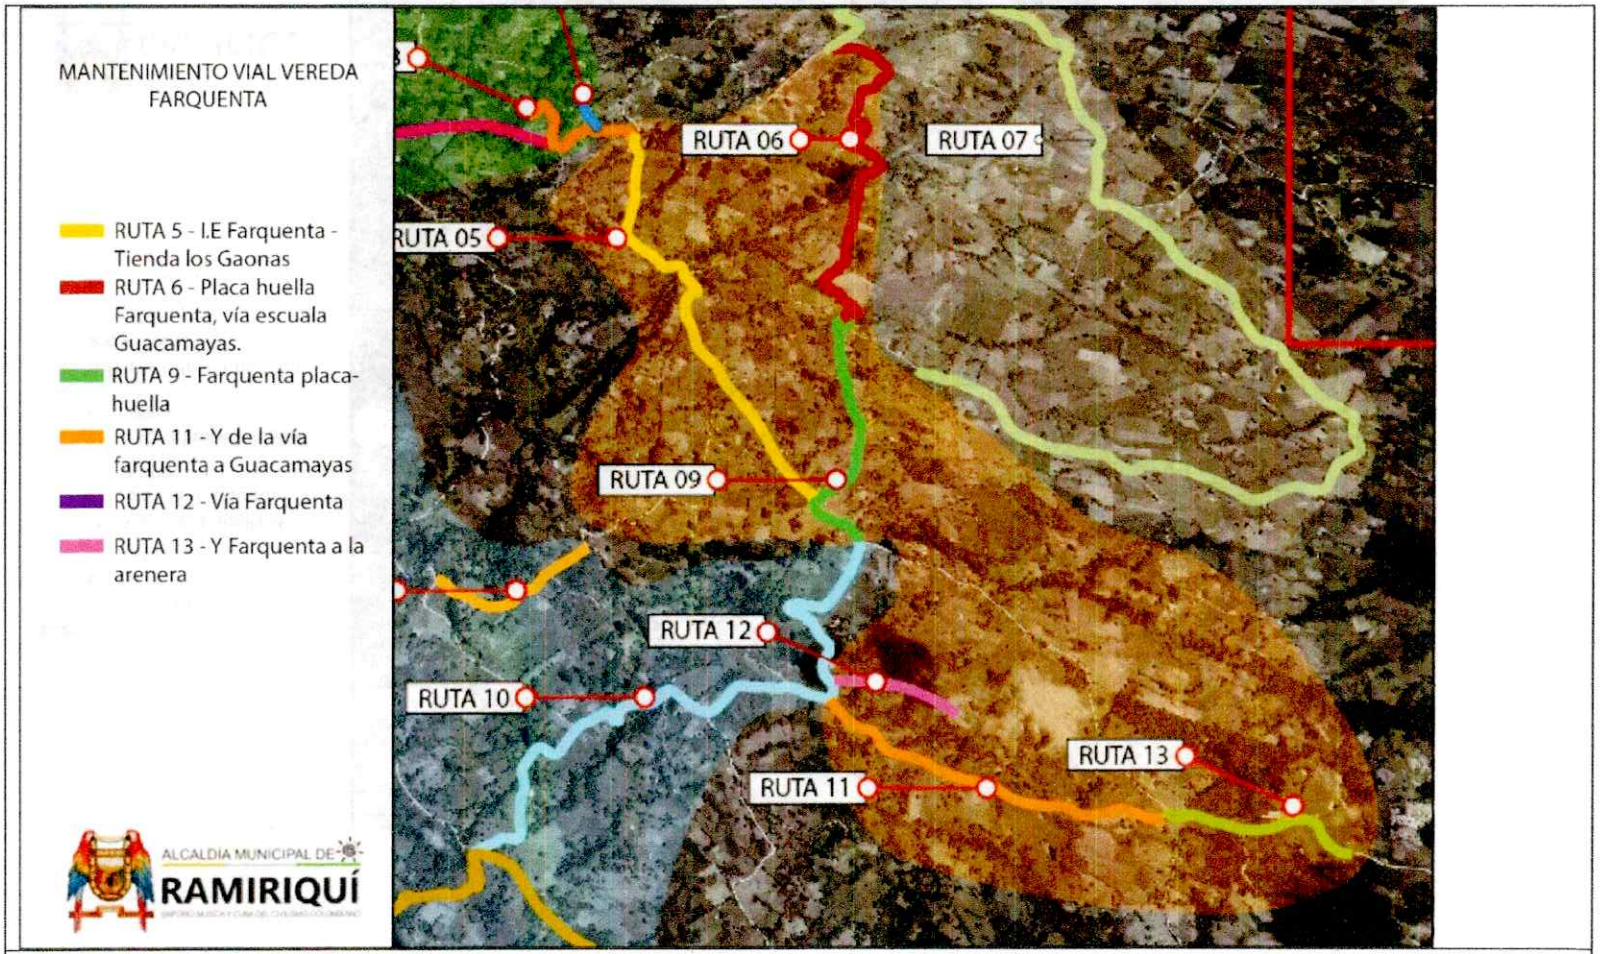
RUTA 2	Y Pantano largo la cenda
RUTA 3	Vía Pantano Largo la cenda
RUTA 4	Entrada I.E Pantano
RUTA 5	I.E Farquenta – Tienda los Gaonas
RUTA 6	Placa huella Farquenta – Vía escuela Guacamayas
RUTA 7	Parte alta placa huella – al Paramo - Guacamayas
RUTA 8	Placa huella I.E Escobal – Vía Farquenta (parte alta)
RUTA 9	Farquenta placa huella
RUTA 10	Limites Escobal - Farquenta
RUTA 11	Y de la vía Farquenta a Guacamayas
RUTA 12	Vía Farquenta
RUTA 13	Y Farquenta a la arenera
RUTA 14	Vía frente a coliseo Escobal
RUTA 15	Vía capilla los tunos
RUTA 16	Ramal Capilla los tunos – Vía principal casco urbano – Vereda Escobal

(Anexo 1, mapa de mantenimiento vial)

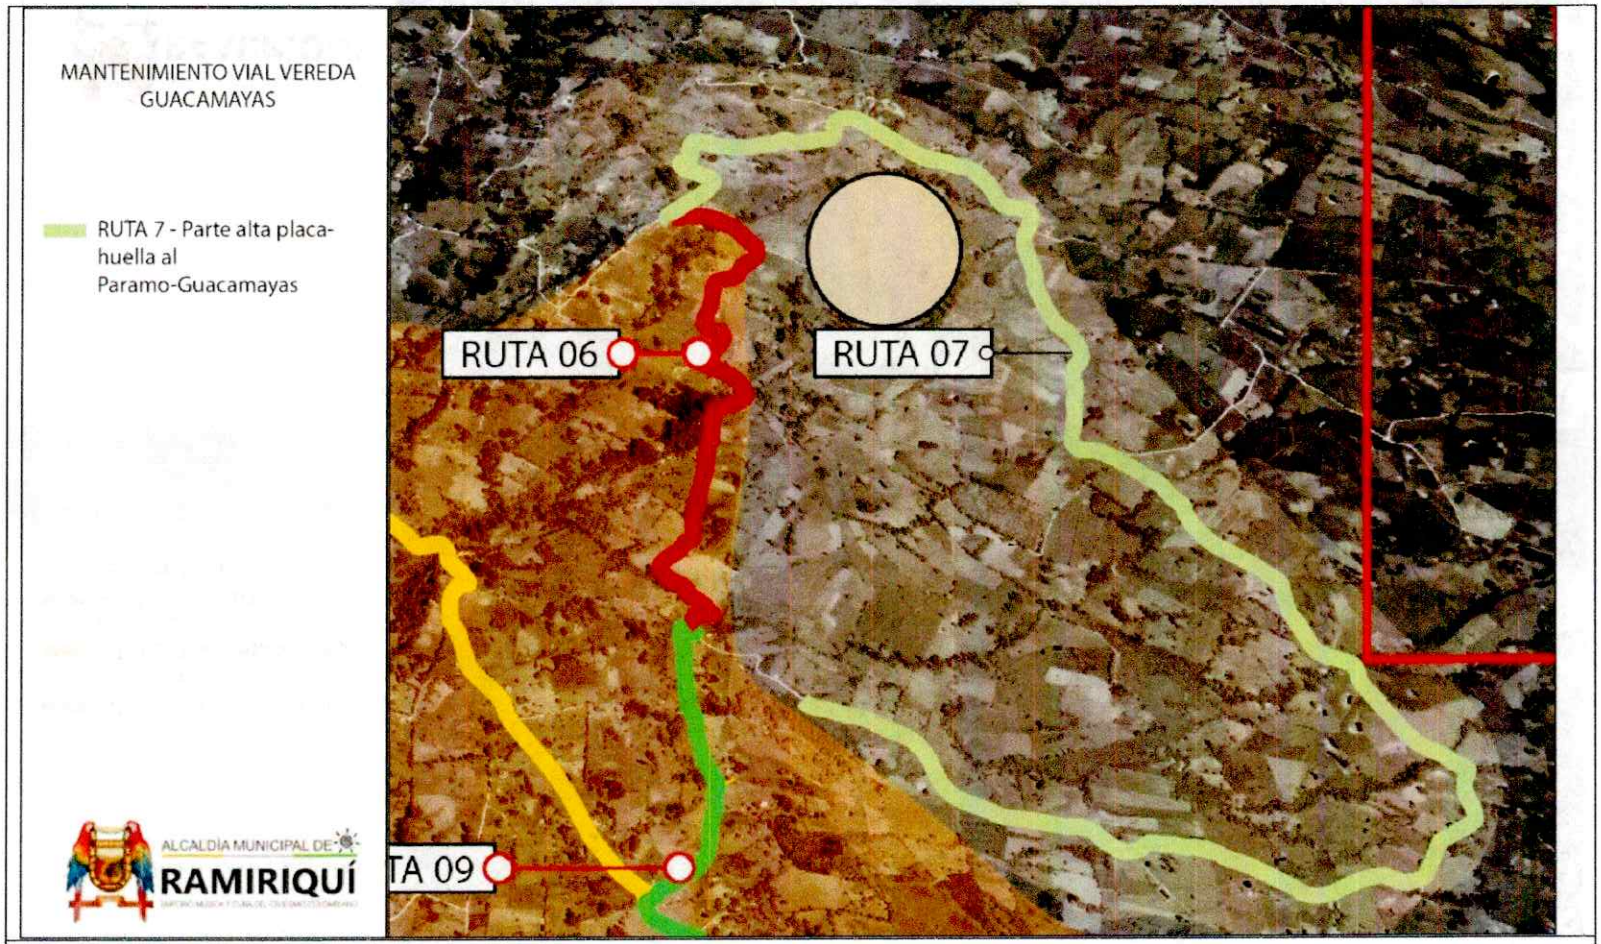
ESQUEMA VIAS INTERVENIDAS



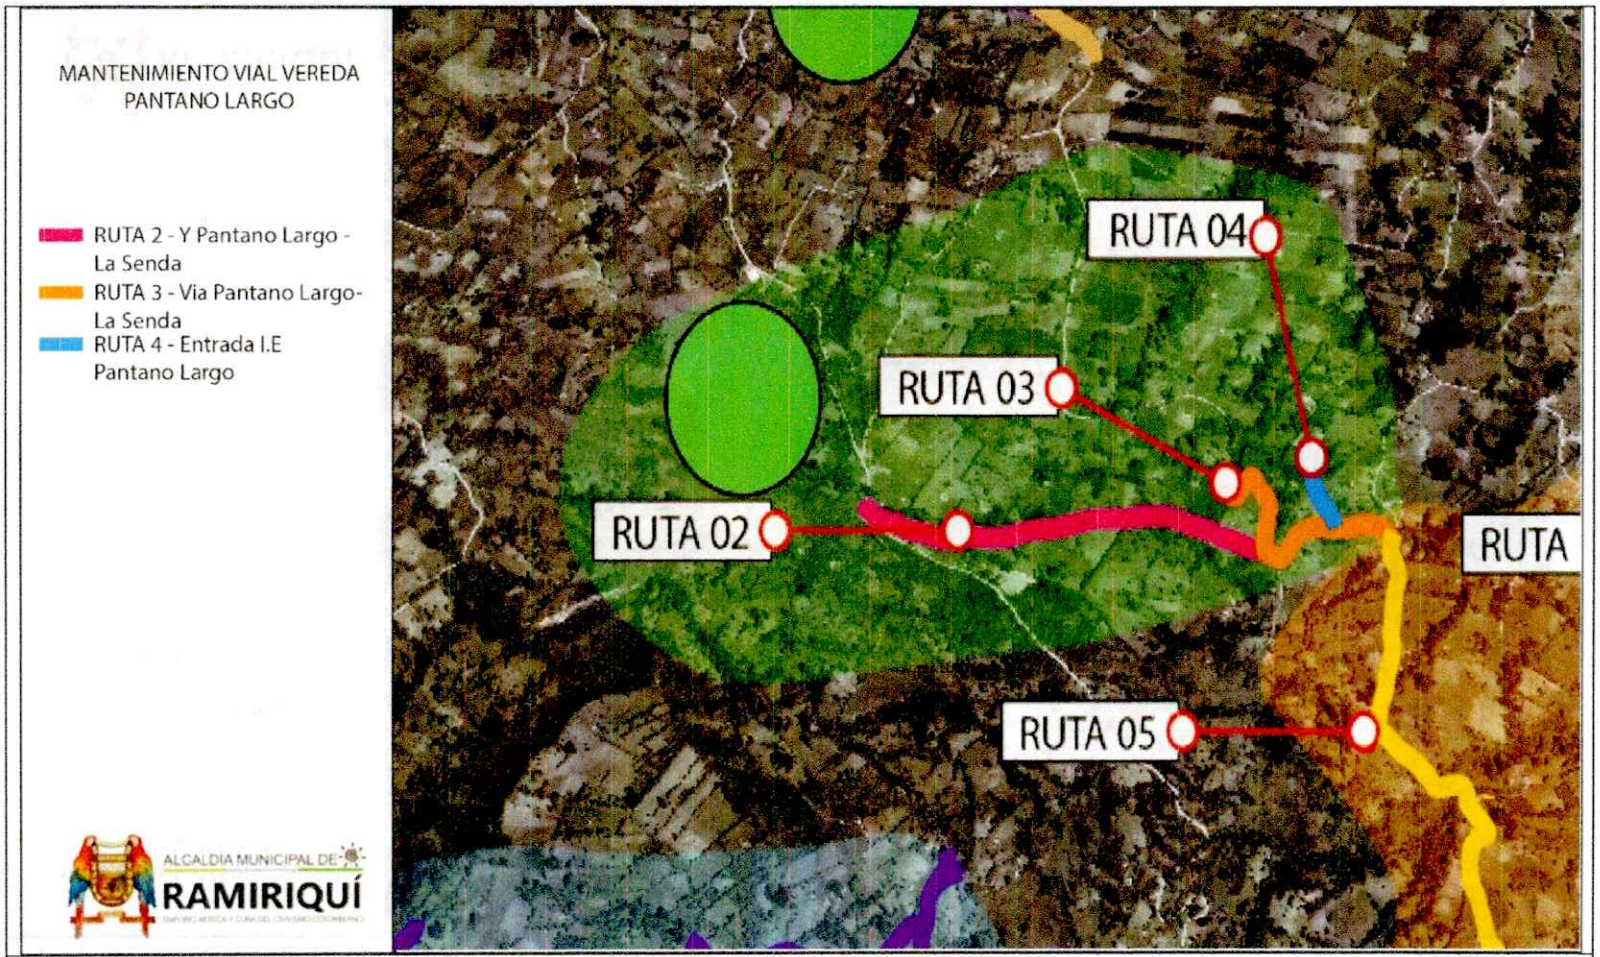
Rutas relacionadas dentro de la vereda Escobal.



Rutas relacionadas dentro de la vereda Farquenta.



Rutas relacionadas dentro de la vereda Guacamayas



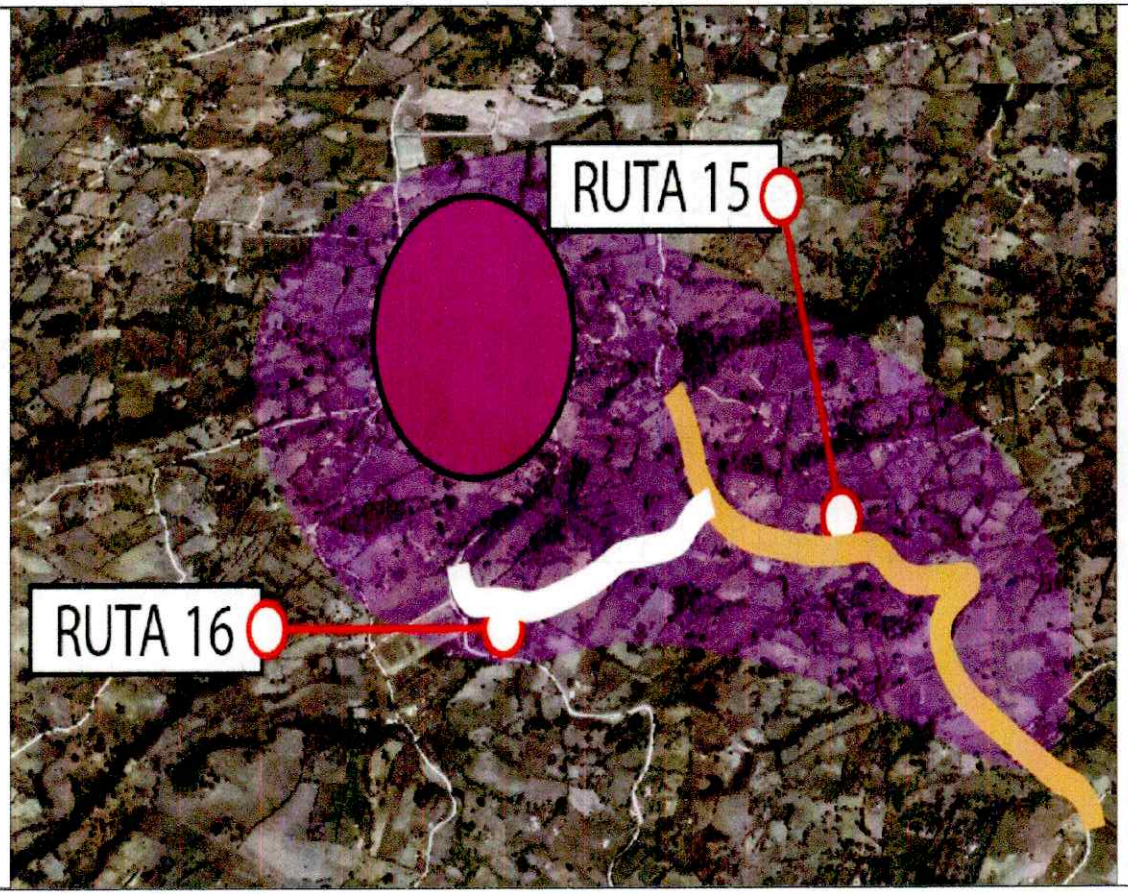
Rutas relacionadas dentro de la vereda Pantano Largo.

MANTENIMIENTO VIAL VEREDA LOS TUNOS Y NAGUATA

RUTA 15 - Vía capilla los tunos

RUTA 16- Ramal capilla los tunos vía principal casco urbano - vrda Escobal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ



Rutas relacionadas dentro de las veredas Los Tunos y Naguata

1	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120HP Y MAX 215 HP.2HR/KM	HR	243

DÍA	FECHA	HORAS EJECUTADAS
MARTES	28/01/2025	7,7
MIÉRCOLES	29/01/2025	8,1
JUEVES	30/01/2025	8,6
VIERNES	31/01/2025	8,7
SÁBADO	01/02/2025	5,7
DOMINGO	02/02/2025	
LUNES	03/02/2025	7,0
MARTES	04/02/2025	0,8
SÁBADO	08/02/2025	2,2
DOMINGO	09/02/2025	
LUNES	10/02/2025	9,6
MARTES	11/02/2025	
MIÉRCOLES	12/02/2025	6,1
JUEVES	13/02/2025	8,2
VIERNES	14/02/2025	7,2
SÁBADO	15/02/2025	
DOMINGO	16/02/2025	
LUNES	17/02/2025	6,5
MARTES	18/02/2025	6,5
MIÉRCOLES	19/02/2025	8,8
JUEVES	20/02/2025	7,8
VIERNES	21/02/2025	9,0
SÁBADO	22/02/2025	
DOMINGO	23/02/2025	
LUNES	24/02/2025	
MARTES	25/02/2025	8,3
MIÉRCOLES	26/02/2025	8,1
JUEVES	27/02/2025	
VIERNES	28/02/2025	
SÁBADO	01/03/2025	
DOMINGO	02/03/2025	

LUNES	03/03/2025	
MARTES	04/03/2025	5,5
MIÉRCOLES	05/03/2025	8,0
JUEVES	06/03/2025	8,0
VIERNES	07/03/2025	8,0
SÁBADO	08/03/2025	7,0
DOMINGO	09/03/2025	
LUNES	10/03/2025	2,0
MARTES	11/03/2025	
MIÉRCOLES	12/03/2025	3,0
JUEVES	13/03/2025	
VIERNES	14/03/2025	4,5
SÁBADO	15/03/2025	
DOMINGO	16/03/2025	
LUNES	17/03/2025	5,0
MARTES	18/03/2025	3,2
MIÉRCOLES	19/03/2025	6,0
JUEVES	20/03/2025	4,3
VIERNES	21/03/2025	7,4
SÁBADO	22/03/2025	
DOMINGO	23/03/2025	
LUNES	31/07/2025	8,8
VIERNES	01/08/2025	7,0
SÁBADO	02/08/2025	4.1
DOMINGO	03/08/2025	
LUNES	04/08/2025	8.3
MARTES	05/08/2025	8.0
243		

2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	247

DÍA	FECHA	HORAS EJECUTADAS
MARTES	28/01/2025	8,7
MIÉRCOLES	29/01/2025	9,0
JUEVES	30/01/2025	9,0
VIERNES	31/01/2025	9,8
SÁBADO	01/02/2025	6,3
DOMINGO	02/02/2025	
LUNES	03/02/2025	7,4
MARTES	04/02/2025	2,4
SÁBADO	08/02/2025	2,3
DOMINGO	09/02/2025	
LUNES	10/02/2025	
MARTES	11/02/2025	9.3
MIÉRCOLES	12/02/2025	6,0
JUEVES	13/02/2025	8,0
VIERNES	14/02/2025	7,5
SÁBADO	15/02/2025	
DOMINGO	16/02/2025	
LUNES	17/02/2025	6,0
MARTES	18/02/2025	6,8
MIÉRCOLES	19/02/2025	8,6
JUEVES	20/02/2025	8,0
VIERNES	21/02/2025	9,0
SÁBADO	22/02/2025	
DOMINGO	23/02/2025	
LUNES	24/02/2025	
MARTES	25/02/2025	
MIÉRCOLES	26/02/2025	8,1
JUEVES	27/02/2025	8,3
VIERNES	28/02/2025	

SÁBADO	01/03/2025	
DOMINGO	02/03/2025	
LUNES	03/03/2025	
MARTES	04/03/2025	5,5
MIÉRCOLES	05/03/2025	8,0
JUEVES	06/03/2025	8,0
VIERNES	07/03/2025	8,0
SÁBADO	08/03/2025	6.5
DOMINGO	09/03/2025	
LUNES	10/03/2025	
MARTES	11/03/2025	2.5
MIÉRCOLES	12/03/2025	3,2
JUEVES	13/03/2025	4.3
VIERNES	14/03/2025	5.2
FIN DE SEMANA		
LUNES	17/03/2025	3.0
MARTES	18/03/2025	6.1
MIÉRCOLES	19/03/2025	8.7
JUEVES	20/03/2025	4.2
VIERNES	21/03/2025	4,8
MIÉRCOLES	30/07/2025	6,0
JUEVES	31/07/2025	8.1
VIERNES	01/08/2025	6,3
SÁBADO	02/08/2025	
DOMINGO	03/08/2025	
LUNES	04/08/2025	4,0
MARTES	05/08/2025	4,1
247		

RELACION DE TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO VIAL.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	VIAJES	M3-KM
31/01/2025	ACOPIO	ESCOBAL	10	630.00
		FARQUENTA	5	385.00
04/02/2025	ACOPIO	FARQUENTA	3	231.00
		ESCOBAL	4	252.00

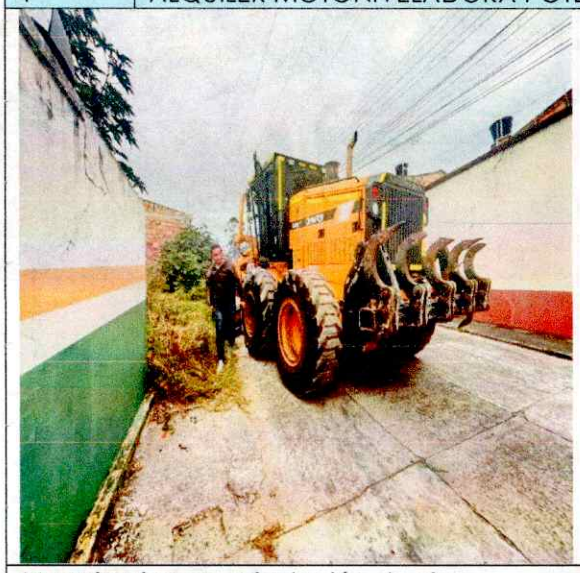
10/02/2025	ACOPIO	FARQUENTA	8	616.00
12/02/2025	ACOPIO	FARQUENTA	10	770.00
13/02/2025	ACOPIO	FARQUENTA	4	308.00
14/02/2025	ACOPIO	FARQUENTA	10	770.00
17/02/2025	ACOPIO	FARQUENTA	10	770.00
		PANTANO LARGO	4	252.00
18/02/2025	ACOPIO	PANTANO LARGO	16	1008.00
19/02/2025	ACOPIO	PANTANO LARGO	11	693.00
20/02/2025	ACOPIO	PANTANO LARGO	18	1134.00
21/01/1900	ACOPIO	PANTANO LARGO	10	630,00
		NAGUATA	3	119,70
28/02/2025	ACOPIO	GUACAMAYAS	12	840.00
05/03/2025	ACOPIO	GUACAMAYAS	8	560.00
06/03/2025	ACOPIO	GUACAMAYAS	12	840.00
11/03/2025	ACOPIO	TUNOS	12	294.00
12/03/2025	ACOPIO	PANTANO LARGO	10	630.00
13/03/2025	ACOPIO	PANTANO LARGO	10	630.00
14/03/2025	ACOPIO	PANTANO LARGO	5	315.00
17/03/2025	ACOPIO	PANTANO LARGO	10	630,00
18/03/2025	ACOPIO	PANTANO LARGO	10	630,00
TOTAL, EJECUTADO				**13937.7**

4	**Retro excavadora**	**HR**	**40.2**

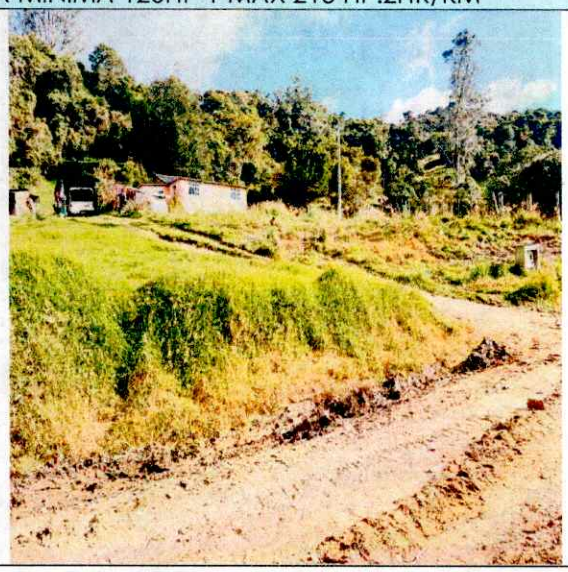
DÍA	FECHA	HORAS/DÍA
MARTES	18/02/2025	4.0
MIERCOLES	19/02/2025	8.0
JUEVES	20/02/2025	7.8
VIERNES	21/02/2025	7.9
FIN DE SEMANA		
LUNES	24/02/2025	
MARTES	25/02/2025	
MIERCOLES	26/02/2025	8.0
JUEVES	27/02/2025	4.5
40.2		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120HP Y MAX 215 HP.2HR/KM



Maquinaria para nivelación de vias



Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado



Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

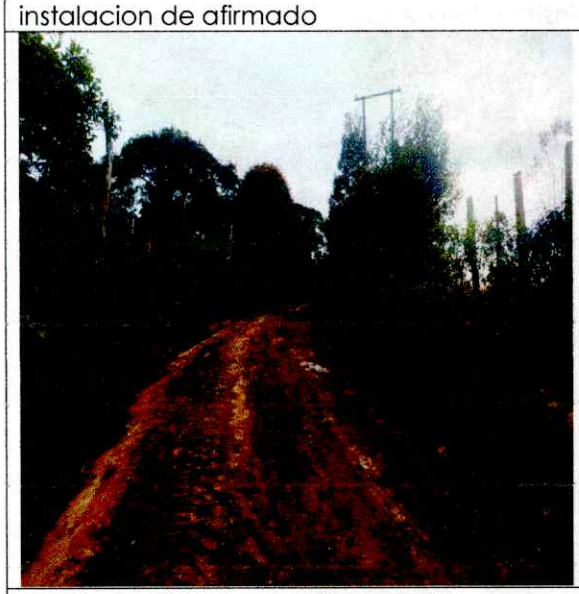


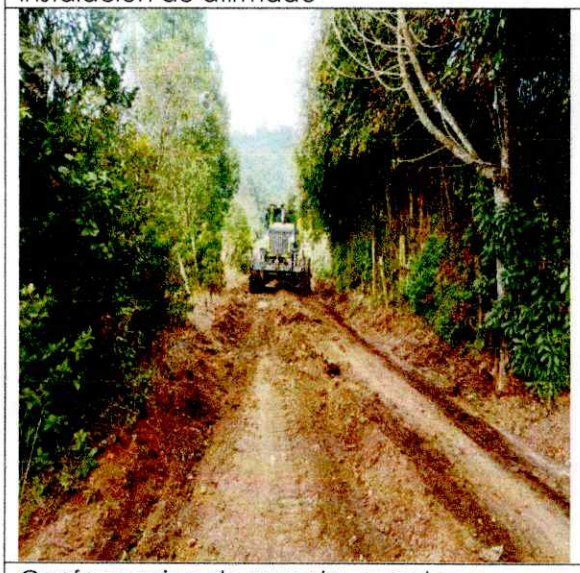
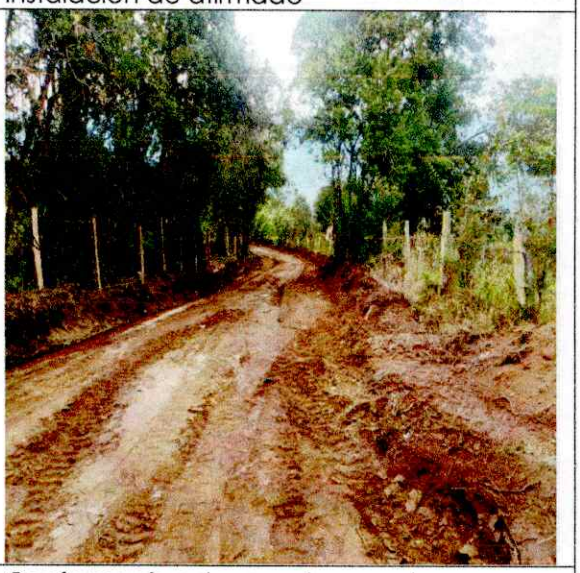
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

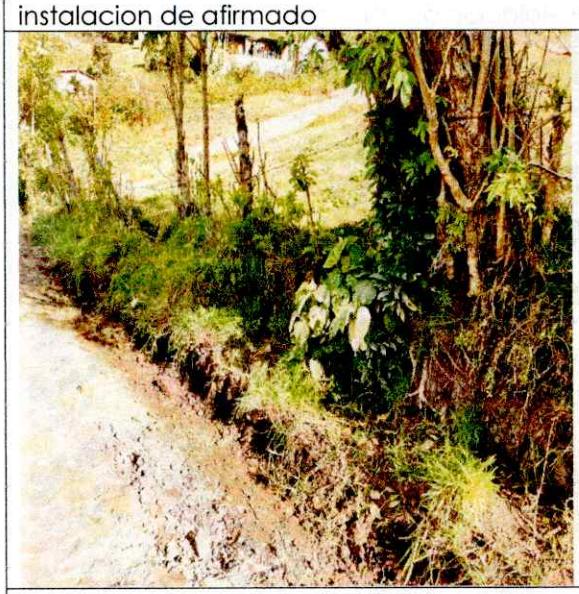
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

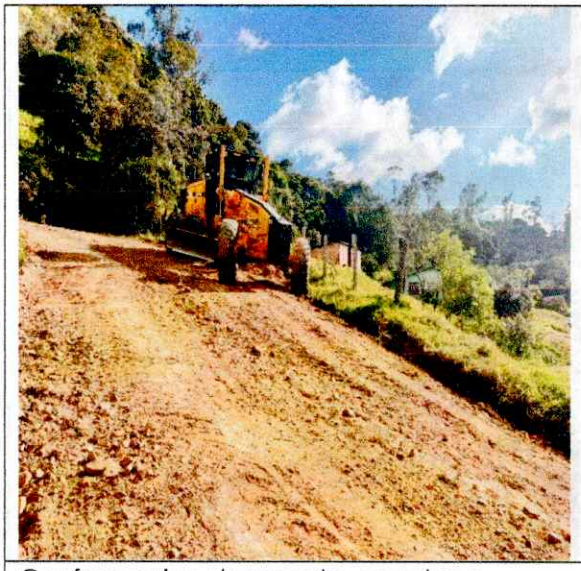
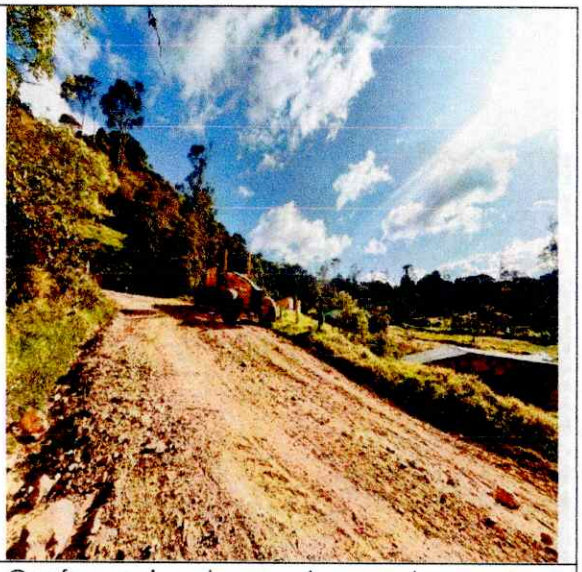
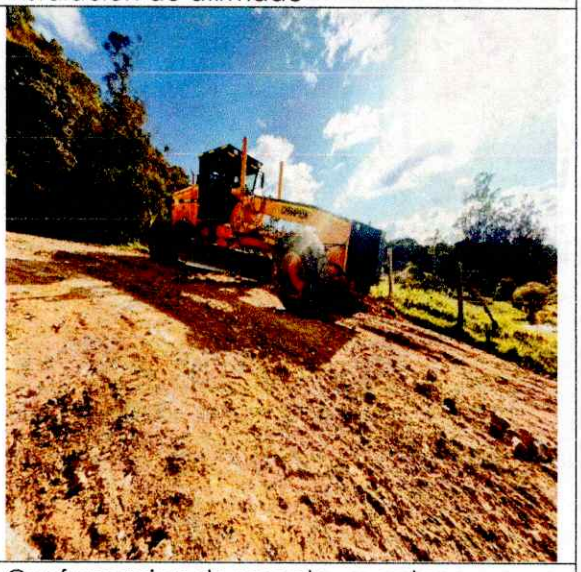
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

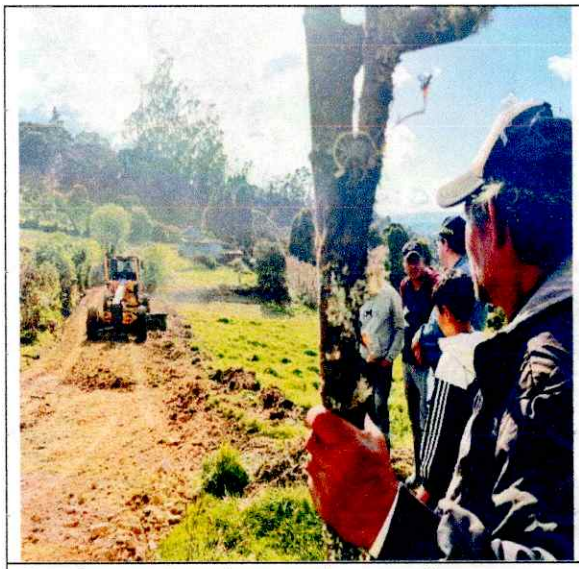
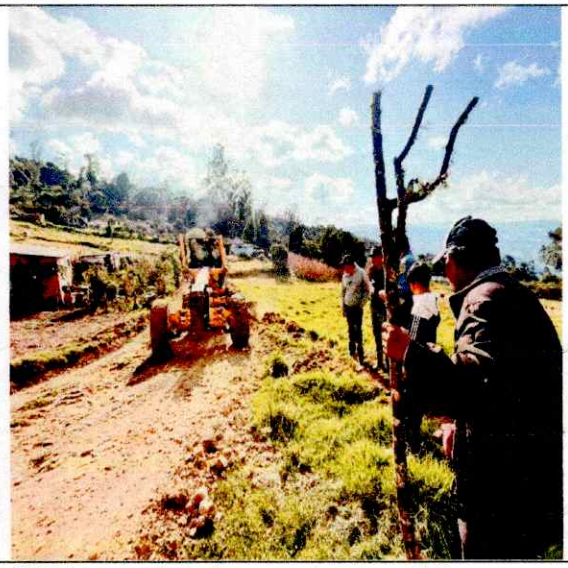
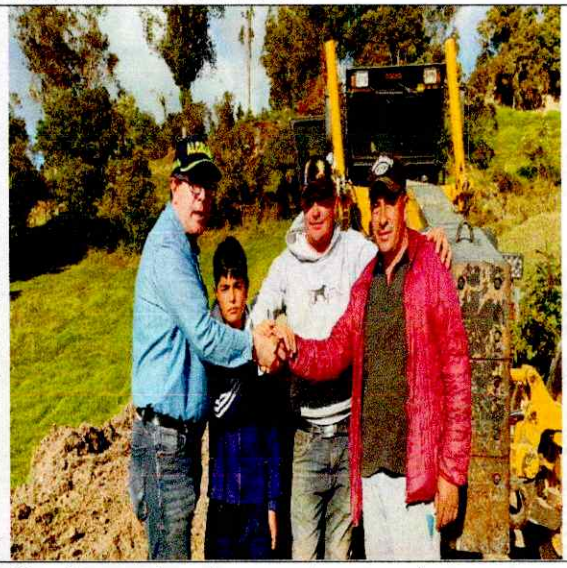
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

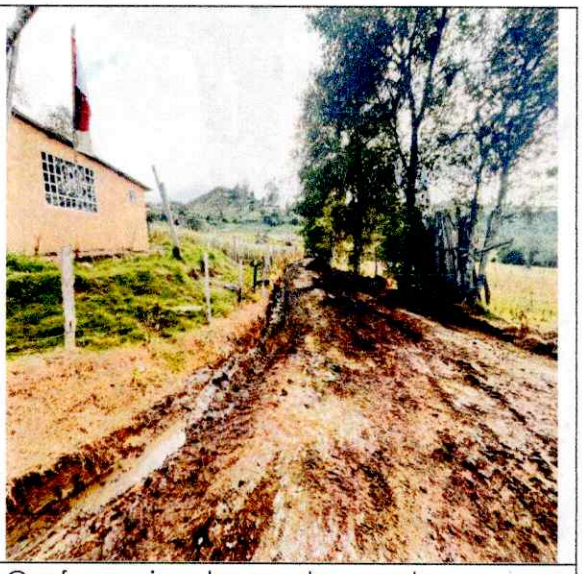
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

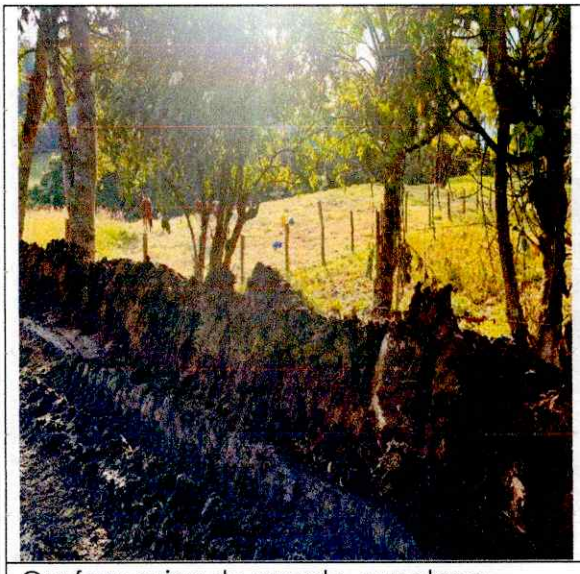
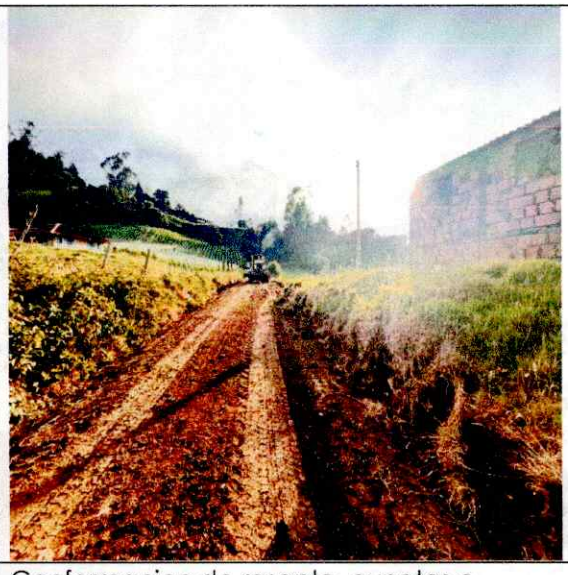
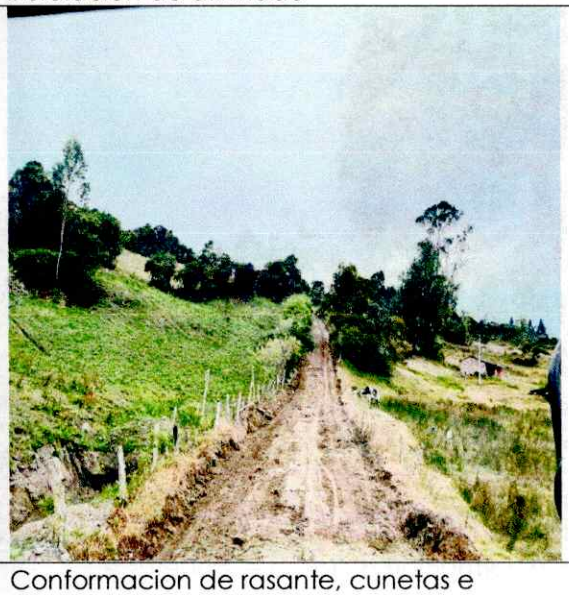
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

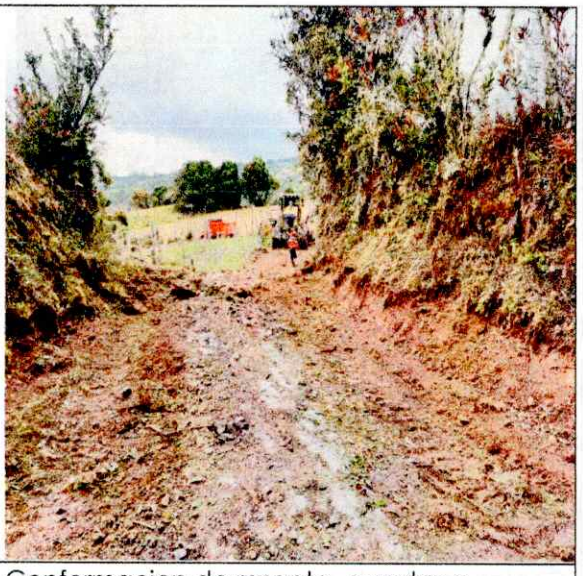
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

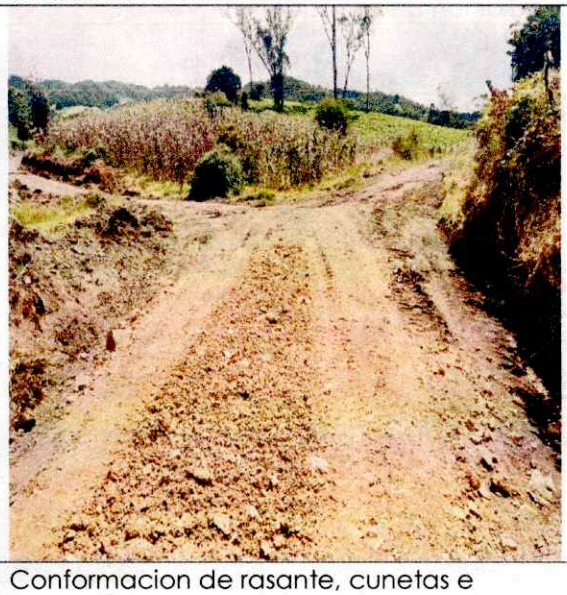
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

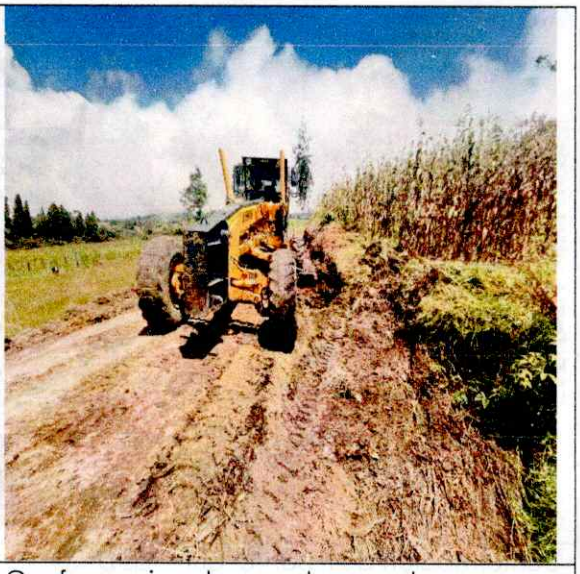
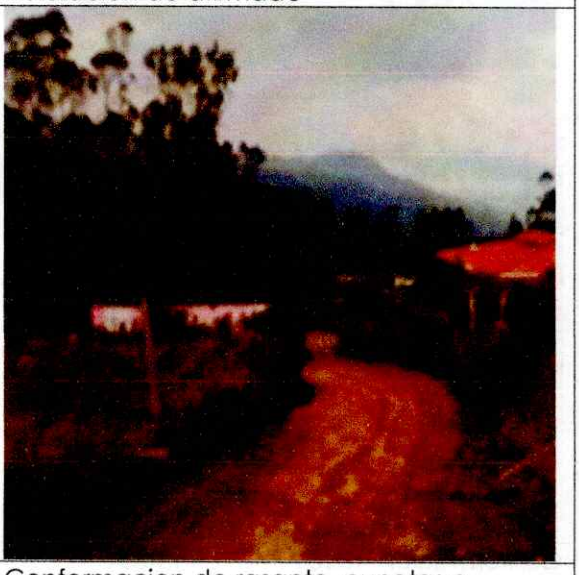
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

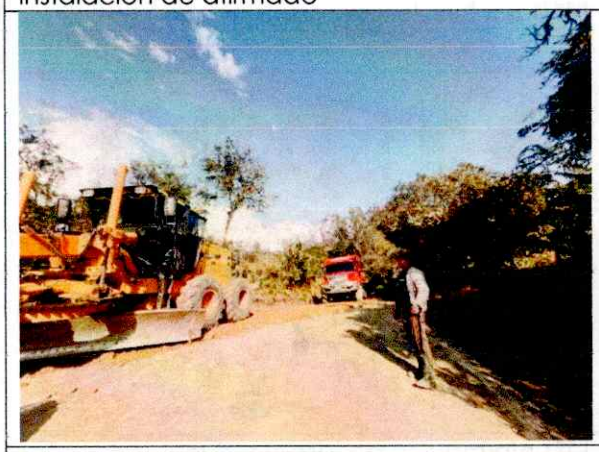
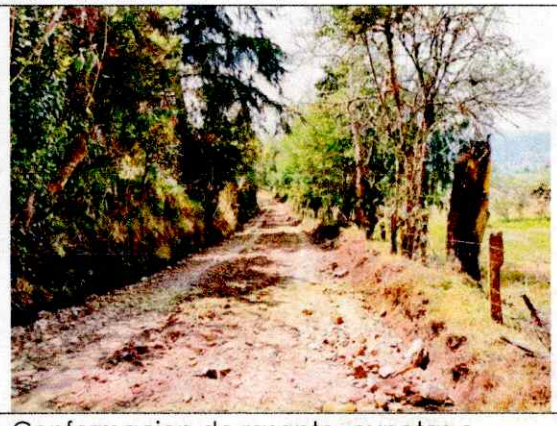
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

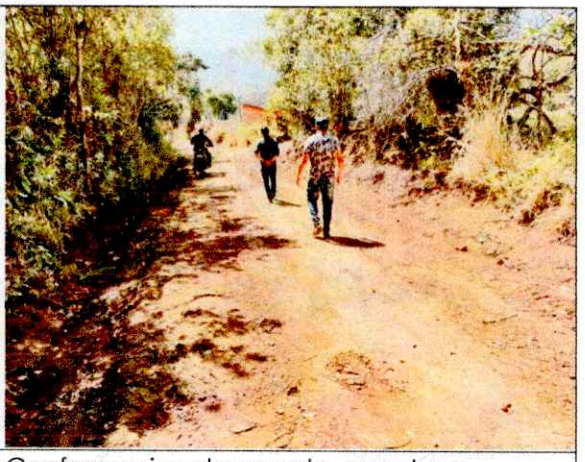
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

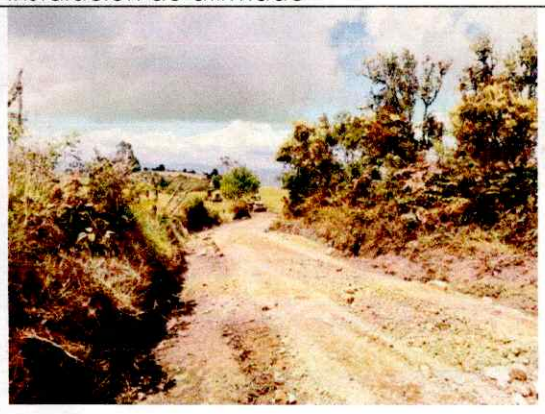
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

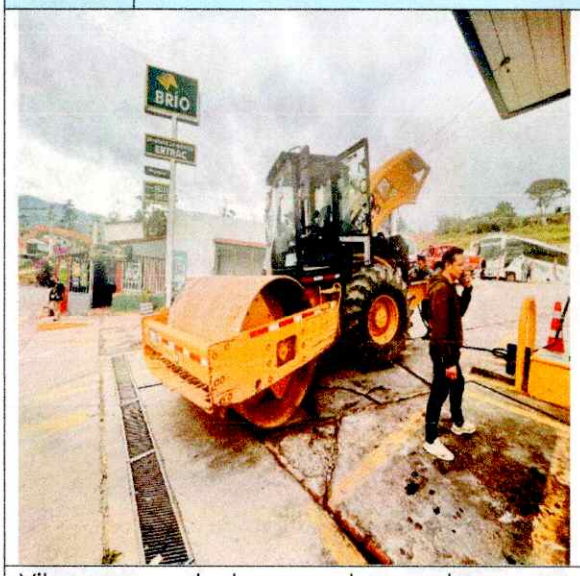
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

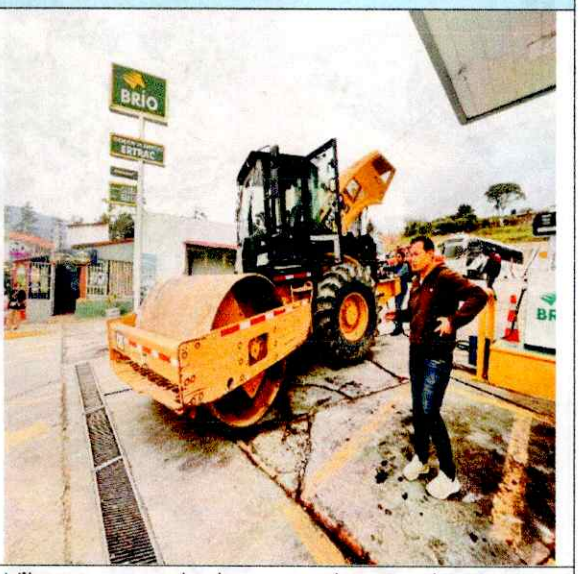
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado
	
Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado	Conformacion de rasante, cunetas e instalacion de afirmado

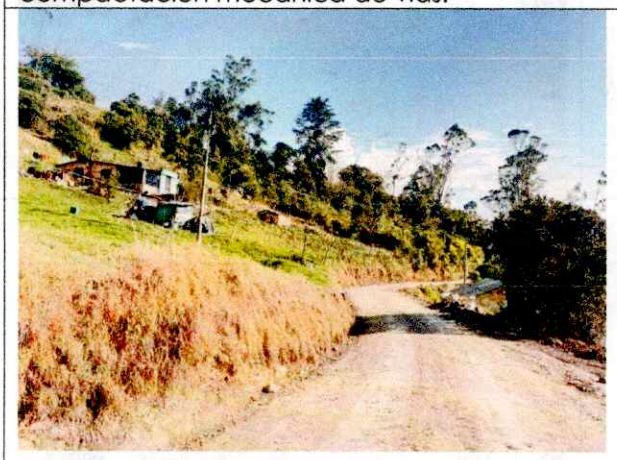
2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR



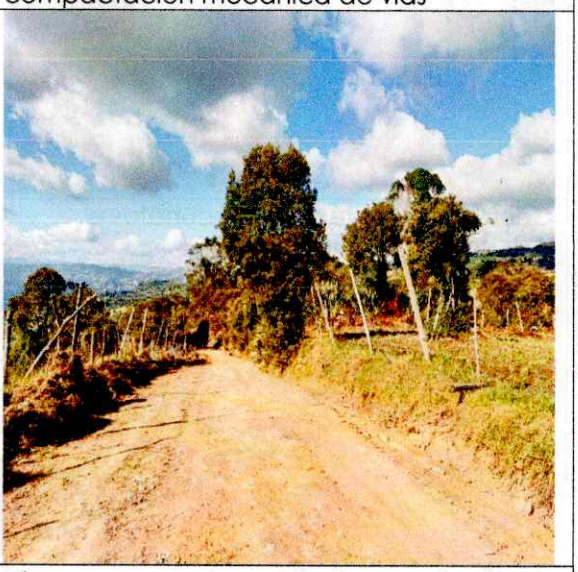
Vibrocompactadora, usada para la compactación mecanica de vias.



Vibrocompactadora, usada para la compactación mecanica de vias

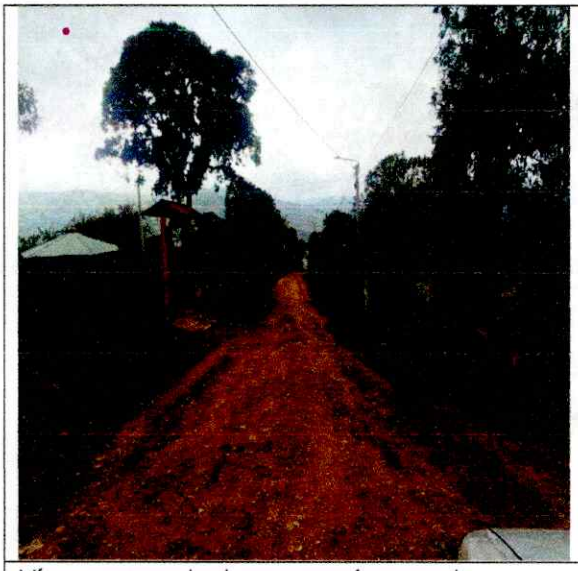
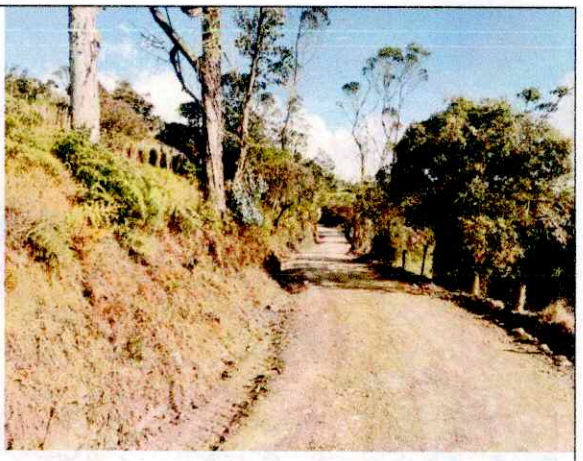
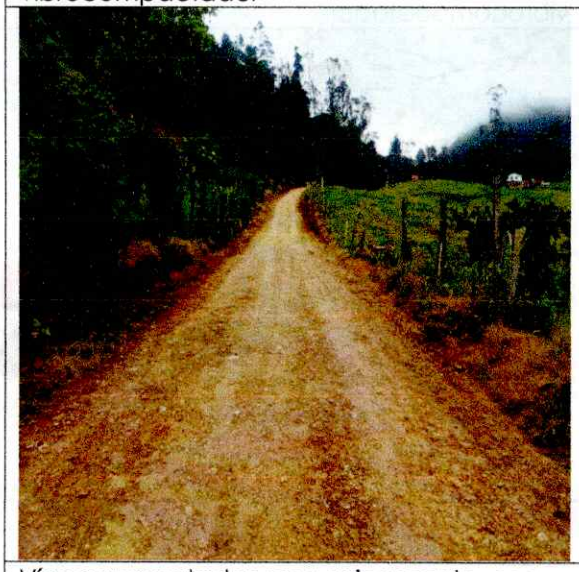
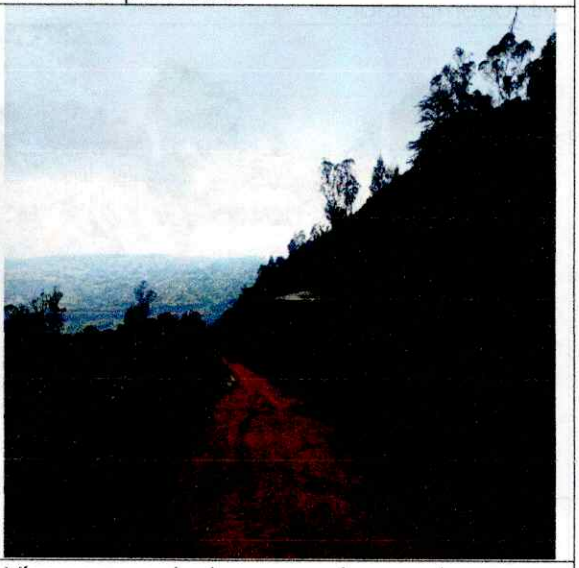


Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador



Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

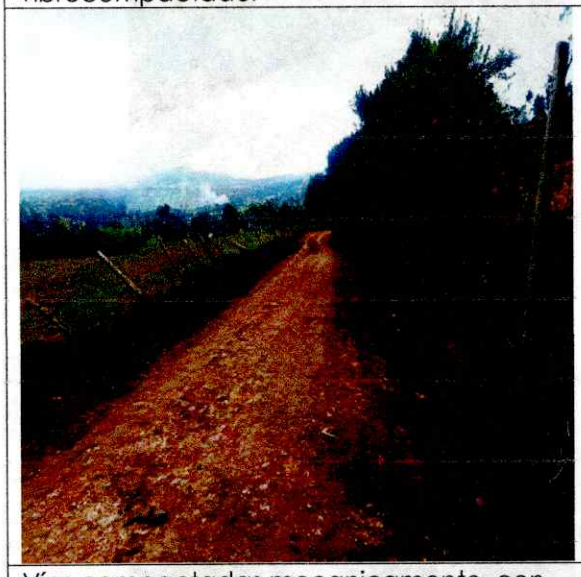
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador



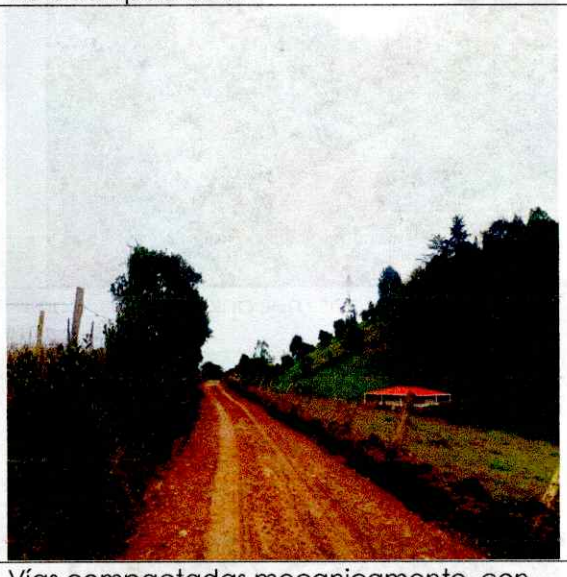
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador



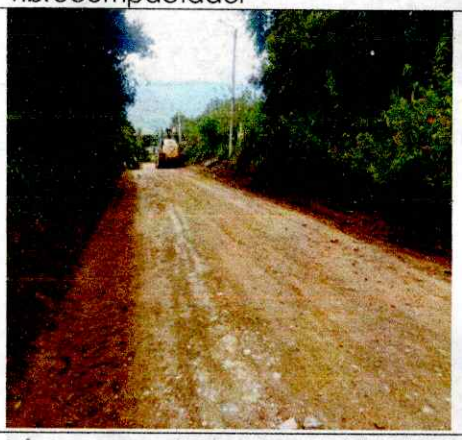
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

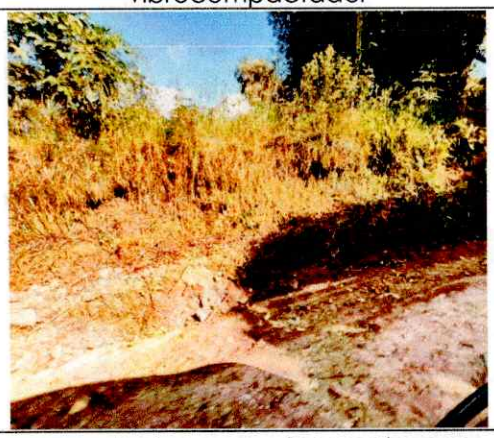


Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

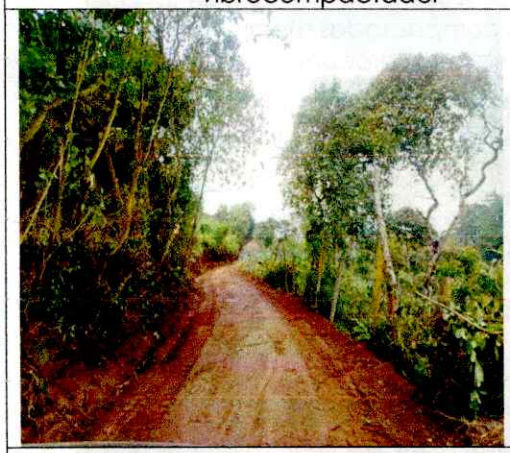


Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

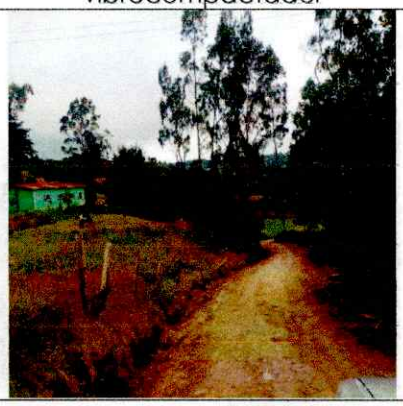
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

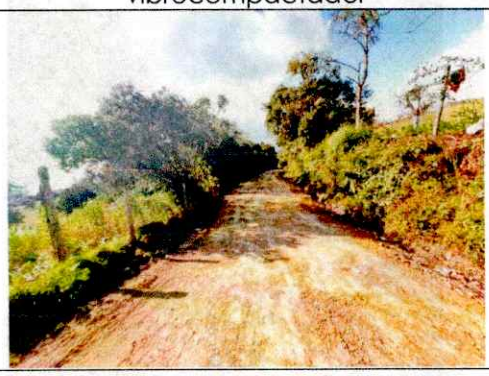
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

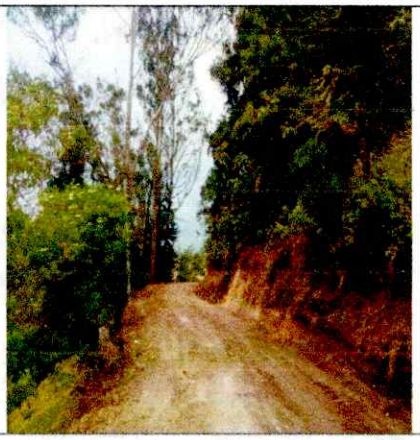
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

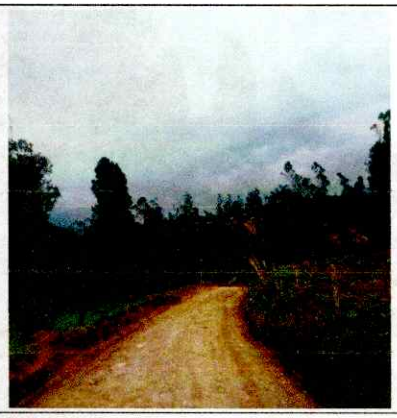
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

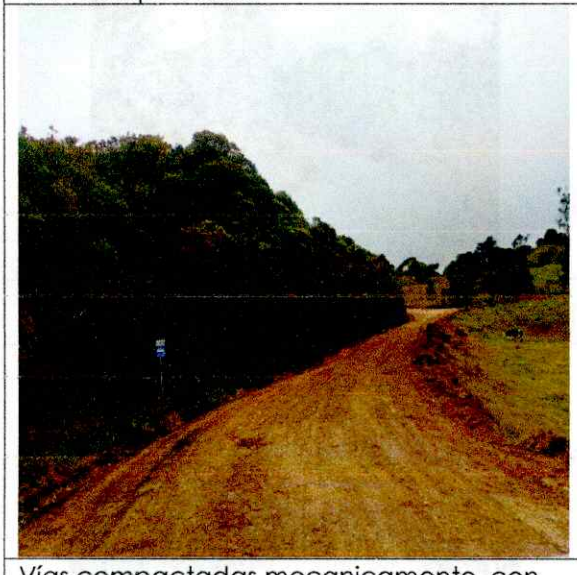
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

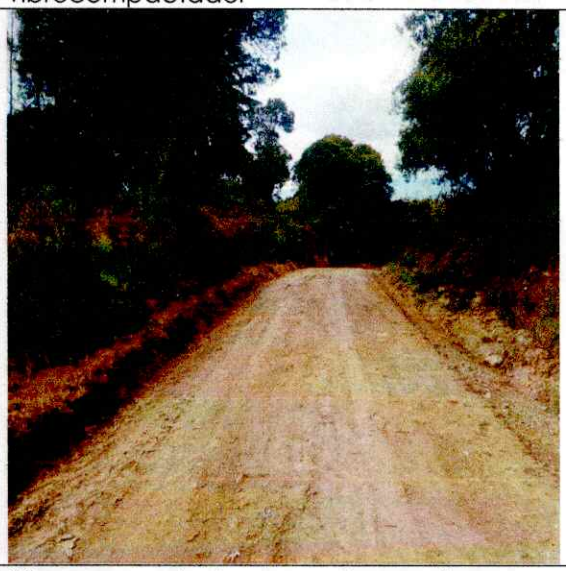
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

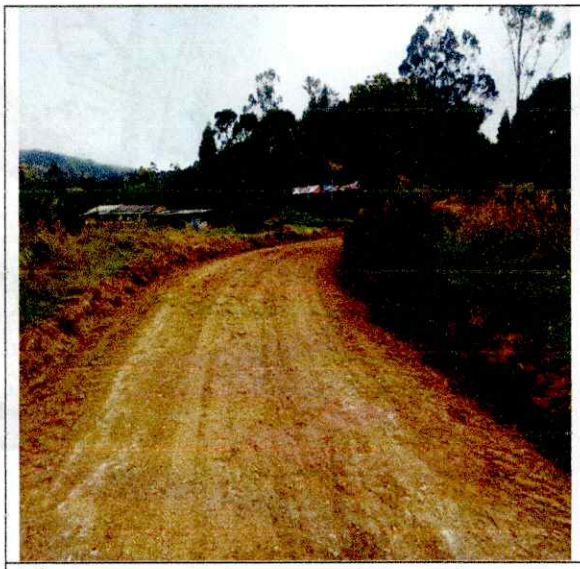
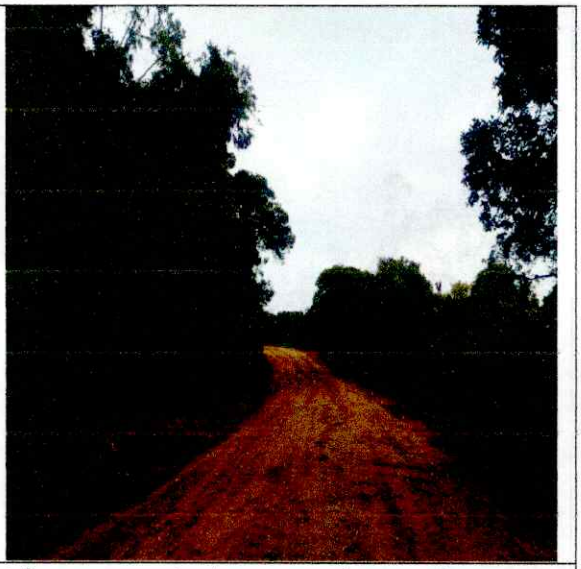
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

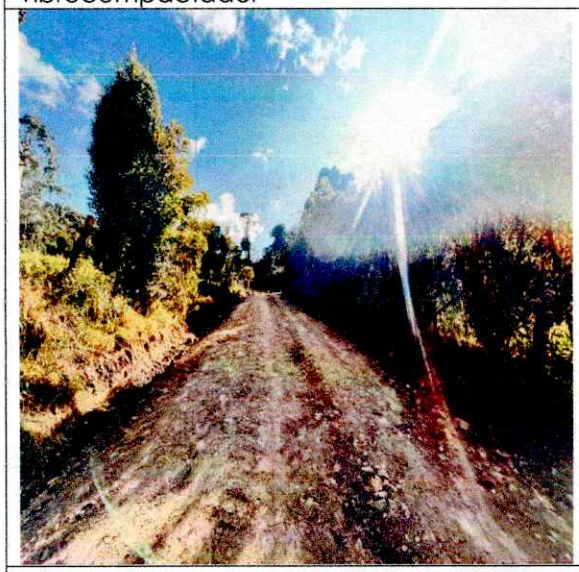
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

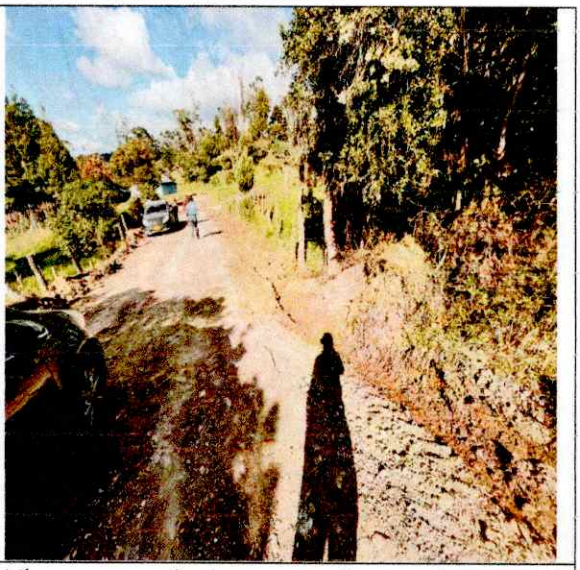
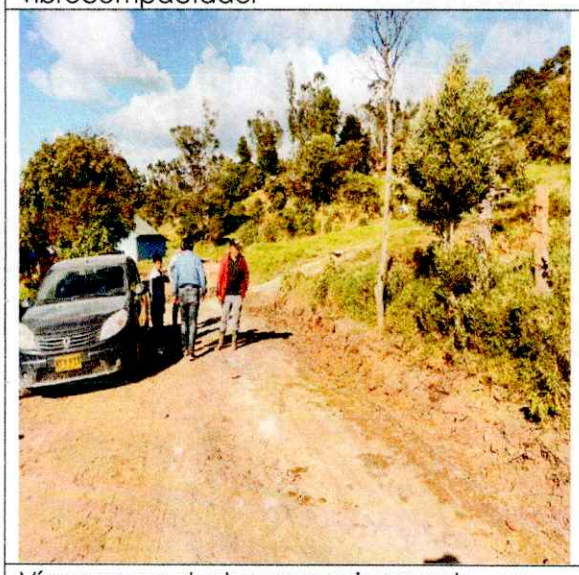
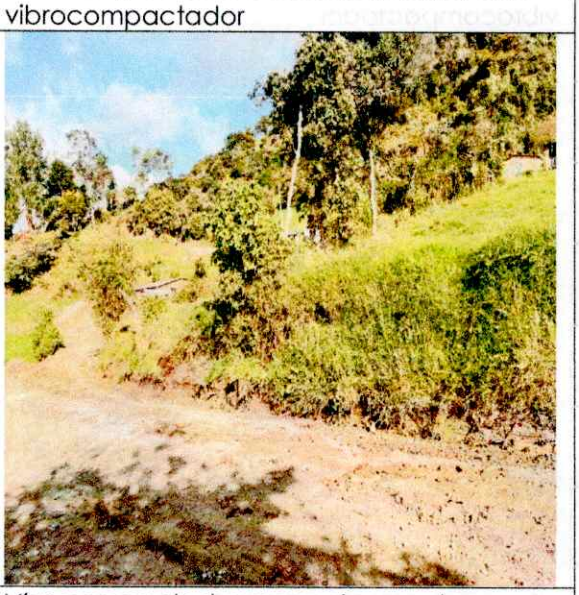
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

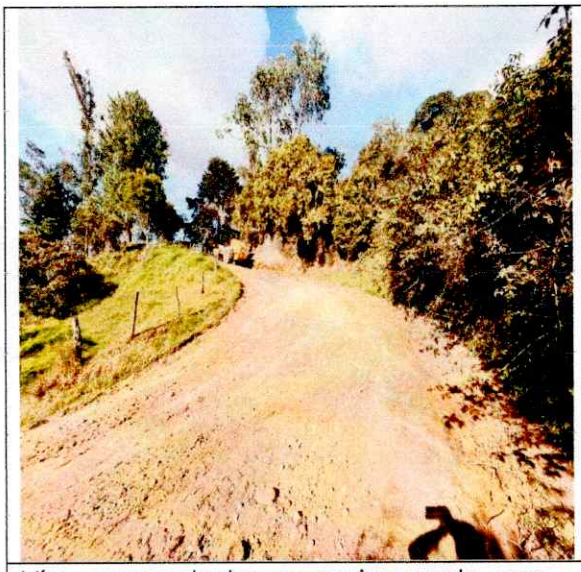
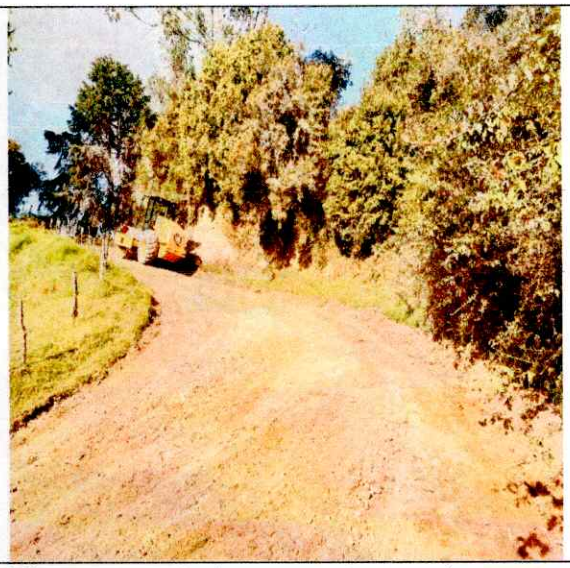
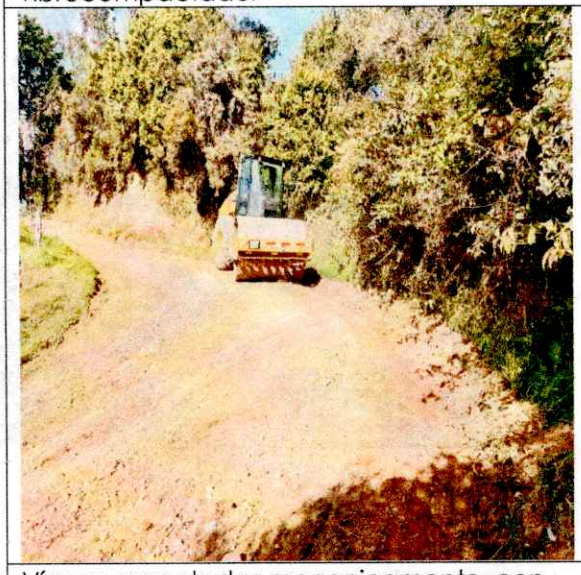
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

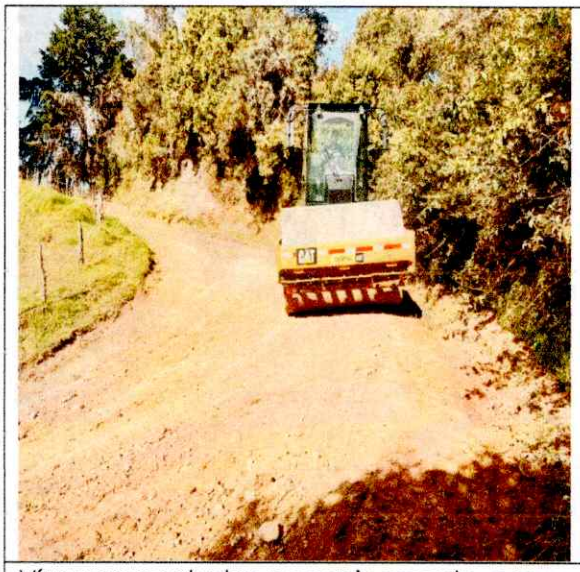
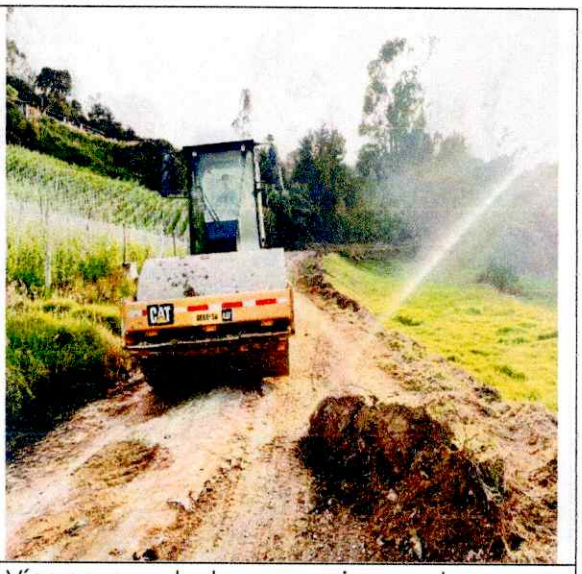
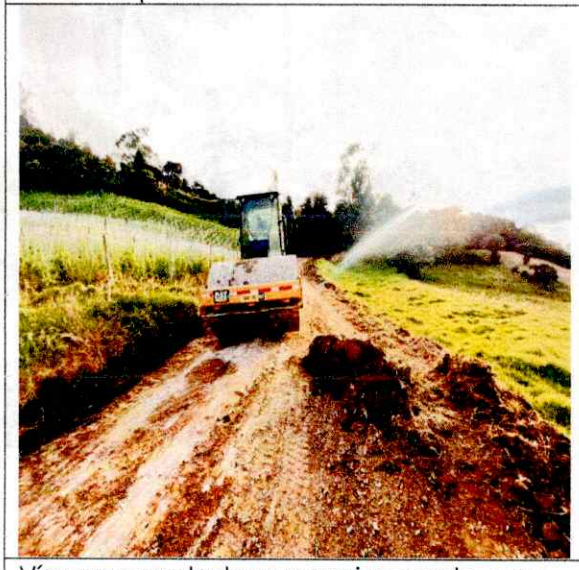
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

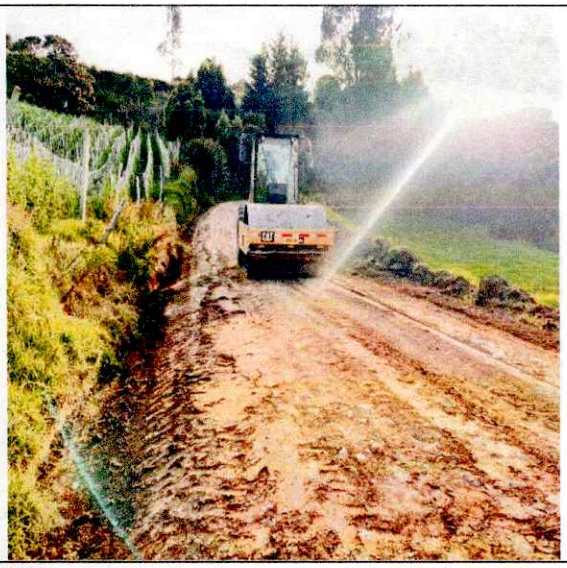
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

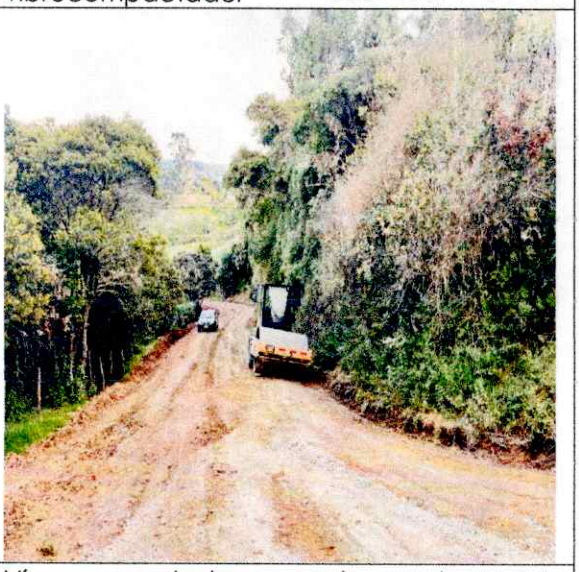
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

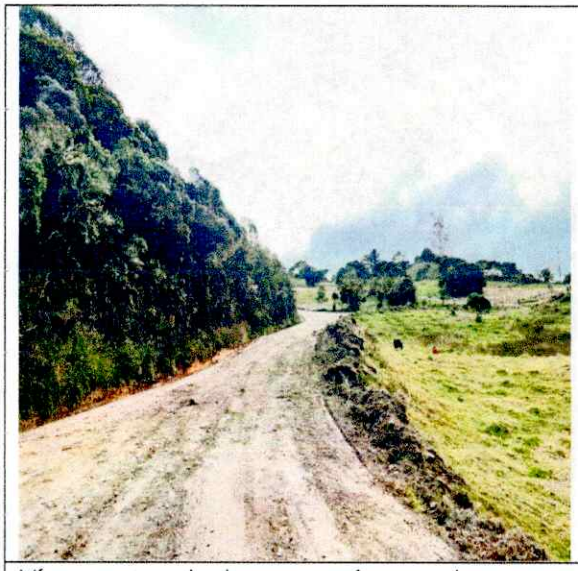
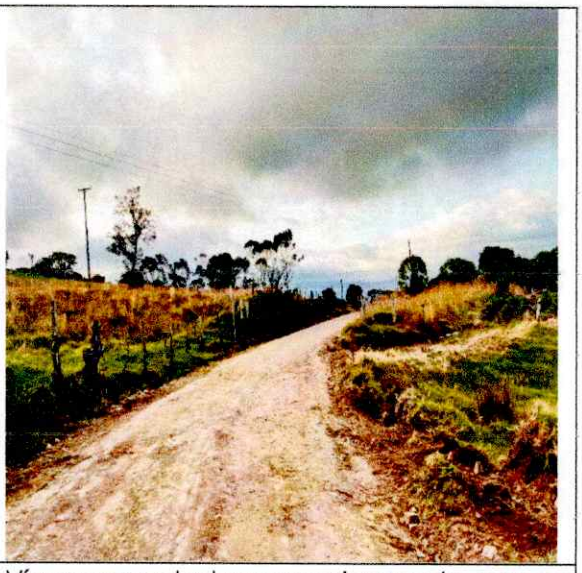
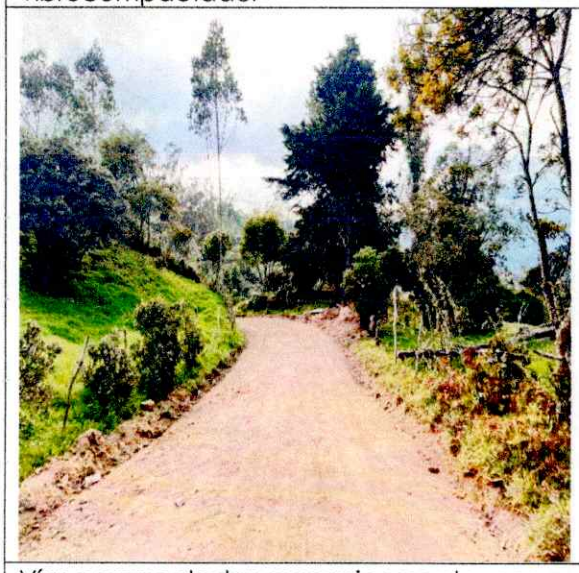
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

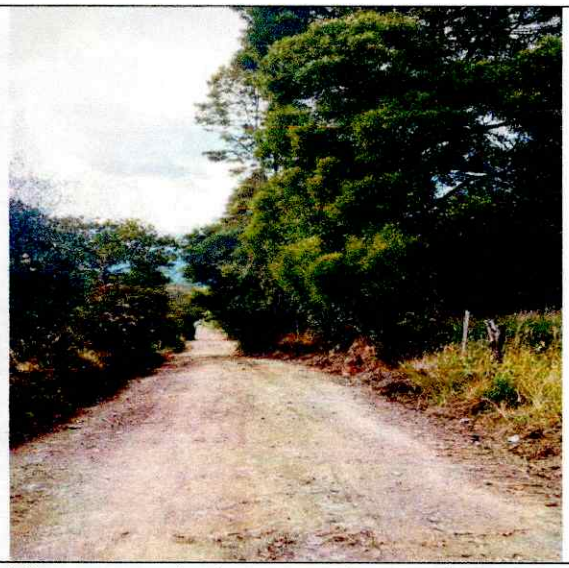
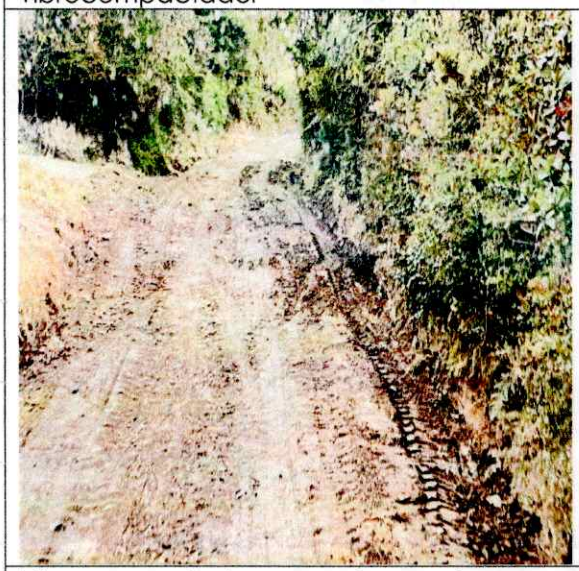
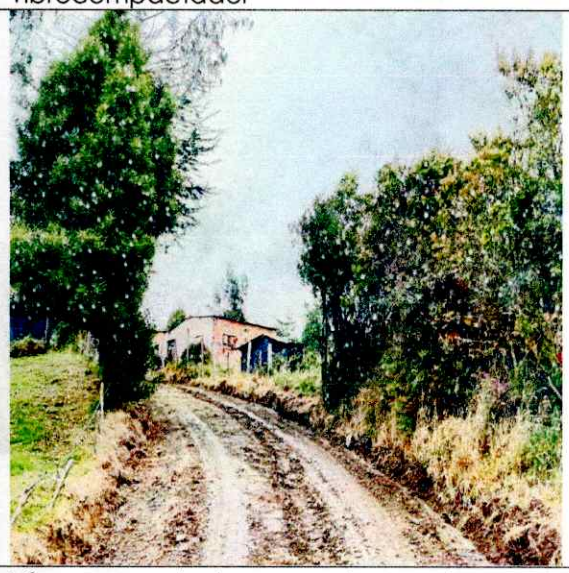
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

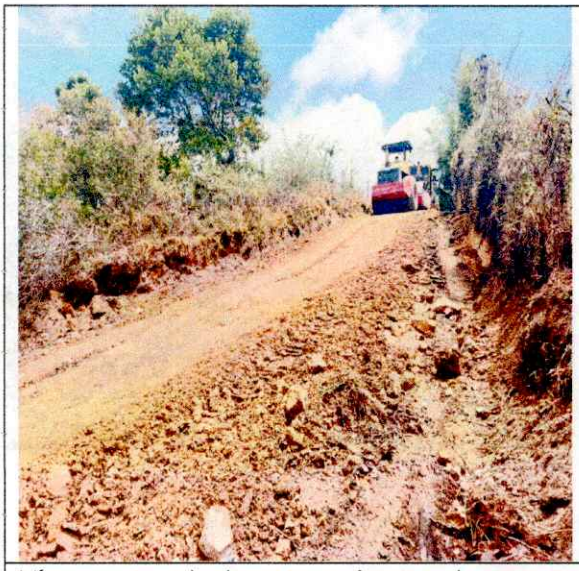
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

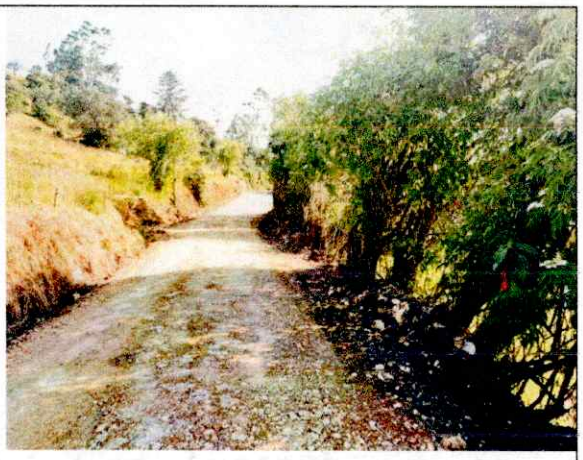
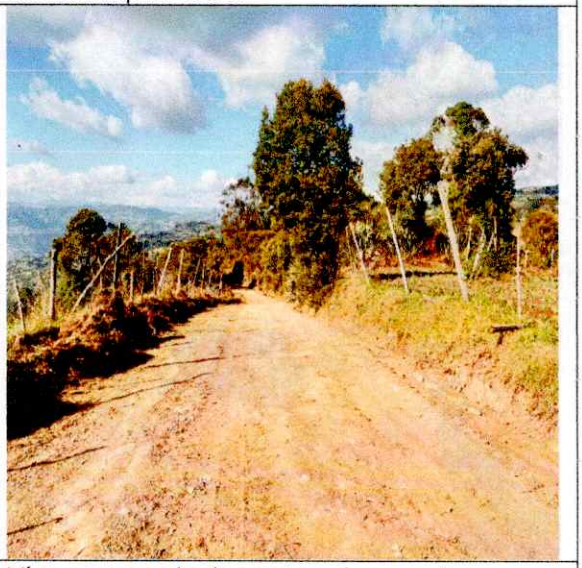
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

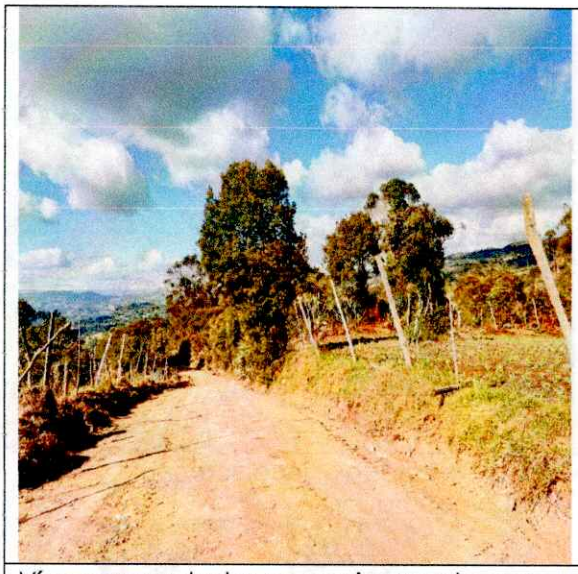
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

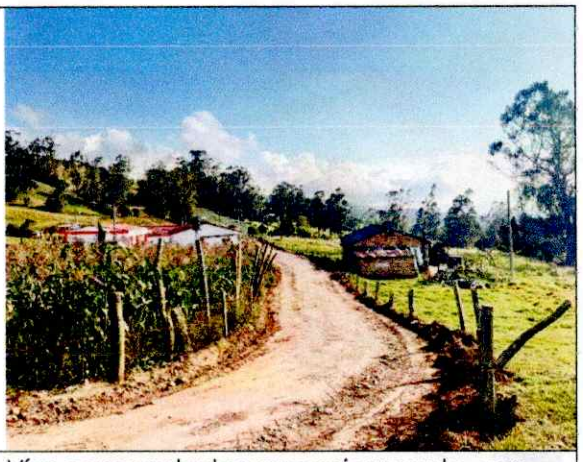
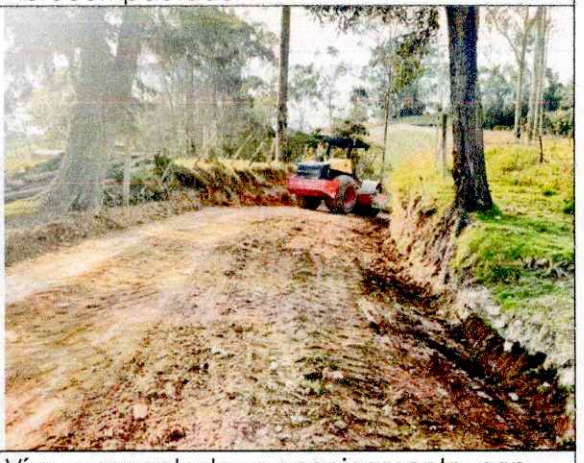
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

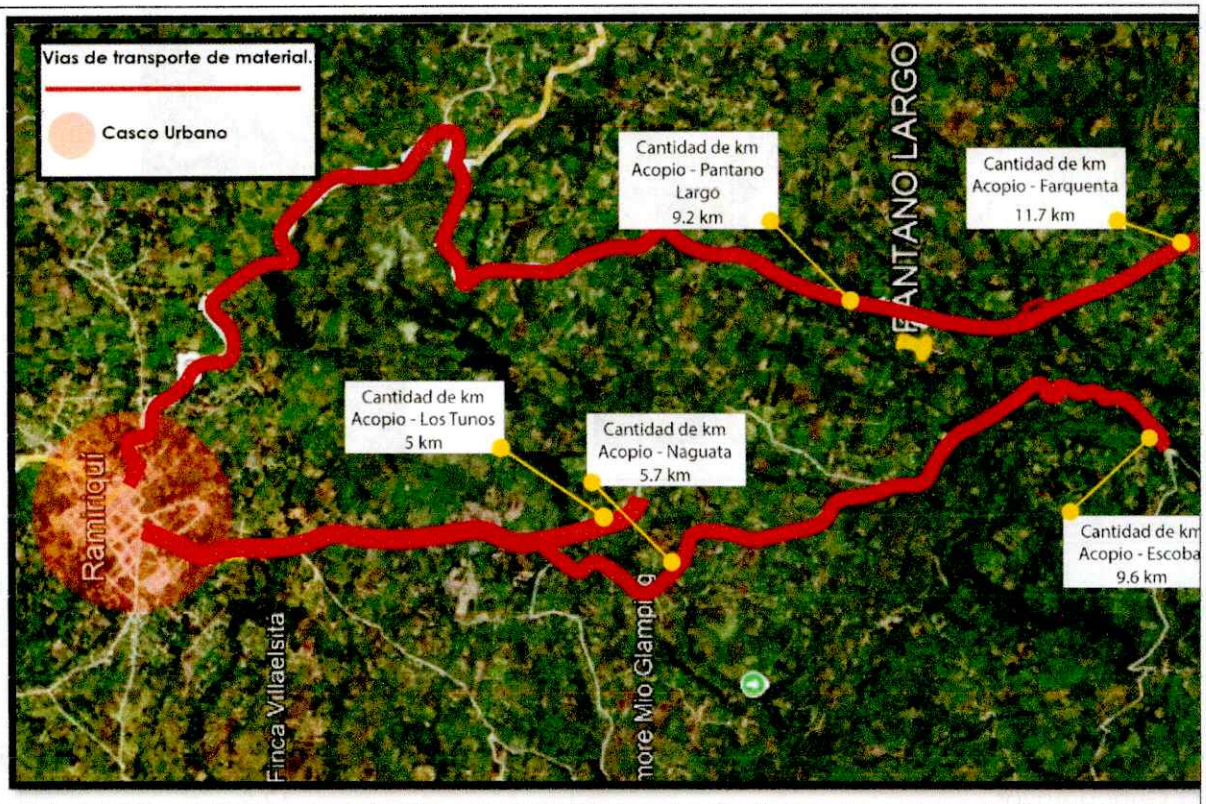
	
Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador	Vías compactadas mecanicamente, con vibrocompactador

3	ALQUILER VOLQUETA VIAJE HASTA 5KM

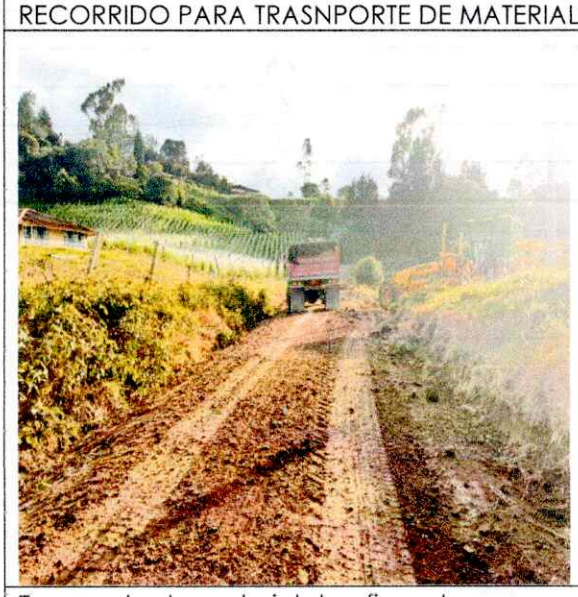
Se realiza el transporte de material de afirmado, el cual se encontraba depositado en el acopio, ubicado en la via Ramiriqui -Miraflores, centro del municipio, a las siguientes veredas:

VEREDA	DISTANCIA PROMEDIO ACOPIO VEREDA (KM)
Guacamayas	13.5
Farquentá	11.7
Pantano Largo	9.5
Los Tunos	6
Naguata	3
Escobal	9.5

MAPA VIAS RURALES INTERVENIDAS



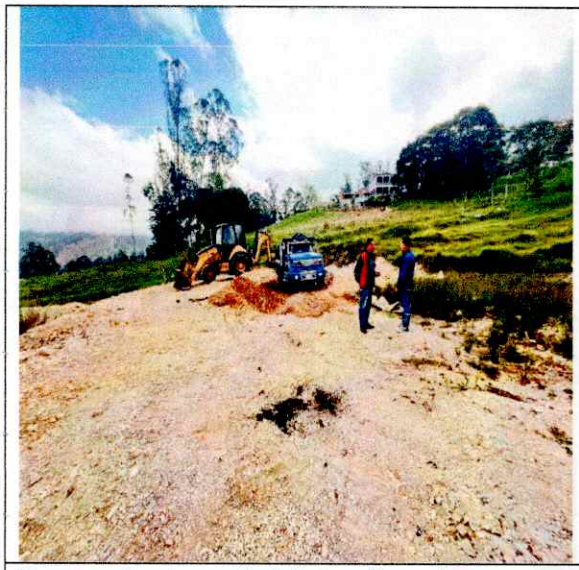
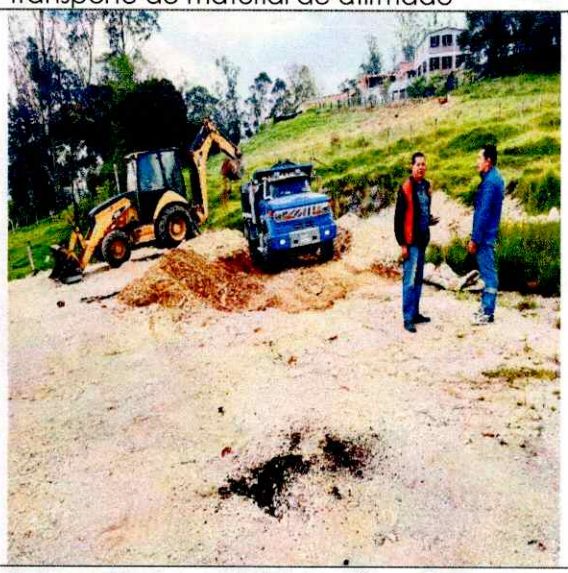
RECORRIDO PARA TRASNPORTE DE MATERIAL

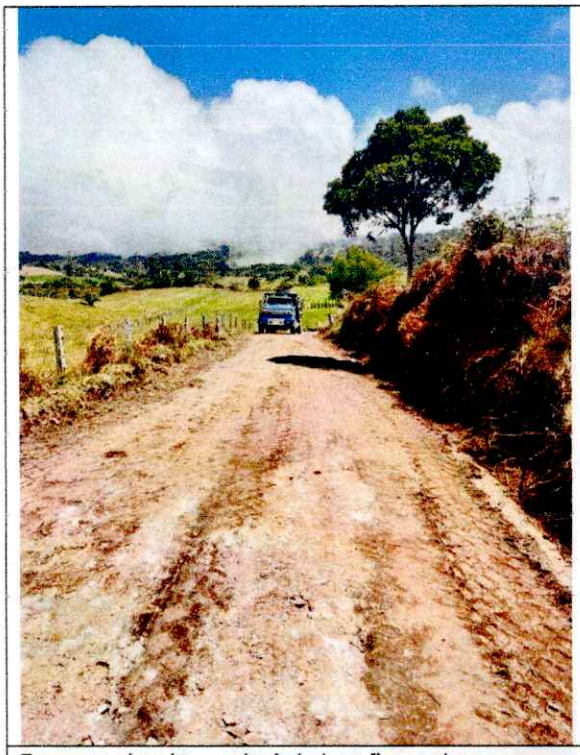
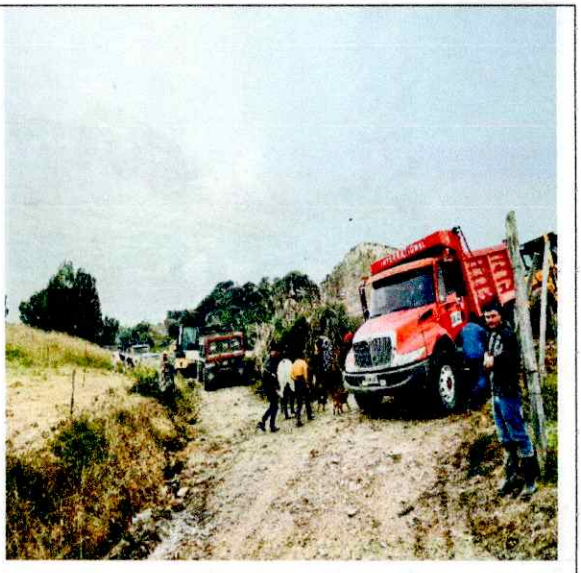
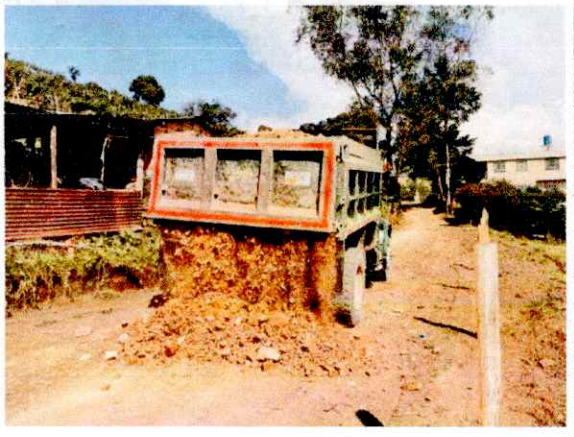


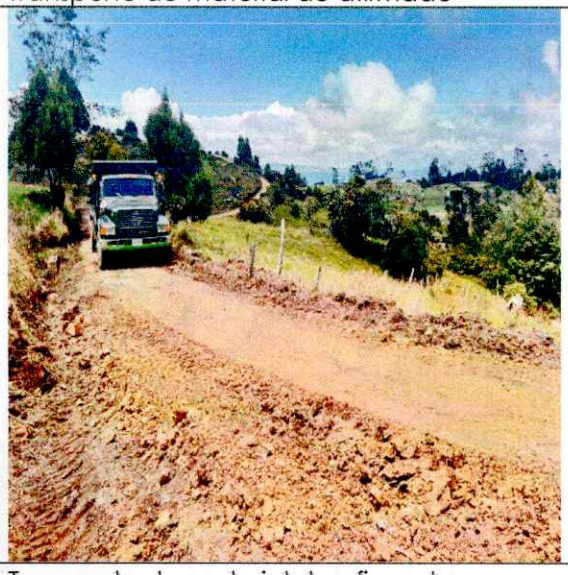
Transporte de material de afirmado



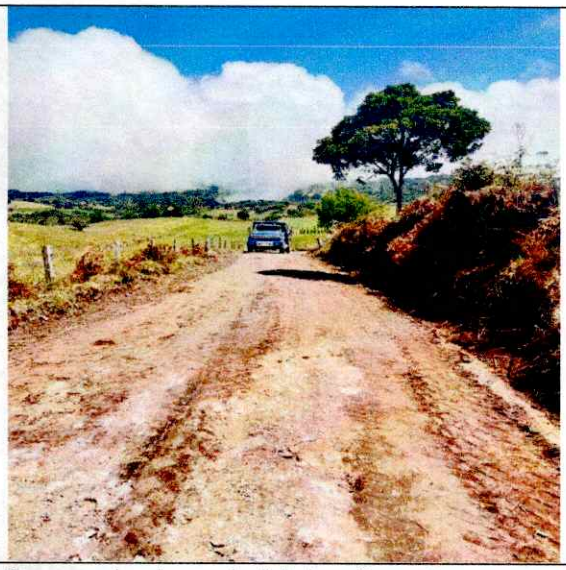
Transporte de material de afirmado

	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado

	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado

	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado

	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado

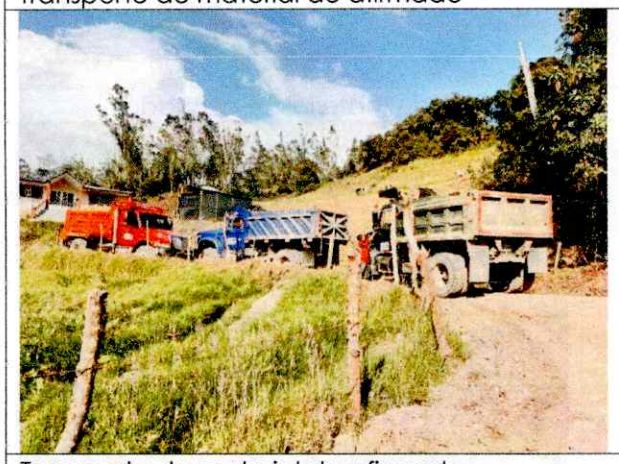
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado



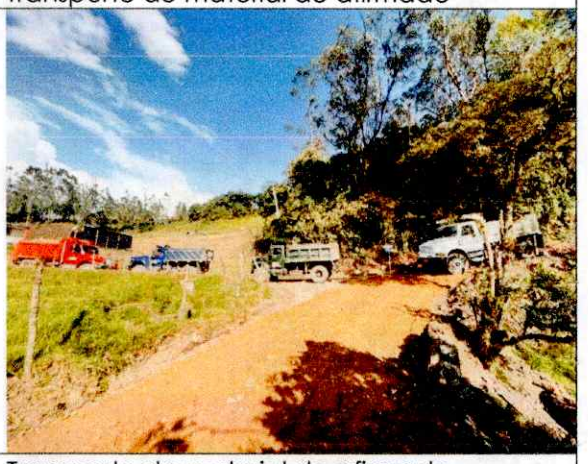
Transporte de material de afirmado



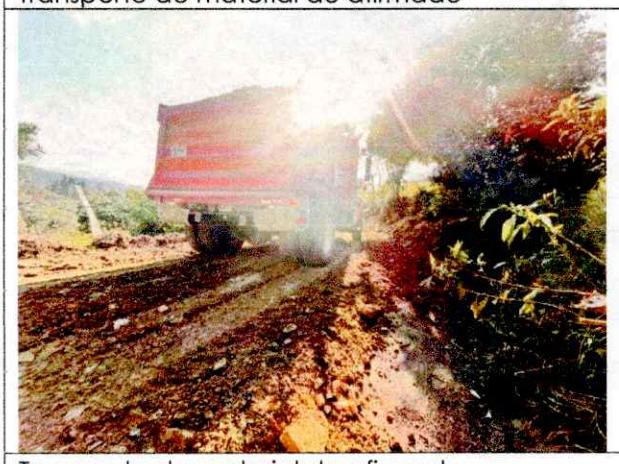
Transporte de material de afirmado



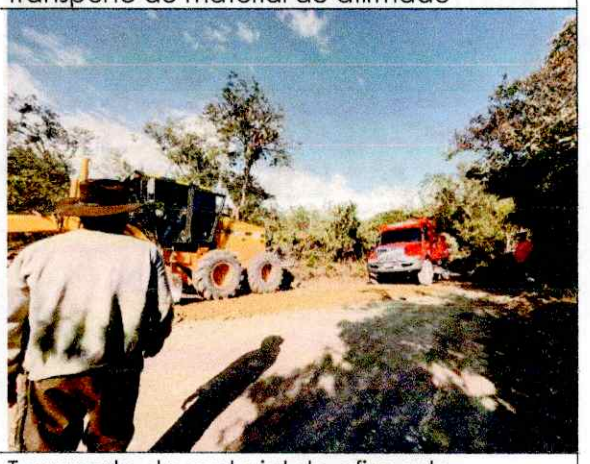
Transporte de material de afirmado



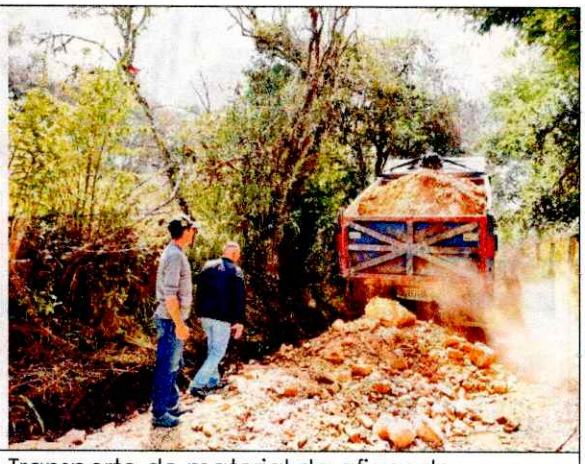
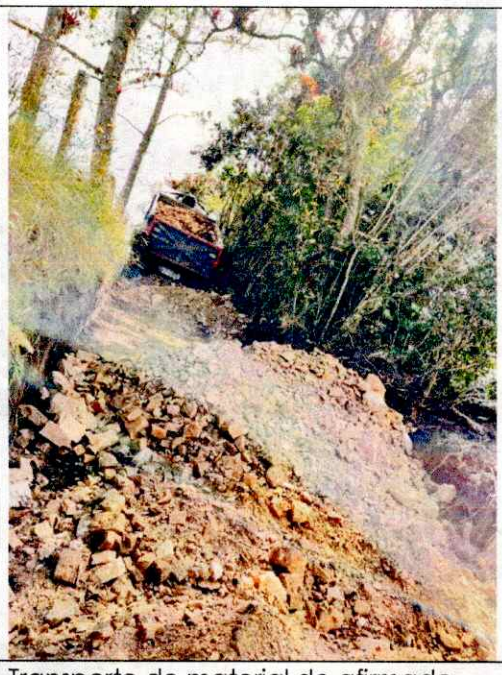
Transporte de material de afirmado



Transporte de material de afirmado



Transporte de material de afirmado

	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado



Transporte de material de afirmado



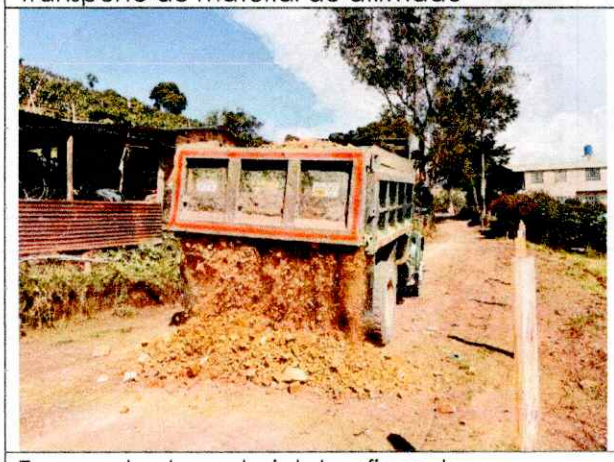
Transporte de material de afirmado



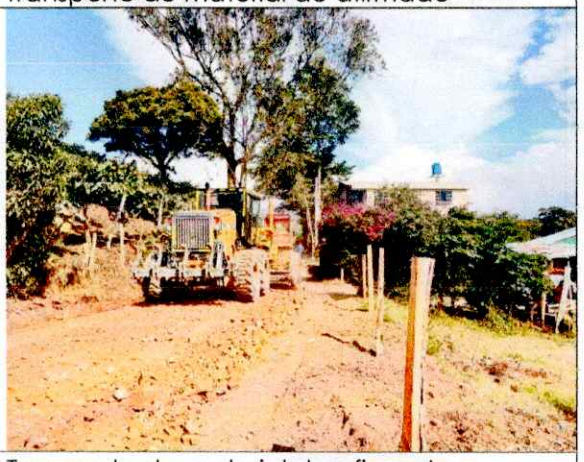
Transporte de material de afirmado



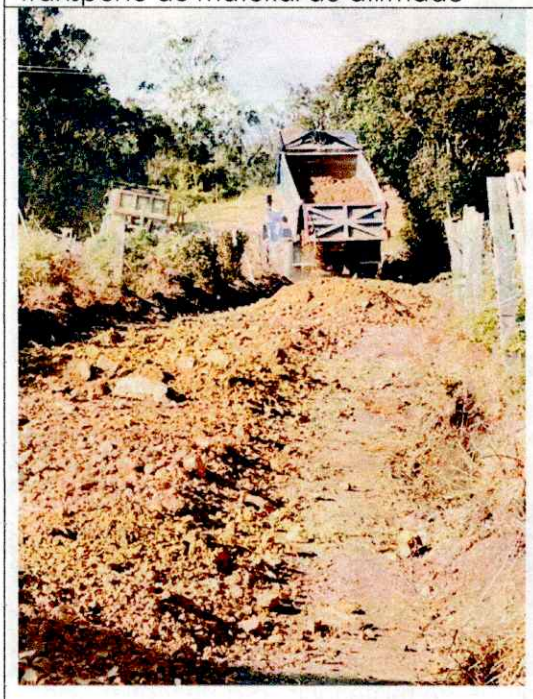
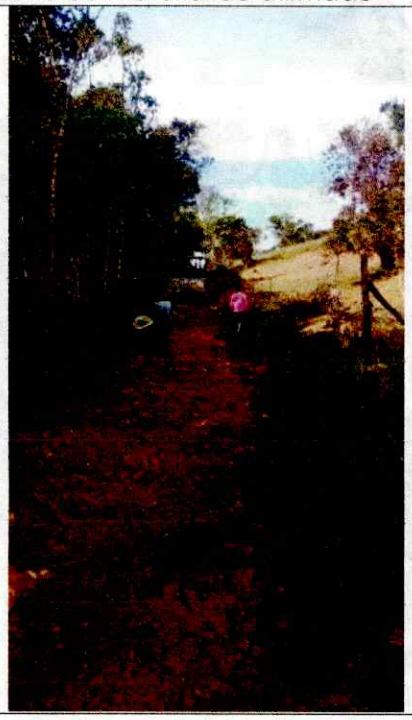
Transporte de material de afirmado



Transporte de material de afirmado



Transporte de material de afirmado

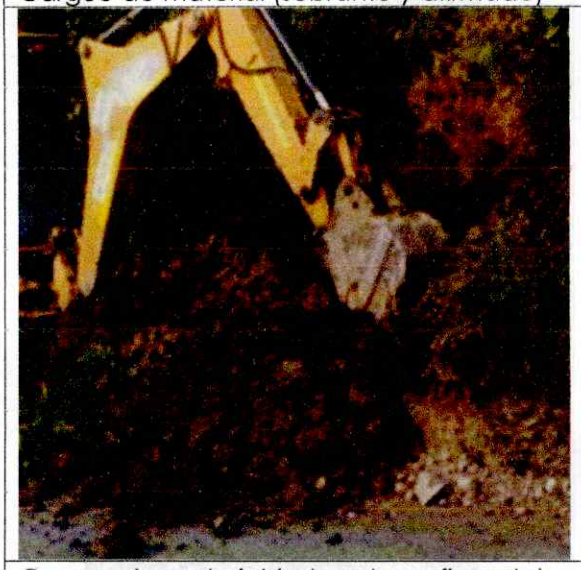
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado
	
Transporte de material de afirmado	Transporte de material de afirmado
4	Alquiler de Retro excavadora



Cargue de material (sobrante y afirmado)



Cargue de material (sobrante y afirmado)



Cargue de material (sobrante y afirmado)



Cargue de material (sobrante y afirmado)



Cargue de material (sobrante y afirmado)



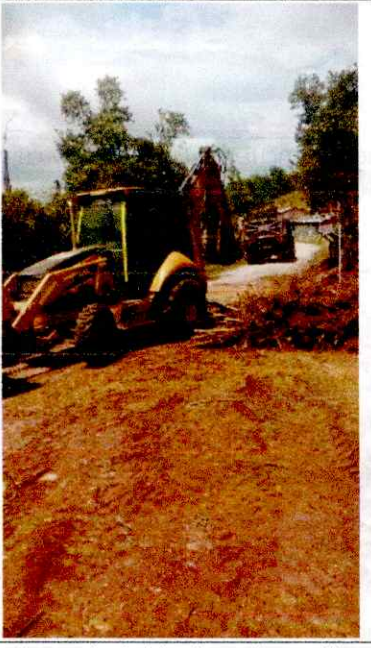
Cargue de material (sobrante y afirmado)



Cargue de material (sobrante y afirmado)



Cargue de material (sobrante y afirmado)

	
Cargue de material (sobrante y afirmado)	Cargue de material (sobrante y afirmado)
	
Cargue de material (sobrante y afirmado)	Cargue de material (sobrante y afirmado)

	
Cargue de material (sobrante y afirmado)	Cargue de material (sobrante y afirmado)

5. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Para el contrato MRAM-SAMC-013-2024 se realizó dos suspensiones, según el siguiente detalle: Suspensión N°01, debido a que el día diecinueve (19) de diciembre de 2024 el contratista presento oficio de solicitud de suspensión al contrato No MRAM-SAMC-013-2024, Aduciendo que el proyecto de gas aún no ha culminado ciertas actividades en los tramos de vías rurales, se argumenta que no es posible avanzar en los tramos de las vías rurales en los que se está trabajando. A esto se suma que las Juntas de Acción Comunal se encuentran realizando tareas de rocería que aún no han finalizado.

Suspensión N° 02, debido a que el día veinticinco (25) de marzo de 2024 se llevó a cabo comité de obra en el cual se manifestó que no es posible continuar con la ejecución del contrato debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando, y las cuales en los últimos días aumentaron, ocasionando que las ultimas vías que se intervinieron se afectara su capa de rodadura, además que con la persistencia de las fuertes precipitaciones, se imposibilita la continuidad de trabajos que se tienen programados.

6. MOTIVO DE LA PRORROGA

Para el contrato MRAM-SAMC-013-2024 se realizaron documentos de prórroga, de acuerdo al siguiente detalle: Prorroga N° 01: Que el cinco (05) de febrero de 2025 se suscribió documento de prórroga N°01, aduciendo que de igual manera y con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido con las juntas de acción comunal, donde las mismas se encuentran avanzando en la rocería de los tramos a intervenir, además para realizar el mantenimiento con lo adicional indicado

en el documento de prorroga y adición, se requiere prorrogar el contrato por un tiempo de cuarenta (40) días

Prorroga N° 02: Que el diecisiete (17) de marzo de 2025 se suscribió documento de prórroga N°02, aduciendo: Que se llevó a cabo comité, donde se revisó el avance del cronograma de trabajo establecido, identificando que debido a las lluvias que se han presentado, no ha sido posible cumplir con los rendimientos proyectados y por lo tanto tampoco se han efectuado los mantenimientos programados, razón por la cual, aun se cuenta con saldo presupuestal pendiente por ejecución. Que aunque las lluvias iniciaron, aun no se presentan con mayor intensidad y en el momento se requiere realizar mantenimiento en los diferentes corredores viales, en especial en los puntos más críticos, razón por la cual es necesario continuar con la ejecución del contrato MRAM-SAMC-013-2024, de tal manera que se pueda realizar la intervención de los diferentes tramos que se tienen proyectados, de tal manera que se permita mejorar la transpirabilidad de los usuarios de las vías rurales, y permitir de esta manera que cada uno de los campesinos Ramiriquenses puedan desarrollar sus actividades diarias con mayor dignidad.

7. MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR

Para el contrato MRAM-SAMC-013-2024 se realizó documento de adición, en base a: Que se llevó a cabo comité, donde se expuso la situación de la red vial terciaria del municipio, donde se pudo identificar que se cuenta con varios tramos de vía que requieren ser intervenidos en los diferentes sectores de las veredas del municipio, puesto que no han sido intervenidos hace un tiempo considerable, o debido al alto tráfico o uso de la comunidad para el transporte de los productos cosechados, su deterioro es más temprano; Además que debido al número de kilómetros en red vial con el que cuenta el municipio, no es posible efectuar el mantenimiento con la maquinaria del municipio y aún menos efectuarlo en temporada de verano, fecha más oportuna para poder realizar este tipo de trabajos, de tal manera que sea eficiente y efectivo el mantenimiento realizado Que se acerca la temporada de cosecha y por lo tanto se requiere realizar la comercialización de los productos, razón por la cual es necesario transportar lo cultivado para acercarlo de la finca a la plaza de mercado municipal, de la capital del departamento o del país, por lo que se hace

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN

Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2024 se realizó documentos de adición, del cual el Certificado de disponibilidad presupuestal N° 063, del cinco (05) de febrero de 2025 expedido por secretaria de hacienda por un valor de cuarenta y dos millones veinticinco mil ochocientos noventa y dos pesos ($42.025.982) m/cte.

9. FECHA DEL OTRO SÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)

Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2024 se realizo documento de adición No. 001.

10. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato MRAM-SAMC-013-2024 se tiene información de garantías según lo establecido en el contrato.

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.
Asegurado/ beneficiario	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI identificada con NIT 891.801.280-6
Amparos, vigencia y valores asegurados	

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Tres años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de la entidad.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato

Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Característica	Condición
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ identificado con NIT 891.801.280-6 y el contratista
Característica	**Condición**
Tomador	•Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. •No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. •Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Doscientos (200) SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ identificada con NIT 891.801.280-6

Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la Póliza	* Número y año del contrato * Objeto del contrato * Firma del representante legal del contratista * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

11. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato N° MRAM-SAMC-013-2024 se tiene la siguiente información de aprobación de garantías.

N° 39-44-101167630 ANEXO 0 DE CUMPLIMIENTO N° 39-40-101043865 ANEXO 0 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO
N° 39-44-101167630 ANEXO 2 DE CUMPLIMIENTO N° 39-40-101043865 ANEXO 2 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N°590 DEL TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA DE INICIO
N° 39-44-101167630 ANEXO 4 DE CUMPLIMIENTO N° 39-40-101043865 ANEXO 4 DE RESPONSABILIDAD CIL EXTRACONTRACTUAL APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N° 056 DEL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA SUSPENSIÓN Y DE REINICIO N° 01
N° 39-44-101167630 ANEXO 6 DE CUMPLIMIENTO APROBADA BAJO RESOLUCIÓN N° 070 DEL DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN DOCUMENTO DE PRORROGA Y ADICIÓN N°01
N-° 39-40-101043865 ANEXO 5 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL APROBADA BAJO RESOLUCIÓN N° 080 DEL DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN DOCUMENTO DE PRORROGA Y ADICIÓN N°01
N° 39-44-101167630 ANEXO 9 DE CUMPLIMIENTO N° 39-40-101043865 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 7 APROBADA BAJO RESOLUCIÓN N° 140 DEL VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2025, SEGÚN DOCUMENTO DE PRORROGA N°02
N° 39-44-101167630 ANEXO 9 DE CUMPLIMIENTO N° 39-40-101043865 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 7 APROBADA BAJO RESOLUCIÓN N° 405 DEL SEIS (06) DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA DE REINICIO N°02

12. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato MRAM-SAMC-013-2024 no se ha realizado ningún pago, del total del valor del contrato, según el lo ejecutado se tiene pendiente por cancelar la suma de ciento veintiséis millones seiscientos veinte mil ciento ochenta pesos con cuarenta centavos ($126.620.180,40), de acuerdo al siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$ 84.657.202	
VALOR DEL ADICIONAL	$41.992.483	
VALOR CANCELADO EN ACTAS ANTERIORES		$ 0
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$126.620.180,40
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 29.504,60
SUMAS IGUALES	**$ 126.649.685**	**$ 126.649.685**

13. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisora del contrato, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

CARMEN ELVIRA PAEZ CARO
Secretaria de infraestructura pública y Movilidad
Municipio de Ramiriquí

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: secretaria de Infraestructura y movilidad
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Carmen Elvira Páez – secretaria de infraestructura pública y movilidad
Revisó: Carmen Elvira Páez – secretaria de infraestructura pública y movilidad
Aprobó: Camilo Andrés Ávila Márquez – alcalde municipal
