

CRONOGRAMA DE TRABAJO

E-mail consorcioiccali2026@gmail.com
311-7047195
Cali - Colombia


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**PARQUE ALAMEDA AVENIDA ROOSEVELT**	**407 días**	**vie 20 mar '26**	**lun 20 sep '27**
2	**1.1**	**Acta de Incio**	**0 días**	**vie 20 mar '26**	**vie 20 mar '26**
3	**1.2**	**ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN**	**137 días**	**vie 20 mar '26**	**sáb 19 sep '26**
4	**1.2.1**	**GESTIÓN DE PERSONAL**	**10 días**	**vie 20 mar '26**	**mié 1 abr '26**
5	**1.2.2**	**GESTIÓN DOCUMENTAL**	**56 días**	**vie 27 mar '26**	**mié 10 jun '26**
6	1.2.2.1	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	10 días	vie 27 mar '26	jue 9 abr '26
7	1.2.2.2	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	10 días	sáb 4 abr '26	jue 16 abr '26
8	**1.2.2.3**	**LISTADO DE SUPUESTOS (HITOS)**	**38 días**	**lun 20 abr '26**	**mié 10 jun '26**
18	**1.2.3**	**AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**125 días**	**sáb 4 abr '26**	**sáb 19 sep '26**
19	**1.2.3.1**	**TOPOGRAFÍA**	**38 días**	**vie 17 abr '26**	**sáb 6 jun '26**
20	1.2.3.1.1	Revisión estudios existentes	3 días	vie 17 abr '26	mar 21 abr '26
21	1.2.3.1.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	3 días	mar 21 abr '26	vie 24 abr '26
22	1.2.3.1.3	Entrega a interventoría y revisión.	3 días	vie 24 abr '26	mar 28 abr '26
23	**1.2.3.1.4**	**Actualización de información de campo**	**29 días**	**mié 29 abr '26**	**sáb 6 jun '26**
24	1.2.3.1.4.1	Inventario de Alcantarillado	8 días	mié 29 abr '26	sáb 9 may '26
25	1.2.3.1.4.2	Validaciones de campo y levantamiento información complementaria	6 días	lun 11 may '26	mar 19 may '26
26	1.2.3.1.4.3	Procesamiento de datos	6 días	mar 19 may '26	mar 26 may '26
27	1.2.3.1.4.4	Elaboración de informe final	4 días	mié 27 may '26	lun 1 jun '26
28	1.2.3.1.4.5	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	5 días	lun 1 jun '26	sáb 6 jun '26
29	**1.2.3.2**	**DISEÑO GEOMÉTRICO**	**75 días**	**mar 19 may '26**	**sáb 29 ago '26**
30	1.2.3.2.1	Revisión diseños existentes	4 días	mar 19 may '26	sáb 23 may '26
31	1.2.3.2.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	7 días	lun 25 may '26	mar 2 jun '26
32	1.2.3.2.3	Entrega a interventoría y revisión.	5 días	mar 2 jun '26	mar 9 jun '26
33	1.2.3.2.4	Ajustes y actualización (Planta-Perfil, Secciones)	17 días	mié 10 jun '26	vie 3 jul '26
34	1.2.3.2.5	Entrega a interventoría y revisión (Planos)	6 días	vie 3 jul '26	vie 10 jul '26
35	**1.2.3.2.6**	**Elaboración de informe final (Atención Observaciones)**	**30 días**	**sáb 11 jul '26**	**vie 21 ago '26**
36	1.2.3.2.6.1	Memoria de diseño	5 días	sáb 11 jul '26	vie 17 jul '26
37	1.2.3.2.6.2	Ajuste a secciones transversales	3 días	mié 19 ago '26	vie 21 ago '26
38	1.2.3.2.7	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	6 días	sáb 22 ago '26	sáb 29 ago '26
39	**1.2.3.3**	**TRÁNSITO**	**42 días**	**vie 17 abr '26**	**vie 12 jun '26**
40	1.2.3.3.1	Revisión información existente	4 días	vie 17 abr '26	mié 22 abr '26
41	1.2.3.3.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	mié 22 abr '26	lun 27 abr '26
42	1.2.3.3.3	Entrega a interventoría y revisión.	3 días	mar 28 abr '26	jue 30 abr '26
43	**1.2.3.3.4**	**Actualización de información de campo**	**31 días**	**sáb 2 may '26**	**vie 12 jun '26**
44	1.2.3.3.4.1	Aforos vehiculares	7 días	sáb 2 may '26	lun 11 may '26
45	1.2.3.3.4.2	Procesamiento y análisis aforos vehiculares	15 días	mar 12 may '26	lun 1 jun '26
46	1.2.3.3.4.3	Elaboración de informe final	4 días	lun 1 jun '26	vie 5 jun '26
47	1.2.3.3.4.4	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	5 días	vie 5 jun '26	vie 12 jun '26
48	**1.2.3.4**	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN (Sin Semaforización)**	**73 días**	**lun 25 may '26**	**mar 1 sep '26**
49	1.2.3.4.1	Revisión diseños existentes	3 días	lun 25 may '26	mié 27 may '26
50	1.2.3.4.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	3 días	jue 28 may '26	lun 1 jun '26
51	1.2.3.4.3	Entrega a interventoría y revisión.	3 días	lun 1 jun '26	jue 4 jun '26
52	1.2.3.4.4	Ajustes y actualización	5 días	vie 26 jun '26	vie 3 jul '26
53	1.2.3.4.5	Elaboración de informe final (V0)	2 días	vie 3 jul '26	lun 6 jul '26
54	1.2.3.4.6	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	12 días	lun 6 jul '26	mar 21 jul '26
55	**1.2.3.4.7**	**Elaboración de informe final (Atención Observaciones)**	**26 días**	**mié 22 jul '26**	**mié 26 ago '26**
56	1.2.3.4.7.1	Ajustes documentales - Planos Finales	21 días	mié 22 jul '26	mié 19 ago '26
57	1.2.3.4.7.2	Entrega a interventoría, revisión y aprobación	5 días	jue 20 ago '26	mié 26 ago '26
58	1.2.3.4.8	Radicación en Secretaría de Movilidad - Aprobaciones	5 días	mié 26 ago '26	mar 1 sep '26
59	**1.2.3.5**	**GEOTECNIA**	**75 días**	**vie 17 abr '26**	**mié 29 jul '26**
60	1.2.3.5.1	Revisión estudios existentes	4 días	vie 17 abr '26	mié 22 abr '26
61	1.2.3.5.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	mié 22 abr '26	lun 27 abr '26
62	1.2.3.5.3	Entrega a interventoría y revisión.	5 días	mar 28 abr '26	mar 5 may '26
63	**1.2.3.5.4**	**Actualización de información de campo**	**36 días**	**mar 5 may '26**	**mar 23 jun '26**
64	1.2.3.5.4.1	Muestreo (Apiques)	6 días	mar 5 may '26	mar 12 may '26
65	1.2.3.5.4.2	Ensayos de laboratorio	10 días	mié 13 may '26	mar 26 may '26
66	1.2.3.5.4.3	Análisis de resultados	6 días	mié 27 may '26	mié 3 jun '26
67	1.2.3.5.4.4	Elaboración de informe final (V0)	3 días	mié 3 jun '26	sáb 6 jun '26

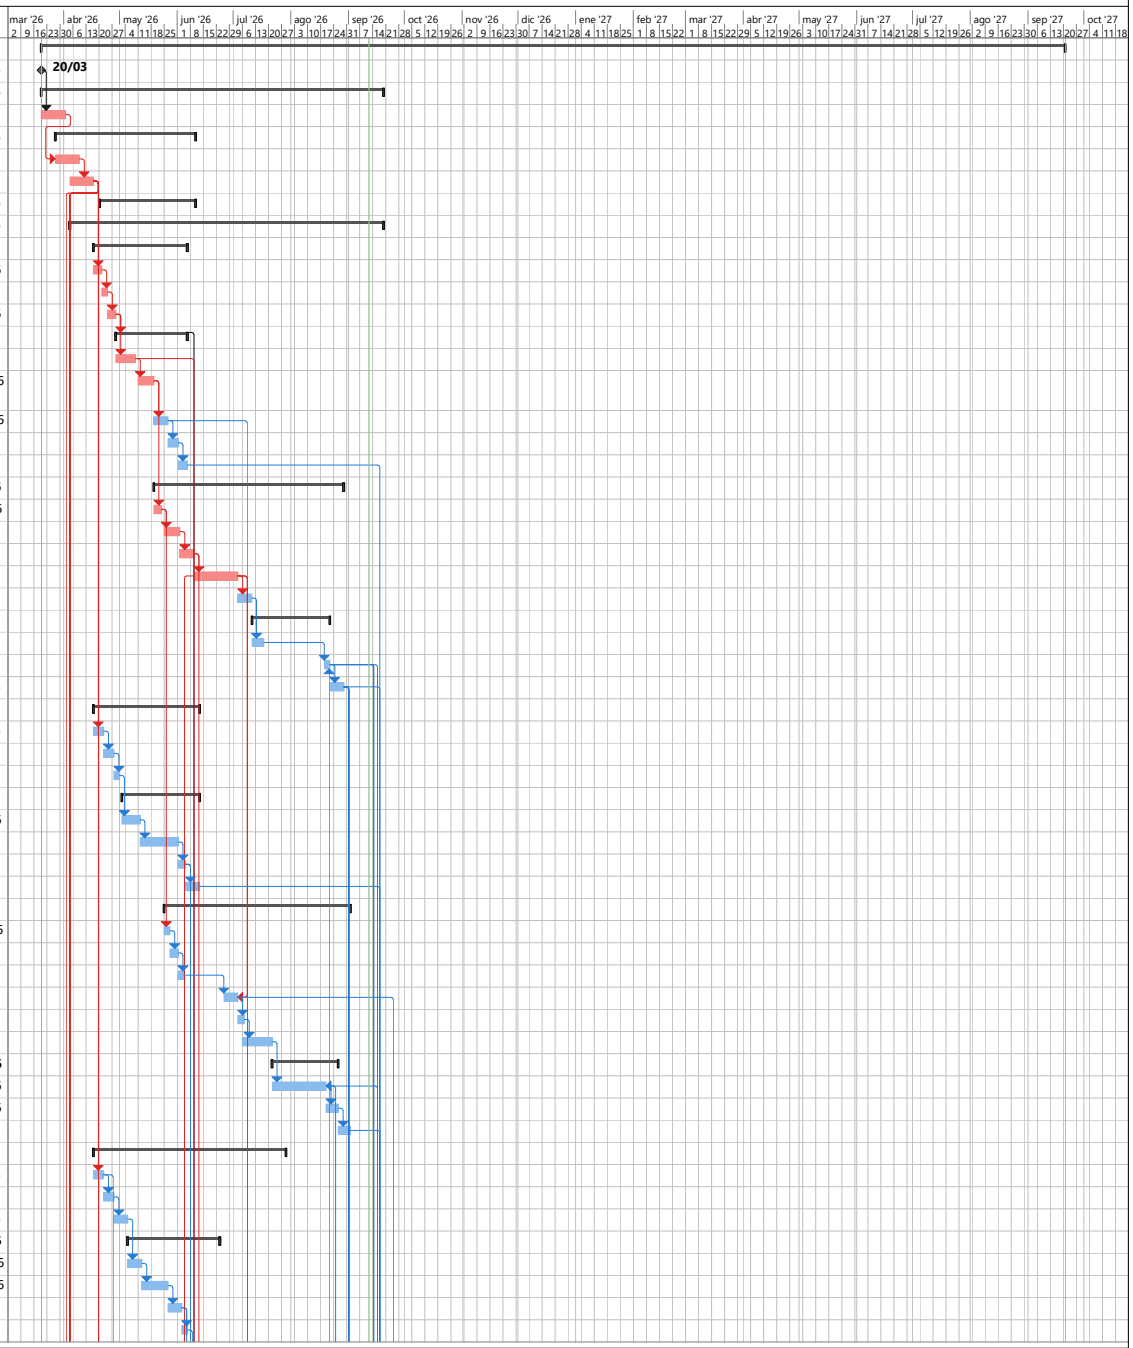


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
68	1.2.3.5.4.5	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	11 días	mar 9 jun '26	mar 23 jun '26
69	**1.2.3.5.5**	**Exploración complementaria (Carrera 34)**	**26 días**	**mié 24 jun '26**	**mié 29 jul '26**
70	1.2.3.5.5.1	Muestreo (Apiques)	2 días	mié 24 jun '26	jue 25 jun '26
71	1.2.3.5.5.2	Ensayos de laboratorio	15 días	vie 26 jun '26	jue 16 jul '26
72	1.2.3.5.5.3	Análisis de resultados	2 días	jue 16 jul '26	sáb 18 jul '26
73	1.2.3.5.5.4	Elaboración de informe final (V1)	3 días	mar 21 jul '26	jue 23 jul '26
74	1.2.3.5.5.5	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	4 días	vie 24 jul '26	mié 29 jul '26
75	**1.2.3.6**	**PAVIMENTOS**	**109 días**	**vie 17 abr '26**	**sáb 12 sep '26**
76	1.2.3.6.1	Revisión diseños existentes	4 días	vie 17 abr '26	mié 22 abr '26
77	1.2.3.6.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	mié 22 abr '26	lun 27 abr '26
78	1.2.3.6.3	Entrega a interventoría y revisión.	5 días	mar 28 abr '26	mar 5 may '26
79	1.2.3.6.4	Ajustes y actualización	10 días	vie 5 jun '26	sáb 20 jun '26
80	1.2.3.6.5	Elaboración de informe final (V1)	3 días	lun 22 jun '26	mié 24 jun '26
81	1.2.3.6.6	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	14 días	jue 25 jun '26	mar 14 jul '26
82	**1.2.3.6.7**	**Complementaciones Revisión 1**	**45 días**	**mar 14 jul '26**	**sáb 12 sep '26**
83	1.2.3.6.7.1	Especificaciones Particulares	1 día	mar 14 jul '26	mié 15 jul '26
84	1.2.3.6.7.2	Plan de Inspección y Ensayos	1 día	mié 15 jul '26	jue 16 jul '26
85	1.2.3.6.7.3	Diseño de andenes y cicloruta	2 días	mar 14 jul '26	jue 16 jul '26
86	1.2.3.6.7.4	Informe Final (V2)	3 días	jue 16 jul '26	mar 21 jul '26
87	1.2.3.6.7.5	Valoración Económica (Definición de Estructura)	2 días	mié 22 jul '26	jue 23 jul '26
88	1.2.3.6.7.6	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	14 días	vie 24 jul '26	mié 12 ago '26
89	1.2.3.6.7.7	Respuesta a solicitudes para aprobación Informe de Diseño + estructura definitiva	9 días	mié 5 ago '26	mar 18 ago '26
90	1.2.3.6.7.8	Anexos complementarios (plano detalles +Secciones + Modulaciones)	5 días	jue 3 sep '26	mié 9 sep '26
91	1.2.3.6.7.9	Aprobaciones finales interventoría	3 días	mié 9 sep '26	sáb 12 sep '26
92	**1.2.3.7**	**URBANISMO**	**123 días**	**mar 7 abr '26**	**sáb 19 sep '26**
93	1.2.3.7.1	Revisión diseños existentes	3 días	mar 7 abr '26	vie 10 abr '26
94	1.2.3.7.2	Elaboración nuevo patrón de diseño en andenes	5 días	vie 10 abr '26	jue 16 abr '26
95	1.2.3.7.3	Presentación y aprobación al patrón de diseño - SIV	2 días	vie 17 abr '26	lun 20 abr '26
96	1.2.3.7.4	Informe de revisión + Plan de trabajo	5 días	lun 20 abr '26	sáb 25 abr '26
97	1.2.3.7.5	Entrega a interventoría y revisión.	3 días	lun 27 abr '26	mié 29 abr '26
98	1.2.3.7.6	Ajustes y actualización de diseños	45 días	sáb 2 may '26	vie 3 jul '26
99	1.2.3.7.7	Elaboración de informe final (V0)	2 días	vie 3 jul '26	lun 6 jul '26
100	1.2.3.7.8	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	6 días	mar 7 jul '26	mar 14 jul '26
101	**1.2.3.7.9**	**Elaboración de informe final (Atención + Revisión Observaciones + Aprobaciones)**	**51 días**	**mar 14 jul '26**	**sáb 19 sep '26**
102	1.2.3.7.9.1	Ajustes Conceptualización (Planta)	24 días	mar 14 jul '26	sáb 15 ago '26
103	1.2.3.7.9.2	Coordinación Interdisciplinaria (Geometría Vial + Señalizaci	8 días	mié 2 sep '26	vie 11 sep '26
104	1.2.3.7.9.3	Coordinación Interdisciplinaria (Redes Húmedas + Secas)	8 días	jue 10 sep '26	sáb 19 sep '26
105	**1.2.3.8**	**REDES DE SERVICIOS**	**121 días**	**jue 9 abr '26**	**sáb 19 sep '26**
106	**1.2.3.8.1**	**REDES HÚMEDAS**	**112 días**	**jue 9 abr '26**	**mié 9 sep '26**
107	**1.2.3.8.1.1**	**ACUEDUCTO**	**112 días**	**jue 9 abr '26**	**mié 9 sep '26**
108	1.2.3.8.1.1.1	Revisión diseños existentes	8 días	jue 9 abr '26	lun 20 abr '26
109	1.2.3.8.1.1.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	lun 20 abr '26	vie 24 abr '26
110	1.2.3.8.1.1.3	Entrega a interventoría y revisión.	5 días	vie 24 abr '26	jue 30 abr '26
111	1.2.3.8.1.1.4	Ajustes y actualización - Mesas de trabajo para seguimier	18 días	mié 27 may '26	sáb 20 jun '26
112	1.2.3.8.1.1.5	Elaboración de informe final (V0)	4 días	lun 22 jun '26	jue 25 jun '26
113	1.2.3.8.1.1.6	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	3 días	vie 26 jun '26	mié 1 jul '26
114	1.2.3.8.1.1.7	Revisión EMCALI EICE ESP	16 días	vie 26 jun '26	vie 17 jul '26
115	**1.2.3.8.1.1.8**	**Elaboración de informe final (Atención Observaciones)**	**19 días**	**vie 17 jul '26**	**jue 13 ago '26**
116	2.3.8.1.1.8.1	Ajustes documentales - Planos Finales	19 días	vie 17 jul '26	jue 13 ago '26
117	1.2.3.8.1.1.9	Radicación y aprobaciones EMCALI EICE ESP - Interventor	20 días	jue 13 ago '26	mié 9 sep '26
118	**1.2.3.8.1.2**	**ALCANTARILLADO**	**112 días**	**jue 9 abr '26**	**mié 9 sep '26**
119	1.2.3.8.1.2.1	Revisión diseños existentes	8 días	jue 9 abr '26	lun 20 abr '26
120	1.2.3.8.1.2.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	lun 20 abr '26	vie 24 abr '26
121	1.2.3.8.1.2.3	Entrega a interventoría y revisión.	5 días	vie 24 abr '26	jue 30 abr '26
122	1.2.3.8.1.2.4	Ajustes y actualización - Mesas de trabajo para seguimier	8 días	mié 10 jun '26	sáb 20 jun '26
123	1.2.3.8.1.2.5	Elaboración de informe final (V0)	4 días	lun 22 jun '26	jue 25 jun '26

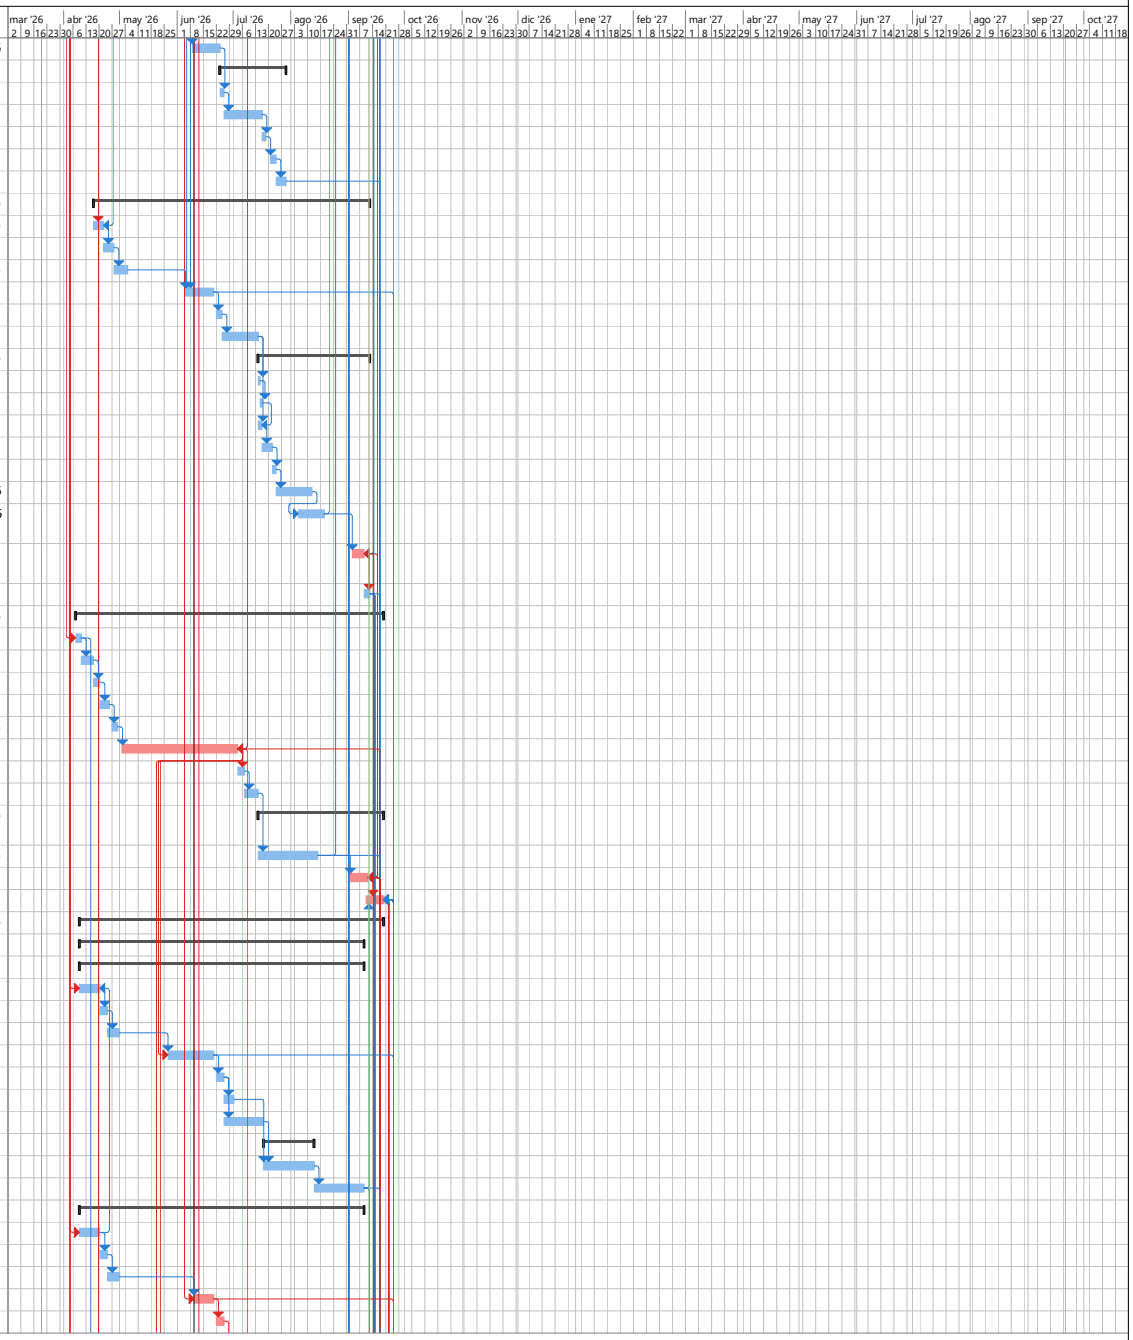


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
124	1.2.3.8.1.2.6	Entrega a EMCALI ESP e interventoría, revisión y aprobac	16 días	vie 26 jun '26	vie 17 jul '26
125	**1.2.3.8.1.2.7**	**Elaboración de informe final (Atención Observaciones)**	**19 días**	**vie 17 jul '26**	**jue 13 ago '26**
126	2.3.8.1.2.7.1	Ajustes documentales - Planos Finales	19 días	vie 17 jul '26	jue 13 ago '26
127	1.2.3.8.1.2.8	Radicación y aprobaciones EMCALI EICE ESP - Interventor	20 días	jue 13 ago '26	mié 9 sep '26
128	**1.2.3.8.2**	**REDES SECAS**	**121 días**	**jue 9 abr '26**	**sáb 19 sep '26**
129	**1.2.3.8.2.1**	**ELÉCTRICAS (MT + BT)**	**121 días**	**jue 9 abr '26**	**sáb 19 sep '26**
130	1.2.3.8.2.1.1	Revisión diseños existentes	8 días	jue 9 abr '26	lun 20 abr '26
131	1.2.3.8.2.1.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	lun 20 abr '26	vie 24 abr '26
132	1.2.3.8.2.1.3	Entrega a interventoría y revisión.	5 días	vie 24 abr '26	jue 30 abr '26
133	1.2.3.8.2.1.4	Elaboración de diseños: Verificaciones de campo y levantamientos + Mesas de trabajo para seguimiento	23 días	jue 28 may '26	mar 30 jun '26
134	1.2.3.8.2.1.5	Elaboración de informe final (V0)	8 días	mar 30 jun '26	jue 9 jul '26
135	1.2.3.8.2.1.6	Entrega a EMCALI e Interventoría para revisión y observaciones	11 días	vie 10 jul '26	vie 24 jul '26
136	**1.2.3.8.2.1.7**	**Elaboración de informe final (Atención Observaciones)**	**23 días**	**sáb 25 jul '26**	**mié 26 ago '26**
137	2.3.8.2.1.7.1	Ajustes documentales - Planos Finales	23 días	sáb 25 jul '26	mié 26 ago '26
138	1.2.3.8.2.1.8	Radicación y aprobaciones EMCALI EICE ESP - Interventor	20 días	mié 26 ago '26	sáb 19 sep '26
139	**1.2.3.8.2.2**	**TELECOMUNICACIONES**	**121 días**	**jue 9 abr '26**	**sáb 19 sep '26**
140	1.2.3.8.2.2.1	Revisión diseños existentes	8 días	jue 9 abr '26	lun 20 abr '26
141	1.2.3.8.2.2.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	lun 20 abr '26	vie 24 abr '26
142	1.2.3.8.2.2.3	Entrega a interventoría y revisión.	5 días	vie 24 abr '26	jue 30 abr '26
143	1.2.3.8.2.2.4	Elaboración de diseños: Verificaciones de campo y levantamientos + Mesas de trabajo para seguimiento	25 días	mar 26 may '26	mar 30 jun '26
144	1.2.3.8.2.2.5	Elaboración de informe final (V0)	14 días	mar 30 jun '26	vie 17 jul '26
145	1.2.3.8.2.2.6	Entrega a EMCALI e Interventoría para revisión y observaciones	5 días	vie 17 jul '26	vie 24 jul '26
146	**1.2.3.8.2.2.7**	**Elaboración de informe final (Atención Observaciones)**	**23 días**	**sáb 25 jul '26**	**mié 26 ago '26**
147	2.3.8.2.2.7.1	Ajustes documentales - Planos Finales	23 días	sáb 25 jul '26	mié 26 ago '26
148	1.2.3.8.2.2.8	Radicación y aprobaciones EMCALI EICE ESP - Interventor	20 días	mié 26 ago '26	sáb 19 sep '26
149	**1.2.3.8.2.3**	**ALUMBRADO PÚBLICO**	**121 días**	**jue 9 abr '26**	**sáb 19 sep '26**
150	1.2.3.8.2.3.1	Revisión diseños existentes	8 días	jue 9 abr '26	lun 20 abr '26
151	1.2.3.8.2.3.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	lun 20 abr '26	vie 24 abr '26
152	1.2.3.8.2.3.3	Entrega a interventoría y revisión.	5 días	vie 24 abr '26	jue 30 abr '26
153	1.2.3.8.2.3.4	Elaboración de diseños: Verificaciones de campo y levantamientos + Estudios fotométricos + Mesas de trabajo para seguimiento	23 días	mar 19 may '26	vie 19 jun '26
154	1.2.3.8.2.3.5	Elaboración de informe parcial	4 días	vie 19 jun '26	mié 24 jun '26
155	1.2.3.8.2.3.6	Entrega a interventoría, revisión.	6 días	jue 25 jun '26	vie 3 jul '26
156	**1.2.3.8.2.3.7**	**Elaboración de informe final (Atención Observaciones)**	**39 días**	**vie 3 jul '26**	**mié 26 ago '26**
157	2.3.8.2.3.7.1	Ajustes documentales - Planos Finales	39 días	vie 3 jul '26	mié 26 ago '26
158	1.2.3.8.2.3.8	Revisiones y aprobaciones finales UAESP e Interventoría	20 días	mié 26 ago '26	sáb 19 sep '26
159	**1.2.3.8.2.4**	**REDES OTROS OPERADORES**	**47 días**	**jue 21 may '26**	**vie 24 jul '26**
160	1.2.3.8.2.4.1	Elaboración de diseños: Verificaciones de campo y levantamientos + Mesas de trabajo para seguimiento	10 días	jue 21 may '26	mié 3 jun '26
161	1.2.3.8.2.4.2	Elaboración de informe final	4 días	mié 3 jun '26	mar 9 jun '26
162	1.2.3.8.2.4.3	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	16 días	mié 10 jun '26	jue 2 jul '26
163	1.2.3.8.2.4.4	Elaboración de informe final (Atención Observaciones)	9 días	jue 2 jul '26	mar 14 jul '26
164	1.2.3.8.2.4.5	Revisiones y aprobaciones finales Interventoría	8 días	mar 14 jul '26	vie 24 jul '26
165	**1.2.3.8.2.5**	**REDES SEGURIDAD Y JUSTICIA**	**47 días**	**jue 21 may '26**	**vie 24 jul '26**
166	1.2.3.8.2.5.1	Elaboración de diseños: Verificaciones de campo y levantamientos + Mesas de trabajo para seguimiento	7 días	jue 21 may '26	vie 29 may '26
167	1.2.3.8.2.5.2	Elaboración de informe final	4 días	sáb 30 may '26	jue 4 jun '26
168	1.2.3.8.2.5.3	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	13 días	jue 4 jun '26	mar 23 jun '26
169	1.2.3.8.2.5.4	Elaboración de informe final (Atención Observaciones)	15 días	mié 24 jun '26	mar 14 jul '26
170	1.2.3.8.2.5.5	Revisiones y aprobaciones finales Seguridad y Justicia	8 días	mar 14 jul '26	vie 24 jul '26
171	**1.2.3.8.2.6**	**REDES DATIC**	**47 días**	**jue 21 may '26**	**vie 24 jul '26**
172	1.2.3.8.2.6.1	Elaboración de diseños: Verificaciones de campo y levantamientos + Mesas de trabajo para seguimiento	11 días	jue 21 may '26	jue 4 jun '26
173	1.2.3.8.2.6.2	Elaboración de informe final	4 días	jue 4 jun '26	mié 10 jun '26
174	1.2.3.8.2.6.3	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	9 días	jue 11 jun '26	mar 23 jun '26

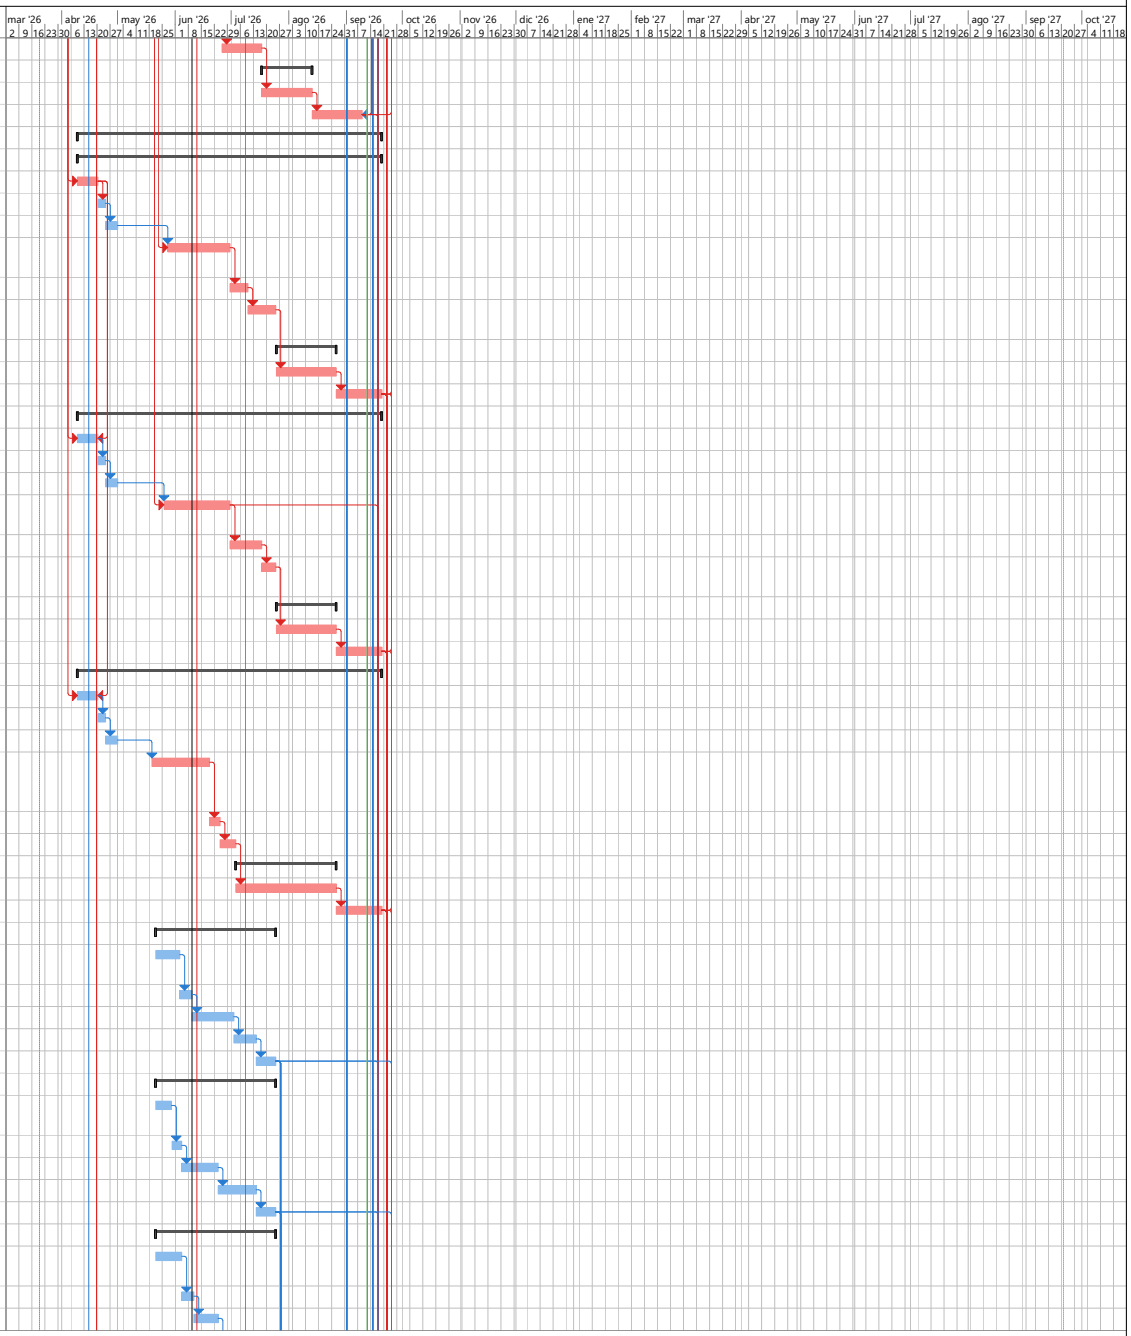

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
175	1.2.3.8.2.6.4	Elaboración de informe final (Atención Observaciones)	15 días	mié 24 jun '26	mar 14 jul '26
176	1.2.3.8.2.6.5	Revisiones y aprobaciones finales DATIC	8 días	mar 14 jul '26	vie 24 jul '26
177	**1.2.3.8.2.7**	**REDES SEMÁFOROS**	**64 días**	**jue 25 jun '26**	**vie 18 sep '26**
178	1.2.3.8.2.7.1	Verificaciones de campo y levantamientos	10 días	jue 25 jun '26	mié 8 jul '26
179	1.2.3.8.2.7.2	Elaboración de diseños	20 días	jue 9 jul '26	mar 4 ago '26
180	**1.2.3.8.2.7.3**	**Entregas a interventoría para revisiones**	**10 días**	**mié 5 ago '26**	**mié 19 ago '26**
181	2.3.8.2.7.3.1	Intersección Av. Roosevelt con Calle 27	2 días	mié 5 ago '26	jue 6 ago '26
182	2.3.8.2.7.3.2	Intersección Carrera 34 con Calle 8	2 días	mié 5 ago '26	jue 6 ago '26
183	2.3.8.2.7.3.3	Intersección Av. Roosevelt con Calle 29	2 días	mié 5 ago '26	jue 6 ago '26
184	2.3.8.2.7.3.4	Intersección Av. Roosevelt con Calle 34	3 días	vie 14 ago '26	mié 19 ago '26
185	2.3.8.2.7.3.5	Intersección Av. Roosevelt con Calle 36	3 días	vie 14 ago '26	mié 19 ago '26
186	2.3.8.2.7.3.6	Intersección Av. Carrera 36 con Calle 9	3 días	vie 14 ago '26	mié 19 ago '26
187	**1.2.3.8.2.7.4**	**Revisiones y aprobaciones**	**32 días**	**sáb 8 ago '26**	**vie 18 sep '26**
188	2.3.8.2.7.4.1	Intersección Av. Roosevelt con Calle 27	24 días	sáb 8 ago '26	mié 9 sep '26
189	2.3.8.2.7.4.2	Intersección Carrera 34 con Calle 8	24 días	sáb 8 ago '26	mié 9 sep '26
190	2.3.8.2.7.4.3	Intersección Av. Roosevelt con Calle 29	24 días	sáb 8 ago '26	mié 9 sep '26
191	2.3.8.2.7.4.4	Intersección Av. Roosevelt con Calle 34	24 días	jue 20 ago '26	vie 18 sep '26
192	2.3.8.2.7.4.5	Intersección Av. Roosevelt con Calle 36	24 días	jue 20 ago '26	vie 18 sep '26
193	2.3.8.2.7.4.6	Intersección Av. Carrera 36 con Calle 9	24 días	jue 20 ago '26	vie 18 sep '26
194	**1.2.3.8.3**	**RED DE GAS**	**56 días**	**vie 17 abr '26**	**vie 3 jul '26**
195	1.2.3.8.3.1	Revisión información existente	6 días	vie 17 abr '26	vie 24 abr '26
196	1.2.3.8.3.2	Solicitud de información Gases de Occidente	10 días	vie 24 abr '26	vie 8 may '26
197	1.2.3.8.3.3	Validaciones de campo y trámites de diseño ante entidad	35 días	vie 8 may '26	jue 25 jun '26
198	1.2.3.8.3.4	Información final	5 días	vie 26 jun '26	vie 3 jul '26
199	**1.2.3.9**	**GESTIÓN PREDIAL**	**10 días**	**mié 10 jun '26**	**mar 23 jun '26**
200	1.2.3.9.1	Revisión información existente	5 días	mié 10 jun '26	mié 17 jun '26
201	1.2.3.9.2	Validación	5 días	mié 17 jun '26	mar 23 jun '26
202	**1.2.3.10**	**PAISAJISMO**	**98 días**	**sáb 4 abr '26**	**sáb 15 ago '26**
203	1.2.3.10.1	Revisión diseños existentes	5 días	sáb 4 abr '26	vie 10 abr '26
204	1.2.3.10.2	Ajustes y actualización de diseños	40 días	vie 8 may '26	vie 3 jul '26
205	1.2.3.10.3	Elaboración de informe final	3 días	vie 3 jul '26	mar 7 jul '26
206	1.2.3.10.4	Entrega a interventoría, revisión y aprobación.	5 días	mié 8 jul '26	mar 14 jul '26
207	1.2.3.10.5	Fichas	10 días	mar 14 jul '26	mar 28 jul '26
208	1.2.3.10.6	Coordinación Urbanismo (Revisión + Aprobaciones)	14 días	mar 28 jul '26	sáb 15 ago '26
209	**1.2.3.11**	**PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	**87 días**	**vie 17 abr '26**	**vie 14 ago '26**
210	1.2.3.11.1	Revisión información existente	3 días	vie 17 abr '26	mar 21 abr '26
211	1.2.3.11.2	Informe de revisión + Plan de trabajo	4 días	mar 21 abr '26	sáb 25 abr '26
212	1.2.3.11.3	Entrega a interventoría y revisión.	4 días	lun 27 abr '26	jue 30 abr '26
213	**1.2.3.11.4**	**Ajustes y actualización - PMT Categoría 2**	**79 días**	**lun 27 abr '26**	**jue 13 ago '26**
214	1.2.3.11.4.1	Levantamiento de información + Identificar condiciones existentes	2 días	lun 27 abr '26	mar 28 abr '26
215	1.2.3.11.4.2	Documento técnico de soporte	35 días	mié 29 abr '26	mié 17 jun '26
216	1.2.3.11.4.3	Señalización temporal (diseños y esquemas)	12 días	mié 29 abr '26	jue 14 may '26
217	**1.2.3.11.4.4**	**Información de campo**	**22 días**	**sáb 2 may '26**	**lun 1 jun '26**
218	2.3.11.4.4.1	Aforos vehiculares	7 días	sáb 2 may '26	lun 11 may '26
219	2.3.11.4.4.2	Procesamiento y análisis aforos vehiculares	15 días	mar 12 may '26	lun 1 jun '26
220	1.2.3.11.4.5	Planeamiento semafórico	8 días	lun 1 jun '26	jue 11 jun '26
221	1.2.3.11.4.6	Trámites Secretaría de Movilidad (formatos, radicación revisión y aprobación)	45 días	vie 12 jun '26	jue 13 ago '26
222	**1.2.3.11.5**	**Ajustes y actualización - PMT Categoría 3**	**80 días**	**lun 27 abr '26**	**vie 14 ago '26**
223	1.2.3.11.5.1	Levantamiento de información + Identificar condiciones existentes	2 días	lun 27 abr '26	mar 28 abr '26
224	1.2.3.11.5.2	Documento técnico de soporte	40 días	mié 29 abr '26	mar 23 jun '26
225	1.2.3.11.5.3	Señalización temporal (diseños y esquemas)	12 días	mié 29 abr '26	jue 14 may '26
226	**1.2.3.11.5.4**	**Información de campo**	**22 días**	**sáb 2 may '26**	**lun 1 jun '26**
227	2.3.11.5.4.1	Aforos vehiculares	7 días	sáb 2 may '26	lun 11 may '26
228	2.3.11.5.4.2	Procesamiento y análisis aforos vehiculares	15 días	mar 12 may '26	lun 1 jun '26
229	1.2.3.11.5.5	Planeamiento semafórico	8 días	lun 1 jun '26	jue 11 jun '26
230	1.2.3.11.5.6	Simulación del tráfico vehicular	8 días	vie 5 jun '26	jue 18 jun '26

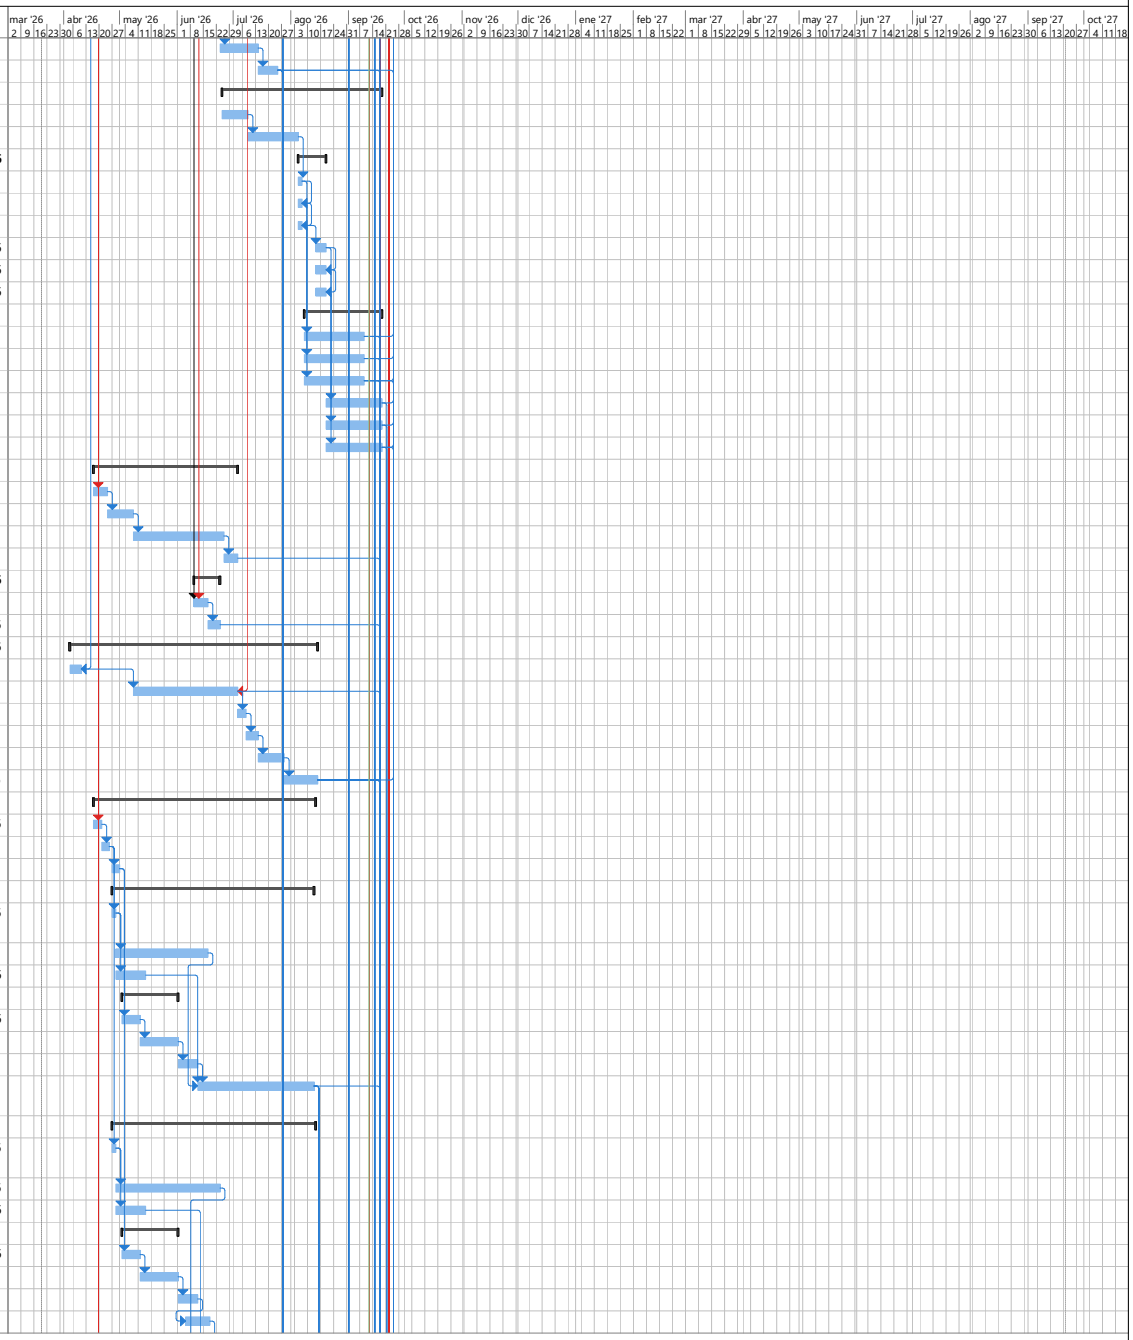

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
231	1.2.3.11.5.7	Trámites Secretaría de Movilidad (formatos, radicación revisión y aprobación)	45 días	sáb 13 jun '26	vie 14 ago '26
232	**1.2.3.12**	**SOCIAL**	**113 días**	**vie 17 abr '26**	**jue 17 sep '26**
233	1.2.3.12.1	Revisión información existente	10 días	vie 17 abr '26	mié 29 abr '26
234	1.2.3.12.2	Informe de revisión + Plan de trabajo + Actualizaciones	48 días	jue 30 abr '26	lun 6 jul '26
235	1.2.3.12.3	Actas de Vecindad	100 días	mar 5 may '26	jue 17 sep '26
236	**1.2.3.13**	**AMBIENTAL**	**58 días**	**vie 17 abr '26**	**lun 6 jul '26**
237	1.2.3.13.1	Revisión información existente	10 días	vie 17 abr '26	mié 29 abr '26
238	1.2.3.13.2	Informe de revisión + Plan de trabajo + Actualizaciones	45 días	mar 5 may '26	lun 6 jul '26
239	**1.2.3.14**	**COSTOS Y PROGRAMACIÓN**	**115 días**	**vie 17 abr '26**	**sáb 19 sep '26**
240	1.2.3.14.1	Revisión información existente	12 días	vie 17 abr '26	lun 4 may '26
241	1.2.3.14.2	Informe de revisión + Plan de trabajo + Validación de Informac	36 días	lun 4 may '26	lun 22 jun '26
242	1.2.3.14.3	Ajustes y actualización	50 días	mié 15 jul '26	sáb 19 sep '26
243	**1.2.4**	**RELACIÓN DE CONDICIONES DE APROBACIÓN PARA INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**43 días**	**vie 24 jul '26**	**sáb 19 sep '26**
244	**1.2.4.1**	**ETAPA 1**	**43 días**	**vie 24 jul '26**	**sáb 19 sep '26**
245	1.2.4.1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	0 días	jue 13 ago '26	jue 13 ago '26
246	1.2.4.1.2	ALCANTARILLADO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
247	1.2.4.1.3	DISEÑO GEOMÉTRICO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 29 ago '26	sáb 29 ago '26
248	1.2.4.1.4	PAVIMENTOS (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 12 sep '26	sáb 12 sep '26
249	1.2.4.1.5	URBANISMO Y PAISAJISMO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
250	1.2.4.1.6	ACUEDUCTO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
251	1.2.4.1.7	ENERGÍA MT + BT (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
252	1.2.4.1.8	ALUMBRADO PÚBLICO (UAESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
253	1.2.4.1.9	TELECOMUNICACIONES (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
254	1.2.4.1.10	SEGURIDAD Y JUSTICIA, DATIC, OTROS OPERADORES	0 días	vie 24 jul '26	vie 24 jul '26
255	1.2.4.1.11	ACTAS DE VECINDAD	0 días	jue 17 sep '26	jue 17 sep '26
256	1.2.4.1.12	COSTOS Y PROGRAMACIÓN	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
257	**1.2.4.2**	**ETAPA 2**	**43 días**	**vie 24 jul '26**	**sáb 19 sep '26**
258	1.2.4.2.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	0 días	jue 13 ago '26	jue 13 ago '26
259	1.2.4.2.2	ALCANTARILLADO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
260	1.2.4.2.3	DISEÑO GEOMÉTRICO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 29 ago '26	sáb 29 ago '26
261	1.2.4.2.4	PAVIMENTOS (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 12 sep '26	sáb 12 sep '26
262	1.2.4.2.5	URBANISMO Y PAISAJISMO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
263	1.2.4.2.6	ACUEDUCTO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
264	1.2.4.2.7	ENERGÍA MT + BT (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
265	1.2.4.2.8	ALUMBRADO PÚBLICO (UAESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
266	1.2.4.2.9	TELECOMUNICACIONES (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
267	1.2.4.2.10	SEGURIDAD Y JUSTICIA, DATIC, OTROS OPERADORES	0 días	vie 24 jul '26	vie 24 jul '26
268	1.2.4.2.11	ACTAS DE VECINDAD	0 días	jue 17 sep '26	jue 17 sep '26
269	1.2.4.2.12	COSTOS Y PROGRAMACIÓN	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
270	**1.2.4.3**	**ETAPA 3**	**43 días**	**vie 24 jul '26**	**sáb 19 sep '26**
271	1.2.4.3.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	0 días	jue 13 ago '26	jue 13 ago '26
272	1.2.4.3.2	ALCANTARILLADO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
273	1.2.4.3.3	DISEÑO GEOMÉTRICO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 29 ago '26	sáb 29 ago '26
274	1.2.4.3.4	PAVIMENTOS (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 12 sep '26	sáb 12 sep '26
275	1.2.4.3.5	URBANISMO Y PAISAJISMO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
276	1.2.4.3.6	ACUEDUCTO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
277	1.2.4.3.7	ENERGÍA MT + BT (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
278	1.2.4.3.8	ALUMBRADO PÚBLICO (UAESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
279	1.2.4.3.9	TELECOMUNICACIONES (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
280	1.2.4.3.10	SEGURIDAD Y JUSTICIA, DATIC, OTROS OPERADORES	0 días	vie 24 jul '26	vie 24 jul '26
281	1.2.4.3.11	ACTAS DE VECINDAD	0 días	jue 17 sep '26	jue 17 sep '26
282	1.2.4.3.12	COSTOS Y PROGRAMACIÓN	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
283	**1.2.4.4**	**ETAPA 4**	**43 días**	**vie 24 jul '26**	**sáb 19 sep '26**
284	1.2.4.4.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	0 días	jue 13 ago '26	jue 13 ago '26
285	1.2.4.4.2	ALCANTARILLADO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
286	1.2.4.4.3	DISEÑO GEOMÉTRICO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 29 ago '26	sáb 29 ago '26
287	1.2.4.4.4	PAVIMENTOS (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 12 sep '26	sáb 12 sep '26

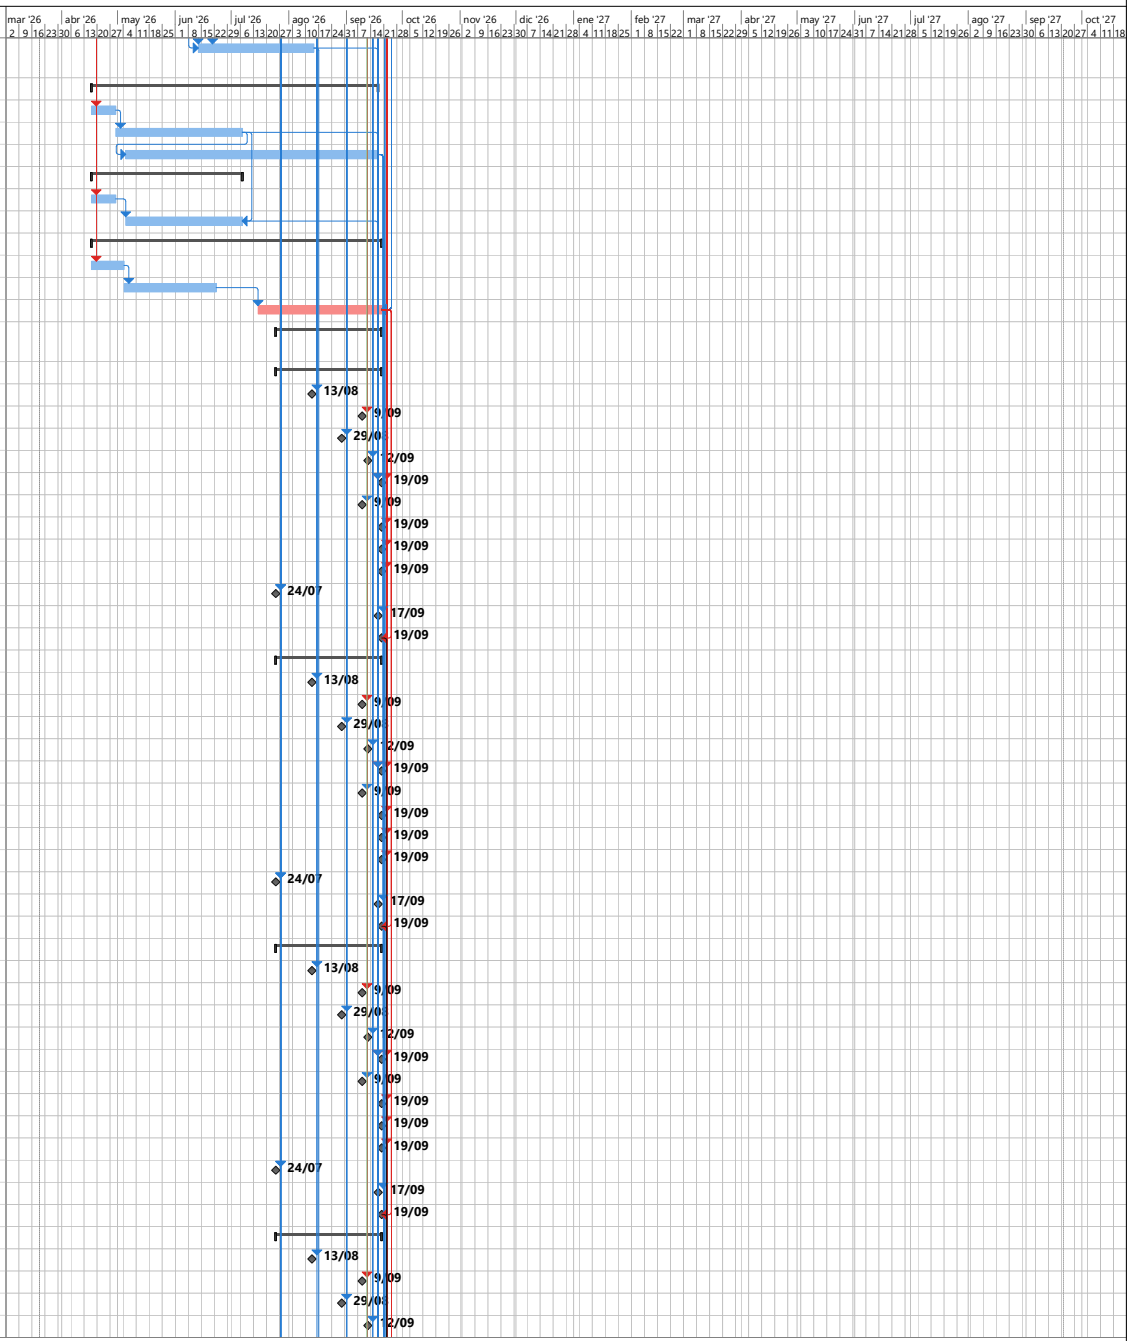

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
288	1.2.4.4.5	URBANISMO Y PAISAJISMO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
289	1.2.4.4.6	ACUEDUCTO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
290	1.2.4.4.7	ENERGÍA MT + BT (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
291	1.2.4.4.8	ALUMBRADO PÚBLICO (UAESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
292	1.2.4.4.9	TELECOMUNICACIONES (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
293	1.2.4.4.10	SEGURIDAD Y JUSTICIA, DATIC, OTROS OPERADORES	0 días	vie 24 jul '26	vie 24 jul '26
294	1.2.4.4.11	ACTAS DE VECINDAD	0 días	jue 17 sep '26	jue 17 sep '26
295	1.2.4.4.12	COSTOS Y PROGRAMACIÓN	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
296	**1.2.4.5**	**ETAPA 5**	**43 días**	**vie 24 jul '26**	**sáb 19 sep '26**
297	1.2.4.5.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	0 días	jue 13 ago '26	jue 13 ago '26
298	1.2.4.5.2	ALCANTARILLADO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
299	1.2.4.5.3	DISEÑO GEOMÉTRICO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 29 ago '26	sáb 29 ago '26
300	1.2.4.5.4	PAVIMENTOS (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 12 sep '26	sáb 12 sep '26
301	1.2.4.5.5	URBANISMO Y PAISAJISMO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
302	1.2.4.5.6	ACUEDUCTO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
303	1.2.4.5.7	ENERGÍA MT + BT (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
304	1.2.4.5.8	ALUMBRADO PÚBLICO (UAESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
305	1.2.4.5.9	TELECOMUNICACIONES (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
306	1.2.4.5.10	SEGURIDAD Y JUSTICIA, DATIC, OTROS OPERADORES	0 días	vie 24 jul '26	vie 24 jul '26
307	1.2.4.5.11	ACTAS DE VECINDAD	0 días	jue 17 sep '26	jue 17 sep '26
308	1.2.4.5.12	COSTOS Y PROGRAMACIÓN	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
309	**1.2.4.6**	**ETAPA 6**	**43 días**	**vie 24 jul '26**	**sáb 19 sep '26**
310	1.2.4.6.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	0 días	vie 14 ago '26	vie 14 ago '26
311	1.2.4.6.2	ALCANTARILLADO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
312	1.2.4.6.3	DISEÑO GEOMÉTRICO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 29 ago '26	sáb 29 ago '26
313	1.2.4.6.4	PAVIMENTOS (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 12 sep '26	sáb 12 sep '26
314	1.2.4.6.5	URBANISMO Y PAISAJISMO (INTERVENTORÍA)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
315	1.2.4.6.6	ACUEDUCTO (EMCALI EICE ESP)	0 días	mié 9 sep '26	mié 9 sep '26
316	1.2.4.6.7	ENERGÍA MT + BT (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
317	1.2.4.6.8	ALUMBRADO PÚBLICO (UAESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
318	1.2.4.6.9	TELECOMUNICACIONES (EMCALI EICE ESP)	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
319	1.2.4.6.10	SEGURIDAD Y JUSTICIA, DATIC, OTROS OPERADORES	0 días	vie 24 jul '26	vie 24 jul '26
320	1.2.4.6.11	ACTAS DE VECINDAD	0 días	jue 17 sep '26	jue 17 sep '26
321	1.2.4.6.12	COSTOS Y PROGRAMACIÓN	0 días	sáb 19 sep '26	sáb 19 sep '26
322	**1.2.5**	**Finalización Etapa de Preconstrucción**	**0 días**	**sáb 19 sep '26**	**sáb 19 sep '26**
323	**1.3**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**270 días**	**lun 21 sep '26**	**lun 20 sep '27**
324	**1.3.1**	**IMPLEMENTACIONES - GESTIONES**	**270 días**	**lun 21 sep '26**	**lun 20 sep '27**
325	1.3.1.1	IMPLEMENTACIÓN PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO	270 días	lun 21 sep '26	lun 20 sep '27
326	1.3.1.2	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	270 días	lun 21 sep '26	lun 20 sep '27
327	1.3.1.3	GESTIÓN SOCIAL	270 días	lun 21 sep '26	lun 20 sep '27
328	1.3.1.4	PAGOS MANIOBRAS EN CALIENTE Y CERTIFICACIONES	193 días	lun 4 ene '27	lun 20 sep '27
329	1.3.1.5	ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS	193 días	lun 4 ene '27	lun 20 sep '27
330	**1.3.2**	**EJECUCIÓN DE OBRAS**	**270 días**	**lun 21 sep '26**	**lun 20 sep '27**
331	**1.3.2.1**	**Inicio**	**0 días**	**lun 21 sep '26**	**lun 21 sep '26**
332	**1.3.2.2**	**ETAPA 1**	**93 días**	**lun 21 sep '26**	**lun 25 ene '27**
340	**1.3.2.3**	**ETAPA 2**	**66 días**	**mié 13 ene '27**	**vie 9 abr '27**
348	**1.3.2.4**	**ETAPA 3**	**88 días**	**sáb 10 abr '27**	**vie 6 ago '27**
356	**1.3.2.5**	**ETAPA 4**	**33 días**	**lun 9 ago '27**	**lun 20 sep '27**
364	**1.3.2.6**	**ETAPA 5**	**25 días**	**jue 19 ago '27**	**lun 20 sep '27**
372	**1.3.2.7**	**ETAPA 6**	**6 días**	**lun 13 sep '27**	**lun 20 sep '27**
376	**1.3.2.8**	**Finalización Ejecución de Obras**	**0 días**	**lun 20 sep '27**	**lun 20 sep '27**
377	**1.4**	**Finalización del Proyecto**	**0 días**	**lun 20 sep '27**	**lun 20 sep '27**

