PROINCO INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO DE OBRA No 2505120663**
	PROINCO INGENIERIA S.A.S. **RPL JUAN JOSE LLANOS ESTRADA** **NIT: 900.375.623-2**

INFORME MENSUAL No. 4

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2505120663

OBJETO: "MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 017 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

PERIODO DE EJECUCION: 03 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE DEL 2025

MANIZALES
2025

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
2.1. OBJETIVO GENERAL 3
2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 3
3. INFORMACION DEL CONTRATO 4
4. LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
6.1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 6
6.2. DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
6.2.1. Viviendas terminadas 7
6.2.2. Viviendas en ejecución 66
6.2.3. Viviendas próximas a iniciar 67
7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 67

1. INTRODUCCION

El derecho a una vivienda digna es uno de los pilares fundamentales del bienestar y desarrollo de las comunidades. En este sentido, el Municipio de Manizales, comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, ha impulsado el desarrollo de acciones concretas que garanticen condiciones habitacionales adecuadas, especialmente para las familias en situación de vulnerabilidad.

En el marco de esta visión, se suscribió el **Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 017** con el **Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)**, cuyo objeto es la **ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana del municipio de Manizales**, mediante la modalidad de precios unitarios fijos y a monto agotable. Este proyecto se alinea con las políticas públicas nacionales y locales en materia de hábitat y vivienda, y responde a la necesidad de intervenir viviendas que, si bien están construidas, presentan condiciones inadecuadas en su estructura, instalaciones básicas o habitabilidad general.

El mejoramiento de viviendas permite reducir los niveles de déficit cualitativo en la ciudad, brindando soluciones efectivas y sostenibles para garantizar espacios seguros, saludables y funcionales. Las acciones ejecutadas dentro del proyecto tienen un impacto directo en la salud, la seguridad, la convivencia y la dignidad de las familias beneficiadas.

La presente documentación tiene como fin describir los objetivos, alcance, actividades ejecutadas, localización y descripción técnica del proyecto, dando cuenta de los avances y resultados obtenidos durante su implementación.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad, seguridad y funcionalidad de las viviendas localizadas en la zona urbana del municipio de Manizales, mediante la ejecución de obras de mejoramiento integral, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 017 suscrito con FONVIVIENDA, bajo la modalidad de precios unitarios fijos y a monto agotable.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Ejecutar obras de mejoramiento en componentes clave de las viviendas como baños, cocinas, cubiertas, pisos e instalaciones eléctricas e hidráulicas.
- Garantizar soluciones habitacionales seguras y funcionales que mejoren la calidad de vida de las familias beneficiarias.

3. INFORMACION DEL CONTRATO

- **Objeto del Contrato:** Mejoramientos de viviendas en la zona urbana del municipio de Manizales, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 017 suscrito con FONVIVIENDA.
- **Modalidad de Contratación:** Precios unitarios fijos a monto agotable.
- **Convenio Marco:** Convenio Interadministrativo No. 017.
- **Entidad Contratante:** Municipio de Manizales.
- **Entidad Cooperante:** FONVIVIENDA.
- **Ubicación del Proyecto:** Zona urbana de Manizales.
- **Fecha de Inicio:** 03 de Junio del 2025
- **Fecha de Finalización:** 03 de Diciembre del 2025.
- **Duración del Proyecto:** 6 meses.

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto de **mejoramiento de viviendas** se ejecuta en la **zona urbana del municipio de Manizales**, departamento de Caldas. Las intervenciones se distribuyen estratégicamente en diversas comunas, barrios y sectores urbanos que han sido previamente priorizados por la Administración Municipal, con base en estudios socioeconómicos y diagnósticos técnicos.



Las zonas seleccionadas corresponden principalmente a sectores con altos índices de vulnerabilidad, donde se identificaron viviendas con condiciones inadecuadas de habitabilidad, estructuras en deterioro, instalaciones deficientes o ausencia de elementos básicos como baños, cocinas funcionales o cubiertas en buen estado.

Entre los barrios intervenidos se encuentran, por ejemplo: San Sebastián, Bajo Persia, Persia, Solferino, La Enea, Fátima, entre otros. Estas áreas fueron seleccionadas en coordinación con las entidades municipales encargadas de la política de vivienda.

La intervención se focaliza en predios legalmente habitados, con uso residencial y en los que las condiciones técnicas permiten una mejora sin necesidad de demolición o reconstrucción total.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad realizar **intervenciones de mejoramiento en viviendas ubicadas en la zona urbana del municipio de Manizales**, dirigidas a hogares que presentan condiciones habitacionales deficientes. Estas intervenciones buscan atender el déficit cualitativo de vivienda, priorizando aspectos estructurales y funcionales esenciales para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.

Las obras que se ejecutan corresponden a **mejoramientos puntuales**, definidos a partir de un diagnóstico técnico y social realizado previamente en cada una de las viviendas seleccionadas. Este diagnóstico permite identificar las necesidades particulares de cada hogar y determinar el tipo de intervención más adecuada, respetando la estructura original de la vivienda y asegurando la estabilidad de la construcción.

Las actividades que incluye el proyecto son, entre otras:

- **Mejoramiento de cocinas:** reparación o instalación de mesones, lavaplatos, griferías, enchapes, conexiones hidráulicas y eléctricas, y mobiliario básico.
- **Adecuación de baños:** cambio o instalación de aparatos sanitarios, lavamanos, duchas, enchapes, pisos y adecuación de redes internas.
- **Reparación de cubiertas:** cambio de tejas, refuerzo de estructura, aplicación de impermeabilizantes y mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias.
- **Instalación y nivelación de pisos:** colocación de pisos en cerámica u otro material resistente, nivelación de superficies y acabados.

- **Reparación de muros y fachadas:** aplicación de pañete, estuco, pintura y sellado de fisuras.
- **Adecuaciones eléctricas e hidráulicas:** renovación de cableado, cambio de luminarias, tomas y llaves, así como la adecuación de tuberías de agua potable y saneamiento básico.

Cada intervención se ejecuta bajo los lineamientos técnicos establecidos por el Municipio de Manizales y FONVIVIENDA, con énfasis en seguridad, funcionalidad, durabilidad y eficiencia en el uso de los recursos. Asimismo, el proyecto incorpora criterios de equidad social, priorizando hogares con jefatura femenina, personas en condición de discapacidad, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

El alcance de las obras se ajusta de acuerdo con los recursos disponibles bajo la modalidad de **precios unitarios fijos y monto agotable**, lo cual permite administrar el presupuesto de forma eficiente y garantizar la transparencia durante todo el proceso de ejecución.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

6.1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

De acuerdo con el cronograma oficial y el plan de trabajo presentado el 28 de julio de 2025, para la fecha de corte del 02 de octubre se tenía proyectada la entrega de noventa y nueve (99) viviendas mejoradas a la Alcaldía de Manizales. No obstante, a dicha fecha se reporta el siguiente estado de avance:

- Cuarenta y siete (47) viviendas han sido entregadas a satisfacción a la Alcaldía de Manizales.
- Once (11) viviendas han sido recibidas por la interventoría y están en trámite de entrega oficial.
- Nueve (9) viviendas se encuentran completamente terminadas y están pendientes de revisión y aceptación por parte de la interventoría.

Adicionalmente, se tienen dieciocho (18) viviendas en ejecución activa y otras diez (10) programadas para iniciar en los próximos días, conforme a la planeación operativa.

En consecuencia, del total de las 99 viviendas que debían haberse entregado conforme al cronograma establecido, se cuenta con sesenta y siete (67) entre

entregadas, en trámite de entrega o finalizadas. Las dieciocho (18) viviendas restantes presentan las siguientes particularidades:

- Dieciocho (18) viviendas se encuentran en etapa final de ejecución y se estima su entrega en los próximos días.

Debido a algunos contratiempos, hemos tenido un retraso respecto al cronograma establecido. Sin embargo, este puede ser mitigado mediante la inclusión de más personal en las actividades de obra, lo que permitirá recuperar el ritmo y cumplir con los plazos definidos.

6.2. DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **Avance de actividades programadas:** Tal como se indicó, para la fecha de corte del 02 de octubre de 2025, se ha intervenido un total de 67 viviendas, con 18 viviendas adicionales en ejecución. En el apartado siguiente se detallan las actividades desarrolladas en cada vivienda, incluyendo las cantidades ejecutadas y el respectivo soporte fotográfico.

6.2.1. Viviendas terminadas

A continuación, se presenta el consolidado de actividades ejecutadas, cantidades asociadas y registro fotográfico correspondiente a las treinta y cinco (35) viviendas que han sido recibidas a satisfacción por la interventoría y/o la Alcaldía. Adicionalmente, se incluyen las cuatro (4) viviendas que se encuentran terminadas y a la espera de revisión técnica final. Cabe señalar que estas últimas están sujetas a posibles ajustes, ya que se encuentran pendientes de las respectivas tomas de medidas finales, las cuales se realizarán en conjunto con la interventoría.

6.2.1.1. *Vivienda 12 – Germán Lopez – Fátima – A la espera de tomar medidas finales con interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	9.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	3.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	3.0
CUBIERTAS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	12
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	53
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	50
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	35.0
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	54
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	18
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	48
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	54
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML	6

6.2.1.1.1. Registro fotográfico









6.2.1.2. *Vivienda 23 – Alba Lucia López Morales – Samaria – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	3,0
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,0
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	18,0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	5,0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	6,0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	6,0
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	117,00
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	40,0

PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	2,5
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 Impermeabilizado e= 0.04 mts	M2	2,5
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	26,46
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	90,0
DESMONTES		
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	2,5
ITEMS NO PREVISTOS		
PICADO DE MURO	M2	117

6.2.1.2.1. Registro fotográfico









6.2.1.3. *Vivienda 26 - Dignora Valencia Torres – San Cayetano – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	9.00
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	5
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	16
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	6.5
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	26.0
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	60
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		

ASEO GENERAL	M2	62
DESMONTES		
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	10
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	64
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	64
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	5
PICADO DE MURO	M2	5

6.2.1.3.1. Registro fotográfico









6.2.1.4. *Vivienda 34 – José Ceballos – Solferino – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.

DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	7
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	9.00
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	3.0
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	35
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	10.2
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	54
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	48
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	75.4
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	47
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	24.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	32
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	71.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	3

6.2.1.4.1. Registro fotográfico






6.2.1.5. *Vivienda 37 – Luz Dary Quintero – Comuneros – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	21.60
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	27.4
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	5
CARPINTERÍA METÁLICA		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	60
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	42
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	51.0
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	51.0
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	14.6
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	51.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	3
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	6

6.2.1.5.1. Registro fotográfico









6.2.1.6. *Vivienda 38 – Yolanda Benavides – Sinaí – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	7
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	2.0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	9.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	5.0
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	5.3
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	6
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	23


ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	5.3
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	66
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	50.0
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	52.00
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	2.2
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	3
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	52.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML	7
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, CON ESTUFA,TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS.	UND	1
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1

6.2.1.6.1. Registro fotográfico







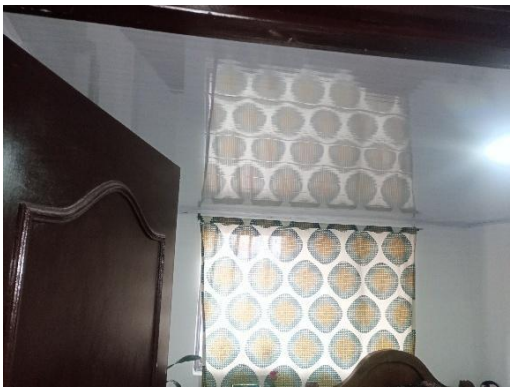

6.2.1.7. *Vivienda 39 – Consuelo Campuzano – Sinaí – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	12
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	8.0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	15.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	8.0
REVOQUES-RESANES		

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4.3
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	12
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	12
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	0
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	3
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	60
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	28
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	36.00
DESMONTES		
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	33
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	38.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	12
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	2
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	1.5
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	38.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML	7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD, ANCHO 0,60M, CON ESTUFA; TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2 PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1

6.2.1.7.1. Registro fotográfico









6.2.1.8. *Vivienda 40 – Luz Marina Ávila – Villa Hermosa – Recibido Alcaldía*

PROINCO INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO DE OBRA No 2505120663**
	PROINCO INGENIERIA S.A.S. **RPL JUAN JOSE LLANOS ESTRADA** **NIT: 900.375.623-2**

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	10.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	11.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	6
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	18
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	6.5
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	50
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	24
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	63
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	65
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	16
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	46
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	65
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	4

6.2.1.8.1. Registro fotográfico









6.2.1.9. *Vivienda 41 – Luis Guillermo Mancero – La Asunción – Recibido Alcaldía*


ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	9
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	27.00
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	18
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO	ML	4.5

E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)		
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	3.6
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA BLANCA O BEIGE (INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA)	ML	5.5
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 Impermeabilizado e= 0.04 mts	M2	3.6
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	27
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	84
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	44.00
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	44.00
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	3.36
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	14
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	44.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML	5
ITEMS NO PREVISTOS		
PICADO DE MURO	M2	27.00
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	8

6.2.1.9.1. Registro fotográfico





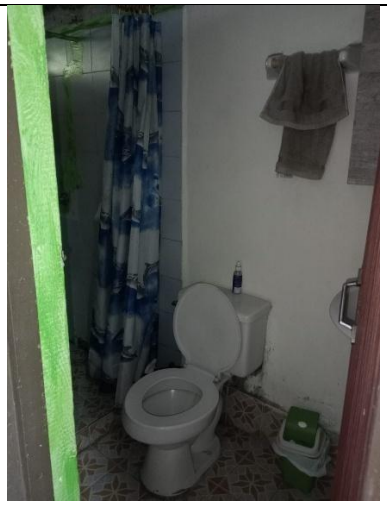




6.2.1.10. *Vivienda 46 – Raúl Quintero Giraldo – La Isla – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	15,00
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	120
PINTURA		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	115,23
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	60,0
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	49,75
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML	7
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA DE ZINC	M2	49,75
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	49,75

6.2.1.10.1. Registro fotográfico

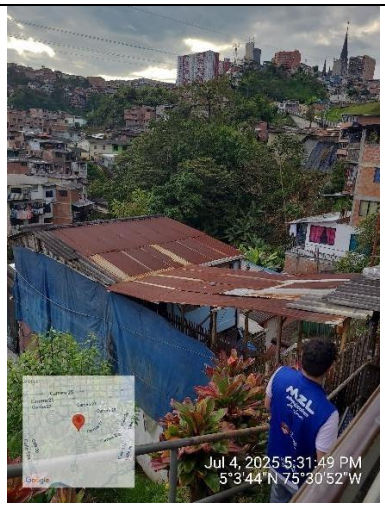







6.2.1.11. *Vivienda 49 – Angela Marcela Pérez – La Linda – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	2.58
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA	UND	5
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	24.83
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	10.72
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	32.62
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	12.95
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	22.76
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	37.7
DESMONTES		
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	0

DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	2.05
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	3.2
DEMOLICION MURO EN BAHAREQUE	M2	1.57
DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE ALTURAS MENORES A 3 METROS (NO INCLUYE RETIRO)	M2	10.72
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, SIN ESTUFA,TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS.	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA DUCHA ACRILICO (INCLUYE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PASADOR Y TOALLERO) A TODO COSTO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE	M2	3

6.2.1.11.1. Registro fotográfico





6.2.1.12. *Vivienda 51 – José Isidro Martínez – La Linda – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	2.05
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	11.13
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	ML	4.00
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	23.4
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	3.7
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	22
PISOS - ACABADOS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 Impermeabilizado e= 0.04 mts	M2	1.89
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	11.13
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA Sencilla GALAXIA Ref. 50430001 Tipo Grival o Similar. (incluye registro o llave de poma, regadera y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion).	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	66
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	55.00
DESMONTES		
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	55.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	23.4
DEMOLICIONES		
DEMOLICION CIELO RASO TABLILLA	M2	32.55
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	55.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML	4
ITEMS NO PREVISTOS		
PICADO DE MURO	M2	11.13

6.2.1.12.1. Registro fotográfico









6.2.1.13. *Vivienda 52 – Beatriz Orrego – El Paraíso – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
CIMIENTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	0.6
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	1.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	3
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y	M2	3.00

TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	18.00
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	16.50
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	5.3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	5.5
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	24
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	66
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	8.5
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA PUERTAS, REJAS Y VENTANAS.	M2	13.0
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	61.00
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	61.00
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2

DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	5
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	55.00
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	6

6.2.1.13.1. Registro fotográfico









6.2.1.14. *Vivienda 53 – Blanca Inés Gaviria – El Paraíso – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
CIMIENTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	0.6
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	3

MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	2.00
08B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	15.0
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4.00
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	16
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	5.5
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	47
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	9
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	72
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	4.00
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	60.00
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	59.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	25.8
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	59.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	4

6.2.1.14.1. Registro fotográfico






6.2.1.15. *Vivienda 54 – Eidi Piedad Puerta – Guamal – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	8
REVOQUES-RESANES		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	45
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	21
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	16
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	21
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	30
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA PUERTAS, REJAS Y VENTANAS.	M2	20.7
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	67.00
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	67.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	12
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	2.2
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	67.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	7
MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	1

6.2.1.15.1. Registro fotográfico






6.2.1.16. *Vivienda 55 – Mariela Monroy Uribe – Barrio Colombia – A la espera de tomar medidas finales con interventoría*


ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	3
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIGUETA DE MADERA CHANUL 12X4 CM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA (COLOR SEGÚN DISEÑO). INSTALACIÓN A UNA ALTURA MENOR A 3 MTS	ML	78
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y	M2	12.00


TERMINADO (UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.2
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 X M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	8
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 MTS	M2	9.50
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 X M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	1.2
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERIA METALICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 PARA PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	8.6
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	34
DESMONTES		
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DEMOLICIONES		
DEMOLICION CIELO RASO TABLILLA	M2	40
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	3.2
DEMOLICION DE MESONES A=0.60 M.	ML	2
PICADO DE PLACA DE PISO	M2	4.10

DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	1.08
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD, ANCHO 0,60M, CON ESTUFA; TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2 PUERTAS Y 3 CAJONES, MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD	UND	1
ITEMS NO PREVISTOS		
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30	ML	4
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1

6.2.1.16.1. Registro fotográfico



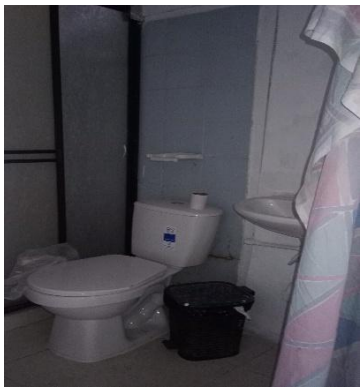

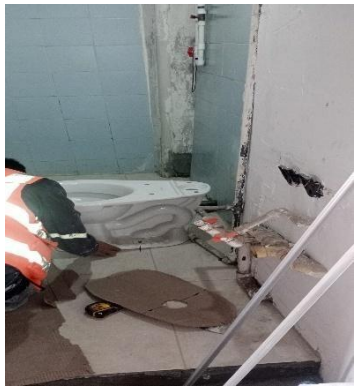




6.2.1.17. *Vivienda 56 – Jairo Franco – El Carmen – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	8
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	8
08B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	2
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	6
CIELO RASO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	25
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	76
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	31
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	31
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	12
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE ANCHO 0.50 - 1.00 M (INCLUYE ACCESORIOS,PASAMANOS, PINTURA ANTICORROSIVA,VACIADO DE GRAVILLA LAVADA PARA LOS PASOS, PERNOS, PLATINAS DE APOYO,	ML	3.15

PERFILERIA Y DEMÁS INSUMOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO)		

6.2.1.17.1. Registro fotográfico
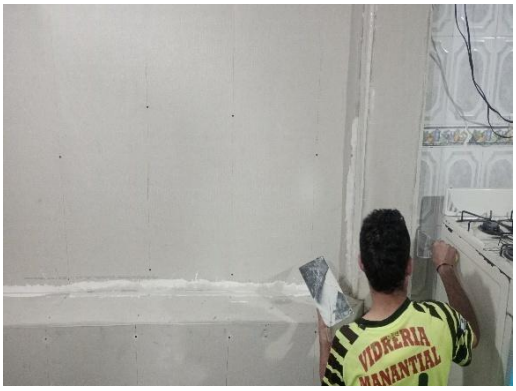
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

6.2.1.18. *Vivienda 57 – Diana Marcela Correa Perdomo – Marmato – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	8
MAMPOSTERIA		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1.00
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA	UND	1.0
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	5.00
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	8
CIELO RASO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	12
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	1.2
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	60
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	3.00
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	71.00
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	72.00

DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	10
DEMOLICIONES		
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	3
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	2.058
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	72.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD, ANCHO 0,60M, CON ESTUFA; TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2 PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD	UND	1
ITEMS NO PREVISTOS		
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30	ML	2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1

6.2.1.18.1. Registro fotográfico









6.2.1.19. *Vivienda 58 – José Orlando Ceballos – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	2
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	5.60
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	15.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA	UND	3.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	5.0
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	17.1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	6.5
CIELO RASO		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	34.45
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	48
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	34.45
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	67.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	15
DEMOLICIONES		
DEMOLICION CIELO RASO TABLILLA	M2	45
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	52.00
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	16

6.2.1.19.1. Registro fotográfico









6.2.1.20. *Vivienda 59 – Luz Mila Salazar Ceballos – Malhabar – A la espera de tomar medidas finales con la interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	8
08B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	4.00
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	4.0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	2.0
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.8
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	6

CIELO RASO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	36
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	1.8
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	74
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	29.00
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	31.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	10
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	33
DEMOLICIONES		
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	2
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	1.6
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	31.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, SIN ESTUFA,TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS.	UND	1
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1

6.2.1.20.1. Registro fotográfico









6.2.1.21. *Vivienda 61 – María Ruth Jaramillo Jaramillo – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	5
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	13.00
CUBIERTAS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	13
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	60
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	14.00
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	48.00
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	54.00
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	10.8
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	10
DEMOLICIONES		
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	2
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	54.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML	7.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD, ANCHO 0,60M, CON ESTUFA; TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2 PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON	UND	1

LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD		
ITEMS NO PREVISTOS		
PICADO DE MURO	M2	14.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1

6.2.1.21.1. Registro fotográfico









6.2.1.22. *Vivienda 62 – Rosa Oliva Castañeda – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA - LISTA DE PRECIOS UNITARIOS	**Un**	**Cant.**
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
08B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	24.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	6.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	6.00
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	7.00
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	8
CIELO RASO		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	59
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	1
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO O CEMENTO CON BATEA Y TANQUE (Incluye accesorios de instalación)	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	2.32
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	59.00
DESMONTES		
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	26.00

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	4.37
DEMOLICIONES		
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	2.2
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	3
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA DE ZINC	M2	4.37
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD, ANCHO 0,60M, CON ESTUFA; TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2 PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1

6.2.1.22.1. Registro fotográfico









6.2.1.23. *Vivienda 63 – Carlos Arturo Gallego – San Jorge – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	18.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	6.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	6.0
CUBIERTAS		
RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	88.0
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	41
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 Impermeabilizado e= 0.04 mts	M2	3
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	14

APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERÌA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	48
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	83.00
DESMONTES		
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	3
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	14
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	37

6.2.1.23.1. Registro fotográfico









6.2.1.24. *Vivienda 64 – Melida Parra – Bosques del Norte – Recibido Interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
CIMIENTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	0.6
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4.00
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	22
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	5.5
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 Impermeabilizado e= 0.04 mts	M2	1.82
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	2.4
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	54
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	24
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	13.00
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	50.00
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	55.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	19
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	55.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	4.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, SIN ESTUFA,TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS.	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO	UND	1

TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		

6.2.1.24.1. Registro fotográfico






6.2.1.25. *Vivienda 65 – Gladys Ceballos Vásquez – Bosques del Norte – A la espera de tomar medidas finales con interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	5
CUBIERTAS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	30
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	5
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	6
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	42
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	42.50
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	54.00
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	26
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	5
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	54.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	4.00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA PUERTAS, REJAS Y VENTANAS.	M2	12
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE ANCHO 0.50 - 1.00 M (INCLUYE ACCESORIOS,PASAMANOS, PINTURA ANTICORROSIVA,VACIADO DE GRAVILLA LAVADA PARA LOS PASOS, PERNOS, PLATINAS DE APOYO, PERFILERIA Y DEMÁS INSUMOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO)	ML	3

6.2.1.25.1. Registro fotográfico






6.2.1.26. *Vivienda 73 – Hernán Sánchez Arias – Sinai – A la espera de tomar medidas finales con interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
CIMIENTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	0.4
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	3
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	12.00
CUBIERTAS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	20
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	6
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	18
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	72
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	67
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	6.5
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	12
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	67

6.2.1.26.1. Registro fotográfico







6.2.1.27. *Vivienda 74 – Gildardo Galvis Cardona – Bosques del Norte – A la espera de tomar medidas finales con interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	4.0
REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	36
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE	M2	46

ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO		
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	4.2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 Impermeabilizado e= 0.04 mts	M2	3.8
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	36
DESMONTES		
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	3.8
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	5.75
ITEMS NO PREVISTOS		
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30	ML	4
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE ANCHO 0.50 - 1.00 M (INCLUYE ACCESORIOS,PASAMANOS, PINTURA ANTICORROSIVA,VACIADO DE GRAVILLA LAVADA PARA LOS PASOS, PERNOS, PLATINAS DE APOYO, PERFILERIA Y DEMÁS INSUMOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO)	ML	3.3

6.2.1.27.1. Registro fotográfico



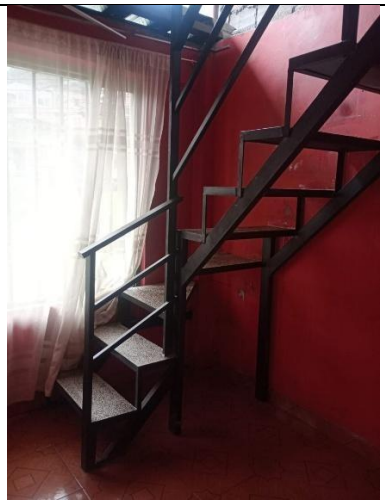





6.2.1.28. *Vivienda 76 – Oscar Marino Rivera – Bengala – A la espera de tomar medidas finales con interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	3
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	7.00
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	18.0

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	3.0
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	25.8
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	11
CIELORASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	28
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	36
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	72.9
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	24.4
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	61
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	2
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	12

6.2.1.28.1. Registro fotográfico






6.2.1.29. *Vivienda 80 – Luz Edid Castaño Botero – Bosques del Norte – A la espera de tomar medidas finales con interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
CIMIENTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	0.9
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	6.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	1.0
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	25.4
CIELORASOS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	31
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	30
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	66
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	56
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	20
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	56
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	18
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	1

6.2.1.29.1. Registro fotográfico









6.2.2. Viviendas en ejecución

Con corte al 02 de octubre, se registran dieciocho (18) viviendas en fase de ejecución, las cuales corresponden a las siguientes unidades habitacionales:

Vivienda No.	Propietario	Barrio
50	Maria Lucy Ocampo	Carmen
60	Maria Magdalena	Kennedy
66	Maria Edilia Murillo Gutierrez	Detalle Del Perfil
67	Maria Ludivia Bustamante Lopez	San Sebastian
68	Diana Maria Morales Quiceno	La Linda
69	Alba Nory Castaño Alzate	San Cayetano
70	Maria Cristina Buitrago Torres	La Linda
71	Maria Clarisa Giraldo Gaviria	Comuneros
72	Gersain García Salazar	Samaria
75	Adriana Maria Hernandez Perez	Santa Ana
77	Rosa Nuñes De Garzon	Fatima
78	Segundo Juan De Dios Salinas Monroy	Bosques Del Norte
79	Aida Galvis Corrales	Campoamor
81	Maria Lucila Vargas Castañeda	La Linda
82	Luz Estela Aguirre Arcila	El Maizal
83	Bertha Ines Ruiz Montoya	El Carmen
84	Maria Luz Dary Gomez Serna	Santos
85	Paola Victoria Uribe Castaño	Santa Ana

6.2.3. Viviendas próximas a iniciar


Las viviendas programadas para iniciar su fase de ejecución en los próximos días son las siguientes:

Vivienda No.	Propietario	Barrio
86	Gloria Ines Molina Correa	Samaria
87	Diana Clemencia Moncada Vergara	Bosques Del Norte
88	Angela Maria Aristizabal Alzate	Solferino
89	Yonathan Smith Ceballos Rios	El Carmen
90	Luisa Valencia	Las Colinas
91	María Gladys Castaño Celis	San Sebastián
92	María Luz Noira Velásquez Largo	Bosques Del Norte
93	Giovanny Londoño Mazo	Cumbre/Betania
94	Clarisa Moreno	Villa Hermosa
96	Martha Emilia López Sanchez	Villa Hermosa

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

A la fecha de corte del 02 de octubre, no se han efectuado desembolsos por parte de la entidad contratante, sin embargo se esta tramitando el acta parcial 1, razón por la cual la información presupuestal que se presenta en este informe corresponde únicamente al presupuesto inicial establecido en el contrato.

- **Valor total del contrato:** $2.028.000.000,00
- **Valor pagado a la fecha:** $0,00
- **Porcentaje de ejecución presupuestal pagado:** 0%
- **Saldo por ejecutar:** $2.028.000.000,00
- **Anticipo recibido:** $0,00



PROINCO INGENIERIA S.A.S

RPL JUAN JOSE LLANOS ESTRADA

C.C. No. 1.080.936.200 de Timana – (H).

NIT 900.375.623-2
