PROINCO INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO DE OBRA No 2505120663**
	PROINCO INGENIERIA S.A.S. **RPL JUAN JOSE LLANOS ESTRADA** **NIT: 900.375.623-2**

INFORME MENSUAL No. 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2505120663

OBJETO: “MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 017 SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”

RESIDENTE DE OBRA
MANIZALES
2025

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
2.1. OBJETIVO GENERAL 3
2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 3
3. INFORMACION DEL CONTRATO 4
4. LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
6.1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA 6
6.2. DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
6.2.1. Viviendas terminadas 7
6.2.2. Viviendas en ejecución 26
6.2.3. Viviendas próximas a iniciar 28
7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 28

1. INTRODUCCION

El derecho a una vivienda digna es uno de los pilares fundamentales del bienestar y desarrollo de las comunidades. En este sentido, el Municipio de Manizales, comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, ha impulsado el desarrollo de acciones concretas que garanticen condiciones habitacionales adecuadas, especialmente para las familias en situación de vulnerabilidad.

En el marco de esta visión, se suscribió el **Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 017** con el **Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)**, cuyo objeto es la **ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana del municipio de Manizales**, mediante la modalidad de precios unitarios fijos y a monto agotable. Este proyecto se alinea con las políticas públicas nacionales y locales en materia de hábitat y vivienda, y responde a la necesidad de intervenir viviendas que, si bien están construidas, presentan condiciones inadecuadas en su estructura, instalaciones básicas o habitabilidad general.

El mejoramiento de viviendas permite reducir los niveles de déficit cualitativo en la ciudad, brindando soluciones efectivas y sostenibles para garantizar espacios seguros, saludables y funcionales. Las acciones ejecutadas dentro del proyecto tienen un impacto directo en la salud, la seguridad, la convivencia y la dignidad de las familias beneficiadas.

La presente documentación tiene como fin describir los objetivos, alcance, actividades ejecutadas, localización y descripción técnica del proyecto, dando cuenta de los avances y resultados obtenidos durante su implementación.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad, seguridad y funcionalidad de las viviendas localizadas en la zona urbana del municipio de Manizales, mediante la ejecución de obras de mejoramiento integral, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 017 suscrito con FONVIVIENDA, bajo la modalidad de precios unitarios fijos y a monto agotable.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO


- Ejecutar obras de mejoramiento en componentes clave de las viviendas como baños, cocinas, cubiertas, pisos e instalaciones eléctricas e hidráulicas.
- Garantizar soluciones habitacionales seguras y funcionales que mejoren la calidad de vida de las familias beneficiarias.

3. INFORMACION DEL CONTRATO

- **Objeto del Contrato:** Mejoramientos de viviendas en la zona urbana del municipio de Manizales, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 017 suscrito con FONVIVIENDA.
- **Modalidad de Contratación:** Precios unitarios fijos a monto agotable.
- **Convenio Marco:** Convenio Interadministrativo No. 017.
- **Entidad Contratante:** Municipio de Manizales.
- **Entidad Cooperante:** FONVIVIENDA.
- **Ubicación del Proyecto:** Zona urbana de Manizales.
- **Fecha de Inicio:** 03 de Junio del 2025
- **Fecha de Finalización:** 03 de Diciembre del 2025.
- **Duración del Proyecto:** 6 meses.

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto de **mejoramiento de viviendas** se ejecuta en la **zona urbana del municipio de Manizales**, departamento de Caldas. Las intervenciones se distribuyen estratégicamente en diversas comunas, barrios y sectores urbanos que han sido previamente priorizados por la Administración Municipal, con base en estudios socioeconómicos y diagnósticos técnicos.

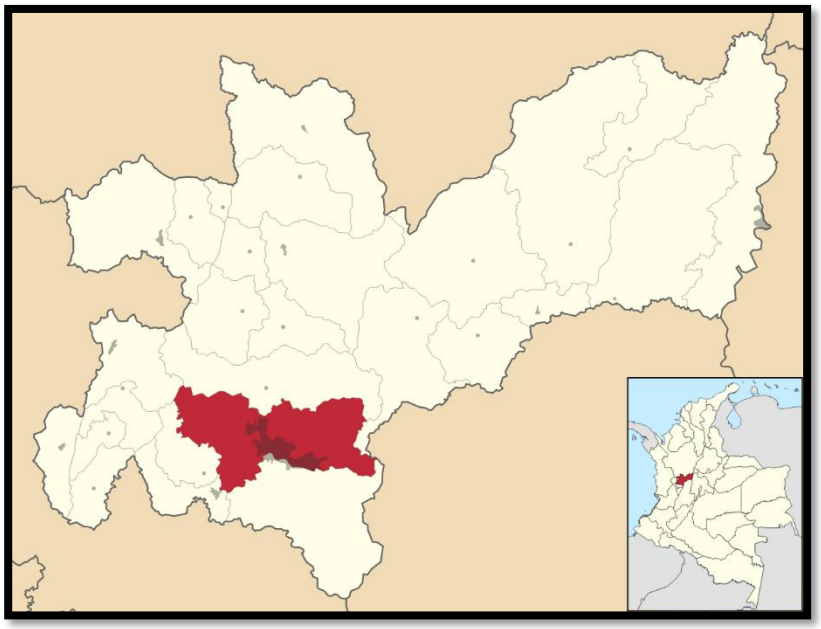

Las zonas seleccionadas corresponden principalmente a sectores con altos índices de vulnerabilidad, donde se identificaron viviendas con condiciones inadecuadas de habitabilidad, estructuras en deterioro, instalaciones deficientes o ausencia de elementos básicos como baños, cocinas funcionales o cubiertas en buen estado.

Entre los barrios intervenidos se encuentran, por ejemplo: San Sebastián, Bajo Persia, Persia, Solferino, La Enea, Fátima, entre otros. Estas áreas fueron seleccionadas en coordinación con las entidades municipales encargadas de la política de vivienda.

La intervención se focaliza en predios legalmente habitados, con uso residencial y en los que las condiciones técnicas permiten una mejora sin necesidad de demolición o reconstrucción total.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad realizar **intervenciones de mejoramiento en viviendas ubicadas en la zona urbana del municipio de Manizales**, dirigidas a hogares que presentan condiciones habitacionales deficientes. Estas intervenciones buscan atender el déficit cualitativo de vivienda, priorizando aspectos estructurales y funcionales esenciales para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.

Las obras que se ejecutan corresponden a **mejoramientos puntuales**, definidos a partir de un diagnóstico técnico y social realizado previamente en cada una de las viviendas seleccionadas. Este diagnóstico permite identificar las necesidades particulares de cada hogar y determinar el tipo de intervención más adecuada, respetando la estructura original de la vivienda y asegurando la estabilidad de la construcción.

Las actividades que incluye el proyecto son, entre otras:

- **Mejoramiento de cocinas:** reparación o instalación de mesones, lavaplatos, griferías, enchapes, conexiones hidráulicas y eléctricas, y mobiliario básico.
- **Adecuación de baños:** cambio o instalación de aparatos sanitarios, lavamanos, duchas, enchapes, pisos y adecuación de redes internas.
- **Reparación de cubiertas:** cambio de tejas, refuerzo de estructura, aplicación de impermeabilizantes y mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias.
- **Instalación y nivelación de pisos:** colocación de pisos en cerámica u otro material resistente, nivelación de superficies y acabados.

- **Reparación de muros y fachadas:** aplicación de pañete, estuco, pintura y sellado de fisuras.
- **Adecuaciones eléctricas e hidráulicas:** renovación de cableado, cambio de luminarias, tomas y llaves, así como la adecuación de tuberías de agua potable y saneamiento básico.

Cada intervención se ejecuta bajo los lineamientos técnicos establecidos por el Municipio de Manizales y FONVIVIENDA, con énfasis en seguridad, funcionalidad, durabilidad y eficiencia en el uso de los recursos. Asimismo, el proyecto incorpora criterios de equidad social, priorizando hogares con jefatura femenina, personas en condición de discapacidad, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

El alcance de las obras se ajusta de acuerdo con los recursos disponibles bajo la modalidad de **precios unitarios fijos y monto agotable**, lo cual permite administrar el presupuesto de forma eficiente y garantizar la transparencia durante todo el proceso de ejecución.

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

6.1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

De acuerdo con el cronograma oficial y el plan de trabajo presentado el 28 de julio de 2025, para la fecha de corte del 02 de diciembre se tenía proyectada la entrega de ciento veintiún (130) viviendas mejoradas a la Alcaldía de Manizales. No obstante, a dicha fecha se reporta el siguiente estado de avance:

- Sesenta y dos (62) viviendas han sido entregadas a satisfacción a la Alcaldía de Manizales.
- catorce (14) viviendas han sido recibidas por la interventoría y están en trámite de entrega oficial.
- cuatro (4) viviendas se encuentran completamente terminadas y están pendientes de revisión y aceptación por parte de la interventoría.

Adicionalmente, se tienen diecisiete (35) viviendas en ejecución activa y otras diecinueve (12) programadas para iniciar en los próximos días, conforme a la planeación operativa.

En consecuencia, del total de las 130 viviendas que debían haberse entregado conforme al cronograma establecido, se cuenta con ochenta (80) entregadas, en

trámite de entrega o finalizadas. Las cincuenta (50) viviendas restantes presentan las siguientes particularidades:

- Treinta y cinco (35) viviendas se encuentran en etapa final de ejecución y se estima su entrega en los próximos días.
- Doce (12) viviendas se encuentran en tramites finales para iniciar actividades.
- Tres (3) viviendas no han sido entregadas por el Ministerio.

A pesar de estos contratiempos puntuales, durante el mes de noviembre se registró un avance significativo en las actividades de mejoramiento, evidenciado en el cumplimiento técnico, la optimización de recursos y la gestión efectiva del cronograma. Las obras ejecutadas en este periodo permitieron mantener el ritmo de trabajo proyectado, asegurar la calidad constructiva y cumplir con los requerimientos establecidos por la Alcaldía de Manizales.

6.2. DETALLE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **Avance de actividades programadas:** Tal como se indicó, para la fecha de corte del 02 de diciembre de 2025, se ha intervenido un total de 80 viviendas, con 35 viviendas adicionales en ejecución. En el apartado siguiente se detallan las actividades desarrolladas en cada vivienda, incluyendo las cantidades ejecutadas y el respectivo soporte fotográfico.

6.2.1. Viviendas terminadas

A continuación, se presenta el consolidado de actividades ejecutadas, cantidades asociadas y registro fotográfico correspondiente a las ocho (8) viviendas que han sido recibidas a satisfacción por la interventoría y/o la Alcaldía. Adicionalmente, se incluyen las dos (2) viviendas que se encuentran terminadas y a la espera de revisión técnica final. Cabe señalar que estas últimas están sujetas a posibles ajustes, ya que se encuentran pendientes de las respectivas tomas de medidas finales, las cuales se realizarán en conjunto con la interventoría.

6.2.1.1. *Vivienda 50 – María Lucy Ocampo – El Carmen – Recibido interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
CIMIENTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	1.2
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	12.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	7.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	4.0
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	7
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISOS EN TABLILLA CHANUL Y VIGUETA DE CHANUL	M2	30
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	66
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	78
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA		
ASEO GENERAL	M2	59
DEMOLICIONES		
DEMOLICION CIELO RASO TABLILLA	M2	30
DEMOLICIÓN DE ENTREPISO EN MADERA O GUADUA Y ESTERILLA (INCLUYE RETIRO)	M2	30

6.2.1.1.1. Registro fotográfico









6.2.1.2. *Vivienda 66 - Maria Edilia Murillo Gutierrez – PIO XII – Recibido interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	7
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	3.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	1.0

REVOQUES Y RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	6
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	2.5
CIELORASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	5
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	6
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia)	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	66
PINTURAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	17
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	19
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	18
DEMOLICIONES		
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	1.8
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	1.8
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	19
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD, ANCHO 0,60M, CON ESTUFA; TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2	UND	1


PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE ANCHO 0.50 - 1.00 M (INCLUYE ACCESORIOS,PASAMANOS, PINTURA ANTICORROSIVA,VACIADO DE GRAVILLA LAVADA PARA LOS PASOS, PERNOS, PLATINAS DE APOYO, PERFILERIA Y DEMÁS INSUMOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO)	ML	3.2

6.2.1.2.1. Registro fotográfico







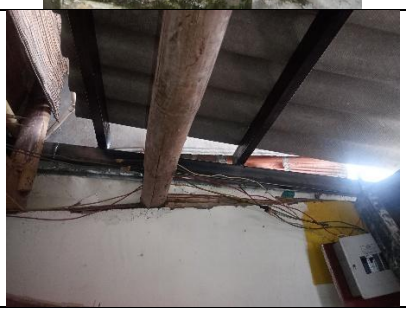

6.2.1.3. *Vivienda 68 – Diana Maria Morales Quiceno – La Linda – Recibido interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	24.0

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	4.0
REVOQUES Y RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	21
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	24
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	12
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	7
CIELORASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	35
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	30
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	55.1
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	12.6
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	55.1
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	15

6.2.1.3.1. Registro fotográfico









6.2.1.4. *Vivienda 69 - Alba Nory Castaño Alzate – San Cayetano – Recibido interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	2
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	24
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	6
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	5

ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	16
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 PARA PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	72
PINTURAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	6
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	41
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	26
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	41
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	6
ITEMS NO PREVISTOS		
DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	14.4
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE ANCHO 0.50 - 1.00 M (INCLUYE ACCESORIOS,PASAMANOS, PINTURA ANTICORROSIVA,VACIADO DE GRAVILLA LAVADA PARA LOS PASOS, PERNOS, PLATINAS DE APOYO, PERFILERIA Y DEMÁS INSUMOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO)	ML	2

6.2.1.4.1. Registro fotográfico









6.2.1.5. *Vivienda 70 – María Cristina Buitrago Torres – La Linda – Recibido Alcaldía*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	12.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	2.0
REVOQUES Y RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	8.00
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	14
CUBIERTAS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	20
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	12
CIELORASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	27
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	16
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	60
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	51
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	27
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	22
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	51
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	3

6.2.1.5.1. Registro fotográfico









6.2.1.6. *Vivienda 71 – María Clarisa Giraldo Gaviria – Comuneros – Recibido interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	14
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	6.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	2.0
REVOQUES Y RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	12
CUBIERTAS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	17
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	9.8
CIELORASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	17.5
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 Impermeabilizado e= 0.04 mts	M2	5.4
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	6
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	60
PINTURAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	12
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	53
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	10.5
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	16
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	53
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
PICADO DE PLACA PISO	M2	5.4
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	9

6.2.1.6.1. Registro fotográfico









6.2.1.7. *Vivienda 77 – Rosa Nuñes De Garzon – Fatima – A la espera de tomar medidas finales con interventoria*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	15
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	16
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	16
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	8
CIELORASOS		

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	7
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	42
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	97
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	21.75
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	15
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	97
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	4

6.2.1.7.1. Registro fotográfico









6.2.1.8. *Vivienda 80 – Luz Edid Castaño Botero – Bosques del Norte – Recibido Alcaldia*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
CIMIENTOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	0.9
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	6.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	1.0
CUBIERTAS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	25.4
CIELORASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	31
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	30
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	66
DESMONTES		
DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	56
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	20
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	56
ITEMS NO PREVISTOS		
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2	18
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	1

6.2.1.8.1. Registro fotográfico









6.2.1.9. *Vivienda 81 – Maria Lucila Vargas Castañeda – La Linda – Recibido interventoría*

ACTIVIDAD DE OBRA	Un	Cant.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS	UND	2.0
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	4.00

REVOQUES-RESANES		
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	5
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	75
PISOS - ACABADOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:3 e= 0.04 mts	M2	13
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO COLOR BLANCO O BEIGE HASTA $40.000 x M2 (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	8
ENCHAPES Y ACCESORIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED COLOR BEIGE O BLANCO HASTA $40.000 x M2. SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	6
APARATOS SANITARIOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.)	UND	1
CARPINTERIA METALICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	24
PINTURA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	16
DESMONTES		
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANTICORROSIVO PARA PUERTAS, REJAS Y VENTANAS.	M2	17.5

6.2.1.9.1. Registro fotográfico









6.2.1.10. *Vivienda 86 – Gloria Ines Molina Correa – Samara – A la espera de tomar medidas finales con interventoria*

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	12.0
DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	4.0
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	4.00
MAMPOSTERIA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	6
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	2.00
CUBIERTAS		
RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	44
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	13
CIELO RASOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	37
CARPINTERÍA METÁLICA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL.14 10cm*10cm (100 MM X 100 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	30
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML	28
DESMONTES		
DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	13
DEMOLICIONES		
DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	1.3
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	20
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio	UND	3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD, ANCHO 0,60M, CON ESTUFA; TIPO SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2 PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD	UND	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRIFERIA Y SIFON PARA LAVAPLATOS SENCILLO TIPO GRIVAL O SIMILAR (INCLUYE ACOPLES, LLAVE	UND	1

DE PASO, REJILLA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		

6.2.1.10.1. Registro fotográfico









6.1.1. Viviendas en ejecución

Con corte al 02 de diciembre, se registran dieciséis (35) viviendas en fase de ejecución, las cuales corresponden a las siguientes unidades habitacionales:

Vivienda No.	Propietario	Barrio
67	María Ludivia Bustamante López	San Sebastián
79	Aida Galvis Corrales	Campoamor
82	Luz Estela Aguirre Arcila	El Maizal
83	Bertha Inés Ruiz Montoya	El Carmen
84	María Luz Dary Gómez Serna	Santos
85	Paola Victoria Uribe Castaño	Santa Ana
87	Diana Clemencia Moncada Vergara	Bosques Del Norte
88	Angela María Aristizábal Alzate	Solferino
89	Yonathan Smith Ceballos Rios	El Carmen
90	Luisa Valencia	Las Colinas
91	Maria Gladys Castaño Celis	San Sebastian
92	Maria Luz Noira Velasquez Largo	Bosques Del Norte
93	Giovanny Londoño Mazo	Cumbre/Betania
94	Clarisa Moreno	Villahermosa
96	Martha Emilia Lopez Sanchez	Comuneros
97	Soledad Sanchez Marin	Comuneros
98	Maria Luz Angel Restrepo Franco	Sinai
99	Paula Andrea Gomez Ruiz	El paraiso
100	Gloria Arias De Naranjo	El paraiso
101	Miriam Del Carmen Aricapa De Jimenez	Bajo persia
102	Maria Doneiva Gallego Buitrago	Bajo persia
103	Jhon Jairo Orozco Cifuentes	20 de julio
104	Gladys Muñoz Bonilla	Solferino
105	Luz Mariela Sanchez	Solferino
106	Maria Elsy Ramirez Ceballos	Solferino
107	Evangelina Quintero Jaramillo	La isla
108	Maria Olga Bañol	La isla
109	Luis Eduardo Hincapie Orozco	Bajo Cervantes
110	Misael Zabala	Bajo Cervantes
111	Gerardo Sanchez Orozco	Bajo Cervantes
113	Berenice Tascon Olaya	San sebastian
115	Maria Corrales Garcia	Comuneros
116	Mariela Zapata Villa	Sinai
117	Isaura Martinez Cardona	Villahermosa
118	Maria Lucila Alvaran Sanchez	Villahermosa

6.1.2. Viviendas próximas a iniciar

Las viviendas programadas para iniciar su fase de ejecución en los próximos días son las siguientes:

Vivienda No.	Propietario	Barrio
112	Ana Isabel Alzate Alzate	Bosques del norte
114	Fabiola Pineda Giraldo	Comuneros
119	Ofelia Cardona Pinilla	Colombia
120	Andrea Munoz Duque	Guamal
121	Hernando Antonio Marulanda	Sultana
122	Mario Franco Tabares	La cumbre
123	Jairo Castillo Taborda	El carmen
124	Alba Marina Ceballos De Ceballos	El paraiso
125	Jose Holman Lopez Cortes	San sebastian
126	Elsa Yamile Zapata Ocampo	Bosques del norte
127	Guillermo Antonio Rios Londoño	Solferino
128	Claudia Viviana Cardona Lopez	Solferino

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

A la fecha de corte del 02 de noviembre, no se han efectuado desembolsos por parte de la entidad contratante, razón por la cual la información presupuestal que se presenta en este informe corresponde únicamente al presupuesto inicial establecido en el contrato.

- **Valor total del contrato:** $2.028.000.000,00
- **Valor pagado a la fecha:** $0,00
- **Porcentaje de ejecución presupuestal pagado:** 0%
- **Saldo por ejecutar:** $2.028.000.000,00
- **Anticipo recibido:** $0,00



PROINCO INGENIERIA S.A.S

RPL JUAN JOSE LLANOS ESTRADA

C.C. No. 1.080.936.200 de Timana – (H).

NIT 900.375.623-2
