1382

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO	MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT 891500978-6	MEMORIAS DE CALCULO

									ELABORO		Claudia Stella Solano		
FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE Nº	1	APROBO	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	C.C.		CONTRATO N°
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	902070211-9	
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	C.C.	76.027.866	234 DE 23 DE MAYO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	901252241-8	
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0	
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.584	


CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES EJECUTADAS


ELABORO	Claudia Stella Solano

ITEM	1.1	REGISTRO FOTOGRÁFICO

1

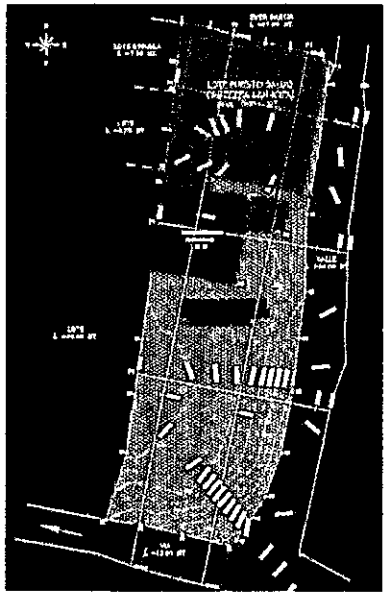

2

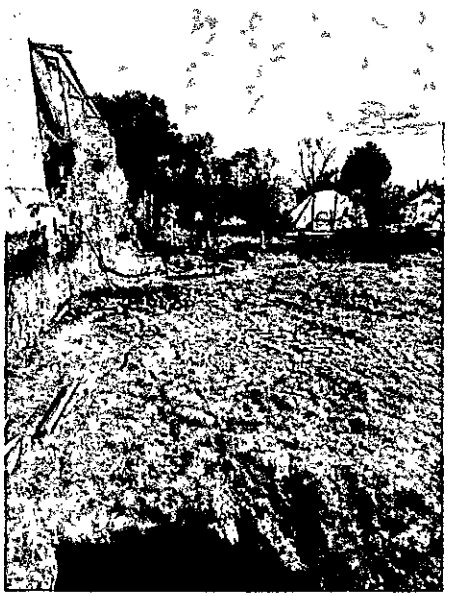

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.					UND	M2
UBICACIÓN	LARGO (m)	ALTO(m)	ANCHO(m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT	TOTAL(M2)
AREA PREDIO	16,5		16		1	264,00
TOTAL EJECUTADO (M2)						264,00

Claudia Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1383

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO	MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT 891500978-6	MEMORIAS DE CALCULO

										ELABORÓ		Claudia Stella Solano
FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE Nº	1		APROBÓ	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

				CONTRATO Nº
SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	CC.		
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT.	76.309.071	
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	C.C.	76.309.071	234 DE 23 DE MAYO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMQJ S.A.S.	NIT.	901252241-8	
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT.	891501104-0	
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC.	25.423.564	


CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES EJECUTADAS


ELABORÓ: Claudia Stella Solano


ITEM	1.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO

1

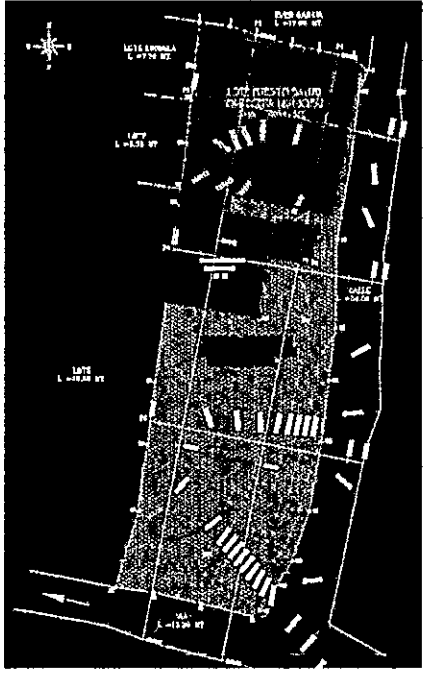

2

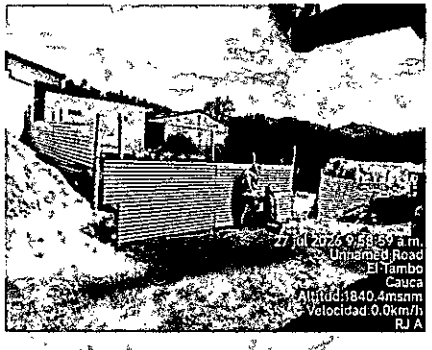

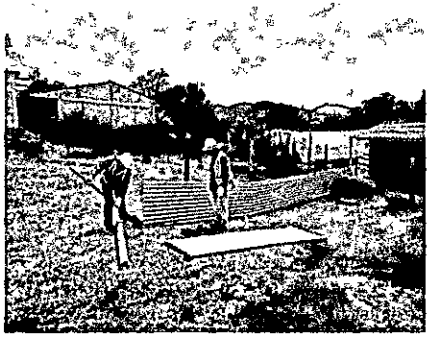

CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA					UND	M2
UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT	TOTAL (M2)
LATERAL DERECHO	9	1,6				14,40
FRONTAL 1	8	2,3				18,40
FRONTAL 2	6	1,6				9,60
CAMPAMENTO	6	1,6				9,60
TECHO PARA FIJAR	12	3				36,00
TOTAL EJECUTADO (UND)						88,00

Claudia Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1884

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO

MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT 891500978-6

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORÓ		Claudia Stella Solano
APROBÓ	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY

FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE Nº	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2026 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.


SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	C.C.	
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ÁNGELES 2026	NIT	76,309,071
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	C.C.	76,309,071
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	901252241-8
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.584

CONTRATO Nº: 234 DE 23 DE MAYO DE 2026

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	1.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO

1

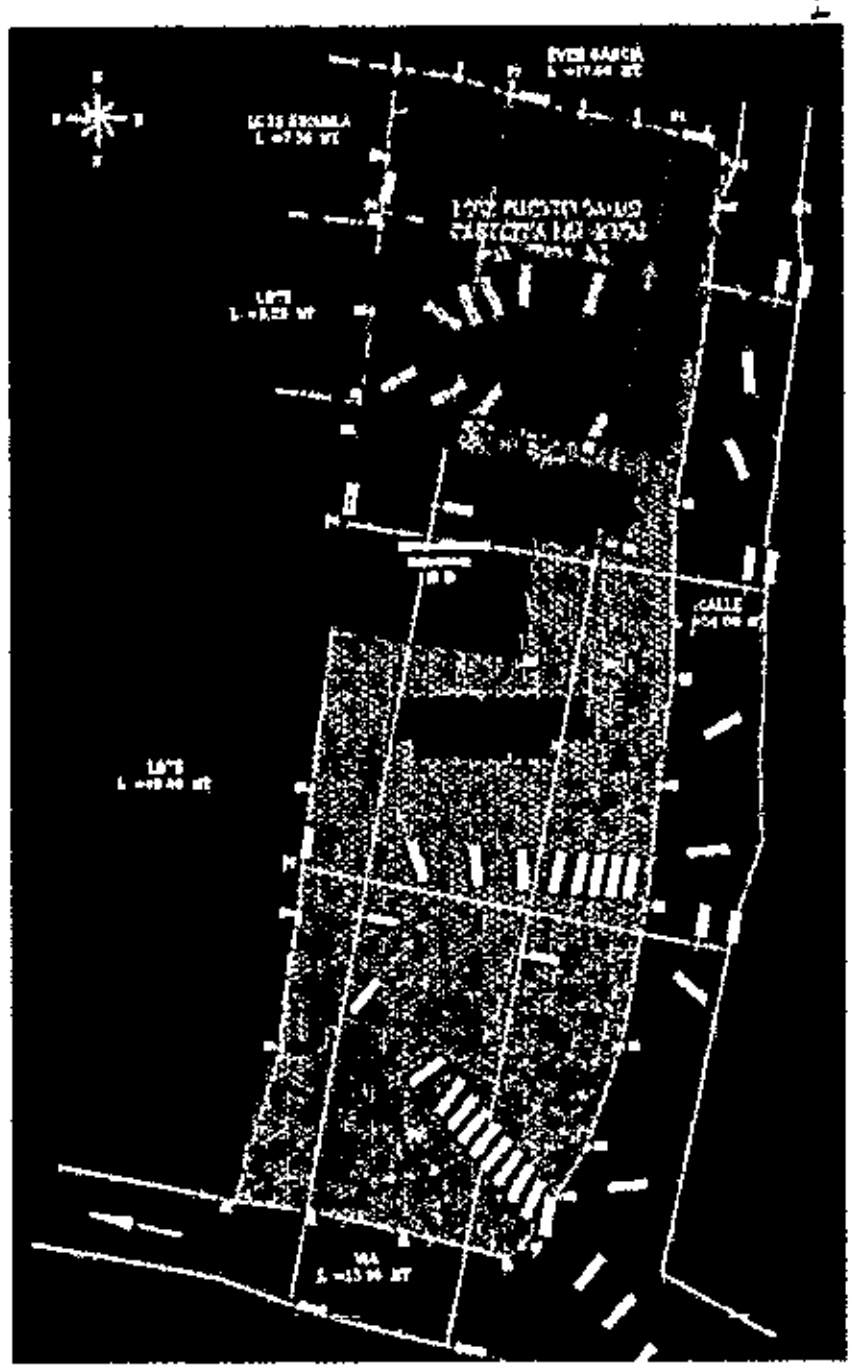

2





DESCAPOTE MAQUINA — UND: M2

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT	TOTAL (M2)
AREA PREDIO	16,5	16				264,00
TOTAL EJECUTADO (UND)						264,00

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1385

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO	MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT° 891500973-6	MEMORIAS DE CALCULO

									ELABORÓ			Claudia Stella Solano	
FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE N°	1	APROBÓ	RESIDENTE INTERVENTORIA		DIEGO MAMBUSCAY	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

				CONTRATO N°
SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	CC		
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	76.309.071	
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	CC	76.309.071	234 DE 23 DE MAYO DE 2026
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	901252241-8	
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0	
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.584	


CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

MEMORIAS DE CALCULO: CANTIDADES EJECUTADAS

ELABORÓ: [illegible]

ITEM	1.4	REGISTRO FOTOGRAFICO

3

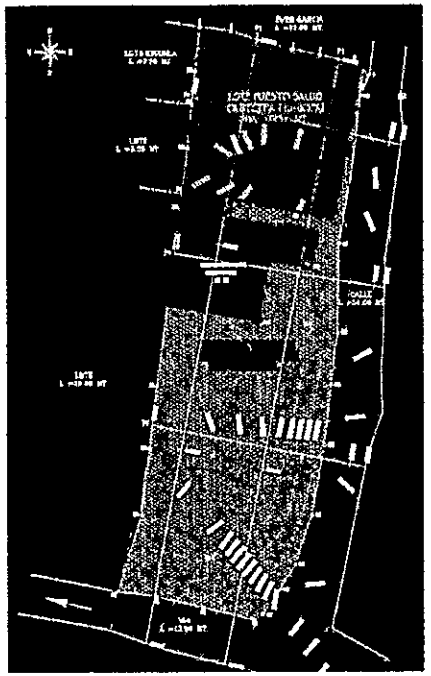


2





EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO					UND	M3
UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT	TOTAL (M3)
TRAMO 1	16	7,55	0,54			64,93
TRAMO 2	10,15	8,66	0,40			35,16

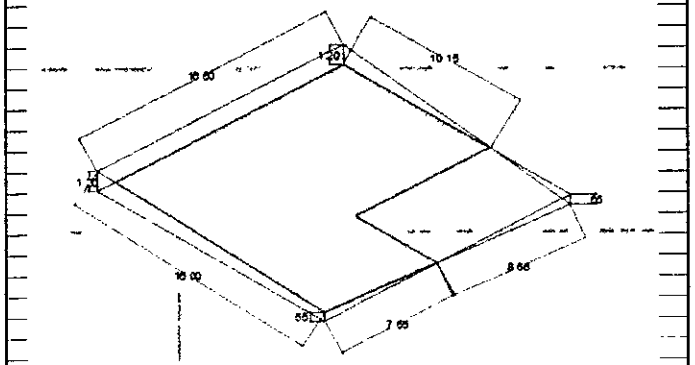

TOTAL EJECUTADO (UND) 100,09

Claudio Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO

MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT 891500978-6

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORÓ		Claudia Stella Solano
APROBÓ	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY

FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE N°	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	CC	
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	76.309.071
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	CC	76.309.071
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	901252241-8
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.584

CONTRATO N°: 234 DE 23 DE MAYO DE 2026

ITEM: 1.5 — REGISTRO FOTOGRÁFICO

1



2



3



RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO — UND: M3

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT	TOTAL (M3)
RELLENO A NIVEL SUPERIO DE ZAPATA PARTE ANTERIOR	8	9,8	0,39			34,40
RELLENO A NIVEL SUPERIO DE ZAPATA PARTE POSTERIOR	6	6,2	0,3			11,16
ENTRE EJE A,B-4,3	4	4,1	0,25			4,10
ENTRE EJE B,C-4,3	4	4,53	0,25			4,53
ENTRE EJE C,D-4,3	4	3,18	0,25			3,18
ENTRE EJE A,B-3,2	4	4,1	0,25			4,10
ENTRE EJE BC-3,2	4	4,53	0,25			4,53
ENTRE EJE C,D-3,2	4	3,18	0,25			3,18
ENTRE EJE A,B-2,1	3,8	4,1	0,25			3,90
ENTRE EJE B,C-2,1	3,8	4,53	0,25			4,30
ENTRE EJE C,D-2,1	3,8	3,18	0,25			3,02
POSTERIOR	16,5	1,7	0,25			7,01
LATERAL DERECHO	14,3	2,8	0,25			10,01
LATERAL IZQUIERDO	14,3	0,8	0,25			2,86
TOTAL EJECUTADO (UND)						100,28

Claudia Solano
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1887

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO	MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT 891500979-6	MEMORIAS DE CALCULO

ELABORÓ		Claudia Stella Solano
APROBÓ	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY

FECHA	DD	31	MM	07	AA	25	CORTE N°	1	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.		CONTRATO N°
SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	CC	234 DE 23 DE MAYO DE 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	76.309.071
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñez	CC	76.309.071
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	901252241-8
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.584

OBRA: REPOSICIÓN PUESTO DE SALUD LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DEL TAMBO-DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

MEMORIA DE CALCULO ANTES DESPUES


PLANO:

ITEM		FECHA DE LEVANTAMIENTO
	1.6	

1




2

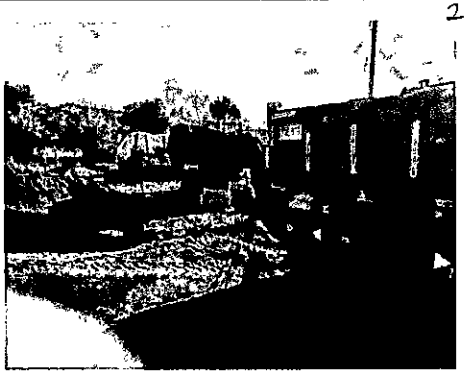


3



4

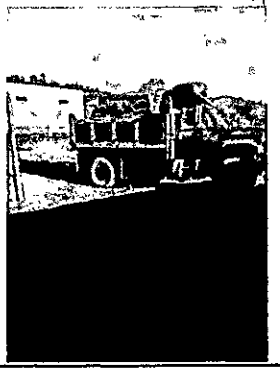

5

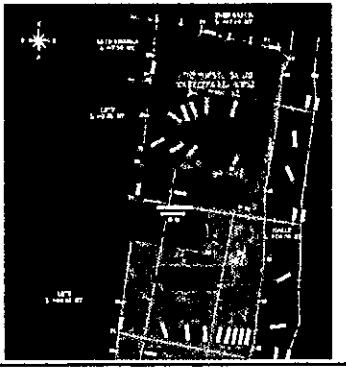

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADO D=5 KM					UND	
UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT	TOTAL (M3)
DESCAPOTE MAQUINA						52,80
EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO						100,09
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN						7,53
TOTAL EJECUTADO (UND)						160,42

Claudia Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1888

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO

MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT 891500974-0

MEMORIAS DE CALCULO

ELABORÓ		Claudia Stella Solano
APROBÓ	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY

FECHA	DD	31	MM	07	AA	25	CORTE Nº	1

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	C.C.	
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	76.309.071
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	C.C.	76.309.071
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	901252241-8
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.584

CONTRATO N°: 234 DE 23 DE MAYO DE 2026


CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA


MEMORIAS DE CÁLCULO (CANTIDADES EJECUTADAS)

ELABORÓ

ITEM: 2.1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

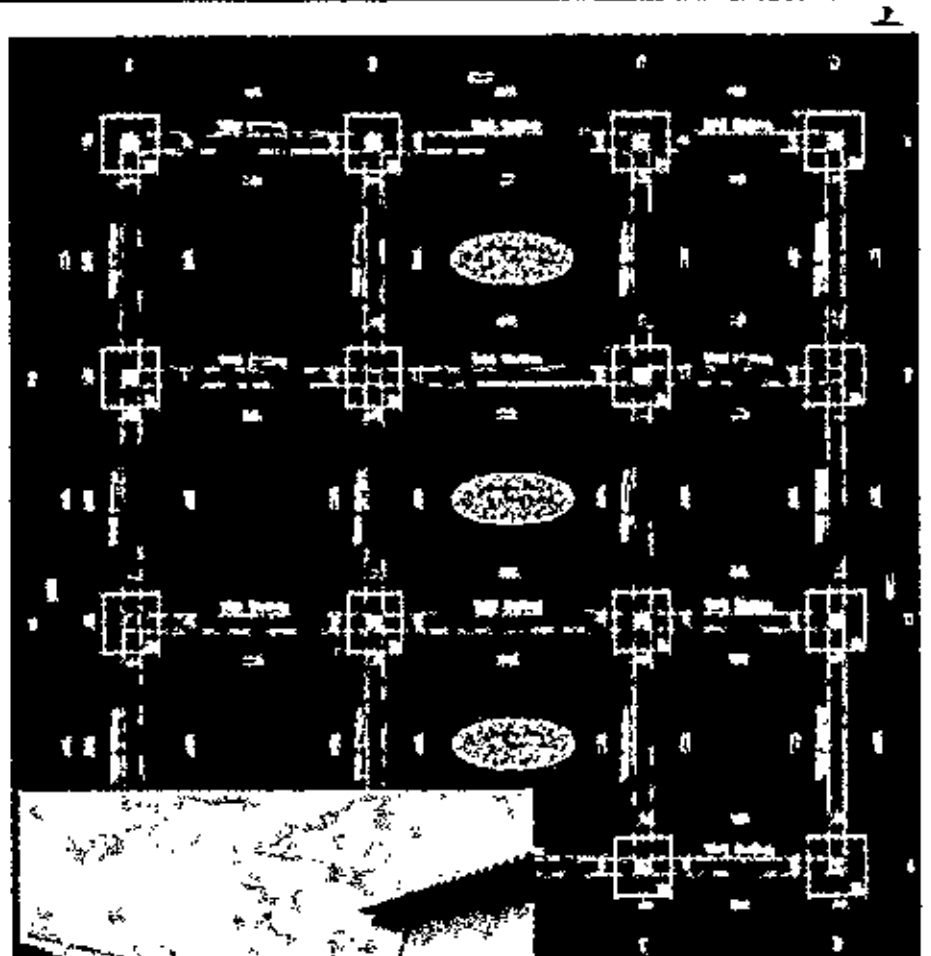

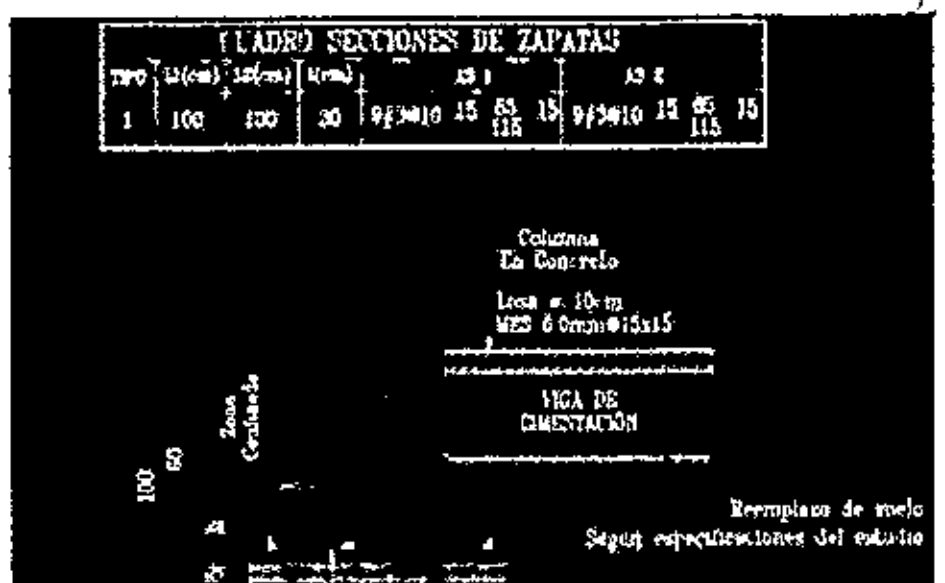





EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN — UND: M3

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT.	TOTAL (M3)
Zapatas	1	1	0,65		8	5,20
Viga A						
Entre 4 y 3	3,3	0,3	0,3			0,30
Entre 3 y 2	3,3	0,3	0,3			0,30
Entre 2 y 1	3,1	0,3	0,3			0,28
Viga B						
Entre 4 y 3	3,3	0,3	0,3			0,30
Entre 3 y 2	3,3	0,3	0,3			0,30
Entre 2 y 1	3,1	0,3	0,3			0,28
Viga c						
Entre 4 y 3	3,3	0,3	0,2			0,20
Entre 3 y 2	3,3	0,3	0,2			0,20
Entre 2 y 1	3,1	0,3	0,2			0,19
TOTAL EJECUTADO (UND)						7,53

Claudia Solano
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1889

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO	MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT 891500978-6	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE Nº	1	RESIDENTE OBRA		Claudia Stella Solano
									RESIDENTE INTERVENTORIA		DIEGO MAMBUSCAY


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.		
SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	C.C.	CONTRATO Nº
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	Nit	76.309.071
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	C.C.	76.309.071
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMOJ S.A.S.	Nit	901252241-8
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	Nit	891501104-0
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	C.C.	25.423.584

CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA


UNIDAD DE CALCULO CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATO Nº	234 DE 23 DE MAYO DE 2026		
PLACAS			

ITEM	2.2	REGISTRO FOTOGRAFICO

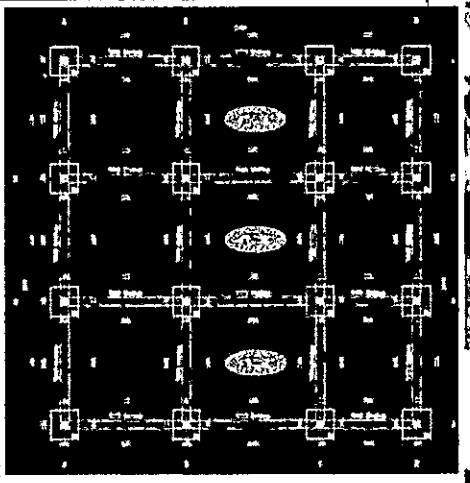

2

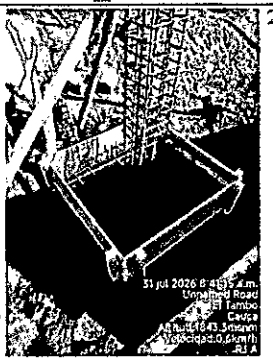

3



SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05 M 3000 PSI

UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	UND CANT	Nº TOTAL (UD)
Zapatas	1	1			16	16,00
Vigas de cimentación (Eje A - B - C - D)	9,4	0,3			4	11,28
Vigas de cimentación (Eje 1 - 2 - 3 - 4)	8,73	0,3			4	10,48
				TOTAL EJECUTADO (UND)		37,76

Claudi Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO	MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT 891500978-6	MEMORIAS DE CALCULO

ELABORO		Claudia Stella Solano
APROBO	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY

FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE Nº	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	C.C.	
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	76,309,071
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	C.C.	76,309,071
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	901252241-8
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.584

CONTRATO Nº
234 DE 23 DE MAYO DE 2026


CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES MUNICIPIO DE EL TAMBO DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL CAUCA

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES EJECUTADAS


ELABORO

ITEM	2.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO


1

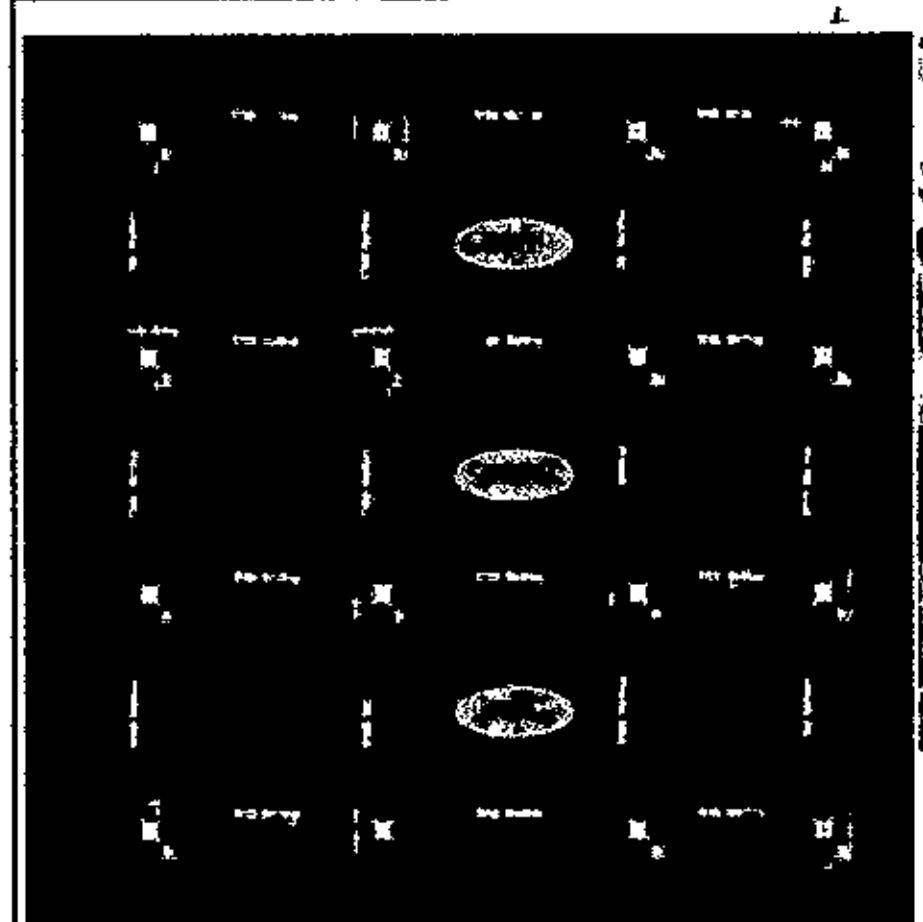

2

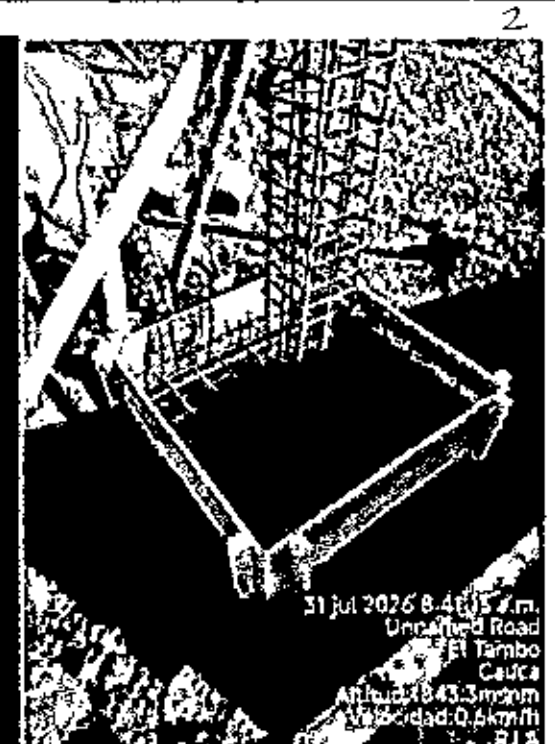


3

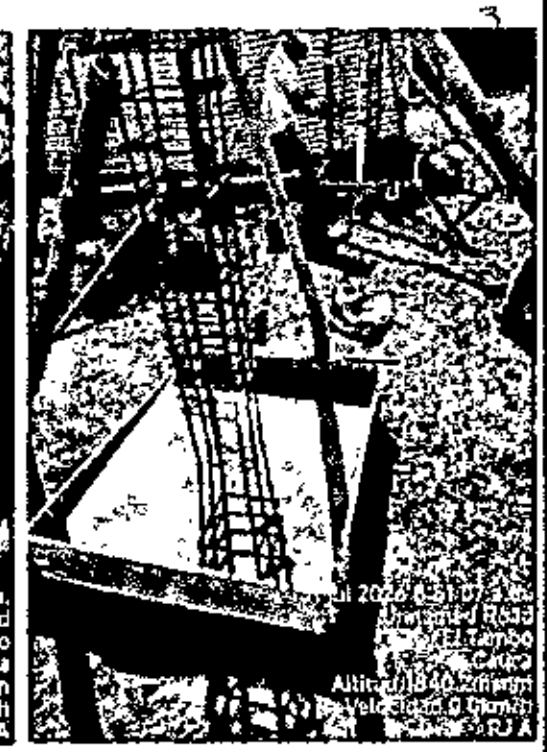

4



5

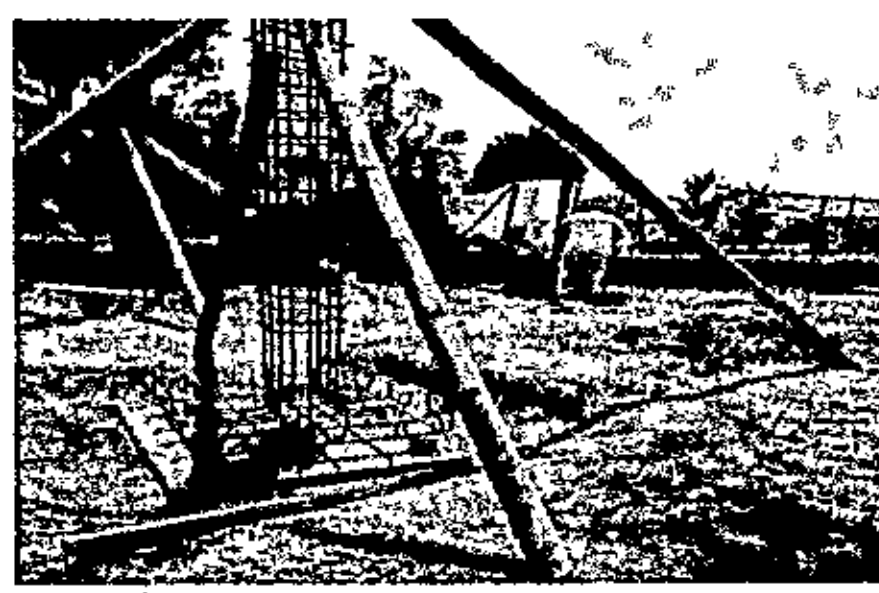

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI					UND	M3
UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT	TOTAL (M2)
zapata	1	1	0,3		16	4,80
TOTAL EJECUTADO (UND)						4,80

Claudia Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO	MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT: 891500978-6	MEMORIAS DE CALCULO

								ELABORO:		Claudia Stella Solano
								APROBO	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY
FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE N°	1		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.		
SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	C.C.	76,309,071
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	76,309,071
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	C.C.	901252241-8
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	891501104-0
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	25.423.584
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	C.C.	


CONTRATO N°
234 DE 23 DE MAYO DE 2026

CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES EJECUTADAS

ELABORO: Claudia Stella Solano

ITEM	2.4	REGISTRO FOTOGRÁFICO

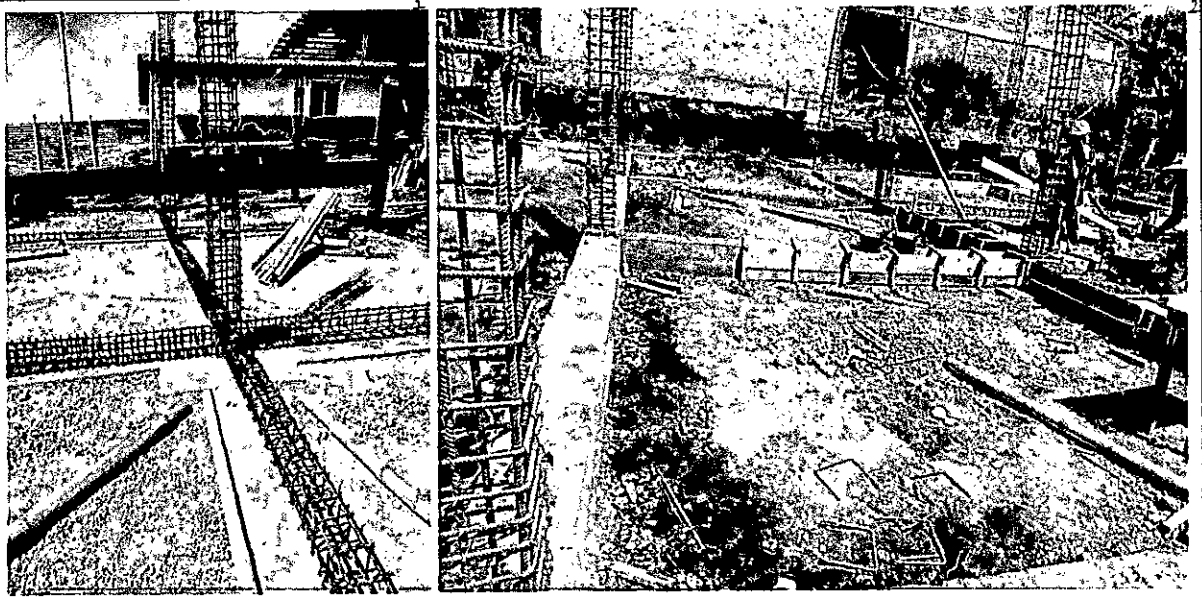

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES SECCION 30X30 CM 3000 PSI					UND	ML
UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	FACTOR DE FORMA (m)	CANT	TOTAL (M2)
VIGA EJE A	12,4					12,40
VIGA EJE B	12,4					12,40
VIGA EJE C	12,4					12,40
VIGA EJE D	12,4					12,40
VIGA EJE 1	11,73					11,73
VIGA EJE 2	11,73					11,73
VIGA EJE 3	11,73					11,73
VIGA EJE 4	11,73					11,73
TOTAL EJECUTADO (UND)						96,52

Claudia Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1372

ESE HOSPITAL DE EL TAMBO | MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT° 891500978-6 | **MEMORIAS DE CALCULO**

ELABORO		Claudia Stella Solano
APROBO	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIEGO MAMBUSCAY

FECHA	DD	31	MM	07	AA	26	CORTE N°	1

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.		
SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	C.C.	
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	76,309,071
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	C.C.	76,309,071
INTERVENTORIA	CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.	NIT	901252241-8
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0
REPRESENTANTE LEGAL	FLOR NELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.584


CONTRATO N°: 234 DE 23 DE MAYO DE 2026

CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3352 2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL CAUCA


MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES EJECUTADAS


TABLERO	

ITEM	4,1	REGISTRO FOTOGRAFICO

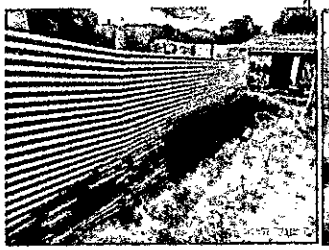
1


2

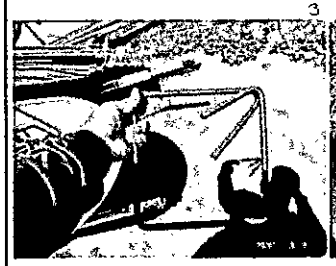
3

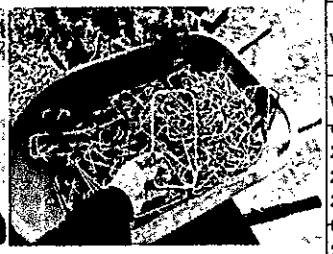
4

ACERO FIGURADO 60000 PSI															UND	KG
UBICACIÓN	CANTIDAD	ELEMENTO	BARRAS LONGITUDINALES: BARRA #	CANT BARRAS	LONG BARRA			ESTRIBOS						PESO (KG)	CANT	TOTAL
Zapatas	16	LONG ARRIBA Y ABAJO	4	9	1,15	0,996	164,94									164,94
Zapatas	16	TRANSV ARRIBA Y ABAJO	4	9	1,15	0,996	164,94									164,94
Viga cimentacion	4	LONGITUDINAL EJES 1234	4	4	14,35	0,996	228,68									228,68
Viga cimentacion	4	ESTRIVOS EJES 1235						3	RIAB	171	0,74	0,557	281,93			281,93
Viga cimentacion	4	LONGITUDINAL EJES ABCD	4	4	14,8	0,996	235,85									235,85
Viga cimentacion	4	ESTRIVOS EJES ABCD						3	RIAB	165	0,74	0,557	272,04			272,04
Columnas (1A-2A-3A-4A),(1B-2B-3B-4B),(1C-2C-3C-4C),(1D-	16		4	8	3,9	0,996	497,2									497,2
Columnas (1A-2A-3A-4A),(1B-2B-3B-4B),(1C-2C-3C-4C),(1D-	16							3	RIAB	41	1	0,557	365,39			365,39
TOTAL (KG)																2211

Claudia Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1893

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ALCALDÍA DE EL TAMBO
NIT 891501104-0

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	31	MM	07	AA	25	CONTEN°	1	ELABORO		Claudia Stella Solano
									REVISO	RESIDENTE	DIEGO MAMBUSCAY


OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

				CONTRATO N°
SUPERVISOR	SANDRA MILENA SÁNCHEZ BETANCOURT	CC		
CONTRATISTA	CONSORCIO LOS ANGELES 2026	NIT	76.309.071	234 DE 23 DE MAYO DE 2026
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Diego Fernando Ruiz Muñoz	CC	76.309.071	
INTEGRANTE	CONSTRUCTORES DM.G.I S.A.S.	NIT	901252241-8	
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO-CAUCA	NIT	891501104-0	
INTERVENTOR	FLOR MELLY ANTE QUINTERO	CC	25.423.564	

CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

MEMORIA DE CANTIDADES ESTRUCTURALES

ITEM: 4.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

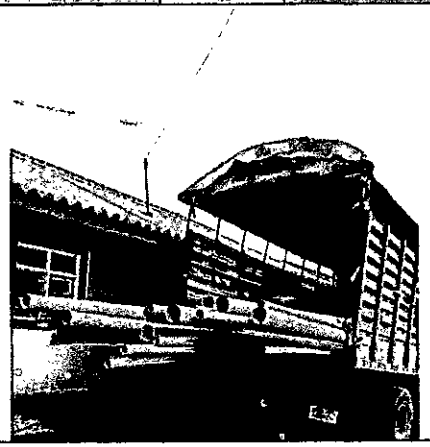

TRANSPORTE DE RESIDUOS

MATERIAL	UNID	CANT.	PESO(KG)								UND TOTAL
ZINC	UNID	90	3,5	315							0,315
GUADUA*5m	UNID	80	4,8	384							0,384
TABLA	UNID	100	6,5	650							0,65
PUNTILLAS	KG	25	1	25							0,025
ALAMBRE NEGRO # 18	KG	200	1	200							0,2
ARENA MIXTO	M3	6	1600	9600							9,6
TRITURADO	M3	15	1600	24000							24
ARENA FINA	M3	14	1600	22400							22,4
TIERRA NEGRA DESCAPOTE	M3	52,8	1200	63360							63,36
MATERIAL DE RELLENO	M3	118,8	1400	166320							166,32
TIERRA EXCAVACION	M3	152	1200	182400							182,4
CEMENTO GRIS	KG	10000	1	10000							10
ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	GL	1	140	140							0,14
BUGGIS	UNID	3	60	180							0,18
HERRAMIENTA	GL	1	120	120							0,12
VARILLA 1/2"	UNID	250	6	1500							1,5
VARILLA 3/8"	UNID	400	3,36	1344							1.344
HIERRO 1/4"	KG	150	1	150							0,15
LISTON-CUARTONES	UNID	30	18	540							0,54
BASTIDORES	UNID	30	5,8	174							0,174
			TOTAL (TON)								483,8

$ 676.539.167,00
10%
$ 73.960.814,40
7,53%

Claudia Solano

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

1994

PROGRAMA DE INVERSIONES 001 JULIO DE 2026

CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA	>1	DE	1

ENTIDAD EJECUTORA: ESE HOSPITAL DE EL TAMBO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 DE 6 | SEGUIMIENTO No. 1 | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No.: 334 DE 2026
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ANGELES 2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 241 DE 2026
INTERVENTOR: CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01 julio de 2026
FECHA DE SUSPENSION:
VALOR INICIAL (Incluido IVA)(A): $5,424,742,185.00
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA)(C=A+B): $5,424,742,185.00

PLAZO ACUMULADO: SEIS (06) MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 diciembre de 2026
FECHA DE REANUDACION:
VALOR ADICIONES (Incluido IVA)(B):

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES N° / PERIODO	1 1/07/2026 4/08/2026	2 5/08/2026 1/09/2026	3 2/09/2026 29/09/2026	4 30/09/2026 31/12/2026	5 4/11/2026 1/12/2026	6 2/12/2026 31/12/2026	7
PRELIMINARES	($ 68,859,630.00)	(6.82%)	4.05%	%P		0.74%	2.66%	1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
	$ 45,086,233.02	4.46%	40,924,910.00	$P		$7,604,529.91	$27,051,406.56	$10,530,295.13	$0.00	$0.00	$0.00	
				$E		$40,924,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		4.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
CIMENTACIÓN	($ 56,295,221.01)	(5.57%)	1.60%	%P		0.04%	0.31%	3.39%	1.29%	0.00%	0.00%	95%
	$ 50,730,767.00	5.02%	16,185,585.00	$P		$371,304.01	$3,314,811.49	$34,169,834.85	$13,055,416.95	$0.00	$0.00	
				$E		$16,185,585.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		1.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTRUCTURA	($ 22,037,523.00)	(2.18%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	2.35%	0.27%	0.00%	0.00%	90%
	$ 26,427,243.00	2.62%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$23,731,899.00	$2,695,551.00	$0.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ACERO DE REFUERZO	($ 61,193,471.00)	(6.06%)	1.63%	%P		1.44%	4.32%	0.40%	2.37%	0.00%	0.00%	85%
	$ 86,141,602.00	8.53%	16,452,051.00	$P		$14,543,049.00	$43,628,147.03	$4,019,106.00	$23,950,300.00	$0.00	$0.00	
				$E		$16,452,051.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		1.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MAMPOSTERIA	($ 96,652,801.00)	(9.57%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	0.07%	0.00%	80%
	$ 96,652,801.00	9.57%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$98,490,706.50	$702,293.50	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	($ 15,621,815.00)	(1.55%)	0.00%	%P		0.00%	1.39%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	75%
	$ 15,621,815.00	1.55%	0.00	$P		$0.00	$14,080,106.00	$0.00	$1,541,709.00	$0.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
RED SANITARIA	($ 15,978,304.01)	(1.58%)	0.00%	%P		0.00%	1.54%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	70%
	$ 15,978,304.01	1.58%	0.00	$P		$0.00	$15,568,381.80	$409,922.21	$0.00	$0.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
RED PATOGENA	($ 3,592,257.00)	(0.36%)	0.00%	%P		0.00%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65%
	$ 3,592,257.00	0.36%	0.00	$P		$0.00	$3,592,257.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
RED PLUVIAL	($ 9,245,206.01)	(0.92%)	0.00%	%P		0.00%	0.83%	0.07%	0.02%	0.00%	0.00%	
	$ 9,245,206.00	0.92%	0.00	$P		$0.00	$8,370,071.50	$718,360.50	$156,774.00	$0.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
RED CONTRAINCENDIOS	($ 491,474.00)	(0.05%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	60%
	$ 491,474.00	0.05%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,486.00	$338,987.97	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
CUBIERTA	($ 28,807,810.01)	(2.85%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	2.72%	0.13%	0.00%	55%
	$ 28,807,810.01	2.85%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$27,464,480.63	$1,343,329.38	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
REVESTIMIENTOS	($ 90,112,946.00)	(8.92%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	8.36%	0.23%	50%
	$ 90,112,946.00	8.92%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$5,000,158.25	$84,463,318.35	$2,547,263.90	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
CARPINTERIAS	($ 22,496,639.00)	(2.23%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.23%	0.00%	45%
	$ 22,496,639.00	2.23%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,496,639.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
CIELO FALSO	($ 22,522,334.00)	(2.23%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.23%	0.00%	40%
	$ 22,522,334.00	2.23%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,522,334.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PISOS	($ 42,531,525.01)	(4.21%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.88%	2.31%	1.00%	35%
	$ 42,531,525.00	4.21%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$3,691,325.00	$23,827,720.00	$10,062,580.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
GUARDAESCOBAS	($ 12,396,514.00)	(1.23%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.23%	0.00%	30%
	$ 12,396,514.00	1.23%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,396,514.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
FACHADA	($ 76,916,993.01)	(7.62%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	5.84%	1.76%	0.00%	25%
	$ 76,916,993.01	7.62%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$58,660,229.38	$17,926,764.63	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	($ 13,684,534.00)	(1.36%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.77%	20%
	$ 13,684,534.00	1.36%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,945,454.00	$7,738,630.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
CARPINTERA DE PUERTAS Y VENTANAS	($ 34,321,529.00)	(3.40%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.40%	0.00%	15%
	$ 34,321,529.01	3.40%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,321,529.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MOBILIARIO	($ 14,987,011.04)	(1.48%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.48%	10%
	$ 14,887,011.02	1.48%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,887,011.02	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MESONES	($ 8,443,452.00)	(0.84%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	5%
	$ 8,443,452.00	0.84%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,443,452.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
OTROS	($ 27,274,803.00)	(2.70%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	2.04%	0.00%	0.63%	0.13%	0%
	$ 27,274,803.00	2.70%	0.00	$P		$0.00	$0.00	$20,691,100.00	$0.00	$6,337,415.00	$1,320,230.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
RED ELECTRICA	($ 265,461,894.00)	(26.29%)	0.00%	%P		0.00%	0.56%	3.20%	10.30%	12.19%	0.00%	
	$ 265,461,894.00	26.29%	0.00	$P		$0.00	$5,822,404.75	$32,334,366.25	$104,647,928.00	$123,158,885.00	$0.00	
				$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 1,009,925,686)	100%	7.28%									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	($ 1,009,925,686)	100%	($ 73,562,546.00)									

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.22%	12.01%	12.53%	33.67%	35.08%	4.48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 22,418,882.02	$ 121,328,588.42	$ 126,530,076.64	$ 340,043,387.22	$ 354,323,098.91	$ 45,281,854.89
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2.22%	14.23%	26.76%	60.43%	95.52%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 22,418,882.02	$ 143,747,470.44	$ 270,277,547.09	$ 610,320,934.30	$ 964,644,031.21	$ 1,009,925,686.10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	7.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 73,562,546.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	7.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 73,562,546.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO INICIAL	PROGRAMA VIGENTE	EJECUTADO
BARRAS			
CURVAS			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONSORCIO LOS ÁNGELES 2026
DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

CONSTRUCTORES DMGJ S.A.S.
NILSON NOLVERTO MUÑOZ ACHINTE
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORÍA

SANDRA MILENA SANCHEZ BETANCOURT
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Original: Anexo para [illegible] de la cuenta.
Copias: Gerente ESE, Supervisor, Contratista y Interventor
