VISITA ACUEDUCTO VEREDA JAGUITO, SECTOR MESITAS

Siendo las 8:30, del día 20 del mes de agosto de 2026, asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
Manuel Andres Suarez Fernández	Alcaldía Municipal

OBJETO DE LA VISITA

Por directriz del Secretario de Infraestructura, se realizó visita técnica a la línea de conducción del acueducto veredal de la vereda Jagüito sector mesita en atención a solicitud recibida por la comunidad en el despacho de la secretaria, con el fin de evidenciar el estado actual de la misma y evaluar el posible reemplazo de dicha infraestructura, atendiendo al incremento en la población beneficiaria del sistema y el deterioro del sistema.

SITUACION OBSERVADA

Durante el recorrido realizado a la línea de conducción del acueducto veredal de la vereda Jagüito sector mesitas, se evidenció que la tubería en PVC ha venido teniendo desplazamientos normales debió a la topografía de la zona, dichos desplazamientos estarían presentando problemas en la hermeticidad de la tubería por lo cual se presentan fugas en las uniones de la misma, causando la perdida de caudal y presión en la tubería, se recomienda reemplazo de la tubería de PVC por tubería PN16, la cual permite tener menos uniones en la línea de conducción y una unión más uniforme, evitando tener perdidas de caudal y presión en la misma. Según información suministrada por la comunidad, de esta línea se benefician aproximadamente 35 familias, siendo las familias ubicadas en los sectores finales las más afectadas, debido a que reciben un caudal insuficiente para atender adecuadamente sus necesidades, situación que evidencia la necesidad de evaluar el reemplazo de la línea de conducción en un tramo de aproximadamente 2700 metros.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES


La comunidad solicita el reemplazo de la tubería de conducción en el sector mesitas de la vereda jaguito, esto debido a la topografía de la zona y a la instalación de la misma ya hace un tiempo considerable se han venido presentando perdidas de presión y de caudal en la línea, con el fin de garantizar un caudal adecuado y uniforme para todas las familias beneficiarias. Así mismo, se solicita el cambio de los accesorios requeridos para el correcto funcionamiento de la línea, tales como galápagos o sillas del diámetro correspondiente, con salida de ½ pulgada para las diferentes derivaciones hacia las viviendas beneficiarias, al igual que la sustitución de ventosas y registros acordes al diámetro que se pretende reemplazar.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE**	**PLAZO PARA CUMPLIMIENTO**

FIRMAS			
NOMBRES Y APELLIDOS	**IDENTIFICACION**	**REPRESENTATE DE:**	**FIRMA**
Manuel Andres Suarez Fernández	**1.115.916.610**	Sec. Infraestructura	
APROBÓ: Lino Rodríguez Ochoa		Sec. Infraestructura	


ANEXOS	**SI** [X] **NO** [ ]	**TIPO DE ANEXO: Anexo Fotográfico**	**NUMERO DE FOLIOS:**	**4**

ANEXO FOTOGRAFICO

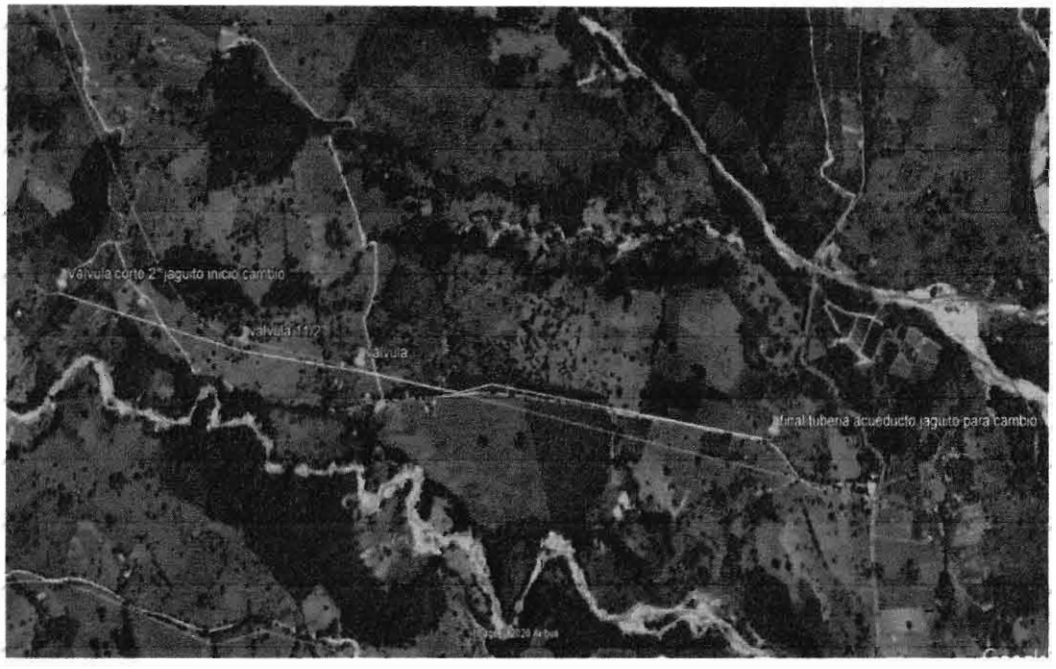



ANEXO FOTOGRAFICO

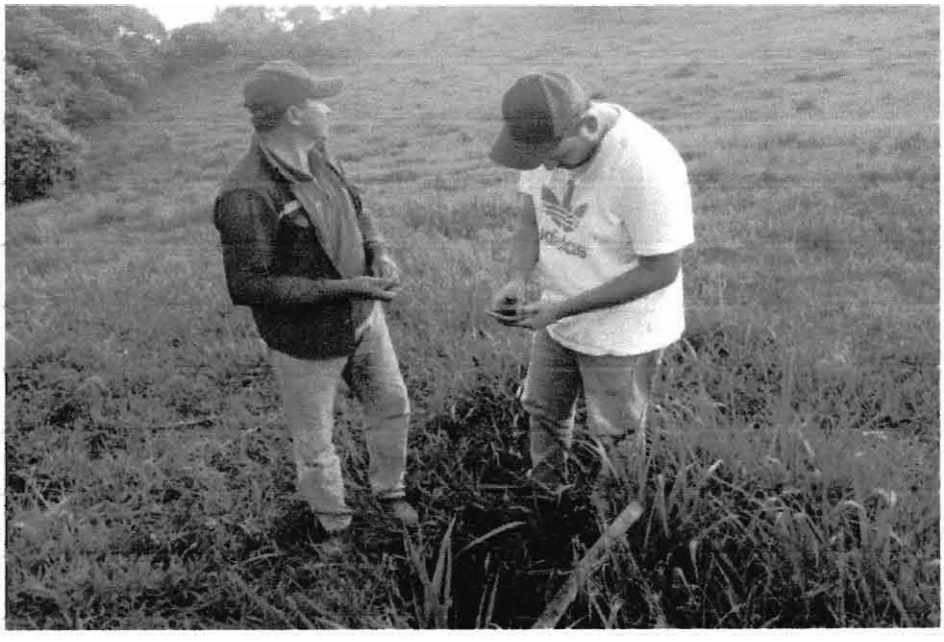



ANEXO FOTOGRAFICO





ANEXO FOTOGRAFICO



