


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% físico completado	Costo	CPTP	CPTR	% PROGRAMA	% EJECCUTADO	Sucesoras
0	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2**	162 días	11/11/25	10/07/26	5%	6%	$ 4.619.275.309,00	$ 278.599.672,23	$ 256.419.755,30	6,03	5,55	
1	ACTA DE INICIO	0 días	11/11/25	11/11/25	100%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	2
2	PLANEACION PROYECTO Y PLAN DE CAMPO	10 días	11/11/25	25/11/25	100%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	6FC+6 días;
3	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE**	146 días	4/12/25	10/07/26	5%	5%	$ 659.896.472,70	$ 39.799.953,16	$ 34.553.076,58	6,03	5,24	
4	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	47 días	4/12/25	12/02/26	75%	63%	$ 39.238.478,10	$ 33.672.089,34	$ 24.638.114,15	85,81	62,79	
13	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	116 días	9/01/26	1/07/26	3%	2%	$ 135.622.344,80	$ 6.127.863,82	$ 3.052.369,90	4,52	2,25	
74	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	49 días	4/03/26	15/05/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
84	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	82 días	28/01/26	27/05/26	0%	0%	$ 215.710.179,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
106	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	70 días	18/03/26	2/07/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
120	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	47 días	22/04/26	1/07/26	22%	18%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 5.367.339,04	0	17,95	
133	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	42 días	16/04/26	17/06/26	0%	0%	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
141	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	48 días	29/04/26	9/07/26	0%	0%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
170	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	52 días	22/04/26	8/07/26	0%	0%	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
194	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	52 días	16/04/26	2/07/26	1%	2%	$ 65.932.204,70	$ 0,00	$ 1.495.253,49	0	2,27	
218	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	72 días	13/03/26	1/07/26	0%	0%	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
231	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	42 días	11/05/26	10/07/26	0%	0%	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
245	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	22 días	9/06/26	10/07/26	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
253	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ)**	146 días	4/12/25	10/07/26	6%	6%	$ 659.896.472,70	$ 39.799.953,16	$ 38.414.900,44	6,03	5,82	
254	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	47 días	4/12/25	12/02/26	75%	63%	$ 39.238.478,10	$ 33.672.089,34	$ 24.638.114,15	85,81	62,79	
263	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	116 días	9/01/26	1/07/26	3%	0%	$ 135.622.344,80	$ 6.127.863,82	$ 0,00	4,52	0	
324	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	49 días	4/03/26	15/05/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
334	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	82 días	28/01/26	27/05/26	0%	0%	$ 215.710.179,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
356	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	70 días	18/03/26	2/07/26	7%	10%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 1.959.726,96	0	10,38	
370	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	47 días	22/04/26	1/07/26	30%	35%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 10.321.805,84	0	34,52	
383	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	42 días	16/04/26	17/06/26	0%	0%	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
391	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	48 días	29/04/26	9/07/26	0%	0%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
420	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	52 días	22/04/26	8/07/26	0%	0%	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
444	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	52 días	16/04/26	2/07/26	1%	2%	$ 65.932.204,70	$ 0,00	$ 1.495.253,49	0	2,27	
468	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	72 días	13/03/26	1/07/26	0%	0%	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
481	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	42 días	11/05/26	10/07/26	0%	0%	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
495	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	22 días	9/06/26	10/07/26	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
503	**VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO**	146 días	4/12/25	10/07/26	5%	5%	$ 659.896.472,80	$ 39.799.953,26	$ 33.493.883,02	6,03	5,08	
504	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	47 días	4/12/25	12/02/26	75%	63%	$ 39.238.478,20	$ 33.672.089,43	$ 24.638.114,20	85,81	62,79	

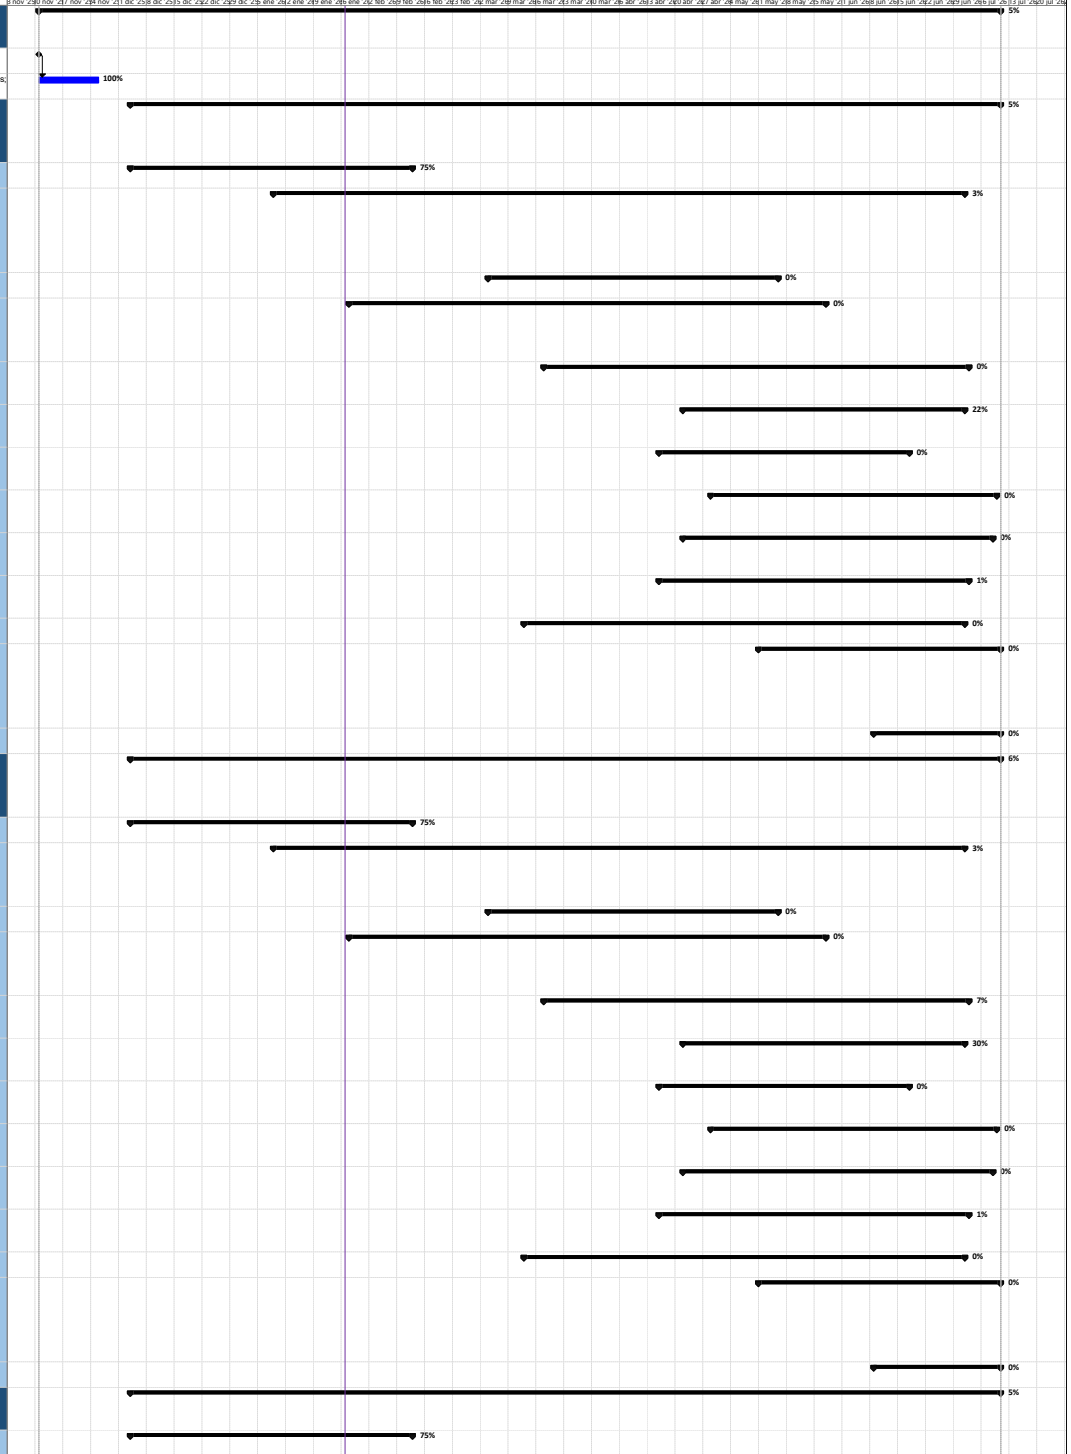

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% físico completado	Costo	CPTP	CPTR	% PROGRAMA	% EJECCUTADO	Sucesoras
513	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	116 días	9/01/26	1/07/26	3%	0%	$ 135.622.344,80	$ 6.127.863,82	$ 0,00	4,52	0	
574	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	49 días	4/03/26	15/05/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
584	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	82 días	28/01/26	27/05/26	0%	0%	$ 215.710.179,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
606	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	70 días	18/03/26	2/07/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
620	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	47 días	22/04/26	1/07/26	30%	25%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 7.360.515,34	0	24,62	
633	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	42 días	16/04/26	17/06/26	0%	0%	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
641	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	48 días	29/04/26	9/07/26	0%	0%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
670	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	52 días	22/04/26	8/07/26	0%	0%	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
694	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	52 días	16/04/26	2/07/26	1%	2%	$ 65.932.204,70	$ 0,00	$ 1.495.253,49	0	2,27	
718	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	72 días	13/03/26	1/07/26	0%	0%	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
731	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	42 días	11/05/26	10/07/26	0%	0%	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
745	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	22 días	9/06/26	10/07/26	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
753	VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN	146 días	4/12/25	10/07/26	5%	6%	$ 659.896.472,70	$ 39.799.953,16	$ 36.455.173,48	6,03	5,52	
754	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	47 días	4/12/25	12/02/26	75%	63%	$ 39.238.478,10	$ 33.672.089,34	$ 24.638.114,15	85,81	62,79	
763	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	116 días	9/01/26	1/07/26	3%	0%	$ 135.622.344,80	$ 6.127.863,82	$ 0,00	4,52	0	
824	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	49 días	4/03/26	15/05/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
834	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	82 días	28/01/26	27/05/26	0%	0%	$ 215.710.179,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
856	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	70 días	18/03/26	2/07/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
870	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	47 días	22/04/26	1/07/26	30%	35%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 10.321.805,84	0	34,52	
883	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	42 días	16/04/26	17/06/26	0%	0%	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
891	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	48 días	29/04/26	9/07/26	0%	0%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
920	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	52 días	22/04/26	8/07/26	0%	0%	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
944	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	52 días	16/04/26	2/07/26	1%	2%	$ 65.932.204,70	$ 0,00	$ 1.495.253,49	0	2,27	
968	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	72 días	13/03/26	1/07/26	0%	0%	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
981	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	42 días	11/05/26	10/07/26	0%	0%	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
995	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	22 días	9/06/26	10/07/26	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1003	VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO	146 días	4/12/25	10/07/26	6%	6%	$ 659.896.472,70	$ 39.799.953,16	$ 38.414.900,44	6,03	5,82	
1004	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	47 días	4/12/25	12/02/26	75%	63%	$ 39.238.478,10	$ 33.672.089,34	$ 24.638.114,15	85,81	62,79	
1013	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	116 días	9/01/26	1/07/26	3%	0%	$ 135.622.344,80	$ 6.127.863,82	$ 0,00	4,52	0	
1074	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	49 días	4/03/26	15/05/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1084	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	82 días	28/01/26	27/05/26	0%	0%	$ 215.710.179,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1106	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	70 días	18/03/26	2/07/26	7%	10%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 1.959.726,96	0	10,38	
1120	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	47 días	22/04/26	1/07/26	30%	35%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 10.321.805,84	0	34,52	

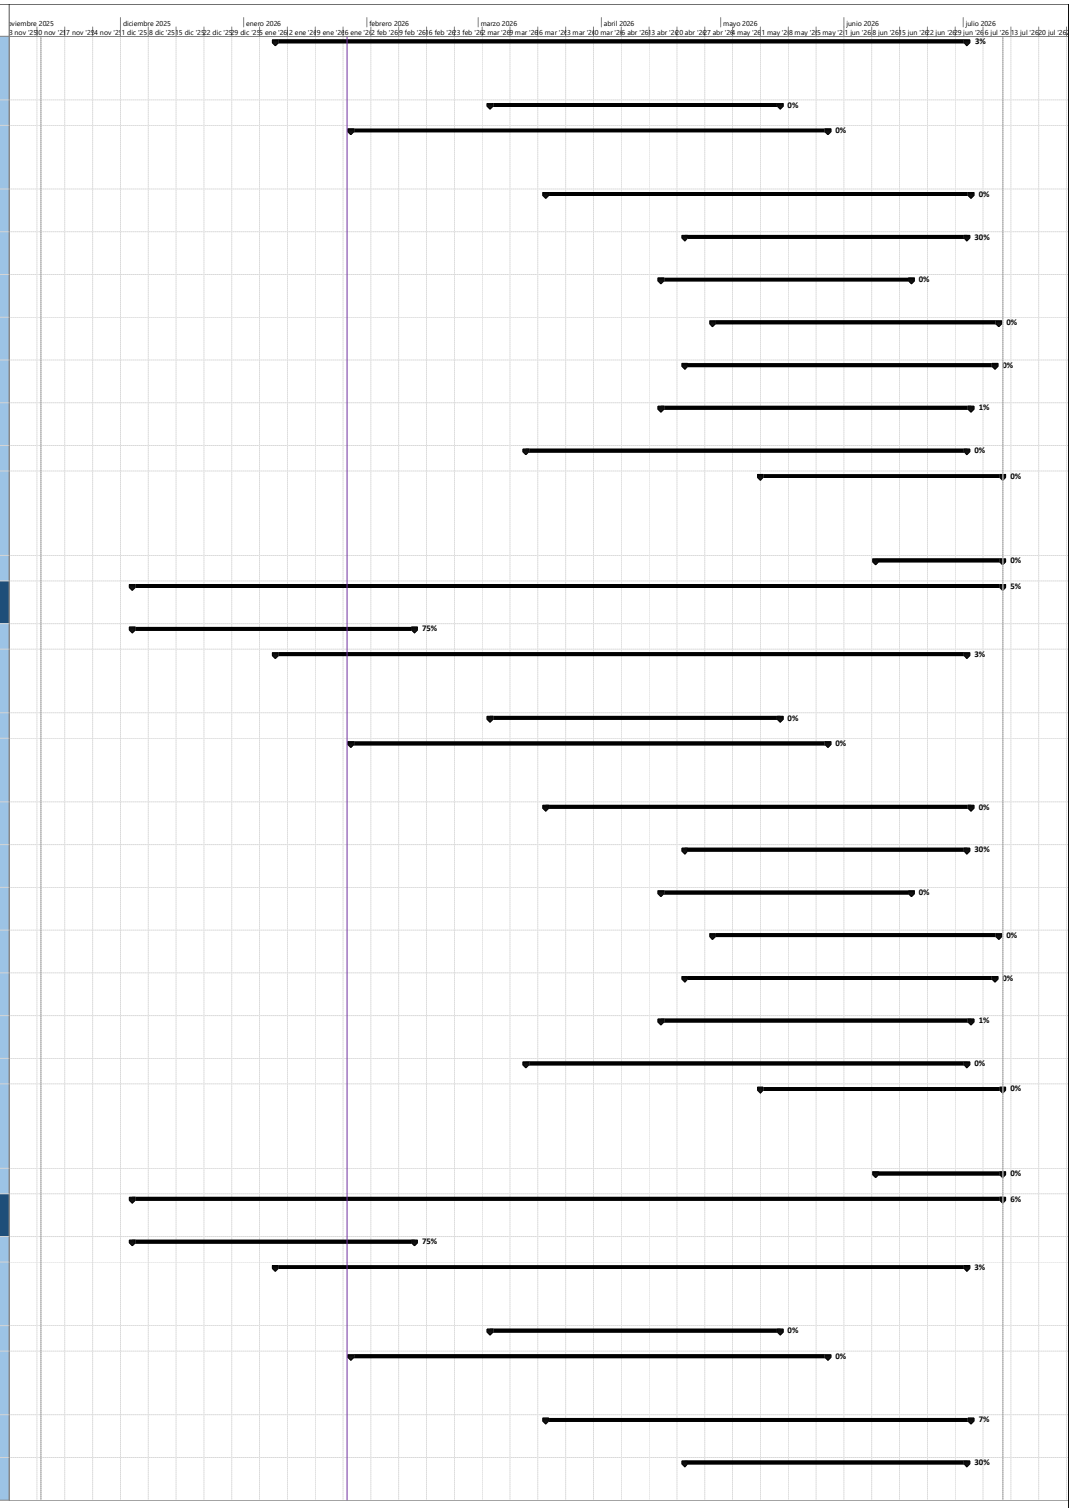

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% físico completado	Costo	CPTP	CPTR	% PROGRAMA	% EJECCUTADO	Sucesoras
1133	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	42 días	16/04/26	17/06/26	0%	0%	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1141	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	48 días	29/04/26	9/07/26	0%	0%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1170	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	52 días	22/04/26	8/07/26	0%	0%	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1194	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	52 días	16/04/26	2/07/26	1%	2%	$ 65.932.204,70	$ 0,00	$ 1.495.253,49	0	2,27	
1218	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	72 días	13/03/26	1/07/26	0%	0%	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1231	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	42 días	11/05/26	10/07/26	0%	0%	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1245	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	22 días	9/06/26	10/07/26	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1253	VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA	146 días	4/12/25	10/07/26	5%	6%	$ 659.896.472,70	$ 39.799.953,16	$ 36.455.173,48	6,03	5,52	
1254	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	47 días	4/12/25	12/02/26	75%	63%	$ 39.238.478,10	$ 33.672.089,34	$ 24.638.114,15	85,81	62,79	
1263	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	116 días	9/01/26	1/07/26	3%	0%	$ 135.622.344,80	$ 6.127.863,82	$ 0,00	4,52	0	
1324	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	49 días	4/03/26	15/05/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1334	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	82 días	28/01/26	27/05/26	0%	0%	$ 215.710.179,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1356	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	70 días	18/03/26	2/07/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1370	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	47 días	22/04/26	1/07/26	30%	35%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 10.321.805,84	0	34,52	
1383	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	42 días	16/04/26	17/06/26	0%	0%	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1391	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	48 días	29/04/26	9/07/26	0%	0%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1420	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	52 días	22/04/26	8/07/26	0%	0%	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1444	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	52 días	16/04/26	2/07/26	1%	2%	$ 65.932.204,70	$ 0,00	$ 1.495.253,49	0	2,27	
1468	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	72 días	13/03/26	1/07/26	0%	0%	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1481	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	42 días	11/05/26	10/07/26	0%	0%	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1495	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	22 días	9/06/26	10/07/26	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1503	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA	146 días	4/12/25	10/07/26	6%	6%	$ 659.896.472,70	$ 39.799.953,16	$ 38.632.647,88	6,03	5,85	
1504	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	47 días	4/12/25	12/02/26	75%	63%	$ 39.238.478,10	$ 33.672.089,34	$ 24.638.114,15	85,81	62,79	
1513	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	116 días	9/01/26	1/07/26	3%	0%	$ 135.622.344,80	$ 6.127.863,82	$ 0,00	4,52	0	
1574	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	49 días	4/03/26	15/05/26	0%	0%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1584	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	82 días	28/01/26	27/05/26	0%	0%	$ 215.710.179,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1606	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	70 días	18/03/26	2/07/26	8%	12%	$ 18.871.444,80	$ 0,00	$ 2.177.474,40	0	11,54	
1620	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	47 días	22/04/26	1/07/26	30%	35%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 10.321.805,84	0	34,52	
1633	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	42 días	16/04/26	17/06/26	0%	0%	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1641	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	48 días	29/04/26	9/07/26	0%	0%	$ 29.897.644,50	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1670	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	52 días	22/04/26	8/07/26	0%	0%	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	
1694	VOLUMEN X. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	52 días	16/04/26	2/07/26	1%	2%	$ 65.932.204,70	$ 0,00	$ 1.495.253,49	0	2,27	
1718	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	72 días	13/03/26	1/07/26	0%	0%	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	

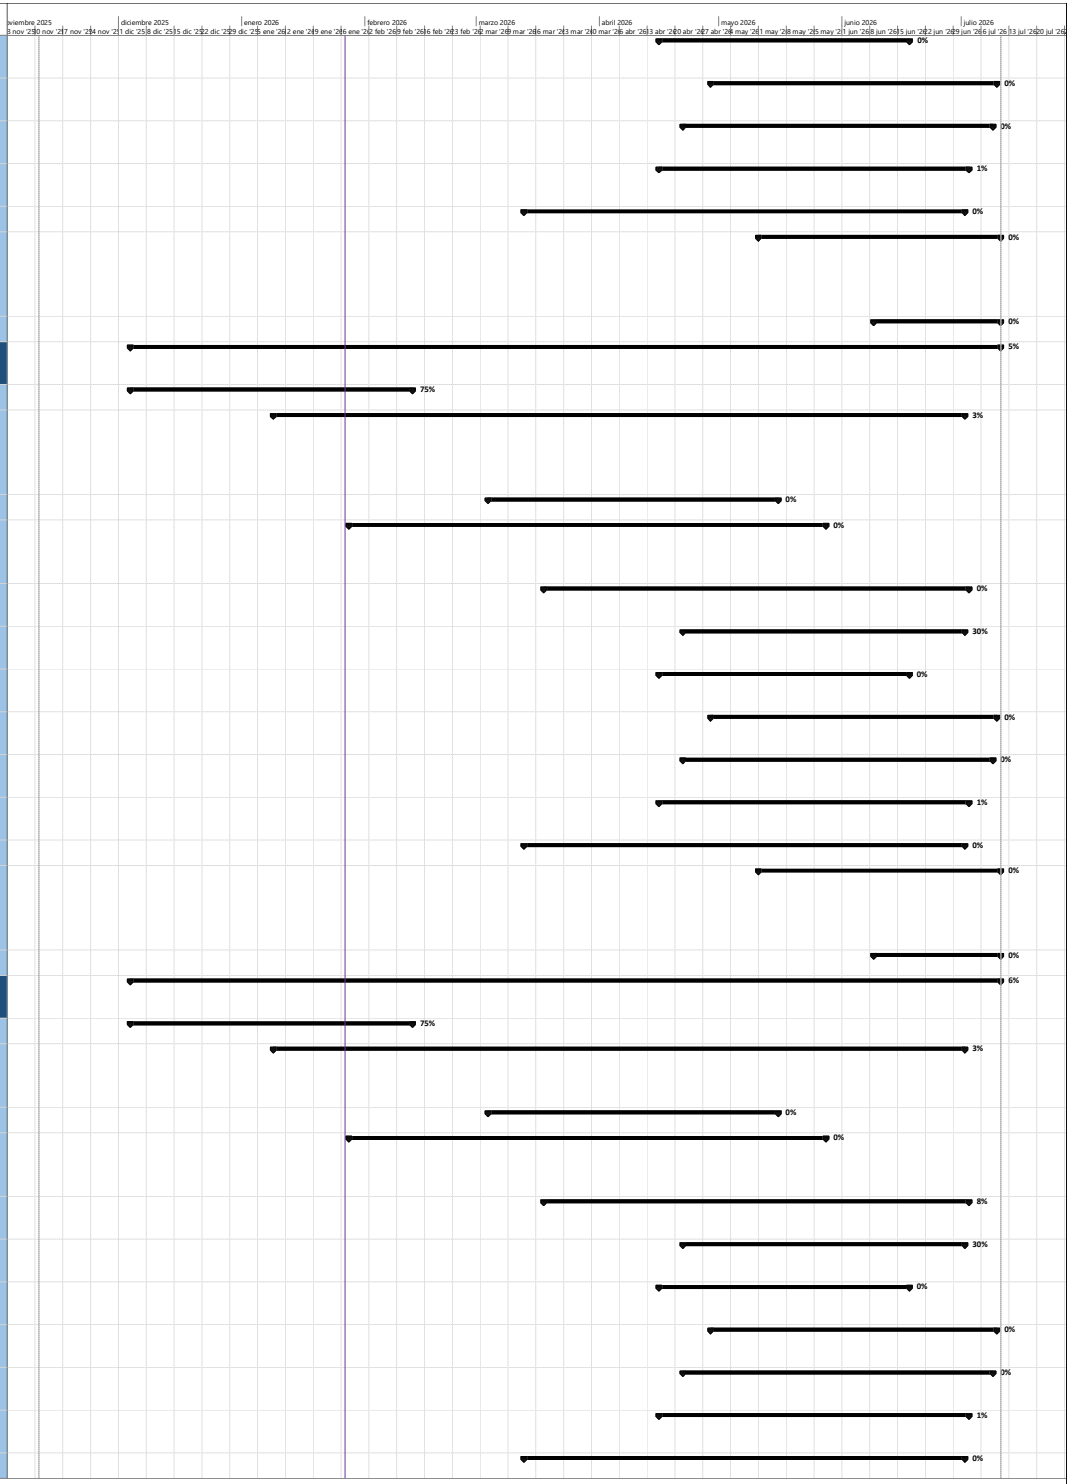

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% físico completado	Costo	CPTP	CPTR	% PROGRAMA	% EJECCUTADO	Sucesoras
1731	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**42 días**	**11/05/26**	**10/07/26**	**0%**	**0%**	**$ 19.946.694,30**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	
1745	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**22 días**	**9/06/26**	**10/07/26**	**0%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	
1753	ENTREGA PRODUCTOS CONSULTORÍA	6 días	3/07/26	10/07/26	0%	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	

