

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	% físico completado	Costo
0	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2**	**11/11/25**	**10/08/26**	**180,5 días**	**22%**	**$ 4.619.275.309,00**
1	ACTA DE INICIO	11/11/25	11/11/25	0 días	100%	$ 0,00
2	PLANEACION PROYECTO Y PLAN DE CAMPO	4/12/25	10/08/26	164,5 días	0%	$ 0,00
3	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE**	**4/12/25**	**10/07/26**	**146 días**	**17%**	**$ 659.896.472,70**
253	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ)**	**4/12/25**	**10/07/26**	**146 días**	**21%**	**$ 659.896.472,70**
503	**VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO**	**4/12/25**	**10/07/26**	**146 días**	**17%**	**$ 659.896.472,80**
753	**VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN**	**4/12/25**	**10/07/26**	**146 días**	**29%**	**$ 659.896.472,70**
1003	**VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO**	**4/12/25**	**10/07/26**	**146 días**	**17%**	**$ 659.896.472,70**
1253	**VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA**	**4/12/25**	**10/07/26**	**146 días**	**17%**	**$ 659.896.472,70**
1503	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA**	**4/12/25**	**10/07/26**	**146 días**	**37%**	**$ 659.896.472,70**
1753	ENTREGA PRODUCTOS CONSULTORÍA	3/07/26	10/07/26	6 días	0%	$ 0,00

CPTP	CPTR	% PROGRAMADO	% EJECCUTADO	Avance %	Sucesoras
$ 1.679.022.778,37	$ 1.028.524.843,56	36,35	22,27	-14,08	
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	2
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	1506FC+6 días;1256FC+6 días
$ 239.860.396,90	$ 114.897.090,46	36,35	17,41	-18,94	
$ 239.860.396,90	$ 138.568.706,50	36,35	21	-15,35	
$ 239.860.397,00	$ 109.474.602,24	36,35	16,59	-19,76	
$ 239.860.396,90	$ 189.918.930,97	36,35	28,78	-7,57	
$ 239.860.396,90	$ 114.056.836,88	36,35	17,28	-19,07	
$ 239.860.396,90	$ 114.878.692,76	36,35	17,41	-18,94	
$ 239.860.396,90	$ 246.729.983,75	36,35	37,39	1,04	
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	

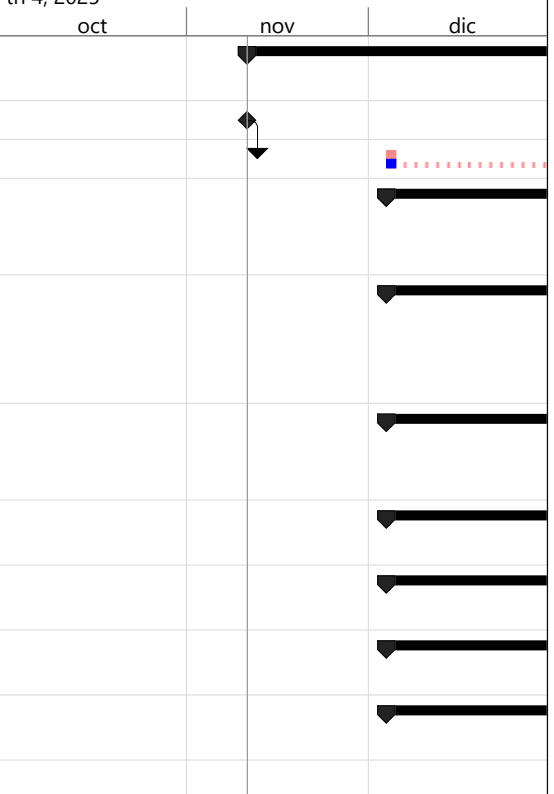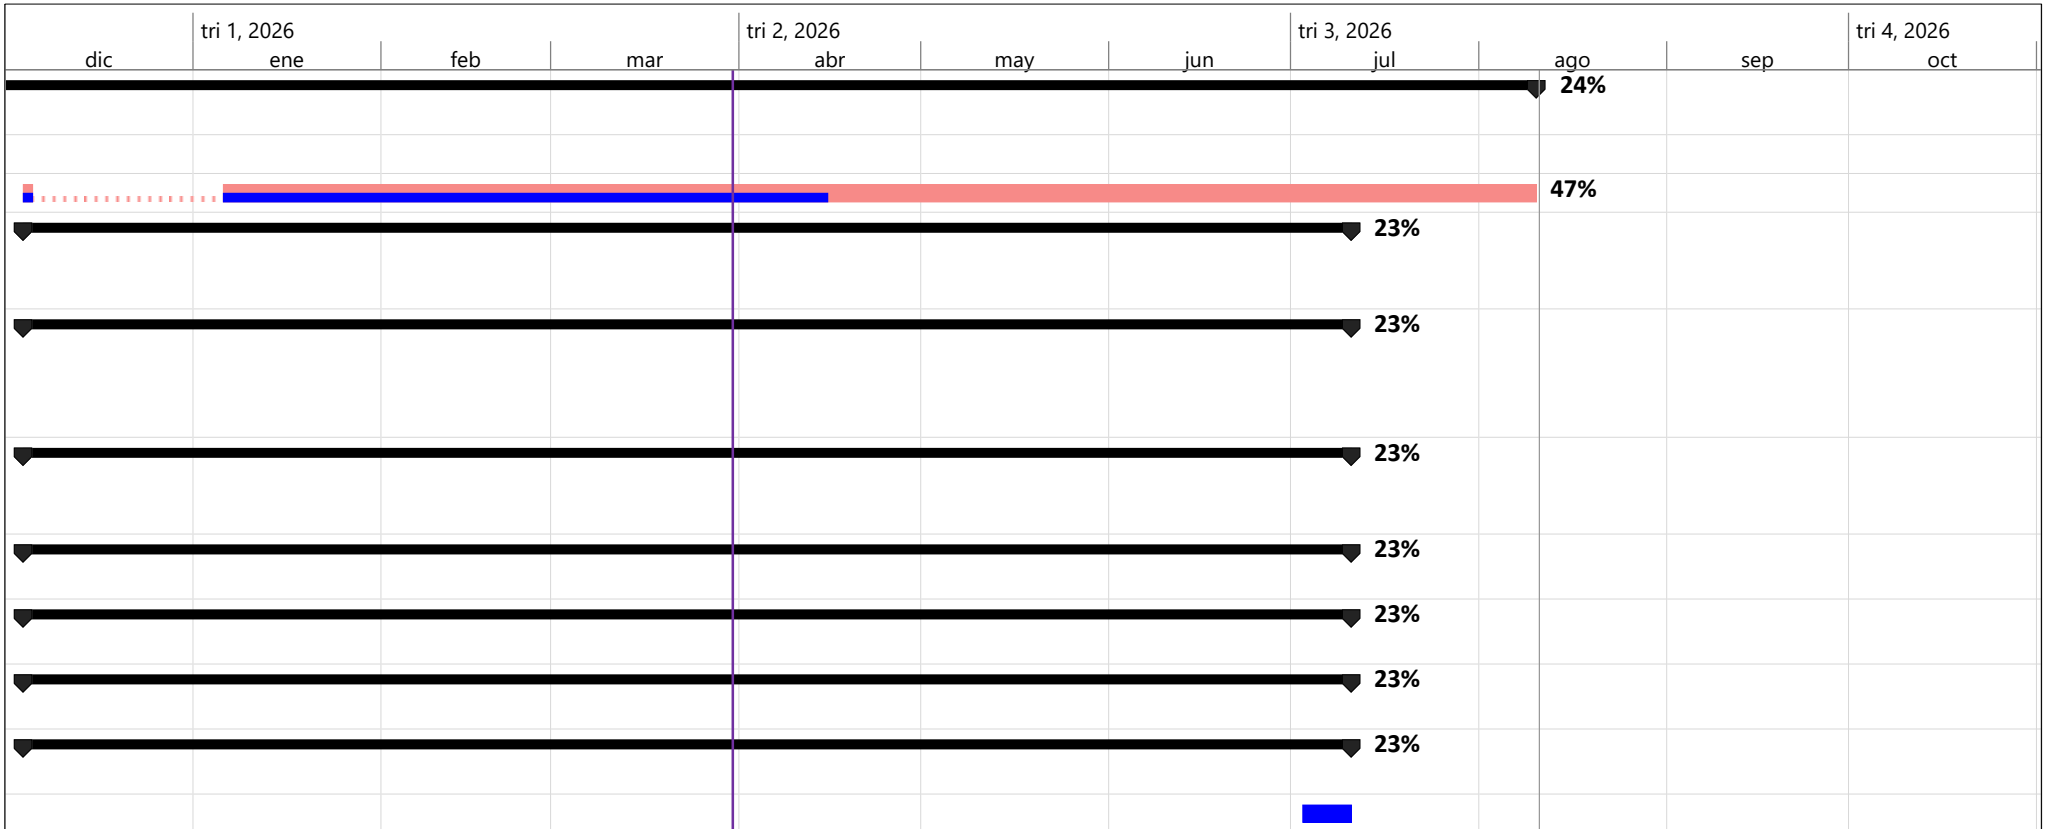


tri 1, 2026
tri 2, 2026
tri 3, 2026
tri 4, 2026
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
24%
47%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
