


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
0	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2**	162,73 días	11/11/25	10/07/26	$ 4.619.275.308,90	$ 2.175.440.006,05	$ 1.816.046.150,48	46,49	39,31	-7,18		
1	ACTA DE INICIO	0 días	11/11/25	11/11/25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		2
2	PLANEACION PROYECTO Y PLAN DE CAMPO	10 días	11/11/25	25/11/25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	1	15;6;143;20
3	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA**	115 días	9/12/25	27/05/26	$ 659.896.472,70	$ 616.616.095,65	$ 428.750.104,79	90,43	64,97	-25,46		
4	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	67 días	9/12/25	17/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
13	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	85 días	15/01/26	19/05/26	$ 135.622.344,80	$ 124.691.420,03	$ 83.514.383,23	91,94	61,58	-30,36		
74	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	54 días	16/02/26	6/05/26	$ 18.871.444,80	$ 17.895.335,59	$ 18.611.149,01	94,83	98,62	3,79		
84	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	48 días	2/03/26	12/05/26	$ 215.710.179,00	$ 202.336.147,91	$ 148.581.171,29	84,6	68,88	-15,72		
106	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	46 días	2/03/26	8/05/26	$ 18.871.444,80	$ 17.782.707,60	$ 13.790.671,20	94,23	73,08	-21,15		
120	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	49 días	2/03/26	13/05/26	$ 29.897.644,50	$ 28.118.022,80	$ 26.516.363,27	94,05	88,69	-5,36		
133	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	30 días	20/03/26	6/05/26	$ 30.831.284,00	$ 29.581.367,08	$ 7.916.140,49	95,95	25,68	-70,27		
141	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	75 días	20/01/26	8/05/26	$ 29.897.644,50	$ 26.966.502,88	$ 11.724.566,46	90,2	39,22	-50,98		
170	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	35 días	18/03/26	11/05/26	$ 32.710.125,00	$ 32.055.922,50	$ 15.210.208,14	98	46,5	-51,5		
194	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	40 días	13/03/26	13/05/26	$ 65.932.204,70	$ 64.480.486,43	$ 57.112.798,47	97,8	86,62	-11,18		
218	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	63 días	10/02/26	13/05/26	$ 22.366.984,20	$ 21.864.355,34	$ 6.534.175,14	97,75	29,21	-68,54		
231	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	22 días	20/04/26	20/05/26	$ 19.946.694,30	$ 11.605.349,40	$ 0,00	58,18	0	-58,18		
245	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	27 días	20/04/26	27/05/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
253	**VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN**	125 días	9/12/25	11/06/26	$ 659.896.472,70	$ 443.160.149,81	$ 351.563.002,79	66,63	53,28	-13,35		
254	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	67 días	9/12/25	17/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
263	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	70 días	20/02/26	3/06/26	$ 135.622.344,80	$ 97.469.439,70	$ 78.168.957,39	70,79	57,64	-13,15		
324	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	69 días	20/02/26	2/06/26	$ 18.871.444,80	$ 16.654.863,46	$ 17.569.965,85	88,25	93,1	4,85		
334	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	62 días	3/03/26	2/06/26	$ 215.710.179,00	$ 123.335.467,05	$ 115.965.792,22	56,8	53,76	-3,04		
356	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	58 días	3/03/26	27/05/26	$ 18.871.444,80	$ 15.196.956,75	$ 7.258.248,00	80,58	38,46	-42,12		
370	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	62 días	3/03/26	2/06/26	$ 29.897.644,50	$ 25.635.450,53	$ 25.768.922,16	85,69	86,19	0,5		
383	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	50 días	6/03/26	20/05/26	$ 30.831.284,00	$ 24.387.267,89	$ 7.916.140,49	77,66	25,68	-51,98		
391	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	85 días	20/01/26	22/05/26	$ 29.897.644,50	$ 23.354.685,04	$ 10.552.109,81	78,1	35,29	-42,81		
420	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	30 días	13/04/26	25/05/26	$ 32.710.125,00	$ 23.591.434,24	$ 0,00	72,09	0	-72,09		
444	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	40 días	25/03/26	22/05/26	$ 65.932.204,70	$ 49.120.714,85	$ 45.982.958,40	73,33	69,74	-3,59		
468	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	41 días	27/03/26	27/05/26	$ 22.366.984,20	$ 4.498.528,28	$ 3.141.430,37	20,11	14,04	-6,07		
481	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	29 días	23/04/26	3/06/26	$ 19.946.694,30	$ 676.863,93	$ 0,00	3,46	0	-3,46		
495	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	27 días	5/05/26	11/06/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		

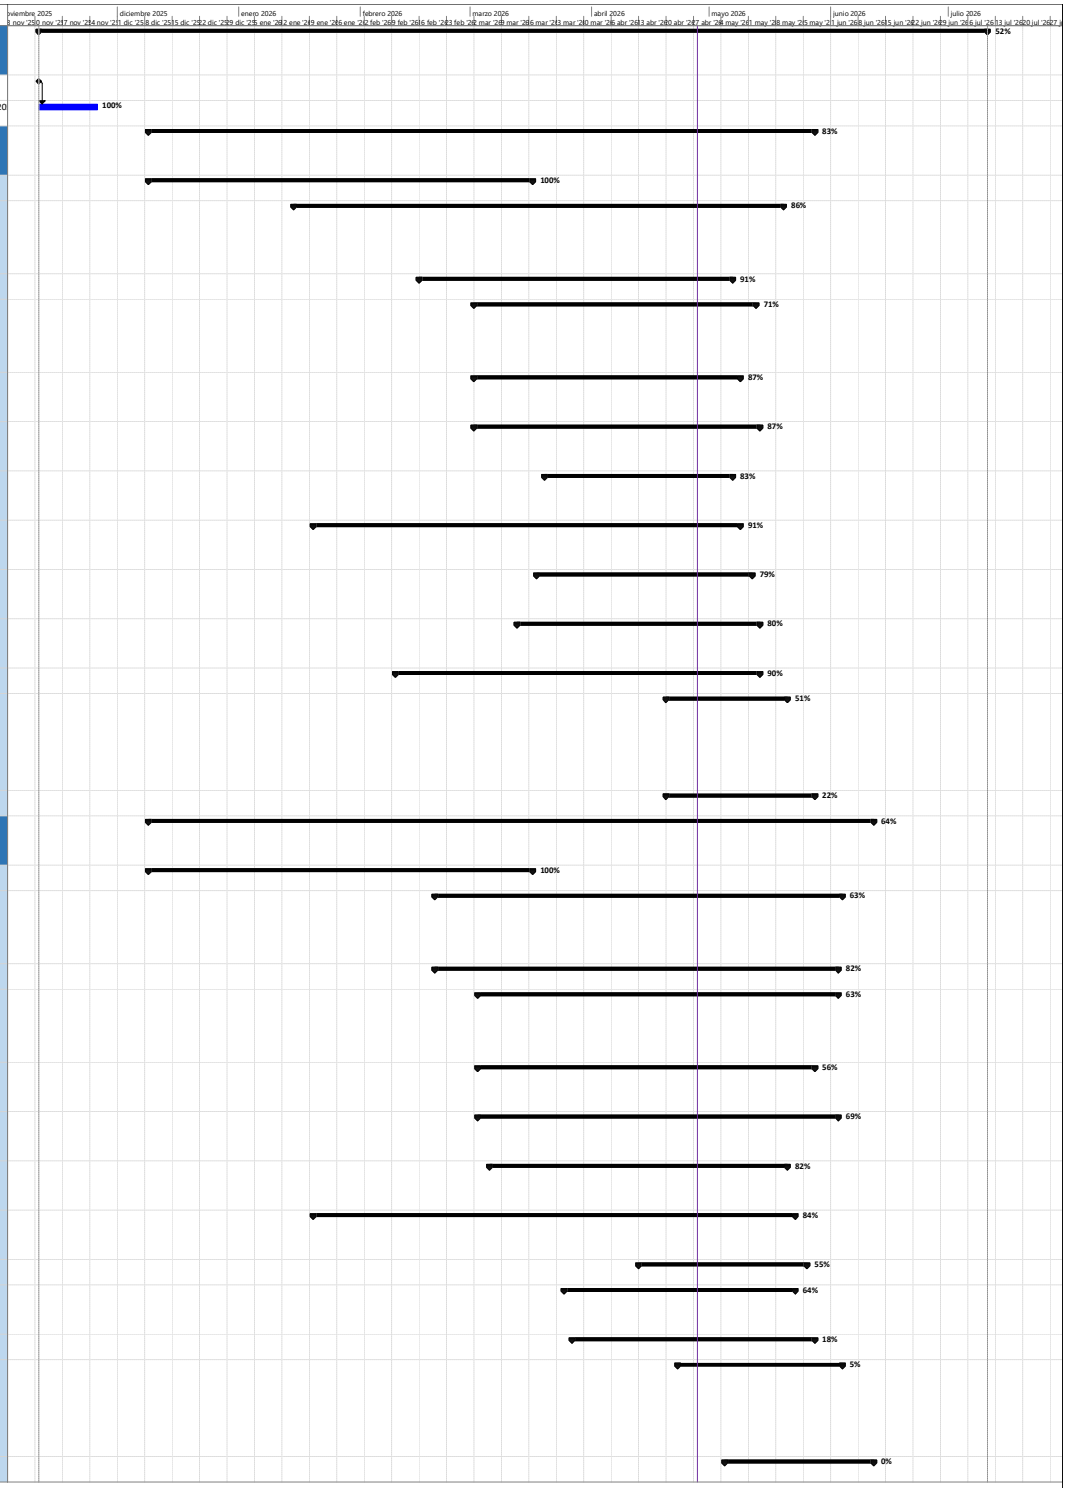

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
503	**VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO**	126 días	9/12/25	12/06/26	$ 659.896.472,70	$ 269.627.340,48	$ 259.707.694,40	40,57	39,36	-1,21		
504	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	70 días	9/12/25	19/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
513	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	55 días	18/03/26	9/06/26	$ 135.622.344,80	$ 48.584.821,96	$ 49.421.345,40	35,8	36,44	0,64		
574	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	63 días	24/02/26	27/05/26	$ 18.871.444,80	$ 15.275.252,96	$ 12.429.123,99	71,82	65,86	-5,96		
584	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	63 días	3/03/26	3/06/26	$ 215.710.179,00	$ 68.605.424,03	$ 86.870.803,28	31,8	40,27	8,47		
606	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	60 días	3/03/26	29/05/26	$ 18.871.444,80	$ 13.986.085,57	$ 9.109.101,24	74,04	48,27	-25,77		
620	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	64 días	3/03/26	4/06/26	$ 29.897.644,50	$ 19.673.942,18	$ 21.213.090,61	65,77	70,95	5,18		
633	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	37 días	13/04/26	3/06/26	$ 30.831.284,00	$ 9.777.127,90	$ 0,00	31,57	0	-31,57		
641	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	91 días	20/01/26	1/06/26	$ 29.897.644,50	$ 13.818.239,05	$ 10.552.109,81	46,26	35,29	-10,97		
670	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	30 días	22/04/26	3/06/26	$ 32.710.125,00	$ 9.600.162,09	$ 0,00	29,26	0	-29,26		
694	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	49 días	20/03/26	2/06/26	$ 65.932.204,70	$ 31.067.806,65	$ 27.732.211,60	47,04	42,06	-4,98		
718	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	24 días	30/04/26	3/06/26	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 3.141.430,37	0	14,04	14,04		
731	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	27 días	30/04/26	9/06/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
745	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	25 días	8/05/26	12/06/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
753	**VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA**	129 días	9/12/25	18/06/26	$ 659.896.472,70	$ 280.763.347,05	$ 200.652.127,72	42,37	30,41	-11,96		
754	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	70 días	9/12/25	19/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
763	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	63 días	16/03/26	18/06/26	$ 135.622.344,80	$ 38.914.608,04	$ 23.691.511,91	28,71	17,47	-11,24		
824	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	69 días	20/02/26	2/06/26	$ 18.871.444,80	$ 16.856.899,05	$ 16.919.226,37	89,1	89,66	0,56		
834	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	62 días	3/03/26	2/06/26	$ 215.710.179,00	$ 104.133.031,50	$ 64.540.485,55	47,95	29,92	-18,03		
856	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	66 días	3/03/26	9/06/26	$ 18.871.444,80	$ 6.959.378,96	$ 9.943.799,76	36,88	52,69	15,81		
870	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	65 días	3/03/26	5/06/26	$ 29.897.644,50	$ 24.545.836,70	$ 22.067.309,03	82,08	73,81	-8,27		
883	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	37 días	17/04/26	10/06/26	$ 30.831.284,00	$ 6.221.808,67	$ 0,00	20,32	0	-20,32		
891	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	95 días	20/01/26	5/06/26	$ 29.897.644,50	$ 13.756.824,65	$ 10.552.109,81	46,05	35,29	-10,76		
920	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	33 días	23/04/26	10/06/26	$ 32.710.125,00	$ 3.974.280,19	$ 0,00	12,15	0	-12,15		
944	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	56 días	18/03/26	10/06/26	$ 65.932.204,70	$ 26.162.201,18	$ 13.699.207,19	38,9	20,78	-18,12		
968	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	22 días	12/05/26	11/06/26	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
981	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	27 días	11/05/26	18/06/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
995	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	22 días	18/05/26	18/06/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1003	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE**	143 días	9/12/25	9/07/26	$ 659.896.472,70	$ 176.483.102,07	$ 157.611.361,43	26,72	23,88	-2,84		
1004	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	70 días	9/12/25	19/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		

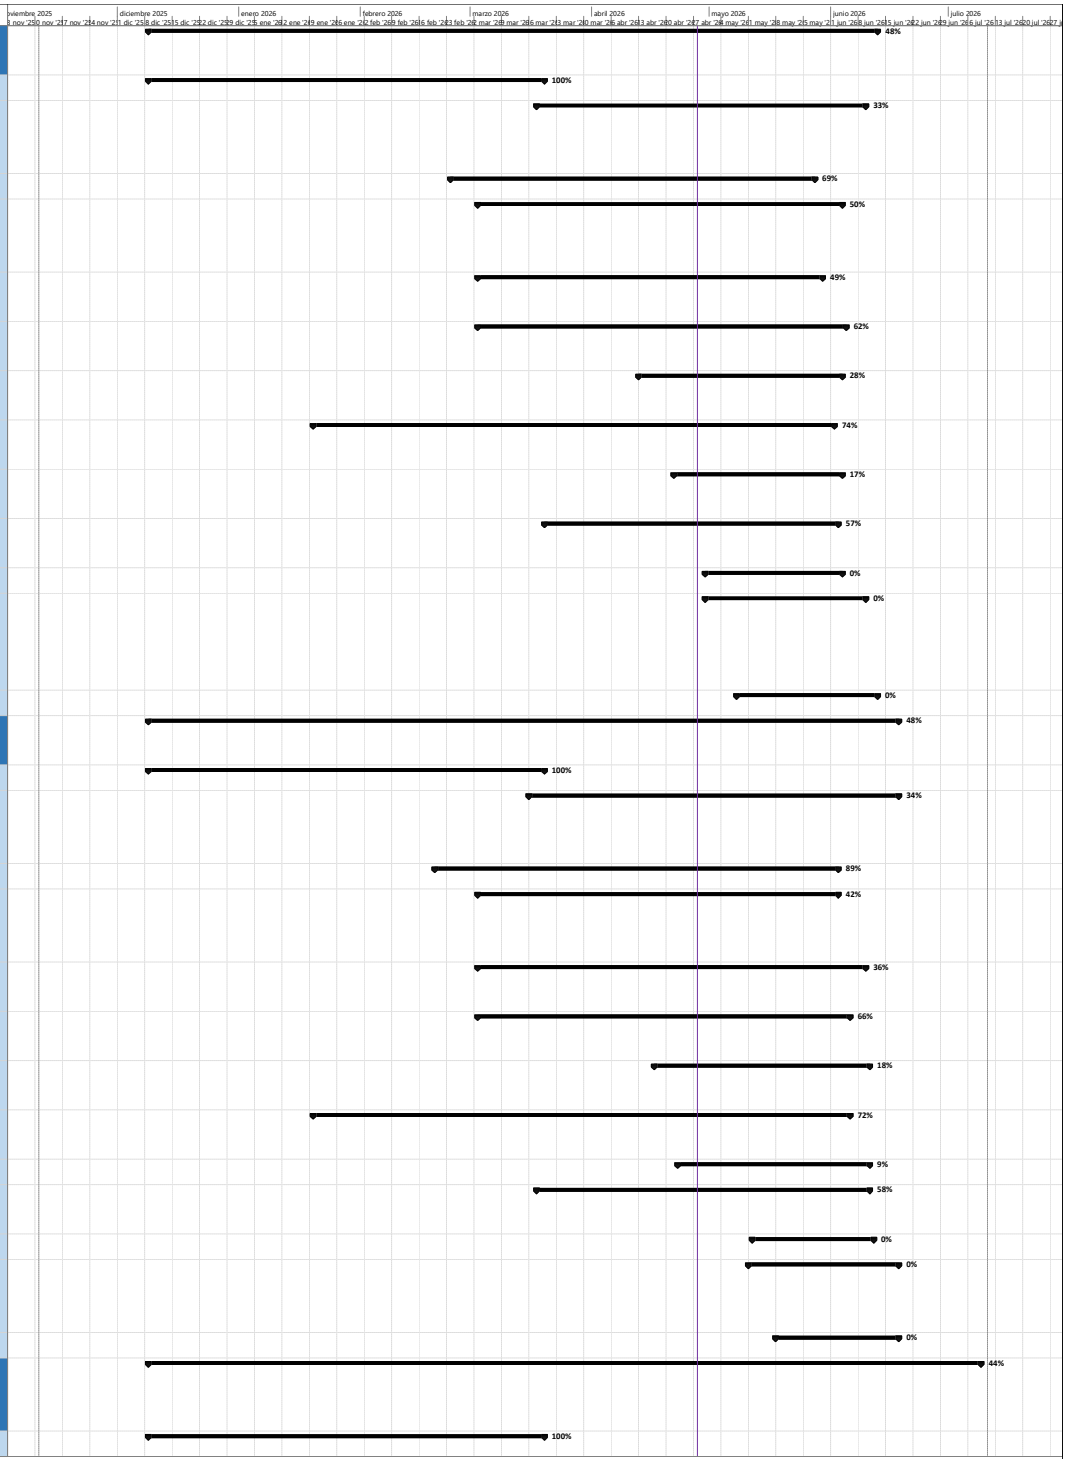

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
1013	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	106 días	2/02/26	8/07/26	$ 135.622.344,80	$ 34.363.025,94	$ 46.166.993,76	25,28	34,04	8,76		
1074	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	94 días	16/01/26	2/06/26	$ 18.871.444,80	$ 15.455.062,55	$ 13.763.139,92	81,9	72,93	-8,97		
1084	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	86 días	24/02/26	2/07/26	$ 215.710.179,00	$ 32.787.947,20	$ 23.469.267,47	15,2	10,88	-4,32		
1106	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	85 días	24/02/26	1/07/26	$ 18.871.444,80	$ 4.948.805,45	$ 2.634.744,02	26,22	13,96	-12,26		
1120	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	89 días	24/02/26	7/07/26	$ 29.897.644,50	$ 19.209.081,83	$ 16.030.832,23	64,45	53,62	-10,83		
1133	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	41 días	30/04/26	1/07/26	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1141	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	96 días	5/02/26	26/06/26	$ 29.897.644,50	$ 12.691.843,19	$ 7.972.705,19	42,45	26,67	-15,78		
1170	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	43 días	28/04/26	1/07/26	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1194	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	76 días	11/03/26	3/07/26	$ 65.932.204,70	$ 17.788.857,79	$ 8.335.200,74	26,78	12,64	-14,14		
1218	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	30 días	15/05/26	30/06/26	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1231	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	29 días	26/05/26	8/07/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1245	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	23 días	4/06/26	9/07/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1253	VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	143,73 días	9/12/25	9/07/26	$ 659.896.472,70	$ 160.498.461,96	$ 210.898.212,68	24,34	31,96	7,62		
1254	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	67 días	9/12/25	17/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
1263	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	86,73 días	3/03/26	9/07/26	$ 135.622.344,80	$ 12.074.910,81	$ 29.937.797,96	8,89	22,07	13,18		
1324	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	87 días	29/01/26	4/06/26	$ 18.871.444,80	$ 12.276.897,43	$ 13.632.992,02	65,06	72,24	7,18		
1334	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	89 días	24/02/26	7/07/26	$ 215.710.179,00	$ 42.276.540,18	$ 69.027.257,27	19,68	32	12,32		
1356	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	85 días	24/02/26	1/07/26	$ 18.871.444,80	$ 5.632.400,45	$ 7.875.199,08	29,85	41,73	11,88		
1370	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	89 días	24/02/26	7/07/26	$ 29.897.644,50	$ 18.152.141,29	$ 21.213.090,61	60,67	70,95	10,28		
1383	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	45 días	4/05/26	8/07/26	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1391	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	112 días	20/01/26	3/07/26	$ 29.897.644,50	$ 13.058.235,90	$ 10.552.109,81	43,68	35,29	-8,39		
1420	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	36 días	13/05/26	6/07/26	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1444	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	76 días	11/03/26	3/07/26	$ 65.932.204,70	$ 17.788.857,79	$ 19.421.287,83	26,98	29,46	2,48		
1468	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	24 días	29/05/26	6/07/26	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1481	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	35 días	19/05/26	9/07/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1495	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	24 días	3/06/26	9/07/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
1503	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ)	143,73 días	9/12/25	9/07/26	$ 659.896.472,70	$ 228.291.509,02	$ 206.863.646,66	34,34	31,35	-2,99		
1504	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	70 días	9/12/25	19/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
1513	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	121,73 días	13/01/26	9/07/26	$ 135.622.344,80	$ 22.962.491,64	$ 30.308.861,41	16,94	22,35	5,41		
1574	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	91 días	29/01/26	11/06/26	$ 18.871.444,80	$ 14.759.954,48	$ 13.763.139,92	78,28	72,93	-5,35		
1584	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	90 días	24/02/26	8/07/26	$ 215.710.179,00	$ 91.115.979,60	$ 76.620.255,57	42,24	35,52	-6,72		

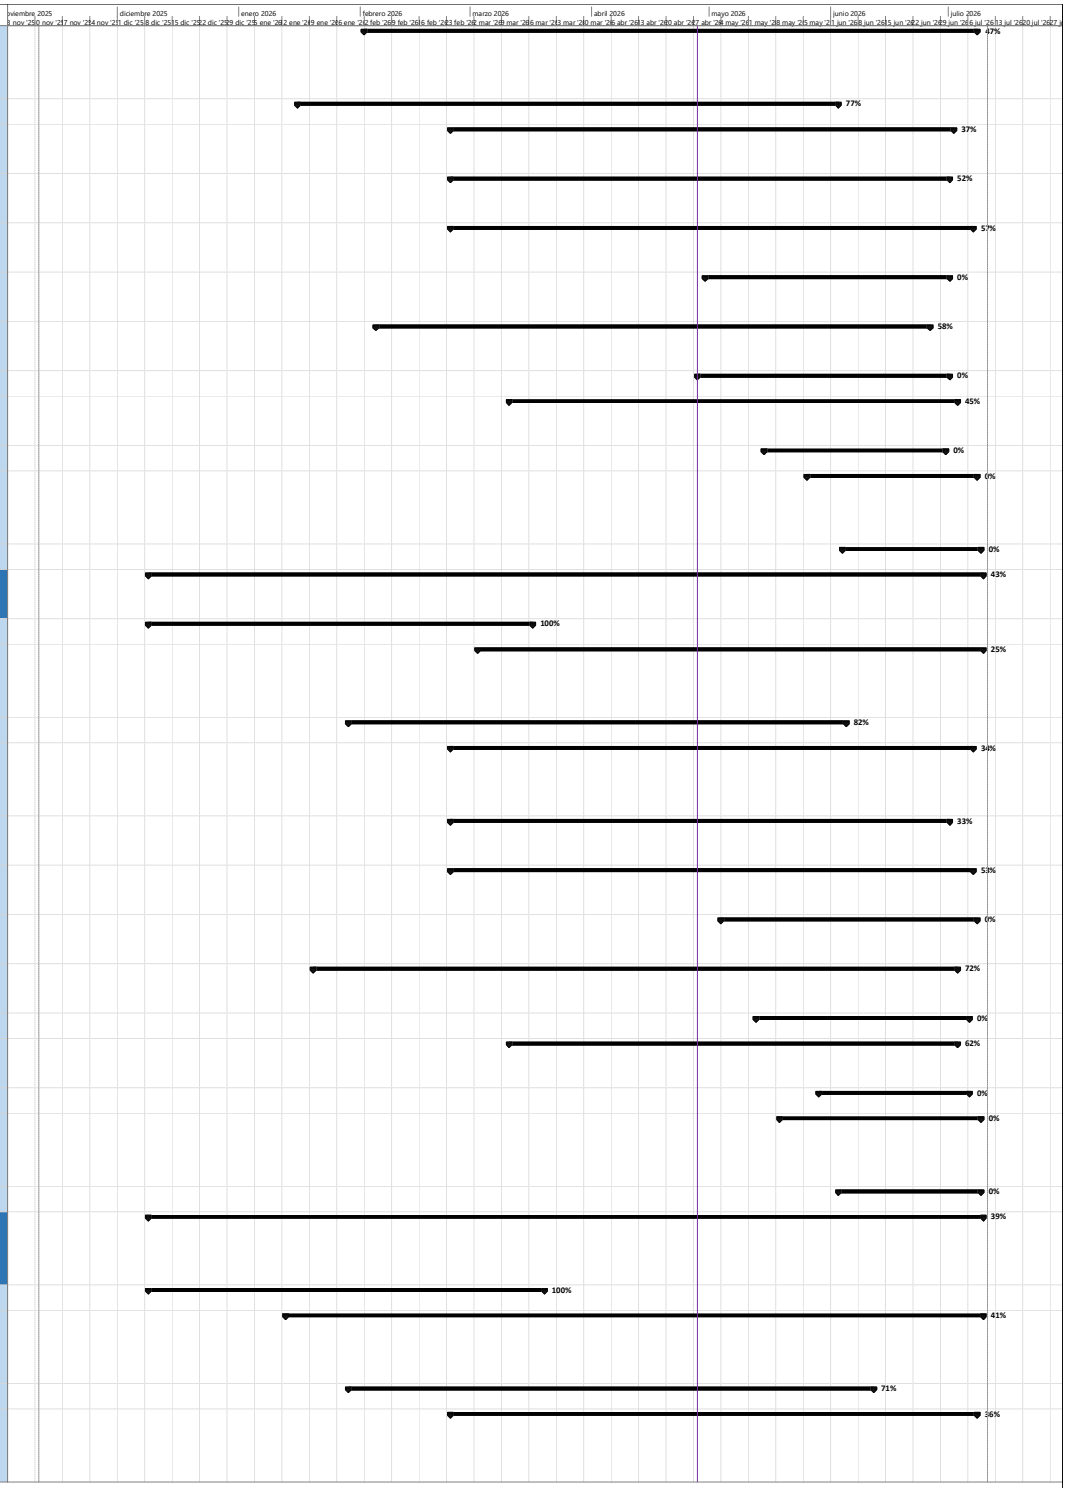

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
1606	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**87 días**	**24/02/26**	**3/07/26**	**$ 18.871.444,80**	**$ 10.034.527,86**	**$ 7.875.199,08**	**53,17**	**41,73**	**-11,44**		
1620	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**90 días**	**24/02/26**	**8/07/26**	**$ 29.897.644,50**	**$ 20.596.155,09**	**$ 21.782.569,56**	**69,05**	**72,86**	**3,81**		
1633	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**45 días**	**4/05/26**	**8/07/26**	**$ 30.831.284,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**		
1641	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**70 días**	**19/03/26**	**3/07/26**	**$ 29.897.644,50**	**$ 11.885.779,25**	**$ 5.862.283,23**	**33,48**	**19,61**	**-13,87**		
1670	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**36 días**	**13/05/26**	**6/07/26**	**$ 32.710.125,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**		
1694	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**76 días**	**11/03/26**	**3/07/26**	**$ 65.932.204,70**	**$ 17.698.143,01**	**$ 11.412.859,80**	**26,98**	**17,31**	**-9,67**		
1718	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**24 días**	**29/05/26**	**6/07/26**	**$ 22.366.984,20**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**		
1731	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**34 días**	**20/05/26**	**9/07/26**	**$ 19.946.694,30**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**		
1745	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**23 días**	**4/06/26**	**9/07/26**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**		
1753	ENTREGA PRODUCTOS CONSULTORÍA	7 días	2/07/26	10/07/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	1748;1498;1241	

