Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0	**0**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2**	**162,73 días**	**11/11/25**	**10/07/26**	**$ 4.619.275.308,90**
1	1	ACTA DE INICIO	0 días	11/11/25	11/11/25	$ 0,00
2	2	PLANEACION PROYECTO Y PLAN DE CAMPO	10 días	11/11/25	25/11/25	$ 0,00
3	**3**	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA**	**115 días**	**9/12/25**	**27/05/26**	**$ 659.896.472,70**
4	**3.1**	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**67 días**	**9/12/25**	**17/03/26**	**$ 39.238.478,10**
13	**3.2**	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**85 días**	**15/01/26**	**19/05/26**	**$ 135.622.344,80**
74	**3.3**	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	**54 días**	**16/02/26**	**6/05/26**	**$ 18.871.444,80**
84	**3.4**	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**48 días**	**2/03/26**	**12/05/26**	**$ 215.710.179,00**
106	**3.5**	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**46 días**	**2/03/26**	**8/05/26**	**$ 18.871.444,80**
120	**3.6**	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**49 días**	**2/03/26**	**13/05/26**	**$ 29.897.644,50**
133	**3.7**	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**30 días**	**20/03/26**	**6/05/26**	**$ 30.831.284,00**
141	**3.8**	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**75 días**	**20/01/26**	**8/05/26**	**$ 29.897.644,50**
170	**3.9**	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**35 días**	**18/03/26**	**11/05/26**	**$ 32.710.125,00**
194	**3.10**	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**40 días**	**13/03/26**	**13/05/26**	**$ 65.932.204,70**
218	**3.11**	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**63 días**	**10/02/26**	**13/05/26**	**$ 22.366.984,20**
231	**3.12**	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**22 días**	**20/04/26**	**20/05/26**	**$ 19.946.694,30**
245	**3.13**	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**27 días**	**20/04/26**	**27/05/26**	**$ 0,00**
253	**4**	**VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN**	**125 días**	**9/12/25**	**11/06/26**	**$ 659.896.472,70**
254	**4.1**	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**67 días**	**9/12/25**	**17/03/26**	**$ 39.238.478,10**

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
263	**4.2**	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**70 días**	**20/02/26**	**3/06/26**	**$ 135.622.344,80**
324	**4.3**	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	**69 días**	**20/02/26**	**2/06/26**	**$ 18.871.444,80**
334	**4.4**	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**62 días**	**3/03/26**	**2/06/26**	**$ 215.710.179,00**
356	**4.5**	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**58 días**	**3/03/26**	**27/05/26**	**$ 18.871.444,80**
370	**4.6**	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**62 días**	**3/03/26**	**2/06/26**	**$ 29.897.644,50**
383	**4.7**	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**50 días**	**6/03/26**	**20/05/26**	**$ 30.831.284,00**
391	**4.8**	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**85 días**	**20/01/26**	**22/05/26**	**$ 29.897.644,50**
420	**4.9**	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**30 días**	**13/04/26**	**25/05/26**	**$ 32.710.125,00**
444	**4.10**	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**40 días**	**25/03/26**	**22/05/26**	**$ 65.932.204,70**
468	**4.11**	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**41 días**	**27/03/26**	**27/05/26**	**$ 22.366.984,20**
481	**4.12**	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**29 días**	**23/04/26**	**3/06/26**	**$ 19.946.694,30**
495	**4.13**	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**27 días**	**5/05/26**	**11/06/26**	**$ 0,00**
503	**5**	**VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO**	**126 días**	**9/12/25**	**12/06/26**	**$ 659.896.472,70**
504	**5.1**	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**70 días**	**9/12/25**	**19/03/26**	**$ 39.238.478,10**
513	**5.2**	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**55 días**	**18/03/26**	**9/06/26**	**$ 135.622.344,80**
574	**5.3**	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	**63 días**	**24/02/26**	**27/05/26**	**$ 18.871.444,80**
584	**5.4**	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**63 días**	**3/03/26**	**3/06/26**	**$ 215.710.179,00**

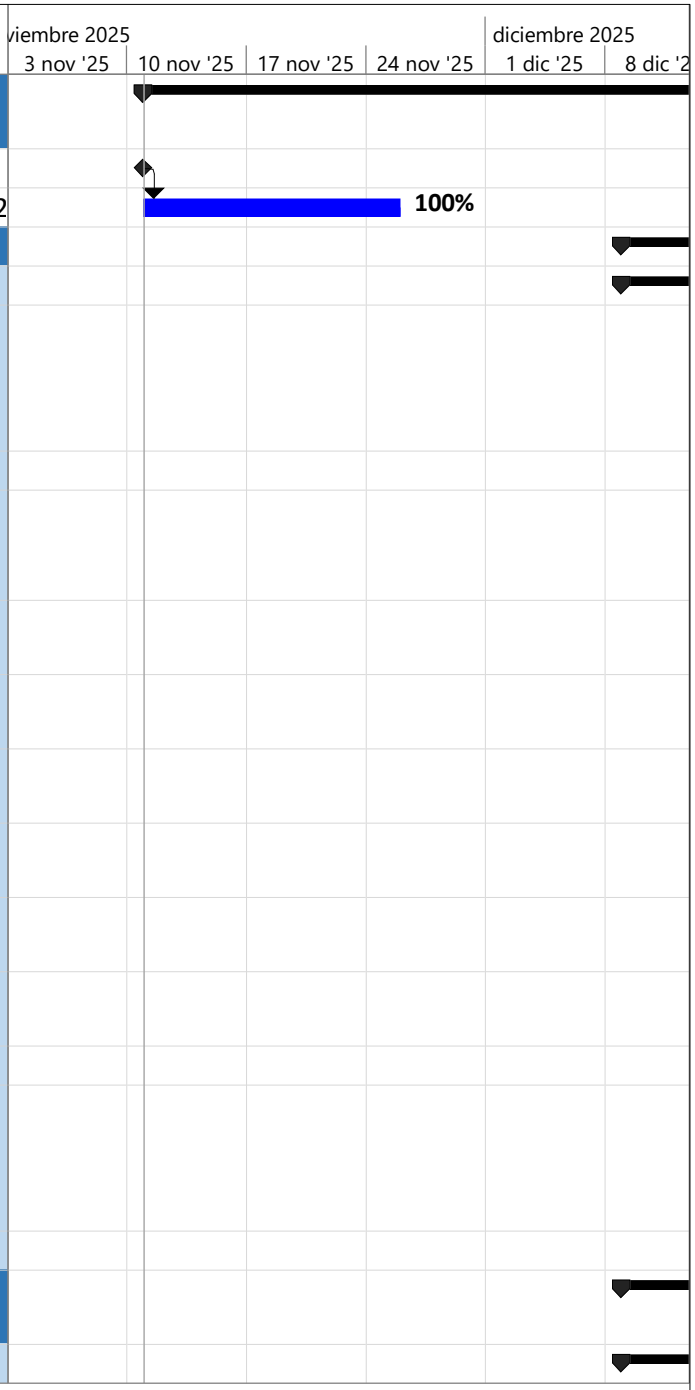
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
606	5.5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	60 días	3/03/26	29/05/26	$ 18.871.444,80
620	5.6	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	64 días	3/03/26	4/06/26	$ 29.897.644,50
633	5.7	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	37 días	13/04/26	3/06/26	$ 30.831.284,00
641	5.8	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	91 días	20/01/26	1/06/26	$ 29.897.644,50
670	5.9	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	30 días	22/04/26	3/06/26	$ 32.710.125,00
694	5.10	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	49 días	20/03/26	2/06/26	$ 65.932.204,70
718	5.11	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	24 días	30/04/26	3/06/26	$ 22.366.984,20
731	5.12	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	27 días	30/04/26	9/06/26	$ 19.946.694,30
745	5.13	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	25 días	8/05/26	12/06/26	$ 0,00
753	6	VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA	129 días	9/12/25	18/06/26	$ 659.896.472,70
754	6.1	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	70 días	9/12/25	19/03/26	$ 39.238.478,10
763	6.2	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	63 días	16/03/26	18/06/26	$ 135.622.344,80
824	6.3	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	69 días	20/02/26	2/06/26	$ 18.871.444,80
834	6.4	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	62 días	3/03/26	2/06/26	$ 215.710.179,00
856	6.5	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	66 días	3/03/26	9/06/26	$ 18.871.444,80
870	6.6	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	65 días	3/03/26	5/06/26	$ 29.897.644,50
883	6.7	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	37 días	17/04/26	10/06/26	$ 30.831.284,00
891	6.8	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	95 días	20/01/26	5/06/26	$ 29.897.644,50

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
920	**6.9**	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**33 días**	**23/04/26**	**10/06/26**	**$ 32.710.125,00**
944	**6.10**	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**56 días**	**18/03/26**	**10/06/26**	**$ 65.932.204,70**
968	**6.11**	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**22 días**	**12/05/26**	**11/06/26**	**$ 22.366.984,20**
981	**6.12**	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**27 días**	**11/05/26**	**18/06/26**	**$ 19.946.694,30**
995	**6.13**	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**22 días**	**18/05/26**	**18/06/26**	**$ 0,00**
1003	**7**	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE**	**143 días**	**9/12/25**	**9/07/26**	**$ 659.896.472,70**
1004	**7.1**	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**70 días**	**9/12/25**	**19/03/26**	**$ 39.238.478,10**
1013	**7.2**	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**106 días**	**2/02/26**	**8/07/26**	**$ 135.622.344,80**
1074	**7.3**	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	**94 días**	**16/01/26**	**2/06/26**	**$ 18.871.444,80**
1084	**7.4**	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**86 días**	**24/02/26**	**2/07/26**	**$ 215.710.179,00**
1106	**7.5**	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**85 días**	**24/02/26**	**1/07/26**	**$ 18.871.444,80**
1120	**7.6**	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**89 días**	**24/02/26**	**7/07/26**	**$ 29.897.644,50**
1133	**7.7**	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**41 días**	**30/04/26**	**1/07/26**	**$ 30.831.284,00**
1141	**7.8**	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**96 días**	**5/02/26**	**26/06/26**	**$ 29.897.644,50**
1170	**7.9**	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**43 días**	**28/04/26**	**1/07/26**	**$ 32.710.125,00**
1194	**7.10**	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**76 días**	**11/03/26**	**3/07/26**	**$ 65.932.204,70**
1218	**7.11**	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**30 días**	**15/05/26**	**30/06/26**	**$ 22.366.984,20**

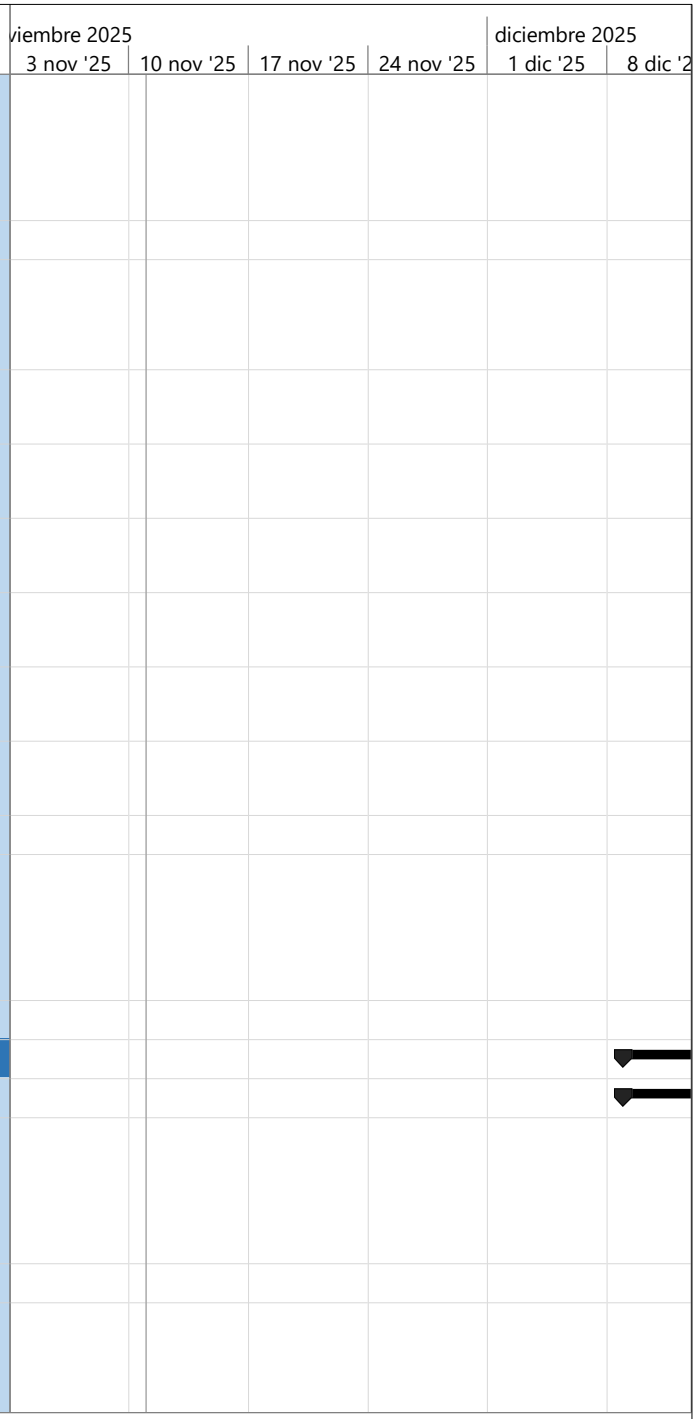
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1231	**7.12**	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**29 días**	**26/05/26**	**8/07/26**	**$ 19.946.694,30**
1245	**7.13**	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**23 días**	**4/06/26**	**9/07/26**	**$ 0,00**
1253	**8**	**VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO**	**143,73 días**	**9/12/25**	**9/07/26**	**$ 659.896.472,70**
1254	**8.1**	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**67 días**	**9/12/25**	**17/03/26**	**$ 39.238.478,10**
1263	**8.2**	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**86,73 días**	**3/03/26**	**9/07/26**	**$ 135.622.344,80**
1324	**8.3**	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	**87 días**	**29/01/26**	**4/06/26**	**$ 18.871.444,80**
1334	**8.4**	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**89 días**	**24/02/26**	**7/07/26**	**$ 215.710.179,00**
1356	**8.5**	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**85 días**	**24/02/26**	**1/07/26**	**$ 18.871.444,80**
1370	**8.6**	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**89 días**	**24/02/26**	**7/07/26**	**$ 29.897.644,50**
1383	**8.7**	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**45 días**	**4/05/26**	**8/07/26**	**$ 30.831.284,00**
1391	**8.8**	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**112 días**	**20/01/26**	**3/07/26**	**$ 29.897.644,50**
1420	**8.9**	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**36 días**	**13/05/26**	**6/07/26**	**$ 32.710.125,00**
1444	**8.10**	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**76 días**	**11/03/26**	**3/07/26**	**$ 65.932.204,70**
1468	**8.11**	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**24 días**	**29/05/26**	**6/07/26**	**$ 22.366.984,20**
1481	**8.12**	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**35 días**	**19/05/26**	**9/07/26**	**$ 19.946.694,30**
1495	**8.13**	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**24 días**	**3/06/26**	**9/07/26**	**$ 0,00**
1503	**9**	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ)**	**143,73 días**	**9/12/25**	**9/07/26**	**$ 659.896.472,70**

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1504	**9.1**	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**70 días**	**9/12/25**	**19/03/26**	**$ 39.238.478,10**
1513	**9.2**	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**121,73 días**	**13/01/26**	**9/07/26**	**$ 135.622.344,80**
1574	**9.3**	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	**91 días**	**29/01/26**	**11/06/26**	**$ 18.871.444,80**
1584	**9.4**	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**90 días**	**24/02/26**	**8/07/26**	**$ 215.710.179,00**
1606	**9.5**	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**87 días**	**24/02/26**	**3/07/26**	**$ 18.871.444,80**
1620	**9.6**	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**90 días**	**24/02/26**	**8/07/26**	**$ 29.897.644,50**
1633	**9.7**	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**45 días**	**4/05/26**	**8/07/26**	**$ 30.831.284,00**
1641	**9.8**	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**70 días**	**19/03/26**	**3/07/26**	**$ 29.897.644,50**
1670	**9.9**	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**36 días**	**13/05/26**	**6/07/26**	**$ 32.710.125,00**
1694	**9.10**	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**76 días**	**11/03/26**	**3/07/26**	**$ 65.932.204,70**
1718	**9.11**	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**24 días**	**29/05/26**	**6/07/26**	**$ 22.366.984,20**
1731	**9.12**	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**34 días**	**20/05/26**	**9/07/26**	**$ 19.946.694,30**
1745	**9.13**	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**23 días**	**4/06/26**	**9/07/26**	**$ 0,00**
1753	10	ENTREGA PRODUCTOS CONSULTORÍA	7 días	2/07/26	10/07/26	$ 0,00

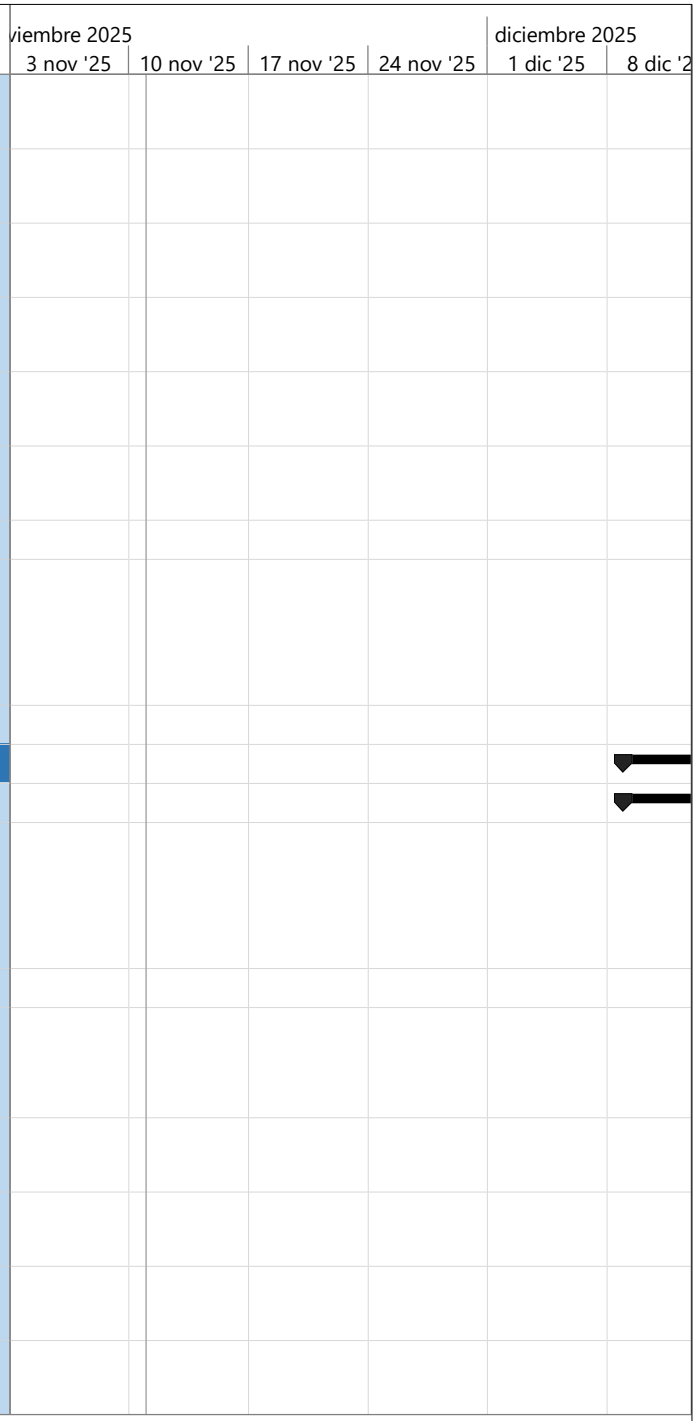
CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTAD	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
$ 4.590.961.131,86	**$ 3.965.693.040,24**	**98,86**	**85,85**	**-13,01**		
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		2
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	1	15;6;143;205;2
$ 659.896.472,70	**$ 656.787.686,59**	**98,04**	**99,53**	**1,49**		
$ 39.238.478,10	**$ 39.238.478,10**	**100**	**100**	**0**		
$ 135.622.344,80	**$ 134.398.064,58**	**100**	**99,1**	**-0,9**		
$ 18.871.444,80	**$ 18.871.444,80**	**100**	**100**	**0**		
$ 215.710.179,00	**$ 215.278.758,64**	**94**	**99,8**	**5,8**		
$ 18.871.444,80	**$ 18.817.007,94**	**100**	**99,71**	**-0,29**		
$ 29.897.644,50	**$ 29.879.848,28**	**100**	**99,94**	**-0,06**		
$ 30.831.284,00	**$ 30.581.300,62**	**100**	**99,19**	**-0,81**		
$ 29.897.644,50	**$ 29.897.644,50**	**100**	**100**	**0**		
$ 32.710.125,00	**$ 32.710.125,00**	**100**	**100**	**0**		
$ 65.932.204,70	**$ 65.889.862,92**	**100**	**99,94**	**-0,06**		
$ 22.366.984,20	**$ 22.266.458,43**	**100**	**99,55**	**-0,45**		
$ 19.946.694,30	**$ 18.958.692,78**	**100**	**95,05**	**-4,95**		
$ 0,00	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**		
$ 659.896.472,70	**$ 655.592.275,13**	**99,56**	**99,35**	**-0,21**		
$ 39.238.478,10	**$ 39.238.478,10**	**100**	**100**	**0**		



CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTAD	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
$ 135.622.344,80	$ 133.714.749,96	97,87	98,59	0,72		
$ 18.871.444,80	$ 18.871.444,80	100	100	0		
$ 215.710.179,00	$ 215.278.758,64	100	99,8	-0,2		
$ 18.871.444,80	$ 18.762.571,08	100	99,42	-0,58		
$ 29.897.644,50	$ 29.719.682,33	100	99,4	-0,6		
$ 30.831.284,00	$ 30.664.628,41	100	99,46	-0,54		
$ 29.897.644,50	$ 29.862.470,80	100	99,88	-0,12		
$ 32.710.125,00	$ 32.383.023,75	100	99	-1		
$ 65.932.204,70	$ 65.889.862,92	100	99,94	-0,06		
$ 22.366.984,20	$ 21.864.355,34	100	97,75	-2,25		
$ 19.946.694,30	$ 19.342.249,00	100	96,97	-3,03		
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
$ 659.896.472,70	$ 576.960.429,95	99,57	87,43	-12,14		
$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
$ 135.622.344,80	$ 120.683.493,12	99,15	88,98	-10,17		
$ 18.871.444,80	$ 16.366.097,82	100	86,72	-13,28		
$ 215.710.179,00	$ 196.209.978,82	100	90,96	-9,04		



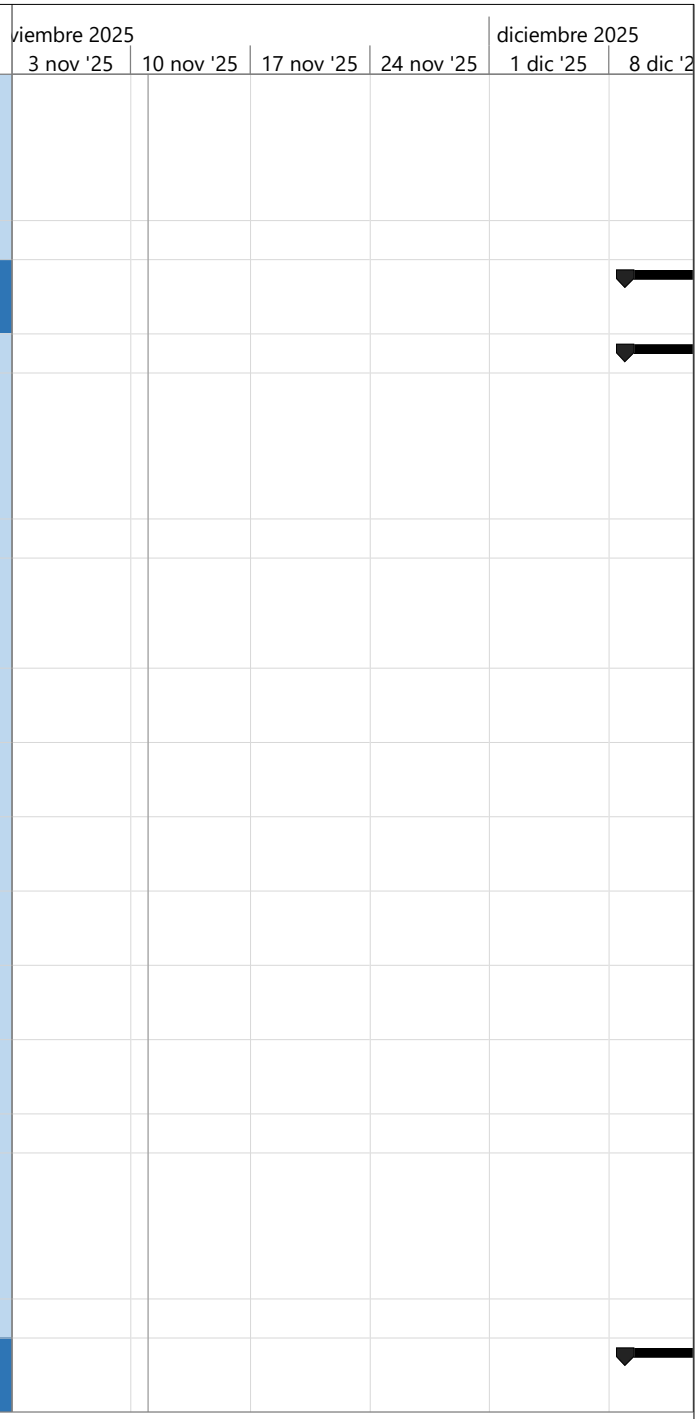
CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTAD	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
$ 18.871.444,80	$ 13.119.283,26	91,15	69,52	-21,63		
$ 29.897.644,50	$ 29.007.833,65	100	97,02	-2,98		
$ 30.831.284,00	$ 27.581.500,01	100	89,46	-10,54		
$ 29.897.644,50	$ 18.173.078,02	100	60,78	-39,22		
$ 32.710.125,00	$ 14.621.425,89	100	44,7	-55,3		
$ 65.932.204,70	$ 65.847.521,13	100	99,87	-0,13		
$ 22.366.984,20	$ 20.637.940,92	100	92,27	-7,73		
$ 19.946.694,30	$ 15.473.799,20	100	77,58	-22,42		
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
$ 659.896.472,70	$ 591.726.588,92	100	89,67	-10,33		
$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
$ 135.622.344,80	$ 120.725.116,35	100	89,02	-10,98		
$ 18.871.444,80	$ 18.741.296,91	100	99,31	-0,69		
$ 215.710.179,00	$ 190.515.230,09	100	88,32	-11,68		
$ 18.871.444,80	$ 16.077.019,32	100	85,19	-14,81		
$ 29.897.644,50	$ 28.118.022,80	100	94,05	-5,95		
$ 30.831.284,00	$ 27.581.500,01	100	89,46	-10,54		
$ 29.897.644,50	$ 29.721.776,00	100	99,41	-0,59		



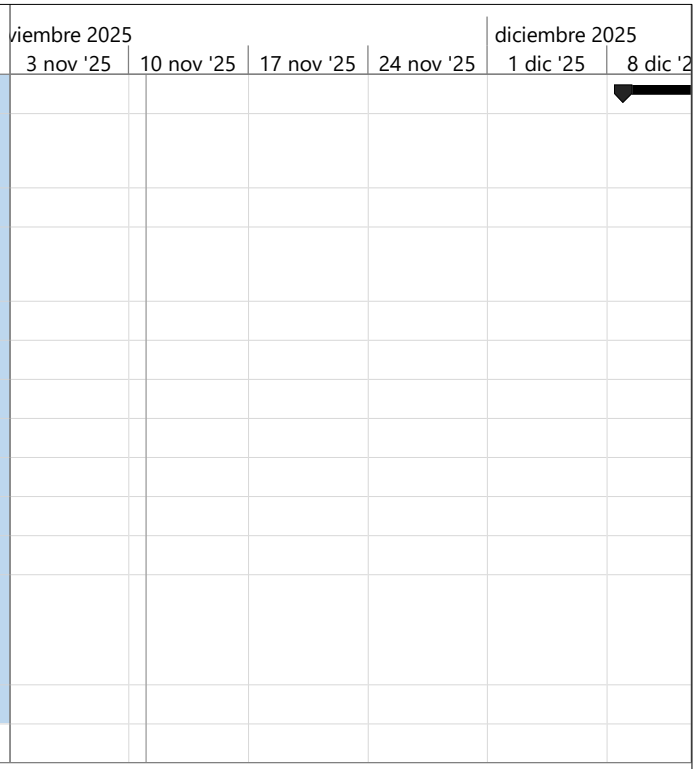
CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTAD	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
$ 32.710.125,00	$ 18.546.640,89	100	56,7	-43,3		
$ 65.932.204,70	$ 65.889.862,92	100	99,94	-0,06		
$ 22.366.984,20	$ 21.097.846,33	100	94,33	-5,67		
$ 19.946.694,30	$ 15.473.799,20	100	77,58	-22,42		
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
$ 656.369.402,69	$ 465.053.562,19	98,97	70,47	-28,5		
$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
$ 133.658.708,44	$ 111.635.986,40	98,55	82,31	-16,24		
$ 18.871.444,80	$ 16.919.226,37	100	89,66	-10,34		
$ 215.710.179,00	$ 102.850.613,34	100	47,68	-52,32		
$ 18.871.444,80	$ 8.601.023,88	100	45,58	-54,42		
$ 28.886.495,81	$ 27.370.581,69	96,61	91,55	-5,06		
$ 30.831.284,00	$ 25.998.271,92	100	84,32	-15,68		
$ 29.897.644,50	$ 27.787.222,54	100	92,94	-7,06		
$ 32.710.125,00	$ 13.149.470,27	100	40,2	-59,8		
$ 65.874.465,91	$ 63.463.848,15	94,92	96,26	1,34		
$ 22.366.984,20	$ 14.199.265,24	100	63,48	-36,52		

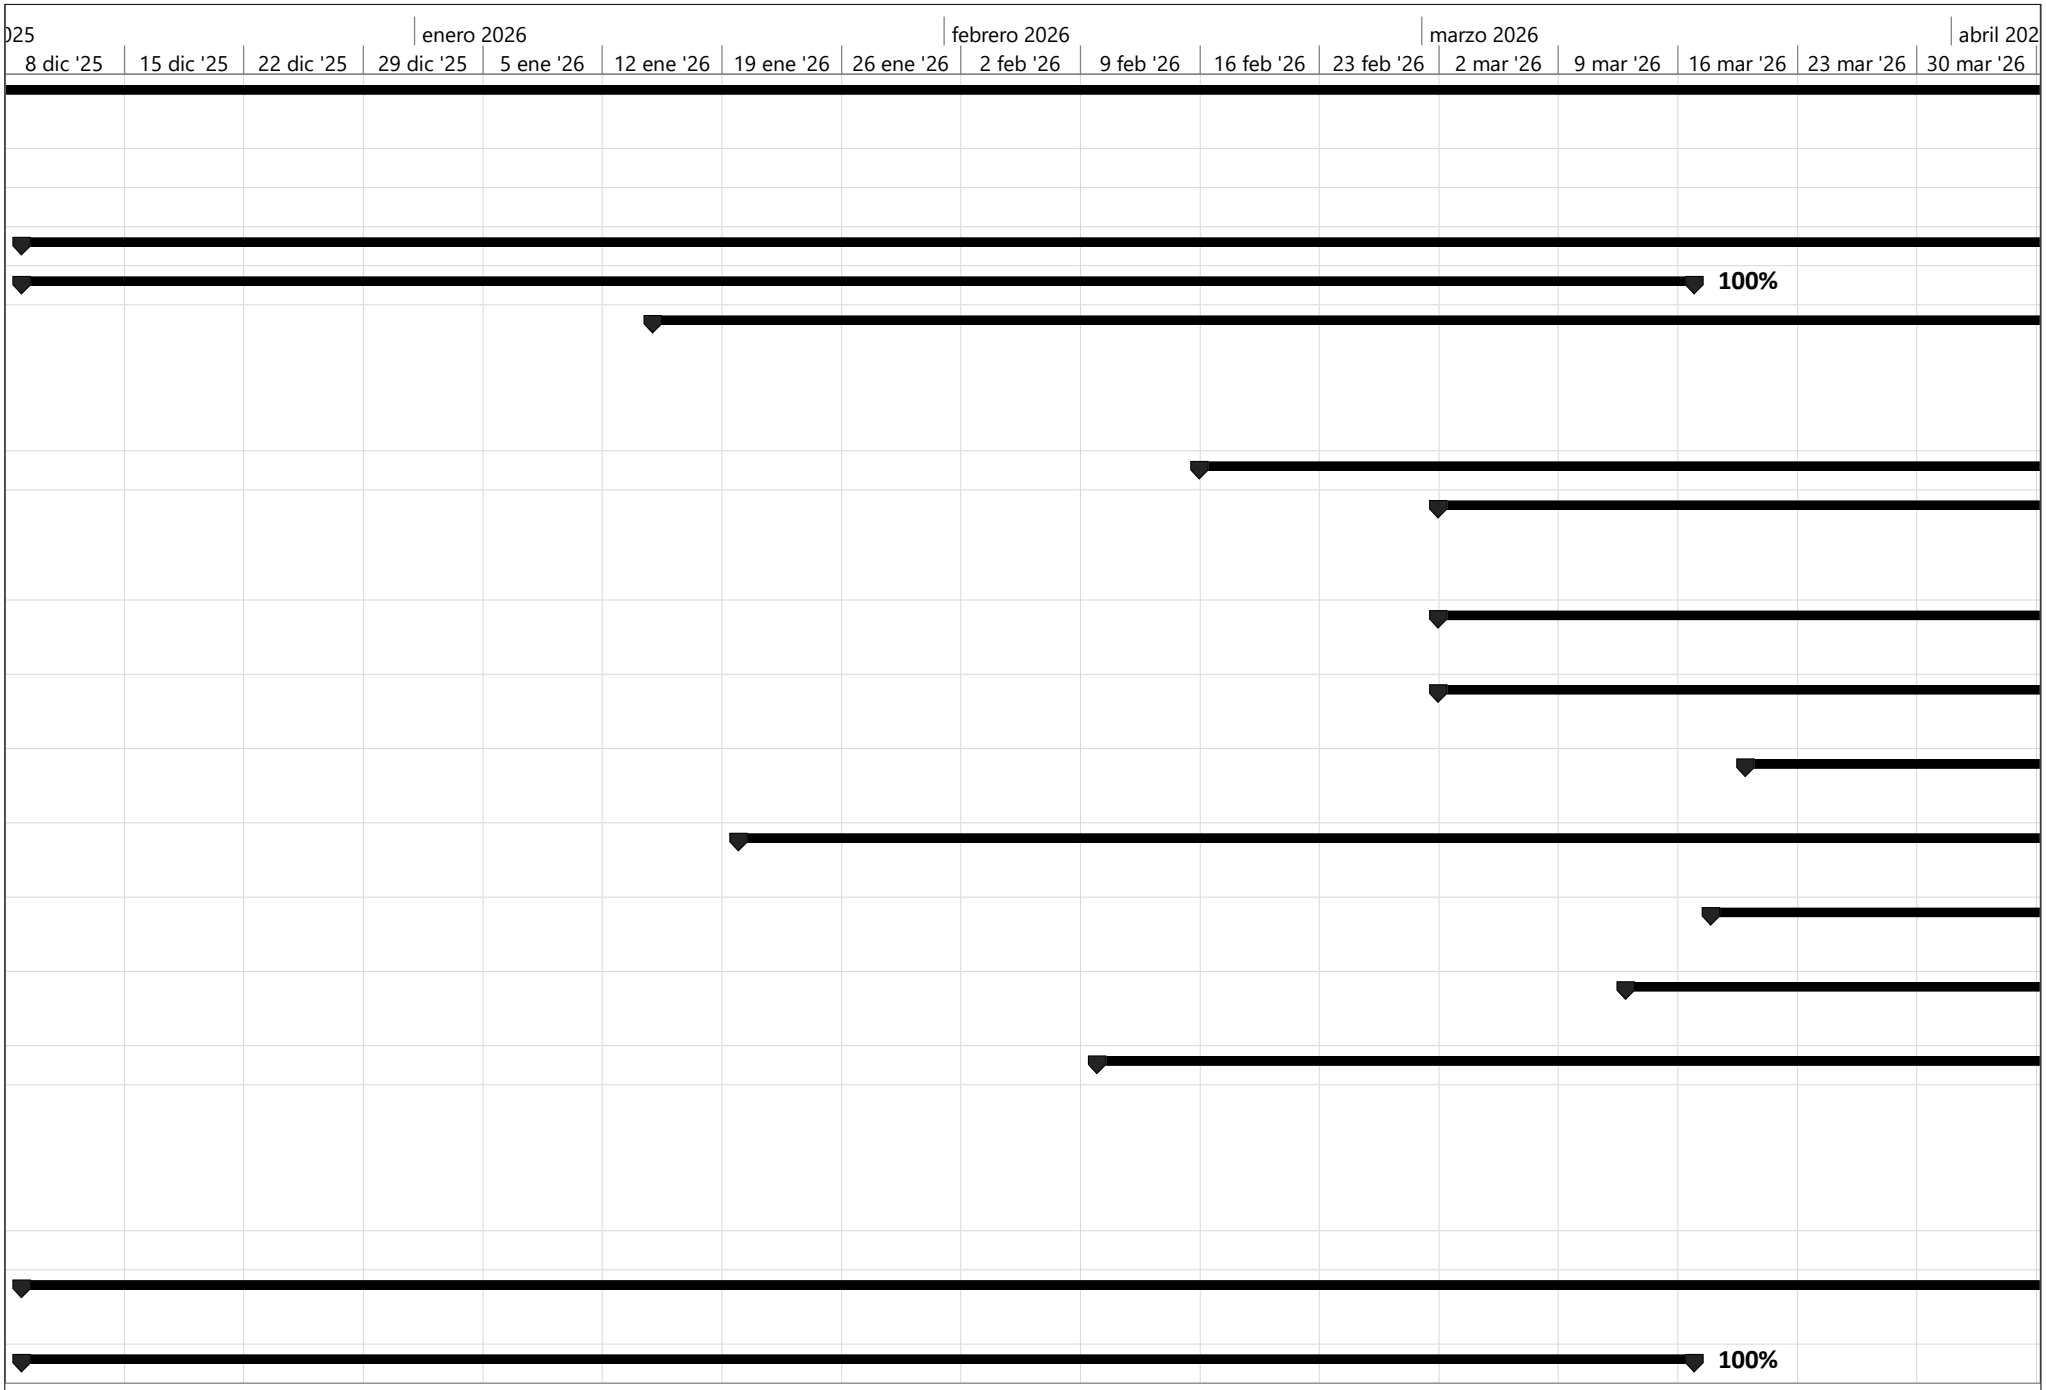


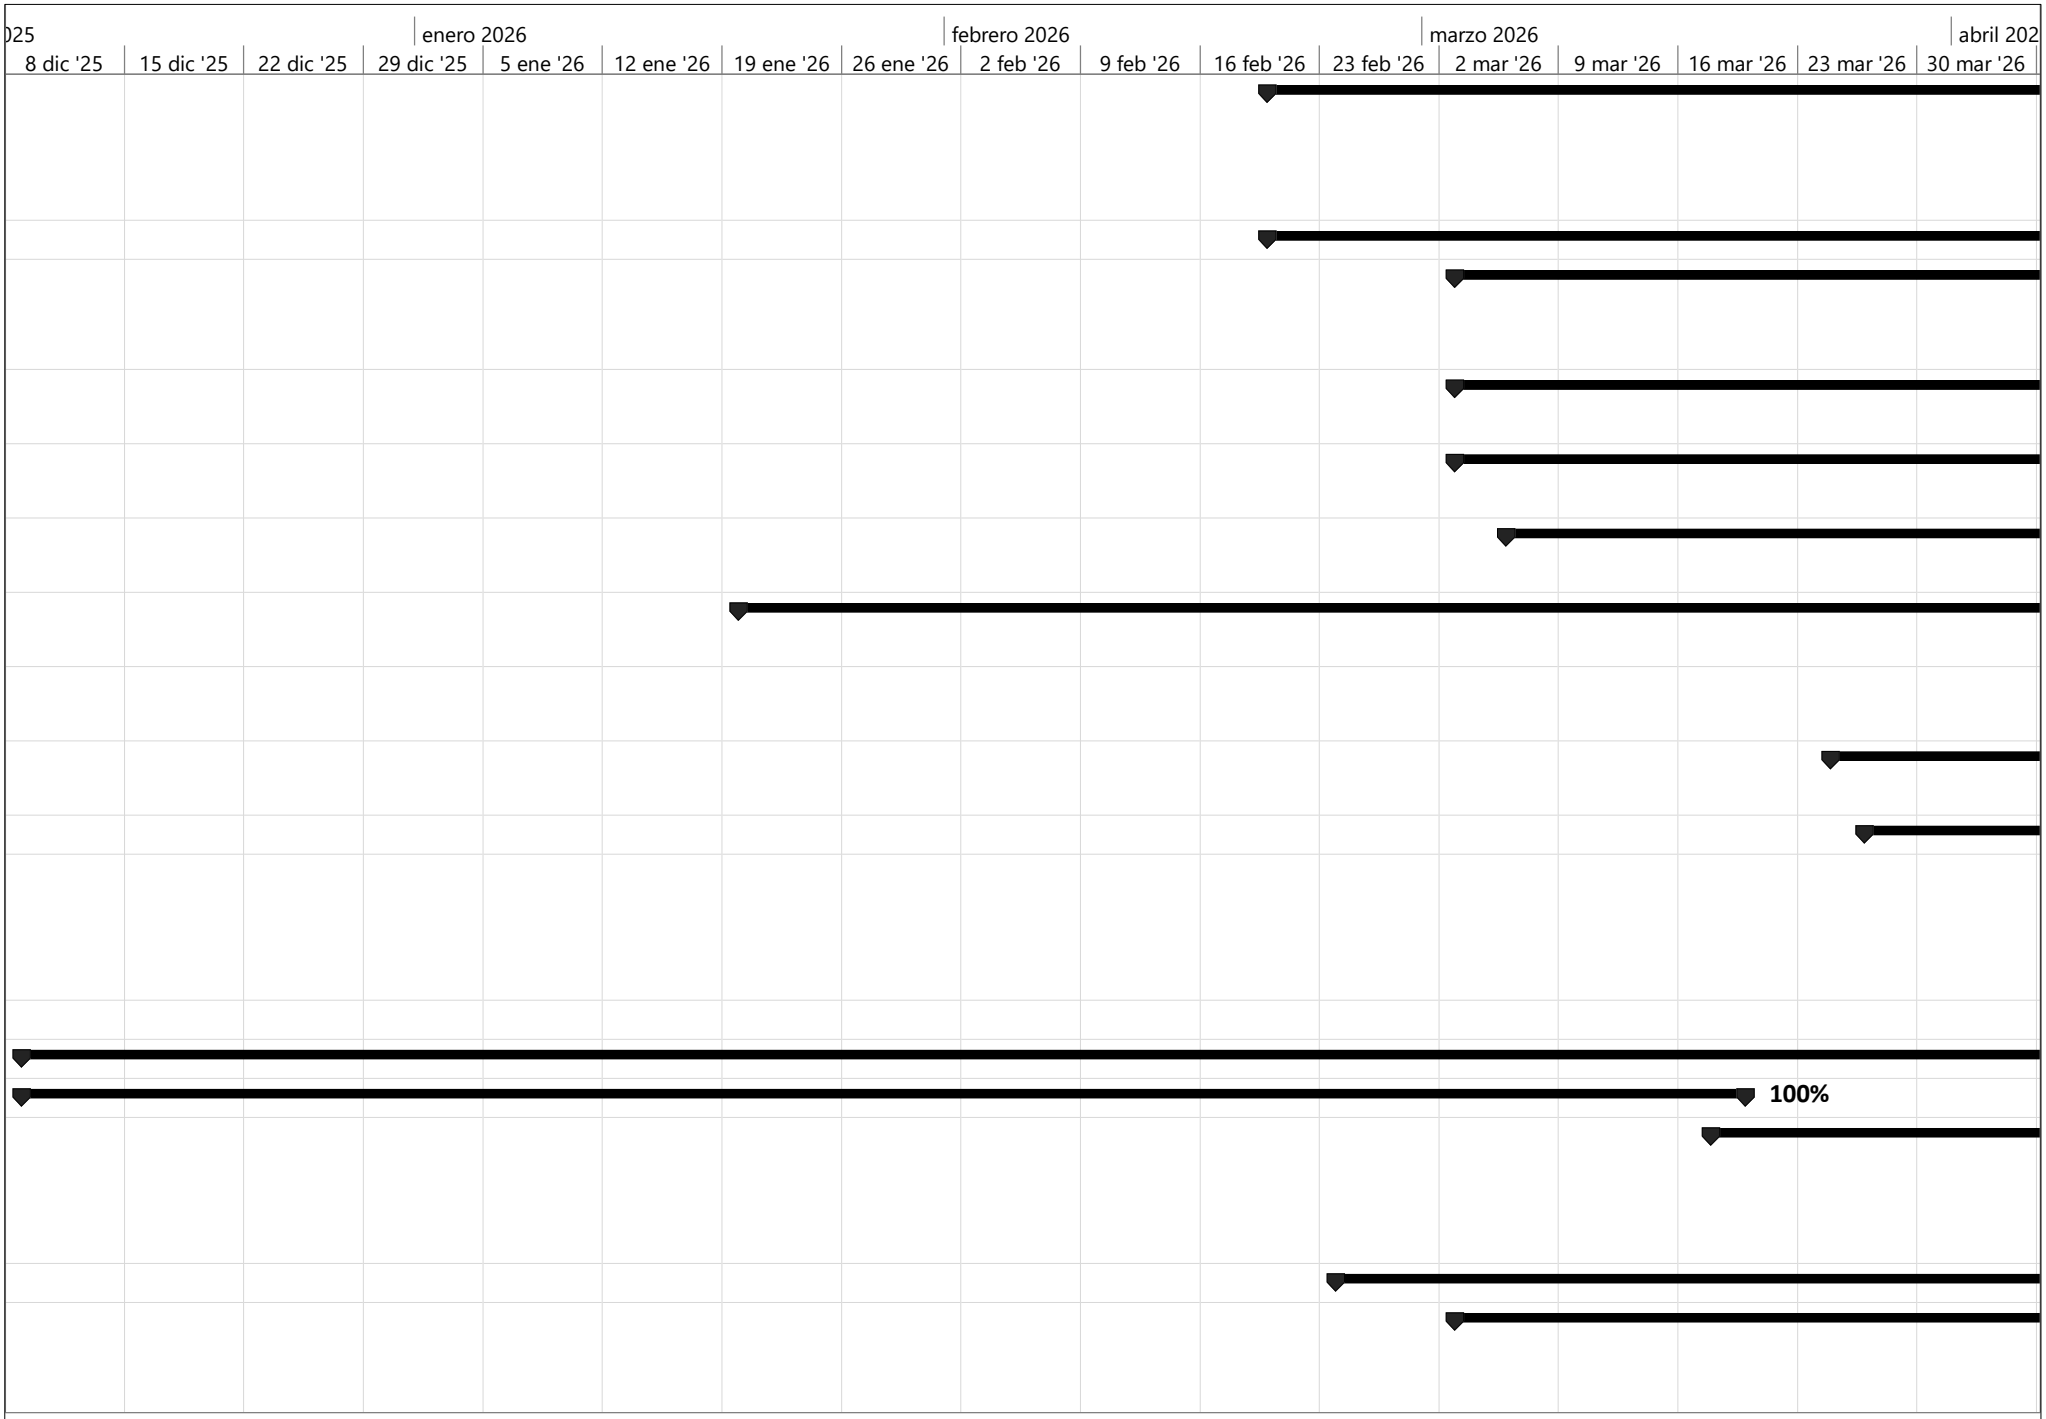
CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTAD	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
$ 19.452.148,15	$ 13.839.574,30	97,52	69,38	-28,14		
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
$ 649.014.468,94	$ 509.803.939,41	98,28	77,26	-21,02		
$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0		
$ 133.127.746,56	$ 110.748.024,25	98,16	81,66	-16,5		
$ 18.871.444,80	$ 18.806.370,85	100	99,66	-0,34		
$ 210.807.674,93	$ 147.718.330,58	97,72	68,48	-29,24		
$ 18.871.444,80	$ 10.466.393,62	100	55,46	-44,54		
$ 28.886.495,81	$ 27.744.302,24	95,08	92,8	-2,28		
$ 29.467.738,27	$ 25.998.271,92	95,57	84,32	-11,25		
$ 29.817.704,27	$ 21.162.842,47	99,73	70,78	-28,95		
$ 32.501.969,66	$ 16.191.511,89	99,36	49,5	-49,86		
$ 65.874.465,91	$ 65.085.369,04	99,91	98,72	-1,19		
$ 22.207.056,84	$ 12.804.470,16	99,28	57,25	-42,03		
$ 19.342.249,00	$ 13.839.574,30	96,97	69,38	-27,59		
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0		
$ 645.991.369,43	$ 509.768.558,05	97,6	77,25	-20,35		



CPTP	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTAD	%AVANCE	Predecesoras	Sucesoras
$ 39.238.478,10	**$ 39.238.478,10**	**100**	**100**	**0**		
$ 132.780.886,34	**$ 105.979.227,66**	**97,9**	**78,14**	**-19,76**		
$ 18.871.444,80	**$ 16.593.856,64**	**100**	**87,93**	**-12,07**		
$ 208.650.573,14	**$ 159.798.100,60**	**96,72**	**74,08**	**-22,64**		
$ 18.797.212,72	**$ 11.576.905,56**	**99,6**	**61,35**	**-38,25**		
$ 28.441.590,38	**$ 26.996.861,13**	**95,12**	**90,3**	**-4,82**		
$ 29.467.738,27	**$ 30.581.300,62**	**95,57**	**99,19**	**3,62**		
$ 29.817.704,27	**$ 16.414.393,05**	**93,45**	**54,9**	**-38,55**		
$ 32.501.969,66	**$ 13.738.252,52**	**99,36**	**42**	**-57,36**		
$ 65.874.465,91	**$ 65.085.369,04**	**99,91**	**98,72**	**-1,19**		
$ 22.207.056,84	**$ 11.560.463,73**	**99,28**	**51,69**	**-47,59**		
$ 19.342.249,00	**$ 12.205.349,40**	**96,97**	**61,19**	**-35,78**		
$ 0,00	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**		
$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	1748;1498;1248	



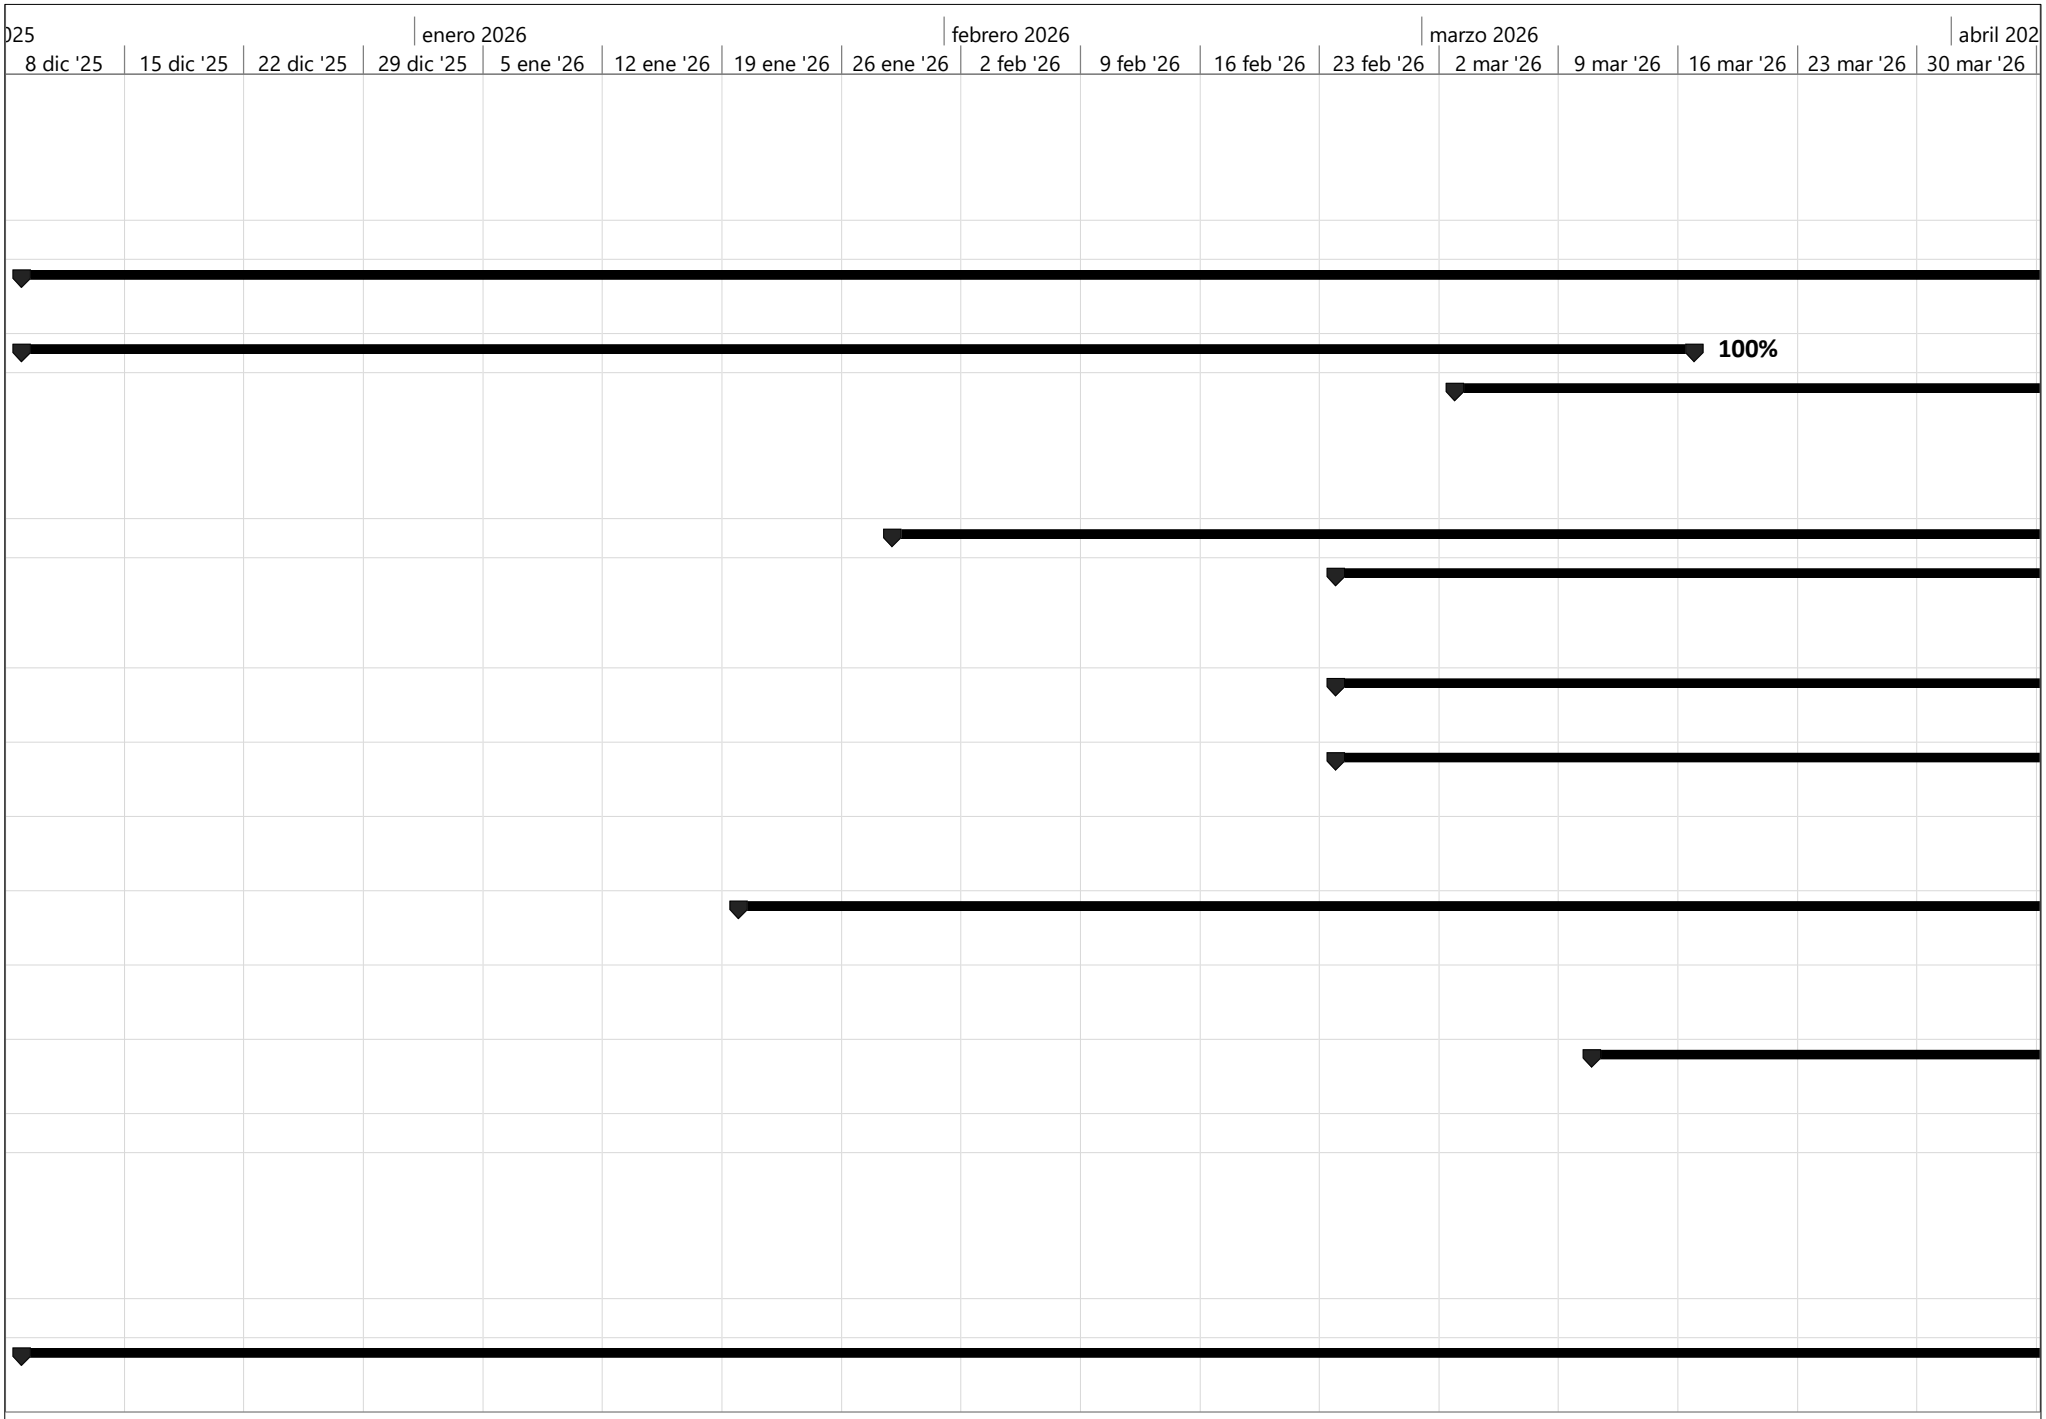

025
enero 2026
febrero 2026
marzo 2026
abril 202
8 dic '25
15 dic '25
22 dic '25
29 dic '25
5 ene '26
12 ene '26
19 ene '26
26 ene '26
2 feb '26
9 feb '26
16 feb '26
23 feb '26
2 mar '26
9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
100%
100%

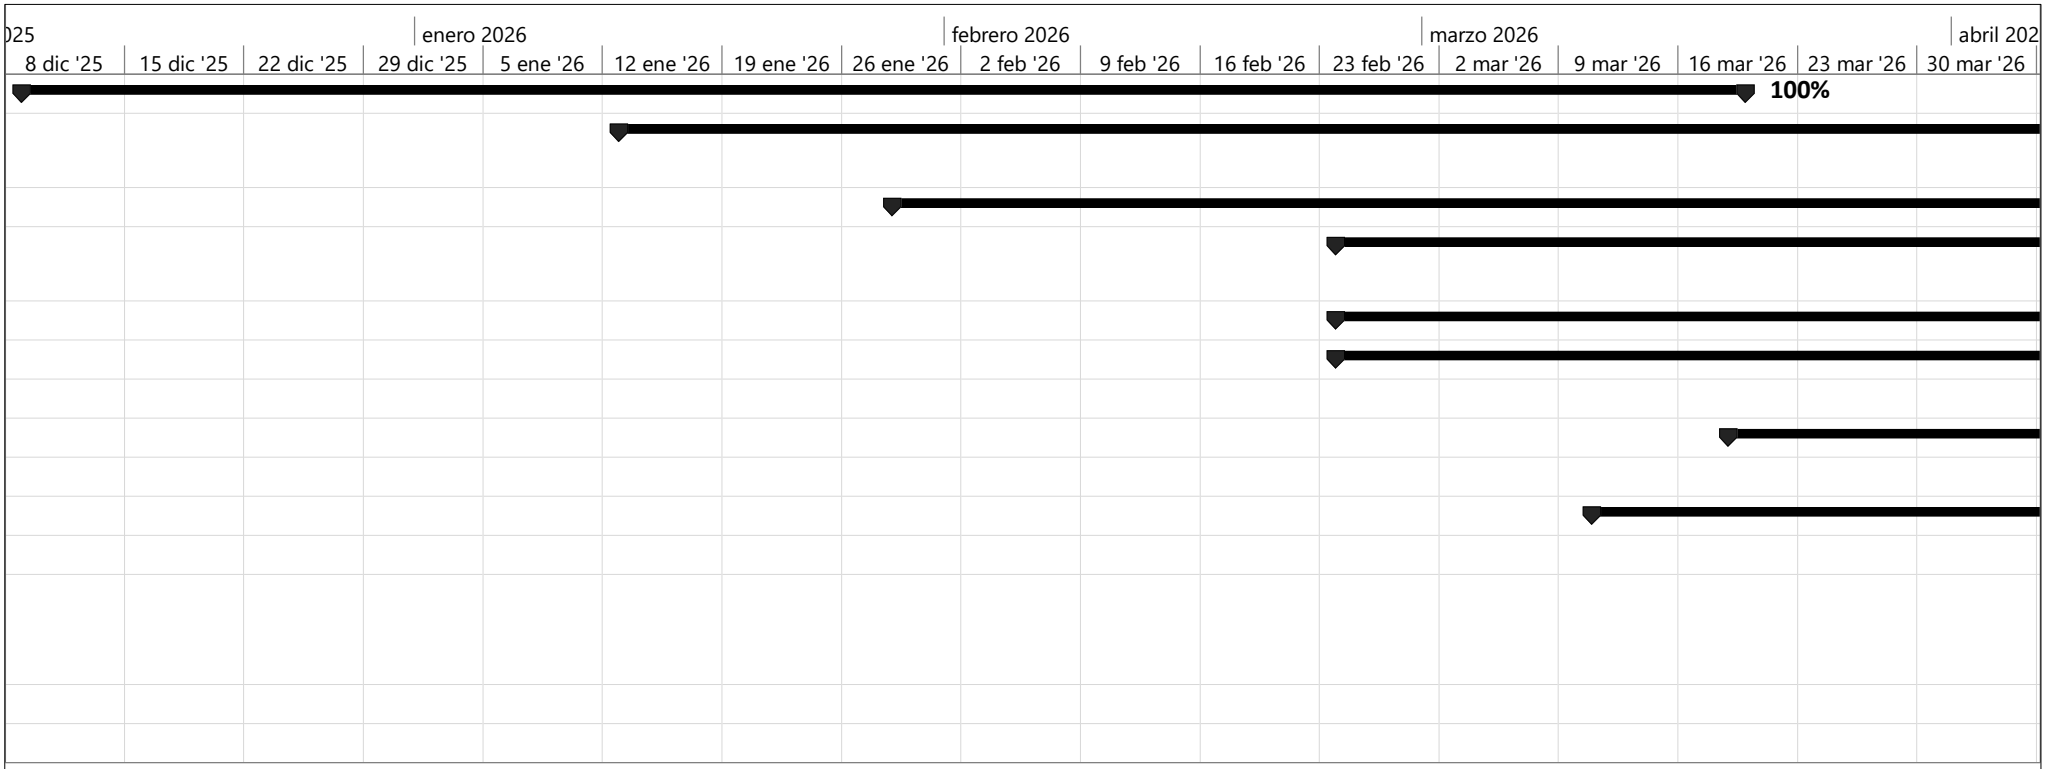

025
enero 2026
febrero 2026
marzo 2026
abril 202
8 dic '25
15 dic '25
22 dic '25
29 dic '25
5 ene '26
12 ene '26
19 ene '26
26 ene '26
2 feb '26
9 feb '26
16 feb '26
23 feb '26
2 mar '26
9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
100%

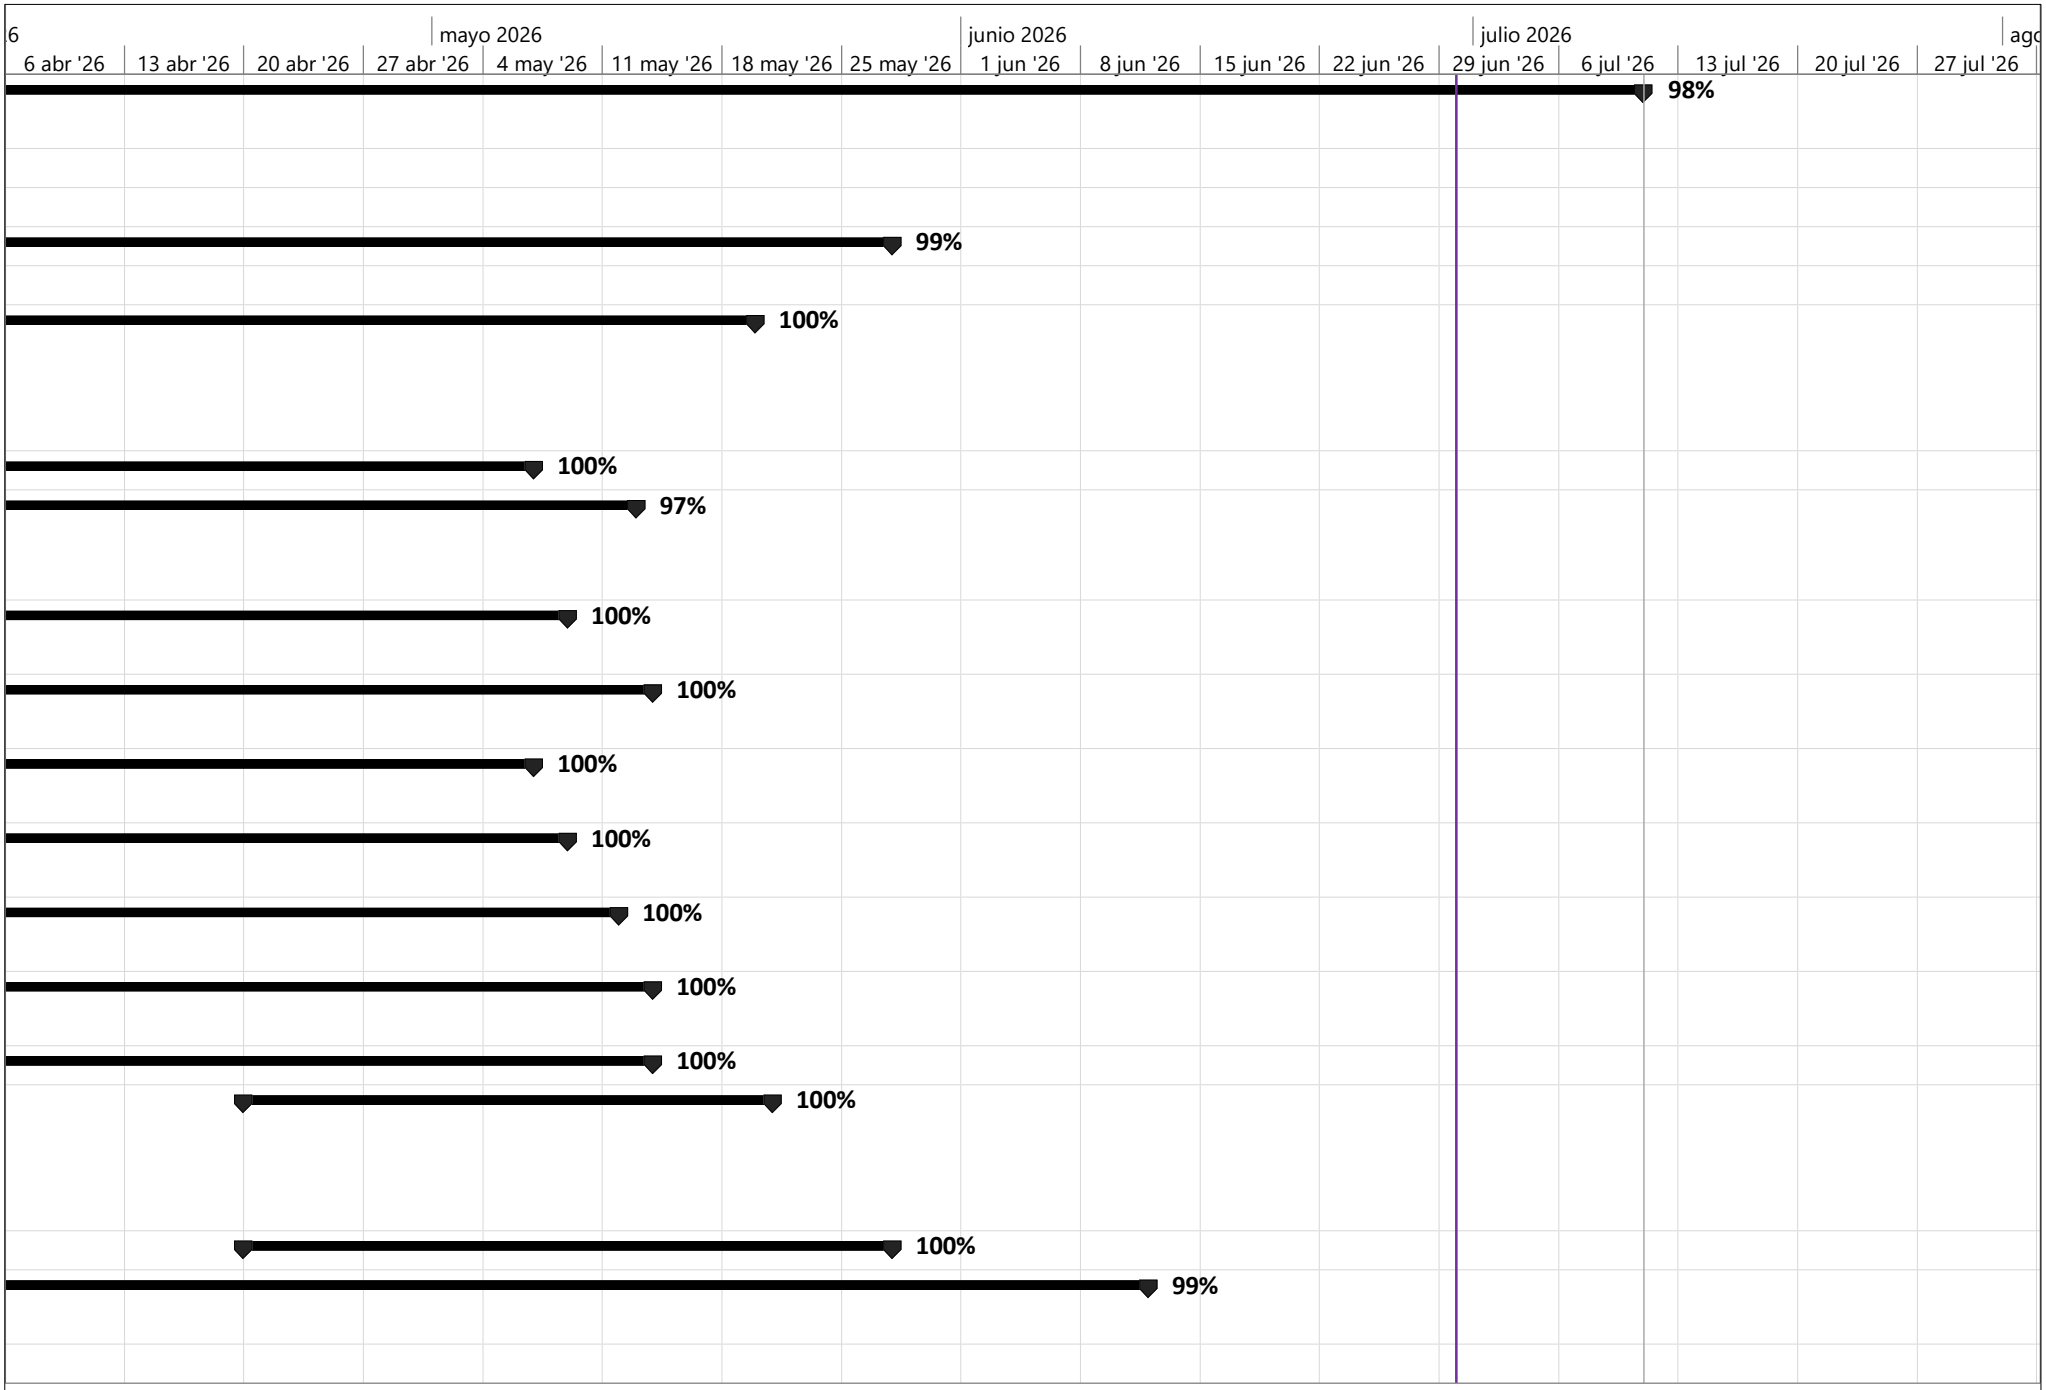

025
enero 2026
febrero 2026
marzo 2026
abril 202
8 dic '25
15 dic '25
22 dic '25
29 dic '25
5 ene '26
12 ene '26
19 ene '26
26 ene '26
2 feb '26
9 feb '26
16 feb '26
23 feb '26
2 mar '26
9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
100%

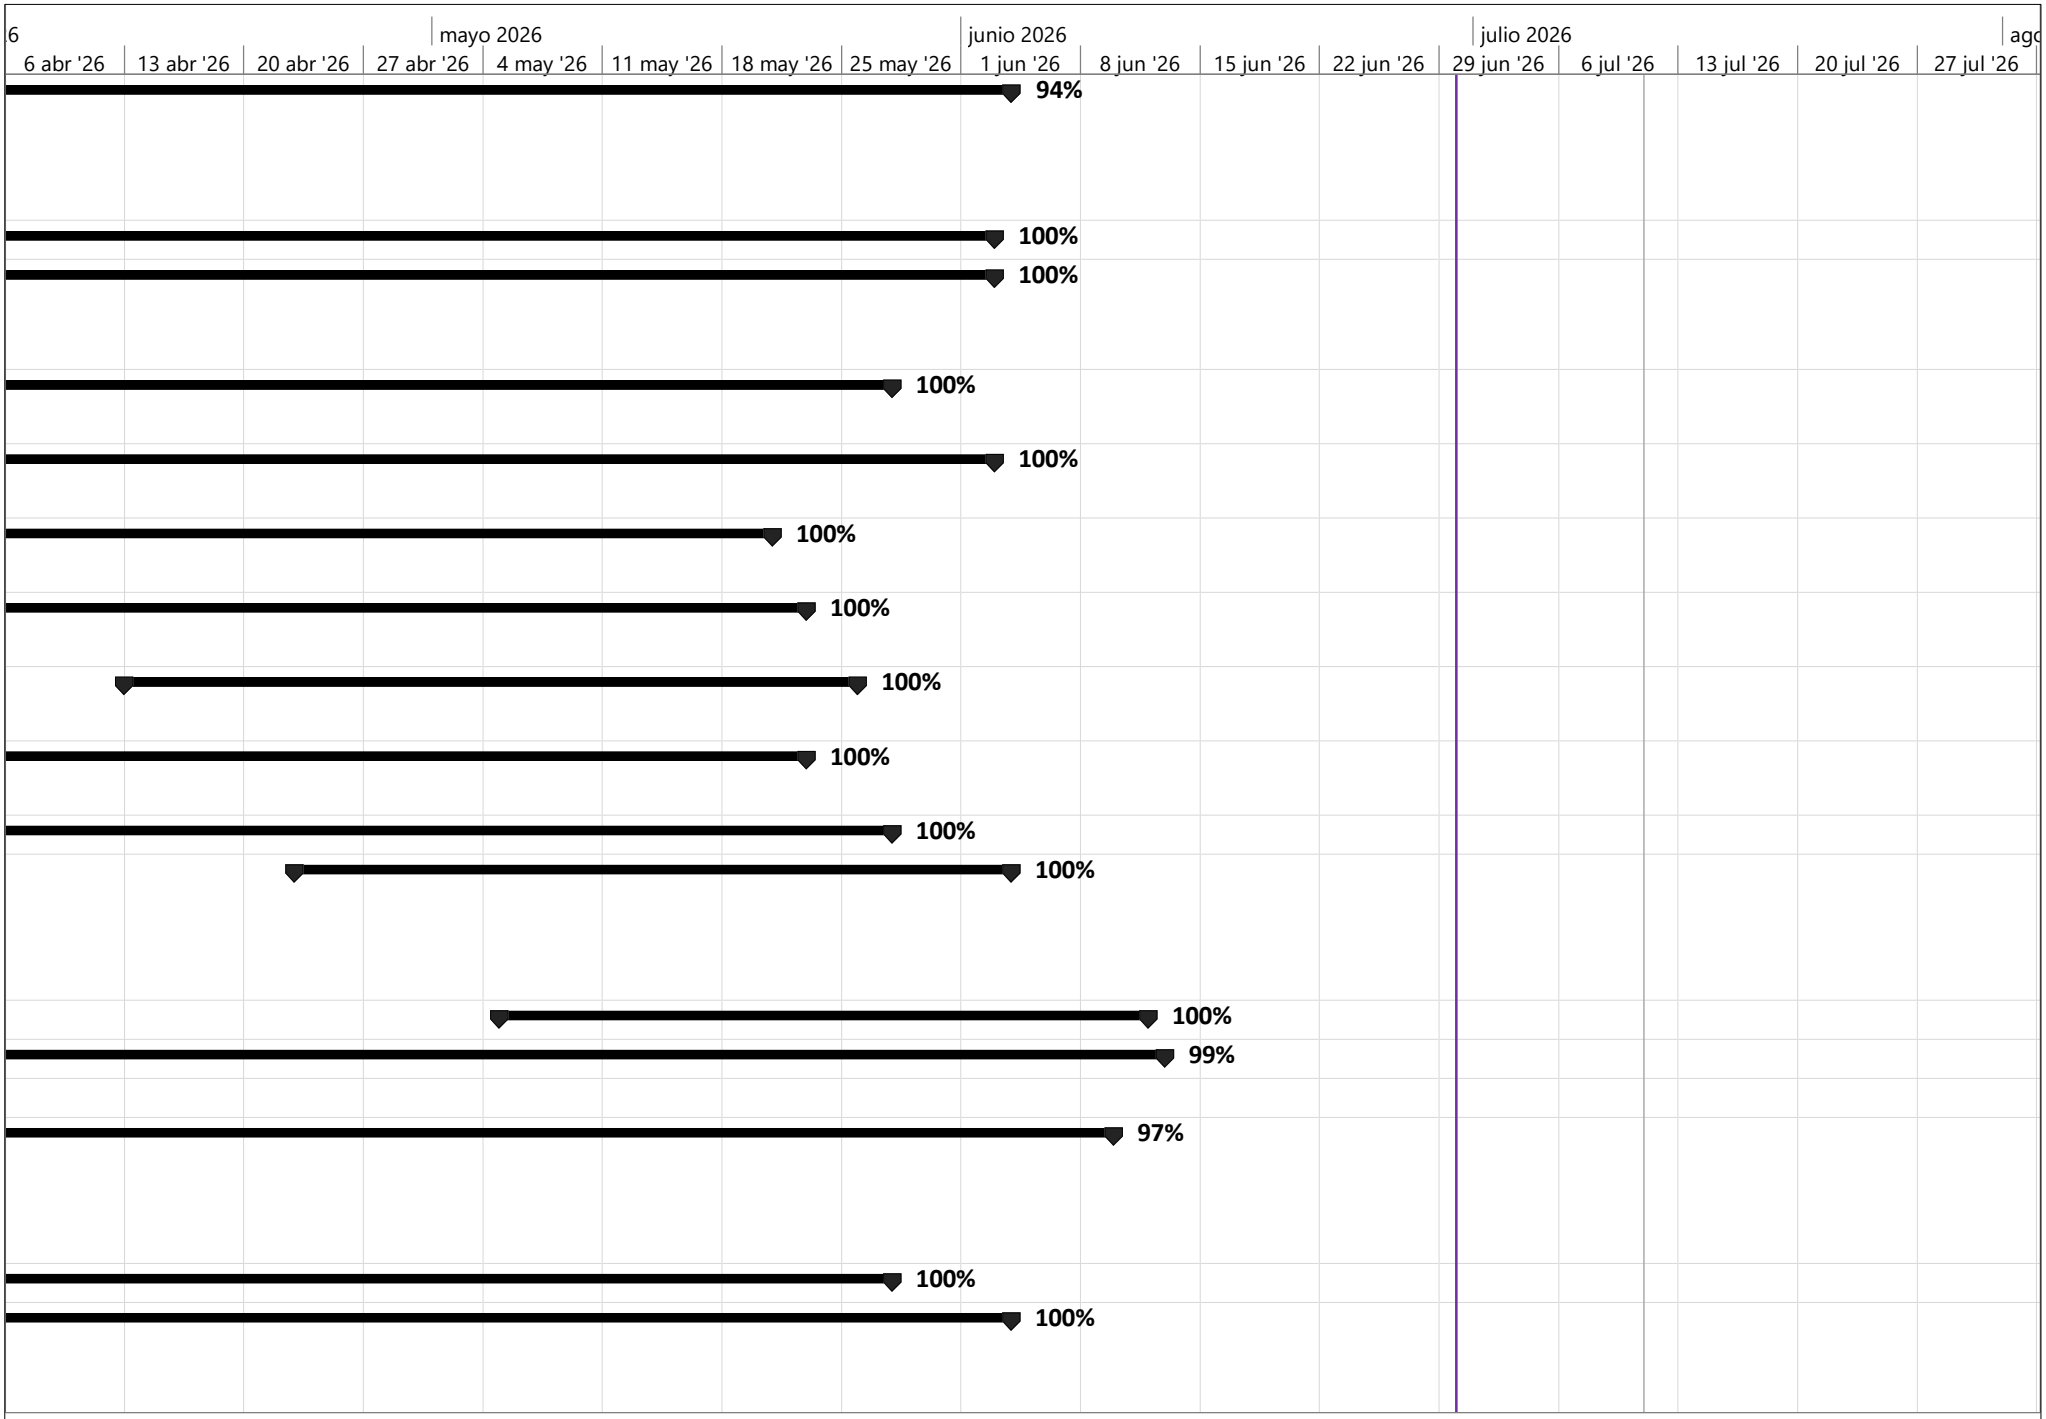


Proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2
Fecha: 30/06/26

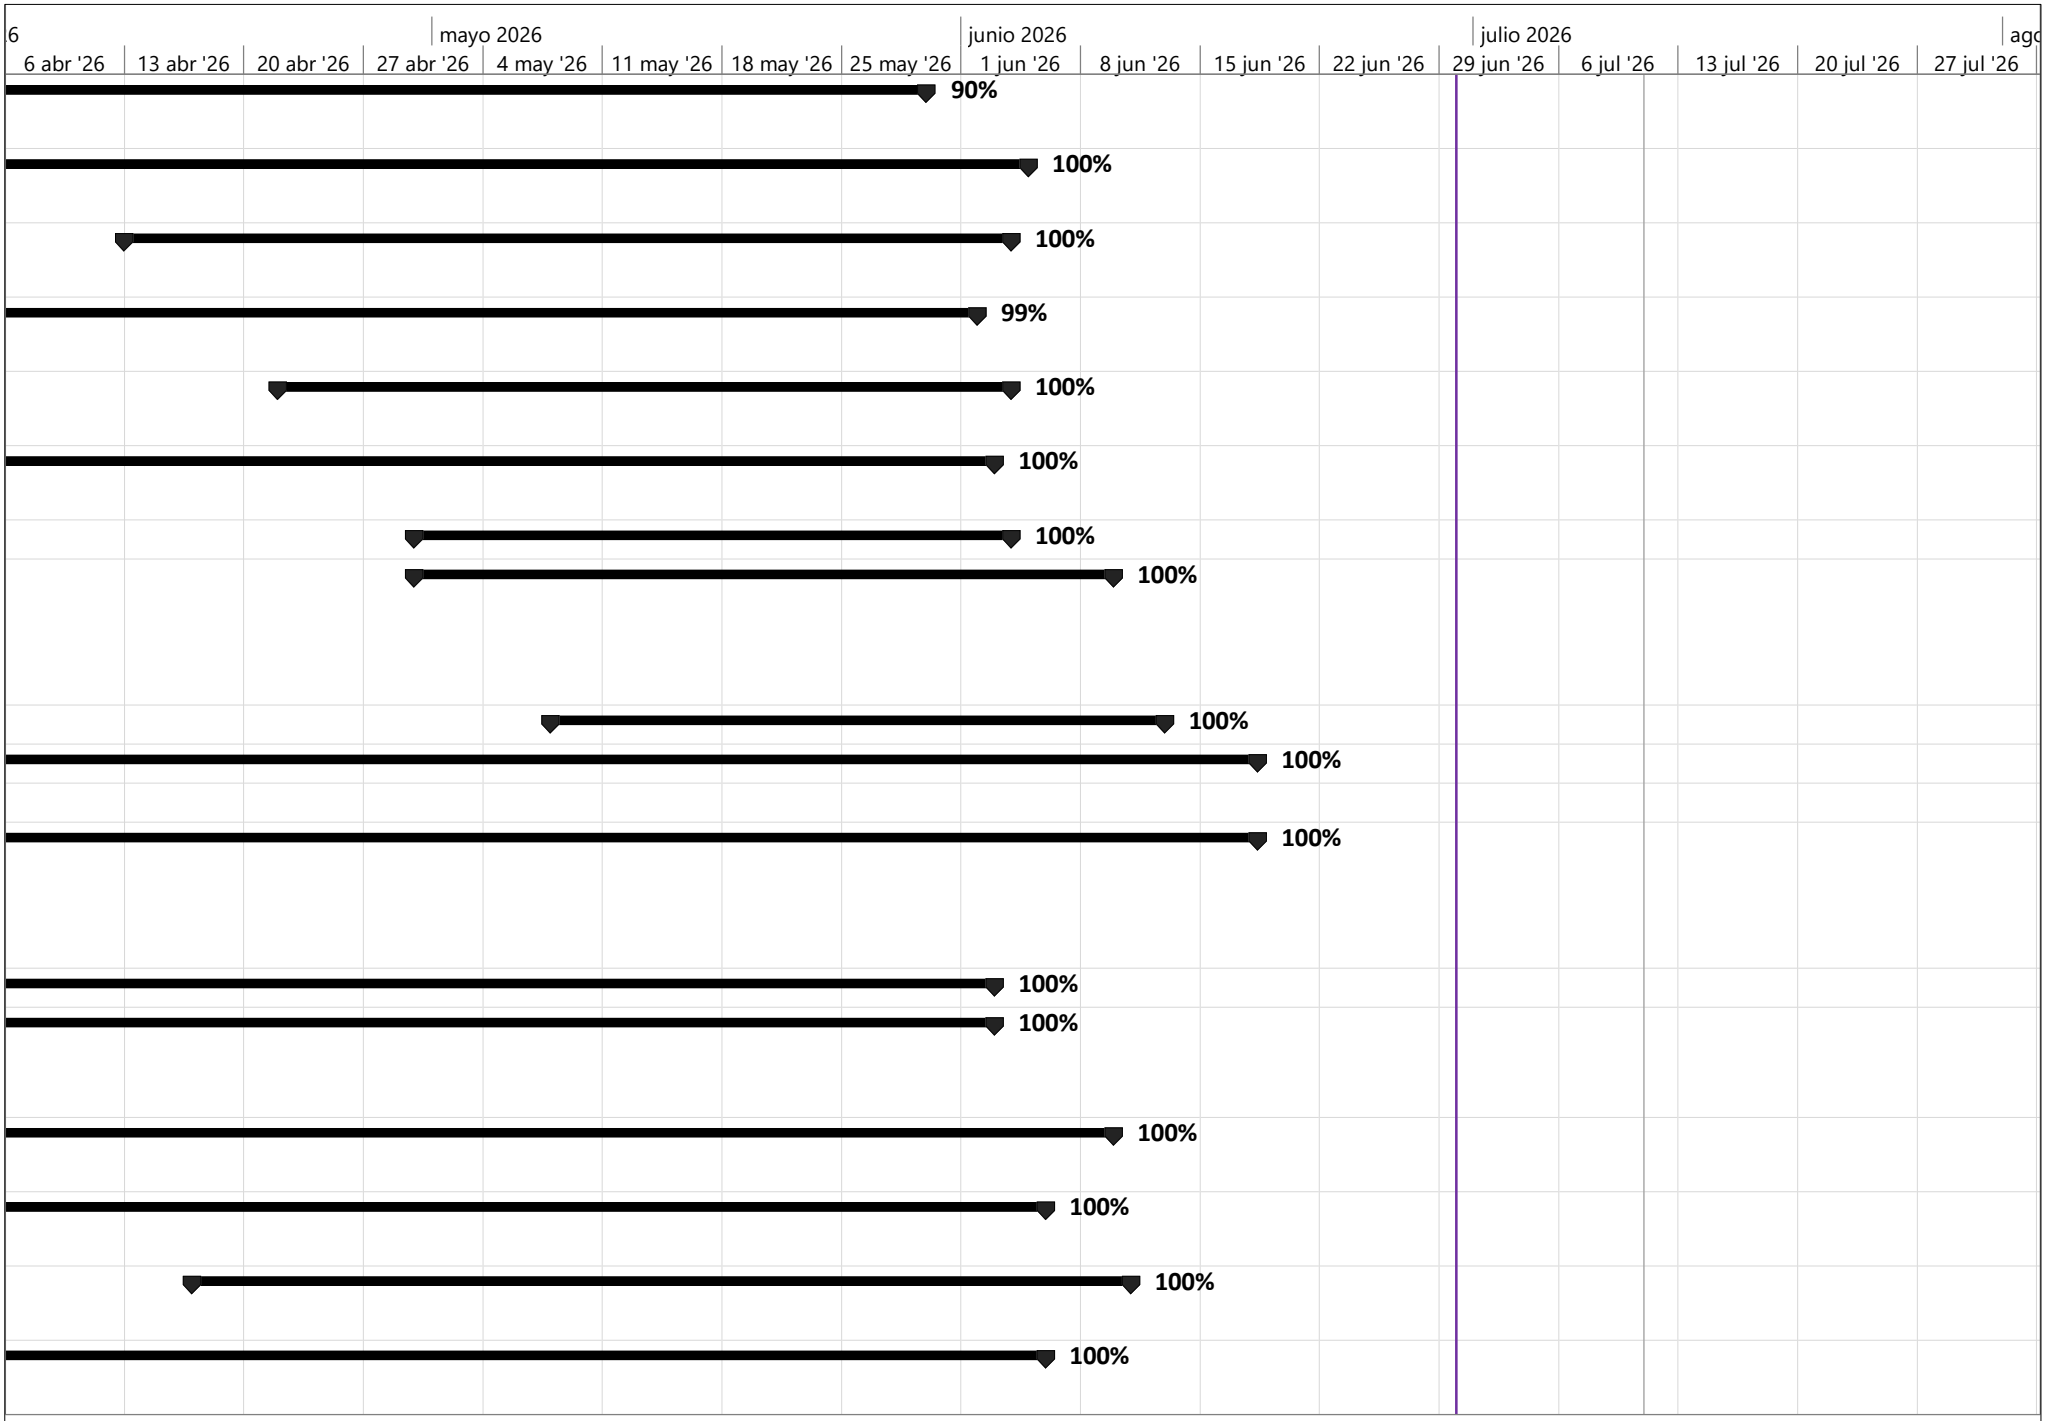

025
enero 2026
febrero 2026
marzo 2026
abril 202
8 dic '25
15 dic '25
22 dic '25
29 dic '25
5 ene '26
12 ene '26
19 ene '26
26 ene '26
2 feb '26
9 feb '26
16 feb '26
23 feb '26
2 mar '26
9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
100%

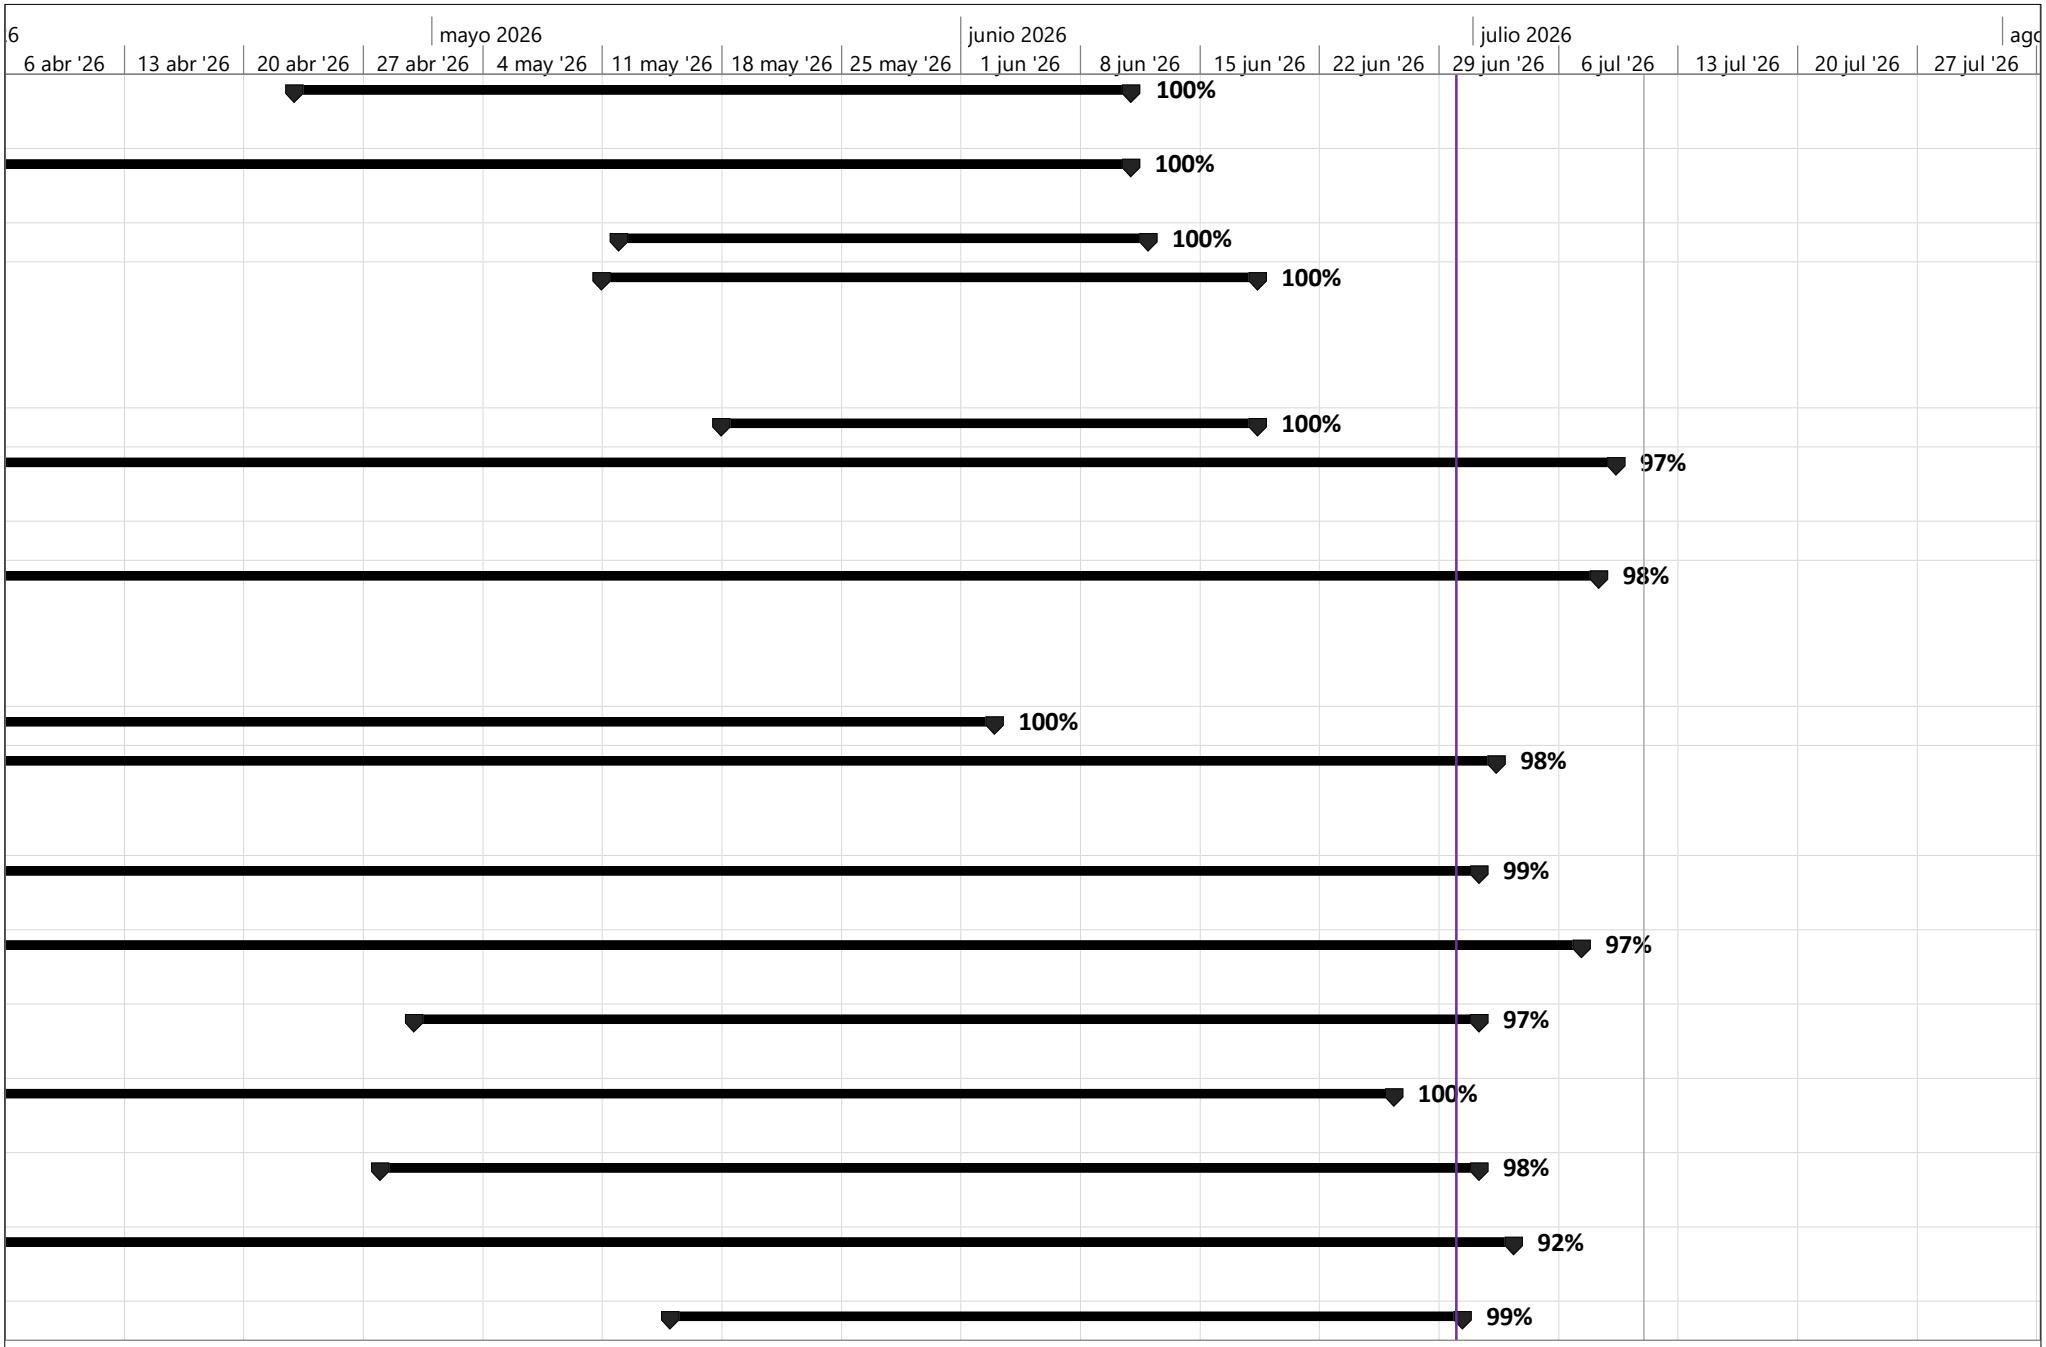

025
enero 2026
febrero 2026
marzo 2026
abril 202
8 dic '25
15 dic '25
22 dic '25
29 dic '25
5 ene '26
12 ene '26
19 ene '26
26 ene '26
2 feb '26
9 feb '26
16 feb '26
23 feb '26
2 mar '26
9 mar '26
16 mar '26
23 mar '26
30 mar '26
100%

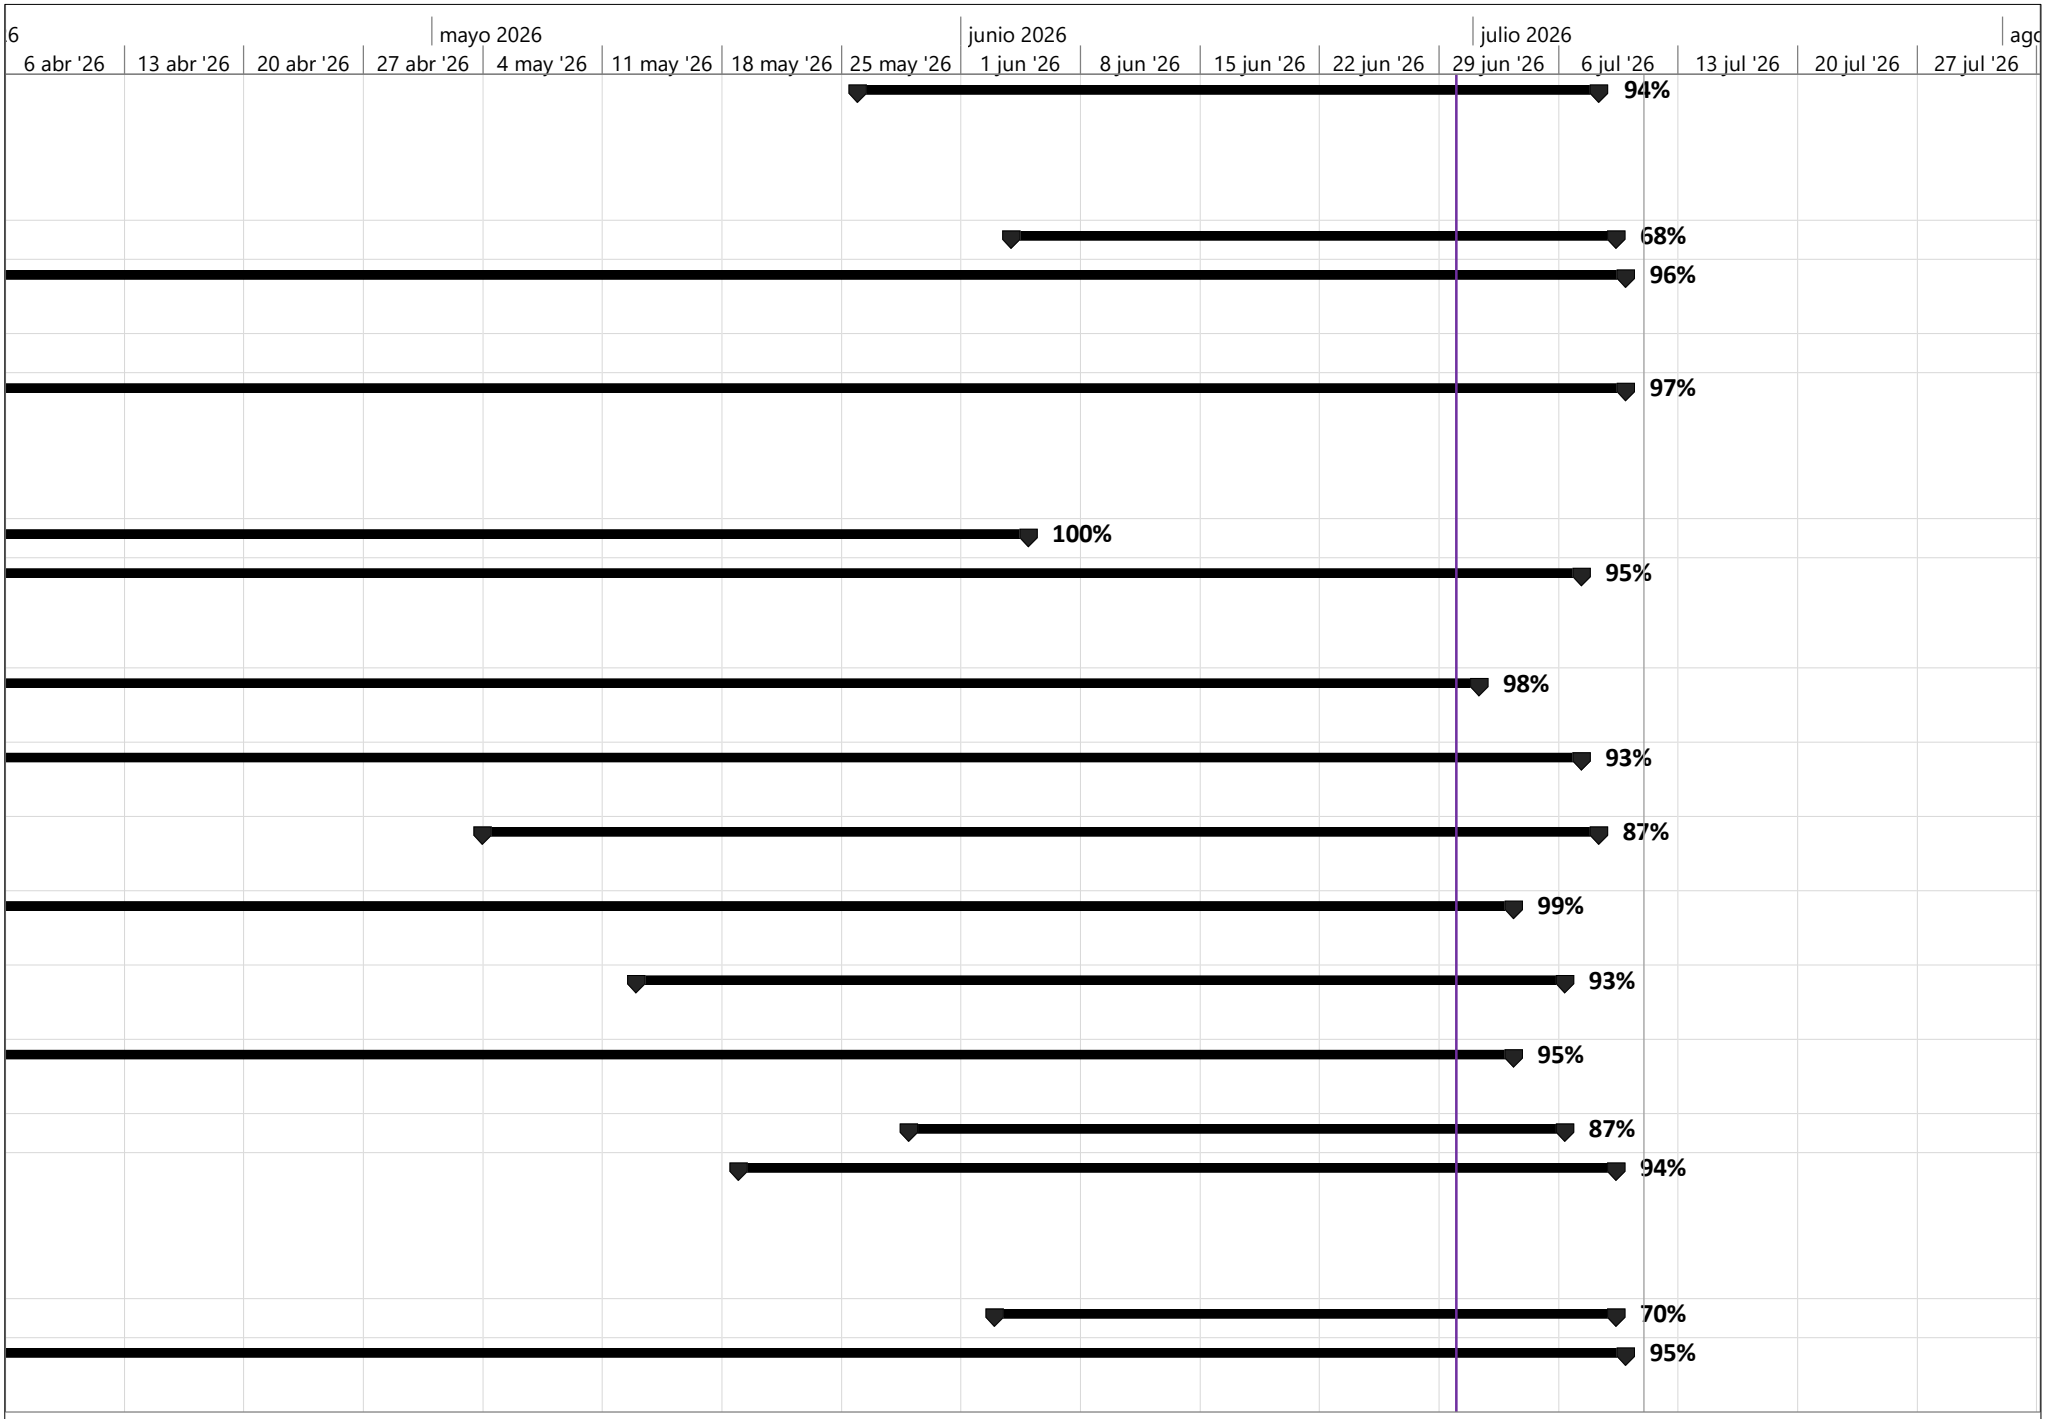

6
mayo 2026
junio 2026
julio 2026
ago
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
27 abr '26
4 may '26
11 may '26
18 may '26
25 may '26
1 jun '26
8 jun '26
15 jun '26
22 jun '26
29 jun '26
6 jul '26
13 jul '26
20 jul '26
27 jul '26
98%
99%
100%
100%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%

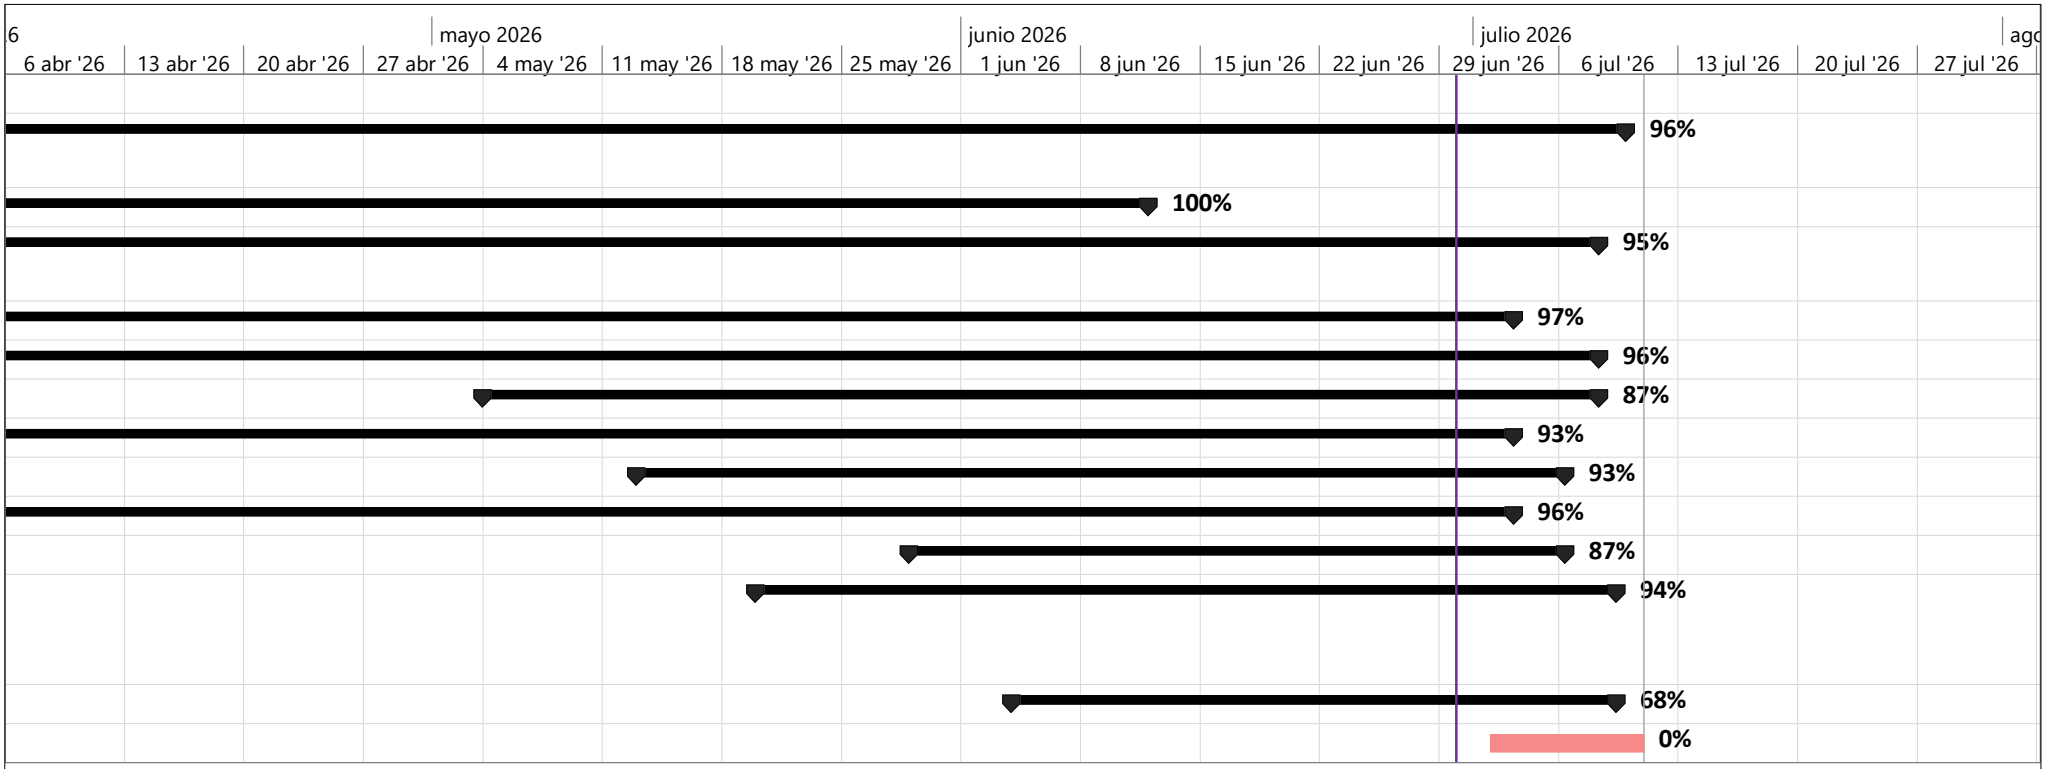


Proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 220
Fecha: 30/06/26


6
mayo 2026
junio 2026
julio 2026
ago
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
27 abr '26
4 may '26
11 may '26
18 may '26
25 may '26
1 jun '26
8 jun '26
15 jun '26
22 jun '26
29 jun '26
6 jul '26
13 jul '26
20 jul '26
27 jul '26
90%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%


6
mayo 2026
junio 2026
julio 2026
ago
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
27 abr '26
4 may '26
11 may '26
18 may '26
25 may '26
1 jun '26
8 jun '26
15 jun '26
22 jun '26
29 jun '26
6 jul '26
13 jul '26
20 jul '26
27 jul '26
100%
100%
100%
100%
100%
97%
98%
100%
98%
99%
97%
97%
100%
98%
92%
99%


6
mayo 2026
junio 2026
julio 2026
ago
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
27 abr '26
4 may '26
11 may '26
18 may '26
25 may '26
1 jun '26
8 jun '26
15 jun '26
22 jun '26
29 jun '26
6 jul '26
13 jul '26
20 jul '26
27 jul '26
94%
68%
96%
97%
100%
95%
98%
93%
87%
99%
93%
95%
87%
94%
70%
95%


6
mayo 2026
junio 2026
julio 2026
ago
6 abr '26
13 abr '26
20 abr '26
27 abr '26
4 may '26
11 may '26
18 may '26
25 may '26
1 jun '26
8 jun '26
15 jun '26
22 jun '26
29 jun '26
6 jul '26
13 jul '26
20 jul '26
27 jul '26
96%
100%
95%
97%
96%
87%
93%
93%
96%
87%
94%
68%
0%
