
| FORMATO | | |
|---|---|---|
| **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | | **SEMANA 10** |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CCC CIENAGA<br>NIT: 902 046 185 - 4<br>RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA | **OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | 328 de 18 de Marzo de 2026 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTER CIENGA AVC<br>NIT: NIT 902 047 304 - 9<br>RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.** | 325 de 17 de Marzo de 2026 | **OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | |
| **VALOR INICIAL** | $ 1.846.610.986,00 | | |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | 5 meses | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA** | $ 1.846.610.986,00 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA. | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | miércoles, 15 de julio de 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | martes, 15 de diciembre de 2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA NUMERO.** | **10** | **DEL** | 14/09/2026 | **AL** | 19/09/2026 | **DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO** | 67 |


## AVANCE DEL CONTRATO

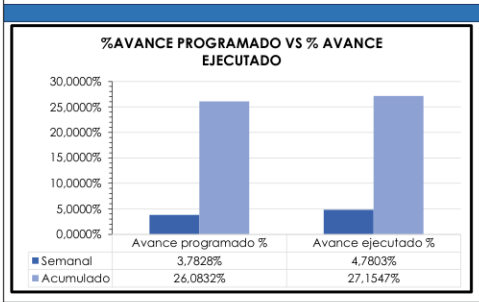


| Semanal | Acumulado | |
|---|---|---|
| 3,7828% | 26,0832% | Avance programado % |
| $ 69.853.575,14 | $ 481.655.065,66 | Valor programado |
| 4,7803% | 27,1547% | Avance ejecutado % |
| $ 501.441.785,07 | $ 501.441.785,07 | Valor ejecutado |

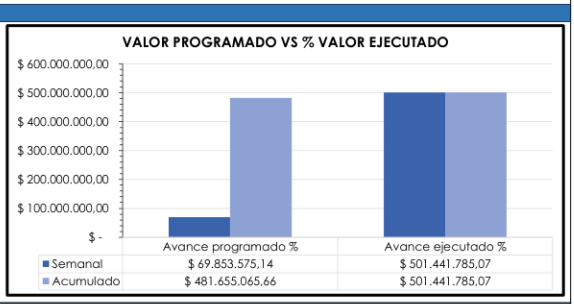


## GRAFICA DE AVANCE

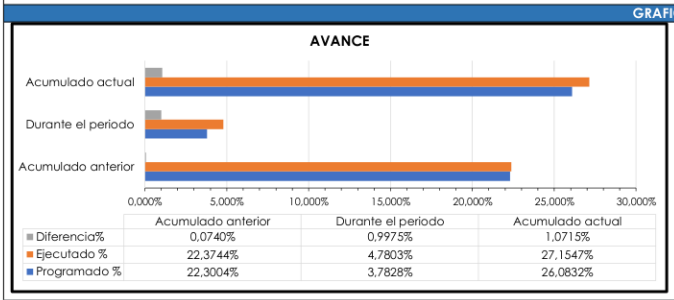


| Programado % | Ejecutado % | Diferencia% | | |
|---|---|---|---|---|
| 22,3004% | 22,3744% | 0,0740% | Acumulado anterior | Ok,Adelantados |
| 3,7828% | 4,7803% | 0,9975% | Durante el periodo | Ok,Adelantados |
| 26,0832% | 27,1547% | 1,0715% | Acumulado actual | Ok,Adelantados |

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA | % DE AVANCE ACUMULADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,0** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | |
| 1,01 | Localización y replanteo | m2 | 1116,00 | $ 7.326,32 | $ 8.176.177,38 | 1116,00 | 0,4428% | $ 8.176.177,38 |
| 1,02 | Conformación y nivelación del terreno con material seleccionado e=15cm | m3 | 167,40 | $ 185.455,55 | $ 31.045.258,71 | 167,40 | 1,6812% | $ 31.045.258,71 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 39.221.436,09** | | **2,12%** | **$ 39.221.436,09** |
| **2,0** | **CIMENTACIONES** | | | | | | | |
| **2,1** | **EDIFICIO DE SERVICIO** | | | | | | | |
| 2,1,1 | Excavacion general para cimentacion, incluye retiro de material sobrante | m3 | 52,89 | $ 153.367,67 | $ 8.111.922,93 | 52,89 | 0,4393% | $ 8.111.922,93 |
| 2,1,2 | Solado en Concreto Pobre de f'c= 14 MPa (140 kg/cm2/) e =0.05 m | m3 | 1,44 | $ 890.049,97 | $ 1.285.232,15 | 1,44 | 0,0696% | $ 1.285.232,15 |
| 2,1,3 | Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para vigas de cimentacion. | kg | 574,65 | $ 13.791,77 | $ 7.925.479,35 | 574,65 | 0,4292% | $ 7.925.479,35 |
| 2,1,4 | Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para zapatas. | Kg | 431,32 | $ 13.791,77 | $ 5.948.617,77 | 431,32 | 0,3221% | $ 5.948.617,77 |
| 2,1,5 | Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para viga de cimentación. | m3 | 3,59 | $ 1.464.861,16 | $ 5.258.119,12 | 3,59 | 0,2847% | $ 5.258.119,12 |
| 2,1,6 | Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para zapata. | m3 | 10,68 | $ 1.199.842,57 | $ 12.817.918,17 | 10,68 | 0,6941% | $ 12.817.918,17 |
| 2,1,7 | Suministro y colocacion de material seleccionado | m3 | 23,47 | $ 254.992,89 | $ 5.983.466,24 | 23,47 | 0,3240% | $ 5.983.466,24 |
| 2,1,8 | Sumnistro y colocacion de piedra rajon envuelta en geotextil e=20cm | m3 | 5,78 | $ 180.857,22 | $ 1.044.631,31 | 5,78 | 0,0566% | $ 1.044.631,31 |
| **2,2** | **AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO** | | | | | | | |
| 2,2,1 | Excavacion general para cimentacion, incluye retiro de material sobrante | m3 | 30,62 | $ 153.367,67 | $ 4.696.808,29 | 30,62 | 0,2543% | $ 4.696.808,29 |
| 2,2,2 | Solado en Concreto Pobre de f'c= 14 MPa (140 kg/cm2/) e =0.05 m | m3 | 0,78 | $ 890.049,97 | $ 697.799,17 | 0,78 | 0,0378% | $ 697.799,17 |
| 2,2,3 | Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para vigas de cimentacion. | Kg | 948,52 | $ 13.791,77 | $ 13.081.714,35 | 948,52 | 0,7084% | $ 13.081.714,35 |
| 2,2,4 | Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para zapatas. | Kg | 335,89 | $ 13.791,77 | $ 4.632.551,89 | 335,89 | 0,2509% | $ 4.632.551,89 |
| 2,2,5 | Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para viga de cimentación. | m3 | 7,54 | $ 1.464.861,16 | $ 11.040.072,58 | 7,54 | 0,5979% | $ 11.040.072,58 |
| 2,2,6 | Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para zapata. | m3 | 5,49 | $ 1.199.842,57 | $ 6.584.736,02 | 5,49 | 0,3566% | $ 6.584.736,02 |
| 2,2,7 | Suministro y colocacion de material seleccionado | m3 | 17,33 | $ 254.992,89 | $ 4.418.108,86 | 17,33 | 0,2393% | $ 4.418.108,86 |
| 2,2,8 | Sumnistro y colocacion de piedra rajon envuelta en geotextil e=20cm | m3 | 3,14 | $ 180.857,22 | $ 567.168,25 | 3,14 | 0,0307% | $ 567.168,25 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 94.094.346,44** | | **5,10%** | **$ 94.094.346,44** |
| **3,0** | **ESTRUCTURAS** | | | | | | | |
| **3,1** | **EDIFICIO DE SERVICIO** | | | | | | | |
| 3,1,1 | Suministro y colocacion de acero de refuerzo para columnas según despiece estructural, Fy=420 Mpa | Kg | 713,00 | $ 13.791,77 | $ 9.833.559,72 | 713,00 | 0,5325% | $ 9.833.559,72 |
| 3,1,2 | Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para columnas. | m3 | 1,59 | $ 1.888.182,17 | $ 2.997.489,19 | 1,59 | 0,1623% | $ 2.997.489,19 |
| 3,1,3 | Suministro y colocacion de acero de refuerzo para viga según despiece estructural, Fy=420 Mpa | Kg | 585,62 | $ 13.791,77 | $ 8.076.697,83 | 585,62 | 0,4374% | $ 8.076.697,83 |
| 3,1,4 | Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para viga | m3 | 4,35 | $ 1.878.808,07 | $ 8.171.687,84 | 4,35 | 0,4425% | $ 8.171.687,84 |
| 3,1,5 | Suministro y colocacion de acero de refuerzo para losa del tanque de almacenamiento según despiece estructural, Fy=420 Mpa | kg | 69,88 | $ 13.791,77 | $ 963.835,10 | 69,88 | 0,0522% | $ 963.835,10 |
| 3,1,6 | Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para losa del tanque de almacenamiento. | m3 | 1,50 | $ 1.306.138,90 | $ 1.959.208,35 | 1,50 | 0,1061% | $ 1.959.208,35 |
| **3,2** | **AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO** | | | | | | | |
| 3,2,1 | Suministro y colocacion de acero de refuerzo para columnas según despiece estructural, Fy=420 Mpa | Kg | 1208,84 | $ 13.791,77 | $ 16.672.083,18 | 1208,84 | 0,9028% | $ 16.672.083,18 |
| 3,2,2 | Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para columnas. | m3 | 4,54 | $ 2.696.403,73 | $ 12.244.833,60 | 4,54 | 0,6631% | $ 12.244.833,60 |
| 3,2,3 | Suministro, figurado e intalación de acero de refuerzo para viga cinta según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289. | Kg | 113,04 | $ 13.791,77 | $ 1.558.968,74 | 113,04 | 0,0844% | $ 1.558.968,74 |
| 3,2,4 | Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para viga cinta de 0,10x0,15m. | m3 | 4,64 | $ 1.547.906,40 | $ 7.182.285,68 | 4,64 | 0,3889% | $ 7.182.285,68 |
| 3,2,5 | Suministro y colocacion de acero de refuerzo para graderia según despiece estructural, Fy=420 Mpa | kg | 363,06 | $ 13.791,77 | $ 5.007.303,19 | 363,06 | 0,2712% | $ 5.007.303,19 |
| 3,2,6 | Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para graderia. | m3 | 6,54 | $ 1.263.888,90 | $ 8.261.662,55 | 6,54 | 0,4474% | $ 8.261.662,55 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 82.929.614,98** | | **4,49%** | **$ 82.929.614,98** |
| **4,0** | **MAMPOSTERÍA** | | | | | | | |
| **4,1** | **EDIFICIO DE SERVICIO** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORMATO | | | | | | | | |
| | | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | | | | SEMANA 10 | | | |
| CONTRATISTA DE OBRA | | CONSORCIO CCC CIENAGA<br>NIT: 902 046 185 - 4<br>RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA | | | OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | | | | | |
| CONTRATO DE OBRA NO. | | 328 de 18 de Marzo de 2026 | | | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA | | | | | |
| INTERVENTORÍA | | CONSORCIO INTER CIENGA AVC<br>NIT: NIT 902 047 304 - 9<br>RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE | | | | | | | | |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. | | 325 de 17 de Marzo de 2026 | | | OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | | |
| VALOR INICIAL | | $ 1.846.610.986,00 | | | | | | | | |
| PLAZO CONTRACTUAL | | 5 meses | | | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA. | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA | | $ 1.846.610.986,00 | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN | | miércoles, 15 de julio de 2026 | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | martes, 15 de diciembre de 2026 | | | | | | | | |
| SEMANA NUMERO. | | 10 | DEL | 14/09/2026 | AL | 19/09/2026 | DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO | 67 | | |
| 4,1,1 | Mamposteria en bloque de concreto 12Mpa, incluye mortero de pega tipo S: f'cp= 12.5MPa (125Kg/cm²), con acabado split | m2 | 157,80 | $ 237.879,75 | $ 37.537.424,86 | 157,80 | 2,0328% | $ 37.537.424,86 | | |
| 4,1,2 | Suministro, figurado e intalación de acero vertical de refuerzo según despiece estructural. Fy=420 MPa (4200 ka/cm2/) NTC-2289. | kg | 254,95 | $ 13.791,77 | $ 3.516.192,15 | 254,95 | 0,1904% | $ 3.516.192,15 | | |
| 4,1,3 | Suministro, figurado e intalación de acero horizontal de refuerzo según despiece estructural. Fy=420 MPa (4200 ka/cm2/) NTC-2289. | Kg | 142,50 | $ 13.791,77 | $ 1.965.327,25 | 142,50 | 0,1064% | $ 1.965.327,25 | | |
| 4,1,4 | Sumnistro y colocación de epoxico a traccion | m | 10,84 | $ 137.022,30 | $ 1.484.979,14 | 10,84 | 0,0804% | $ 1.484.979,14 | | |
| 4,1,5 | Mesón en concreto de 21mpa, 3000 psi, e = 5.00cm, incluye acero de refuerzo con barras de 3/8" corrugadas @7.00cm y formaleta | m2 | 0,78 | $ 685.552,89 | $ 534.731,26 | | - | $ - | | |
| 4,1,6 | Suministro de mortero para dovela | m3 | 8,67 | $ 975.299,17 | $ 8.455.843,81 | 8,67 | 0,4579% | $ 8.455.843,81 | | |
| 4,2 | AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO | | | | | | | | | |
| 4,2,1 | Mamposteria en bloque de concreto 12Mpa, incluye mortero de pega tipo S: f'cp= 12.5MPa (125Kg/cm²), con acabado split | m2 | 163,44 | $ 237.879,75 | $ 38.879.066,66 | 49,03 | 0,6316% | $ 11.663.244,24 | | |
| 4,2,2 | Suministro, figurado e intalación de acero vertical de refuerzo según despiece estructural. Fy=420 MPa (4200 ka/cm2/) NTC-2289. | Kg | 105,76 | $ 13.791,77 | $ 1.458.574,56 | 31,73 | 0,0237% | $ 437.612,87 | | |
| 4,2,3 | Suministro, figurado e intalación de acero horizontal de refuerzo según despiece estructural. Fy=420 MPa (4200 ka/cm2/) NTC-2289. | Kg | 72,92 | $ 13.791,77 | $ 1.005.695,88 | 21,88 | 0,0163% | $ 301.763,93 | | |
| 4,2,4 | Sumnistro y colocación de epoxico a traccion | m | 7,20 | $ 137.022,30 | $ 986.560,53 | 2,16 | 0,0160% | $ 295.968,16 | | |
| 4,2,5 | Suministro de mortero para dovela | m3 | 9,60 | $ 975.299,17 | $ 9.362.872,04 | 2,88 | 0,1521% | $ 2.808.861,61 | | |
| Subtotal | | | | | $ 105.187.268,15 | | 3,71% | $ 68.467.218,02 | | |
| 5,0 | PLACA "PAZ A LO BIEN" | | | | | | | | | |
| 5,1 | PLACA | | | | | | | | | |
| 5,1,1 | Suministro e instalación de placa en lamina galvanizado "Paz a lo bien" | Und | 1,00 | $ 7.771.829,37 | $ 7.771.829,37 | | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | $ 7.771.829,37 | | 0,00% | $ - | | |
| 6,0 | PINTURA Y ACABADOS | | | | | | | | | |
| 6,1 | AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO | | | | | | | | | |
| 6,1,1 | Colocación de estuco plástico para muros y columnas interiores. | $m^2$ | 124,86 | $ 48.482,31 | $ 6.053.604,94 | | - | $ - | | |
| 6,1,2 | Colocación de pintura para interiores en muros y columnas internos, incluye lijado y pintura tipo 1, 3 manos. | $m^2$ | 164,45 | $ 47.454,89 | $ 7.804.145,93 | | - | $ - | | |
| 6,1,3 | Colocación de pintura blanca para franjas de divisorias y franjas peatonales, 3 manos. | $m^2$ | 42,00 | $ 105.360,37 | $ 4.425.135,70 | | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | $ 18.282.886,57 | | 0,00% | $ - | | |
| 7,0 | CUBIERTA | | | | | | | | | |
| 7,1 | EDIFICIO DE SERVICIO | | | | | | | | | |
| 7,1,1 | Levante en mamposteria en bloque de concreto 12Mpa, incluye mortero de pega tipo S: f'cp= 12.5MPa (125Kg/cm²), con acabado split | m2 | 7,86 | $ 237.879,75 | $ 1.869.734,85 | 7,86 | 0,1013% | $ 1.869.734,85 | | |
| 7,1,2 | Suministro e instalación de lamina termoacústica tipo Sandwich e=18mm | m2 | 90,03 | $ 549.067,15 | $ 49.430.319,65 | | - | $ - | | |
| 7,1,3 | Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para viga cinta de 0,10x0,15m. | m3 | 0,80 | $ 1.547.906,40 | $ 1.236.622,42 | 0,80 | 0,0671% | $ 1.238.325,12 | | |
| 7,1,4 | Suministro, figurado e intalación de acero de refuerzo para viga cinta según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289. | Kg | 58,96 | $ 13.791,77 | $ 813.140,70 | 58,96 | 0,0440% | $ 813.162,77 | | |
| 7,1,5 | Perfil metálico PHR C 220 mm×80 mm×20 mm–e = 2.50 mm con una capa de anticorrosivo rojo, incluye tensor de 1/2" de diamettro en barra lisa. | m | 78,30 | $ 160.401,78 | $ 12.559.459,40 | | - | $ - | | |
| 7,1,6 | Angulo estructural L 2"x2"x1/8" | Und | 20,00 | $ 57.324,69 | $ 1.146.493,90 | | - | $ - | | |
| 7,2 | AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO | | | | | | | | | |
| 7,2,1 | Perfil metálico PTE 150 mm x 100mm x 3 mm con una capa de anticorrosivo. | m | 64,64 | $ 160.953,89 | $ 10.404.059,18 | 64,64 | 0,5634% | $ 10.404.059,18 | | |
| 7,2,2 | Perfil metálico PTE 150 mm x 100mm x 4 mm con una capa de anticorrosivo. | m | 127,50 | $ 195.764,10 | $ 24.959.922,23 | 127,50 | 1,3517% | $ 24.959.922,23 | | |
| 7,2,3 | Perfil metálico PTE 200 mm x 100mm x 4 mm con una capa de anticorrosivo. | m | 45,60 | $ 221.176,59 | $ 10.085.652,41 | 45,60 | 0,5462% | $ 10.085.652,41 | | |
| 7,2,4 | Suministro e instalación de lamina termoacústica tipo Sandwich e=18mm | m2 | 262,02 | $ 549.067,15 | $ 143.866.273,82 | | - | $ - | | |
| 7,2,5 | Caballete Galvanizado 0.60XM Cal.26 0.46Mm | m | 80,74 | $ 146.875,85 | $ 11.858.168,49 | | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | $ 268.229.847,05 | | 2,67% | $ 49.370.856,56 | | |
| 8,0 | IMPERMEABILIZACIONES | | | | | | | | | |
| 8,01 | Impermeabilización de muros del área polivalente, 3 manos | m2 | 86,58 | $ 56.359,71 | $ 4.879.736,45 | | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | $ 4.879.736,45 | | 0,00% | $ - | | |
| 9,0 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | |
| 9,01 | Suministro e instalación de ventana en aluminio con acabado negro y vidrio laminado 120x80. | Und | 4,00 | $ 565.689,74 | $ 2.262.758,95 | | - | $ - | | |
| 9,02 | Suministro e instalación de puertas en aluminio con acabado negro y vidrio laminado 220x80. | Und | 5,00 | $ 1.972.984,31 | $ 9.864.921,53 | | - | $ - | | |
| 9,03 | Suministro e instalación de division de baños en acero galvanizado | m2 | 28,40 | $ 877.619,56 | $ 24.924.395,52 | | - | $ - | | |
| 9,04 | Suministro e instalación de estera metálica entamborada en lámina de acero cold rolled calibre 16, incluye pasadores de seguridad, base en anticorrosivo y pintura de color negro. | m2 | 6,10 | $ 362.030,55 | $ 2.208.386,35 | | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | $ 39.260.462,35 | | 0,00% | $ - | | |
| 10,0 | ESPACIO PUBLICO | | | | | | | | | |
| 10,01 | Suministro e instalacion de maquina bio-saludable barras paralelas | Und | 1,00 | $ 3.599.863,25 | $ 3.599.863,25 | | - | $ - | | |
| 10,02 | Suministro e instalacion de maquina bio-saludable caminador aereo | Und | 1,00 | $ 3.886.513,25 | $ 3.886.513,25 | | - | $ - | | |
| 10,03 | Suministro e instalacion de maquina bio-saludable pony | Und | 1,00 | $ 3.729.863,25 | $ 3.729.863,25 | | - | $ - | | |
| 10,04 | Suministro e instalacion de maquina bio-saludable giro de cadera twister | Und | 1,00 | $ 4.379.863,25 | $ 4.379.863,25 | | - | $ - | | |
| 10,05 | Suministro e instalacion de maquina bio-saludable cicla | Und | 1,00 | $ 5.046.763,25 | $ 5.046.763,25 | | - | $ - | | |
| 10,06 | Suministro e instalacion de maquina bio-saludable doble swinger | Und | 1,00 | $ 3.989.863,25 | $ 3.989.863,25 | | - | $ - | | |
| 10,07 | Suministro e instalacion de banca en concreto sin espaldar | Und | 5,00 | $ 3.057.898,90 | $ 15.289.494,51 | | - | $ - | | |
| 10,08 | Suministro e instalacion de banca en concreto con espaldar | Und | 4,00 | $ 3.770.298,90 | $ 15.081.195,61 | | - | $ - | | |
| 10,09 | Empradización tapete grama soicia Japónica. Incluye adecuación del terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | m2 | 78,85 | $ 113.025,18 | $ 8.912.035,38 | | - | $ - | | |
| 10,1 | Suministro e instalación de Cesta SOUL, con acabado en concreto pulido reforzado con fibra y soporte acero (según especificaciones). | Und | 5,00 | $ 3.946.114,54 | $ 19.730.572,68 | | - | $ - | | |
| 10,11 | Suministro e instalación de avisos. | Und | 6,00 | $ 904.579,37 | $ 5.427.476,24 | | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | $ 89.073.503,90 | | 0,00% | $ - | | |
| 11,0 | PLAZAS Y ANDENES | | | | | | | | | |
| 11,01 | Losa de concreto estampado color naranja de alta resistencia al trafico peatonal y proteccion con sellador acrilico UV | m2 | 210,84 | $ 295.252,89 | $ 62.251.119,38 | 100,00 | 1,5989% | $ 29.525.289,03 | | |
| 11,02 | Malla electrosoldada para losa de concreto xx-188(150mmx150mmx6mm) | m2 | 210,84 | $ 69.112,04 | $ 14.571.581,85 | 100,00 | 0,3743% | $ 6.911.203,69 | | |
| 11,03 | Recubrimiento sintético deportivo con granulado diseñado para absorción de impactos y resistencia a la intemperie, incluye losa base en concreto e=10cm con malla electrosoldada. | m2 | 189,39 | $ 1.968.435,57 | $ 372.802.012,51 | | - | $ - | | |
| 11,04 | Losa en concreto e=10cm con acabado afinado para servir como base de otros recubrimiento o superficie final | m2 | 130,00 | $ 189.903,98 | $ 24.687.517,78 | | - | $ - | | |
| 11,05 | Malla electrosoldada para losa de concreto xx-188(150mmx150mmx6mm) | m2 | 130,00 | $ 69.112,04 | $ 8.984.564,79 | | - | $ - | | |
| 11,06 | Suministro e instalación de piso enchapado grano de mármol de alto tráfico color blanco, instalado con adhesivo de alta adherencia y juntas impermeables | m2 | 79,54 | $ 183.878,84 | $ 14.625.722,74 | | - | $ - | | |
| 11,07 | Losa de concreto pulido e=10cm superficie lisa mediante allanado mecanico | m2 | 354,35 | $ 184.101,72 | $ 65.236.445,38 | | - | $ - | | |

| | FORMATO | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | **SEMANA 10** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CCC CIENAGA<br>NIT: 902 046 185 - 4<br>RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA | **OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | 328 de 18 de Marzo de 2026 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTER CIENGA AVC<br>NIT: NIT 902 047 304 - 9<br>RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.** | 325 de 17 de Marzo de 2026 | **OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | |
| **VALOR INICIAL** | $ 1.846.610.986,00 | | |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | 5 meses | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA. | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA** | $ 1.846.610.986,00 | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | miércoles, 15 de julio de 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | martes, 15 de diciembre de 2026 | | |

| **SEMANA NUMERO.** | **10** | **DEL** | 14/09/2026 | **AL** | 19/09/2026 | **DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO** | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,08 | Malla electrosoldada para losa de concreto xx-188(150mmx150mmx6mm) | m2 | 354,35 | $ 69.112,04 | $ 24.489.850,26 | | - | $ | - |
| 11,09 | Piso en adoquin color gris tipo indural de 20cm x 10cm x 6cm | m2 | 69,68 | $ 298.370,78 | $ 20.790.475,99 | | - | $ | - |
| 11,1 | Bordillo en concreto hecho en sitio | m | 414,58 | $ 116.714,28 | $ 48.387.524,59 | 100,00 | 0,6320% | $ | 11.671.428,40 |
| 11,11 | Rampas en adoquin color gris tipo indural de 20cm x 20cm x 6cm | m2 | 29,63 | $ 194.305,78 | $ 5.757.280,28 | | - | $ | - |
| 11,12 | Graderia en manposteria estructural con losa e=10cm, con acero de refuerzo 3/8" @0,10m A.S | m | 10,76 | $ 933.897,93 | $ 10.048.741,77 | 10,76 | 0,5442% | $ | 10.048.741,77 |
| 11,13 | Tarima elevada en concreto reforzado incluye esctructura y acabado final | m2 | 8,97 | $ 1.073.749,82 | $ 9.631.535,88 | | - | $ | - |
| 11,14 | Suministro e instalación de losetas podotactiles | Und | 761,00 | $ 18.467,01 | $ 14.053.396,23 | | - | $ | - |
| **Subtotal** | | | | | **$ 696.317.769,43** | | **3,15%** | **$** | **58.156.662,88** |
| **12,0** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS** | | | | | | | | |
| **12,1** | **RED SANITARIA** | | | | | | | | |
| 12,1,1 | Localización y replanteo tuberia sanitaria. | m | 117,96 | $ 14.197,91 | $ 1.674.801,32 | 117,96 | 0,0907% | $ | 1.674.785,70 |
| 12,1,2 | Localización y replanteo cajas de registro. | m2 | 1,24 | $ 9.754,61 | $ 12.095,72 | 1,24 | 0,0007% | $ | 12.095,72 |
| 12,1,3 | Excavación general de terreno. | m3 | 39,90 | $ 174.944,51 | $ 6.979.828,95 | 39,90 | 0,3780% | $ | 6.980.285,90 |
| 12,1,4 | Retiro del material producto de la excavación a lugar autorizado hasta 15Km. | m3 | 51,87 | $ 125.245,69 | $ 6.496.068,90 | 51,87 | 0,3518% | $ | 6.496.494,19 |
| 12,1,5 | Suministro y colocación de capa de arena para cimentacion de tuberia emax= 15cm. | m3 | 4,83 | $ 144.767,30 | $ 699.611,74 | 4,83 | 0,0379% | $ | 699.226,08 |
| 12,1,6 | sifon de piso y rejilla de 2" | Und | 5,00 | $ 70.553,76 | $ 352.768,80 | | - | $ | - |
| 12,1,7 | Ramal de desagüe, tubería 2" pvc. Incluye suministro e intalacion de accesorios seaún diseños. | m | 48,08 | $ 54.095,97 | $ 2.600.934,44 | 48,08 | 0,1408% | $ | 2.600.934,44 |
| 12,1,8 | Ramal de desagüe tubería 4" pvc. Incluye suministro e intalacion de accesorios seaún diseños. | m | 57,75 | $ 80.276,02 | $ 4.635.940,40 | 57,75 | 0,2511% | $ | 4.635.940,40 |
| 12,1,9 | Construcción de cajas de registro de 50x50cm en maposteria. | m2 | 8,15 | $ 157.234,20 | $ 1.281.458,76 | 8,15 | 0,0694% | $ | 1.281.458,76 |
| 12,1,10 | Construcción de cajas de registro de 70x70cm en maposteria. | m2 | 2,28 | $ 157.234,20 | $ 358.808,45 | 2,28 | 0,0194% | $ | 358.493,98 |
| 12,1,11 | Codo de 90° 4" PVC sanitario | Und | 15,00 | $ 47.748,33 | $ 716.224,92 | 15,00 | 0,0388% | $ | 716.224,92 |
| 12,1,12 | Codo de 90° 2" PVC sanitario | Und | 21,00 | $ 43.168,43 | $ 906.536,99 | 21,00 | 0,0491% | $ | 906.536,99 |
| 12,1,13 | Codo de 45° 4" PVC sanitario | Und | 4,00 | $ 65.559,63 | $ 262.238,51 | 4,00 | 0,0142% | $ | 262.238,51 |
| 12,1,14 | Codo de 45° 2" PVC sanitario | Und | 16,00 | $ 73.810,20 | $ 1.180.963,16 | 16,00 | 0,0640% | $ | 1.180.963,16 |
| 12,1,15 | Yee 4"x4"x4" PVC sanitario | Und | 6,00 | $ 70.128,57 | $ 420.771,42 | 6,00 | 0,0228% | $ | 420.771,42 |
| 12,1,16 | Yee 4"x4"x2" PVC sanitario | Und | 13,00 | $ 64.051,07 | $ 832.663,90 | 13,00 | 0,0451% | $ | 832.663,90 |
| 12,1,17 | Yee 2"x2"x2" PVC sanitario | Und | 2,00 | $ 32.683,37 | $ 65.366,74 | 2,00 | 0,0035% | $ | 65.366,74 |
| 12,1,18 | Tapa en concreto y barras de 3/8" cada 0,10m en ambos sentidos. Incluye revoque impermeabilizado y cañuelas orientadoras de flujo. | m2 | 1,24 | $ 171.239,93 | $ 212.337,52 | | - | $ | - |
| 12,1,19 | Relleno de acometidas con material para relleno | m3 | 80,54 | $ 215.321,14 | $ 17.342.912,34 | 80,54 | 0,9391% | $ | 17.341.964,93 |
| 12,1,20 | Ramal de desagüe, tubería 1 1/2" pvc. Incluye suministro e intalacion de accesorios seaún diseños. | m | 12,13 | $ 41.988,21 | $ 509.363,15 | 12,13 | 0,0276% | $ | 509.316,96 |
| 12,1,21 | Yee 4"x4"x1 1/2" PVC sanitario | Und | 1,00 | $ 42.707,67 | $ 42.707,67 | 1,00 | 0,0023% | $ | 42.707,67 |
| 12,1,22 | Suministro e instalación de canaleta circular de 8", incluye abrazaderas, tornilleria, aaccesorios de empalme. | ml | 71,44 | $ 125.862,66 | $ 8.991.628,35 | | - | $ | - |
| 12,1,23 | Suministro e instalación de bajantes en tuberia sanitaria para sistema de aguas lluvias de 2 1/2" incluye accesorios seaún diseño | ml | 13,10 | $ 52.593,18 | $ 688.970,65 | | - | $ | - |
| **12,2** | **RED DE AGUA POTABLE** | | | | | | | | |
| 12,2,1 | Localización y replanteo. | m | 105,46 | $ 6.307,53 | $ 665.192,41 | 105,46 | 0,0360% | $ | 665.192,41 |
| 12,2,2 | Excavación general de terreno. | m3 | 47,98 | $ 174.944,51 | $ 8.394.589,79 | 47,98 | 0,4546% | $ | 8.393.837,53 |
| 12,2,3 | Retiro del material producto de la excavación a lugar autorizado hasta 15Km. | m3 | 62,38 | $ 125.245,69 | $ 7.812.775,09 | 62,38 | 0,4231% | $ | 7.812.826,44 |
| 12,2,4 | Suministro y colocación de capa de arena para cimentacion de tuberia emax= 10cm. | m3 | 6,33 | $ 115.352,63 | $ 729.905,30 | 6,33 | 0,0395% | $ | 730.182,15 |
| 12,2,5 | Suministro e instalación de tuberia de 1" PVC Presión | m | 75,32 | $ 36.788,21 | $ 2.770.887,80 | 75,32 | 0,1501% | $ | 2.770.887,80 |
| 12,2,6 | Suministro e instalación de tuberia de 3/4" PVC Presión | m | 12,62 | $ 33.754,87 | $ 425.986,51 | 12,62 | 0,0231% | $ | 425.986,51 |
| 12,2,7 | Suministro e instalación de tuberia de 1/2" PVC Presión | m | 17,52 | $ 33.754,87 | $ 591.385,40 | 17,52 | 0,0320% | $ | 591.385,40 |
| 12,2,8 | Codo 90° 1" PVC Presión | Und | 19,00 | $ 30.953,16 | $ 588.109,99 | 19,00 | 0,0318% | $ | 588.109,99 |
| 12,2,9 | Codo 90° 3/4" PVC Presión | Und | 11,00 | $ 30.638,99 | $ 337.028,90 | 11,00 | 0,0183% | $ | 337.028,90 |
| 12,2,10 | Codo 90° 1/2" PVC Presión | Und | 11,00 | $ 20.041,08 | $ 220.451,87 | 11,00 | 0,0119% | $ | 220.451,87 |
| 12,2,11 | Tee 1 "x1"x1" PVC Presión | Und | 5,00 | $ 24.176,38 | $ 120.881,90 | 5,00 | 0,0065% | $ | 120.881,90 |
| 12,2,12 | Tee 1"x1"x1/2" PVC Presión | Und | 2,00 | $ 27.860,94 | $ 55.721,88 | 2,00 | 0,0030% | $ | 55.721,88 |
| 12,2,13 | Tee 3/4"x 3/4"x3/4" PVC Presión | Und | 3,00 | $ 21.555,58 | $ 64.666,74 | 3,00 | 0,0035% | $ | 64.666,74 |
| 12,2,14 | Tee 1/2"x1/2"x1/2" PVC Presión | Und | 7,00 | $ 19.847,38 | $ 138.931,66 | 7,00 | 0,0075% | $ | 138.931,66 |
| 12,2,15 | Reduccion 1"x3/4" PVC Presion | Und | 1,00 | $ 83.807,38 | $ 83.807,38 | 1,00 | 0,0045% | $ | 83.807,38 |
| 12,2,16 | Reduccion 1"x1/2" PVC Presion | Und | 1,00 | $ 96.807,38 | $ 96.807,38 | 1,00 | 0,0052% | $ | 96.807,38 |
| 12,2,17 | Sumnistro e instalacion de collarin de acuducto 2" adaptado de PEAD a PVC | Und | 1,00 | $ 73.147,38 | $ 73.147,38 | 1,00 | 0,0040% | $ | 73.147,38 |
| 12,2,18 | Relleno de acometidas con material para relleno | m3 | 62,38 | $ 105.876,65 | $ 6.604.541,85 | 62,38 | 0,3577% | $ | 6.604.585,26 |
| 12,2,19 | Tanque elevado 2000L | Und | 1,00 | $ 1.834.065,61 | $ 1.834.065,61 | | - | $ | - |
| **12,3** | **APARATOS SANITARIO Y ACCESORIOS** | | | | | | | | |
| 12,3,1 | Suministro e instalación de sanitario. | Und | 6,00 | $ 2.737.916,32 | $ 16.427.497,90 | | - | $ | - |
| 12,3,2 | Lavamanos Institucional | Und | 2,00 | $ 653.627,77 | $ 1.307.255,53 | | - | $ | - |
| 12,3,3 | Lavamanos triple poceta | Und | 2,00 | $ 1.221.138,44 | $ 2.442.276,87 | | - | $ | - |
| 12,3,4 | Instalación de indicador señal de baños hombres, mujeres. | Und | 2,00 | $ 64.006,78 | $ 128.013,56 | | - | $ | - |
| 12,3,5 | Suministro e instalacion de barras en acero inoxidable satinado para discapacitados | Und | 2,00 | $ 1.313.805,61 | $ 2.627.611,21 | | - | $ | - |
| 12,3,6 | Meson en granito pulido lavado para lavamanos triple | Und | 2,00 | $ 2.173.898,90 | $ 4.347.797,80 | | - | $ | - |
| 12,3,7 | Suministro e instalación de orinal. | Und | 2,00 | $ 629.947,53 | $ 1.259.895,05 | | - | $ | - |
| 12,3,8 | Suministro e instalación de lavatrapero | Und | 2,00 | $ 753.528,14 | $ 1.507.056,29 | | - | $ | - |
| 12,3,9 | Suministro e instalación de lavaplatos | Und | 1,00 | $ 753.528,14 | $ 753.528,14 | | - | $ | - |
| 12,3,10 | Suministro e instalación de poceta tipo lavaplatos institucional en acero inoxidable incluye griferia y accesorios | Und | 1,00 | $ 1.536.453,29 | $ 1.536.453,29 | | - | $ | - |
| 12,3,11 | Meson en granito pulido de 2.05 x 0,60 x 0,10 edificio de servicio | Und | 1,00 | $ 2.367.481,87 | $ 2.367.481,87 | | - | $ | - |
| **12,4** | **RED DE GAS NATURAL** | | | | | | | | |
| 12,4,1 | Suministro e instalación de tubería para red interna de gas PE, incluyendo accesorios de unión y fijación. | ML | 19,30 | $ 116.951,10 | $ 2.257.156,20 | | - | $ | - |
| 12,4,2 | Suministro e instalación de válvula de corte para punto de consumo de gas. | Und | 1,00 | $ 138.079,38 | $ 138.079,38 | | - | $ | - |
| 12,4,3 | Suministro e instalación de punto de salida para gas, incluyendo terminal, adaptadores y accesorios de conexión. | Und | 1,00 | $ 89.075,88 | $ 89.075,88 | | - | $ | - |
| 12,4,4 | Prueba de hermeticidad, limpieza, rotulado y puesta en servicio de la instalación de gas. | Gl | 1,00 | $ 387.107,62 | $ 387.107,62 | | - | $ | - |
| **Subtotal** | | | | | **$ 126.450.174,22** | | **4,16%** | **$** | **76.792.908,94** |
| **13,0** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | |
| **13,1** | **SALIDAS ELECTRICAS** | | | | | | | | |
| 13,1,1 | Salida de interruptor en muro en tuberia SCH40, incluye: cable cobre No. 12, tuberia, accesorios. | Und | 4,00 | $ 202.922,56 | $ 811.690,26 | | - | $ | - |
| 13,1,2 | Salida de tomacorriente en muro en tuberia SCH40, incluye: cable cobre No. 12, tuberia, accesorios. | Und | 7,00 | $ 206.899,16 | $ 1.448.294,12 | | - | $ | - |
| 13,1,3 | Salida de tomacorriente GFCI en muro en tuberia SCH40, incluye: cable cobre No. 12, tuberia, accesorios. | Und | 6,00 | $ 253.543,16 | $ 1.521.258,96 | | - | $ | - |
| 13,1,4 | Salida de tomacorriente 220V en muro en tuberia PVC, incluye: cable cobre No. 10, tuberia, accesorios. | Und | 1,00 | $ 224.019,64 | $ 224.019,64 | | - | $ | - |
| 13,1,5 | Salida de luminaria led 25W, 220V en tuberia PVC, incluye: cable encauchetado 4xNo. 14, tuberia, accesorios. | Und | 2,00 | $ 436.791,51 | $ 873.583,01 | | - | $ | - |
| 13,1,6 | Salida de luminaria led 35W, 220V en tuberia PVC, incluye: cable encauchetado 4xNo. 14, tuberia, accesorios. | Und | 10,00 | $ 436.791,51 | $ 4.367.915,07 | | - | $ | - |
| 13,1,7 | Salida de iluminacion en techo en tuberia SCH40, incluye: cable de cobre No. 12, tuberia, accesorios. | Und | 12,00 | $ 160.044,22 | $ 1.920.530,62 | | - | $ | - |
| 13,1,8 | Salida de iluminacion en techo en tuberia EMT a la vista, incluye: cable de cobre No. 12, tuberia, accesorios. | Und | 14,00 | $ 183.199,32 | $ 2.564.790,43 | | - | $ | - |
| **13,2** | **LUMINARIAS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | |
| 13,2,1 | Luminaria panel led de 15W. | Und | 8,00 | $ 142.980,21 | $ 1.143.841,69 | | - | $ | - |
| 13,2,2 | Luminaria panel led de 20W. | Und | 4,00 | $ 160.155,38 | $ 640.621,51 | | - | $ | - |
| 13,2,3 | Luminaria Hera led. | Und | 14,00 | $ 487.364,80 | $ 6.823.107,20 | | - | $ | - |
| 13,2,4 | Luminaria led de 25W, 220V | Und | 2,00 | $ 1.007.749,60 | $ 2.015.499,20 | | - | $ | - |

| | FORMATO | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | **SEMANA 10** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CCC CIENAGA<br>NIT: 902 046 185 - 4<br>RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA | **OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | 328 de 18 de Marzo de 2026 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTER CIENGA AVC<br>NIT: NIT 902 047 304 - 9<br>RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.** | 325 de 17 de Marzo de 2026 | **OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | |
| **VALOR INICIAL** | $ 1.846.610.986,00 | | |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | 5 meses | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA. | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA** | $ 1.846.610.986,00 | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | miércoles, 15 de julio de 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | martes, 15 de diciembre de 2026 | | |

| **SEMANA NUMERO.** | **10** | **DEL** | 14/09/2026 | **AL** | 19/09/2026 | **DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO** | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2,5 | Luminaria led de 35W, 220V | Und | 10,00 | $ 1.007.749,60 | $ 10.077.496,00 | | - | $ | - |
| 13,2,6 | Pedestal para luminaria 5mts con brazo sencillo de 0,5 mts con 0° para el anden, con base y canastilla. | Und | 8,00 | $ 4.138.959,50 | $ 33.111.676,00 | | - | $ | - |
| 13,2,7 | Pedestal para luminaria 5mts con brazo doble de 0,5 mts con 0° para el anden, con base y canastilla. | Und | 2,00 | $ 4.233.599,50 | $ 8.467.199,00 | | - | $ | - |
| **13,3** | **TABLEROS Y PROTECCIONES** | | | | | | | | |
| 13,3,1 | Gabinete principal, incluye barraje, protecciones, DPS protecciones parciales. | Und | 1,00 | $ 22.679.206,33 | $ 22.679.206,33 | | - | $ | - |
| 13,3,2 | Gabinete control iluminacion parque, incluye barraje, protecciones, control de programacion. | Und | 1,00 | $ 5.888.435,80 | $ 5.888.435,80 | | - | $ | - |
| 13,3,3 | Tablero monofásico con puerta y chapa plástica de 6 circuitos 240/120V, 100 A | Und | 2,00 | $ 1.366.555,67 | $ 2.733.111,33 | | - | $ | - |
| 13,3,4 | Interruptor automático enchufable 1x20 A | Und | 8,00 | $ 136.265,57 | $ 1.090.124,53 | | - | $ | - |
| **13,4** | **ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES** | | | | | | | | |
| 13,4,1 | Acometida en 2F#4 THWN + 1N#4 THWN + 1T#2, P/PAL | m | 35,00 | $ 280.695,33 | $ 9.824.336,52 | | - | $ | - |
| 13,4,2 | Alimentador en 2F#8+ 1N#8+1T#10 THWN | m | 48,00 | $ 188.627,75 | $ 9.054.131,92 | | - | $ | - |
| 13,4,3 | Circuito ramal en 2F#10+ 1T#10 THWN | m | 155,00 | $ 268.040,20 | $ 41.546.230,75 | | - | $ | - |
| 13,4,4 | Circuito ramal en 1F#12+ 1N#12+1T#12 THWN | m | 60,00 | $ 226.829,33 | $ 13.609.759,90 | | - | $ | - |
| **13,5** | **CAJAS DE REGISTRO** | | | | | | | | |
| 13,5,1 | Caja de registro de 40x40x60 cms | Und | 10,00 | $ 963.765,40 | $ 9.637.654,00 | 8,00 | 0,4175% | $ | 7.710.123,20 |
| 13,5,2 | Caja de registro de 60x60x60 cms | Und | 3,00 | $ 1.326.309,40 | $ 3.978.928,20 | 3,00 | 0,2155% | $ | 3.978.928,20 |
| **13,6** | **PUESTA A TIERRA** | | | | | | | | |
| 13,6,1 | Sistema de puesta a tierra compuesta por 4 varillas C.W. 5/8'x2.40 mts amarradas a cable 2/0 Cu - desnudo. | Und | 1,00 | $ 5.672.750,43 | $ 5.672.750,43 | 1,00 | 0,3072% | $ | 5.672.750,43 |
| **13,7** | **SISTEMA FOTOVOLTAICO** | | | | | | | | |
| 13,7,1 | Sistema e instalación de paneles solares y accesorios de fijación para us sistema fotovoltaico 9,94Kw | Und | 1,00 | $ 14.969.537,96 | $ 14.969.537,96 | | - | $ | - |
| 13,7,2 | Suministro e instalación de inversor fotovoltaico sun2000-8KTL-LC0, completamente configurado. | Und | 1,00 | $ 5.861.908,68 | $ 5.861.908,68 | | - | $ | - |
| 13,7,3 | Suministro e instalación de tablero de protecciones AC/DC, incluyendo interruptores, fusibles, DPS y seccionadores. | Und | 1,00 | $ 1.817.124,40 | $ 1.817.124,40 | | - | $ | - |
| 13,7,4 | Suministro e instalación del sistema de cableado de potencia AC/DC, canalizaciones, puesta a tierra y accesorios eléctricos. | Und | 1,00 | $ 2.633.585,50 | $ 2.633.585,50 | | - | $ | - |
| 13,7,5 | Pruebas, configuración, puesta en marcha, señalización y entrega del sistema fotovoltaico en operación. | Gl | 1,00 | $ 386.828,00 | $ 386.828,00 | | - | $ | - |
| **Subtotal** | | | | | **$ 227.395.176,97** | | **0,94%** | **$** | **17.361.801,83** |
| | **CERTIFICACIONES RETIE - RETILAP** | | 1,00 | $ 13.440.042,00 | **$ 13.440.042,00** | | - | $ | - |
| | **IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO** | | 1,00 | $ 16.794.462,00 | **$ 16.794.462,00** | 0,44 | **0,40%** | $ | 7.415.736,47 |
| | **PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)** | | 1,00 | $ 17.282.430,00 | **$ 17.282.430,00** | 0,44 | **0,41%** | $ | 7.631.202,86 |
| | **TOTAL ACUMULADO** | | | | **$ 1.846.610.986,00** | | **27,1547%** | **$** | **501.441.785,07** |

| | FORMATO | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | **SEMANA 10** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO CCC CIENAGA<br>NIT: 902 046 185 - 4<br>RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA | **OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | 328 de 18 de Marzo de 2026 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA | |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO INTER CIENGA AVC<br>NIT: NIT 902 047 304 - 9<br>RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.** | 325 de 17 de Marzo de 2026 | **OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | |
| **VALOR INICIAL** | $ 1.846.610.986,00 | | |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | 5 meses | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA. | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA** | $ 1.846.610.986,00 | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | miércoles, 15 de julio de 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | martes, 15 de diciembre de 2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA NUMERO.** | **10** | **DEL** | 14/09/2026 | **AL** | 19/09/2026 | **DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO** | 67 |

| Realizó. | Revisó. | Supervisó. |
|---|---|---|
| ANDRES FERIA AGUIRRE<br>INTERVENTORIA | ADALBERTO SOTOMAYOR RUIZ<br>SECRETRARIO DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO | DAVID GONZALES PUENTE<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| DANILO DURANGO BOTIA<br>REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO | | |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**










**OBSERVACIONES**

En el transcurso de esta semana se realizaron las actividades conrrespondientes al suministro, figuracion y colocacion del acero horizontal de dovelas, la colocacion del anclaje epoxico a traccion y el mortero de las dovelas en el Area Polivalente.
Igualmente en la Cubierta del Edificio de Servicio se culmino con la mamposteria de la cuchilla, la viga cinta de remate de cubierta; en el Area polivalente se procedio a la instalacion de los perfiles corespondientes a la estructura de la cubierta.
En el Capitulo de Plazas y Andenes, se han iniciado las actividades correspondientes a la losa de concreto estampado color naranja al igual que la malla electrosoldada de esta, se han fabricado bordillos en sitio y se ha culminado con la graderia en mamposteria.
Con respecto a las Instalaciones Hidrosanitarias en el subcapitulo de la Red Sanitaria, se culmino con la instalaron los accesorios sanitarios tanto de Ø4" y Ø2"; en el subcapitulo Red de Agua Potable se realizo la localizacion y replanteo de estas redes all igual que las excavaciones, retiro de material y suministro e instalacion de las redes tanto de Ø1", Ø3/4" y Ø1/2" asi como sus respectivos accesorios y los respectivos rellenos de estas excavaciones.
En el Capitulo de Instalaciones Electricas se a realizado la construccion de las cajas de regitro de 60x60x60 y se iniciaron las de 40x40x40; igualmente se culmino la instalacion del sistema de puesta a tierra.
Se continuan tambien con las actividades correspondientes a los Programas de impacto ambiental y el Plan de Gestion Integral de la Obra (PGIO).
