JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S
construcción e interventoría

Florencia, septiembre 24 del 2026
ADM-011-JACOING-BOX

Señores:
COREMPORIUM S.A.S
Ing. DANIEL RICARDO GONZALEZ SOTO
Representante Legal
La ciudad.

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE COBRO PARCIAL No. 03 **PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JULIO DE 2026**

REFERENCIA: Contrato de obra pública N°. COP-2026-002 cuyo objeto es "Construcción de la segunda fase del box culvert en el Barrio La Libertad del Municipio de El Doncello departamento del Caquetá".

Respetados señores:

En atención al desarrollo del contrato relacionado en el asunto y conforme a lo pactado contractualmente, me permito remitir para su revisión, verificación y aval el Informe de Cobro Parcial No. 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Mayo y el 27 de julio de 2026, por un valor presentado de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($426.868.794,00).

Amortizando el 100% del Anticipo por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($238.202.123,00), dejando así para cobro de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (188.666.671,00)

Para dar trámite al respectivo cobro, se relacionan uno a uno los entregables que contiene el informe:

- Informe de cobro No. 01 (incluye registro fotográfico).
- Certificado de parafiscales.
- Planillas de seguridad social.
- Fic Sena.
- Memorias de cantidades.
- Bitácora de obra.
- Informe de Cumplimiento de SST
- Informe de Cumplimiento de PMA
- Informe de Cumplimiento de PMT
- Resultados de Laboratorio
- Soportes de la Administración
- Legalización del Anticipo
- Certificados de calidad y fichas técnicas.
- Rut.

- Certificado de la cuenta bancaria.
- Factura electrónica.

Con base en el avance físico de obra verificado y documentado en el Acta Parcial de Obra No. 01 y en el Informe de Ejecución y Cobro No. 01, solicitamos respetuosamente que se avale el pago y, posterior a ello, se inicie el trámite para el desembolso correspondiente.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita agilizar el proceso.

Sin otro en particular,

Atentamente,

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON
R.L. JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.502.544-8
Copia: Archivo.
Elaboró: Y.S.V.H
Folios: (01)
Anexos: (00)

JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S

construcción e interventoría

ACTA DE OBRA

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellar@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE EL DONCELLO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.01

CÓDIGO	MSE-FR-07		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE EL DONCELLO
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ
ACTA N°: 01 PARCIAL DE OBRA
VALOR DEL PRESENTE ACTA: $ 426.868.794,00
PERIODO MES: DEL 27 DE MAYO DEL 2026 AL 27 DE JULIO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: DD 24 / MM 09 / AA 2026

CONTRATO No : COP-2026-002
CONTRATISTA: JACO INGENIERIA ZOMAC SAS/ R.L. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTODE CAQUETÁ"
LOCALIZACIÓN : MUNICIPIO DE EL DONCELLO- DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
INTERVENTOR: COREMPORIUM S.A.S / R.L. DANIEL RICADO GONZALEZ SOTO

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES
PLAZO ACUMULADO: TRES (03) MESES
FECHA DE CELEBRACION: 05 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE INICIACION: 27 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR DE ADICION No. N/A
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 27 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 476.404.246,00
FECHA DE VENCIMIENTO FINAL: 27 DE AGOSTO DE 2026
VALOR TOTAL FINAL: $ 476.404.246,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES ORIGINALES: ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 Fecha 12 de Diciembre de 2025: CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA: ACUMULADO ACTAS PARCIALES: CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA: CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO ACTA No. 02 FINAL: CANTIDAD	VALOR
1.PRELIMINARES																
1			1,1	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	225,00	6.325	$ 1.423.125,00		$ -		$ -	210,00	$ 1.328.250,00	210,00	$ 1.328.250,00
2			1,2	RELLENO CON CRUDO DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	45,00	238.013	$ 10.710.585,00		$ -			42,00	$ 9.996.546,00	42,00	$ 9.996.546,00
2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
3			2,1	CONCRETO 2000 PSI - 13.8 MPa MEZCLA EN OBRA SOLADO DE LIMPIEZA E=0,07	M3	14,00	1.301.392	$ 18.219.488,00		$ -		$ -	12,25	$ 15.942.052,00	12,25	$ 15.942.052,00
4			2,2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	134,00	1.437.019	$ 192.560.546,00		$ -		$ -	124,74	$ 179.253.750,00	124,74	$ 179.253.750,00
5			2,3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	11.233,00	16.033	$ 180.098.689,00		$ -		$ -	10.915,66	$ 175.010.777,00	10.915,66	$ 175.010.777,00
3. EXCAVACIONES Y RELLENOS																
6			3,1	EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	240,00	84.701	$ 20.328.240,00		$ -		$ -	239,40	$ 20.277.419,00	239,40	$ 20.277.419,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL								**$ 423.340.673,00**		$ -		$ -		$ 401.808.794,00		$ 401.808.794,00
COMPONENTE SST								**$ 24.790.000,00**						$ 14.110.000,00		
COMPONENTE PMA								**$ 15.225.000,00**						$ 10.950.000,00		
PMT								**$ 13.048.573,00**								
ADMINISTRACION							35%									
IMPREVISTO																
UTILIDAD							5%									
TOTAL COSTO PROYECTO								**$ 476.404.246,00**		$ -		$ -		$ 426.868.794,00		$ 401.808.794,00

VALOR TOTAL CONTRATO $ 476.404.246,00

% Amortización: 50%
Saldo a amortizar: $ 238.202.123,00
Saldo Anticipo: $ 238.202.123,00
Saldo Amortizado: $ 238.202.123,00

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 426.868.794,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA $ 188.666.671,00

Saldo básico Por Ejecutar: $ 49.535.452,00

VALOR BÁSICO EN LETRAS A PAGAR: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS.

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	$ 426.868.794,00	$ 426.868.794,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Para constancia de lo anterior firman

NOTA:
1: El Interventori Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Firma:
Nombre :
JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON
Contratista: CONSORCIO OBRAS 25
Representante Legal

Firma:
Nombre:
DANIEL RICADO GONZALEZ SOTO
COREMPORIUM S.A.S
R.L Interventoria

Firma:
Nombre: JAIR DIAZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL - ORDENADOR DEL GASTO
MUNICIPIO DE EL DONCELLO

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S

construcción e interventoría

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellar@hotmail.com

MUNICIPIO DE EL DONCELLO

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD 24	MM 9	AA 2026	**CORTE Nº**	01 PARCIAL	**ELABORÓ:**	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTODE CAQUETÃ"								
INTERVENTOR	COREMPORIUM S.A.S / R.L. DANIEL RICADO GONZALEZ SOTO			**NIT.**	901.407.449-2	**CONTRATO Nº**	INTV-2026-002		
CONTRATISTA	JACO INGENIERIA ZOMAC SAS / R.L. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON			**NIT.**	901.502.544-8	**CONTRATO Nº**	COP-2026-002		

ITEM	1,1	**DESCRIPCIÓN**	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	**UND**	M2	**UBICACIÓN**	BARRIO LA LIBERTAD





Localización	Longitud [m]	Ancho [m]	Alto [m]	Cantidad [N°]	Medida Total
LOCALIZACION Y REPLANTEO	70,00	3,00		1,00	210,00

MUNICIPIO DE EL DONCELLO

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA


FECHA	DD	24	MM	9	AA	2026	**CORTE N°**	01 PARCIAL	**ELABORÓ:** JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTODE CAQUETÂ"

INTERVENTOR	COREMPORIUM S.A.S / R.L. DANIEL RICADO GONZALEZ SOTO	**NIT.**	901.407.449-2	**CONTRATO N°**	INTV-2026-002
CONTRATISTA	JACO INGENIERIA ZOMAC SAS / R.L. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON	**NIT.**	901.502.544-8	**CONTRATO N°**	COP-2026-002

ITEM	1.2	**DESCRIPCIÓN**	RELLENO CON CRUDO DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	**UND**	M3	**UBICACIÓN**	BARRIO LA LIBERTAD



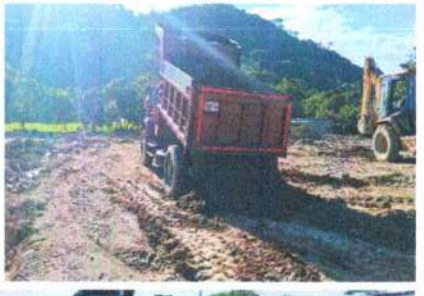



Localización	Longitud [m]	Ancho [m]	Alto [m]	Cantidad [N°]	Medida Total
Mejoramiento bajo el nivel de placa inferior	70,00	3,00	0,20	1,00	42,00
				Sub-total	42,00
				TOTAL	42,00

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA	ING. DANIEL RICARDO GONZALEZ SOTO / ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

MUNICIPIO DE EL DONCELLO

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	9	AA	2026	**CORTE N°**	01 PARCIAL	**ELABORÓ:** JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTODE CAQUETÃ"				
INTERVENTOR	COREMPORIUM S.A.S / R.L. DANIEL RICADO GONZALEZ SOTO	**NIT.**	901.407.449-2	**CONTRATO N°**	INTV-2026-002
CONTRATISTA	JACO INGENIERIA ZOMAC SAS / R.L. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON	**NIT.**	901.502.544-8	**CONTRATO N°**	COP-2026-002

ITEM	2.1	**DESCRIPCIÓN**	CONCRETO 2000 PSI - 13.8 MPa MEZCLA EN OBRA SOLADO DE LIMPIEZA E=0,07	**UND**	M3	**UBICACIÓN**	BARRIO LA LIBERTAD







Localización	Longitud [m]	Ancho [m]	Alto [m]	Cantidad [N°]	Medida Total
BOX COULVERT SOLADO	70,00	2,50	0,07	1,00	12,25
				Sub-total	12,25
				TOTAL	12,25

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA	ING. DANIEL RICARDO GONZALEZ SOTO / ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

MUNICIPIO DE EL DONCELLO

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	9	AA	2026	**CORTE N°**	01 PARCIAL	**ELABORÓ:** JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTODE CAQUETÂ"

INTERVENTOR	COREMPORIUM S.A.S / R.L. DANIEL RICADO GONZALEZ SOTO	**NIT.**	901.407.449-2	**CONTRATO N°**	INTV-2026-002
CONTRATISTA	JACO INGENIERIA ZOMAC SAS / R.L. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON	**NIT.**	901.502.544-8	**CONTRATO N°**	COP-2026-002

ITEM	2.2	**DESCRIPCIÓN**	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	**UND**	M3	**UBICACIÓN**	BARRIO LA LIBERTAD











Localización	Longitud [m]	Ancho [m]	Alto [m]	Cantidad [N°]	Medida Total
BOX CULVERT CONCRETO CAJÓN	70,00	0,25	1,00	1,00	17,50
	70,00	0,25	2,50	1,00	43,75
	70,00	0,25	2,50	1,00	43,75
	70,00	0,25	1,00	1,00	17,50
BOX CULVERT ALETAS DESCOLE	1,50	0,25	1,30	1,00	0,49
BOX CULVERT ALETAS DESCOLE	1,50	0,25	1,30	1,00	0,49
ZAPATAS DE ALETAS DE DESCOLE	1,50	0,75	0,25	1,00	0,28
ZAPATAS DE ALETAS DE DESCOLE	1,50	0,75	0,25	1,00	0,28
SOLERA DE DESCOLE	0,55	2,50	0,25	1,00	0,34
DENTELLON	4,10	0,25	0,35	1,00	0,36
				Sub-total	124,74
				TOTAL	124,74

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA	ING. DANIEL RICARDO GONZALEZ SOTO / ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

MUNICIPIO DE EL DONCELLO

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD 24	MM 9	AA 2026	**CORTE Nº**	01 PARCIAL	**ELABORÓ:**	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTODE CAQUETÀ"								
INTERVENTOR	COREMPORIUM S.A.S / R.L. DANIEL RICADO GONZALEZ SOTO			**NIT.**	901.407.449-2	**CONTRATO Nº**	INTV-2026-002		
CONTRATISTA	JACO INGENIERIA ZOMAC SAS / R.L. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON			**NIT.**	901.502.544-8	**CONTRATO Nº**	COP-2026-002		

ITEM	2,3	**DESCRIPCIÓN**	ACERO FIGURADO 60000 PSI	**UND**	KG	**UBICACIÓN**	BARRIO LA LIBERTAD



Localización	Diametro	Longitud	Cantidad	Peso/Ml	Peso/elemento	Cantidad de elementos	Metros Box	Total
Acero Longitudinal del Box Placa Inferior dos parrilas	#4	1,00	2,00	0,99	1,98	11,00	70,00	1.524,60
Acero Longitudinal del Box superiror Doble parrilla	#4	1,00	2,00	0,99	1,98	11,00	70,00	1.524,60
Acero Longitudinal del Box muros laterales	#4	1,00	4,00	0,99	3,96	5,00	70,00	1.386,00
Acero para Translape longitudinal 74 varillas a lo largo del Box (dobles parrillas placa superior-inferior y muros) , en 75 metros se deben realizar 14 translapos	#4	0,90	1,00	0,99	0,89	64,00	14,00	798,34
Acero Anillo exterior lateral del cuerpo Incluye lado izq y lado derecho	#4	3,00	2,00	0,99	5,94	300,00		1.782,00
Acero Anillo interno lateral del cuerpo	#4	1,50	2,00	0,99	2,97	300,00		891,00
Acero Anillo Superior placa supeiro doble parrilla	#4	2,40	2,00	0,99	4,75	300,00		1.425,60
Acero Anillo inferior lateral del cuerpo	#4	2,40	2,00	0,99	4,75	300,00		1.425,60
Acero Longitudinal de aleta de empalme 1	#4	1,50	12,00	0,99	17,82	1,00		17,82
Acero Longitudinal de aleta de empalme 2	#4	1,50	12,00	0,99	17,82	1,00		17,82
Acero Transversal de aleta de empalme 1	#4	1,50	12,00	0,99	17,82	1,00		17,82
Acero tranversal de aleta de empalme 2	#4	1,50	12,00	0,99	17,82	1,00		17,82
Acero de la Zapata Long de empalme 1	#4	1,50	8,00	0,99	11,88	1,00		11,88
Acero de la Zapata Long de empalme 2	#4	1,50	8,00	0,99	11,88	1,00		11,88
Acero de la Zapata trans de empalme 1	#4	0,65	12,00	0,99	7,72	1,00		7,72
Acero de la Zapata Trans de empalme 2	#4	0,65	14,00	0,99	9,01	1,00		9,01
Acero Longitudinal de solera	#4	0,48	2,00	0,99	0,94	10,00		9,41
Acero Transve de placa de solera	#4	2,35	2,00	0,99	4,65	2,00		9,31
Acero Longitudinal de dentellon	#4	3,95	1,00	0,99	3,91	4,00		15,64
Acero Transve de placa de dentellon	#3	1,24	1,00	0,56	0,69	17,00		11,80
						Sub-total		10.915,66
						TOTAL		10.915,66

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA	ING. DANIEL RICARDO GONZALEZ SOTO / ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA		

MUNICIPIO DE EL DONCELLO

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	24	MM	9	AA	2026	**CORTE N°**	01 PARCIAL	**ELABORÓ:** JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON / ING. RESIDENTE DE OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTODE CAQUETÃ"								
INTERVENTOR	COREMPORIUM S.A.S / R.L. DANIEL RICADO GONZALEZ SOTO						**NIT.**	901.407.449-2	**CONTRATO N°** INTV-2026-002
CONTRATISTA	JACO INGENIERIA ZOMAC SAS / R.L. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON						**NIT.**	901.502.544-8	**CONTRATO N°** COP-2026-002

ITEM	3.1	**DESCRIPCIÓN**	EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**UND**	M3	**UBICACIÓN**	BARRIO LA LIBERTAD











Localización	Area [m2]	Ancho [m]		Cantidad [N°]	Medida Total
Excavacion del box según la implantacion topografia , Ancho de 3.00 metros , 2.50 metros de ancho del box terminnado + 0.25 metros a cada lado para ubicar y retirar formaletas externas para fundicion.	79,80	3,00		1,00	239,40

JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S

construcción e interventoría

INFORME DE OBRA

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellar@hotmail.com

INFORME DE OBRA 1

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellar@hotmail.com

Fecha de Elaboración: 29 de junio del 2026

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. COP-2026-002

"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ."

INFORME DE EJECUCIÓN No.1

BOX CULVERT – BARRIO LA LIBERTAD

(DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026)

Presentado por:

JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S

Presentado a:

EL DONCELLO – CAQUETÁ
JUNIO DE 2026

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellar@hotmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. CONDICIONES FISICAS INICIALES 5
4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA 5
5. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 6
5.1. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA 6
5.2. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 9
6. INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA 10
6.1. CONTROL DE POLIZAS. 10
6.2. PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. 13
7. INFORME PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 14
7.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO. 14
7.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 16
7.3. ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO 16
7.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME. 17
8. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 17
9. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA 18
9.1. ACTAS GENERADAS 18
10. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA 19
10.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA 19
11. ESTADO DEL TIEMPO 22
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO 24
13. CONCLUSIONES 36

Ilustración 1. Localización Box Culvert – Barrio La Libertad 5
Ilustración 2. Avance de obra - pesos 7
Ilustración 3. Avance de obra - Porcentaje 7
Ilustración 4. Cronograma de Obra – Construcción de la Segunda Fase del Box Culvert 8
Ilustración 5.avance físico de obra 9

Tabla 1. Valor programado Vs Valor reprogramado Vs Valor ejecutado. 6
Tabla 2. % programado Vs % reprogramado Vs % ejecutado. 7

Tabla 3. Relación del Estado Financiero del Contrato. 9
Tabla 4. Póliza del Contrato de Obra No. COP-2026-002 10
Tabla 5. Póliza Ajustada Contrato de Obra No. COP-2026-002 11
Tabla 6. Póliza Actualizada al Acta de Inicio 12
Tabla 7. Condiciones Iniciales del Contrato de Obra. 14
Tabla 8. Resumen del Avance de Ejecución Física de Obra 18
Tabla 9. Resumen de las Actas Generadas. 18
Tabla 10. Personal Inscrito a la Ejecución del Contrato de Obra. 19
Tabla 11. Personal Profesional Inscrito en Aportes de Seguridad Social y Parafiscales. 19
Tabla 12. Personal Profesional Inscrito en Aportes de Seguridad Social y Parafiscales. 20
Tabla 13. Estado del Tiempo mayo 22
Tabla 14- Estado del Tiempo junio 23

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se exponen los avances de obra ejecutados de conformidad con las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en el **Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002**, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"**. El informe presenta el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período correspondiente, así como el seguimiento técnico, administrativo, financiero y presupuestal del proyecto.

El Municipio de El Doncello adelantó el proceso de contratación con el propósito de dar continuidad a la construcción de la segunda fase del Box Culvert ubicado en el barrio La Libertad, una obra orientada a mejorar las condiciones del sistema de drenaje, optimizar el manejo de aguas y fortalecer la infraestructura urbana del sector, contribuyendo a la reducción del riesgo de afectaciones ocasionadas por las escorrentías y el mejoramiento de la movilidad de la comunidad.

Durante la ejecución del contrato se desarrollan las actividades contempladas en el presupuesto de obra, entre las que se destacan las labores preliminares, excavaciones, rellenos, estructuras en concreto reforzado y demás obras complementarias necesarias para la correcta construcción del Box Culvert, conforme a las especificaciones técnicas, planos y demás documentos contractuales.

El objetivo principal del proyecto es contribuir al mejoramiento de la infraestructura de drenaje del municipio, garantizando una obra funcional, segura y de calidad que permita mitigar problemas de inundación, proteger la infraestructura vial existente y brindar mejores condiciones de movilidad y bienestar a los habitantes del barrio La Libertad del municipio de El Doncello, Caquetá.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta en el barrio La Libertad, ubicado en la zona urbana del municipio de El Doncello, departamento del Caquetá, donde se desarrolla la construcción de la segunda fase del Box Culvert objeto del Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002.

A continuacion se detalla la ubicación geografica:



Ilustración 1. Localización Box Culvert – Barrio La Libertad

3. CONDICIONES FISICAS INICIALES

- **BARRIO LA LIBERTAD – MUNICIPIO DE EL DONCELLO**

El sector objeto de intervención presentaba deficiencias en la infraestructura de drenaje de aguas lluvias, lo que ocasionaba dificultades en la evacuación de los caudales superficiales, afectando la estabilidad de la vía y generando riesgo de inundaciones durante las temporadas de lluvia.

Las condiciones existentes hacían necesaria la construcción de la segunda fase del Box Culvert, con el fin de dar continuidad al sistema de drenaje, mejorar el manejo hidráulico del sector y garantizar un adecuado funcionamiento de la infraestructura, contribuyendo a la seguridad, movilidad y bienestar de la comunidad del barrio La Libertad del municipio de El Doncello, Caquetá.

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

La información general del Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002, suscrito entre el Municipio de El Doncello – Caquetá y JACO INGENIERÍA ZOMAC S.A.S., es la siguiente:

Contrato:	Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002.
Contratista:	JACO INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.
Objeto:	**"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ."**
Fecha de Celebración:	30 de abril de 2026.
Fecha Acta de Inicio:	27 de mayo de 2026.
Fecha de Terminación inicial:	26 de agosto de 2026.
Plazo Inicial:	Tres (03) Mes.

Prorroga de plazo:	N/A.
Plazo Final:	N/A.
Fecha de Terminación Final:	N/A.
Valor del Contrato inicial:	$476.404.246,00
Valor del Adición:	N/A.
Valor del Contrato final:	**$476.404.246,00**

5. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA

- **CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT – BARRIO LA LIBERTAD**

De acuerdo con la programación inicial del proyecto, presentada por el contratista y aprobada por la interventoría, para la fecha de corte del presente informe se estableció un avance físico-financiero ejecutado del 58,00%, equivalente a la ejecución de $276.314.462,68, vs una programación de 35,89% demostrando un rendimiento en obra superior en 22,11%.

A continuación, se presentan las tablas y gráficas comparativas del valor programado, valor reprogramado y valor ejecutado correspondientes al período objeto del presente informe:

Tabla 1. Valor programado Vs Valor reprogramado Vs Valor ejecutado.

Meses Calendario	Valor Programado Acumulado	Valor Reprogramado	Valor Ejecutado Acumulado
Mes 1	$ 170.989.440,25	$0,00	$ 276.314.462,68
Mes 2	$ 381.223.225,93	$0,00	$ 0,00
Mes 3	$ 476.404.246,00	$0,00	$ 0,00

Ilustración 2. Avance de obra - pesos



Tabla 2. % programado Vs % reprogramado Vs % ejecutado.

Meses Calendario	Valor Programado Acumulado	Valor Reprogramado	Valor Ejecutado Acumulado
Mes 1	35,89%	0%	58,00%
Mes 2	80,02%	0%	0,00%
Mes 3	100%	0%	0,00%

Ilustración 3. Avance de obra - Porcentaje

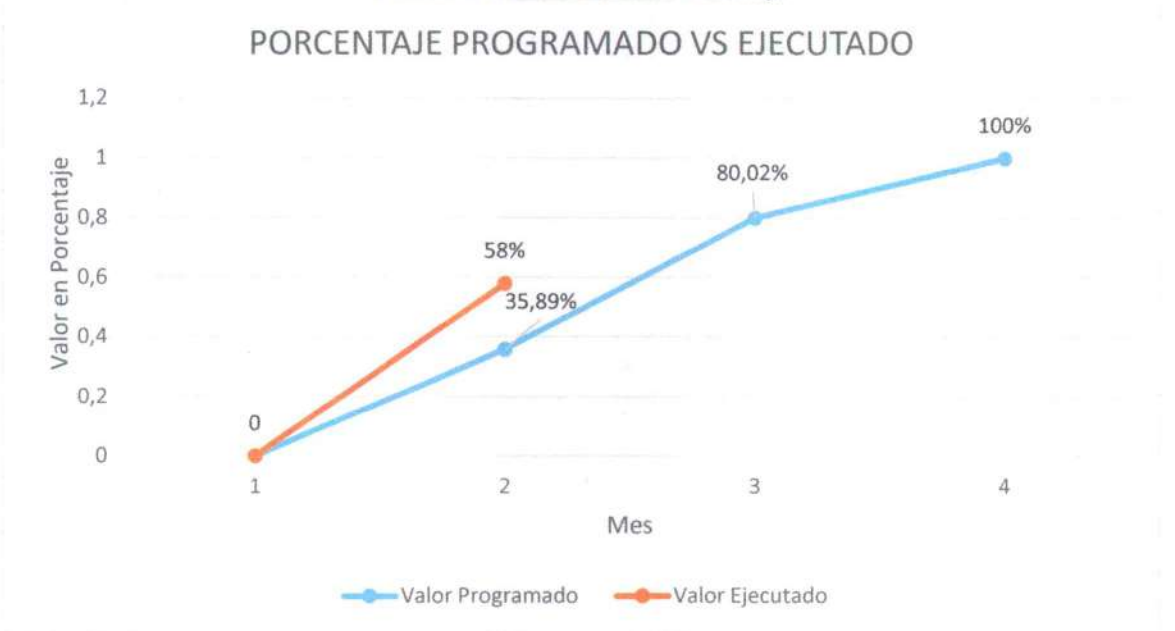


Ilustración 4. Cronograma de Obra – Construcción de la Segunda Fase del Box Culvert

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Predec	mié 27/05/2026	Fin	Detalles	Semestre 2 mes 1	mes 2	mes 3
	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	**90 días**	**$ 476.404.246,00**			**lun 24/08**	Costo	$ 170.989.440,25	$ 210.233.785,68	$ 96.181.020,06
	PRELIMINARES	**88 días**	**$ 12.133.710,00**		**lun 1/06/26**	**sáb 22/08**	Costo	$ 3.538.627,51	$ 5.084.699,76	$ 3.510.422,73
	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	3 días	$ 1.423.125,00		lun 1/06/26	sáb 22/08	Costo	$ 515.478,52	$ 532.661,13	$ 374.985,35
	RELLENO GRAVILLA O CRDUO DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	6 días	$ 10.710.585,00	10	mié 10/06/26	sáb 22/08	Costo	$ 3.023.148,99	$ 4.551.998,63	$ 3.135.437,38
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**80 días**	**$ 390.878.723,00**		**mié 10/06/26**	**lun 24/08**	Costo	$ 128.329.423,97	$ 185.729.332,19	$ 76.820.166,83
	CONCRETO 2000 PSI - 13.8 MPa MEZCLA EN C	5 días	$ 18.219.488,00	10	mié 10/06/26	lun 15/06	Costo	$ 18.219.488,00		
	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	76 días	$ 192.560.546,00	8CC+3 días	dom 14/06/26	lun 24/08	Costo	$ 45.289.733,68	$ 83.453.460,31	$ 63.817.352,00
	ACERO FIGURADO 60000 PSI	58 días	$ 180.098.689,00	4CC+1 d	jue 11/06/26	mar 4/08	Costo	$ 64.820.002,29	$ 102.275.871,88	$ 13.002.814,83
	EXCAVACIONES Y RELLENOS	**7 días**	**$ 20.328.240,00**		**mié 3/06/26**	**mié 10/08**	Costo	$ 20.328.240,00		
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	7 días	$ 20.328.240,00	3CC+3 días	mié 3/06/26	mié 10/08	Costo	$ 20.328.240,00		
	SISOMA	90 días	$ 40.015.000,00		lun 1/06/26	lun 24/08	Costo	$ 14.171.979,17	$ 14.644.378,47	$ 11.198.642,36
	PMT	90 días	$ 13.048.573,00		lun 1/06/26	lun 24/08	Costo	$ 4.621.369,60	$ 4.775.415,26	$ 3.651.788,14

5.2. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El resumen del estado financiero del Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002, con corte a la fecha del presente informe, se relaciona a continuación:

Tabla 3. Relación del Estado Financiero del Contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 476.404.246,00
VALOR ADICION	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 476.404.246,00
VALOR ANTICIPO	$ 238.202.123,00
VALOR PAGADO DEL ANTICIPO	$ 238.202.123,00
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	$ 276.314.462,68
VALOR A AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 238.202.123,00
VALOR PENDIENTE DE GIRO	$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE COBRO	$ 476.404.246,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

Nota aclaratoria:

El presente informe corresponde al avance de ejecución de la Construcción de la Segunda Fase del Box Culvert en el barrio La Libertad del municipio de El Doncello, Caquetá. El estado financiero refleja la ejecución acumulada del contrato con corte al presente informe, de conformidad con las actas de obra y los soportes financieros aprobados por la interventoría.

Ilustración 5.avance fisico de obra



6. INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA

6.1. CONTROL DE POLIZAS.

La información referente a las pólizas que amparan el Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002, se relacionan a continuación:

Tabla 4. Póliza del Contrato de Obra No. COP-2026-002

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
Aseguradora	**Nro.**	**Fecha de expedición**	**Anexo**
Seguros Mundial	61-40-101064833	06/05/2026	0
Descripción del Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	05/05/2026	05/02/2027	$ 95.280.849,20
Pago de Prestaciones Sociales	05/05/2026	05/08/2026	$ 47.640.424,60
Calidad del Servicio	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 95.280.849,20
Estabilidad de la Obra	05/05/2026	05/02/2027	$ 238.202.123,00
VALOR TOTAL ASEGURADO			$ 476.404.246,00
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
Aseguradora	**Nro.**	**Fecha de expedición**	**Anexo**
Seguros Mundial	61-40-101023576	06/05/2026	0
Descripción del Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Total Asegurado**
Amparo básico – Predios, labores y operaciones	05/05/2026	05/08/2026	$ 525.271.500,00
Patronal	05/05/2026	05/08/2026	
Contratistas y Subcontratistas	05/05/2026	05/08/2026	

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
Aseguradora	**Nro.**	**Fecha de expedición**	**Anexo**
Seguros Mundial	61-40-101023576	06/05/2026	0
Descripción del Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Total Asegurado**
Vehículos Propios y no Propios	05/05/2026	05/08/2026	

Tabla 5. Póliza Ajustada Contrato de Obra No. COP-2026-002

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
Aseguradora	**Nro.**	**Fecha de expedición**	**Anexo**
Seguros Mundial	61-44-101064833	01/06/2026	1
Descripción del Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	05/05/2026	05/08/2031	$ 95.280.849,20
Pago de Prestaciones Sociales	05/05/2026	05/08/2031	$ 47.640.424,60
Calidad del Servicio	05/05/2026	05/08/2031	$ 95.280.849,20
Estabilidad de la Obra	05/05/2026	05/08/2031	$ 238.202.123,00
VALOR TOTAL ASEGURADO			$ 476.404.246,00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
Aseguradora	**Nro.**	**Fecha de expedición**	**Anexo**
Seguros Mundial	61-40-101023576	01/06/2026	**1**
Descripción del Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Total Asegurado**
Amparo básico – Predios, labores y operaciones	05/05/2026	05/08/2026	$ 525.271.500,00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
Aseguradora	**Nro.**	**Fecha de expedición**	**Anexo**
Seguros Mundial	61-40-101023576	01/06/2026	**1**
Descripción del Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Total Asegurado**
Patronal	05/05/2026	05/08/2026	
Contratistas y Subcontratistas	05/05/2026	05/08/2026	
Vehículos Propios y no Propios	05/05/2026	05/08/2026	

Tabla 6. Póliza Actualizada al Acta de Inicio

SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
Aseguradora	**Nro.**	**Fecha de expedición**	**Anexo**
Seguros Mundial	61-44-101064833	01/06/2026	2
Descripción del Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	27/05/2026	27/02/2027	$ 95.280.849,20
Pago de Prestaciones Sociales	27/05/2026	27/08/2029	$ 47.640.424,60
Calidad del Servicio	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 95.280.849,20
Estabilidad de la Obra	27/05/2026	27/02/2027	$ 238.202.123,00
VALOR TOTAL ASEGURADO			$ 476.404.246,00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
Aseguradora	**Nro.**	**Fecha de expedición**	**Anexo**
Seguros Mundial	**61-40-101023576**	01/06/2026	**2**
Descripción del Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor Total Asegurado**
Amparo básico – Predios, labores y operaciones	27/05/2026	27/08/2026	$ 525.271.500,00
Patronal	27/05/2026	27/08/2026	
Contratistas y Subcontratistas	27/05/2026	27/08/2026	
Vehículos Propios y no Propios	27/05/2026	27/08/2026	

6.2. PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA LA EJECUCION.

Para la ejecución del presente proyecto se cuenta con el permiso ambiental correspondiente, cuya vigencia se mantiene desde la ejecución de la primera etapa del proyecto. El trámite de actualización del citado permiso ante la autoridad ambiental competente ya fue realizado y se encuentra debidamente gestionado, sin que ello haya afectado el normal desarrollo de las actividades contractuales.

7. INFORME PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

7.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.

El Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002 contempla la ejecución del siguiente componente:

- Construcción de la segunda fase del Box Culvert en el barrio La Libertad del municipio de El Doncello, departamento del Caquetá, por un valor de $476.404.246,00.

El presupuesto general del contrato se relaciona de la siguiente manera:

:

Tabla 7. Condiciones Iniciales del Contrato de Obra.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ								
N°	**ITEM**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**V. TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
				BOX CULVERT BARRIO LA LIBERTAD				
	1			**PRELIMINARES**				
1	1.1			LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	225,00	$ 6.325,00	$ 1.423.125,00
2	1.2			RELLENO CON CRUDO DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	45,00	$ 238.013,00	$ 10.710.585,00
	2			**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**				
3	2.1			CONCRETO 2000 PSI - 13.8 MPa MEZCLA EN OBRA SOLADO DE LIMPIEZA E=0,07	M3	14,00	$1.301.392,00	$ 18.219.488,00
4	2.2			CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	134,00	$1.437.019,00	$ 192.560.546,00

5	2.3			ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	11.233,00	$ 16.033,00	$ 180.098.689,00
	3			**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
6	3.1			EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	240,00	$ 84.701,00	$ 20.328.240,00
							COMPONENTE SST	**$ 24.790.000,00**
							COMPONENTE PMA	**$ 15.225.000,00**
							PMT	**$ 13.048.573,00**
							TOTAL	**$ 476.404.246,00**

ADMINISTRACION	**A=**	35%
IMPREVISTOS	**I=**	0%
UTILIDAD	**U=**	5%
VALOR TOTAL		**$ 476.404.246,00**

7.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

El Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002 no ha presentado modificaciones durante el período objeto del presente informe; por tanto, las actividades se ejecutan conforme al presupuesto y a las cantidades de obra inicialmente contratadas.

7.3. ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO.

A Durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002 no ha sido necesaria la incorporación de ítems no previstos, por cuanto las actividades ejecutadas se desarrollaron de conformidad con el presupuesto y las cantidades de obra inicialmente contratadas.

7.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A continuación, se relacionan las actividades y cantidades ejecutadas del presupuesto correspondiente a la construcción del box culvert ejecutadas desde el 27 de mayo al 26 de junio de 2026:

- ITEM 1.1. Localización y replanteo obra arquitectónica: La Interventoría verificó la ejecución de la localización y el replanteo topográfico del Box Culvert sobre el terreno, constatando la materialización de ejes, niveles y referencias de acuerdo con los planos del proyecto, así como el empalme con la estructura construida en la primera fase. Cantidad ejecutada: 210,00 m².

- ITEM 1.2. Relleno con crudo de río compactado mecánicamente: La Interventoría verificó la colocación, extensión y compactación mecánica del material de crudo de río empleado como mejoramiento de la base de apoyo de la estructura, comprobando la conformación y nivelación de la superficie de fundación de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. Cantidad ejecutada: 18,00 m³.

- ITEM 2.1. Concreto 2000 PSI (13.8 MPa) mezcla en obra – Solado de limpieza E=0,07: La Interventoría verificó la preparación de la superficie de fundación y la ejecución del solado de limpieza en concreto de 2000 PSI con espesor de 0,07 m, constatando que proporciona una superficie adecuada para el armado del acero y la posterior fundición de los elementos estructurales del Box Culvert. Cantidad ejecutada: 12,25 m³.

- ITEM 2.2. Concreto 3000 PSI (20.7 MPa) mezcla en obra: La Interventoría verificó la fundición del concreto estructural de 3000 PSI correspondiente a la placa inferior y los muros del Box Culvert, evidenciando la correcta instalación de formaletas, el vaciado, vibrado y curado del concreto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Cantidad ejecutada: 61,00 m³.

- ITEM 2.3. Acero figurado 60000 PSI: La Interventoría verificó el corte, figurado, armado y colocación del acero de refuerzo de 60000 PSI en la placa inferior y los muros del Box Culvert, constatando el cumplimiento de los diámetros, separaciones, traslapos, recubrimientos y demás especificaciones definidas en los planos estructurales. Cantidad ejecutada: 9.000,00 kg.

- ITEM 3.1. Excavación mecánica en seco en material común (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km): La Interventoría verificó la ejecución de la

excavación mecánica hasta las cotas de fundación establecidas en los diseños, así como la conformación de taludes y el retiro del material sobrante a una distancia menor de 5 km, de conformidad con las especificaciones del contrato. Cantidad ejecutada: 239,40 m³.

8. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El resumen del avance de ejecución de actividades de obra del contrato se denota a continuación:

Tabla 8. Resumen del Avance de Ejecución Física de Obra

Periodo	Avance Físico Programado	Avance Físico Reprogramado	Avance Físico del Proyecto	% Avance	% Retraso
Del 27 de mayo al 26 de junio del 2026.	$ 170.989.440,25	$0,00	$ 276.314.462,68	58,00%	0%
Acciones a Tomar					
Ninguna. La ejecución de las actividades correspondientes a la construcción de la segunda fase del Box Culvert en el barrio La Libertad del municipio de El Doncello se desarrolla de manera satisfactoria, de conformidad con la programación establecida y las especificaciones técnicas del contrato.					

9. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA

9.1. ACTAS GENERADAS.

Las actas generadas durante la ejecución del proyecto se relacionan a continuación:

Tabla 9. Resumen de las Actas Generadas.

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE MAYO DE 2026
ACTA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE MAYO DEL 2026
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DEL ACTA DE INICIO	NUEVE (09) DE JUNIO DE 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA DE REINICIO:	N/A
PRORROGA:	N/A
OTROSÍ Y/O MODIFICACIONES:	N/A
ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURÍA CUIDADANA	DIECINUEVE (19) DE MAYO DEL 2026
ACTA DE APROBACION DEL PERSONAL PROFESIONAL.	DOS (02) DE JUNIO DE 2026

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO	N/A

10. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

10.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA.

Personal Obligatorio para la Ejecución de la Obra: El personal obligatorio que se encuentra inscrito en la ejecución del contrato en el presente informe de cobro se relaciona a continuación:

Tabla 10. Personal Inscrito a la Ejecución del Contrato de Obra.

PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**% DE DEDICACIÓN**		**CÉDULA**
		Mayo	**Junio**	
JOSE ALBERTO ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	20%	20%	79.442.593
JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON	RESIDENTE DE OBRA	100%	100%	1.117.503.840
BRIDI JASBLEIDY MUÑOS TORRES	PROFESIONAL SST	100%	100%	1.018.406.112
EDICSON RAUL VELANDIA QUITIAN	ASESOR AMBIENTAL	50%	50%	80.096.122
KATHLEEN JULIETH MUÑOZ PÉREZ	VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	100%	100%	1.117.549.235

Aportes a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales: El personal que se encuentra inscrito en aportes de seguridad social y parafiscales en la ejecución del contrato de obra durante el mes de ejecución, el mismo se relaciona a continuación:

- **Mes de Mayo:**

Tabla 11. Personal Profesional Inscrito en Aportes de Seguridad Social y Parafiscales.

PERSONAL PROFESIONAL				
No.	**IDENTIFICACIÓN**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**PLANILLA**
1	79.442.593	JOSE ALBERTO ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	**9506779384**
2	1.117.503.840	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON	RESIDENTE DE OBRA	

3	1.018.406.112	BRIDI JASBLEIDY MUÑOS TORRES	PROFESIONAL SST	
4	80.096.122	EDICSON RAUL VELANDIA QUITIAN	ASESOR AMBIENTAL	
5	1.117.549.235	KATHLEEN JULIETH MUÑOZ PÉREZ	VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	

PERSONAL OPERATIVO				
No.	**IDENTIFICACIÓN**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**PLANILLA**
1	1.007.499.293	PALENCIA SEPULVEDA YESID	MAESTRO	**9506779384**
2	1.117.813.160	HENAO ALVAREZ MANUEL	OFICIAL DE OBRA	
3	1.115.942.681	RESTREPO MENDEZ LEIDER FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	
4	1.117.458.076	ROMERO ROMERO ELLYS STEVER	AYUDANTE DE OBRA	
5	18.385.025	MONTOYA OSORIO JAIR	AUXILIAR VIAL	
6	1.117.836.054	DIAZ CABRERA FEIMER	AUXILIAR VIAL	

PERSONAL VICTIMA DEL CONFLICTO				
No.	**IDENTIFICACIÓN**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**PLANILLA**
1	1.117.549.235	MUÑOZ TORRES KATHLEEN JULIETH	AUXILIAR OPERATIVA	**9506779384**

- **Mes de Junio:**

Tabla 12. Personal Profesional Inscrito en Aportes de Seguridad Social y Parafiscales.

PERSONAL PROFESIONAL				
No.	**IDENTIFICACIÓN**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**PLANILLA**
1	79.442.593	JOSE ALBERTO ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	**9508862133**
2	1.117.503.840	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON	RESIDENTE DE OBRA	
3	1.018.406.112	BRIDI JASBLEIDY MUÑOS TORRES	PROFESIONAL SST	
4	80.096.122	EDICSON RAUL VELANDIA QUITIAN	ASESOR AMBIENTAL	
5	1.117.549.235	KATHLEEN JULIETH MUÑOZ PÉREZ	VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO	

PERSONAL OPERATIVO

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PLANILLA
1	1.007.499.293	PALENCIA SEPULVEDA YESID	MAESTRO	9508862133 9509451052 9509461178
2	1.117.813.160	HENAO ALVAREZ MANUEL	OFICIAL DE OBRA	
3	1.115.942.681	RESTREPO MENDEZ LEIDER FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	
4	1.117.458.076	ROMERO ROMERO ELLYS STEVER	AYUDANTE DE OBRA	
5	18.385.025	MONTOYA OSORIO JAIR	AUXILIAR VIAL	
6	17.647.011	PAREDES URQUINA HELVER	AUXILIAR VIAL	

PERSONAL VICTIMA DEL CONFLICTO				
No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PLANILLA
1	1.117.549.235	MUÑOZ TORRES KATHLEEN JULIETH	AUXILIAR OPERATIVA	9508862133

Nota: Como anexo al presente informe mensual se adjuntan las planillas y soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal profesional, administrativo y operativo vinculado por la empresa contratista, correspondientes a los meses de mayo y junio.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Previo al desarrollo de las actividades en campo, el contratista de obra implementó las acciones preventivas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), realizando charlas de seguridad, inducción al personal, verificación del uso de los elementos de protección personal (EPP), inspecciones de orden y aseo, así como la identificación y control de los peligros y riesgos presentes en el lugar de trabajo. De igual manera, el residente de obra y la profesional SISO verificaron las condiciones de salud del personal antes del inicio de las labores.

Cabe resaltar que el área de ejecución de las actividades cuenta con la señalización necesaria para garantizar la protección y seguridad del personal de obra y de la comunidad aledaña durante la ejecución del proyecto.

Adjunto al presente informe se presenta el informe de actividades detallado de las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución.

11. ESTADO DEL TIEMPO

El estado del tiempo en el periodo del presente informe se relaciona a continuación:

Tabla 13. Estado del Tiempo mayo

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO EN EL MES DE MAYO														
ESTADO DEL TIEMPO	Semana 1							Semana 2						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SOLEADO														
NUBLADO														
LLUVIA														
LLOVIZNA														
ESTADO DEL TIEMPO	Semana 3							Semana 4						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SOLEADO														
NUBLADO														
LLUVIA														
LLOVIZNA														

ESTADO DEL TIEMPO	Semana 5							TOTAL DIAS	PORCENTAJE
	L	M	M	J	V	S	D		
	25	26	27	28	29	30	31		
SOLEADO			X	X		X	X	4	80%
NUBLADO					X			1	20%
LLUVIA								0	0%
LLOVIZNA								0	0%
							TOTAL DIAS	5	100%

Tabla 14- Estado del Tiempo junio

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO EN EL MES DE JUNIO														
ESTADO DEL TIEMPO	Semana 1							Semana 2						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SOLEADO				X							X	X	X	X
NUBLADO							X							
LLUVIA	X		X			X							X	
LLOVIZNA		X			X			X	X	X				

ESTADO DEL TIEMPO	Semana 3							Semana 4						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SOLEADO	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
NUBLADO							X							
LLUVIA					X				X	X				
LLOVIZNA												X		

ESTADO DEL TIEMPO	Semana 5							TOTAL DIAS	PORCENTAJE
	L	M	M	J	V	S	D		
	29	30							
SOLEADO								13,5	52%
NUBLADO								2	8%
LLUVIA								5	19%
LLOVIZNA								5,5	21%
							TOTAL DIAS	26	100%

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las obras ejecutadas durante el periodo del presente informe:

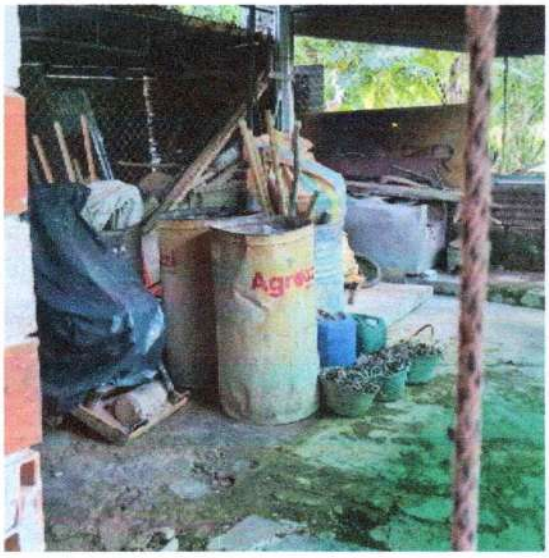
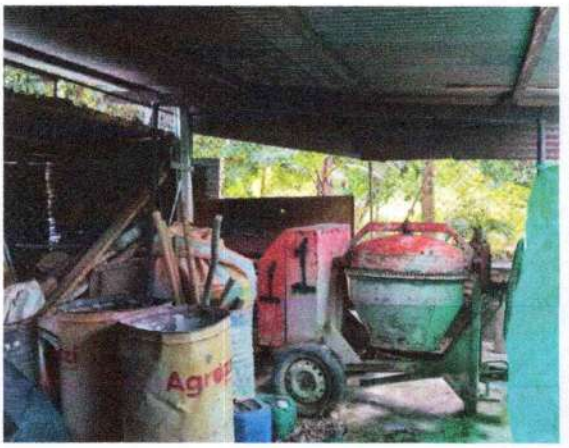
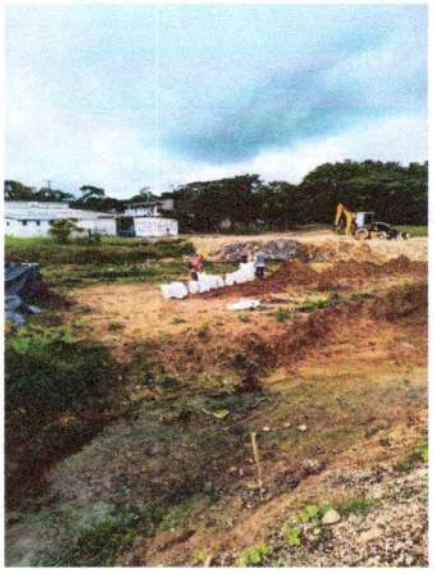
Foto 01.	Foto 02.
	
Foto 03.	**Foto 04.**
	

Foto 05.	Foto 06.
	
Foto 07.	**Foto 08.**
	

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellar@hotmail.com

Foto 09.	Foto 10.
	
Foto 11.	**Foto 12.**
	

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellar@hotmail.com

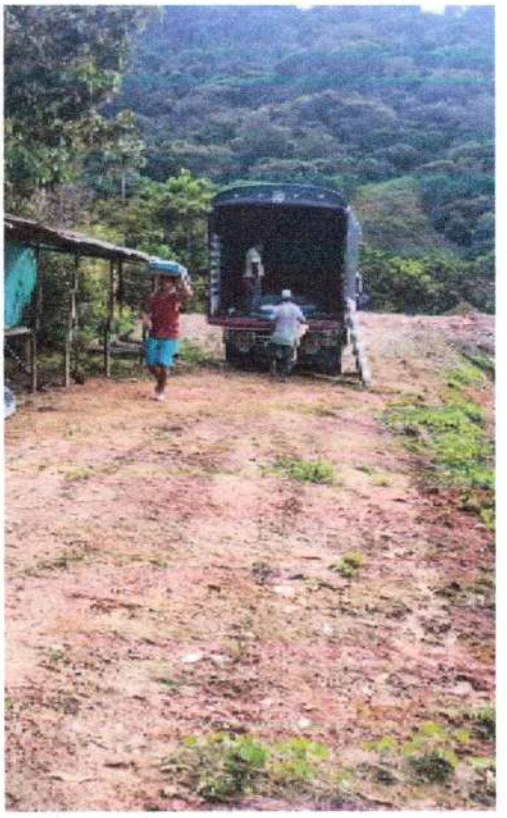
Foto 13.	Foto 14.
	
Foto 15.	**Foto 16.**
	

Foto .17	Foto 18.
	
Foto 19.	**Foto 20**
	

Foto 21.	Foto 22.
	

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellar@hotmail.com

Foto 23.	Foto 24.
	

Foto 25.	Foto 26.
	
Foto 27.	**Foto 28.**
	

Foto 29.	**Foto 30.**
	

Foto 31.	**Foto 32.**
	
Foto 33.	**Foto 34.**
	

Foto 35.	Foto 36.
	
Foto 37.	**Foto 38.**
	
Foto 39.	**Foto 40.**
	

Foto 41.	Foto 42.
	

Foto 43.	Foto 44.
	

Foto 45.	Foto 46.
	

Foto 47.	Foto 48.
	

Foto 49.	Foto 50.
	
Foto 51.	**Foto 52.**
	

Foto 53.	Foto 54.
	

Foto 55.	Foto 56.
	

Foto 57.	Foto 58.
	

Foto 59.	Foto 60.
	

Foto 61.	Foto 62.
	

Foto 64.	Foto 63.
	

13. CONCLUSIONES

- A la fecha de corte del presente informe, el Contrato de Obra Pública No. COP-2026-002 presenta un avance físico y financiero acumulado del **58,00 %**, de conformidad con las actividades ejecutadas y verificadas por la interventoría.

- Las actividades desarrolladas se ejecutan conforme a las especificaciones técnicas, los planos, el presupuesto y las obligaciones establecidas en el contrato, evidenciando un adecuado desarrollo de la obra.

- Durante el período informado, el contratista mantuvo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, implementando las medidas preventivas necesarias para la ejecución de las actividades y la protección del personal y la comunidad.

- Con la culminación de las actividades restantes, se espera cumplir el objeto contractual, entregando una obra que contribuya al mejoramiento del sistema de drenaje del barrio La Libertad y al bienestar de la comunidad del municipio de El Doncello, Caquetá.

Cordialmente,

ING. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN
R.L JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S

	PROFESIONAL	CARGO	FIRMA
Revisó:	ING. JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	Director de obra	
Elaboró:	ING. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN	Residente de obra	

Contrato de obra Publica
Nº CoP - 2026 - 002

Contratante : Municipio de el Doncello
Nit: 800.095.760 - 9

Contratista: JaCo Ingenieria ZoMac S.A.S
Nit: 901.502.544 - 8

Interventoria: Coremporium S.A.S
Nit: 901.417.449 - 2

objeto: "Construcción de la segunda fase del box Culvert en el Barrio la libertad del municipio de el Doncello Departamento del Caquetá"

- 27 Mayo 2026 Miercoles
Clima soleado
Actividades
- Contratación de personal y recepción de hojas de vida
- Toma en arriendo de casa-bodega en el barrio la libertad
Novedades - Suscripción acta de inicio

- 28 Mayo 2026 Jueves
Clima soleado
Actividades
- Traslado de equipo a la obra
- Cotización de materiales para la construcción
- Legalización de hojas de vida
- Aprobación de actividades y Cronograma de obra
novedades - ninguna

- 29 mayo Viernes
clima soleado
Actividades
- Replanteo del box = Alineación y Ubicacion del box
- Elaboración Plan de gerencia y Plan de Calidad
Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro / oficial / Ayudante
Firma

Residente de obra Director de obra

Residente de interventoria

- 30 Mayo 2026 Sabado
clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
Ayudantes

Actividades
- Traslado de materiales de hierro para la figuración
- Ingreso de cemento
- Contratación de cuadrilla para excavación y conformación del box

novedades ninguna

Equipo - mezcladora - vibrador - planla electrica - Rana - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor: - Carretillas - Palas - palin - Picas - Cadales - niveles - valdes - canecas - Mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra Residente Interventoria

- 31 Mayo 2026 Domingo

Dia de descanso

- 01 Junio 2026 Lunes
Clima lluvias todo el dia

Personal Director de obra
Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Inicio de excabación de 3.50m de ancho x 75 m de largo con retroexcabadora (pajarita).
- organización del ingreso al segundo tramo de la construcción del Box y de materiales
- Dotación de epp al personal
- Construcción del sitio para figurar Hierro/acero

Novedad - llega varilla de 1/2 y 100kg de alambre
equipo - Mezcladora - vibro - planta electrica - Rana - motobomba - tronzadora - Pulidora - taladro
Herramienta menor: - carretillas - palas - palin - picas - Codales - niveles - canecas
Herramientas de mano
firma

Residente de obra

Residente Interventoria

-02 Junio 2026 Martes
Clima lluvias variables todo el dia

Personal Residente de obra
maestro
oficial
Ayudantes

Actividades
- manejo de transito para el descargue de material y maquinaria por la via principal
- perfilado de excavación con retroexcavadora
- Continua la figuración de acero para el box

novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador de concreto
-planta electrica -Rana -tronzadora
-pulidora -taladro
Herramienta menor -Carretilla -Palas -palin
-picas -Codales -niveles
-valdes -canecas
-mangueras
Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 03 Junio 2026 Miercoles
Clima Dia de mucha lluvia

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Construcción de cuneta para el manejo del agua (desvio del box)
- Perfilado de excavación para anchura
- Construcción del muro para desvio del agua
- Adecuación de la segunda etapa de la Coïstrucción del box de 0.00 al 0.75 m

Novedades Ninguna

equipo -Mezcladora - Vibrador de concreto - Rana
-Planta electrica - tronzadora - Pulidora
-taladro

Herramienta menor - Carretilla - Palas - Palin - Picas
-Codales - Niveles - Valdes - Canecas
-mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

-04 Junio 2026 Jueves
Clima Nublado

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudante

Actividades
- Continua Conformación desde 0.00 hasta 0.75 ML
- De 0.00 a 0.10 m Construcción de pabellon de desvio; de 0.10 a 0.40 m de conformación con material mixto grueso +0,30 m
- figuración de Hierro del box
- Aseo de ramas y material vegetal

novedades - llega hierro para figurar (ST de acero de 1/2), Entrega de epp, 3 carretillas nuevas y 12 valdes

equipo - Mezcladora - Vibrador Compactador - Planta electrica - Rana - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor :- Carretillas - Palas - Palin - Picas - Codales - Niveles - valdes - Canecas

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 05 Junio 2026 Viernes

Clima lluvias variables y sol

Personal
- Director de obra
- Residente de obra
- maestro
- oficial
- ayudantes

Actividades

- Aplicación de solado de limpieza de 0.10 al 0.30, $e = 0{,}07_m \times 3.50_m$ de ancho
- Preparación de alambre negro para amarre del acero (100 kg)
- Solado de 0.30 al 0.40, $e = 0{,}07m$
- Amarre de acero del anillo 10 al 15

Novedades - Por las lluvias se dispuso un encauchetado para laborar - llega 6T de acero de 1/2 y 5T de cemento

equipo - mezcladora - vibro compactador - planta Electrica - Rana - motobomba - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas - Codales - Niveles - Valdes - Canecas - Extensiones electricas - mangueras

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

-06 Junio 2026 sabado
Clima lluvias todo el dia

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Amarre de Hierro del 15 al 40
- fundición de placa inferior del 0.10 al 0.22
- Toma de muestra de concreto para laboratorio
- solado de limpieza del 0.30 al 0.40, e=0,07 m
- figurado y amarre de acero del 0.10 al 0.40

novedad -llega 200 kg de alambre negro, 1008 varillas de ½ y 100 Bultos de cemento

equipo -mezcladora -vibrador compactador -Planta electrica -Rana -motobomba -tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor: -Carretilla -palas -palin -picas -codales -valdes -niveles -canecas -mangueras

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

-07 Junio 2026 Domingo

Dia de descanso

- 08 Junio 2026 Lunes
Clima lluvias variables

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Conformación del 0.52 al 0.65 con grueso de 0.15 a 0.49 m, material mixto compactado con rana
- solado de limpieza del 0.40 al 0.50, e=0.07m
- fundición de placa inferior desde 0.10 hasta 0.31 mL, ancho 3 m, grueso 0.25 m, Con doble parrilla en acero de 1/2

novedades Ninguna

equipo -mezcladora-vibrador de concreto -planta electrica - Rana - motobomba - tronzadora -Pulidora - taladro

Herramienta menor -Carretilla - valdes -palas -Picas - Codales - Palin - Niveles -Canecas -extensión electricas

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente Interventoria

- 09 Junio 2026 Martes
Clima lluvias variables

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Conformación del 0,65 al 0,75, grueso 0,45 m material mixto compactado; se termina la conformación del box
- Resumen: Conformación del 0,65 al 0,75, grueso 0,45 m, ancho 2.50 m; solado de limpieza de 0,10 al 0,75, e = 0,06; Placa inferior fundida de 0,10 al 0.31, grueso 0.25 m, ancho 2 m; acero instalado para continuar amarre de 0.10 al 0,50.

novedades ninguna

equipo - mezcladora - Vibrador de concreto - planta electrica - rana - cotobomba - tronzadora - Polidora - taladro

Herramienta menor - Carretilla - palas - pala - picas - Valdes - Codales - niveles - Canecas

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 10 Junio 2026 miercoles
Clima. Soleado

Personal Residente de obra
maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- Instalación de acero figurado del 0.40 al 0.60 ML

novedades llegan 200 bultos de cemento

equipo -mezcladora -vibrador de concreto -planta electrica -Rana -tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor -Carretilla -palas -palin -Picas -Codales -niveles -Valdes -Canecas -mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente Interventoria

-11 Junio 2026 Jueves
Clima Nublado

Personal Residente de obra
Maestro
oficiales
ayudantes

Actividades
- figurado de acero para el aliviadero del 0,40 al 0,60.
- Amarre de hierro del 0,40 al 0,60.

Novedades -6 viajes de fundición - la lluvia de anoche ocasiono daños, llevandose gran parte de la conformación final del box (0.70/0,75); se realiza movimiento de material para mejorar la salida.

equipo - Mezcladora - vibrador de concreto - planta electrica - rana - motobomba - tronzadora - talado - pulidora

Herramienta menor - Carretillas - Palas - Palin - picas - Codales - niveles - valdes - Canecas - extensiones - Mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 12 Junio 2026 Viernes
Clima soleado

Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Fundición del 0,31 al 0,60 de placa inferior

Novedades Visita del director de obra

equipo - Mezcladora - Planta electrica - vibrador de concreto - rana - motobomba - tronzadora - pulidora - taladro

Herramienta menor - Carretilla - Valdes - palas - Palin - Picas - codales - Niveles - Conecas - extensión - Mangueras

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 13 Junio 2026 Sabado
Clima soleado con lluvias variables

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Amarre de acero (primer anillo) del 0,60 al 0,75

Novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador de concreto -Rana
-Tronzadora -Pulidora -taladro
Herramienta menor -Carretillas -valdes -palas -palin
-picas -Codales -niveles -Canecas
Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 14 Junio 2026 Domingo

Dia de descanso

- 15 Junio 2026 Lunes
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Amarre de acero del 0,60 al 0,75

novedades ninguna

equipo - Mezcladora - vibrador de concreto - rana
- tronzadora - pulidora - taladro
Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas
- Codales - niveles - valdes
- Canecas - mangueras

Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

-16 Junio 2026 Martes
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficiales
ayudantes

Actividades
- Encofrado del 0,10 al 0,40 para fundir Muro en el costado izquierdo

novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador de concreto -planta electrica- Rana - motobomba
Herramienta menor -Carretillas -palas -picas -palin -Codales -niveles -Canecas
Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

-17 Junio 2026 Miercoles
Clima Soleado

Personal Residente de obra
maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
-fundición de placa inferior Terminada 0,60 al 0,75

novedades toma de muestras de concreto del 0,60 al 0,75
placa inferior

equipo -Mezcladora -vibrador de concreto -planta electrica -sana -motobomba -tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor -carretillas -palas -picas -palin -Codales -Valdes -Extenciones

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 18 Junio 2026 Jueves
Clima nublado

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- fundición de muro lateral lado izquierdo desde 0,19 al 0,40 (30mL de fundición)

Novedades se toma muestras para laboratorio

equipo -mezcladora -vibrador de concreto - Rana
-motobomba -tronzadora -pulidora -taladro
Herramienta menor -Carretillas -palas -palin -picas
-valdes -canecas -niveles
Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 19 Junio 2026 Viernes
Clima Sol en la mañana, lluvias fuertes en la tarde

Personal Residente de obra
Maestro de
Oficial
ayudantes

Actividades
- Encofrado para fundición de muro del 0,40 al 0,70 (lado izquierdo)
- Excavación de detas y alistamiento para fundición de ciclopeo

Novedades -se alisto material y equipo; ingreso de cemento

equipo - Mezcladora - vibrador de concreto - Planta electrica - Rana - motobomba - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor - Carretillas - Valdes - Canecas - Palas - Palin - picas - Codales - niveles - extensiones - Mangueras

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 20 Junio 2026 sabado
Clima soleado

Pessonal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Desencofrado de la fundisión del dia anterior
- fundición de muro del 9,40 al 9,70

novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador de concreto -pulidora
-planta electrica -rana -motobomba
-tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor -Carretillas -palas -palin -picas
-Codales -niveles -mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 21 Junio 2026 Domingo

Dia de descanso

- 22 Junio 2026 Lunes
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Desencofrado de la fundición del dia anteciors y encofrado del 0,70 al 0,75

Novedades Ingreso de ferreteria 50 bultos de cemento

equipo -Mezcladora -Vibrador de Concreto - Motobomba
-planta electrica - Pulidora - tronzadora - Rana
Herramienta menor - Carretillas -palas - palin - picas
-valdes - niveles - canecas - mangueras
Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 23 Junio 2026 Martes
Clima Sol y lluvias en la tarde

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- fundición del 0,70 al 0,75

novedades llegan 6m³ (6 viajes) de fundición

equipo - mezcladora - vibro - pulidora - tronzadora
- talado - Planta electrica rana

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas
- Codales - niveles - valdes - canecas

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 24 Junio 2026 miercoles
Clima sol lluvia en la tarde

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Encofrado del 0,45 al 0,70 listo para fundir
- Toma de muestras de fundición del 0,70 al 0,75

novedades - llegan 200 bultos de cemento, se aplica barniz a las formaletas de madera

equipo - mezcladora - pulidora - tronzadora - Rana - vibrador de concreto - Planta electrica

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - Picas - Valdes - niveles - Codales

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 25 Junio 2026 Jueves
Clima nublado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Suministro de cemento y alistamiento para inicio de fundición de muro lado derecho de adosado
- fundición del muro del 0,45 al 0,10

novedades ninguna

equipo - Mezcladora - formaleta - Pulidora - Rana
- Planta electrica - Vibro - motobomba
Herramienta menor - Carretillas - palas - Palin - picas
- Codales - niveles - Valdes
- Canecas - Extensión - Mangueras
Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 26 Junio 2026 viernes
Clima soleado con lluvias variables

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Formaleteo para el 0,10 al 0,40

Novedades El motor de la mezcladora se varo se envia otro para continuar los ejercicios

equipo - mezcladora - pulidora - tronzadora - taladro
- Planta electrica - rana - motobomba
Herramienta menor - Carretillas - Palas - Palin - picas
- Valde - niveles - mangueras
Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 27 Junio 2026 Sabado
Clima Soleado

Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- formaleteo del 0,10 al 0,40
- Amarre de hierro de placa superior en forma a lo largo

Novedades se recibe visita del director de obra

Equipo - mezcladora - vibrador de concreto - rana
- tronzadora - pulidora - taladro
Herramienta menor - Carretilla - palas - picas - palin
- Codales - niveles - valdes - canecas
Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

- 28 Junio 2026 Domingo
Dia de descanso
- 29 Junio 2026 Lunes
Dia festivo (San Pedro y San Pablo) lluvias fuertes en la mañana - se recibio tacos a la obra para fundición
firma

Residente de obra Residente interventoria

- 30 Junio 2026 martes
Clima nublado mañana - lluvias en la tarde

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- formaleteo de placa superior del 0,10 al 0,20

Novedades las lluvias en la tarde retrazaron el avance de las actividades

equipo - mezcladora - taladro - Pulidora - troneadora - Rana - Planta electrica - vibro


Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas - Valdes - Canecas - mangueras

Herramienta de mano

firma



Residente de obra



Residente interventoria

- 01 Julio 2026 miercoles
Clima nublado - llovizna

Personal Residente de obra
Maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- Terminación de formaletear para fundir Placa superior del 0,20 al 0,43

novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibro -pulidora -Rana
-Tronzadora -planta electrica
-valdes -niveles -canecas -mangueras
Herramienta menor -Carretillas -palas -palin -Picas

Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

-02 Julio 2026 Jueves
Clima nublado

Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro
Oficial
ayudante

Actividades
- fundicion de placa superior del 0,10 al 0,43

Novedades Ninguna

Equipo -mezcladora - Rana - tronzadora - pulidora
-taladro - motobomba - vibro de concreto

Herramienta menor -Carretillos - palas - palin - picos
-Valdes - Canecas - niveles
-Extención electrica - manguera

Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

-03 Julio 2026 Viernes
Clima nublado

Personal Residente de obra
maestro
Oficial
ayudante

Actividad
- Amarre de acero figurado de aletas
- Amarre de acero, formaleteo y fundición de zarpa
- fundición de ciclopeo de 0,40 de ancho; placa/ zarpa grueso 0,25 m

novedades llegan 30 bultos de cemento y ferreteria en la tarde

equipo - mezcladora - vibrador de concreto - Rana
- motobomba - tronzadora - pulidora
- taladro

Herramienta menor - Carretillas - Palas - Palin - Picas
- Codales - niveles - valdes -
- Mangueras - Canecas

Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 04 Julio 2026 sabado
Clima nublado, sol y lluvia en la tarde

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Amarre de acero, formaleteo y fundicion de aletas (salida/desvio)
- Toma de muestras de concreto

novedades Saldo de 10 bultos de cemento se uso retroexcabadora para retirar el jarillon construido para el desvio del agua que corre por el primer tramo del box

equipo - Retroexcabadora - mezcladora - vibro
- Rana tronzadora pulidora
Herramienta menor y de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

- 05 Julio 2026 Domingo
Dia de descanso no se laboro

06 Julio 2026 Lunes
Clima lluvia nublado y sol

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Solado de limpieza 0,00 al 0,10
- Compactación de la conformación del 0,00 al 0,10 con Rana, Solado e=0,07 m, ancho 2,50 m

novedades - Se recogieron muestras de concreto de fundiciones de placa y muros

equipo - mezcladora - Rana - Pulidora - vibro
- Trancadora - taladro

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - Picas
- Codales - niveles - valdes
- Canecas - mangueras

Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 07 Julio 2026 Martes
Clima nublado, lluvias fuertes desde las 11:00 a.m.

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Amarre de acero del 0,00 al 0,40 (Primero y segundo anillo)

novedades Ninguna

equipo -mezcladora - Rana - pulidora - vibro
-Tronzadora - taladro -Planta electrica

Herramienta menor -Carretillas - valdes - palas - Palin
-Picas - mangueras - niveles
-Canecas - Codales

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 08 Julio 2026 Miercoles -
Clima lluvia en la mañana, sol desde las 10:00 a.m

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- amarre de acero figurado en forma longitudinal desde 0,00 al 0,10 para alistar la fundición de placa superior

novedad ninguna

equipo -mezcladora -tronzadora -Pulidora -Rana
-taladro -vibrador de concreto - Planta electrica

Herramienta menor -Carretillas -Valdes -palas
-Palin -Picas -Canecas -Codales
-niveles -mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 09 Julio 2026 Jueves
Clima Nublado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudante

Actividad
- fundición del 0,00 al 0,10 de placa, grueso 0,25M ancho 2,50m, longitud 10 m

novedad ninguna

equipo - mezcladora - tronzadora - pulidora - taladro
- motobomba - vibrador de concreto - Rana

Herramienta menor - Carretillas - valdes - palas - palin
- picas - canecas - codales
- niveles - mangueras

Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 10 Julio 2026 Viernes
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudante

Actividades
- formaleteo de muro izquierdo para fundición del 0,00 al 0,10

novedades llegan 200 bultos de cemento

equipo - mezcladora - Pulidora - taladro - Rana
- Planta electrica - Pulidora

Herramienta menor - valdes - Carretillas - palin
- palas - Picas - Codales
- niveles - Canecas - mangueras

Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 11 Julio 2026 Sabado
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- fundición de muro de lado izquierdo del 0,00 al 0,10, grueso 0,25 m, Alto 1m, longitud 10 m

novedad ninguna

equipo -mezcladora -vibrador de concreto - Rana
-Planta electrica - Motobomba -tronzadora
-Pulidora - taladro

Herramienta menor -Carretilla - Palas - Palin - picas
-Codales - niveles - canecas
-Extensiones electricas

Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

- 12 Julio 2026 Domingo

no se laboro por dia de descanso

-13 Julio 2026 Lunes
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
-formaleteo y organización de acero figurado para fundición de muro lado derecho del 0,00 al 0,10

novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador -planta electrica
-Rana -tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor -Carretillas -palas -palin -picas
-valdes -canecas -mangueras

Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

-14 Julio 2026 Martes
Clima lluvia todo el dia (leve)

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
-fundición de muro lado derecho grueso 0,25 m, Alto 1 m, longitud 10 m.

novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador -planta electrica
-Rana -troncadora -pulidora -taladro

Herramienta menor -Carretillas palas palin picas
-valdes -Codales - Canecas
-Extensiones - mangueras

Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

-15 Julio 2026 Miercoles
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
-formaleteo placa superior desde 0,00 al 0,10

Novedades ninguna

equipo - mezcladora - vibrador de concreto
-Planta electrica - Rana - tronzadora
-Pulidora - taladro

Herramienta menor - Carretilla - palas - palin - picas
-valdes - Extensiones electricas
- mangueras - codales

Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

-16 Julio 2026 Jueves
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- fundición de placa superior desde e,00 al e,10, grueso 0,25 m, ancho 2,50m, longitud 10 m

novedades ninguna

equipo -mezcladora -tronzadora pulidora taladro
-motobomba - Rana planta electrica

Herramienta menor - carretilla - valdes - canecas - palas
-palin - mangueras - Codales
-niveles - Extensiones

Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

-17 Julio 2026 Viernes
Clima Soleado

Personal Residente de obra
maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- organización de formaletas para fundición de Placa del 0,45 en adelante
- organización de material (cemento, grava, petreos)
- Instalación de mangueras de agua paca la mezcla

novedades ninguna

equipo - mezcladora - tranzadora - pulidora
- taladro - motobomba - Planta electrica
- Rana - vibrador de concreto

Herramienta menor - Carretillas - Palas - valdes
- Picas - codales - niveles
- Canecas - mangueras

Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

-18 Julio 2026 sabado
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Organización y aseo de la obra; organización de formaletas y bodega
- corte de tacos
- Consecucion de amarras y puntillas para iniciar la fundición de placa superior del 0,45 en adelante

novedad ninguna

equipo - mezcladora - tronzadora - Pulidora - Rana
- Planta electrica - taladro - motobomba
- Vibrador concreto -

Herramienta menor - Carretillas palas palin picos
- Valdes - Mangueras - Canecas
- niveles - Codales

Heslamienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

-19 Julio 2026 Domingo

Dia de descanso

-20 Julio 2026 Lunes
Clima nublado todo el dia

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
-formaleteo de placa superior desde 0,40 al 0,55,

navedad ninguna

equipo -mezcladora -Pulidora -tronzadora
-taladro -Rana -motobomba

Herramienta menor -Carretillas -palas -palin
-Picas -valdes -Canecas
-Extensión -manguera

Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 21 Julio 2026 martes
Clima soleado todo el dia

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- formaleteo y organización de acero longitudinal desde 0.40 al 0,75

novedad ninguna

equipo -mezcladora -vibrador -planta electrica -Rana -tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor -Carretillas -palas -palin -picas -Codales -niveles -valdes -Canecas -mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

-22 Julio 2026 Miercoles
Clima Sol en la mañana lluviar en la tarde

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- fundición de Placa superior desde 0,45 al 0,55 ancho 2,50 m, grueso 0,25 m, longitud de fundición 15 ml durante el dia

Novedades ninguna

equipo - mezcladora - fronzadora - Pulidora - taladro
- vibrador de concreto - Rana - motobomba

Herramienta menor - Carretillas - Palas - palin - picas
- Mangueras - Codales - niveles
- Canecas - Extenciones electricas

Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

-23 Julio 2026 Jueves
Clima soleado

Personal Residente de obra
Maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
-fundición de placa superior (tramo del 0,70 al 6.75 ML

novedad se conto con la visita de la ing.
kassandra (supervición)

equipo -mezcladora -tronzadora -pulidora -Rana
-motobomba -taladro

Herramienta menor -Carretilla -palas -palin -picas
-Codales -niveles -valdes
-Canecas -extensiones electricas

Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

- 24 Julio 2026 Viernes
Clima Soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- fundición de placa superior desde 0,35 at 0,70; Placa ancho 2,50 m, grueso 0,25 m, longitud 15 ML

novedad ninguna

equipo - mezcladora - pulidora - tronzadora
- taladro - Rana - motobomba

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas
- Valdes - codales - niveles
- Canecas - Extensión electricas

Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

-25 Julio 2026 Sabado
Clima soleado

Pessonal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
-organización del saldo de materiales

novedades ninguna

equipo -mezdadora -pulidosa -tranzadora -Rana

Hesramienta menor -Carretillas -Palas -pàlin -picas -Codales
-valdes -canecas

Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

-26 Julio 2026 Domingo

Dia de descanso no se laboso

- 27 Julio 2026 Lunes
Clima lluvioso

Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro
oficial
ayudante

Actividades
- Se recoge todo el material sobrante y aseo general de la obra
- Se recibe al moestro la fundición
- Se ultiman detalles del manejo del material para relleno a los costados a fin de evitar la erosión por corrientes

equipo - Mezcladora - Rana - Vibro
Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas
Valdes - Canecas
Herramienta de mano
novedades ninguna
Firma

Residente de obra Residente interventoria

INFORME SST

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellaro@gmail.com

INFORME DE CUMPLIMIENTO
COMPONENTE SST (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

El Doncello (Caquetá) – Junio de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad contratante	MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
N° de contrato	COP-2026-002
Código BPIN	202500000046211
Valor total del contrato	$476.404.246,00 M/CTE
Valor de la obra civil	$423.340.673,00
Fecha de celebración	05 de mayo de 2026
Acta de inicio	27 de mayo de 2026
Plazo de ejecución	Tres (03) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2026
Contratista	JACO INGENIERÍA ZOMAC S.A.S. — Nit. 901.502.544-8
Representante legal	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN — C.C. 1.117.503.840 de Florencia – Caquetá
Interventoría	COREMPORIUM S.A.S. – R.L. Daniel Ricardo González Soto
Supervisión de la interventoría	Kassandra Andrea Orozco Orozco

2. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto reportar y soportar técnicamente ante la interventoría (COREMPORIUM S.A.S.) y la supervisión, el cumplimiento de las obligaciones del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) contempladas en el presupuesto SISOMA del contrato de la referencia, durante la ejecución de la segunda fase del box culvert en el barrio La Libertad del municipio de El Doncello (Caquetá). El presente informe corresponde al período desde 27 de mayo al 26 junio de 2026.

El alcance abarca la verificación de la conformación del grupo de gestión SST, la implementación de las medidas de seguridad industrial, la dotación y disponibilidad de los elementos de emergencia y señalización, y el uso de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal, contrastando cada ítem presupuestado con la evidencia recolectada en obra.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE

La gestión SST del contrato se desarrolla en concordancia con la normatividad colombiana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable a obras civiles:

- **Decreto 1072 de 2015.** Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6), que establece la obligación de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- **Resolución 0312 de 2019.** Define los Estándares Mínimos del SG-SST, aplicables según el número de trabajadores y el nivel de riesgo de la obra.
- **Ley 1562 de 2012.** Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y dicta disposiciones en materia de salud ocupacional.
- **Decreto 1295 de 1994.** Organiza el Sistema General de Riesgos Laborales (afiliación, cotización y prestaciones).

- **Resolución 2400 de 1979.** Estatuto de Seguridad Industrial: disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en establecimientos de trabajo, incluyendo señalización y equipos de emergencia.
- **Resolución 1409 de 2012.** Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, cuando la actividad lo requiera.

4. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

La verificación del cumplimiento se realizó mediante inspección directa en el frente de obra y en las instalaciones temporales, confrontando cada insumo presupuestado con su existencia física, estado y disposición. Se registró evidencia fotográfica fechada de los elementos de seguridad industrial (kit de emergencias y kit de señalización), de la dotación y uso de EPP por el personal, y de la presencia del profesional en SST durante las jornadas de inducción y acompañamiento.

Adicionalmente, la gestión documental del componente (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, planillas de pago de aportes, registros de inducción y actas) reposa en la carpeta contractual y se aporta como soporte del pago, de conformidad con el Parágrafo del artículo de forma de pago del contrato (Informe SST, protocolos y planillas de seguridad social).

5. VERIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUMPLIMIENTO DE ÍTEMS

A continuación se presenta la relación de los ítems del componente SST conforme al presupuesto SISOMA aprobado, indicando su unidad, cantidad, valor y su estado de ejecución verificado en obra:

Ítem del presupuesto	Unidad	Cant.	Vr. unitario	Vr. total	Cumple
1. DESARROLLO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN SST — 1.1 Conformación del grupo de gestión SST					
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (1) — dedicación 100%	mes	2	$3.500.000	$12.460.000	✓
2. SEGURIDAD INDUSTRIAL					
Kit de emergencias (extintor 10 lbs con señalización acrílica 22×15 cm, camilla rígida, reflectivos y botiquín dotado)	un	1	$750.000	$750.000	✓
Kit señalización SST (señales 15×15 cm: uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro, baños)	un	2	$450.000	$900.000	✓
Programa de compensación ambiental según resolución de ocupación de cauce	un	0	$4.000.000	$0	N/A
		TOTAL COMPONENTE SST		**$14.110.000**	

Convención: ✓ = ítem ejecutado y verificado en obra con soporte fotográfico. N/A = ítem no ejecutado / no aplica en el período.

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO

6.1 Conformación del grupo de gestión SST

El contrato cuenta con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con dedicación de tiempo completo durante el período, responsable de la implementación del SG-SST en obra, la ejecución de las inducciones y charlas de seguridad, la inspección de condiciones y el diligenciamiento de los registros. Las fotografías del registro evidencian al profesional (identificado con uniforme de la Consultora SG-SST) adelantando actividades de inducción y acompañamiento al personal en el frente de obra, lo que soporta la ejecución del ítem por valor de $12.460.000.

6.2 Seguridad industrial — Kit de emergencias

Se verificó la disponibilidad del kit de emergencias en el sitio de trabajo, conforme a la especificación del presupuesto: extintor multipropósito de 10 lbs con su señalización acrílica, camilla rígida, elementos reflectivos y botiquín de primeros auxilios dotado. El registro fotográfico muestra el kit dispuesto sobre mesa durante la jornada, incluyendo

extintor, botiquín, guantes y demás elementos, dando cumplimiento al ítem por valor de $750.000 y garantizando la capacidad de respuesta ante emergencias exigida por la Resolución 2400 de 1979.

6.3 Seguridad industrial — Kit de señalización SST

Se constató la disposición de la señalización de seguridad (dos kits) con las señales normalizadas de 15×15 cm: uso obligatorio de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro y baños. Esta señalización se observa en las jornadas de inducción y en el frente de obra, dando cumplimiento al ítem por valor de $900.000 y contribuyendo a la prevención de riesgos y a la orientación del personal.

6.4 Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)

Aunque los EPP se suministran como parte de la obligación general de seguridad, se documenta el uso efectivo por parte del personal (casco, chaleco reflectivo de alta visibilidad y botas de seguridad) durante las actividades constructivas, lo que evidencia la operatividad del SG-SST en campo.

6.5 Ítem no ejecutado en el período

El programa de compensación ambiental asociado a la resolución de ocupación de cauce se relaciona con cantidad cero y valor $0, por corresponder a un trámite condicionado a la expedición de la respectiva resolución de la autoridad ambiental; en consecuencia, no se causa ni se cobra en el presente período.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELACIONADO CON LOS ÍTEMS

Cada evidencia fotográfica se relaciona con el ítem del presupuesto que soporta. Las imágenes fueron homogenizadas en formato y proporción para su presentación.



Foto 1. *Profesional SST en inducción y acompañamiento; personal con EPP (Ítem 1.1)*



Foto 2. *Uso de EPP: casco, chaleco reflectivo y botas de seguridad (Seguridad industrial)*



Foto 3. *Área de almacenamiento y elementos de seguridad en campamento*



Foto 4. *Profesional SST – charla de inducción de seguridad al personal (Ítem 1.1)*



Foto 5. *Inducción SST con kit de señalización dispuesto (Ítem 2 – señalización)*



Foto 6. *Kit de emergencias – extintor dispuesto durante la capacitación (Ítem 2)*

8. CONCLUSIONES Y CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Con fundamento en la inspección en obra y el registro fotográfico relacionado por ítem, se emite CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO respecto de las obligaciones del componente SST ejecutadas en el período: conformación y presencia del profesional en seguridad y salud en el trabajo, dotación y disponibilidad del kit de emergencias, implementación del kit de señalización SST y uso efectivo de elementos de protección personal por el personal de obra.

El ítem de programa de compensación ambiental (ocupación de cauce) se reporta como no ejecutado y no causado en el período, por estar condicionado a la respectiva resolución. Los demás ítems se encuentran ejecutados, verificados y soportados, dando cumplimiento a las obligaciones SST del contrato COP-2026-002.

BRIDI JASBLEIDY MUÑOZ TORRES
C.C. 1.018.406.112 – Ingeniera Aeronáutica Esp en Salud y Seguridad en el Trabajo

Elaboro	BRIDI JASBLEIDY MUÑOZ TORRES C.C. 1.018.406.112 – Lic. SST	Cargo	PROFESIONAL SST	FIRMA	
Reviso	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN	Cargo	RESIDENTE DE OBRA	FIRMA	
Recibió/verifico	DANIEL RICARDO GONZALEZ SOTO	Cargo	INTERVENTORÍA	FIRMA	

PLANILLA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Componente SST – Contrato COP-2026-002

El Doncello (Caquetá) – Junio de 2026

N° de contrato:	COP-2026-002	**Municipio:**	El Doncello – Caquetá
Objeto:	Construcción de la segunda fase del box culvert – barrio La Libertad	**Componente:**	SST
Fecha de entrega:	1 de Junio de 2026	**Responsable:**	BRIDI JASBLEIDY MUÑOZ TORRES – Profesional SST

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP – PERSONAL OPERATIVO (marque con X el elmento entregado)

N°	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Guantes	Gafas	Camisa	Jean	Casco	Firma
1	1.007.499.293	PALENCIA SEPÚLVEDA YESID	Maestro	X	X	X	X	X	Yesid P.S.
2	1.117.813.160	HENAO ÁLVAREZ MANUEL	Oficial de obra	X	X	X	X	X	M. Henao A.
3	1.115.942.681	RESTREPO MÉNDEZ LEIDER FERNANDO	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	Leider Fernando Restrepo M.
4	1.117.458.076	ROMERO ROMERO ELLYS	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	E.S.R.R.
5		MONTOYA OSORIO JAIR							Jair M.O.
6	17.647.011	PAREDES URQUINA HELVER	Auxiliar vial	X	X	X	X	X	Helver P.U.

Declaro que recibí de manera completa los elementos de protección personal (EPP) y dotación relacionados, en buen estado, y me comprometo a su uso obligatorio y adecuado durante la ejecución de la obra.

BRIDI JASBLEIDY MUÑOZ TORRES
Entregó – Profesional SST

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN
Residente de Obra

INFORME PMA

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellaro@gmail.com

INFORME DE CUMPLIMIENTO
COMPONENTE AMBIENTAL (PMA) Y COMPONENTE SOCIAL

El Doncello (Caquetá) – Junio de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad contratante	MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
N° de contrato	COP-2026-002
Código BPIN	202500000046211
Valor total del contrato	$476.404.246,00 M/CTE
Valor de la obra civil	$423.340.673,00
Fecha de celebración	05 de mayo de 2026
Acta de inicio	27 de mayo de 2026
Plazo de ejecución	Tres (03) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2026
Contratista	JACO INGENIERÍA ZOMAC S.A.S. — Nit. 901.502.544-8
Representante legal	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN — C.C. 1.117.503.840 de Florencia – Caquetá
Interventoría	COREMPORIUM S.A.S. – R.L. Daniel Ricardo González Soto
Supervisión de la interventoría	Kassandra Andrea Orozco Orozco

2. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME

El presente informe reporta y soporta técnicamente el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del componente de gestión social contempladas en el presupuesto SISOMA del contrato, durante la ejecución de la segunda fase del box culvert en el barrio La Libertad del municipio de El Doncello (Caquetá). El presente informe corresponde al período desde 27 de mayo al 26 junio de 2026.

El alcance comprende la verificación de la conformación del grupo de gestión ambiental, las capacitaciones al personal, el manejo integral de residuos sólidos, el manejo de instalaciones temporales, y los programas de gestión social de atención a la comunidad, información y divulgación, contrastando cada ítem presupuestado con su evidencia en obra.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE

La gestión ambiental y social del contrato se enmarca en la normatividad colombiana aplicable a proyectos de infraestructura:

- **Ley 99 de 1993.** Crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA); establece los principios de la gestión ambiental.
- **Decreto 1076 de 2015.** Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, incluyendo lo relativo a ocupación de cauces y aprovechamiento de recursos naturales.
- **Resolución 472 de 2017.** Reglamenta la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), aplicable al manejo de residuos de la obra.

- **Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – INVIAS.** Referente técnico para la estructuración y ejecución de los programas del PMA y de gestión social (DAGA, PAC, PMIT y PGS).
- **Ley 850 de 2003.** Reglamenta las veedurías ciudadanas y soporta los mecanismos de atención, información y divulgación a la comunidad.

4. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

La verificación se realizó mediante inspección directa de las instalaciones temporales y del frente de obra, confrontando cada insumo presupuestado con su existencia y funcionamiento, y mediante la revisión de los soportes documentales de la gestión social. Se registró evidencia fotográfica fechada del ingeniero ambiental en sus actividades, de la dotación de oficina (equipo de cómputo, impresora y material), del punto de atención a la comunidad con buzón de sugerencias, de las carteleras informativas, de la instalación temporal (baño) y de las reuniones de socialización con la comunidad.

Los ítems asociados al manejo de residuos sólidos (puntos ecológicos, recolección y demarcación de la zona de disposición) se soportan en los registros de manejo ambiental y actas de obra que reposan en la carpeta contractual, en concordancia con el informe PAGA/PMA exigido para el pago.

5. VERIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUMPLIMIENTO DE ÍTEMS

A continuación se presenta la relación de los ítems de los componentes ambiental y social conforme al presupuesto SISOMA aprobado:

Ítem del presupuesto	Unidad	Cant.	Vr. unitario	Vr. total	Cumple
1. GESTIÓN AMBIENTAL — 1.1 Conformación del grupo de gestión ambiental (DAGA-1.1-01)					
Ingeniero Ambiental (medio tiempo) — dedicación 50%	mes	2	$3.500.000	$6.230.000	✓
1.2 Capacitación ambiental al personal de la obra (DAGA-1.2-02)					
Capacitaciones (papelería y talleres)	mes	1	$350.000	$350.000	✓
Equipos audiovisuales	un	0.5	$400.000	$200.000	✓
2. PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS — 2.5 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales (PAC-2.5-08)					
Puntos ecológicos (3 puestos)	un	1	$920.000	$920.000	✓
Recolección de residuos sólidos	un	1	$350.000	$350.000	✓
Demarcación zona de disposición	un	1	$220.000	$220.000	✓
3. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES — 3.1 Campamentos y sitios de acopio (PMIT-5.1-11)					
Alquiler de baño en sitio o de la zona	un	1	$420.000	$1.260.000	✓
4. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL — 4.1 Atención a la comunidad (PGS-6.1-18)					
Punto de atención a la comunidad — instalación de buzones satélites (buzón de sugerencias)	un	1	$400.000	$400.000	✓
Equipos de cómputo e impresora	un	1	$250.000	$250.000	✓
Material de oficina (papel, bolígrafos, etc.)	un	1	$100.000	$100.000	✓
Cartelera informativa del proyecto	un	1	$380.000	$380.000	✓
4.2 Proyecto de información y divulgación (PGS-6.2-19)					
Elaboración y distribución de piezas de comunicación	un	1	$30.000	$30.000	✓

Ítem del presupuesto	Unidad	Cant.	Vr. unitario	Vr. total	Cumple
Reuniones de inicio y cierre del proyecto	un	1	$260.000	$260.000	✓
TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL (PMA) Y SOCIAL				**$10.950.000**	

Convención: ✓ = ítem ejecutado y verificado en obra con soporte fotográfico. N/A = ítem no ejecutado / no aplica en el período.

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO

6.1 Gestión ambiental y conformación del grupo (DAGA)

El contrato cuenta con un ingeniero ambiental con dedicación de medio tiempo, responsable de la implementación y seguimiento del PMA, las capacitaciones al personal y el control ambiental de las actividades. El registro fotográfico evidencia al profesional adelantando la gestión documental y técnica en la oficina/campamento del proyecto, soportando el ítem por valor de $6.230.000. Las capacitaciones ambientales al personal (papelería, talleres y equipos audiovisuales) se soportan en las jornadas de socialización registradas.

6.2 Manejo integral de residuos sólidos (PAC-2.5-08)

Conforme a la Resolución 472 de 2017 y a la Guía de Manejo Ambiental, el programa contempla puntos ecológicos (3 puestos) para la separación en la fuente, la recolección de residuos sólidos y la demarcación de la zona de disposición. Estas actividades se desarrollan en obra y se soportan en los registros de manejo ambiental y actas de la carpeta contractual.

6.3 Manejo de instalaciones temporales (PMIT-5.1-11)

Se verificó la disposición de la instalación sanitaria temporal (alquiler de baño) para el personal de obra, en cumplimiento de las condiciones de higiene exigidas. El registro fotográfico evidencia la unidad sanitaria y el lavamanos disponibles, soportando el ítem por valor total de $1.260.000 correspondiente al período de ejecución.

6.4 Atención a la comunidad (PGS-6.1-18)

Se constató la instalación del punto de atención a la comunidad con buzón de sugerencias (buzón satélite), la dotación de la oficina con equipo de cómputo e impresora y material de oficina, y la instalación de la cartelera informativa del proyecto. Las fotografías evidencian el buzón instalado en la fachada de atención y la dotación operativa, dando cumplimiento a los ítems por valores de $400.000, $250.000, $100.000 y $380.000 respectivamente.

6.5 Información y divulgación (PGS-6.2-19)

Se realizaron las reuniones de socialización con la comunidad (inicio del proyecto) y la elaboración y distribución de piezas de comunicación. El registro fotográfico muestra las jornadas de reunión con asistentes, soportando los ítems por valores de $260.000 y $30.000.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELACIONADO CON LOS ÍTEMS

Cada evidencia fotográfica se relaciona con el ítem del presupuesto que soporta. Las imágenes fueron homogenizadas en formato y proporción para su presentación.



Foto 1. *Alquiler de baño en sitio – lavamanos e instalación temporal (PMIT-5.1-11)*



Foto 2. *Alquiler de baño en sitio – unidad sanitaria (PMIT-5.1-11)*



Foto 3. *Punto de atención a la comunidad – buzón de sugerencias instalado (PGS-6.1-18)*



Foto 4. *Punto de atención a la comunidad – fachada con buzón de sugerencias (PGS-6.1-18)*



Foto 5. *Dotación de oficina – cómputo, impresora, extintor y ruta de evacuación (PGS-6.1-18)*



Foto 6. *Ingeniero Ambiental – revisión de planos y carteleras del proyecto (DAGA-1.1-01)*



Foto 7. *Cartelera informativa del proyecto y documentación técnica (PGS-6.1-18)*



Foto 8. *Ingeniero Ambiental (medio tiempo) en actividades de gestión (DAGA-1.1-01)*



Foto 9. *Reunión de inicio del proyecto con la comunidad (PGS-6.2-19)*



Foto 10. *Reunión de socialización y divulgación del proyecto (PGS-6.2-19)*

8. CONCLUSIONES Y CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Con fundamento en la inspección en obra y el registro fotográfico relacionado por ítem, se emite CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO respecto de las obligaciones de los componentes ambiental y social ejecutadas en el período: presencia del ingeniero ambiental, capacitaciones al personal, manejo de residuos sólidos, disposición de la instalación sanitaria temporal, instalación del punto de atención a la comunidad con buzón de sugerencias, dotación de oficina, carteleras informativas y realización de las reuniones de socialización.

Los ítems relacionados se encuentran ejecutados, verificados y/o soportados documentalmente conforme al presupuesto SISOMA, dando cumplimiento a las obligaciones ambientales y sociales del contrato COP-2026-002.

EDICSON RAUL VELANDIA QUITIAN
C.C. 80.096.122 – T.P. No. N.° 25202-119248 CND

Reviso	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN	Cargo	RESIDENTE DE OBRA	FIRMA	
Recibió/verifico	DANIEL RICARDO GONZALEZ SOTO	Cargo	INTERVENTORÍA	FIRMA	

INFORME PMT

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellaro@gmail.com

INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

El Doncello (Caquetá) – Junio de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad contratante	MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BOX CULVERT EN EL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
N° de contrato	COP-2026-002
Código BPIN	202500000046211
Valor total del contrato	$476.404.246,00 M/CTE
Valor de la obra civil	$423.340.673,00
Fecha de celebración	05 de mayo de 2026
Acta de inicio	27 de mayo de 2026
Plazo de ejecución	Tres (03) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2026
Contratista	JACO INGENIERÍA ZOMAC S.A.S. — Nit. 901.502.544-8
Representante legal	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN — C.C. 1.117.503.840 de Florencia – Caquetá
Interventoría	COREMPORIUM S.A.S. – R.L. Daniel Ricardo González Soto
Supervisión de la interventoría	Kassandra Andrea Orozco Orozco

2. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME

El presente informe reporta y soporta técnicamente el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) contempladas en el presupuesto del contrato, durante la ejecución de la segunda fase del box culvert en el barrio La Libertad del municipio de El Doncello (Caquetá). El presente informe corresponde al período desde 27 de mayo al 26 junio de 2026.

El alcance comprende la verificación del personal de regulación del tránsito (auxiliares de tránsito) y de los dispositivos de señalización, canalización e intercomunicación dispuestos en el frente de obra para garantizar la seguridad vial y peatonal, contrastando cada ítem presupuestado con su evidencia en campo.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE

La implementación del PMT se desarrolla conforme a la normatividad colombiana de tránsito y señalización vial:

- **Ley 769 de 2002.** Código Nacional de Tránsito Terrestre, marco general de la regulación del tránsito y la señalización de vías.
- **Resolución 1885 de 2015.** Adopta el Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas; su Capítulo 4 regula la señalización de obras en la vía.
- **Ley 1503 de 2011.** Promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía, aplicable a la operación del personal de control de tránsito.
- **Resolución 1050 de 2004.** Antecedente técnico del Manual de Señalización Vial, referente para los dispositivos temporales de canalización.

4. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

La verificación se realizó mediante inspección directa del frente de obra y de sus accesos, confrontando cada dispositivo presupuestado con su existencia física, cantidad, estado y correcta disposición sobre la vía. Se registró evidencia fotográfica fechada de la señalización reflectiva, los dispositivos de canalización (delineadores tubulares, conos y barreras), la señalización de inicio y fin de obra y el personal de regulación del tránsito con sus paletas Pare/Siga y chalecos reflectivos.

La operación del PMT se ajusta a los esquemas de señalización temporal del Capítulo 4 del Manual de Señalización Vial, garantizando la canalización del tránsito, la reducción de velocidad y la seguridad de peatones y trabajadores en la zona de obra.

5. VERIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUMPLIMIENTO DE ÍTEMS

A continuación se presenta la relación de los ítems del componente PMT conforme al presupuesto aprobado:

Ítem del presupuesto	Unidad	Cant.	Vr. unitario	Vr. total	Cumple
PERSONAL PARA EL MANEJO DE TRÁNSITO					
Auxiliar de tránsito — dedicación 50% (1 mes) — Yesid Palencia Sepúlveda (C.C. 1.007.499.293) y Jair Montoya Osorio (C.C. 18.385.025)	und	2	$1.750.950	$3.116.691	✓
EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN E INTERCOMUNICACIÓN					
Barrera o maletín plástico 2×1×0,5 m	und	2	$650.000	$1.300.000	✓
Paletas Pare / Siga 45 cm	und	1	$95.000	$95.000	✓
Delineadores tubulares (colombinas H = 1,30 m)	und	9	$90.000	$810.000	✓
Cinta plástica "Peligro No Pase"	ml	177	$500	$88.500	✓
Señalización vial reflectiva para obras tipo trípode (inicio y fin de obra)	und	1	$300.000	$300.000	✓
Chalecos reflectivos	und	1	$45.000	$45.000	✓
Radio comunicadores para control de tráfico	und	2	$200.000	$400.000	✓
Cono vial plástico de 70 cm	und	6	$110.000	$660.000	✓
COSTO TOTAL PMT — MUNICIPIO DE EL DONCELLO				**$6.815.191**	

Desglose Costo del Auxiliar de tránsito.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EJECUCIÓN / MES	VR / MES	FP	DEDICACION	FP
1	AUXILIAR DE TRANSITO	UND	2	1	$ 1,750,950	178%	50%	$ 3,116,691.00

Convención: ✓ = ítem ejecutado y verificado en obra con soporte fotográfico. N/A = ítem no ejecutado / no aplica en el período.

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO

6.1 Personal para el manejo de tránsito

El PMT contempla dos auxiliares de tránsito con dedicación del 50% en el período del presente informe, encargados de la regulación del paso vehicular y peatonal mediante paletas Pare/Siga. El registro fotográfico evidencia a los auxiliares operando en la vía, dotados con chaleco reflectivo de alta visibilidad y paletas, soportando el ítem por valor de $6.233.382 y garantizando el control del tránsito exigido por el Manual de Señalización Vial. Los auxiliares de tránsito son los señores Yesid Palencia Sepúlveda (C.C. 1.007.499.293) y Jair Montoya Osorio (C.C. 18.385.025), quienes se relacionan en el registro fotográfico del presente informe.

6.2 Dispositivos de canalización del tránsito

Se verificó la disposición de los delineadores tubulares (colombinas H=1,30 m, 9 unidades), los conos viales plásticos de 70 cm (6 unidades) y las barreras o maletines plásticos de 2×1×0,5 m (2 unidades), utilizados para canalizar el tránsito a un solo carril y delimitar el frente de obra. Las fotografías muestran estos dispositivos correctamente instalados sobre la calzada, dando cumplimiento a los ítems respectivos por valores de $810.000, $660.000 y $1.300.000.

6.3 Señalización de obra e intercomunicación

Se constató la instalación de la señalización vial reflectiva tipo trípode para el inicio y fin de obra (señal de "hombres trabajando"), la cinta plástica de demarcación "Peligro No Pase" (177 ml) y las paletas Pare/Siga de 45 cm. Asimismo, el PMT contempla radio comunicadores para el control coordinado del tráfico entre los auxiliares. Estos dispositivos se evidencian en el registro fotográfico, soportando los ítems por valores de $300.000, $88.500, $95.000 y $400.000.

6.4 Elementos de protección y visibilidad

El personal de regulación utiliza chalecos reflectivos que garantizan su visibilidad en la vía, en cumplimiento de las condiciones de seguridad del Manual de Señalización Vial. La operación conjunta de señalización, canalización y personal asegura la seguridad de los usuarios de la vía y de los trabajadores durante la ejecución de la obra.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO RELACIONADO CON LOS ÍTEMS

Cada evidencia fotográfica se relaciona con el ítem del presupuesto que soporta. Las imágenes fueron homogenizadas en formato y proporción para su presentación.



Foto 1. *Delineadores tubulares (colombinas H=1,30 m) – canalización*



Foto 2. *Auxiliar de tránsito con paleta y conos viales – control de paso*

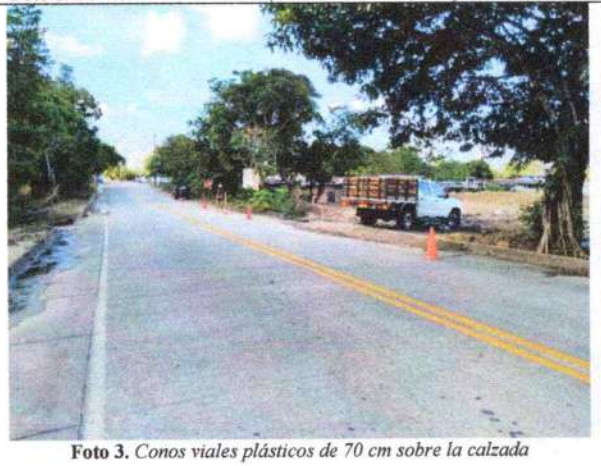


Foto 3. *Conos viales plásticos de 70 cm sobre la calzada*



Foto 4. *Conos viales – control de paso de vehículos pesados*



Foto 5. *Delineadores tubulares (colombinas) en borde de calzada*



Foto 6. *Canalización del tránsito con conos viales*



Foto 7. *Barrera/maletín plástico y señalización reflectiva tipo trípode (inicio/fin de obra)*

8. CONCLUSIONES Y CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO

Con fundamento en la inspección en obra y el registro fotográfico relacionado por ítem, se emite CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO respecto de las obligaciones del Plan de Manejo de Tránsito ejecutadas en el período: disposición de los auxiliares de tránsito con paletas Pare/Siga y chalecos reflectivos, instalación de la señalización vial reflectiva tipo trípode, delineadores tubulares (colombinas), conos viales, barreras plásticas y cinta de demarcación.

Los ítems relacionados se encuentran ejecutados, verificados y soportados conforme al presupuesto aprobado y a los esquemas del Manual de Señalización Vial, garantizando la seguridad vial y peatonal durante la ejecución del contrato COP-2026-002.

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGÓN
Representante Legal
JACO INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.
CONTRATISTA

Recibido / Verificado
DANIEL RICARDO GONZALEZ SOTO
Representante Legal
COREMPORIUM S.A.S. – Interventoría

JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S

construcción e interventoría

BITACORA DE OBRA

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellaro@gmail.com

Contrato de obra Publica
Nº CoP - 2026 - 002

Contratante : Municipio de el Doncello
Nit: 800.095.760 - 9

Contratista: JaCo Ingenieria ZoMac S.A.S
Nit: 901.502.544 - 8

Interventoria: Coremporium S.A.S
Nit: 901.417.449 - 2

objeto: "Construcción de la segunda fase del box Culvert en el Barrio la libertad del municipio de el Doncello Departamento del Caquetá"

- 27 Mayo 2026 Miercoles
Clima soleado
Actividades
- Contratación de personal y recepción de hojas de vida
- Toma en arriendo de casa-bodega en el barrio la libertad
Novedades - Suscripción acta de inicio

- 28 Mayo 2026 Jueves
Clima soleado
Actividades
- Traslado de equipo a la obra
- Cotización de materiales para la construcción
- Legalización de hojas de vida
- Aprobación de actividades y Cronograma de obra
novedades - ninguna

- 29 mayo Viernes
clima soleado
Actividades
- Replanteo del box = Alineación y Ubicacion del box
- Elaboración Plan de gerencia y Plan de Calidad
Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro / oficial / Ayudante

Firma

Residente de obra Director de obra

Residente de interventoria

- 30 Mayo 2026 Sabado
clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
Ayudantes

Actividades
- Traslado de materiales de hierro para la figuración
- Ingreso de cemento
- Contratación de cuadrilla para excavación y conformación del box

novedades ninguna

Equipo - mezcladora - vibrador - planta electrica - Rana - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor: - Carretillas - palas - palin - Picas - Codales - niveles - valdes - canecas - Mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra Residente Interventoria

- 31 Mayo 2026 Domingo

Dia de descanso

- 01 Junio 2026 Lunes
Clima lluvias todo el dia

Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Inicio de excabación de 3.50m de ancho x 75 M de largo con retroexcabadora (Pajarita).
- organización del ingreso al segundo tramo de la construcción del Box y de Materiales
- Dotación de epp al personal
- Construcción del sitio para figurar Hierro/acero

Novedad - llega varilla de 1/2 y 100kg de alambre

equipo - Mezcladora - vibro - planta electrica - Rana - motobomba - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor: carretillas - palas - palin - picas - Codales - niveles - canecas

Herramientas de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

-02 Junio 2026 Martes
Clima lluvias variables todo el dia

Personal Residente de obra
Maestro
Oficial
Ayudantes

Actividades
- manejo de transito para el descargue de material y maquinaria por la via principal
- perfilado de excavación con retroexcavadora
- Continua la figuración de acero para el box

novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador de concreto
-planta electrica -Rana -tronzadora
-pulidora -taladro
Herramienta menor -Carretilla -Palas -palin
-picas -Codales -niveles
-Valdes -canecas
-mangueras
Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente Interventoria

- 03 Junio 2026 Miercoles
Clima Dia de mucha lluvia

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Construcción de cuneta para el manejo del agua (desvio del box)
- Perfilado de excavación para anchura
- construcción del muro para desvio del agua
- Atecuación de la segunda etapa de la Construcción del box de 0.00 al 0.75 m

novedades Ninguna

equipo -Mezcladora - vibrador de concreto - Rana
-Planta electrica - tronzadora - Pulidora
-taladro

Herramienta menor - Carretilla - Palas - Palin - Picas
-Codales - Niveles - Valdes - Canecas
-mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

-04 Junio 2026 Jueves
Clima Nublado

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudante

Actividades
- Continua Conformación desde 0.00 hasta 0.75 ML
- De 0.00 a 0.10 m Construcción de pabellon de desvio; de 0.10 a 0.40m de conformación con material mixto grueso +0,30 m
- figuración de Hierro del box
- Aseo de ramas y material vegetal

novedades - llega hierro para figurar (ST de acceso de 1/2), Entrega de epp, 3 carretillas nuevas y 12 valdes

equipo - Mezcladora - Vibrador Compactador - Planta electrica - Rana - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor :- Carretillas - Palas - Palin - Picas - Codales - Niveles - valdes - Canecas

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 05 Junio 2026 Viernes
Clima lluvias variables y sol

Personal
Director de obra
Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Aplicación de solado de limpieza de 0.10 al 0.30, e = 0,07m x 3.50m de ancho
- Preparación de alambre negro para amarre del acero (100 kg)
- Solado de 0.30 al 0.40, e = 0,07m
- Amarre de acero del anillo 10 al 15

Novedades - Por las lluvias se dispuso un encauchetado para laborar - llega 6T de acero de ½ y 5T de cemento

equipo - mezcladora - vibro compactador - planta Electrica - Rana - motobomba - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas - Codales - Niveles - Valdes - Canecas - Extensiones electricas - mangueras

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

-06 Junio 2026 sabado
Clima lluvias todo el dia

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Amarre de Hierro del 15 al 40
- fundición de placa inferior del 0.10 al 0.22
- Toma de muestra de concreto para laboratorio
- solado de limpieza del 0.30 al 0.40, e=0,07m
- figurado y amarre de acero del 0.10 al 0.40

novedad -llega 200 kg de alambre negro, 1008 varillas de ½ y 100 Bultos de cemento

equipo -mezcladora -vibrador compactador -planta electrica -Rana -motobomba -tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor: -Carretilla -palas -palin -picas -codales -valdes -niveles -Canecos -mangueras

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra Residente interventoria

-07 Junio 2026 Domingo

Dia de descanso

- 08 Junio 2026 Lunes
Clima lluvias variables

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Conformación del 0.52 al 0.65 con grueso de 0.15 a 0.49 m, material mixto compactado con rana
- solado de limpieza del 0.40 al 0.50, e = 0.07 m
- Fundición de placa inferior desde 0.10 hasta 0.31 mL, ancho 3 m, grueso 0.25 m, Con doble parrilla en acero de 1/2

novedades Ninguna

equipo - mezcladora - vibrador de concreto - planta electrica - Rana - motobomba - tronzadora - Pulidora - taladro

Herramienta menor - Carretilla - valdes - palas - Picas - Codales - Palin - Niveles - Canecas - extensión electricas

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente Interventoria

-09 Junio 2026 Martes
Clima lluvias variables

Personal Residente de obra
Maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- Conformación del 0,65 al 0,75, grueso 0,45 m material mixto compactado; se termina la conformación del box
- Resumen: Conformación del 0,65 al 0,75, grueso 0,45 m, ancho 2.50 m; solado de limpieza de 0,10 al 0,75, e = 0,06; placa inferior fundida de 0,10 al 0.31, grueso 0.25 m, ancho 2 m; acero instalado para continuar amarre de 0.10 al 0,50.

novedades ninguna

equipo -Mezcladora -Vibrador de concreto - planta electrica - rana - cotobomba - tronzadora -Polidora - taladro

Herramienta menor -Carretilla - palas - palin - picas -Valdes - Codales - niveles - Canecas

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 10 Junio 2026 miercoles
clima soleado

personal Residente de obra
maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- Instalación de acero figurado del 0.40 al 0.60 mL

novedades llegan 200 bultos de cemento

equipo - mezcladora - vibrador de concreto - planta electrica - Rana - tronzadora - pulidora - taladro

Herramienta menor - Carretilla - palas - palin - Picas - Codales - niveles - Valdes - Canecas - Mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 11 Junio 2026 Jueves
Clima Nublado

Personal Residente de obra
Maestro
oficiales
ayudantes

Actividades
- figurado de acero para el aliviadero del 0,40 al 0,60.
- Amarre de hierro del 0,40 al 0,60.

Novedades -6 viajes de fundición - la lluvia de anoche ocasiono daños, llevandose gran parte de la conformación final del box (0.70/0,75); se realiza movimiento de material para mejorar la salida.

equipo - Mezcladora - vibrador de concreto - planta electrica - rana - motobomba - tronzadora - talado - pulidora

Herramienta menor - Carretillas - Palas - Palin - Picas - Codales - niveles - valdes - Canecas - extensiones - Mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 12 Junio 2026 Viernes
Clima soleado

Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- Fundición del 0,31 al 0,60 de placa inferior

Novedades Visita del director de obra

equipo - Mezcladora - Planta electrica - vibrador
. de concreto - rana - motobomba
- tronzadora - pulidora - taladro

Herramienta menor - Carretilla - Valdes - palas
- Palin - picas - codales - Niveles
- Canecas - extensión - mangueras

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 13 Junio 2026 Sabado
Clima soleado con lluvias variables

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Amarre de acero (primer anillo) del 0,60 al 0,75

Novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador de concreto -Rana
-Tronzadora -Pulidora -taladro
Herramienta menor -Carretillas -valdes -palas -palin
-picas -Codales -niveles -Canecas
Herramienta de mano
Firma

Residente de obra Residente interventoria

- 14 Junio 2026 Domingo

Dia de descanso

- 15 Junio 2026 Lunes
Clima Soleado

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Amarre de acero del 0,60 al 0,75

novedades Ninguna

equipo - Mezcladora - vibrador de concreto - rana
- tronzadora - pulidora - taladro
Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas
- Codales - niveles - valdes
- Canecas - mangueras

Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

-16 Junio 2026 Martes
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficiales
ayudantes

Actividades
- Encofrado del 0,10 al 0,40 para fundir Muro en el costado izquierdo

novedades ninguna

equipo -mezcladora -vibrador de concreto -planta electrica- Rana - motobomba
Herramienta menor -Carretillas -palas -picas -palin -Codales -niveles -Canecas
Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 17 Junio 2026 Miercoles
Clima Soleado

Personal Residente de obra
maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- Fundición de placa inferior Terminada 0,60 al 0,75

novedades toma de muestras de concreto del 0,60 al 0,75 placa inferior

equipo -Mezcladora -vibrador de concreto -planta electrica -rana -motobomba -tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor -carretillas -palas -picas -palin -Codales -Valdes -Extenciones

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 18 Junio 2026 Jueves
Clima nublado

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- fundición de muro lateral lado izquierdo desde 0,19 al 0,40 (30mL de fundición)

novedades se toma muestras para laboratorio

equipo -mezcladora -vibrador de concreto -Rana
-motobomba -tronzadora -pulidora -taladro
Herramienta menor -Carretillas -palas -palin -picas
-valdes -canecas -niveles
Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

-19 Junio 2026 viernes
Clima sol en la mañana, lluvias fuertes en la tarde

Personal Residente de obra
Maestro de
Oficial
ayudantes

Actividades
-Encofrado para fundición de muro del 0,40 al 0,70 (lado izquierdo)
-Excavación de detas y alistamiento para fundición de ciclopeo

novedades -se alisto material y equipo; ingreso de cemento

equipo -Mezcladora -vibrador de concreto -Planta electrica -Rana -motobomba -tronzadora -Pulidora -taladro

Herramienta menor -Carretillas -valdes -Canecas -palas -Palin -picas -Codales -niveles -extensiones -Mangueras

Herramienta de mano

Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 20 Junio 2026 sabado
Clima soleado

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Desencofrado de la fundisión del dia anterior
- fundición de muro del 0,40 al 0,70

novedades ninguna

equipo -mezcladora - vibrador de concreto - pulidora
-planta electrica - rana - motobomba
-tronzadora -pulidora -taladro

Herramienta menor -Carretillas -palas -palin -picas
-Codales -niveles -mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 21 Junio 2026 Domingo

Dia de descanso

- 22 Junio 2026 Lunes
Clima soleado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Desencofrado de la fundición del dia anterior y encofrado del 0,70 al 0,75

Novedades Ingreso de ferreteria 50 bultos de cemento

equipo -Mezcladora -Vibrador de Concreto - Motobomba
-planta electrica - Pulidora - tronzadora - Rana
Herramienta menor - Carretillas -palas - palin - Picas
-valdes - niveles - canecas - mangueras.
Herramienta de mano
Firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 23 Junio 2026 Martes
Clima Sol y lluvias en la tarde

Personal Residente de obra
Maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- fundición del 0,70 al 0,75

novedades llegan 6m³ (6 viajes) de fundición

equipo - mezcladora - vibro - pulidora - tronzadora
- talado - Planta electrica rana

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - Picas
- Codales - niveles - valdes - canecas

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 24 Junio 2026 miercoles
Clima sol lluvia en la tarde

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Encofrado del 0,45 al 0,70 listo para fundir
- Toma de muestras de fundición del 0,70 al 0,75

novedades - llegan 200 bultos de cemento, se aplica barniz a las formaletas de madera

equipo - mezcladora - pulidora - tronzadora - Rana - vibrador de concreto - Planta electrica

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas - Valdes - niveles - Codales

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 25 Junio 2026 Jueves
Clima nublado

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Suministro de cemento y alistamiento para inicio de fundición de muro lado derecho de adosado
- fundición del muro del 0,45 al 0,10

novedades ninguna

equipo - Mezcladora - fronzadora - Pulidora - Rana
- Planta electrica - Vibro - motobomba
Herramienta menor - Carretillas - palas - Palin - Picas
- Codales - niveles - Valdes
- Canecas - Extensión - Mangueras
Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 26 Junio 2026 viernes
Clima soleado con lluvias variables

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- Formaleteo para el 0,10 al 0,40

Novedades El motor de la mezcladora se varo se envia otro para continuar los ejercicios

equipo - mezcladora - pulidora - tronzadora - taladro
- Planta electrica - rana - motobomba
Herramienta menor - Carretillas - Palas - Palin - Picas
- Valde - niveles - mangueras
Herramienta de mano
firma

Residente de obra

Residente interventoria

- 27 Junio 2026 Sabado
Clima Soleado

Personal Director de obra
Residente de obra
Maestro
Oficial
ayudantes

Actividades
- formaleteo del 0,10 al 0,40
- Amarre de hierro de placa superior en forma a lo largo

novedades se recibe visita del director de obra

Equipo - mezcladora - vibrador de concreto - rana
- tronzadora - pulidora - taladro
Herramienta menor - carretilla - palas - picas - palin
- Codales - niveles - valdes - canecas
Herramienta de mano
firma

Residente de obra Residente interventoria

- 28 Junio 2026 Domingo
Dia de descanso
- 29 Junio 2026 Lunes
Dia festivo (San Pedro y San Pablo) lluvias fuertes en la mañana - se recibio tacos a la obra para fundición
firma

Residente de obra Residente interventoria

- 30 Junio 2026 martes
Clima nublado mañana - lluvias en la tarde

Personal Residente de obra
maestro
oficial
ayudantes

Actividades
- formaleteo de placa superior del 0,10 al 0,20

Novedades las lluvias en la tarde retrazaron el avance de las actividades

equipo - mezcladora - taladro - Pulidora - tronzadora - Rana - Planta electrica - Vibro

Herramienta menor - Carretillas - palas - palin - picas - Valdes - Canecas - mangueras

Herramienta de mano

firma

Residente de obra

Residente interventoria

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellaro@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901502544	8	JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CA 11 MZ 19	FLORENCIA-CAQUETA	4352655	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	414212398	9506779384	E	2026/06/11	2026/06/23	BANCO DAVIVIENDA	12	$2,438,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																								$9,402,537	$1,505,000			$9,577,628	$383,900			$9,544,887	$382,500			$9,577,628		$145,100		$0	$0		$2,416,500
Centro de Trabajo: OBRA DONCELLO (6 Afiliados)																								$1,108,907	$177,700			$1,283,998	$51,800			$1,251,257	$50,400			$1,283,998		$89,600		$0	$0		$369,500
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (6 Afiliados)																								$1,108,907	$177,700			$1,283,998	$51,800			$1,251,257	$50,400			$1,283,998		$89,600		$0	$0		$369,500
1	CC	1117836054	DIAZ CABRERA FEIMER	X																		230301	4	$233,454	$37,400	ESSC62	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	SI	$72,500
2	CC	1117813160	HENAO ALVAREZ MANUEL	X	X																	230301	4	$233,454	$37,400	ESSC62	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	SI	$72,500
3	CC	18385025	MONTOYA OSORIO JAIR	X																			0	$0	$0	ESSC62	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	SI	$25,000
4	CC	1007499293	PALENCIA SEPULVEDA YESID	X	X																	230301	4	$233,454	$37,400	ESSC62	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	SI	$72,500
5	CC	1115942681	RESTREPO MENDEZ LEIDER FERNANDO	X	X																	230301	4	$233,454	$37,400	ESSC62	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	SI	$72,500
6	CC	1117458076	ROMERO ROMERO ELLYS STEVER	X																		230301	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	SI	$54,500
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																								$183,334	$29,400			$183,334	$7,400			$183,334	$7,400			$183,334		$12,800		$0	$0		$57,000
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																								$183,334	$29,400			$183,334	$7,400			$183,334	$7,400			$183,334		$12,800		$0	$0		$57,000
7	CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	X	X																	25-14	1	$183,334	$29,400	EPS005	1	$183,334	$7,400	CCF13	1	$183,334	$7,400	14-11	1	$183,334	6.960%	$12,800	1	$0	$0	SI	$57,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)																								$8,110,296	$1,297,900			$8,110,296	$324,700			$8,110,296	$324,700			$8,110,296		$42,700		$0	$0		$1,990,000
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (6 Afiliados)																								$8,110,296	$1,297,900			$8,110,296	$324,700			$8,110,296	$324,700			$8,110,296		$42,700		$0	$0		$1,990,000
8	CC	1117503840	CUELLAR OBREGON JAIRO ALEXIS																			25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
9	CC	1018406112	MUÑOZ TORRES BRIDI JASBLEIDY	X																		230301	5	$583,334	$93,400	EPS005	5	$583,334	$23,400	CCF13	5	$583,334	$23,400	14-11	5	$583,334	0.522%	$3,100	5	$0	$0	SI	$143,300
10	CC	1117549235	MUÑOZ PEREZ KATHLEEN JULIETH	X																		230301	5	$291,818	$46,700	EPS005	5	$291,818	$11,700	CCF13	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	0.522%	$1,600	5	$0	$0	SI	$71,700
11	CC	17647011	PAREDES URQUINA HELVER																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
12	CC	1117930353	VANEGAS HERNANDEZ YUDY SORAYA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
13	CC	80096122	VELANDIA QUITIAN EDICSON RAUL	X	X																	230301	2	$233,334	$37,400	EPS010	2	$233,334	$9,400	CCF13	2	$233,334	$9,400	14-11	2	$233,334	0.522%	$1,300	2	$0	$0	SI	$57,500
Total			**Afiliados(13)**																					$9,402,537	$1,505,000			$9,577,628	$383,900			$9,544,887	$382,500			$9,577,628		$145,100		$0	$0		$2,416,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$1,505,000	$13,300	$0	$1,518,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$869,600	$7,700	$0	$877,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$635,400	$5,600	$0	$641,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$145,100	$1,300	$0	$146,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$145,100	$1,300	$0	$146,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$382,500	$3,400	$0	$385,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	$382,500	$3,400	$0	$385,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$383,900	$3,600	$0	$387,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$44,700	$400	$0	$45,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$9,400	$100	$0	$9,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$700	$0	$70,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7,100	$100	$0	$7,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$252,600	$2,300	$0	$254,900
TOTAL				13	$2,416,500	$21,600	$0	$2,438,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901502544	8	JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CA 11 MZ 19	FLORENCIA-CAQUETA	4352655	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	522681705	9508862133	E	2026/07/10	2026/07/30	BANCO DAVIVIENDA	20	$4,397,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																								$15,744,715	$2,519,600			$17,495,620	$700,400			$17,168,215	$687,300			$17,495,620		$426,000		$0	$0		$4,333,300
Centro de Trabajo: OBRA DONCELLO (8 Afiliados)																								$2,334,541	$373,800			$4,085,446	$163,800			$3,758,041	$150,700			$4,085,446		$284,800		$0	$0		$973,100
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (8 Afiliados)																								$2,334,541	$373,800			$4,085,446	$163,800			$3,758,041	$150,700			$4,085,446		$284,800		$0	$0		$973,100
1	CC	1010010594	ARIAS MORALES CESAR LUIS	X	X																	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC62	2	$116,727	$4,700	CCF13	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
2	CC	1117836054	DIAZ CABRERA FEIMER		X																	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
3	CC	1117813160	HENAO ALVAREZ MANUEL	X	X																	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC62	2	$116,727	$4,700	CCF13	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
4	CC	80400129	LOPEZ GARZON JAVIER	X	X																	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF13	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
5	CC	1117974446	MEDINA HECTOR FABIAN	X	X																	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC62	2	$116,727	$4,700	CCF13	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$36,300
6	CC	18385025	MONTOYA OSORIO JAIR																				0	$0	$0	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$249,000
7	CC	1007499293	PALENCIA SEPULVEDA YESID	X																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	1115942681	RESTREPO MENDEZ LEIDER FERNANDO	X	X																	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																								$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$44,000			$1,100,000	$44,000			$1,100,000		$76,600		$0	$0		$340,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																								$1,100,000	$176,000			$1,100,000	$44,000			$1,100,000	$44,000			$1,100,000		$76,600		$0	$0		$340,600
9	CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	X	X																	25-14	6	$1,100,000	$176,000	EPS005	6	$1,100,000	$44,000	CCF13	6	$1,100,000	$44,000	14-11	6	$1,100,000	6.960%	$76,600	6	$0	$0	SI	$340,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)																								$12,310,174	$1,969,800			$12,310,174	$492,600			$12,310,174	$492,600			$12,310,174		$64,600		$0	$0		$3,019,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (6 Afiliados)																								$12,310,174	$1,969,800			$12,310,174	$492,600			$12,310,174	$492,600			$12,310,174		$64,600		$0	$0		$3,019,600
10	CC	1117503840	CUELLAR OBREGON JAIRO ALEXIS																			25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
11	CC	1018406112	MUÑOZ TORRES BRIDI JASBLEIDY																			230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
12	CC	1117549235	MUÑOZ PEREZ KATHLEEN JULIETH																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
13	CC	17647011	PAREDES URQUINA HELVER																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
14	CC	1117930353	VANEGAS HERNANDEZ YUDY SORAYA		X																	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	SI	$14,600
15	CC	80096122	VELANDIA QUITIAN EDICSON RAUL	X	X																	230301	15	$1,750,000	$280,000	EPS010	15	$1,750,000	$70,000	CCF13	15	$1,750,000	$70,000	14-11	15	$1,750,000	0.522%	$9,200	15	$0	$0	SI	$429,200
Total Afiliados(15)																								$15,744,715	$2,519,600			$17,495,620	$700,400			$17,168,215	$687,300			$17,495,620		$426,000		$0	$0		$4,333,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$2,519,600	$37,000	$0	$2,556,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$745,400	$11,000	$0	$756,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,774,200	$26,000	$0	$1,800,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$426,000	$6,300	$0	$432,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$426,000	$6,300	$0	$432,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$687,300	$10,100	$0	$697,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	15	$687,300	$10,100	$0	$697,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$700,400	$10,600	$0	$711,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$159,100	$2,400	$0	$161,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,000	$1,100	$0	$71,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$1,100	$0	$71,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$4,700	$100	$0	$4,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$396,500	$5,900	$0	$402,400
TOTAL				15	$4,333,300	$64,000	$0	$4,397,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901502544	8	JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CA 11 MZ 19	FLORENCIA-CAQUETA	4352655	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	565559547	9509461052	N	2026/07/10	2026/08/14	BANCO DAVIVIENDA	35	$1,057,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$3,326,719	$532,300			$3,326,719	$133,100			$3,326,719	$133,100			$3,326,719		$231,500		$0	$0		$1,030,000
Centro de Trabajo: OBRA DONCELLO (2 Afiliados)																						**$3,326,719**	**$532,300**			**$3,326,719**	**$133,100**			**$3,326,719**	**$133,100**			**$3,326,719**		**$231,500**		**$0**	**$0**		**$1,030,000**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																						**$3,326,719**	**$532,300**			**$3,326,719**	**$133,100**			**$3,326,719**	**$133,100**			**$3,326,719**		**$231,500**		**$0**	**$0**		**$1,030,000**
1	CC	1117813160	HENAO ALVAREZ MANUEL	X	X						A			¤	¤					230301	2	($116,727)	($18,700)	ESSC62	2	($116,727)	($4,700)	CCF13	2	($116,727)	($4,700)	14-11	2	($116,727)	6.960%	($8,200)	2	$0	$0	SI	($36,300)
2	CC	1117813160	HENAO ALVAREZ MANUEL	X							C									230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1115942681	RESTREPO MENDEZ LEIDER FERNANDO	X	X						A			¤	¤					230301	1	($58,364)	($9,400)	ESSC62	1	($58,364)	($2,400)	CCF13	1	($58,364)	($2,400)	14-11	1	($58,364)	6.960%	($4,100)	1	$0	$0	SI	($18,300)
4	CC	1115942681	RESTREPO MENDEZ LEIDER FERNANDO	X							C									230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total		**Afiliados(2)**																				$3,326,719	$532,300			$3,326,719	$133,100			$3,326,719	$133,100			$3,326,719		$231,500		$0	$0		$1,030,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$532,300	$13,900	$0	$546,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$532,300	$13,900	$0	$546,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$231,500	$6,100	$0	$237,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$231,500	$6,100	$0	$237,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$133,100	$3,500	$0	$136,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	$133,100	$3,500	$0	$136,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$133,100	$3,500	$0	$136,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$133,100	$3,500	$0	$136,600
TOTAL				2	$1,030,000	$27,000	$0	$1,057,000

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellaro@gmail.com

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE

JACO INGENIERÍA ZOMAC S.A.S

CERTIFICA QUE:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, yo, Jairo Alexis Cuéllar Obregón, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.503.840 de Florencia, Caquetá, y Luis Danilo Pabón Calvache, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.168.126 de Bogotá DC, en calidad de representante legal y revisor fiscal de la empresa JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S, identificada con NIT No. 901.502.544-8, certificamos que la mencionada empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses.

Dado en Florencia a los Catorce (14) días del mes de septiembre del Dos mil Veintiséis (2026).

JACO INGENIERIA ZOMAC S.A.S
Nit. 901.502.544-8
R/L. JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON

LUIS DANILO PABON CALVACHE
C.C. 19.168.126
Revisor Fiscal
TP 3329-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



3329-T

LUIS DANILO
PABON CALVACHE
C.C. 19168126
RESOLUCION INSCRIPCION 590 FECHA 26/10/1978
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ **10594**

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOCARD 1793 01/2008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

44FF097FC576E937

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS DANILO PABON CALVACHE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19168126 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FIC – SENA

Dirección: Casa 11 manzana 19 B. / Portal del Mirador – Florencia, Caquetá.
Contacto Telefónico: 3136482832
Correo electrónico: jacoingsas@hotmail.com – jalexiscuellaro@gmail.com

Pago FIC Mayo
Box Derecho

102

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7903718

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 167114370		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
28	07	2026
FECHA VENCIMIENTO		
02	08	2026

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador: Jaco Ingenieria Zomac SAS — NIT o C C: 901502544

Dirección: Casa 11 Mzn 19 — Telefono: +57,3136482832

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Caqueta		
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 262,650.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 262,650.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7903718(3900)000000262650(96)20260802

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 167114370

Ciudad | NIT 901502544 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: Jaco Ingenieria Zomac SAS

Suc	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la marca. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0000211914 FECHA: 2026/07/30 HORA: 11:09:14
CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:126
TOTAL EFE: $262,650.00
TOTAL CHQ: $0.00
VALOR FACTURA $ 262,650.00
VALOR FACTURA $ 262,650.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**167114370**	**847070443320**	**30/07/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901502544**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.51.91.20**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 262,650.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 262,650.00	COP$ 262,636.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	167114370	847070443320	30/07/2026

Número de Identificación
901502544

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Departamento
CAQUETA

Dirección de Domicilio
Casa 11 Mzn 19

Localización
Nacional

Correo electrónico
jacoingsas@hotmail.com

Regional
Caqueta

Número Licencia de Obra

Nombre Obra
BOX COULVERT DONCELLO - 2 FASE

Fecha Terminación Obra
27/08/2026

Tipo FIC
Mensual

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total Mano de Obra
262636.00

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte SENA
0.00

Primer Nombre ó Razón Social
Jaco Ingenieria Zomac SAS

Tipo de documento
01

Naturaleza Juridica
01

Ciudad Capital
FLORENCIA (CAQUETA)

Ciudad de Domicilio
Florencia

Teléfono de Contacto
+57,3136482832

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF
36-02-00-018-000000

Número Contrato de Obra
COP-2026-002

Fecha Inicio Obra
27/05/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
EL DONCELLO

Año Periodo a Pagar
2026

Costo Total de Obra a Todo Costo
476404246.00

Número de Trabajadores en el Periodo
6

Aporte FIC
262636.00

Valor del Pago
262636.00

Pago FIC Junio Box Caqueta 103

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7903720

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupon

REFERENCIA		
No. 167114637		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
28	07	2026
FECHA VENCIMIENTO		
02	08	2026

Nombre Pagador: Jaco Ingenieria Zomac SAS — NIT o C.C: 901502544

Dirección: Casa 11 Mzn 19 — Telefono: +57,3136482832

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Caqueta		
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 87,550.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 87,550.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algun incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7903720(3900)000000087550(96)20260802

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 167114637

Cajero | NIT 901502544 | Teléfono

Nombre del Pagador - Cliente: Jaco Ingenieria Zomac SAS

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 08400211022 FECHA: 2026/07/30 HORA: 11:10:2
CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:132
TOTAL EFE: $87,550.00
TOTAL CHQ: $0.00
VALOR FACTURA $87,550.00
VALOR FACTURA $87,550.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	167114637	847070443562	30/07/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901502544**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.51.91.20**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 87,550.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 87,550.00	COP$ 87,545.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	167114637	847070443562	30/07/2026

Número de Identificación
901502544

Primer Nombre ó Razón Social
Jaco Ingenieria Zomac SAS

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CAQUETA

Ciudad Capital
FLORENCIA (CAQUETA)

Dirección de Domicilio
Casa 11 Mzn 19

Ciudad de Domicilio
Florencia

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3136482832

Correo electrónico
jacoingsas@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Caqueta

Regional Centros SIIF
36-02-00-018-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
COP-2026-002

Nombre Obra
BOX COULVERT DONCELLO - 2 FASE

Fecha Inicio Obra
27/05/2026

Fecha Terminación Obra
27/08/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
EL DONCELLO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
6

Costo Total de Obra a Todo Costo
476404246.00

Costo Total Mano de Obra
87545.00

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
87545.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
87545.00

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7911824

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA			
No.	168454367		
FECHA DE EXPEDICIÓN			
14	08	2026	
FECHA VENCIMIENTO			
19	08	2026	

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizarla liquidación y generar un nuevo cupón.

Nombre Pagador: Jaco Ingenieria Zomac SAS — NIT o C.C. 901502544 — VALOR FACTURA $ 175,100.00

Dirección: Casa 11 Mzn 19 — Teléfono: +57,3136482832

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Caqueta		
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 175,100.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 175,100.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7911824(3900)000000175100(96)20260819

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 168454367

Ciudad | NIT 901502544 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: Jaco Ingenieria Zomac SAS

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente de cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

BANCOLOMBIA
FLORENCIA - GRAN PLAZA FLORENCIA
2026 AGO. 18
OF. 847
RECIBIDO Nº 150
