REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE PANDI

ACTA RECIBO FINAL DE OBRAS - CONTRATO MP-COP-057-2026

En el Municipio de PANDI (Cundinamarca), a los Cuatro (04) días del mes de septiembre del año 2026 se reunieron el ingeniero Miller Javier Guerrero Santuario, en su calidad de Secretario de obras publicas y planeacion y supervisor del contrato, el Ingeniero Jesus David Quintero Diaz, representante legal de la Empresa JQ Ingenieria Civil SAS, para dejar constancia por medio de la presente acta de Recibo final de obras, de las siguiente actividades ejecutadas según las condiciones que se detallan a continuación:

"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LA CHISGUA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1325 DE 2025

CONDICIONES SEGÚN CONDICIONES MAYORES Y MENORES						CANTIDADES			VALORES			SALDO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr. UNITARIO**	**Vr. TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO TOTAL**	**CANT**	**VALOR**
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,22	$63.647,00	$523.178,00		16,78	16,78		$1.067.714	$1.067.714	-8,56	-$544.536
630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases	M3	29,22	$771.532,00	$22.544.165,00		32,67	32,67		$25.206.722	$25.206.722	-3,451	-$2.662.557
630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	25,65	$531.951,00	$13.644.543,00		18,83	18,83		$10.014.217	$10.014.217	6,82455	$3.630.326
671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,33	$637.333,00	$11.044.981,00		20,72	20,72		$13.205.540	$13.205.540	-3,39	-$2.160.559
640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	kg	3218,85	$7.915,00	$25.477.198,00		2999,35	2999,35		$23.739.871	$23.739.871	219,498	$1.737.327
		SUB TOTAL			$73.234.065,00					$73.234.064,00	$73.234.064,00		$ 1,00
		ADMINISTRACION		28,5%	$20.871.709,00					$20.871.708,00	$20.871.708,00		$0,00
		IMPREVISTOS		1,0%	$732.341,00					$732.341,00	$732.341,00		$0,00
		UTILIDAD		3,5%	$2.563.192,00					$2.563.192,00	$2.563.192,00		$0,00
		COSTOS INDIRECTOS			$24.167.241,00					$24.167.241,00	$24.167.241,00		$0,00
		Ajuste al Peso								$1,00	$1,00		-$1,00
		COSTO TOTALES (1)			$97.401.306,00					$97.401.306,00	$97.401.306,00		$0,00

RESUMEN CONVENIO

N°	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA PAGO**	**VALOR FACTURADO**	**% PAGADO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO x PAGAR**	**% PAG. ACUMUL.**
1	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1**	**20/08/2026**	**$97.401.306,00**	**100,00%**		**$0,00**	**100,00%**

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LOS CAMBULOS DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1324 DE 2025

CONDICIONES SEGÚN MAYORES Y MENORES						CANTIDADES			VALORES			SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANT	VALOR
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	18,76	$63.647,00	$1.194.018,00		18,76	18,76		$1.194.018	$1.194.018	0,00	$0
630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases	M3	28,58	$771.532,00	$22.047.298,00		28,58	28,58		$22.047.298	$22.047.298	0,00	$0
630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	15,72	$531.951,00	$8.361.232,00		15,72	15,72		$8.361.232	$8.361.232	0,00	$0
671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20,96	$637.333,00	$13.358.500,00		20,96	20,96		$13.358.500	$13.358.500	0,00	$0
640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	kg	3572,08	$7.915,00	$28.273.017,00		3572,08	3572,08		$28.273.017	$28.273.017	0,00	$0
			SUB TOTAL		$73.234.065,00					$73.234.065,00	$73.234.065,00		$ 0,00
			ADMINISTRACION	28,5%	$20.871.709,00					$20.871.709,00	$20.871.709,00		$0,00
			IMPREVISTOS	1,0%	$732.341,00					$732.341,00	$732.341,00		$0,00
			UTILIDAD	3,50%	$2.563.192,00					$2.563.192,00	$2.563.192,00		$0,00
			COSTOS INDIRECTOS		$24.167.241,00					$24.167.242,00	$24.167.242,00		$0,00
			Ajuste al Peso							$1,00	$1,00		$0,00
			COSTO TOTALES (1)		$97.401.306,00					$97.401.306,00	$97.401.306,00		$0,00

RESUMEN CONVENIO

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO x PAGAR	% PAG. ACUMUL.
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	20/08/2026	$97.401.306,00	100,00%		$0,00	100,00%

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

CONDICIONES SEGÚN MAYORES Y MENORES						CANTIDADES			VALORES			SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANT	VALOR
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,41	$63.647,00	$599.107,00		9,41	9,41		$599.107	$599.107		
630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases	M3	32,74	$771.532,00	$25.261.501,00		32,74	32,74		$25.261.501	$25.261.501		
630,7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	13,85	$531.951,00	$7.368.053,00		13,85	13,85		$7.368.053	$7.368.053		
671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20,91	$637.333,00	$13.327.378,00		20,91	20,91		$13.327.378	$13.327.378		
640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	kg	3370,57	$7.915,00	$26.678.026,00		3370,57	3370,57		$26.678.026	$26.678.026		
			SUB TOTAL		$73.234.065,00					$73.234.065,00	$73.234.065,00		$ 0,00
			ADMINISTRACION	28,5%	$20.871.709,00					$20.871.709,00	$20.871.709,00		$0,00
			IMPREVISTOS	1,0%	$732.341,00					$732.341,00	$732.341,00		$0,00
			UTILIDAD	3,5%	$2.563.192,00					$2.563.192,00	$2.563.192,00		$0,00
			COSTOS INDIRECTOS		$24.167.242,00					$24.167.242,00	$24.167.242,00		$0,00
			Ajuste al Peso		-$ 1,00					-$1,00	-$1,00		
			COSTO TOTALES (1)		$97.401.306,00					$97.401.306,00	$97.401.306,00		$0,00

RESUMEN CONVENIO

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO x PAGAR	% PAG. ACUMUL.
1	Acta Final de obras / Conv. 1326-2025		$97.401.306,00	100,00%	$97.401.306,00	$0,00	100,00%

RESUMEN CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 292.203.918,00

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO x PAGAR	% PAG. ACUMUL.
1	ACTA DE OBRAS No. 1/ CONV.ICCU 1325 DE 2025	20/08/2026	$97.401.306,00	33,33%	$0,00	$0,00	33,33%
2	ACTA DE OBRA No. 1/ CONV.ICCU 1324 - 2025	20/08/2026	$97.401.306,00	33,33%	$0,00	$0,00	66,67%
3	ACTA DE FINAL OBRA No. 1/ CONV.ICCU 1326 - 2025		$97.401.306,00	33,33%	$97.401.306,00	$97.401.306,00	100,00%
	TOTALES		**$292.203.918,00**	**100,00%**	**$ 97.401.306,00**	**$97.401.306,00**	**100,00%**

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
N°	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTA DE OBRAS No. 1/ CONV.ICCU 1325 DE 2025	$0,00
2	ACTA DE OBRA No. 1/ CONV.ICCU 1324 - 2025	$0,00
3	ACTA DE FINAL OBRA No. 1/ CONV.ICCU 1326 - 2025	$0,00

JQ INGENIERIA CIVIL SAS
R/L JESUS DAVID QUINTERO DIAZ
CONTRATISTA

NOMBRE: Ing. MILLER JAVIER GUERRERO SANTUARIO
Secretario de Planeacion y Obras Publicas

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRAS

MUNICIPIO: PANDI

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CONTRATO: MP-COP-057-2026

CONTRATISTA: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

SUPERVISOR: MILLER J. GUERRERO S / SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


MUNICIPIO DE PANDI

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LA CHISGUA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1325 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LOS KAMBULOS DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1324 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

ITEM: EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | **600.4 P** | **CONVENIO No. 1325 DE 2025** | **M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO

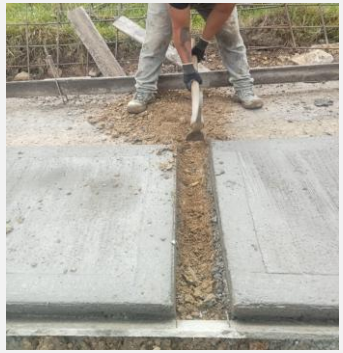

Ubicación	Ancho (a)	Largo (l)	Altura (h)	Cantidad	TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN S. viga Riostras	0,15	2,70	0,10	35,00	1,42
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN, Cuneta Izquierda	0,65	110,00	0,05	1,00	3,80
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN, Cuneta Derecha	0,65	104,39	0,06	1,00	3,78
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN, Rampa final	2,70	1,50	0,10	1,00	0,41
TOTAL:				**M3**	**9,41**

SUPERVISOR

MILLER J. GUERRERO S
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

Director de Obra: JESUS DAVID QUINTERO D.
R/L: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRAS

MUNICIPIO: PANDI

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CONTRATO: MP-COP-057-2026

CONTRATISTA: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

SUPERVISOR: MILLER J. GUERRERO S / SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE PANDI

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LA CHISGUA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1325 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LOS KAMBULOS DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1324 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

ITEM: CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | **630,4** | **CONVENIO No. 1325 DE 2025** | **M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Ubicación	Ancho (a)	Largo (l)	Altura (h)	Cantidad	TOTAL
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) cinta Izquierda	0,90	2,85	0,15	36,00	13,85
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) cinta derecha	0,90	2,85	0,15	36,00	13,85
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi . viga Riostras 15 x 25	0,15	2,70	0,25	34,00	3,44
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi . viga de atraque	0,20	2,70	0,35	2,00	0,38
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi . Rampa Inicial	2,70	1,50	0,15	1,00	0,61
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi . Rampa Final	2,70	1,50	0,15	1,00	0,61
TOTAL:				**M3**	**32,74**

SUPERVISOR
MILLER J. GUERRERO S
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
Director de Obra: JESUS DAVID QUINTERO D.
R/L: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRAS

MUNICIPIO: PANDI

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CONTRATO: MP-COP-057-2026

CONTRATISTA: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

SUPERVISOR: MILLER J. GUERRERO S / SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE PANDI

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LA CHISGUA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1325 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LOS KAMBULOS DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1324 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

ITEM: CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | **630,7** | **CONVENIO No. 1325 DE 2025** | **M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Ubicación	Ancho (a)	Largo (l)	Altura (h)	Cantidad	TOTAL
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI, cinta central	0,90	2,85	0,15	36,00	13,85
TOTAL:				**M3**	**13,85**

SUPERVISOR
MILLER J. GUERRERO S
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
Director de Obra: JESUS DAVID QUINTERO D.
R/L: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRAS

MUNICIPIO: PANDI

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CONTRATO: MP-COP-057-2026

CONTRATISTA: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

SUPERVISOR: MILLER J. GUERRERO S / SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE PANDI

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LA CHISGUA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1325 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LOS KAMBULOS DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1324 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

ITEM: CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | **671,1** | **CONVENIO No. 1325 DE 2025** | **M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Ubicación	Ancho (a)	Largo (l)	Altura (h)	Cantidad	TOTAL
TRAMO 1					
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI, izquierda	0,65	110,00	0,15	1,00	10,73
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI, Derecha	0,65	104,39	0,15	1,00	10,18
TOTAL:				**M3**	**20,91**

SUPERVISOR
MILLER J. GUERRERO S
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
Director de Obra: JESUS DAVID QUINTERO D.
R/L: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRAS

MUNICIPIO: PANDI

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CONTRATO: MP-COP-057-2026

CONTRATISTA: JQ INGENIERIA CIVIL SAS

SUPERVISOR: MILLER J. GUERRERO S / SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE PANDI

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LA CHISGUA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1325 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA MERCADILLO, SECTOR LOS KAMBULOS DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1324 DE 2025, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA ZONA URBANA CON LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR EL PORTON DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA. CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO ICCU No. 1326 DE 2025

ITEM: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | **640,1** | **CONVENIO No. 1325 DE 2025** | **Kg**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Ubicación	Diam	Lc	Cant	Peso	Cant Total	Peso Total
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI BASE IZQUIERDA	1/2	3,30	5,00	1,00	35,00	577,50
	1/2	1,00	15,00	1,00	35,00	525,00
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI BASE DERECHA	1/2	3,30	5,00	1,00	35,00	577,50
	1/2	1,00	15,00	1,00	35,00	525,00
Cuneta Izquierda	3/8	3,30	3,00	0,56	35,00	194,04
	3/8	0,80	15,00	0,56	35,00	235,20
Cuneta Derecha	3/8	3,30	3,00	0,56	35,00	194,04
	3/8	0,80	15,00	0,56	35,00	235,20
Refuerzo 60000 psi, vigas Riostras 0,15 x 25	3/8	3,50	2,00	0,56	34,00	133,28
	3/8	0,30	14,00	0,56	34,00	80,01
Refuerzo 60000 psi, Rampas	1/2	2,70	7,00	1,00	2,00	37,80
	1/2	2,00	14,00	1,00	2,00	56,00
TOTAL:				**Kg**		**3370,57**

SUPERVISOR
MILLER J. GUERRERO S
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
Director de Obra: JESUS DAVID QUINTERO D.
R/L: JQ INGENIERIA CIVIL SAS
