INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA PARCIAL 2

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO:

OBJETO	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA RURAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIRALES ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR".**
VALOR INICIAL	**$ 199.982.144**
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	OBRA – SAMC-007 DE 2026
CONTRATISTA	RAUL REINA ROMERO S.A.S
NIT:	900,688.480-1
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL JOSE REINA ROMERO
C.C.	77,018.775 DE VALLEDUPAR
CDP	No. 0316-6 DEL 16 DE MARZO DE 2026
RP	No. 0430-1 DEL 30 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	5 (CINCO) MESES HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2026
ACTA DE INICIO	4 DE MAYO DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 55,368.658**
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO	**85,68%**

2. DESCRIPCION GENERAL DEL AVANCE DE OBRA:

Para el efectivo cumplimiento del objeto del contrato, el contratista realizo las siguientes actividades:

- El día 28 de Julio de 2026 se procedió a suministrar y hacer Entrega a satisfacción los siguientes materiales para **LA VEREDA LA DUDA:**

RECIBIO: ARELIS ARDILA


1 (UN) TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.

2 (DOS) ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM.

2 CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS.

2 PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA.



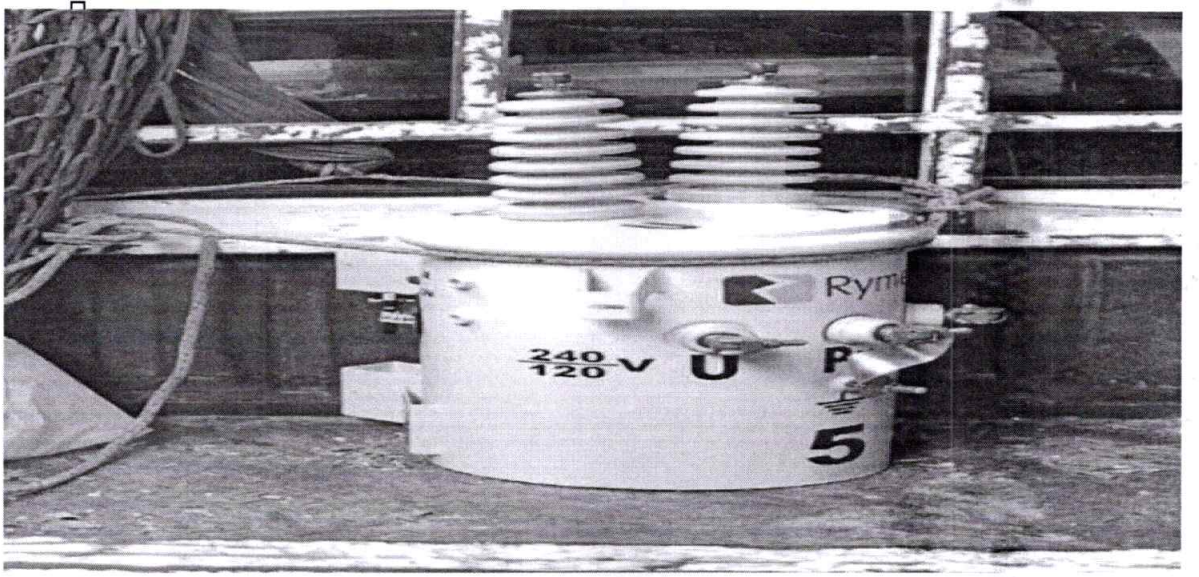

- El día 12 de agosto de 2026 se procedió a suministrar y hacer Entrega a satisfacción los siguientes materiales para **LA VEREDA RIESITO:**

RECIBIO: ELADIO DURAN

1 (UN) TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.


2 (DOS) ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM.

2 CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS.

2 PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA.

1 KIT SPT MONOFASICO EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS 15 KV.

1 CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS.

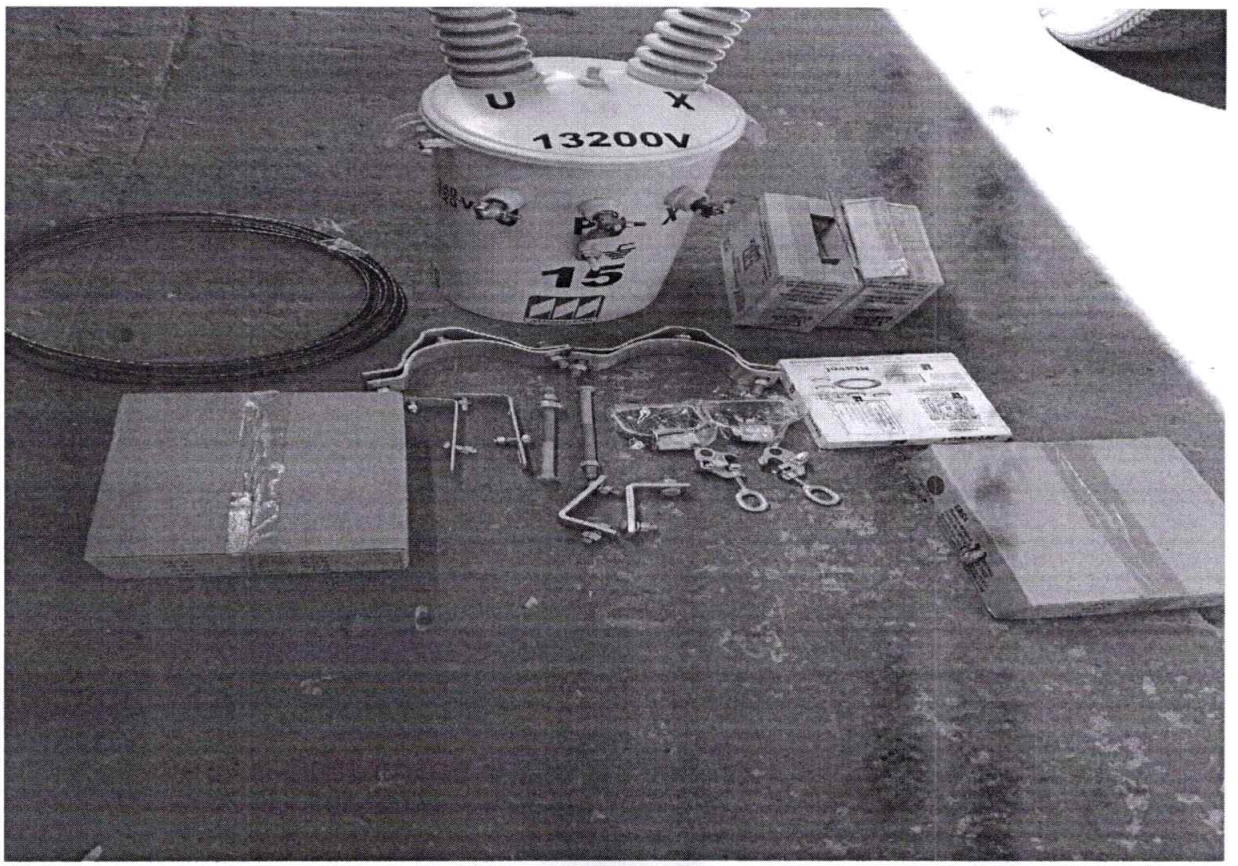
U
X
13200V
15


U
X
13200V
15

- El día 9 de septiembre de 2026 se procedió a suministrar y hacer Entrega a satisfacción los siguientes materiales para **LA VEREDA CAÑO PADILLA:**

RECIBIO: JOSE DE JESUS JIMENEZ CARDENAS

1 (UN) TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.





3.BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE EGRESO	PORCENTAJE %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199,982.144**		**100%**
VALOR DEL ANTICIPO	$ 99,991.072		-
ACTA PARCIAL 1	**$ 115,980.326**		
AMORTIZACIÓN 50%	$ 57,990.163		-
ACTA PARCIAL 2	**$ 55,368.658**		
AMORTIZACIÓN 50%	$ 27,684.329		
PAGO AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL 2	$ 27,684.329		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR)	**$ 28,633.160**		

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 85,68%

Para mayor constancia se firma en Valledupar a los 28 días del mes de septiembre de 2,026.

RAUL JOSE REINA ROMERO
C.C. 77.018.775 DE VALLEDUPAR
REPRESENTANTE LEGAL
RAUL REINA ROMERO S.A.S
