
Bogotá, 10 de Junio de 2026
INTER-WPG-OFC-148

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación
Supervisor Del Contrato
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Remision Informe Mensual De Interventoria No.14

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia, esta interventoria se permite remitir el informe mensual de interventoria No.14, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026. Para su informacion y fines pertinentes, acompañados de todos sus anexos.

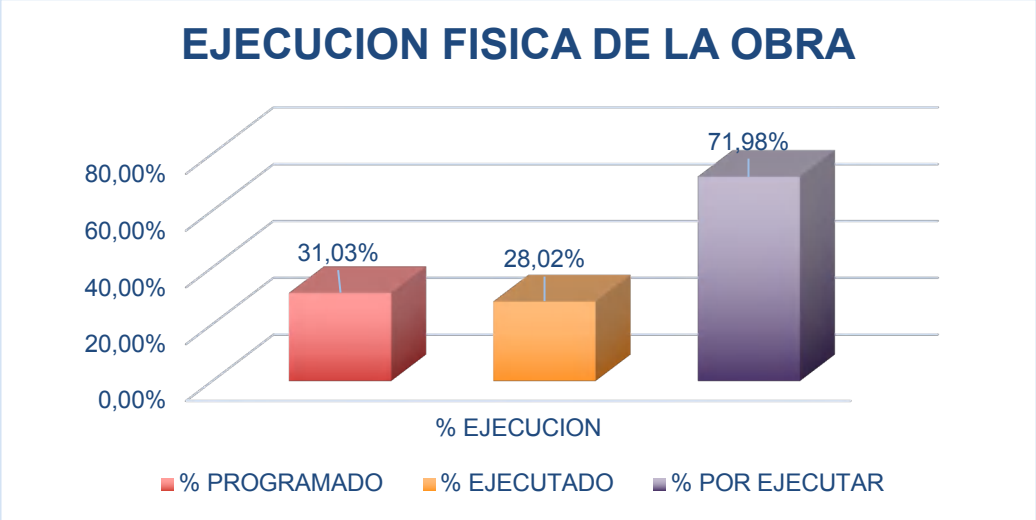

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORME MENSUAL PERIODO 14


Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA


Informe No.	*14*	*Período al que corresponde*	***Desde***	*01/Mayo/2026*	***Hasta***	*31/Mayo/2026*

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO OBRA							
Contratista	*CONSORCIO COLPITALITO 23*						
Contrato de obra No.	*1506 De 2023*	*Objeto*	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.				
Valor	***$12.653.913.161,52***	*Plazo*	*18 Meses 20 Días*	*Fecha de inicio*	*Dic/04/23*	*Fecha de Terminación*	*Nov/08/26*

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA							
Contratista	*CONSORCIO INTERCONSULTORES*						
Contrato de Interventoría No.	*1585 De 2023*	*Objeto*	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"				
Valor	***$ 973.140.781,00***	*Plazo*	*18 Meses 11 Días*	*Fecha de inicio*	*Dic/04/23*	*Fecha de Terminación*	*Oct/30/26*

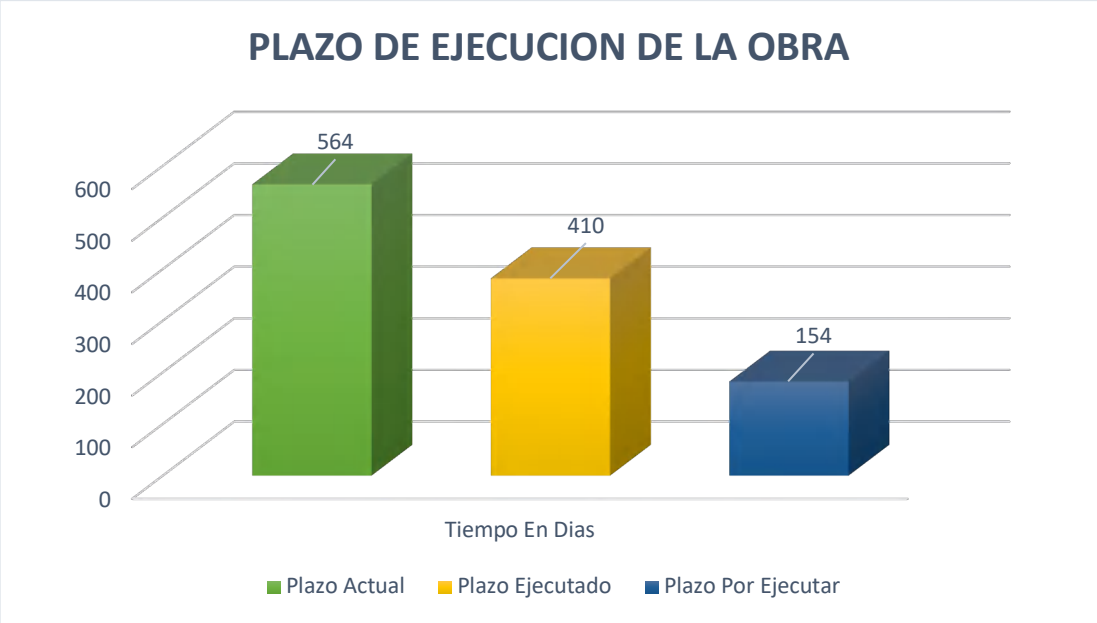

2. ASPECTOS TÉCNICOS				
Item	***Descripción***			***Evidencia***
3.1	*Programación de obra (%)*	*Programado*	*Ejecutado*	*Se adjunta registro Semanal fotográfico de avance del periodo.*
		49,39%	*34,20%*	

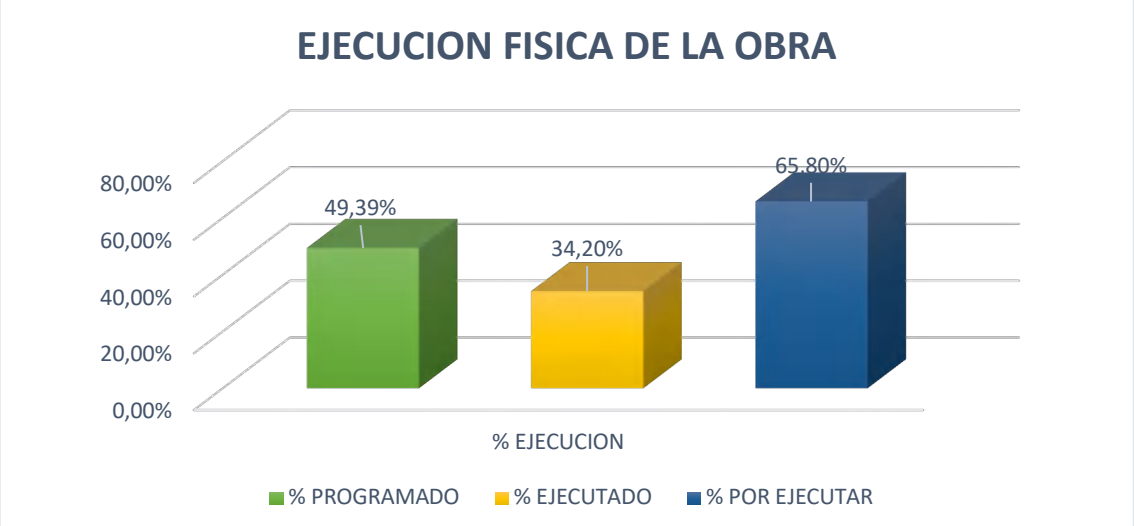


Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

COMPONENTE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

3. ASPECTOS FINANCIEROS					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
4.1	*Entrega de recurso*		*Valor*	*Estado*	-
		Acta Parcial 1	*$554.458.857,38*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 2	*$368.711.925,91*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 3	*$247.093.830.03*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 4	*$354.770.738,00*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 5	*$1.213.153.654,82*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 6	*$648.120.653,54*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 7	*$731.790.613,45*	*DESEMBOLSADA*	
		Acta Parcial 8	*$875,083,659.21*	*PRESENTE*	
		Total entrega de recursos	*$ 4,993,183,932.36*		
4.2	*Plan de inversión del anticipo de obra (si aplica)*				*Si Aplica*
4.3	*Informe de inversión del anticipo de obra (si aplica)*				*Si Aplica*

El acta parcial No.07 de obra e interventoría se encuentra desembolsada y con el presente informe se presenta el acta parcial de obra No.08.

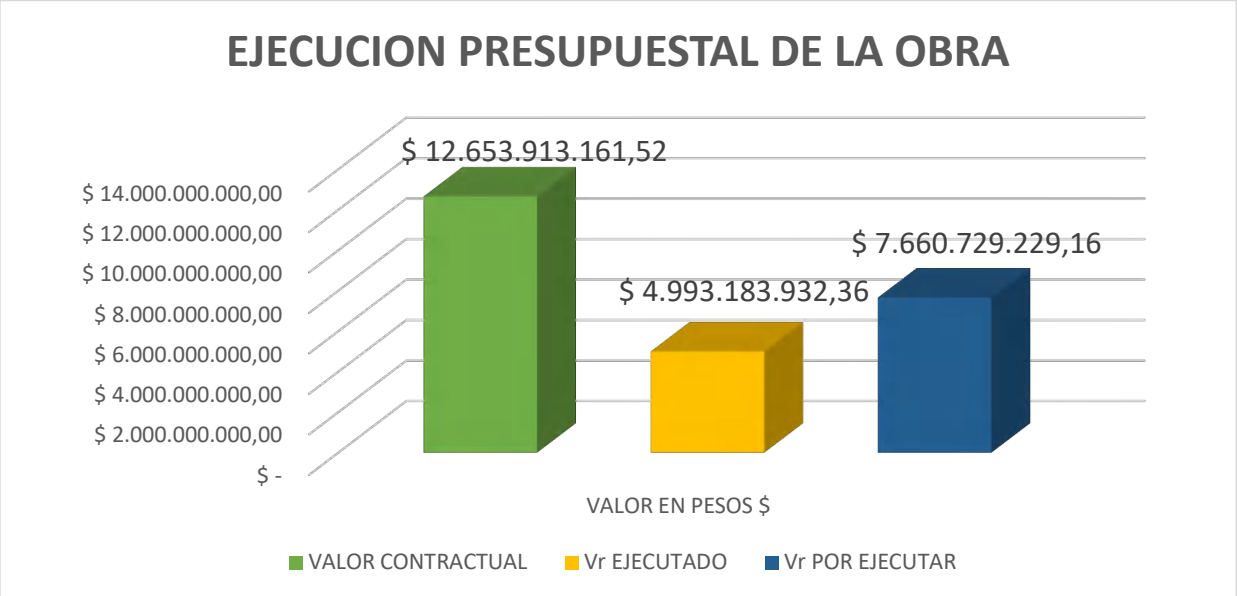


Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR DEL CONTRATO	***$ 973.140.781,00***
VALOR FACTURADO PERIODO 04-12-2023 A 28-12-2023	$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 06-05-2024 A 31-05-2024	$40.448.251,76
VALOR FACTURADO PERIODO 01-06-2024 A 30-06-2024	$26.897.852,94
VALOR FACTURADO PERIODO 01-07-2024 A 31-07-2024	$18.025.707,97
VALOR FACTURADO PERIODO 01-08-2024 A 31-10-2024	$ 0,00
VALOR FACTURADO PERIODO 01-11-2024 A 15-11-2024	$25.867.317,47
VALOR FACTURADO PERIODO 24-11-2025 A 11-01-2026	$23.623.405,60
VALOR FACTURADO PERIODO 12-01-2026 A 28-02-2026	$49.824.848,77
VALOR FACTURADO PERIODO 01-03-2026 A 30-04-2026	$56.247.536,14
VALOR FACTURADO PERIODO 01-05-2026 A 15-08-2026	$67.438.656,12
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$664.767.204,23

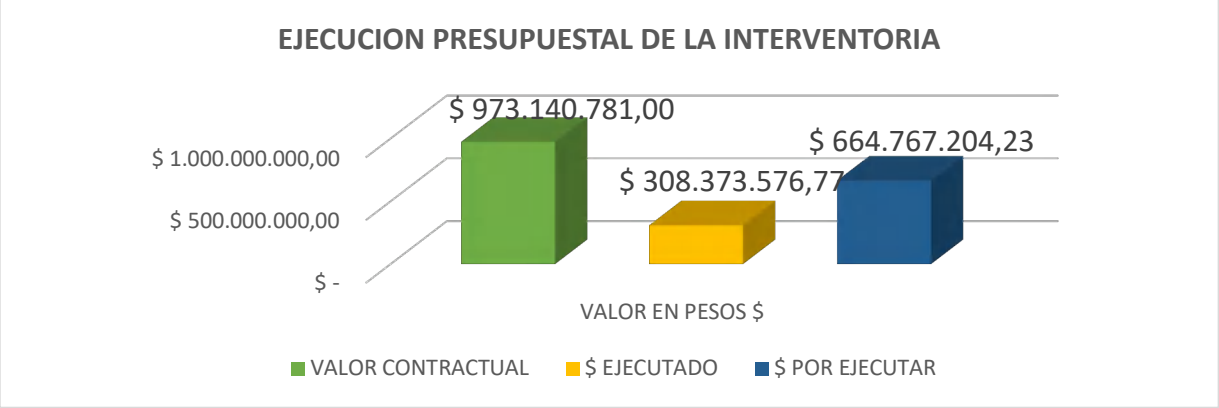

RESPECTO AL BALANCE DE MAYORS Y MENORES CANTIDADES NO.02

Actualmente se encuentra en proceso de revisión técnica, análisis y aval de las cantidades de obra mayores y menores correspondientes a los capítulos que aún se encuentran pendientes de ajuste, con el fin de garantizar la coherencia entre el alcance real del proyecto y las condiciones contractuales vigentes. Este proceso, por su nivel de detalle técnico y presupuestal, resulta dispendioso, toda vez que implica la verificación exhaustiva de cantidades, actividades, rendimientos y su correspondencia con las soluciones constructivas adoptadas en obra; no obstante, se encuentra en desarrollo permanente por parte del contratista y la interventoría. De manera paralela, se adelanta la redistribución del recurso necesario.

Una vez se logre la conciliación técnica y presupuestal entre obra e interventoría, se dará inicio al trámite administrativo correspondiente ante la entidad contratante, el cual se tiene previsto gestionar durante el mes de febrero del año en curso, conforme a los procedimientos y plazos establecidos.

Todavía se encuentran en proceso de modificación algunos diseños como el eléctrico, hidráulico y red contra incendio, además se sigue a la espera de la respuesta de surgas para perfeccionar el proyecto de gas. Todo esto son situaciones ajenas al contratista de obra e interventoría.

COMPONENTE LEGAL Y JURIDICO

1. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE OBRA					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
6.1	***Estado de las garantías VIGENTES***				
	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*21-40-101220737 21-44-101427775*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	ANEXO 9				
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*04/12/2023*	*17/05/2027*	*$2.530.782.632,30*
	Buen Manejo Y Correcta Inversion Del Anticipo		*04/12/2023*	*17/05/2027*	*$2.563.268.624.69*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*04/12/2023*	*17/11/2029*	*$1.265.391.316.15*
	Estabilidad Calidad De La Obra		*5 años*		*$2.530.782.632,30*
	ANEXO 9				


	Predios Labores Y Operaciones	*04/12/2023*	*17/11/2026*	*$711.750.000,00*
	Daño Emergente Y Lucro Cesante	*04/12/2023*	*17/11/2026*	*$711.750.000,00*
	Perjuicios Extrapatrimoniales	*04/12/2023*	*17/11/2026*	*$711.750.000,00*

2. ASPECTOS LEGALES CONTRATO DE INTERVENTORIA					
Item	***Descripción***				***Evidencia***
6.1	***Estado de las garantías VIGENTES***				
	Aseguradora	*SEGUROS DEL ESRADO*	*No. póliza*	*33-44-101244090 33-40-101077107*	*Pólizas Remitidas A La Entidad*
	ANEXO 10				
	Amparo		***Desde***	***Hasta***	***Valor Asegurado***
	De Cumplimiento		*04/12/2023*	*17/10/2026*	*$124.661.771,00*
	Salarios Y Prestaciones Sociales		*04/12/2023*	*17/04/2029*	*$124.661.771,00*
	Calidad Del Servicio		*06/09/2024*	*10/01/2030*	*$124.661.771,00*
	ANEXO 10				
	Predios Labores Y Operaciones		*04/12/2023*	*17/04/2026*	*$350.181.000,00*

COMPONENTE TECNICO

Información general del proyecto

El proyecto se localiza en la Calle 1ª No. 12E – 67/68 en al barrio paraíso de la comuna 2 de la ciudad de Pitalito, departamento del Huila.

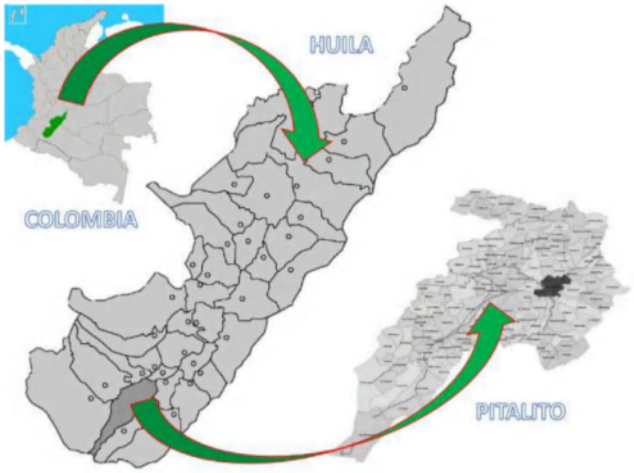

El proyecto corresponde a la construcción de la primera fase del colegio Winnipeg del Municipio de Pitalito – Huila, y se desarrolla en un área de 7.920 m2., el cual, de acuerdo con el alcance contractual, contempla la construcción de doce (12) aulas escolares en dos módulos de uno y dos niveles, con sus respectivas baterías sanitarias y demás espacios complementarios como biblioteca, sala de profesores, laboratorio de física y química, aulas TIC, restaurante comedor y aula múltiple, dos campos deportivos multifuncionales, tienda escolar, un taller, zona de parqueaderos y cerramiento perimetral con una portería peatonal y subestación eléctrica sobre la calle 1ª y una portería vehicular con depósito de basuras sobre la calle 12 Este.

El proyecto contempla internamente zonas duras de circulación peatonal y de concentración y permanencia a campo abierto tales como plazoletas. Así mismo, se cuenta con zonas verdes y franjas perimetrales con un diseño de contenedores de raíces para árboles. Dentro de la modificatoria No. 1 del contrato, del pasado 09 de diciembre de 2025 y conforme a la modificación de la licencia de construcción No. 11379-6 JUNIO 2022, según resolución No. 170 del 01 de abril de 2025 presentada por el Municipio de Pitalito, en el cual se realizaron los ajustes a los diseños estructurales en cumplimiento de la norma vigente Colombiana NSR-10, lo que conllevo al balance No. 1 de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previsto, con la modificación de la cimentación y los elementos estructurales de los módulos que componen el proyecto, tales como el sistema constructivo y la resistencia del concreto para aulas de dos pisos pasando de una cimentación de zapatas con concreto 3000PSI a una placa de cimentación aligerada de 50cm de espesor y concreto 4000psi, la incorporación de concretos ciclópeos bajo zapatas por parte del consultor de diseños, la adición de un muro de contención sobre el perímetro del predio para el cerramiento perimetral, el reforzamiento estructural del tanque de almacenamiento de agua potable y RCI, la mayor cantidad de obra en las actividades preliminares de replanteo, excavaciones, movimiento de tierra y rellenos, entre otros que se encuentran ampliamente soportados y graficados en el acta de justificación anexa al mencionado balance de obra.

A nivel de arquitectura, las modificaciones corresponden a la implantación del módulo de tienda escolar, bicicletero, parqueadero y rampa de acceso para aulas de 2 pisos, la reubicación del tanque de almacenamiento de agua potable y RCI que se desplazó hacia el interior del lote de la fase 1, la ampliación de la subestación eléctrica para darle cabida a los equipos de respaldo del sistema de la red interna y sus respectivos tableros; se mantienen la materialidad y acabados que corresponde a muros en mampostería de arcilla a la vista en muros determinados y demás con las diferentes

capas de acabado y obra blanca, estructura de cubierta con perfiles metálicos y teja en lámina, zona deportiva en placa de concreto con su respectiva demarcación multifuncional y circulaciones peatonales en adoquín; se incluyen en este la construcción de las redes internas de acueducto con tanque de almacenamiento y equipos, red sanitaria, red de aguas lluvias, red eléctrica con subestación eléctrica, red contra incendios con su respectivos tanque de almacenamiento.

En consecuencia, a dichas modificaciones, se contó con una adición en valor correspondientes a $ 4.109.684.412,54 y una prórroga en tiempo de nueve (09) meses y veinte (20) días para un valor total de $12.653.913.161,52 y un plazo total de dieciocho (18) meses y veinte (20) días contados a partir de la fecha del acta de inicio.

3. AVANCE DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

PERIODO DE DESARROLLO	***01-MAYO-2026 A 31-MAYO-2026***

6.1 PRIMERA FASE IE WINNIPEG

informe	fecha		programado semanal	programado acumulado	ejecutado semanal	ejecutado acumulado
	del	al				
Semana 55	27-04-26	03-05-26	1,98%	39,80%	0,20%	32,54%
Semana 56	04-05-26	10-05-26	2,77%	42,57%	0,57%	33,12%
Semana 57	11-05-26	17-05-26	3,27%	45,83%	0,61%	33,57%
Semana 58	18-05-26	24-05-26	1,58%	47,41%	0,57%	34,15%
Semana 59	25-05-26	31-05-26	1,98%	49,39%	0,05%	34,20%

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01-MAYO-2026 A 31-MAYO-2026

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista CONSORCIO COLPITALITO 23, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado en seguridad y salud en el trabajo del contrato en ejecución cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.". De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

TEMA	ACTIVIDAD	MES – FECHA	ESTADO/OBSERVACIONES
Inspecciones de seguridad	Inspección de condiciones y áreas de trabajo y seguridad,equipos,EPP Y áreas de trabajo.	mayo	Cumplido-seguimiento periódico en obra
Capacitación SST	Charlas de seguridad y socialización de riesgos laborales	mayo	Participación de personal operativo
Elementos de protección personal	Entrega y verificación de uso de EPP al personal de obra	mayo	Cumplido-entrega realizada por el contratista con registro firmado por trabajadores
Promoción de la salud	Ejecución de pausas activas con trabajadores	mayo	Actividad preventiva realizada en jornada laboral
Equipos de emergencia	Revisión y dotación de botiquín de primeros auxilios	mayo	Cumplido- botiquín completo y disponible

Equipos de emergencia	Verificación de estado, vigencia y ubicación de extintor	mayo	Cumplido-señalizado y accesible
Equipos de emergencia	verificación de camilla para atención de emergencias	mayo	Cumplido- disponible y señalizada
Comunicación SST	Actualización de tablero informativo con políticas, normas, horarios orden y aseo, uniforme.	mayo	Información visible para el personal
Seguridad social	Revisión de afiliaciones del personal al sistema de seguridad social	mayo	Cumplido- se verifica personal activo y afiliaciones recientes
Permisos de trabajo	Control y verificación de permisos para actividades de riesgo	permanente	Cumplido- aplicado según la actividad ejecutada
Orden y aseo	Seguimiento a condiciones de orden y aseo en áreas de trabajo	mayo	Cumplido – se realizan jornadas de aseo

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento exhaustivo a las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales están enfocadas a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva del personal vinculado al proyecto "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.", a través de la aplicación de programas y normas de seguridad en las áreas de trabajo, realizando un seguimiento continuo, que permitan alcanzar el más alto nivel físico, mental y social en nuestros profesionales.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar e involucrar de forma clara en las diferentes etapas del desarrollo del contrato, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de la obra, que se pueden generar como consecuencia de la ejecución de las actividades contractuales.

Realizar el seguimiento a las responsabilidades y obligaciones de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las cuales enmarcan el componente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Bioseguridad. Verificar el cumplimiento en cuanto a los procesos, procedimientos, permisos, registros e inspecciones que debe realizar el contratista, para cotejar el desempeño frente a lo indicado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. CONTROL DE PERSONAL

Con el fin de optimizar las medidas de seguridad y prevención, asegurando un óptimo manejo y control del personal, esta interventoría contempla con la solicitud para revisión y verificación de afiliación a seguridad social correspondientes a ARL, EPS y EFP. De igual forma también se solicita el respectivo examen ocupacional de ingreso y para los trabajos considerados de alto riesgo tales como tareas en alturas, se requiere de su respectivo certificado para trabajo en alturas.

Se toman registros de ingreso de personal diario para control del personal operativo de obra y verificación de sus afiliaciones vigentes al sistema de seguridad y salud en el trabajo. En dicho control de personal se verifica el personal ingrese con toda la dotación correspondiente a su actividad laboral, adicional a la dotación básica de ropa, calzado y casco.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INICIO
Andres Mauricio Tovar Sánchez	1.130.621.691	Director de obra	24-nov-24
Jeisson David Tarazona Ibarra	1.082.781.804	Residente en Ingeniería Civil	24-nov-24
Claudia Julieth Romero Ñañez	1.083.919.077	Residente SST	26-ene-26
Edgar Hernando Oliveros Córdoba	19.348.497	Representante Legal	24-nov-24

LISTADO PERSONAL DE MANO DE OBRA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INICIO
Emerson Daniel Orozco	1.119.581.154	ayudante	19-feb-26
Bladimir Valencia	1.125.409.765	ayudante	19-feb-26
Diego Alejandro Almanza	1.006.431.206	Ayudante	5-mar-26
Osvaldo Daniel Ramírez	1.119.581.149	ayudante	12-dic-25
Jhonger Stilver rivera	1.083.881.335	ayudante	24-dic-25
Jonny Alexander Esquivel	1.006.507.474	ayudante	24-dic-25
Albert Leandro Uzcátegui	62.361.116	ayudante	13-feb-25
Alejandro Lara	7.715.478	Ayudante	25-mar-26
Juan David Olivera Moreno	79.672.581	Ayudante	24-feb-26
Jhon Fredy Imbaqui Estacio	1.007.748.238	Ayudante	24-feb-26
Edwin Fernando Avendaño	1.006.503.161	ayudante	13-ago-25
Lisandro Arturo Mensa Nupan	1.083.886.609	Ayudante	27-feb-26
Víctor Alfonso Fernández Rojas	80.895.922	ayudante	27-feb-26
Johan Sebastián Gaviria	1.004.419.006	Ayudante	19/0372026
Didier Avendaño	1.006.596.585	Ayudante	31-mar-26
José Quiñonez		Oficial	22-mar-26
Andres Trujillo	1.075.224.894	Oficial	24-dic-25
Wilmar Andrés Micolta Obando	1.085.545.199	oficial	6-dic-25
Wilinton Ortega Carabali	4.929.181	Oficial	
Jerson Estiven Ceballos Pacheco	1.002.924.482	Oficial	22-mar-26
Apolinar Catuche	12.168.640	plomero	21-feb-26

Fuente: Área SST Consorcio Colpitalito

3. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD EN EL TRABAJO

La gestión de la salud ocupacional constituye un componente fundamental dentro de la prevención de riesgos laborales, ya que permite promover condiciones seguras de trabajo y preservar el bienestar integral de los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades. A través de la implementación de acciones de vigilancia médica y control preventivo, se busca identificar oportunamente posibles condiciones que puedan afectar la salud de los colaboradores, garantizando su adecuada ubicación laboral de acuerdo con sus capacidades físicas y contribuyendo al mantenimiento de condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones. En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 2346 de 2007, relacionada con la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y la administración de las historias clínicas ocupacionales, esta Interventoría verifica como requisito indispensable para el ingreso de personal al proyecto la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Dichas valoraciones deben ser practicadas por profesionales competentes en salud ocupacional y en instituciones autorizadas por el contratista Consorcio Colpitalito 2023, con el propósito de determinar la aptitud de los trabajadores para el desempeño de las labores asignadas y asegurar el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos para la ejecución contractual.

FECHA	TEMA	RESPONSABLE
2-may-26	Cuidado de las manos en obra	Residente SST
5-may-26	Plan de emergencia	Residente SST
6-may-26	Respeto	Residente SST
9-may-26	Orden y aseo	Residente SST
13-may-26	Riesgo psicosocial	Residente SST
13-may-26	Plan de emergencia	Residente SST
15-may-26	Plan de emergencia	Residente SST
16-may-26	Seguridad basada en comportamiento	Residente SST
20-may-26	Primeros auxilios	Residente SST
23-may-26	Extintor multiproposito	Residente SST
27-may-26	Primeros auxilios	Residente SST



Tabla 4. pausas activas de SST ejecutadas en el mes de mayo 01 / 31 de mayo del 2026



4. SEGUIMIENTO A DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

La firma contratista Consorcio Colpitalito debe realizar la entrega de los elementos de protección personal adecuados para los trabajadores que se vinculen en obra, los cuales corresponde a:

- Guantes de Carnaza o vaqueta (cuando aplique)
- Guantes de Caucho
- Gafas de seguridad
- Camisa
- Pantalón
- Botas punta de acero
- Protector respiratorio

De igual forma se deben presentar los registros del seguimiento de dotación de EPP's y realizar los respectivos cambios cuando sea necesario.INSPECCIONES DE SEGURIDAD

El contratista debe presentar por medio de formatos las siguientes inspecciones:

- Elementos de protección personal y dotación
- Trabajo en caliente (en este momento no aplica)
- Trabajo seguro en alturas (Si aplica)
- Elementos de protección contra caídas (Si aplica)
- Inspección de extintores en obra.
- Inspección de botiquín.

INSPECCIONES SST REALIZADAS POR EL CONSORCIO COLPITALITO 23		
FECHA	**UBICACIÓN**	**TIPO DE INSPECCIÓN**
Inspección previo al uso	parqueadero	Inspección pre operacional de maquinaria
19-may-26	Punto de emergencia	Inspección de botiquín
19-may-26	Punto de emergencia	Inspección de extintores
Inspección diaria previo al uso	Aula de dos pisos	Inspección de planta eléctrica
Inspección diaria previa al uso	Área de trajo	Inspección de pulidora
19-may-26	Punto de emergencia	Inspección de camilla
Inspección diaria previo al uso	Sala de profesores	Inspección de arnés
Inspección diaria previa al uso	Aulas de dos pisos	Inspección de andamio
Inspección	Obra en general	Inspección de orden y aseo



5. TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Con el fin de identificar, valorar y establecer las medidas de control necesarias sobre las condiciones potencialmente peligrosas, se implementó el uso de los permisos para trabajos considerados de alto riesgo, los cuales definen las precauciones que se deben tomar antes, durante y después de la realización del trabajo, en donde estos serán diligenciados y avalados por el residente de obra.

6. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

Tanto los accidentes como los incidentes de trabajo deben ser reportados por el contratista ante esta interventoría durante el mes, el cual debe ir soportado mediante la investigación del accidente y la documentación correspondiente del reporte.

A la fecha el contratista no ha manifestado ni reportado ante esta interventoría ningún accidente o incidente de trabajo que se haya presentado durante el mes evaluado.

7. CONCLUSIONES

• Para el período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, la Interventoría realizó seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades asociadas al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), verificando la implementación de los controles y medidas preventivas requeridas para el desarrollo seguro de las actividades constructivas ejecutadas por el contratista Consorcio Colpitalito 2023.

• Durante el período evaluado se efectuó control sobre el personal vinculado al proyecto, verificando la vigencia de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y la documentación requerida para el ingreso y permanencia en obra, de acuerdo con los requisitos establecidos para la ejecución de las actividades contractuales.

• Se realizó seguimiento al suministro, reposición y uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), verificando que estos fueran acordes con las actividades desarrolladas y promoviendo su utilización permanente como medida de prevención y control frente a los riesgos presentes en los diferentes frentes de trabajo.

• En el marco de las actividades de promoción y prevención, se dio continuidad a las jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal operativo, fortaleciendo los conocimientos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, autocuidado, trabajo seguro y demás aspectos asociados a la cultura preventiva del proyecto.

• Se efectuó seguimiento a las inspecciones de seguridad de las áreas de trabajo, equipos, herramientas y elementos de protección personal, con el propósito de identificar oportunamente condiciones susceptibles de mejora y fortalecer las medidas preventivas implementadas en los diferentes frentes de obra.

• Se verificó la continuidad de las condiciones de señalización preventiva, informativa y de emergencia en las áreas operativas del proyecto, así como la identificación de rutas de evacuación, puntos de encuentro y ubicación de los elementos destinados a la atención de emergencias.

• Durante el período objeto de seguimiento se realizó verificación de la disponibilidad, ubicación y condiciones de los equipos para atención de emergencias, entre ellos botiquines, extintores y camillas, procurando que permanecieran accesibles, señalizados y disponibles para su utilización ante cualquier eventualidad.

• Se mantuvo el seguimiento a los controles establecidos para las actividades consideradas de alto riesgo, mediante la verificación de los permisos de trabajo y de las medidas preventivas requeridas antes y durante la ejecución de dichas actividades.

• Se realizó seguimiento a las condiciones de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, promoviendo la conservación de áreas organizadas y libres de condiciones que pudieran generar riesgos locativos para los trabajadores y demás personal presente en la obra.

• Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, el contratista no reportó ante esta Interventoría accidentes ni incidentes de trabajo, de acuerdo con la información y soportes disponibles para el período evaluado.

• En términos generales, el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo presentó un desempeño satisfactorio durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, evidenciándose continuidad en las actividades de seguimiento, control, prevención y capacitación relacionadas con el SG-SST y con las obligaciones contractuales aplicables al desarrollo de las obras.

8. RECOMENDACIONES

• Mantener la implementación integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), fortaleciendo las actividades de seguimiento, control y mejora continua durante la ejecución de las actividades contractuales.

• Continuar con la verificación periódica de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social del personal vinculado a la obra, garantizando la vigencia de los soportes correspondientes antes y durante la permanencia del personal en los frentes de trabajo.

• Mantener actualizado el control de los exámenes médicos ocupacionales y de las certificaciones requeridas para la ejecución de actividades de riesgo, verificando que el personal cuente con los requisitos y aptitudes correspondientes para las labores asignadas.

• Fortalecer las inspecciones periódicas de seguridad en los diferentes frentes de trabajo, equipos, herramientas y áreas operativas, con el propósito de identificar oportunamente condiciones subestándar y establecer las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

• Continuar garantizando la entrega, reposición, conservación y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con los peligros y riesgos asociados a las actividades desarrolladas en obra.

• Mantener la aplicación y seguimiento de los permisos de trabajo para las actividades consideradas de alto riesgo, verificando su correcta diligencia, autorización y cumplimiento de los controles establecidos antes y durante la ejecución de las labores.

• Dar continuidad a las actividades de capacitación, inducción, reinducción y sensibilización del personal, reforzando los temas relacionados con identificación de peligros, prevención de riesgos, autocuidado, trabajo seguro, emergencias y demás aspectos asociados al SG-SST.

• Mantener actualizados y organizados los registros correspondientes a inspecciones, capacitaciones, entrega de EPP, control de personal, permisos de trabajo y demás documentos asociados al SG-SST, garantizando su trazabilidad y disponibilidad para las actividades de seguimiento y control.

• Continuar verificando el estado, ubicación, señalización y accesibilidad de los equipos destinados a la atención de emergencias, incluyendo botiquines, extintores y camillas, garantizando su disponibilidad ante cualquier eventualidad.

• Mantener y fortalecer la señalización preventiva, informativa y de emergencia en los diferentes frentes de trabajo, verificando periódicamente su visibilidad, conservación y correspondencia con las condiciones existentes en la obra.

• Dar continuidad a las pausas activas y demás actividades orientadas al bienestar de los trabajadores, promoviendo hábitos de autocuidado y prevención durante la jornada laboral.

• Continuar promoviendo la participación activa de trabajadores, supervisores, residentes y responsables del SG-SST en la identificación de peligros, reporte de condiciones inseguras y adopción oportuna de medidas preventivas, fortaleciendo la cultura de seguridad y prevención en el proyecto.

COMPONENTE AMBIENTAL

8. INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
01-MAYO-2026 A 31-MAYO-2026

1. INTRODUCCIÓN

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista Consorcio Colpitalito, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado ambiental del contrato en ejecución cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA".

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales referentes a los aspectos ambientales, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a los impactos ambientales que se generarán durante la ejecución del presente contrato, con el fin de desarrollar e implementar por medio de la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, las medidas de manejo ambiental necesarias para evitar, minimizar, corregir o compensar los impactos negativos que se presenten y así mismo, potencializar los impactos positivos.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Dar cumplimiento estricto a las medidas determinadas por el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023.

- Dar seguimiento y control al Programa de Manejo Ambiental de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, con el fin de mitigar, minimizar y corregir cualquier eventualidad que se presente en cuanto a la disposición de los residuos de construcción y demolición generados dentro de los frentes de obra.

- Implementar todas las medidas ambientales Colombianas definidas, con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la gestión ambiental, que será verificada por la interventoría mediante el seguimiento y monitoreo continuo.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO



VALLA INFORMATIVA: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y VISIBLE.

3 ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, se realizó seguimiento a las actividades ambientales asociadas al desarrollo de las obras, verificando las condiciones de las áreas intervenidas y las medidas implementadas por el contratista para mantener un adecuado manejo del entorno. En los diferentes frentes se adelantaron labores de limpieza, adecuación y mantenimiento de los espacios de trabajo, incluyendo el manejo de sectores con cobertura vegetal, procurando conservar condiciones apropiadas de higiene, organización y salubridad durante la ejecución de las actividades constructivas.

En desarrollo de las labores de manejo del recurso hídrico, se efectuó control sobre las aguas de escorrentía y las precipitaciones que ingresan o se generan en las áreas de intervención. Para ello se mantuvieron medidas de conducción y evacuación orientadas a impedir la formación de acumulaciones de agua y zonas de encharcamiento, contribuyendo a conservar la estabilidad superficial del terreno y las condiciones de circulación en los diferentes sectores de la obra.

Durante el período se dio continuidad a las actividades propias del proceso constructivo, entre ellas excavaciones, cortes, movimientos y conformación de terreno, así como la preparación de superficies destinadas a cimentaciones y a la ejecución de elementos estructurales correspondientes a los módulos contemplados en el proyecto. La Interventoría realizó seguimiento a las condiciones en que se desarrollaron estas labores, verificando la implementación de medidas de delimitación, señalización y control de las áreas intervenidas.

De igual manera, se adelantaron trabajos relacionados con la ejecución de estructuras en concreto, comprendiendo actividades de cimentación y construcción de columnas, vigas, losas y otros elementos requeridos para la conformación de las edificaciones. En estas actividades se efectuó seguimiento a los procedimientos empleados para la preparación, colocación y manejo del concreto, procurando que su ejecución se desarrollara conforme a las condiciones técnicas previstas y bajo prácticas que permitieran prevenir afectaciones ambientales derivadas de estos procesos.

Como apoyo al desarrollo de las actividades constructivas, se realizaron trabajos de adecuación y acondicionamiento de las áreas de trabajo, incluyendo procesos de

nivelación y regularización de superficies. Estas intervenciones facilitaron la ejecución de las actividades posteriores y permitieron conservar condiciones apropiadas en los sectores intervenidos. Paralelamente, se mantuvieron labores de limpieza, recolección y organización de los frentes de trabajo, contribuyendo al adecuado manejo ambiental y operativo de la obra.

En el seguimiento efectuado a los equipos utilizados durante la ejecución contractual, se verificaron las condiciones generales de la maquinaria, herramientas y demás elementos empleados en los frentes de trabajo. Se evidenció la aplicación de actividades de revisión y mantenimiento preventivo, orientadas a conservar los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y a disminuir la posibilidad de generar afectaciones ambientales relacionadas con fugas, fallas o condiciones deficientes de operación.

Frente al manejo de emisiones atmosféricas, se realizó seguimiento a las medidas implementadas para disminuir la generación y dispersión de material particulado asociada principalmente a excavaciones, movimiento de tierras, manipulación de materiales y circulación de maquinaria dentro del proyecto. El manejo de los materiales excavados, la organización de los sitios de almacenamiento y el control de los frentes de trabajo contribuyeron a reducir la dispersión de partículas y a mantener condiciones ambientales adecuadas en el área de intervención.

En relación con las emisiones de ruido, se efectuó seguimiento a las condiciones de operación de los equipos, maquinaria y vehículos empleados en las actividades constructivas. Se mantuvieron controles operativos encaminados a evitar niveles innecesarios de emisión sonora y a reducir posibles molestias o afectaciones sobre los sectores aledaños al proyecto y la comunidad ubicada en su entorno.

Para el manejo de los residuos generados durante la ejecución de las actividades, se verificó la continuidad de la separación en la fuente mediante los puntos ecológicos dispuestos en las instalaciones de la obra. Asimismo, se realizaron controles sobre las condiciones de almacenamiento temporal, procurando que los residuos producidos por las actividades del proyecto fueran manejados de acuerdo con los procedimientos establecidos y permanecieran organizados en los sitios destinados para tal fin.

También se efectuó seguimiento a las zonas utilizadas para el almacenamiento temporal de residuos de construcción, demolición y residuos de carácter industrial. En estos espacios se mantuvo la clasificación de los materiales generados, facilitando el

aprovechamiento de aquellos que presentan posibilidades de reutilización o recuperación y procurando que los residuos no aprovechables fueran retirados mediante los mecanismos definidos y entregados para su disposición correspondiente a través de los sistemas o gestores autorizados.

Finalmente, se verificaron las condiciones de almacenamiento de los materiales e insumos utilizados en la obra, observando la implementación de medidas de protección mediante cubiertas y espacios destinados para su acopio. Estas acciones permiten disminuir el deterioro de los materiales ocasionado por la exposición directa a las condiciones climáticas y prevenir posibles afectaciones sobre el suelo o las áreas de trabajo. De igual manera, se realizó seguimiento a la procedencia de los materiales pétreos e insumos empleados en el proyecto, verificando que fueran suministrados por fuentes y proveedores que cuentan con los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes, favoreciendo la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a la ejecución contractual.

3.1 AGUA POTABLE

=: La obra cuenta con el servicio domiciliario de agua potable suministrado por las empresas pública del municipio de Pitalito EMPITALITO, de uso doméstico para el servicio de las baterías sanitarias, cuenta con una red interna que permite el suministro directo hacia el servicio y una derivación hacia un tanque de almacenamiento de 2000 litros, como reserva ante cualquier contingencia.

Cabe aclarar que ese suministro tiene una presión mínima, la cual escasamente surte el servicio de los baños. A medida que va creciendo la demanda de la obra y a futuro del proyecto por ahora no se ha dado respuesta por parte del consultor.

Durante el mes, la ejecución del proyecto, se generaron aguas residuales domésticas, provenientes del lavado de manos y uso de los baños, las cuales fueron

dispuestas directamente al sistema de alcantarillado.

Se esta a la epsera de las gestiones correspondientes por parte de la -gobernación Del Huila y de la Alcaldia De Pitalito para garantizar el flujo correcto, necesario e indispensable para el funcionamiento de la obra y a futuro de las instalaciones.



4. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Como requisito para la ejecución del contrato, la firma contratista Consorcio Colpitalito 2023, deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad vigente.

5. SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA

Mediante el presente programa se busca tener un control sobre los materiales de construcción, es decir cuantificar las cantidades ingresadas a obra que se utilizaran en el contrato, además de verificar que provengan de canteras con permisos ambientales y mineros si aplica.

Se realiza la verificación de los permisos de las canteras y todo la documentación de la Cantera Buenos Aires, que es la que abastece al proyecto se encuentra en regla.

Se lleva a cabo el acopio de residuos de construcción, los cuales fueron señalizados, cubiertos con plástico negro y delimitados con cinta de peligro. Al igual que se adecuaron sitios para acopiar materiales de construcción y/o agregados pétreos.

10. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Durante el período de seguimiento correspondiente al mes de mayo de 2026, se realizó control a las obligaciones ambientales asociadas al manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en el desarrollo del proyecto “Construcción de la Primera Fase de la Institución Educativa Winnipeg – Sede Principal del Municipio de Pitalito, Huila”. En este sentido, el contratista Consorcio Colpitalito 2023 debe garantizar la implementación de las medidas necesarias para realizar una adecuada separación, almacenamiento temporal, transporte y disposición o aprovechamiento de los residuos producidos en los diferentes frentes de trabajo, manteniendo los respectivos registros y soportes que permitan evidenciar la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables.

Dentro del seguimiento efectuado por la Interventoría, se mantiene la verificación de los soportes relacionados con el manejo de los RCD, incluyendo los certificados de aprovechamiento o disposición final expedidos por los gestores correspondientes y la documentación asociada a la autorización ambiental de los sitios receptores utilizados. Lo anterior permite fortalecer el control sobre la gestión de los residuos generados y garantizar que su manejo se efectúe de manera adecuada durante la ejecución de las actividades constructivas.

De igual manera, durante las inspecciones realizadas en el período evaluado no se identificaron afectaciones sobre los recursos hídricos ni sobre los sistemas de drenaje existentes en el área de intervención. No se evidenciaron vertimientos directos o no controlados, obstrucciones de canales, modificaciones significativas de las condiciones de escorrentía, acumulaciones de sedimentos ni otras situaciones que pudieran interferir con el flujo normal de las aguas superficiales.

En consecuencia, para el período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, se mantuvieron condiciones ambientales adecuadas en relación con el manejo de los residuos generados y la protección de los recursos hídricos y sistemas de drenaje presentes en el área del proyecto, continuando la Interventoría con las actividades de seguimiento y control correspondientes.

11. MANEJO DE RESPEL Y ESPECIALES

En aras de velar por la integridad física y armonía del medio ambiente el contratista debe garantizar que los residuos peligrosos - RESPEL y Especiales generados por las

actividades realizadas en el proyecto, tengan un manejo integral desde su generación hasta el final de su vida útil, con el fin de que este tipo de residuos sean almacenados, transportados y dispuestos tal y como lo estipula la normatividad legal vigente, conllevando así la correcta entrega a sitio de disposición autorizado por la entidad competente de la región para su respectivo tratamiento final.

Por consiguiente, en sitio se cuenta con acopios de disposición provisional tanto de residuos peligrosos como de residuos especiales, los cuales a la fecha se han generado sobrantes de envases de pintura, donde se encuentran debidamente delimitadas y señalizadas.

12. CONCLUSIONES AMBIENTALES

• Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a la gestión ambiental desarrollada en los diferentes frentes de trabajo, verificando la aplicación de las medidas establecidas para prevenir, controlar y minimizar los impactos derivados de las actividades constructivas.

• Las actividades de excavación, movimiento y conformación de terrenos, adecuación de áreas y ejecución de elementos estructurales se desarrollaron con medidas de control sobre las zonas intervenidas, procurando mantener condiciones adecuadas de organización y manejo ambiental durante la ejecución de las obras.

• Se efectuó seguimiento a las medidas implementadas para el manejo de aguas lluvias y escorrentías, evidenciándose condiciones adecuadas en los sistemas de conducción y evacuación y sin identificarse, durante las inspecciones realizadas, afectaciones sobre los sistemas de drenaje o sobre los recursos hídricos del área de intervención.
• En materia de calidad del aire, se verificó la implementación de medidas para controlar la generación y dispersión de material particulado asociada a las excavaciones, movimiento de tierras, manipulación de materiales y tránsito de maquinaria, contribuyendo a mantener condiciones ambientales adecuadas dentro del área del proyecto.

• Respecto al componente de ruido, se realizó seguimiento a la operación de maquinaria, equipos y vehículos empleados en obra, manteniendo controles orientados a reducir posibles afectaciones sobre las áreas aledañas y la comunidad del entorno.

• Se verificó el adecuado manejo de los residuos generados durante el período, mediante la separación en la fuente, utilización de puntos ecológicos y disposición de áreas para el almacenamiento temporal, manteniendo condiciones de orden y control en los diferentes frentes de trabajo.

• En relación con los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se realizó seguimiento a las actividades de separación, almacenamiento temporal, aprovechamiento y disposición, así como a los soportes documentales relacionados con su gestión, con el propósito de garantizar la trazabilidad de los residuos generados durante la ejecución contractual.

• Se constató que los residuos de construcción acopiados en obra se encuentran en áreas delimitadas, señalizadas y protegidas, al igual que los espacios destinados al almacenamiento de materiales y agregados pétreos, contribuyendo a mantener condiciones adecuadas de manejo y organización.

• Se realizó seguimiento al manejo de los Residuos Peligrosos y Especiales (RESPEL), verificándose la existencia de áreas destinadas para su almacenamiento provisional, debidamente delimitadas y señalizadas. Durante el período se identificaron sobrantes de envases de pintura dentro de este tipo de residuos.

• En cuanto a los materiales utilizados en la ejecución de las obras, se verificó la documentación correspondiente a la fuente de abastecimiento de materiales pétreos, constatándose que la Cantera Buenos Aires, reportada como proveedora del proyecto, cuenta con la documentación y permisos requeridos para su operación.

• Se verificaron las condiciones de almacenamiento y protección de los materiales e insumos utilizados en obra, implementando medidas orientadas a evitar su deterioro y posibles afectaciones sobre el suelo y las áreas de trabajo.

• En relación con el abastecimiento de agua potable, la obra cuenta con suministro domiciliario proporcionado por EMPITALITO y con un tanque de almacenamiento de 2.000 litros como sistema de reserva. Sin embargo, durante el período se mantuvo la condición de baja presión del servicio, la cual actualmente resulta limitada para atender

adecuadamente la demanda de la obra. Esta situación requiere seguimiento y gestión, considerando el incremento progresivo de las necesidades de abastecimiento durante la ejecución y el futuro funcionamiento de las instalaciones.

• Durante mayo de 2026, las aguas residuales domésticas generadas por el uso de las baterías sanitarias y el lavado de manos fueron conducidas al sistema de alcantarillado disponible, sin que durante el período se identificaran vertimientos no controlados o afectaciones sobre los recursos hídricos.
• Como resultado del seguimiento realizado durante el período, no se evidenciaron situaciones asociadas a contaminación del suelo, vertimientos no controlados, obstrucciones de los sistemas de drenaje, procesos de erosión o eventos que representaran afectaciones ambientales significativas dentro del área de intervención.

• En términos generales, durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, el componente ambiental presentó un comportamiento favorable, evidenciándose la continuidad de las medidas de manejo, prevención, seguimiento y control ambiental en los diferentes frentes de obra. No obstante, se recomienda mantener especial seguimiento a la condición de presión del suministro de agua potable y a las gestiones requeridas para garantizar un abastecimiento suficiente para las necesidades actuales y futuras del proyecto.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

1. Mantener el seguimiento permanente a la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, verificando su aplicación efectiva en los diferentes frentes de trabajo y adoptando oportunamente las acciones preventivas o correctivas que sean necesarias.
2. Realizar seguimiento a las gestiones adelantadas ante la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Pitalito y las entidades o responsables correspondientes, con el fin de definir una solución que permita garantizar condiciones adecuadas de presión y caudal en el suministro de agua potable requerido para la obra y para el futuro funcionamiento de las instalaciones.
3. Mantener en funcionamiento y realizar seguimiento periódico al tanque de almacenamiento de 2.000 litros dispuesto como reserva, verificando sus condiciones de operación y capacidad para atender eventuales interrupciones o limitaciones temporales del suministro.

4. Continuar con la inspección de los sistemas de manejo de aguas lluvias y escorrentías, especialmente durante los períodos de precipitación, garantizando que se encuentren libres de obstrucciones, acumulación de sedimentos o cualquier condición que pueda afectar su funcionamiento.
5. Mantener las medidas de control para prevenir la generación y dispersión de material particulado durante las actividades de excavación, movimiento de tierras, transporte y almacenamiento de materiales, reforzando estas acciones cuando las condiciones climáticas o de operación lo requieran.
6. Continuar con el control operacional de maquinaria, equipos y vehículos utilizados en el proyecto, verificando la ejecución de los mantenimientos preventivos y la atención oportuna de posibles fugas, fallas o condiciones que puedan generar impactos sobre el suelo, el aire o los recursos hídricos.
7. Fortalecer el manejo integral de los residuos generados en los diferentes frentes de trabajo, garantizando la separación en la fuente, el almacenamiento temporal adecuado y la entrega de los residuos a los sistemas de recolección, aprovechamiento o disposición correspondientes.
8. Mantener un control permanente sobre los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), verificando que las áreas de acopio permanezcan delimitadas, señalizadas y protegidas, y conservando los certificados y demás soportes que permitan demostrar su adecuado aprovechamiento o disposición final.
9. Dar continuidad al manejo diferenciado de los residuos peligrosos y especiales, garantizando que permanezcan en áreas debidamente identificadas, delimitadas y acondicionadas, y realizando su entrega a los gestores o sistemas autorizados cuando corresponda.
10. Continuar verificando la procedencia de los materiales pétreos y demás insumos utilizados en la obra, manteniendo actualizados los documentos y permisos ambientales y mineros correspondientes de las fuentes de abastecimiento y proveedores.
11. Mantener adecuadamente acondicionadas las áreas destinadas al almacenamiento de materiales, agregados pétreos y residuos, utilizando las cubiertas, delimitaciones y demás medidas de protección necesarias para evitar su dispersión, deterioro o afectación de las áreas circundantes.
12. Continuar realizando inspecciones ambientales periódicas en los diferentes frentes de trabajo, con énfasis en las condiciones de orden y limpieza, manejo de residuos, almacenamiento de materiales, control de emisiones y protección de los sistemas de drenaje.

13. Fortalecer las actividades de sensibilización y capacitación ambiental dirigidas al personal de obra, promoviendo buenas prácticas relacionadas con el uso eficiente del agua, manejo adecuado de residuos, prevención de contaminación y conservación de las condiciones ambientales del proyecto.
14. Mantener actualizado el archivo documental ambiental del proyecto, incluyendo registros de inspecciones, certificados de disposición o aprovechamiento de residuos, soportes de procedencia de materiales, permisos de proveedores y demás documentos requeridos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
15. Continuar con el seguimiento conjunto entre el contratista y la Interventoría al cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la ejecución de las obras, procurando que las medidas implementadas se mantengan acordes con las condiciones reales de los frentes de trabajo y con el avance constructivo del proyecto.

1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Item	***Descripción***	***Observación***
9.1	*Administrativa*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.2	*Técnica*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.3	*Financiera*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.4	*Legal*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.5	*Ambiental*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.6	*Seguridad Y Salud*	*Cumpliendo A Cabalidad*

2. ENTREGA DE ANEXOS	
Item	***Descripción***
10.1	*Registro fotográfico.*
10.2	*Bitácora.*
10.3	*Informes Semanales*
10.4	*Actas Comité.*
10.5	*Correspondencia Enviada*
10.8	*Anexos Varios*

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

FIRMAS	
Firma	
Nombre	*ING. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO*
Cargo	*REPRESENTANTE LEGAL*
Dependencia	*INTERVENTORIA*



Fotografia No 1: INSTALACIÓN DE FORMALETA MÉTALICA EN COLUMNAS DE EJES 3 Y 4 - MÓDULO AULAS DE UN PISO.



Fotografia No 2: EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTACIÓN DE MANGUERA DE GAS POR PARTE DE LA EMPRESA SUR GAS - MÓDULO DE CERRAMIENTO.



Fotografia No 3: AMARRADO DE ACERO DE VIGAS AEREAS ENTRE EJES D Y 8 - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 4: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL CON RANA Y RECEBO CEMENTO PARA PLACA CONTRAPISO - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 5: APUNTALAMIENTO Y ENTARIMADO PARA LOSA DE VIGA CANAL - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 6: AMARRADO DE ACERO DE VIGAS AEREAS EN EJE 1 - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 7: RETIRO DE CASETONES EN LOSA DE ENTREPISO - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 8: INSTALACIÓN DE ACERO DE VIGAS AÉREAS - MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.



Fotografia No 9: LIMPIEZA DE ALMA VIGAS T INVERTIDA 103 - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 10: INSTALACIÓN DE ACERO TRANSVERSAL EN EJE 3C - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 11: FUNDICIÓN COLUMNA EN EJE 10C', COCNRETO DE 3000 PSI - MÓDULO DE COCINA.



Fotografia No 12: CONTROL DE ASENTAMIENTO PARA COLUMNA - MÓDULO DE COCINA.



Fotografia No 13: INSTALACIÓN DE FORMALETA (TABLA) PARA ALMA DE VIGA T INVERTIDA - MÓDULO DE CERRAMIENTO.



Fotografia No 14: FUNDICION DE COLUMNAS PRIMERA FASE, CONCRETO 3000 PSI - MÓDULO AULAS DE UN PISO.



Fotografia No 15: TOMA DE CILINDROS PARA CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO DE COLUMNAS. - MÓDULO AULAS DE UN PISO.



Fotografia No 16: FUNDICIÓN DE LA ZARPA DE LA VIGA T INVERTIDA, CONCRETO 3000 PSI - MÓDULO CERRAMIENTO.



Fotografia No 17: APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA EPOTOC 1-1 - MÓDULO DE CERRAMIENTO.



Fotografia No 18: FUNDICIÓN DEL ALMA DE LA VIGA T INVERTIDA, CONCRETO 3000 PSI- MÓDULO CERRAMIENTO.



Fotografia No 19: LIMPIEZA DE CASETONES DE LOSA ENTREPISO - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 20: EXTENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA DE CONTRAPISO - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 21: INSTALACIÓN DE FORMALETA (TABLA) PARA FUNDICIÓN DE PLACA CONTRAPISO - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 22: FUNDICIÓN DE PLACA CONTRAPSIO, CONCRETO 3000 PSI - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 23: DESCARGUE DE LADRILLO TOLETE - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 24: CORTE DE JUNTAS EN LOSA DE CONTRAPISO PARA DILATACIÓN - MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



Fotografia No 25: INSTALACIÓN DE ACERO, LOSA DE ENTREPISO - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 26: VISITA TÉCNICA DE ING. ESTRUCTURAL - MÓDULO AULAS DE DOS PISOS.



Fotografia No 27: INSTALACIÓN DE CUARTO BOCEL EN VIGAS AEREAS - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 28: DESCARGUE DE LADRILLO ESTRUCTURAL - MÓDULO DE CERRAMIENTO.



Fotografia No 29: INSTALACIÓN DE FORMALETA METALICA PARA FUNDICIÓN DE VIGAS DE LOSA - MÓDULO DE BIBLIOTECA.



Fotografia No 30: FUNDICION DE COLUMNAS SEGUNDA FASE, CONCRETO 3000 PSI - MÓDULO AULAS DE UN PISO.



Fotografia No 31: TOMA DE CILINDROS PARA CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO DE COLUMNAS. - MÓDULO AULAS DE UN PISO.



Fotografia No 32: DESARME DE FORMALETA METALICA EN COLUMNAS - MÓDULO DE AULAS DE UN PISO.

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

INFORMES SEMANALES PERIODO 14

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA # 55

Semana Número:	55	Del:	27 de abril de 2026	Al:	3 de mayo de 2026		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	382	De 564	% Transcurrido	67,73%	% Faltante 32,27%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA		SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG		SUPERVISOR		ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,98%	39,80%
Valor básico de la Obra programada:	$ 250.000.000,00	$ 5.036.352.836,46

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,20%	32,54%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	25.203.577,59	4.118.100.273,11


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	sábado, 7 de noviembre de 2026	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	30/19/2026	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

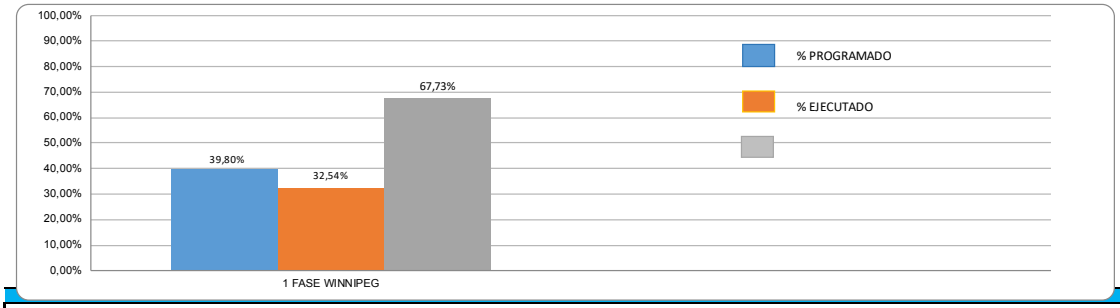

Durante la presente semana se ejecutaron actividades técnicas orientadas al avance estructural y de cerramientos del proyecto, destacándose la realización del comité de seguimiento contractual en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito, espacio en el cual se efectuó la revisión integral del estado de ejecución de las obras, cronograma, aspectos técnicos y compromisos de las partes. En obra, se desarrolló el armado y amarre del acero de refuerzo transversal correspondiente a las columnas del módulo de aulas de un piso, garantizando el cumplimiento de las especificaciones estructurales del diseño. Asimismo, se llevó a cabo la fundición de concreto ciclópeo para el módulo de cerramiento localizado paralelo a la carrera 12E y la calle primera, actividad destinada a la conformación de elementos de soporte y estabilidad. De igual manera, se realizó el desencofrado de la viga de entrepiso del módulo de aulas de profesores, una vez verificado el cumplimiento de los tiempos de fraguado y resistencia requeridos. Como parte de las actividades de estructura vertical, se efectuó el vaciado e instalación de concreto con resistencia especificada de 3.000 psi en las columnas del módulo de cocina, así como la instalación y ajuste de formaleta para las columnas del módulo de aulas de un piso, preparándolas para las siguientes etapas de fundición. Finalmente, en el módulo de aula múltiple se ejecutaron labores de excavación mecánica y retiro de material mediante retroexcavadora, con el propósito de adecuar el terreno y dar continuidad a las actividades de cimentación y desarrollo de la infraestructura proyectada.

AVANCE FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE FORMALETA COLUMNAS MÓDULO AULA MÚLTIPLE.



ARMADO DE ACERO TRASNVERSAL COLUMNAS DEL MÓDULO DE AULAS DE UN PISO.



COMITE - SEGUIMIENTO DEL PROYECTO, ALCALDÍA MUNICIPAL.



DESENCOFRADO DE LA LOSA DEL MÓDULO DE LA SALA DE PROFESORES.

		
RETIRO DE MATERIAL MÓDULO AULA MULTIPLE.		FUNDICIÓN DE CONCRETO CICLOPEO CERRAMIENTO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA # 56

Semana Número:	56	Del:	4 de mayo de 2026	Al:	10 de mayo de 2026		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	389	De 564	% Transcurrido	68,97%	% Faltante 31,03%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA	SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA	

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,77%	42,57%	Obra Física Ejecutada (%)	0,57%	33,12%
Valor básico de la Obra programada:	$ 350.000.000,00	$ 5.386.352.836,46	Valor básico de la Obra Ejecutada:	72.646.273,71	4.190.746.546,81


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	sábado, 7 de noviembre de 2026	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	973.140.781,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

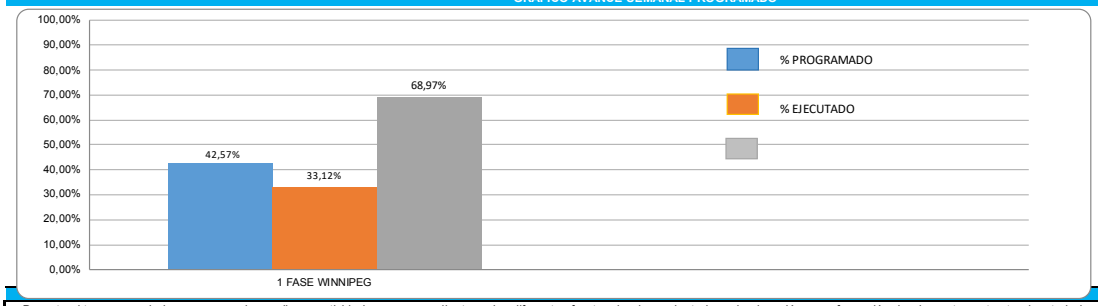

Durante el transcurso de la semana se desarrollaron actividades correspondientes a los diferentes frentes de obra, orientadas a la ejecución y conformación de elementos estructurales, trabajos de cimentación, adecuación de superficies y avance de los sistemas constructivos previstos en el proyecto. En el módulo de sala de profesores M2 se realizó la instalación y disposición del acero de refuerzo correspondiente a la viga aérea, verificando su configuración y ubicación de acuerdo con los requerimientos de diseño estructural y las condiciones establecidas para su posterior formalización y fundición. En el módulo de biblioteca se ejecutaron actividades de instalación de entarimado para la conformación de la placa de cubierta y de las vigas aéreas, disponiendo los elementos provisionales de soporte y formalización requeridos para garantizar la correcta geometría, nivelación y estabilidad del sistema durante la ejecución de los elementos en concreto. En el módulo de aulas de dos pisos se efectuó el retiro de los casetones correspondientes a la placa de entrepiso, dejando expuesta y acondicionada la superficie para la continuidad de las actividades posteriores y realizando las labores necesarias para la disposición del área de trabajo. En el módulo de aula de un piso se adelantaron trabajos de restitución de los orificios generados como consecuencia de la extracción de núcleos de concreto, mediante el relleno y reparación de las zonas intervenidas, con el propósito de recuperar la continuidad y condiciones requeridas de los elementos afectados. Así mismo, en este módulo se realizó la instalación de formaleta para las columnas, disponiendo los elementos de confinamiento y soporte necesarios para garantizar la sección, alineación, plomo y geometría de los elementos verticales previo a su proceso de fundición. En el módulo de cerramiento, correspondiente al tramo 1 sobre la carrera 12 Este, se ejecutó la instalación del acero de refuerzo de las vigas tipo T invertida, de acuerdo con la configuración estructural prevista, como parte de las actividades asociadas a la conformación del sistema de cerramiento y sus elementos de soporte. De manera complementaria, en el área destinada al aula múltiple se ejecutaron trabajos de relleno con material de recebo, incluyendo su distribución y compactación por capas, con el fin de alcanzar las condiciones de soporte y nivelación requeridas para las posteriores actividades constructivas. Finalmente, en el frente correspondiente al cerramiento se realizó la fundición de la zarpa de la viga tipo T invertida, ejecutando el vaciado del concreto en el elemento de cimentación previamente dispuesto, como parte de la conformación de la estructura de soporte del cerramiento. En conjunto, las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron avanzar en la ejecución de elementos estructurales horizontales y verticales, sistemas de formaleta, trabajos de cimentación y preparación de superficies, manteniendo la continuidad de los diferentes frentes de obra programados.

AVANCE FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE ENTARIMADO, MÓDULO DE BIBLIOTECA



RETIRO DE CACETONES DE LOSA ENTREPISO, MÓDULO AULA DE DOS PISOS.



INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN VIGA AEREA, MÓDULO SALA PROFESORES M2.



RELLENO CON RECEBO COMPACTADO EN MÓDULO AULA MULTIPLE

	
INSTALACION DE FORMALETA EN COLUMNAS DEL MÓDULO DE AULA DE DOS PISOS.	INSTALACIÓN DE FORMALETA COLUMNAS DEL MÓDULO DEL AULA DE UN PISO.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Cordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA*	CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA # 57

Semana Número:	57	Del:	11 de mayo de 2026	Al:	17 de mayo de 2026				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	396	De	564	% Transcurrido	70,21%	% Faltante	29,79%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA		SEDE:FASE 1- INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA		

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,27%	45,83%
Valor básico de la Obra programada:	$ 413.234.113,75	$ 5.799.586.950,21

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,61%	33,57%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	77.545.040,93	4.248.241.865,76


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23
Contrato No.	1506 De 2023
Valor Inicial:	$ 8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$ 12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	sábado, 7 de noviembre de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	1585 De 2023
Valor Inicial:	$ 623.308.855,00
Valor Actualizado:	$ 623.308.855,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

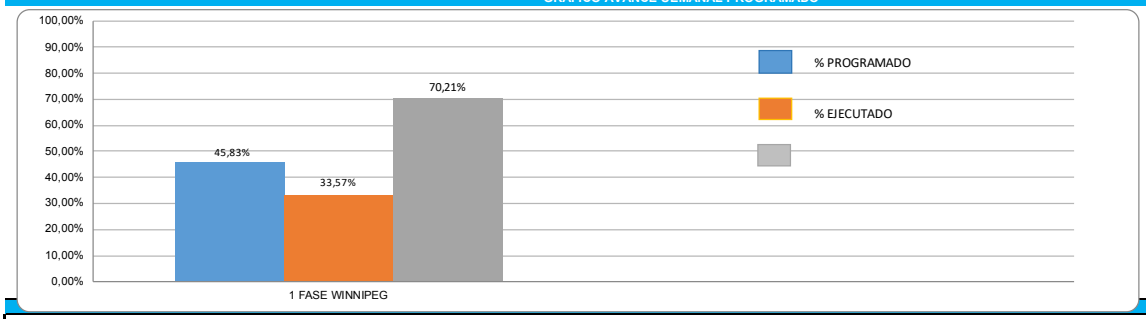

Durante el transcurso de la semana se ejecutaron actividades correspondientes al avance de la estructura y elementos de cerramiento de los diferentes módulos del proyecto. Los trabajos iniciaron con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de la viga tipo T invertida destinada al cerramiento, verificando la disposición, separación y continuidad de las barras de acuerdo con la configuración estructural prevista. Paralelamente, se realizó la instalación del acero de refuerzo transversal en las columnas correspondientes al módulo de aulas de dos pisos, garantizando la correcta ubicación de los estribos y su confinamiento. Se ejecutó además la instalación de formaleta en sistema tricapa sobre el alma de la viga T invertida de cerramiento, efectuando el montaje y ajuste de los elementos necesarios para asegurar la geometría y estabilidad del elemento durante la posterior fundición. En el módulo de sala de profesores 2 se adelantó el armado del acero de refuerzo correspondiente a las vigas aéreas, incluyendo la disposición de las armaduras conforme a la configuración estructural definida. En el módulo de aula múltiple se realizaron trabajos de suministro, extendido, nivelación, humectación y compactación del recebo-cemento destinado a la conformación de la placa de contrapiso, preparando la superficie para las actividades posteriores de construcción. Asimismo, se llevó a cabo la fundición de 14 columnas con concreto de resistencia de 3.000 psi en el módulo de aulas de un piso, realizando el vaciado y consolidación del concreto dentro de los elementos previamente armados y formaleteados. Finalmente, se ejecutó la fundición de la zarpa y el alma de la viga tipo T invertida correspondiente al cerramiento, completando la conformación del elemento estructural mediante el vaciado del concreto y su adecuada consolidación, de acuerdo con las dimensiones y condiciones establecidas para el sistema de cerramiento.

AVANCE FOTOGRAFICO



ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL TRANSVERSAL DE VIGA T INVERTIDA PARA CERRAMIENTO.



INSTALACIÓN DE FORMALETA (TRICAPA) EN ALMA DE VIGA T INVERTIDA PARA CERRAMIENTO.





ARMADO DE ACERO DE VIGAS AEREAS EN MÓDULO SALA DE PROFESORES 2.	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO CEMENTO PARA PLACA CONTRAPISO DE MODULO AULA MÚLTIPLE.





FUNDICIÓN DE 14 COLUMNAS EN MODULO DE AULAS DE 1 PISO.	FUNDICIÓN DE ZARPA EN VIGA T INVERTIDA PARA CERRAMIENTO.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma . Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA # 58

Semana Número:	58	Del:	18 de mayo de 2026	Al:	24 de mayo de 2026		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	403	De 564	% Transcurrido	71,45%	% Faltante 28,55%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA		SEDE: Pfase 1- INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG		SUPERVISOR		ING EDGAR MARTIN LARA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,58%	47,41%
Valor básico de la Obra programada:	$ 200.000.000,00	$ 5.999.586.950,21

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,57%	34,15%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	72.651.519,85	4.320.893.385,61


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	sábado, 7 de noviembre de 2026	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

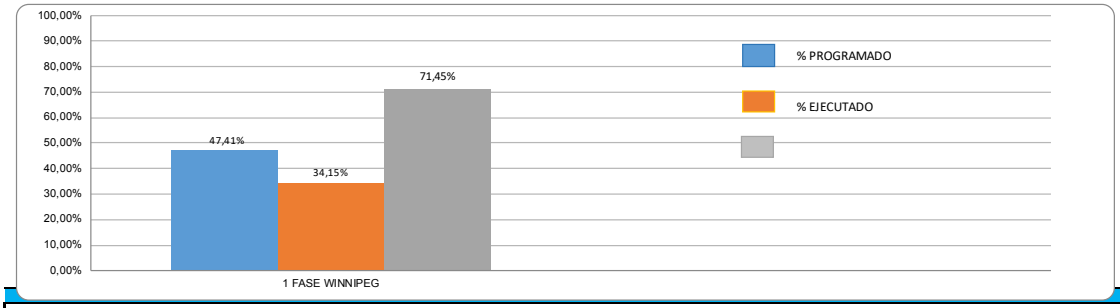

Durante el transcurso de la semana se ejecutaron actividades correspondientes al avance de la estructura y elementos de cerramiento de los diferentes módulos del proyecto. Los trabajos iniciaron con el armado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de la viga tipo T invertida destinada al cerramiento, verificando la disposición, separación y continuidad de las barras de acuerdo con la configuración estructural prevista. Paralelamente, se realizó la instalación del acero de refuerzo transversal en las columnas correspondientes al módulo de aulas de dos pisos, garantizando la correcta ubicación de los estribos y su confinamiento. Se ejecutó además la instalación de formaleta en sistema tricapa sobre el alma de la viga T invertida de cerramiento, efectuando el montaje y ajuste de los elementos necesarios para asegurar la geometría y estabilidad del elemento durante la posterior fundición. En el módulo de sala de profesores 2 se adelantó el armado del acero de refuerzo correspondiente a las vigas aéreas, incluyendo la disposición de las armaduras conforme a la configuración estructural definida. En el módulo de aula múltiple se realizaron trabajos de suministro, extendido, nivelación, humectación y compactación del recebo-cemento destinado a la conformación de la placa de contrapiso, preparando la superficie para las actividades posteriores de construcción. Asimismo, se llevó a cabo la fundición de 14 columnas con concreto de resistencia de 3.000 psi en el módulo de aulas de un piso, realizando el vaciado y consolidación del concreto dentro de los elementos previamente armados y formaleteados. Finalmente, se ejecutó la fundición de la zarpa y el alma de la viga tipo T invertida correspondiente al cerramiento, completando la conformación del elemento estructural mediante el vaciado del concreto y su adecuada consolidación, de acuerdo con las dimensiones y condiciones establecidas para el sistema de cerramiento.

AVANCE FOTOGRAFICO





ARMADO DE ACERO DE VIGAS AÉREAS EN MODULO DE BIBLIOTECA.



FUNDICIÓN DE ALMA DE VIGA T INVERTIDA CON CONCRETO 3000 PSI EN MODULO DE CERRAMIENTO.



RETIRO DE CASETONES EN LOSA DE ENTREPISO DE MODULO AULAS DE DOS PISOS.

LIMPIEZA Y RETIRO DE LA OBRA DE CASETONES DE LOSA ENTREPISO EN MODULO DE AULAS DE DOS PISOS.



INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA DE CONTRAPISO DE MODULO AULA MÚLTIPLE.



FUNDICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO CON CONCRETO 3000 PSI EN AULA MÚLTIPLE.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

CONSORCIO INTER CONSULTORES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA # 59

Semana Número:	59	Del:	25 de mayo de 2026	Al:	31 de mayo de 2026		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	410	De 564	% Transcurrido	72,70%	% Faltante 27,30%
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA	SEDE: PRIMERA FASE - BACHILLERATO INSTITUCION EDUCATIVA WINNNIPEG			SUPERVISOR	ING EDGAR MARTIN LARA	

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,98%	49,39%	Obra Física Ejecutada (%)	0,05%	34,20%
Valor básico de la Obra programada:	$ 250.000.000,00	$ 6.249.586.950,21	Valor básico de la Obra Ejecutada:	6.932.994,84	4.327.826.380,45


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO COLPITALITO 23	
Contrato No.	1506 De 2023	
Valor Inicial:	$	8.544.228.748,98
Valor Actualizado:	$	12.653.913.161,52
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	sábado, 7 de noviembre de 2026	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORIO INTERCONSULTORES	
Contrato No.	1585 De 2023	
Valor Inicial:	$	623.308.855,00
Valor Actualizado:	$	623.308.855,00
Fecha de Iniciación:	lunes, 4 de diciembre de 2023	
Fecha de Vencimiento:	viernes, 30 de octubre de 2026	

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

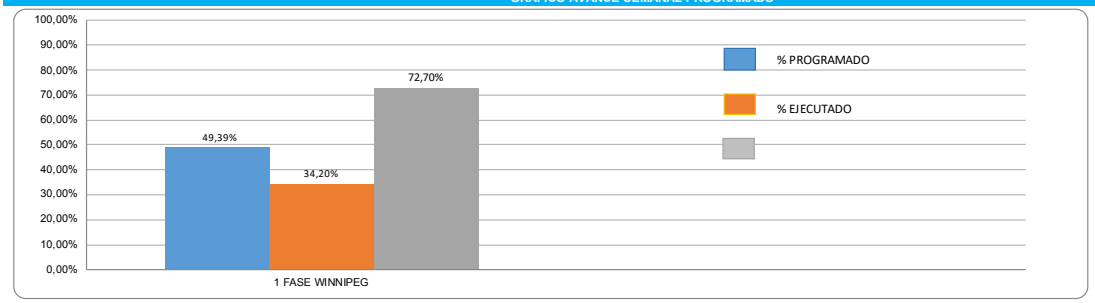

AVANCE

Durante el transcurso de la semana se adelantaron actividades correspondientes a la ejecución, revisión y control de los elementos estructurales de los diferentes módulos del proyecto. En el módulo de aula múltiple se realizó el corte de juntas en la losa de contrapiso, ejecutando las ranuras de dilatación en las ubicaciones requeridas con el propósito de controlar la aparición de fisuras asociadas a movimientos y retracciones del concreto. En el módulo de aulas de dos pisos se efectuó el retiro de los casetones utilizados en la conformación de la placa de entrepiso, realizando el desencofrado de manera progresiva y verificando las condiciones superficiales de los elementos una vez retirado el sistema de formaleta. Como parte del seguimiento técnico a la estructura, se contó con la visita de un ingeniero estructural para realizar la inspección y valoración del estado de la placa de entrepiso del mismo módulo, verificando las condiciones constructivas y estructurales observadas en campo. En el módulo de biblioteca se adelantó la instalación del cuarto bocel requerido para la conformación y ajuste de la formaleta de las vigas de losa, garantizando la definición de los encuentros y acabados previstos en los elementos. Posteriormente, se realizó el montaje y ajuste de la formaleta metálica destinada a la fundición de las vigas de losa, verificando su alineación, nivelación, estabilidad y correcta disposición antes del vaciado del concreto. Finalmente, en el módulo de aulas de un piso se continuó con la fundición de columnas utilizando concreto con resistencia de 3.000 psi, efectuando el vaciado y consolidación del concreto dentro de los elementos previamente preparados, de acuerdo con las dimensiones y condiciones establecidas para la ejecución de la estructura.

AVANCE FOTOGRAFICO





CORTE DE JUNTAS EN LOSA DE CONTRAPISO PARA DILATACIÓN EN MODULO DE AULA MÚLTIPLE.



RETIRO DE CASETONES EN PLACA DE ENTREPISO DE MODULO DE AULAS DE DOS PISOS.



VISITA TÉCNICA DE INGENIERO ESTRUCTURAL PARA ESTADO DE PLACA DE ENTREPISO MODULO DE AULAS DE DOS PISOS.

INSTALACIÓN DE CUARTO BOCEL PARA FORMALETA DE VIGAS DE LOSA EN MODULO DE BIBLIOTECA.



INSTALACIÓN DE FORMALETA METALICA PARA FUNDICIÓN DE VIGAS DE LOSA EN MODULO DE BIBLIOTECA.



FUNDICIÓN DE COLUMNAS CON CONCRETO 3000 PSI EN MODULO DE AULAS DE UN PISO.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

BITACORA

PERIODO 14

298 - 02/05/2026, Sabado.

El Personal de obra da Continuidad con la instalacion de acero para corramiento tramo 3 por otro lado el personal de obra da inicio a la desinstalacion de plataforma. falsa de la Etapa 1 del modulo aula de dos pisos.
retrancando las vigas principales a media luz para las vigas cortas o a 1/3 y 2/3 para las vigas con luz larga.
- instalacion de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo aula-multiple.

- Personal de obra: 4 oficiales
11 ayudantes
- Clima: nublado Con lluvias en horas de la mañana.

Liliana A. Cañi C. — Residente.
Inspectora de intervencion

299. 04/05/2026, Lunes.

El Personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades:
- instalacion de acero transversal de Columnas del modulo aulas de 1 Piso.
- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo aula multiple.
- instalacion de reeebo-cemento para placa de piso del modulo Cocina y aula-multiple.
- Por otro lado se da inicio a la actividad de instalacion de estructura falsa o entarimado para el modulo biblioteca.
- Personal en obra: 6 oficiales 1 operador de retroexcavadora
13 ayudantes
- Clima: nublado Con lluvias intermitente en todo el dia.
- nota: la Empresa Zigas realiza Presencia en obra para [illegible] inicio a la instalacion de la [illegible]

Powered by CamScanner

Prolongacion de la red de Gas Sobre el Costado de la carrera 12 Este.
-Personal de la empresa dor Gas: 1 Cordinador
3 ayudantes

300. 05/05/2026. Martes. Liliana A. Cer. C. Yuma
El Personal de obra realiza las siguientes actividades: Residente
- instalacion de acero de refuerzo para viga de cerramiento tramo 3 y tramo 2.
- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo aula multiple.
- instalacion de Placa falsa o entarimado para el modulo biblioteca.
- instalación de acero transversal para Columnas del modulo aulas de 1 piso.
- instalacion de recebocemento para placa de piso del modulo Coure.
- Personal en obra: 6 oficiales 1 operador de retroexcavadora 13 ayudantes
- Clima: cielo parcialmente nublado Liliana A. Cer. C. Yuma
- Equipos: 1 Retroexcavadora. Residente

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

301. 06/05/2026, Miercoles
El Personal de obra realiza los siguientes actividades:
- instalacion de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Sala profesores modulo 2.
- instalacion de acero transversal de Columnas del modulo aula de dos pisos nivel 2.
- Instalacion de Casetones y Cuadradonal de aula de los pisos entrepiso nivel 2.
- instalacion de estructura falsa o entarimado para vigas y losas aereas del modulo biblioteca.
- desinstalación de entarimado del modulo Sala de Profesores modulo 1.
- instalacion de acero de refuerzo para viga de amarracion de Cerramiento tramo 3 Carrera 12 este.

NKB

Powered by CamScanner

- Personal en obra: 5 oficiales
1.º ayudantes.
- Clima: nublado con lluvias de 7:00am - 9:00am y de 12:00 - 3:00pm.

La interventoría observa posteriormente a la desinstalación del entarimado del módulo de Sala de profesores (modulo 1), al igual que en la desinstalación de casetones y cuantifica el del módulo de aulas de dos pisos: hormigonado sucreo y segregación de concreto, perdida de recubrimiento, exposición parcial de acero, deficiente confinamiento del concreto en el borde, ausencia y/o mala disposición de separadores, Vibrado insuficiente en zona perimetral; por lo tanto se recomienda realizar saneamiento del concreto defectuoso, limpieza y tratamiento del acero expuesto, verificación del recubrimiento y reparación con el mortero estructural aprobado. Asimismo, fortalecer el control de formaleta, Vibrado y uso adecuado de separadores (panelitas) en próximos vaciados

Liliana A. Cortés
L. interventoría

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

302. 07/05/2026. Jueves.

El Personal en obra realiza las siguientes actividades:
- instalacion de acero transversal para columnas del modulo aula de dos pisos nivel 2.
- instalacion de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Sala de profesores modulo 2.
- instalacion de entarimado para el modulo biblioteca.
- limpieza de vigas de arriostracion del modulo Aula-multiple para alistar perfiles para aplicacion de pintura de advertencia.

Powered by CamScanner

• desinstalación de Casetones del modulo aula de dos Pisos entrepiso nivel 2 Etapa 1
• Reparacion de hormigonco en Placa entrepiso nivel 2 de Aulas de dos Pisos con puente de adherencia y mortero de reparación.
- Personal en obra: 6 oficiales
13 ayudantes
1 maestro
- Clima: Cielo parcialmente nublooso durante la mayor parte del dia

Liliana A. Cobo / Residente de intervantoria

303 08/05/2026. Viernes.
El Personal en obra realiza las siguientes actividades.
•instalación de separadores para acero de refuerzo de viga de cimentación de Cerramiento.
• instalación de acero de refuerzo para sala de Profesores modulo 2. vigas aereas.
• instalación de Formaleta para viga de cimentacion de cerramiento.
• instalación de acero de transversal de Columnas del modulo aula de dos Pisos.
• instalacion de Pasarela para bomba estacionaria en Columnas del modulo aulas de 1 Piso.
• instalacion y ubicacion de bomba estacionaria para Columnas del modulo aulas de 1 Piso.
- Personal en obra: 6 oficiales
13 ayudantes
1 maestro
- Equipos en obra: 1 bomba estacionaria
- Clima: Cielo mayormente nublado en horas de la mañana y parcialmente nublado en horas de la tarde.

Liliana A Cobo Residente de intervantoria

304. 09/05/2026. Sabado.
El Personal en obra realiza la fundicion de zapata de viga T invertida de Cerramiento tramo 3 sobre la Carrera 12 Este.

LAURA GONZALEZ M
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

asi mismo se realiza la fundicion de (1) Columna del modulo Cocina. y Previamente a la fundicion de los 3 almas pendientes en aula multiple se Solicito al Personal de interventoria Presente la liberacion de la superficie de las tres almas para poder aplicar el puente de adherencia y el vaciado del Concreto. a lo que se dio como aprobada la actividad.
la fundicion de los elementos se realizo con concreto 3000PSi y se realizaron las muestras en obra.

-Personal en obra: 5 oficiales
13 ayudantes
1 maestro.

-Equipos en obra: 1 bomba estacionaria.
-Clima: Cielo parcialmente nublado

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Residente.

Liliana Ab
R. Interventoría

La interventoria evidencia infiltración y escurrimiento de agua proveniente de la placa de entrepiso, generando humedad permanente sobre elementos estructurales verticales (Columnas), con presencia de manchas, lavado superficial del concreto y exposición a condiciones que pueden afectar la durabilidad del acero de refuerzo, Se recomienda realizar inspec. técnica detallada de la placa de entrepiso con el fin de identificar el origen de la infiltración y ejecutar de manera inmediata las actividades de Corrección correspondientes, tales como sellado de fisuras, reparación de puntos de filtración e implementación del Sistema de impermeabilización, evitando afectaciones de durabilidad de los elementos estructurales.

Arquitecto Interv

Powered by CamScanner

305 11/05/2026, Lunes

El Personal de obra realiza las siguientes actividades:

- desinstalación de formaleta de Zarpa de cerramiento tramo #3.
- amarre de acero de refuerzo para viga T de Cerramiento tramo #2.
- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Sala de Profesores modulo 2.
- instalación de acero transversal para Columnas del modulo aula de 2 Pisos nivel 2.

Por otro lado se da inicio ~~(illegible)~~ a la instalación de enturmado para Sala de Profesores modulo 2.

- Se realiza la desinstalación de enturmado para aulas de dos Pisos nivel 2 Etapa 2.
- Se realiza la instalación de recebocemento sobre el modulo aula multiple.

- Personal en obra: 4 oficiales.
  12 ayudantes.
  1 maestro.

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

- Clima: nublado Con lluvias durante toda la jornada.

Liliana A Cerón
R. Interventoria

Residente.

306. 12/05/2026, martes.

El Personal de obra Realiza las siguientes actividades:

- Instalación de Recbocemento en el modulo aula-multiple para Placa de Piso.
- instalación de acero de refuerzo para viga T Cerramiento tramo 2.
- instalación de acero transversal para Columnas del modulo aula de dos Pisos ~~(tramo)~~ Etapa 2 nivel 2.
- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Sala de Profesores modulo 2.
- instalación de enturmado para Sala de Profesores modulo 2.
- desinstalacion de enturmado Aula de dos Pisos nivel 2 Etapa 2
- instalación de formaleta para alma de viga T Cerramiento tramo #3
- instalación de mallas para losas aereas modulo biblioteca.

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

- Personal en obra: 4 oficiales
  12 ayudantes
  1 maestro.

Liliana A Cerón
R. Interventoria

Residente

- Clima: nublado Con lluvias en horas de la mañana

Powered by CamScanner

307. 13/05/2026. Miercoles

El Personal de dosa realizan las siguientes actividades:

- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo sala de Profesores modulo 2.
- instalacion de acero de refuerzo para viga y Cerramiento tramo 2.
- instalación de acero de refuerzo (mallas) para losas aereas del modulo biblioteca.
- instalacion de recebo-cemento con maquina para Placa de Piso de aula multiple
- instalación de entramado para sala de profesores modulo 2.
- adecuaciones para el ingreso de mixer a obra con Pajarita sobre calle 1ra
- Reparacion de vigas aereas del modulo Aula de dos pisos etapa 1.
- instalacion de Separadores para 2 capa de Cerramiento. tramo #2.
- instalacion de malla de refuerzo para losas aereas del modulo biblioteca.

- Personal en obra: 4 oficiales.
  13 ayudantes
  1 maestro
  1 operador de Pajarita.
- Equipos en obra: 1 Pajarita.
- Clima: nublado en horas de la mañana y Parcialmente nublado en horas de la tarde.

Residente.
Liliana A. Cerón
L. Interventoría

SRTA. LAURA CORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

308. 14/05/2026. Jueves.

El Personal en obra realiza las siguientes actividades:

- instalación de formaleta para 2 capa Cerramiento tramo 2.
- instalacion de malla de refuerzo para losas aereas del modulo biblioteca
- instalacion de entramado para sala de Profesores modulo 2.
- instalacion de recebo-cemento para placa de piso del modulo aula multiple
- instalación de acero transversal para columnas del modulo aula de dos pisos nivel 2
- Reparacion de vigas aereas del modulo aula de 2 pisos nivel 2 etapa 1.
- Retiro de Casetones etapa 2 nivel 2 Aula de dos pisos.

-Personal en obra: 4 oficiales
13 ayudantes
1 maestro.

-Clima: Parcialmente nublado

Residente.
Liliana A. Cerón
L. Interventoría

SRTA. LAURA CORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
NKB

Powered by CamScanner

309 309 15/05/2026. Viernes

El Personal en obra realiza la fundición de Columnas Etapa 1 de aulas de 1 Piso Correspondientes a 10 unidades de 40X40 y 4 unidades de 30X40, así mismo se realiza la fundición del alma de la viga T de Arriostramiento tramo #3 Sobre la Carrera 12 Este y la Zarpa de viga T del tramo #2 Sobre calle 11a Sobre el modulo aula de 2 Pisos. Con Concreto 3000PSI. ayudados de la autobomba y descarga directa para Zarpa se realizo la aplicación del Puente de adherencia para el alma de la viga T tramo #3. y se tomaron 8 muestras de Concreto de 4" como lo indica la norma.

- Personal en obra: 4 oficiales 1 operada de autobomba.
  13 ayudantes
  1 maestro
- Clima: Parcialmente nublado
- Equipos en obra: 1 autobomba

Liliana A. Cerón C. Residente.
R. Interventoría

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

310 16/05/2026 Sabado.

El Personal de obra Realiza las Siguientes actividades:

- desinstalación de formaleta de Columnas Etapa 1 Aula de dos piso e instalación de vinipel forrando las Columnas.
- instalación de Formaleta para Columnas Etapa 2: Aulas de 1 Piso.
- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Cocina.
- instalacion de entramado para losa de Profesores modulo 2
- instalacion de mallas de refuerzo para losa aereas del modulo biblioteca

- Personal en obra: 4 oficiales
  13 ayudantes
  1 maestra
- Clima: Parcialmente nublada

Liliana A. Cerón C. Residente.
R. Interventoría

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

311 18/Mayo/2026. Lunes. (festivo)
El Personal en obra realiza la Continuidad de las Siguientes actividades.

- instalacion de acero de refuerzo para Vigas aereas del modulo Sala de Profesores
- instalacion de malla de refuerzo para losas aereas del modulo biblioteca.
- instalacion de formaleta para viga T (alma) del Cerramiento tramo 2 Sobre la Calle 1ra
- instalacion de formaleta para columnas 2da Etapa del modulo aulas de 1 Piso.
- Se Continua con la desinstalacion de Coseton de Placa entrepiso nivel 2 del modulo aula de dos pisos.
- Se Continua con la instalacion de recebo cemento sobre el modulo aula multiple para placa de Piso.

- Persona en obra: 3 oficiales
8 ayudantes
1 maestro

- Clima: Cielo nublado.

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Ing. Interventoria Residente.

312. 19/Mayo/2026. Martes.

El Personal en obra da Continuidad a las Siguiente actividades:

- instalación de formaleta para viga T (alma) de Cerramiento tramo 2 Sobre la Calle 1ra. detras del modulo Aula de dos Pisos.

Powered by CamScanner

- instalacion de acero de malla de refuerzo para losas aereas del modulo biblioteca.
- instalacion de Cuartobasel para vigas y losas aereas del modulo biblioteca.
- retiro de Casetones del modulo aula de dos pisos placa entrepiso nivel 2.
- instalacion de reacabocemento sobre el modulo aula multiple para placa de piso.

- Personal en obra: 3 oficiales
  8 ayudantes
  1 maestro.
- Clima: cielo nublado

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Iliana A. Cerón
L. interventora

Residente.

313 20/Mayo/2026. Miercoles.
El Personal en obra realiza la fundicion de alma de viga T invertida de cerramiento tramo 2 sobre la Calle 1ra, realizando su vaciado directo con bugy se realizo la actividad con Concreto 3000PSI y se realizo su vibrado en toda la seccion, antes de aplicar el Concreto se realizo la aplicacion del puente de adherencia entre Concreto viejo y Concreto nuevo. se tomaron las 8 muestras de Concreto que exige la norma.

- Personal en obra: 3 oficiales
  8 ayudantes
  1 maestro

- Clima: Cielo nublado durante todo el dia Con lluvias de 7:00am - 10:00am (y) (de)

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Iliana A. Cerón
L. interventora

Residente

Powered by CamScanner

314. 21/Mayo/2026. Jueves.

El Personal en obra realiza las siguiente actividades:
- instalacion de recebocemento sobre el modulo aula multiple para placa de Piso.
- instalación de Cuarto bosel para losas y vigas aereas del modulo biblioteca.
- instalacion de mallas de refuerzo para losas y vigas aereas del modulo biblioteca.

Nota: las lluvias del dia anterior y las lluvias de la jornada de hoy afectaron directamente la instalacion de recebocemento ya que se esta realizando por Capas y a la hora de extender el material y absorver el agua ya no sirve para su correcta Compactación lo que Conlleva al retiro del material afectado para remplazarlo por material bueno para su Correcta Compactación.

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes.
  1 maestro.
- Clima: Cielo nublado con lluvias de 2:00pm - 6:00pm.

Liliana A Cañ
& Interventoria.

Residente.

ARQ. LAURA CORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

315. 22/Mayo/2026. Viernes.

El Personal de obra da Continuidad y Realiza las Siguientes actividades:

* instalacion de formaleta Perimetral para Placa de Piso del modulo aula multiple.
- instalacion de recebocemento para Placa de Piso del modulo aula multiple.
- nivelacion del terreno de Placa de piso del modulo aula multiple.

Powered by CamScanner

- Instalación de malla electrosoldada para placa de piso del modulo aula multiple.
- Instalacion de separadores para malla electrosoldada de placa de piso del modulo aula multiple
- Retiro de Cajetones del modulo aula de la piso placa entrepiso nivel 2.

Personal en obra: 1 oficial
8 ayudantes
1 maestro

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

- Clima: Parcialmente nublado

Residente

Liliana Ale
R. Interventor

316. 23/Mayo/2026, Sabado.

El Personal de obra Realiza la fundicion de Placa de piso del modulo aula multiple con Concreto 3000 psi con vaciado directo y buggy. la actividad inicio a las 10:00am y de ejecuto hasta las 5:00 pm, se realizaron los ensayos de slump correspondientes y de tomaron las 8 muestras de Concreto que exige la norma. asi mismo se le aplico el antisol a la Placa despues del fallado.

- Personal en obra: 1 maestro
1 oficial
8 ayudantes

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

- Clima: Cielo Parcialmente nublado

Liliana Alcot
R. Interventora.

Residente

Powered by CamScanner

317 25/05/2026, Lunes.

El Personal en obra Realizo las Siguientes Actividades:

- Dilatación de la Placa de Piso del modulo aula multiple.
- Retiro de Cadetonel del modulo aula de dos Pisos Placa entrepiso nivel 2.
- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Sala de profesores modulo 2.
- instalacion de mallas de refuerzo para losas aereas del modulo biblioteca.
- instalación de Cuartobasel para losas y vigas del modulo biblioteca.

-Personal en obra: 1 oficial
8 ayudantes
1 maestro

-Clima: Parcialmente nublado.

Liliana A Cri
R. Interventoria

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

318. 26/05/2026, Martes.

El Personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades.

- instalacion malla de refuerzo para losas aereas del modulo biblioteca
- instalación de acero de refuerzo para vigas aereas del modulo Sala de profesores.
- Retiro de Cadetones del modulo aula de dos Pisos Placa entrepiso nivel 2.
- instalación Cuartobase para losas y vigas del modulo biblioteca.

Personal en obra: 1 oficial
8 ayudantes
1 maestro

Liliana A Cri
R. Interventoria

Clima: Parcialmente Nublado

Powered by CamScanner

319. 26/Mayo/2026

Se realizo un recorrido en obra en conjunto con el Contratista, interventoria, Equipo de apoyo de residente de obra y director junto con el especialista estructural Fabian Camilo Falla. donde se pudo concluir lo siguiente

- Con respecto a la losa aerea del nivel 2 del modulo aula de dos pisos se debe realizar la medicion de las grietas de la losa para darle un tratamiento a las fisuras que sean mayor a 0,004 cm teniendo encuenta que son fisuras causadas por la retraccion del Concreto y no comprometen su funcionamiento estructural.
- Con respecto al hormigoneo encontrado en las vigueta y nervios del nivel 2 de Aulas de dos pisos, se solicita realizar la extraccion del material suelto y limpiar la superficie para posteriormente instalar formaleta en una de sus caras y aplicar el mortero de reparacion asegurando darle su seccion de diseño.
- Con respecto al caseton ubicado en la losa de baño de aulas de dos pisos que sufrio un levantamiento en el proceso de fundicion se solicita realizar la demolicion de la placa delgada existente sobre el Caseton y realizar la demolicion en el borde de la viga y vigueta que soporta la placa para posteriormente instalar la formale y reparar toda la seccion con mortero de reparacion
- se deja evidencia de que la reparacion en los nucleos extraidos en el modulo aula de 1 piso se realizo conforme al procedimiento recomendado por el especialista.
- se aclara por parte del especialista que para las reparaciones esteticas que no requieren una preparacion de la superficie son aquellas que no tiene afectaciones profundas, material suelto y acero expuesto del elemento y se permite la aplicacion del mortero para mejoras su estetica.

Liliana A. Cerón
Residente
Interventoria.

Powered by CamScanner

320 27/Mayo/2026. Miercoles

El Personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades:

- instalacion de acero para mallas de refuerzo para losas aereas del modulo biblioteca.
- instalación de Cuartoboard y goteros para losas aereas y vigas del modulo biblioteca
- Reparación de base reja de Cerramiento sobre la parte trasera del modulo Sala de profesores modulo 1.
- Reglecion y devolucion de cosetones del modulo aula de los pasos Placa entrepiso nivel 2.
- instalacion de dos formaletas de acero para vigas de biblioteca.

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes
  1 maestro.
- Clima: Parcialmente nublado

Solicitud / 27/05/2026 Se Solicita a interventoria la revision y aprovacion del acero de refuerzo instalado de vigas aereas del modulo biblioteca para su liberacion, asi mismo de solicita la verificacion de instalacion de aforadores (distanciadores de acero de las vigas del mismo modulo como tambien la instalacion de acero de refuerzo de mallas de refuerzo para losas aereas de modulo biblioteca.

Liliana Acri
Interventoria

Residente.

ARQ. LAURA CORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

321. 28/Mayo/2026. Jueves.

El Personal en obra da Continuidad a las siguientes actividades:

- instalación de mallas de refuerzo para losas aereas del modulo biblioteca.

Powered by CamScanner

- instalación de formaleta perimetral para vigas y losas aereas del modulo biblioteca
- instalacion de Cuartobosel y goteros para losas aereas del modulo biblioteca.

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes.
  1 maestro.
- Clima: cielo parcialmente nublado

Solicitud 28/05/2026: Se solicita a interventoria la liberación de las vigas aereas del modulo Sala de Profesores. Para su revisión y aprovacion parcial por etapas, dejando como unicos pendientes las vigaetas.

Liliana A. Cori
L. interventora.

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

322 29/Mayo/2026. Viernes

El personal de obra da Continuidad a las siguientes actividades:
- instalación de formaleta perimetral para vigas y losas aereas del modulo biblioteca
- instalación de Cuartobosel para vigas del modulo biblioteca.

Por otro lado se inicia con la actividad de la fundación Etapa 2 de Columnas del modulo Aulas de 1 Piso. iniciando actividad a la 1:00 pm con Concreto 3000PSI y vaciada manual de valde. la actividad Concluye a las 3:00 pm Con 8 Columnas de 40x40 x 3m de altura. Se realizaron ensayos de Slump y de toma de muestras de Concreto como lo dicta la norma.
Se dio vibro al concreto en toda la altura y se bajo la temperatura de las formaletas Con agua antes de su vaciado ya que el dia fue muy Seco.

Powered by CamScanner

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes
  1 maestro
- Clima: Soleado durante todo el día

Liliana A Cri — Residente
Ing. Interventoría

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

322. 30/Mayo/2026. Sabado.

El Personal de obra realiza las siguientes actividades.
- instalacion de formaleta perimetral del modulo biblioteca en vigas
- instalación de mallas de refuerzo para losas aereas
- desinstalación de formaleta para columnas del modulo aulas de 1 piso.
- instalacion de vinipel a todo el perimetro de columnas del modulo aulas de 1 piso.

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes
  1 maestro
- Clima: Soleado

Liliana A Cri — Residente.
Ing. Interventoría

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

323. 01/Junio/2026. Lunes.

El Personal en obra Realiza las siguientes actividades:
- instalación de formaleta para vigas y losas aereas del modulo biblioteca.
- instalación de Cuartobasel para vigas del modulo biblioteca.
- Recolección y devolucion de Cortorce del modulo Aula de dos Pisos placa entrepiso nivel 2.

- Personal en obra: 1 oficial
  8 ayudantes
  1 maestro
- Clima: Parcialmente nublado con sol

ARQ. LAURA GORDILLO M.
DIRECTORA DE
INTERVENTORIA

Liliana A Cri — Residente.

Powered by CamScanner

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ENSAYOS LABORATORIO PERIODO 14

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de mayo de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	30 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	30 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
148	Placa de contrapiso Modulo aula múltiple	N/S	21	No suministrada	23-may.-26	7	30-may.-26	200	98	3498	75,43	2,319	2,0	142,9	193,18	19,3	92,0	3	Mixer Concretera Hormigones del sur Placa: SVE 981
						7	30-may.-26	200	98	3516	75,43	2,331	2,0	137,2	185,48	18,5	88,3	3	
						28	20-jun.-26												
						28	20-jun.-26												
						56	18-jul.-26												
						56	18-jul.-26												

Plazo para ensayar los especimenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
**** Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**7/11/2025**

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de mayo de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	30 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	30 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 148

ENSAYO A 7 DÍAS (30 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 148

ENSAYO A 28 DÍAS (20 DE JUNIO DE 2026)

	Elaboró	**Aprobó**
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	29 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	26 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	26 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
115	11 Columnas Modulo de cocina	N/S	21	No suministrada	28-abr.-26	7	5-may.-26	200	99	3366	76,98	2,186	2,0	170,4	225,73	22,6	107,5	5	Mixer Concretos PYS Placa: PXS 713
						7	5-may.-26	200	99	3374	76,98	2,192	2,0	168,4	223,08	22,3	106,2	3	
						28	26-may.-26	200	99	3410	76,98	2,215	2,0	152,9	202,55	20,3	96,5	3	
						28	26-may.-26	201	99	3402	76,98	2,199	2,0	207,3	274,61	27,5	130,8	5	
						56	23-jun.-26												
						56	23-jun.-26												

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
**** Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	29 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	26 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	26 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 115

ENSAYO A 7 DÍAS (05 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 115

ENSAYO A 28 DÍAS (26 DE MAYO DE 2026)





	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	28 de marzo de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	22 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	22 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
056	Vigas 107 y 110 Zapatas A'-9, A'-10, A'-12 Columnas D-1, D-2, D-3 Aula múltiple	N/S	21	No suministrada	27-mar.-26	7	3-abr.-26	205	101	3659	80,12	2,228	2,0	97,1	123,59	12,4	58,9	3	Mixer Concretos PYS Placa: PXS 714
						7	3-abr.-26	206	101	3662	80,12	2,219	2,0	86,6	110,22	11,0	52,5	5	
						28	24-abr.-26	203	102	3605	81,71	2,173	2,0	134,1	167,35	16,7	79,7	6	
						28	24-abr.-26	202	101	3592	80,12	2,219	2,0	142,1	180,86	18,1	86,1	3	
						56	22-may.-26	203	100	3550	78,54	2,227	2,0	165,8	215,3	21,5	102,5	5	
						56	22-may.-26	201	100	3578	78,54	2,266	2,0	159,9	207,6	20,8	98,9	5	

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
* Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	28 de marzo de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	22 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	22 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 056

ENSAYO A 7 DÍAS (03 DE ABRIL DE 2026)




CILINDROS CÓDIGO 056

ENSAYO A 28 DÍAS (24 DE ABRIL DE 2026)




CILINDROS CÓDIGO 056

ENSAYO A 56 DÍAS (22 DE MAYO DE 2026)




	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	16 de mayo de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	22 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	22 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
143	13 columnas entre ejes A y B en modulo aula de 1 piso	N/S	21	No suministrada	15-may.-26	7	22-may.-26	200	98	3392	75,43	2,248	2,0	102,5	138,57	13,9	66,0	6	Mixer Concretera Hormigones del sur Placa: WNW 134
						7	22-may.-26	200	98	3386	75,43	2,244	2,0	100,4	135,73	13,6	64,6	3	
						28	12-jun.-26												
						28	12-jun.-26												
						56	10-jul.-26												
						56	10-jul.-26												

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
**** Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	16 de mayo de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	22 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	22 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 143

ENSAYO A 7 DÍAS (22 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 143

ENSAYO A 28 DÍAS (12 DE JUNIO DE 2026)

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	22 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	22 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica

INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
110	Placa entrepiso modulo aula de dos pisos Entre ejes F5D al F4D	N/S	28	No suministrada	24-abr.-26	7	1-may.-26	201	99	3439	76,98	2,223	2,0	177,6	235,27	23,5	84,0	5	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: WNW 134
						7	1-may.-26	200	98	3411	75,43	2,261	2,0	163,0	220,36	22,0	78,7	5	
						28	22-may.-26	200	99	3420	76,98	2,221	2,0	201,2	266,53	26,7	95,2	3	
						28	22-may.-26	201	99	3454	76,98	2,232	2,0	194,0	257	25,7	91,8	3	
						56	19-jun.-26												
						56	19-jun.-26												

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.


Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.

Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.

Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.

Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).

Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
* ***Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	22 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	22 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 7 DÍAS (01 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 28 DÍAS (22 DE MAYO 2026)





	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	22 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	22 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica

INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
111	Placa entrepiso modulo aula de dos pisos Entre ejes F2E al F1E	N/S	28	No suministrada	24-abr.-26	7	1-may.-26	200	99	3426	76,98	2,225	2,0	158,9	210,50	21,0	75,2	3	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: BPN 470
						7	1-may.-26	200	98	3434	75,43	2,276	2,0	164,2	221,98	22,2	79,3	5	
						28	22-may.-26	201	100	3470	78,54	2,198	2,0	201,6	261,75	26,2	93,5	3	
						28	22-may.-26	200	99	3474	76,98	2,257	2,0	187,9	248,91	24,9	88,9	3	
						56	19-jun.-26												
						56	19-jun.-26												

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.


Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.

Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.

Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.

Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).

Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
* ***Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	22 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	22 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 7 DÍAS (01 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 28 DÍAS (22 DE MAYO DE 2026)





	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	10 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	7 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	7 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
087	Placa entrepiso de modulo aula de dos pisos, entre los ejes 9 al 8.	N/S	28	No suministrada	9-abr.-26	7	16-abr.-26	204	100	3672	78,54	2,292	2,0	151,9	197,22	19,7	70,4	3	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: FOW 749
						7	16-abr.-26	204	101	3728	80,12	2,281	2,0	133,4	169,79	17,0	60,6	3	
						7	16-abr.-26	205	101	3680	80,12	2,241	2,0	141,3	179,84	18,0	64,2	3	
						14	23-abr.-26	200	99	3545	76,98	2,303	2,0	166,2	220,17	22,0	78,6	3	
						14	23-abr.-26	200	99	3549	76,98	2,305	2,0	79,1	104,8	10,5	37,4	5	
						14	23-abr.-26	200	99	3543	76,98	2,301	2,0	73,8	97,763	9,8	34,9	6	
						28	7-may.-26	199	98	3558	75,43	2,370	2,0	183,8	248,48	24,8	88,7	3	
						28	7-may.-26	203	100	3668	78,54	2,301	2,0	204,0	264,86	26,5	94,6	3	
						28	7-may.-26	203	101	3714	80,12	2,284	2,0	200,7	255,44	25,5	91,2	3	
						56	4-jun.-26												
						56	4-jun.-26												
						56	4-jun.-26												

Plazo para ensayar los especimenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
* Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	**Aprobó**
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	10 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	7 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	7 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 087

ENSAYO A 7 DÍAS (16 DE ABRIL DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 087

ENSAYO A 14 DÍAS (23 DE ABRIL DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 087

ENSAYO A 28 DÍAS (07 DE MAYO DE 2026)





	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	29 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	5 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	5 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
115	11 Columnas Modulo de cocina	N/S	21	No suministrada	28-abr.-26	7	5-may.-26	200	99	3366	76,98	2,186	2,0	170,4	225,73	22,6	107,5	5	Mixer Concretos PYS Placa: PXS 713
						7	5-may.-26	200	99	3374	76,98	2,192	2,0	168,4	223,08	22,3	106,2	3	
						28	26-may.-26												
						28	26-may.-26												
						56	23-jun.-26												
						56	23-jun.-26												

Plazo para ensayar los especimenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
**** Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	29 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	5 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	5 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 115

ENSAYO A 7 DÍAS (05 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 115

ENSAYO A 28 DÍAS (26 DE MAYO DE 2026)

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	1 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	1 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
110	Placa entrepiso modulo aula de dos pisos Entre ejes F5D al F4D	N/S	28	No suministrada	24-abr.-26	7	1-may.-26	201	99	3439	76,98	2,223	2,0	177,6	235,27	23,5	84,0	5	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: WNW 134
						7	1-may.-26	200	98	3411	75,43	2,261	2,0	163,0	220,36	22,0	78,7	5	
						14	8-may.-26												
						14	8-may.-26												
						28	22-may.-26												
						28	22-may.-26												

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
**** Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	1 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	1 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 7 DÍAS (01 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 14 DÍAS (08 DE MAYO 2026)

CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 28 DÍAS (22 DE MAYO DE 2026)

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	1 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	1 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
111	Placa entrepiso modulo aula de dos pisos Entre ejes F2E al F1E	N/S	28	No suministrada	24-abr.-26	7	1-may.-26	200	99	3426	76,98	2,225	2,0	158,9	210,50	21,0	75,2	3	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: BPN 470
						7	1-may.-26	200	98	3434	75,43	2,276	2,0	164,2	221,98	22,2	79,3	5	
						14	8-may.-26												
						14	8-may.-26												
						28	22-may.-26												
						28	22-may.-26												

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
**** Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	1 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	1 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 7 DÍAS (01 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 14 DÍAS (08 DE MAYO DE 2026)

CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 28 DÍAS (22 DE MAYO DE 2026)

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	1 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	1 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
110	Placa entrepiso modulo aula de dos pisos Entre ejes F5D al F4D	N/S	28	No suministrada	24-abr.-26	7	1-may.-26	201	99	3439	76,98	2,223	2,0	177,6	235,27	23,5	84,0	5	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: WNW 134
						7	1-may.-26	200	98	3411	75,43	2,261	2,0	163,0	220,36	22,0	78,7	5	
						14	8-may.-26												
						14	8-may.-26												
						28	22-may.-26												
						28	22-may.-26												

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
**** Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	1 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	1 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 7 DÍAS (01 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 14 DÍAS (08 DE MAYO 2026)

CILINDROS CÓDIGO 110

ENSAYO A 28 DÍAS (22 DE MAYO DE 2026)

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO:	**PM-EL-FO-001**
VERSIÓN:	**001**
FECHA:	**25/10/2024**


Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	1 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	1 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

Descripción de los materiales:	**Arena:**	N/S	**Grava:**	N/S	**Cemento:**	N/S	**Aditivo No.1**	No aplica
	Fuente:	N/S	**Fuente:**	N/S	**Fuente:**	N/S	**Aditivo No.2**	No aplica


INFORME DE ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

Muestra	Elemento	Slump	Resistencia nominal	Temperatura	Fecha de toma	Edad de falla	Fecha de rotura	Longitud promedio	Diámetro promedio	Masa del espécimen	Área sección transversal	Densidad	Relación longitud / diámetro	Carga máxima	Resistencia		Desarrollo	Tipo de falla	Observaciones
Código	Punto de referencia	(Pulg.)	Mpa	°C	Dia- Mes- Año	Hora - Dias	Dia- Mes- Año	(mm)	(mm)	(g)	Cm²	Kg/cm³	L/D	Kn	Kg/cm²	Mpa	%		
111	Placa entrepiso modulo aula de dos pisos Entre ejes F2E al F1E	N/S	28	No suministrada	24-abr.-26	7	1-may.-26	200	99	3426	76,98	2,225	2,0	158,9	210,50	21,0	75,2	3	Mixer Concretera Hormigones del Sur Placa: BPN 470
						7	1-may.-26	200	98	3434	75,43	2,276	2,0	164,2	221,98	22,2	79,3	5	
						14	8-may.-26												
						14	8-may.-26												
						28	22-may.-26												
						28	22-may.-26												

Plazo para ensayar los especímenes luego del curado	
24 Horas	± 0,5 horas o - 2,1 %
3 días	2,0 horas o - 2,8%
7 días	6,0 horas o - 3,6%
28 días	20,0 horas o - 3,0%
90 días	2,0 días o - 2,2%



Tipo 1. Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 2. Conos bien formados en un extremo, pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos razonablemente bien formados en ambos extremos.
Tipo 3. Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.
Tipo 4. Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.
Tipo 5. Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar).
Tipo 6. Similar al Tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.



Relación equipos utilizados:	Balanza	LOC-EH 010	Calibrador pie de rey	LOC-EH 020	Prensa hidráulica	LOC-EH 001

Observaciones:
Según los criterios usuales de control de calidad del concreto y la normativa del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), los ensayos a edades tempranas son indicativos del desarrollo de resistencia y no constituyen criterio definitivo de aceptación, la cual se verifica a los 28 días. De forma referencial, se espera aproximadamente ***70 % a 7 días, 90 % a 14 días y 100 % a 28 días*** *, valores que pueden variar dependiendo del tipo de cemento utilizado, el diseño de mezcla y las condiciones de curado.*

Comentarios:
**** Las muestras han sido elaboradas y suministradas por el cliente.***
* Los datos se presentan de acuerdo con la información suministrada por el contratante del servicio, incluyendo nombre del proyecto, localización y entidad contratante.
* Este informe únicamente podrá reproducirse en su totalidad con autorización escrita del laboratorio emisor
* Los resultados presentados corresponden únicamente a las muestras obtenidas en el proyecto identificado con el presente código y no podrán asumirse como válidos para otros proyectos.

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

INV E - 410 / NTC - 673: INFORME - ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Proyecto:	I.E.M. Winnipeg.	**Código de la obra:**	LOC-CO-010-26	**Fecha de recepción:**	25 de abril de 2026
		Orden de servicio:	LOC - OS 018-26	**Fecha de digitalización:**	1 de mayo de 2026
Localización:	Municipio de Pitalito, Huila.	**Remisión:**	LOC-018-26	**Fecha de emisión:**	1 de mayo de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTERCONSULTORES	**Dirigido a:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES		

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 7 DÍAS (01 DE MAYO DE 2026)





CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 14 DÍAS (08 DE MAYO DE 2026)

CILINDROS CÓDIGO 111

ENSAYO A 28 DÍAS (22 DE MAYO DE 2026)

	Elaboró	Aprobó
Firma:		
Nombre:	John Fredy Sanchez Ospitia	Myriam Claros Montealegre
Cargo:	Jefe de Laboratorio	Coordinadora de Calidad

Gobernación del Huila	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

CORRESPONDENCIA ENVIADA PERIODO 14

Bogotá, 20 de Mayo de 2026
INTER-WPG-LG-211

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Requerimiento técnico por hallazgos identificados en elementos estructurales fundidos y solicitud de evaluación y rehabilitación prioritaria

Reciba cordial saludo ing Edgar,

En ejercicio de las funciones de interventoría y durante la inspección técnica realizada a los elementos estructurales correspondientes a la losa y vigas fundidas en sitio, se identificaron hallazgos asociados a defectos constructivos en diferentes sectores del elemento, evidenciándose visualmente zonas con presencia de hormigueros (nidos de grava), segregación del concreto, vacíos y pérdida localizada de material en caras inferiores y laterales en vigas. Las condiciones observadas podrían generar afectaciones relacionadas con la homogeneidad del concreto, el adecuado confinamiento del agregado, el recubrimiento del acero de refuerzo y la adherencia concreto–acero, aspectos que eventualmente podrían incidir sobre el comportamiento y desempeño del elemento estructural por lo cual se solicita la atención y gestión inmediata que la situación requiere

Teniendo en cuenta que mediante inspección visual no es posible determinar el alcance real de la afectación, ni establecer si corresponde a un defecto superficial o a una condición con incidencia estructural, esta interventoría solicita presentar de manera inmediata concepto técnico y propuesta de tratamiento avalada por el diseñador estructural del proyecto, diferente a la aplicada para los otros elementos, ya que la situación observada presenta una mayor magnitud respecto a otras afectaciones identificadas, por lo cual requiere una evaluación técnica específica que permita determinar el procedimiento definitivo de intervención y reparación., este documento debe incluir como mínimo:

1. Levantamiento e identificación detallada de todas las áreas afectadas.
2. Delimitación y cuantificación de las zonas con presencia de hormigueros, vacíos y segregación.

3. Procedimiento de remoción de material deteriorado o no consolidado hasta encontrar concreto sano.

4. Verificación de las condiciones del acero de refuerzo y del recubrimiento estructural existente.
5. Realización de ensayos y evaluaciones técnicas que el diseñador estructural considere pertinentes para establecer el alcance real de la afectación (ensayos no destructivos según aplique).
6. Presentación de procedimiento de reparación estructural indicando materiales, metodología de ejecución y criterios de aceptación.
7. Emisión de concepto técnico definitivo respecto a la aceptabilidad del elemento estructural intervenido.

Para esta evaluación y concepto técnico se solicita asista al sitio su especialista estructural, hasta tanto interventoría considera necesario abstenerse de aceptar las áreas afectadas y no autoriza continuar con actividades posteriores que puedan ocultar o limitar la adecuada evaluación de los hallazgos identificados. Por ende la fundida de las columnas del módulo de aulas de dos pisos, no está autorizada hasta determinar por el profesional designado el estado del elemento tras la evaluación de las afectaciones y su reparación.

Adicionalmente, a través del presente comunicado, esta interventoría realiza un primer llamado técnico al personal responsable de la ejecución de obra y a los profesionales encargados de la dirección y residente de las actividades constructivas, recordando que recae sobre dichos responsables la obligación de garantizar que el proceso de ejecución de los elementos estructurales se desarrolle bajo altos estándares de supervisión, control y aseguramiento de calidad en todas sus etapas, desde los procesos iniciales de formaleteado, revisión de condiciones previas a fundida, colocación y manejo del concreto, procesos de vibrado y compactación, hasta las actividades posteriores a la fundida relacionadas con desencofrado, curado y control de calidad del elemento ejecutado.

Producto de la inspección visual realizada, se evidencian a primera vista defectos constructivos cuya causa deberá ser técnicamente validada; sin embargo, preliminarmente podrían estar asociados a deficiencias durante el proceso constructivo, tales como procedimientos inadecuados o insuficientes de vibrado y compactación del concreto, así como posibles deficiencias en el sistema de formaleta empleado, situaciones que eventualmente pueden generar segregación, presencia de hormigueros, vacíos o pérdida de homogeneidad en el elemento estructural.

Se solicita la presentación del informe técnico requerido en un plazo que no deberá exceder el día viernes 29 de mayo de 2026, considerando la necesidad de iniciar con carácter prioritario y urgente las actividades de evaluación y rehabilitación de las zonas afectadas, dado que la permanencia de las condiciones evidenciadas podría generar reducción del recubrimiento efectivo del acero de refuerzo, incremento de la permeabilidad del elemento, ingreso de humedad y agentes externos a través de vacíos o discontinuidades del concreto, favoreciendo eventuales procesos de corrosión del acero, afectación de la adherencia concreto–acero, propagación de deterioros localizados y posibles afectaciones a la durabilidad y desempeño esperado del elemento estructural.

En consecuencia, se solicita fortalecer las medidas de control y supervisión técnica durante las actividades de fundida y ejecución de elementos estructurales, con el fin de evitar la repetición de situaciones similares en las actividades subsiguientes del proyecto.

Así mismo, no se autoriza la ejecución de actividades de resane, aplicación de morteros, pañetes o cualquier intervención que pueda alterar, ocultar o modificar las condiciones actualmente observadas sin aprobación previa de interventoría.

Anexamos registro fotográfico de soporte:













Por otra parte recordamos que el trámite del corte parcial de obra se encuentra suspendido hasta tanto no se reparen todos los defectos de los elementos que se están facturando y se cuente con la satisfacción por parte de interventoría.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la entrega de la información y soportes técnicos correspondientes dentro de los tiempos establecidos contractualmente.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Neiva, 13 de Mayo de 2026
INTER-WPG-ADM-210

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación - Supervisor Del Contrato
Gobernación Del Huila
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1585 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

ASUNTO: Remisión Garantías Actualizadas Otro Sí No.02

Reciba Cordial Saludo Señor Secretario:

De acuerdo con las obligaciones de esta interventoría, nos permitimos remitir las garantías actualizadas mediante Otro Sí No.02 de interventoría de las siguientes Pólizas:

1. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL-33-44-101244090, Anexo 12.
2. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL-33-44-101244090, Anexo 13.
3. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS - 33-40-101077107, Anexo 13.

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Copia: Arquitecto YAMID CULMA MEDINA - Apoyo Técnico Contrato De Interventoría - Gobernación Del Huila - Neiva, Huila

Bogotá, 05 de Mayo de 2026
INTER-WPG-LG-209

Ingeniero
EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO COLPITALITO 23
Pitalito, Huila.

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

Asunto: Aprobación Orden De Operación De Anticipo No.60

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, esta interventoria se permite APROBAR, la ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO NO.60, que tiene es siguiente beneficiario:

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR
901.890.667	No. De identificacion tributaria	CONCRETERA HORMIGONES DEL SUR S.A.S.	45700003669

TIPO DE CUENTA	ENTIDAD DESTINO	VALOR BRUTO
Ahorros	BANCOLOMBIA S.A	$ 50.000.000,00

Adjunto a este oficio se anexan todos los soportes correspondientes.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Neiva, 05 de Mayo de 2026
INTER-WPG-ADM-208

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación - Supervisor Del Contrato
Gobernación Del Huila
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

ASUNTO: Remisión Resumen Estado De Documentación Planimétrica Y Solicitud De Información Faltante

Reciba Cordial Saludo Señor Secretario:

De acuerdo con la reunión sostenida el día jueves 30 de abril de 2026, en la cual participaron todas las partes contractuales, incluida la Alcaldía del municipio de Pitalito, nos permitimos remitir el resumen de lo acordado respecto al estado actual de la entrega de la documentación correspondiente a la planimetría del proyecto.

En el marco de dicha reunión, se identificaron los documentos entregados y aquellos que se encuentran pendientes por remitir, necesarios para la consolidación integral del archivo técnico del proyecto.

Adicionalmente, se solicitó la aclaración respecto a dos (2) planos que no fueron incluidos en la documentación entregada, toda vez que, conforme a la licencia aprobada, el proyecto contempla un total de ochenta y cinco (85) planos, mientras que a la fecha únicamente se han remitido ochenta y tres (83). En ese sentido, se requiere precisar cuáles son los planos faltantes o si corresponden a documentos refundidos, con el fin de asegurar la integridad y consistencia de la planimetría del proyecto.

En ese sentido, de manera atenta solicitamos se gestione la remisión de la información faltante, con el fin de proceder a la actualización del archivo digital (Drive), garantizando que todas las partes cuenten con acceso completo y oportuno a la documentación.

Es importante resaltar que el contratista de obra debe contar con la planimetría completa, debidamente revisada y firmada, con el propósito de asegurar que el archivo documental se encuentre íntegro, lo cual resulta fundamental para garantizar la correcta ejecución y adecuado desarrollo del proyecto.

Lo anterior permitirá que tanto el contratista como la interventoría puedan completar, organizar y validar el archivo documental, asegurando la trazabilidad y control de la información técnica del proyecto. Entendemos que mucha de la información que está requiriendo el contratista de obra y esta interventoría a usted como contratante debe ser entregada por la Alcaldía De Pitalito, pero la solicitamos a través de ustedes ya que no tenemos competencia contractual con ellos.

Agradecemos la gestión adelantada hasta el momento y destacamos el compromiso y esfuerzo técnico que se ha venido desarrollando para el avance del proyecto, el cual reconocemos y valoramos de manera especial, seguros de que, con el apoyo de todas las partes, se continuará fortaleciendo la organización y completitud de la información.

PROYECTO	PLANIMETRIA FIRMADA	PDF	DWG	OBSERVACIONES	MEMORIAS	CARTA RESPONSABILIDAD	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES TECNICAS
ELECTRICO	Esta Completo	NO	OK	Ninguna	OK	no esta	rolando ariza	sin firmar
GAS	No Esta Firmada	OK	OK	Este proyecto no lo firma el consultor ya que no es un proyecto de el	No estan	no esta	No registra	No registra
PROYECTO VOZ Y DATOS	Esta Completo	NO	OK	Ninguna	no estan	no esta	rolando ariza	sin firmar
AGUAS NEGRAS	Esta la planimetria actualizada pero falta el rotulo de la firma	OK	NO	se debe tener en editable sin protecciones para poder trabajar. Adicionalmente debidamente firmado y sellado	en proceso pendientes otro si 2	no esta	carlos plazas	inciales en licitaicon pendientes otro si 2 por obra
AGUAS LLUVIAS	Esta la planimetria actualizada pero falta el rotulo de la firma	OK	NO	se debe tener en editable sin protecciones para poder trabajar. Adicionalmente debidamente firmado y sellado	en proceso pendientes otro si 2	no esta	carlos plazas	inciales en licitaicon pendientes otro si 2 por obra
RED CONTRA INCENDIOS	No esta rotulado ni firmado el plano original, y el actualizado aun no esta consolidado ni entregado	OK	NO	esta en proceso de diseño no ha sido entregado al contratista	esta en proceso de diseño no ha sido entregado al contratista	esta en proceso de diseño no ha sido entregado al contratista	esta en proceso de diseño no ha sido entregado al contratista	esta en proceso de diseño no ha sido entregado al contratista
ARQUITECTONICO	Esta Completo	OK	NO	Falta el editable que debe ser entregado sin protecciones	faltan memorias del ajuste	OK	arq jairo muñoz	OK
ESTRUCTURAL	Esta Completo	OK	NO	Falta el editable que debe	OK	OK	carlos plazas	otro si 1 de obrba y de resto orgiinales
TOPOGRAFIA	Esta Completo	OK	OK	OK	OK	OK	carlos plazas	OK

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Copia: Arquitecto YAMID CULMA MEDINA - Apoyo Técnico Contrato De Interventoría - Gobernación Del Huila - Neiva, Huila

Neiva, 05 de Mayo de 2026
INTER-WPG-ADM-207

Ingeniero
EDGAR MARTIN LARA
Secretario De Educación - Supervisor Del Contrato
Gobernación Del Huila
Neiva, Huila

REF: CONTRATO DE OBRA No 1506 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.

ASUNTO: Aprobación Cuenta de Anticipo #2 Correspondiente al Otrosí#1 del contrato 1506 de 2023

Reciba Cordial Saludo Señor Secretario:

En cumplimiento de las funciones de interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero y contractual, nos permitimos informar que fue revisada la solicitud presentada por el contratista CONSORCIO COLPITALITO 23, correspondiente a la Cuenta de Anticipo No. 2, en el marco del Otrosí No. 1 del contrato en referencia.

La solicitud incluye los soportes exigidos, tales como cuenta de cobro, programa de inversión del anticipo, flujo de fondos, programación de personal, maquinaria y equipos, documentos contractuales y certificaciones bancarias, entre otros. Una vez efectuado el análisis integral de la documentación aportada, se evidenció que la misma cumple con los requisitos contractuales y normativos aplicables, presenta coherencia técnica y financiera, y se encuentra ajustada a las condiciones establecidas en la modificación contractual aprobada.

En ese sentido, los documentos fueron ajustados de acuerdo con los requerimientos de la interventoría, satisfacen lo solicitado y permiten garantizar la adecuada destinación y manejo de los recursos del anticipo. En consecuencia, esta interventoría emite concepto favorable y APRUEBA la Cuenta de Anticipo No. 2, y en cumplimiento de nuestras funciones, nos permitimos remitir la presente para los fines pertinentes ante la entidad.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Consorcio Interconsultores

Copia: Arquitecto YAMID CULMA MEDINA - Apoyo Técnico Contrato De Interventoría - Gobernación Del Huila - Neiva, Huila

Gobernación del Huila	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA”**
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

ACTAS DE REUNION PERIODO 14

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SGN-C048-F24
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 3
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA			
PROCESO			
COORDINADOR			
TEMA(S) A TRATAR	Ejecución de proyecto " Construcción de la primera fase de la Institución Educativa Winnipeg sede Principal del municipio de Algeciras, Huila".		
LUGAR			
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
08/05/2026	10:00	11:00 am.	1h

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Seguimiento de las actividades y compromisos.

II. PARTICIPANTES:

- Contratista
- Interventoría.
-
-
-

III. ORDEN DEL DIA

1- Saludo
2- Revisión de compromisos
3- Estado actual del proyecto
4- proposiciones y varios
5- compromisos.
6-

IV. DESARROLLO

Posterior al saludo de los participantes se da inicio al comite. El contratista menciona que toda la información referente al contrato esta en un drive que contine actas, desenvolsos; en la Construcción se han usado 2 link uno de la gobernación y otro desde el inicio del contrato, (comunicado 265). El Contratista menciona que la próxima Semana hara entrega de los planos hidraulicos Con rotulo y sanitarios, y arquitectonicos. Se esta trabajando en el balance No.2 en el cual se incluye Parte electrica, hidrosanitaria, RCI, aguas lluvias, aguas negras, red de fluidos, gas y red de datos. Se revisarón los contidentes entre contratista e interventoria del acta N17. en el cual se incluye losa de Sala de profesores y losa entrepiso del modulo de aula de 2 pisos para lo cual la interventoria Solicita la reparación de la losa para dar Continuidad al acta. Para evitar que siga pasando lo que hasta el momento ocurre que es exposición

de acero, mal arrigonado de la estructura, filtración de agua en la placa, deterioro en la vigueta o nervio de losa, Perdida Considerable de recubrimiento de concreto, fisuras, desprendimiento del concreto al rededor del refuerzo. Para lo que la interventoría menciona que la exposición Continua del acero y la perdida de recubrimiento pueden comprometer la durabilidad y dependiendo de la profundidad del daño y del estado real de los barras, también la capacidad resistente del elemento. El contratista menciona que se tomarán medidas, Se compraran los separadores necesarios y se usaran adecuadamente en próximas fundidas. Y Se continuara realizando las reparaciones pertinentes mediante el uso de mortero de reparación realizando remoción del concreto deteriorado, limpieza del acero de refuerzo expuesto y restitución de la sección con el mortero Verticoat. Conforme a las especificaciones del fabricante y las recomendaciones del especialista. El contratista realiza entrega de los informes

mensuales de abril y mayo que estaban pendientes hasta el momento incluyendo informe tecnico con seguridad y salud en el trabajo, financiero y administrativo. En cuanto a la programación de concreto; el contratista menciona que no ha sido facil cumplir debido a la disponibilidad de equipo y suministro de material se realizará la fundición de las columnas de aulas de un piso el próximo viernes con estacionario debido a que la autobomba esta en Neiva y se proyecta la fundición de columnas de aulas de 2 pisos para el siguiente viernes 22/05/2026. El contratista se compromete a realizar la entega de la programación de concreto para el próximo martes 12 de mayo. El contratista solicito mediante oficio el uso de bloque a cara de columna, en este comite queda aprobado pero se dara respuesta mediante oficio el martes 12/05/2026.

Compromisos	Responsable	fecha cumplimiento
Entrega de planos arquitectonicos	Contratista	12/05/2026.
balance N. 2. presupto	Contratista	15/05/2026.
Reposición de la losa	Contratista	15/05/2026.
programación de concreto. Respuesta uso muro.	Contratista interventoría	12/05/2026 12/05/2026

FIRMAS ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA	CORREO	FIRMA
Jeider A. Toledo	Inspector de interventoría		
Liliana A. Cerón	Residente de interventoría.		Liliana A. Cerón
Ausecio Mauricio Tovar S.	DIRECTOR DE OBRA -		
Laura Cardillo M	Director Interventoría		

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: SGN-C048-F24
Fecha Aprobación: 1 de mayo de 2020	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 3
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA			
PROCESO			
COORDINADOR			
TEMA(S) A TRATAR	Ejecución del proyecto "Construcción de la primera fase de la Institución Educativa Winnipeg sede principal del municipio de Pitalito, Huila".		
LUGAR			
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
15/05/2026	11:00 am	12:00 am	1h.

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Seguimiento de las actividades y compromisos

II. PARTICIPANTES:

- Contratista
- Interventoría
-
-
-

III. ORDEN DEL DIA

1- Saludo
2- Revisión de compromisos
3- Estado actual del proyecto
4- proposiciones y varias
5- Compromisos.
6-

IV. DESARROLLO

Con los buenos días para todos se da inicio al comité de obra comenzando con el compromiso de la reparación de la placa de entrepiso del módulo de aulas de dos pisos lo cual esta suspendida y aunque aun no se han retirado todos los escombros falta bastante por reparar, el contratista menciona que el producto con el cual se realiza la reparación no se encuentra en Pitalito por lo tanto no es posible continuar con esta actividad solo hasta el 19 de mayo. La interventoría menciona que se debe hacer una inspección de toda la losa ya que la infiltración y los daños no son solamente estéticos. En estos momentos el atraso esta en un 9,45% para lo que la interventoría recomienda aumentar el personal y actividades y disminuir ese porcentaje ya que con un valor mayor al 10% se emite comunicado a la gobernación. La interventoría solicita al contratista

oficio con fecha actualizada y seleccionar todos los soportes necesarios tales como trazabilidad, lluvias, problemas presentados con equipo y suministro de concreto, servicios provisionales; acueducto y energía, recuperación del predio en el inicio de la obra y todo lo concerniente para la solicitud de prorroga en tiempo. Es importante solicitar el tramite de la licencia de construcción, mencionar la interventoria, ya que de no ser así se tendría que suspender la obra debido a que esta viene en el mes de Julio. El contratista menciona que en la próxima semana hara llegar los planos electricos, pendientes, ya se entregarón los planos arquitectonicos y estructurales. El contratista realizo la entrega de la programación del concreto para subsanar el compromiso pendiente, para esto sujeto al suministro y equipo de concreto por parte de la concretera. Se aprueba la mamposteria por parte de la interventoria la cual se dejara cara de columna.
