San Gil, Santander., 3 de septiembre de 2026 **CP&S-2002-INVIAS-0175-2026**

Señores
Instituto Nacional de vías Invias
Atte. Ing.(a) Leana Marcela Rueda Vesga
Director(a) Territorial Santander
Atte. Ing. Víctor Manuel Ruiz
Supervisor contrato Invias DTSAN
Floridablanca – Santander
lmruedav@invias.gov.co
vruiz@invias.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO No. 2002 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

Asunto: relación de señalización vertical instalada; señalización horizontal marcada y elementos de seguridad vial instados mediante el contrato 1802 de 2025

Respetados Ingenieros:

De acuerdo con la solicitud establecida por parte de la supervisión de la DTSAN en referencia al apoyo para realizar la verificación de las cantidades ejecutadas de los ítems de señalización horizontal y vertical llevadas a cabo mediante el contrato referido en el asunto. se expresa por parte de la AMV G2 lo siguiente a saber:

1. **LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO:** La actividad de línea de demarcación con pintura en frio revisados por parte de la AMV G2 DTSAN se implementó en los siguientes tramos a saber:

RUTA	MUNICIPIO	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD TRAMO (ML)	PR INICIAL DEMARCACIÓN	PR FINAL DEMARCACIÓN	UBICACIÓN DE LINEAS DE DEMARCACION			TOTAL
							MI	EJE	MD	
64ST02	Barichara	PR0+0000	PR3+0300	3.280	0+0000	3+0200	3280	3280	3280	9840
6402	Barichara	PR67+0760		67	67+0760	67+0827	67	67	20	154
6402	Barichara	PR58+0892		28	58+0892	58+0920	28	28	28	84
6402	Barichara	PR58+0965		18	58+0965	58+0983	18	18	0,00	36
6402	Barichara	PR59+0040		250	59+0040	59+0290	250	250	0,00	500
6402	Barichara	PR59+0795		65	59+0795	59+0855	65	60	45,00	170
6402	Barichara	PR59+0970		55	59+0970	60+0020	55	55	55	165
TOTAL				**3.763**						**10.949,00**

Para un total de diez mil novecientos cuarenta y nueve (10.949,00 ML) de línea de demarcación, de parte de la AMV G2 del contrato de la referencia no se puede establecer la calidad de las líneas ni si se cumplió con la especificación dada. (El contrato contaba con interventoría delegada por el Instituto Nacional de Vías Invias para la coordinación y ejecución de las obras. De acuerdo al formato MEPI-MN1-IN-16-FR-2 que corresponde a ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO DEFINITIVO DE OBRA en el numeral 15 se tiene una cantidad de 12075,24 ML la cual difiere a la observada por parte de la AMV G2 DTSAN del contrato de la referencia

2. **MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO**: La AMV G2 DTSAN verifico en los sitios donde se tenia que crear marcas viales, y se encontró que las marcas encontradas no registraban diferencia con las que en el sitio existían anteriormente, los sitios verificados corresponden al sector escuela la Flora del municipio de San Gil PR76+0600 y sector La Honda del municipio de Barichara PR55+0250; esta actividad deberá ser revisada y aprobada por la interventoría delegada por el Instituto Nacional de Vías Invias mediante el contrato 1844 de 2025 a cargo de la empresa IC INGENIO CIVIL S.A.S. De acuerdo con el formato MN1-IN-16-FR-2 que corresponde a ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO DEFINITIVO DE OBRA en el numeral 16 se tiene una cantidad de 520 M2 de marca vial, la cual como se expresó anteriormente no se puede cuantificar por la calidad de la misma.

3. **TACHA REFLECTIVA TIPO A BIDIRECCIONAL**: La AMV G2 DTSAN reviso esta actividad y encontró las siguientes cantidades de esta actividad realizada en la Ruta 64ST02 Guane – Cruce Ruta 6402 PR55+0100 a saber:

TACHAS REFLECTIVA TIPO A BIDIRECCIONAL						
RUTA	**MUNICIPIO**	**PR MARCA**	**PR FINAL**	**TIPO DE TACHA**	**UND**	**CANTIDAD**
64ST02	Barichara	0+0000	3+0300	BLANCA	Und	232
64ST02	Barichara	0+0000	3+0300	AMARILLAS	Und	123
				TOTAL		355

4. **SEÑALES VERTICALES** La AMV G2 DTSAN reviso el corredor vial y se verificaron las señales verticales instaladas dentro del contrato se encontró con una cantidad de diez y ocho 18 unidades completas en dimensión de 0,75 ML X 0,75ML las cuales se instalaron en los siguientes tramos a saber:

LISTADO SEÑALES VERTICALES CONTRATO 1855 DE 2025								
No	**DIRECCION TERRITORIAL**	**SECTOR**	**RUTA**	**MUNICIPIO**	**CANT**	**PR UBICACIÓN**	**COSTADO**	**TIPO SEÑAL**
1	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	55+0167	Derecho	SP
2	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	55+0251	Izquierdo	SP
3	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	58+0105	Derecho	SP
4	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	59+0025	Izquierdo	SP
5	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	60+0415	Derecho	SP
6	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	60+0622	Izquierdo	SP
7	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	64+0814	Izquierdo	SP
8	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	64+0825	Derecho	SP
9	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	69+0034	Derecho	SP
10	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	1	69+0144	Izquierdo	SP
11	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	1	74+0594	Izquierdo	SP
12	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	1	74+0704	Derecho	SP
13	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	1	76+0240	Derecho	SP
14	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	1	76+0387	Izquierdo	SP
15	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	1	76+0739	Derecho	SP
16	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	**6402**	San Gil	**1**	76+0248	Izquierdo	SP
17	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	1	76+0855	Izquierdo	SP
18	SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	1	*76+0885	Derecho	SP

De acuerdo al numeral 18 del formato MN1-IN-16-FR-2 que corresponde a ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO DEFINITIVO DE OBRA se tiene una cuantificación de 10 unidades, la AMV G2 DTSAN del contrato de la referencia no evaluó la condición técnica de las señales en cuanto a las características de reflectividad, esta condición debe ser evaluada y calificada por la interventoría delegada por el Instituto Nacional de Vías Invias mediante el contrato 1844 de 2025 a cargo de la empresa IC INGENIO CIVIL S.A.S.

5. **DEFENSA METALICA:** La AMV G2 DTSAN reviso esta actividad y encontró que fue instalada una defensa metálica en la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100 – San Gil en el PR74+0655 al PR74+0677 sobre el MD, este elemento de seguridad vial no concuerda con lo estipulado en el formato MN1-IN-16-FR-2 que corresponde a ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO DEFINITIVO DE OBRA para los numerales 19,20 y 21 ya que el elemento instalado corresponde a la anterior especificación técnica. Esta actividad deberá ser evaluada, revisada y aprobada por la interventoría delegada por el Instituto Nacional de Vías Invias mediante el contrato 1844 de 2025 a cargo de la empresa IC INGENIO CIVIL S.A.S.

DEFENSA METALICA						
RUTA	**MUNICIPIO**	**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**TIPO DE DEFENSA**	**UND**	**CANTIDAD**
6402	San Gil	74+0655	74+0677	BLANCA	ML	22
				TOTAL		22

6. **CAPTAFAROS** La AMV G2 DTSAN reviso el corredor vial y estos elementos luminosos se instalaron en conjunto con los tramos de defensa metálica en cantidad de cuatro (04). La condición de los mismos deberá ser evaluada, revisada y aprobada por la interventoría delegada por el Instituto Nacional de Vías Invias mediante el contrato 1844 de 2025 a cargo de la empresa IC INGENIO CIVIL S.A.S.

CAPTAFAROS						
RUTA	**MUNICIPIO**	**PR INICIAL**	**PR FINAL**	**TIPO**	**UND**	**CANTIDAD**
6402	San Gil	74+0655	74+0677	LAMINA GRIS	UND	4
				TOTAL		4

Sin más particulares y en espera de cumplir con lo solicitado me suscribo a usted.

Agradezco su atención, sin otro particular

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA
Ingeniero Residente AMV G2 Santander
Consorcio P&S.
C.C. Archivo

REGISTRO FOTOGRAFICO – SEÑALIZACION VERTIVAL

Foto 1 SP PR55+0167 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100 – San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 2 SP PR55+0251 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 3 SP PR58+1005 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 4 SP PR59+0025 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 5 SP PR60+0415 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.




Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 6 SP PR60+0622 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto7 SP PR64+0814 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.

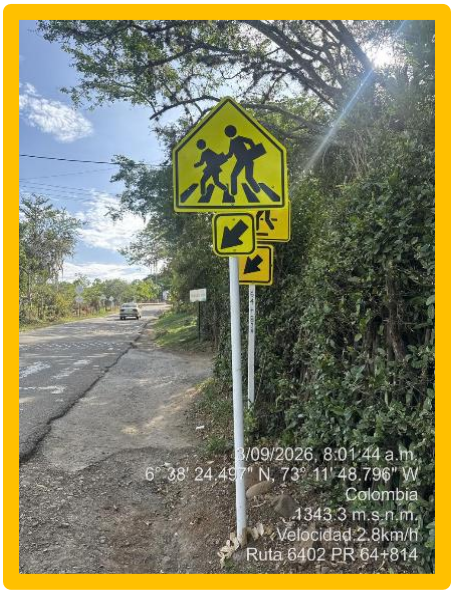

Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 8 SP PR64+0830 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 9 SP PR69+0034 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 10 SP PR69+0144 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 11 SP PR74+0594 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.




Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 12 SP PR74+0704 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 13 SP PR76+0240 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil.

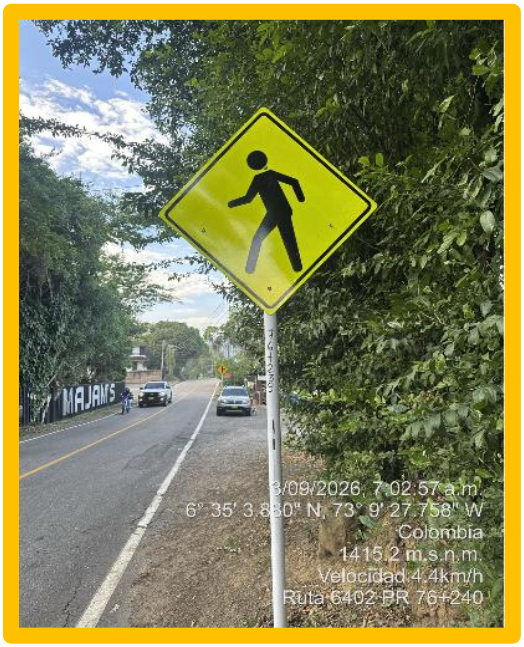

Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 14 SP PR76+0387 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 15 SP PR76+0739 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 16 SP PR76+0748 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 17 SP PR76+0855 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 18 SP PR76+0885 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100– San Gil



Registro AMV G2 DTSAN C P&S


REGISTRO FOTOGRAFICO – LINEA DE DEMARCACION EN FRIO

Foto 19 Ruta 64ST02 Guane - Cruce RUTA 6402 PR55+0100 - PR0+0000



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 20 Ruta 64ST02 Guane - Cruce RUTA 6402 PR55+0100 – PR3+0200

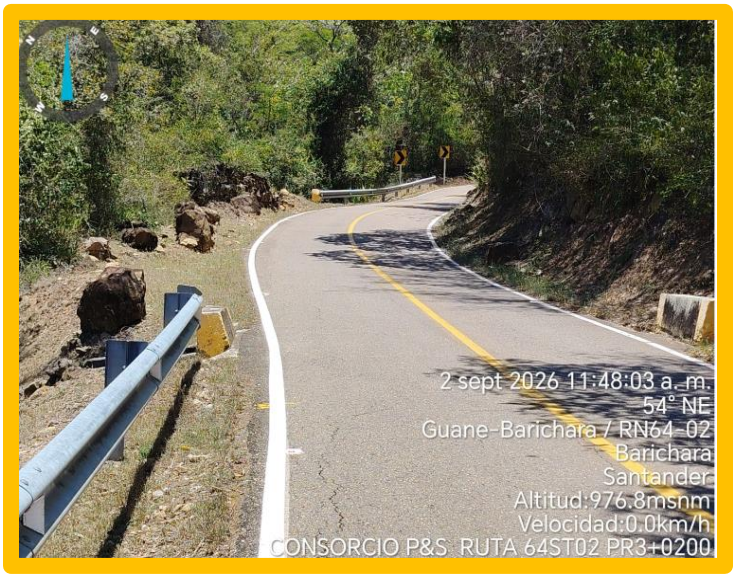

Registro AMV G2 DTSAN C P&S

REGISTRO FOTOGRAFICO – MARCAS VIALES

Foto 21 Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100 – San Gil PR55+0180



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Foto 22 Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100 – San Gil PR76+0715



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

REGISTRO FOTOGRAFICO – DEFENSA METALICA

Foto 23 Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100 – San Gil - PR74+0655



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

REGISTRO FOTOGRAFICO – CAPTAFAROS

Foto 24 Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100 – San Gil - PR74+0655



Registro AMV G2 DTSAN C P&S

Remite: ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com>

Fecha: 2026-09-03 14:20:29

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: RELACION DE INTERVENCION CONTRATO 1802 DE 2025

Adjuntos: 01

Radicado: 2026E-VUVRAZ-095473

Fecha Radicación: 2026-09-03 14:26:06

Cc: Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>

