LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	PROBINTEC S.A.S				
Supervisor	INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ				
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR.8168931				
Informe N°	11	Periodo del informe	3/08/2026	Hasta el	2/09/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría			CUMPLE	
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	
Informes semanales	SI		CUMPLE	
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		CUMPLE	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	
Directiva distrital N° 1 de 2011	SI		CUMPLE	
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	SI		CUMPLE	
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	
Bitácora	SI		CUMPLE	
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	
Actividades no previstas del proyecto	SI		CUMPLE	
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	SI		CUMPLE	
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra	SI		CUMPLE	
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del	SI		CUMPLE	
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	SI		CUMPLE	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	SI		CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	N.A.		N.A.	
Modificaciones	N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	**Aprobó**	**Revisó.**
PROBINTEC S.A.S **NIT 829.001.061-1** Interventoría	**ARQUITECTA ROCIO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** Director de Interventoría	**INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ** Apoyo a la Supervisión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 011

Periodo del informe

DEL 03 DE AGOSTO DEL 2026 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350 – LOTE 18

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 011

Periodo del informe
DEL 03 DE AGOSTO DE 2026 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Contratista de obra: CONSORCIO EDUCATIVO 25 – NIT 901.973.696-9
Bogotá D.C., septiembre de 2026

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL 5
1.1 Introducción 5
1.2 Objetivos 5
1.3 Delimitación del área de influencia directa 6
1.4 Aspectos generales del proyecto 17
1.5 Obligaciones específicas del contrato 20
1.6 Informes semanales 23
1.7 Personal aprobado 24
1.8 Verificación de licencias y permisos vigentes 26
1.9 Pólizas actualizadas con modificaciones 26
1.10 Cumplimiento del artículo 3 del Decreto 332 de 2020 – vinculación de mujeres 28
1.11 Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital 28
1.12 Incumplimientos o apremios del contrato 29
1.13 Verificación de la matriz de riesgos 29
1.14 Descripción de actividades desarrolladas en el periodo 29
1.15 Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato 32
1.16 Relación de correspondencia (entrada, salida e interna) 32
1.17 Bitácora 33
1.18 Reseña fotográfica del periodo por semana 33
1.19 Actividades no previstas del proyecto 33
1.20 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría 34
1.21 Programación y control de obra 34
2. ASPECTOS TÉCNICOS 36
2.1 Control del plan de calidad y ensayos de material 36
2.2 Estado de servicios públicos, trámites y licencias 36
2.3 Pagos parafiscales 36
2.4 Verificación de la amortización del anticipo 37
2.5 Estado financiero del contrato de obra 37
2.6 Aspectos sociales 38
2.7 Aspectos ambientales PIGA y PGRCD 38
2.8 Seguridad y salud en el trabajo 38
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38
3.1 Conclusiones 38
3.2 Recomendaciones 39
4. ANEXOS 39
5. DOCUMENTACIÓN SECOP II 40
5.1 Acta de inicio 40
5.2 Garantías 40
5.3 Designación del supervisor 40
5.4 Informes mensuales 40
5.5 Actas parciales 40
5.6 Modificaciones 40

5.7 Suspensión 40
5.8 Prórroga a la suspensión 40
5.9 Acta de terminación 40
5.10 Acta de entrega 40
5.11 Reinicio a la suspensión 40
5.12 Acta de liquidación 40
6. PROFESIONALES PARTÍCIPES DEL PROYECTO OFERTADOS 41
6.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados 41

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Introducción

El presente Informe de Interventoría No. 11 tiene como finalidad documentar, evaluar y verificar las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026, en el marco del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155350 – Lote 18, cuya ejecución, en virtud del Modificatorio No. 3 (Adición No. 3 y Prórroga No. 2), se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Este informe consolida los resultados del proceso de interventoría integral realizado durante el mes reportado, abarcando la supervisión técnica, administrativa, ambiental, financiera y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría y en el contrato de obra.

Durante este periodo se efectuó la verificación de las actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y ejecución de obras menores, contrastando lo ejecutado frente a lo programado, con el propósito de establecer el avance físico real del proyecto y detectar desviaciones o situaciones que requieran acciones correctivas. Se destaca en el periodo la ejecución final de los frentes de la Adición No. 2 (Técnico Palermo – Sede A y República de Colombia – Sede B), el avance de las emergencias en Simón Bolívar – Sede A y Sede B, Juan del Corral – Sede A y Magdalena Ortega – Sede A, y la incorporación de dos nuevos frentes de emergencia con los recursos de la Adición No. 3.

De igual manera, el informe incluye la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando la documentación soporte, las afiliaciones y las medidas preventivas aplicadas; y, en materia ambiental, la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD). Finalmente, consolida las actuaciones administrativas del periodo (comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, comunicaciones, trámite de ítems no previstos y de garantías) y proporciona a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito una visión integral, verificable y actualizada del estado del contrato.

1.2 Objetivos

- Documentar y evaluar las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026, verificando su correspondencia con las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores previstas contractualmente.
- Verificar el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades desarrolladas en el periodo reportado, conforme al contrato de interventoría integral y al contrato de obra.
- Realizar seguimiento al avance físico del proyecto, comparando lo ejecutado en el periodo frente a lo programado en el cronograma del contrato (03 de octubre de 2025 – 31 de diciembre de 2026), identificando avances, retrasos y sus causas.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos constructivos, materiales y actividades ejecutadas, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y verificaciones técnicas.
- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del SG-SST y de la gestión ambiental (PMA y PGRCD) durante el mes evaluado.

- Registrar y consolidar las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, aprobaciones y comunicaciones.
- Identificar riesgos, novedades y situaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas o la operación de las sedes educativas, proponiendo acciones de mejora.
- Generar un informe integral y verificable que permita a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito conocer el estado real del proyecto dentro del periodo señalado.

1.3 Delimitación del área de influencia directa

El área de influencia directa del proyecto corresponde a las instituciones educativas y sedes administrativas intervenidas dentro del Lote 18, ubicadas principalmente en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá D.C., y en la localidad de Teusaquillo (Colegio Técnico Palermo). A continuación, se presenta la localización de cada una de las sedes objeto de interventoría.

Frentes contractuales y de las Adiciones No. 1 y No. 2

1. Institución Educativa Distrital Colegio Rodolfo Llinás – Sede B

La Institución Educativa Distrital Colegio Rodolfo Llinás – Sede B (Bochica Compartir) se encuentra ubicada en la Calle 87 No. 102-55, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 1 – Localización IED Rodolfo Llinás – Sede B. Fuente: Google Earth

2. Institución Educativa Distrital Colegio Simón Bolívar – Sede A

La Institución Educativa Distrital Colegio Simón Bolívar – Sede A se encuentra ubicada en la Carrera 92 No. 87A-60, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 2 – Localización IED Simón Bolívar – Sede A. Fuente: Google Earth

3. Institución Educativa Distrital Colegio Magdalena Ortega – Sede A

La Institución Educativa Distrital Colegio Magdalena Ortega de Nariño – Sede A se encuentra ubicada en la Carrera 69B No. 78A-36, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.

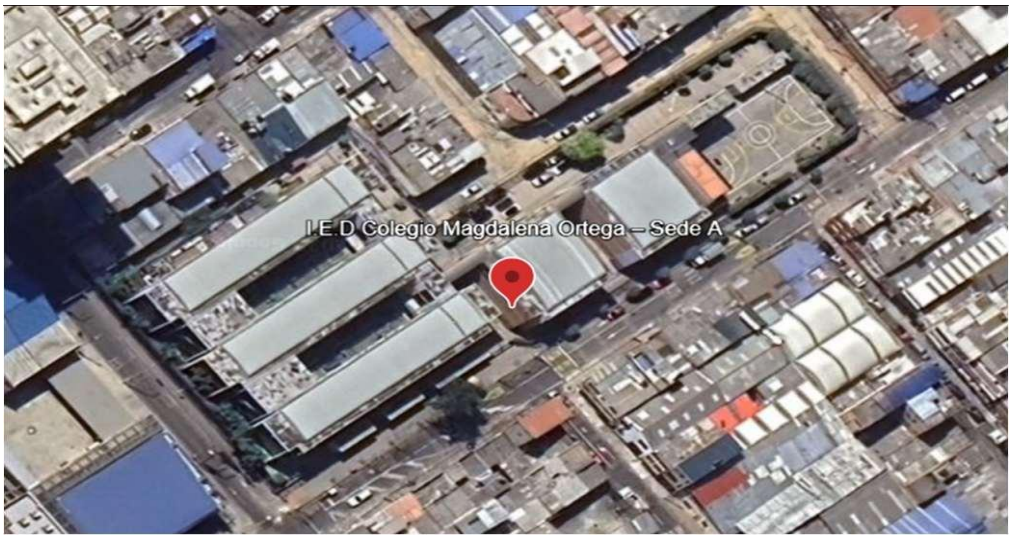


Imagen 3 – Localización IED Magdalena Ortega – Sede A. Fuente: Google Earth

4. Institución Educativa Distrital Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede B

La Institución Educativa Distrital Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede B (La Española) se encuentra ubicada en la Carrera 84 No. 83-71, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus

humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 4 – Localización IED Jorge Gaitán Cortés – Sede B. Fuente: Google Earth

5. Institución Educativa Distrital Colegio Tabora – Sede A

La Institución Educativa Distrital Colegio Tabora – Sede A se encuentra ubicada en la Carrera 77B No. 74A-02, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.

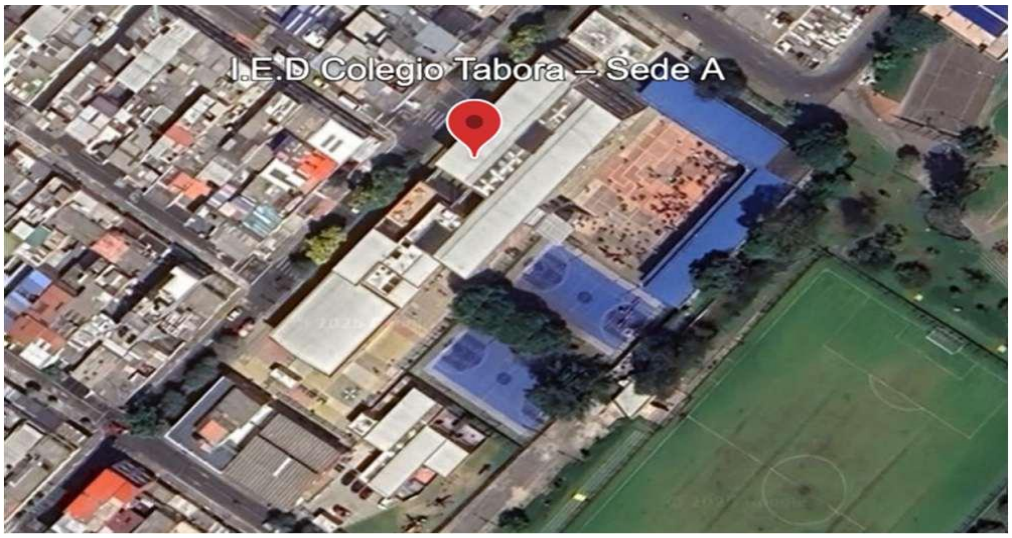


Imagen 5 – Localización IED Tabora – Sede A. Fuente: Google Earth

6. Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A

El Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A se encuentra ubicado en la Avenida Carrera 63 No. 68-82, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.

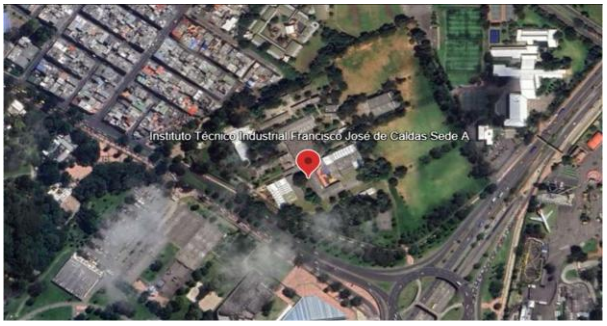


Imagen 6 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede A. Fuente: Google Earth

7. Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede C

El Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede C (Clemencia de Caicedo) se encuentra ubicado en la Calle 68A No. 68D-51, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 7 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede C. Fuente: Google Earth

8. Colegio Antonio Villavicencio – Sede B (Adición No. 1)

El Colegio Antonio Villavicencio – Sede B se encuentra ubicado en la Carrera 113C No. 63F-18, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.

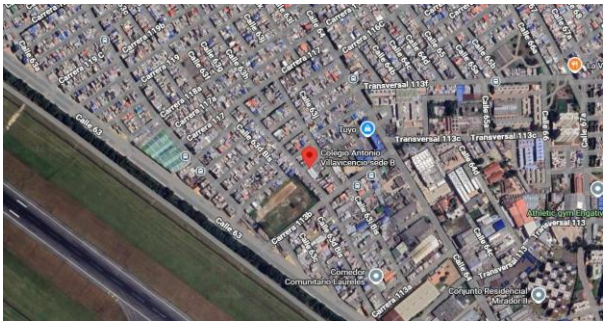


Imagen 8 – Localización Colegio Antonio Villavicencio – Sede B. Fuente: Google Maps

9. Colegio Abel Rodríguez Céspedes – Sede A (Adición No. 1)

El Colegio Abel Rodríguez Céspedes – Sede A se encuentra ubicado en la Calle 72 con Carrera 112F, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 9 – Localización Colegio Abel Rodríguez Céspedes – Sede A. Fuente: Google Maps

10. Colegio Técnico Palermo – Sede A (Adición No. 2)

El Colegio Técnico Palermo – Sede A se encuentra ubicado en la Carrera 23 No. 49-37, localidad de Teusaquillo. El sector corresponde a una zona completamente urbanizada y consolidada de Bogotá, caracterizada por la presencia de equipamientos educativos, comerciales, institucionales y de servicios, delimitada por corredores viales como la Carrera 24, la Avenida NQS (Carrera 30), la Calle 45 y la Calle 53, lo que le proporciona alta accesibilidad y conectividad con otras zonas de la ciudad.



Imagen 10 – Localización Colegio Técnico Palermo – Sede A. Fuente: Google Maps

11. Colegio República de Colombia – Sede B (Adición No. 2)

El Colegio República de Colombia – Sede B se encuentra ubicado en la Calle 69C No. 69-28, localidad de Engativá, en una zona urbana consolidada de uso predominantemente residencial, con presencia de comercio y servicios de carácter barrial. El sector presenta condiciones de accesibilidad adecuadas, cobertura de servicios públicos y cercanía a equipamientos educativos y recreativos.



Imagen 11 – Localización Colegio República de Colombia – Sede B. Fuente: Google Maps

Emergencias y/u obras prioritarias

12. Dirección Local de Educación de Engativá (DILE) – Emergencia (Obra)

La Dirección Local de Educación de Engativá se encuentra ubicada en la Carrera 78A No. 76-10, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 12 – Localización Dirección Local de Engativá. Fuente: Google Maps

13. Colegio La Palestina – Sede B – Emergencia (Silvicultural)

El Colegio La Palestina – Sede B se encuentra ubicado en la Transversal 77 No. 81B-91, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo,

Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.

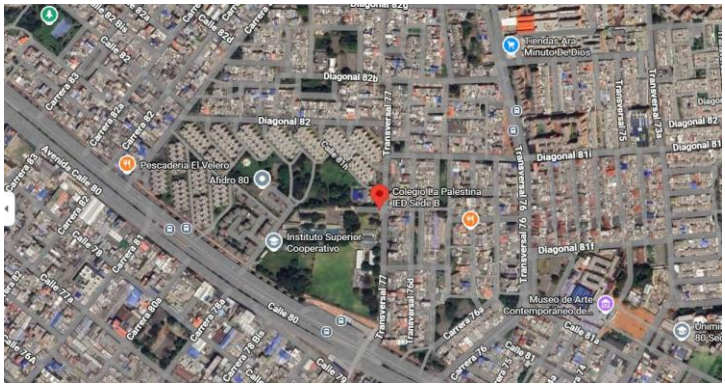


Imagen 13 – Localización Colegio La Palestina – Sede B. Fuente: Google Maps

14. ITI Francisco José de Caldas – Sede A – Emergencias (Silvicultural)

Las tres emergencias silviculturales atendidas en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A se localizan en la Avenida Carrera 63 No. 68-82, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 14 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede A. Fuente: Google Earth

15. Colegio Tabora – Sede A – Emergencias (Obra y Silvicultural)

Las emergencias de obra (rampas de acceso) y silvicultural atendidas en el Colegio Tabora – Sede A se localizan en la Carrera 77B No. 74A-02, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 15 – Localización IED Tabora – Sede A. Fuente: Google Earth

16. Colegio Miguel Antonio Caro – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio Miguel Antonio Caro – Sede A se encuentra ubicado en la Transversal 94 No. 81A-29, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 16 – Localización Colegio Miguel Antonio Caro – Sede A. Fuente: Google Maps

17. Colegio Torquigua – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio Torquigua – Sede A se encuentra ubicado en la Calle 64 No. 128-50, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 17 – Localización Colegio Torquigua – Sede A. Fuente: Google Maps

18. Colegio Luicila Rubio de Laverde – Emergencia (Obra)

El Colegio Luicila Rubio de Laverde se encuentra ubicado en la Diagonal 77B No. 129-70, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 18 – Localización Colegio Luicila Rubio de Laverde. Fuente: Google Maps

19. Colegio Juan del Corral – Sede A – Emergencias (Obra)

El Colegio Juan del Corral – Sede A se encuentra ubicado en la Carrera 69 No. 98-42, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.

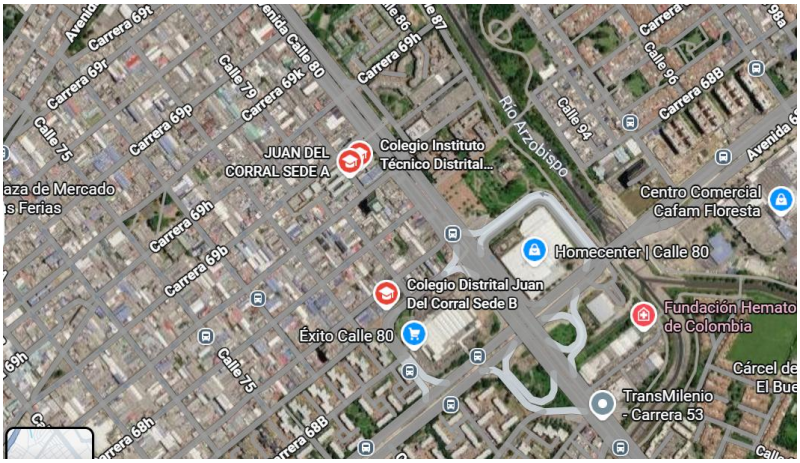


Imagen 19 – Localización Colegio Juan del Corral – Sede A. Fuente: Google Maps

20. Colegio Simón Bolívar – Sede B – Emergencia (Obra)

El Colegio Simón Bolívar – Sede B se encuentra ubicado en la Carrera 85 No. 88-99, localidad de Engativá, en un sector urbano consolidado de uso predominantemente residencial, con presencia de equipamientos educativos, comercio vecinal y servicios comunitarios, con acceso a vías principales como la Calle 88 y la Avenida Ciudad de Cali.



Imagen 20 – Localización Colegio Simón Bolívar – Sede B. Fuente: Google Maps

21. Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede A (Los Cerezos) se encuentra ubicado en la Carrera 89A No. 86-24, localidad de Engativá, en un sector urbano consolidado de uso predominantemente residencial, con presencia de equipamientos educativos, comercio vecinal y servicios comunitarios.



Imagen 21 – Localización Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede A. Fuente: Google Maps

22. Colegio San José Norte – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio San José Norte – Sede A (La Soledad Norte) se encuentra ubicado en la Carrera 84A No. 75A-08, localidad de Engativá, en una zona urbana consolidada con predominio de uso residencial, complementado por comercio de escala barrial, equipamientos educativos, parques y servicios comunitarios.

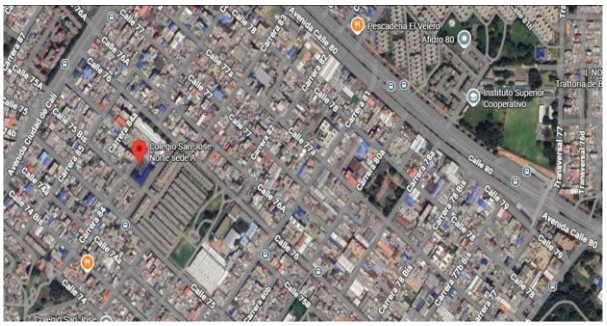


Imagen 22 – Localización Colegio San José Norte – Sede A. Fuente: Google Maps

23. Colegio Magdalena Ortega – Sede A – Emergencias (Obra)

Las emergencias de obra (cambio de policarbonato en puntos fijos y limpieza y desinfección de tanques) del Colegio Magdalena Ortega de Nariño – Sede A se localizan en la Carrera 69B No. 78A-36, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.

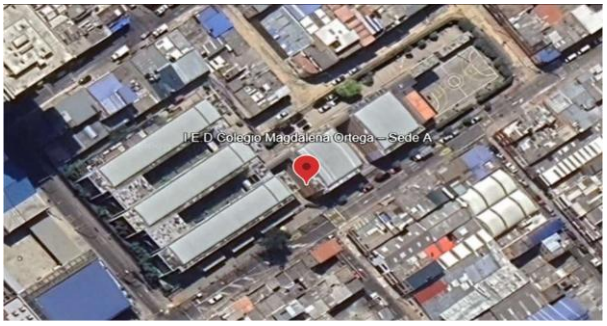


Imagen 23 – Localización IED Magdalena Ortega – Sede A. Fuente: Google Earth

24. Colegio Simón Bolívar – Sede A – Emergencia (Obra)

La emergencia de mantenimiento del cerramiento y construcción de la estructura de pérgola del Colegio Simón Bolívar – Sede A se localiza en la Carrera 92 No. 87A-60, localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Amarillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.

25. Predio Plazuela de Álamos – Colegio Ana Galvis Ortiz – Emergencia (Obra) – Modificatorio No. 3

Frente incorporado con los recursos de la Adición No. 3. Corresponde al predio denominado Plazuela de Álamos, destinado al Colegio Ana Galvis Ortiz, ubicado en el sector de Álamos de la localidad de Engativá. La intervención consiste en la instalación de un cerramiento rígido perimetral con concertina, dos puertas de acceso, baño y campamento provisional, de acuerdo con lo definido en la visita conjunta realizada con la Supervisión.

26. Colegio Néstor Forero Alcalá – Sede C – Emergencia (Obra) – Modificatorio No. 3

Frente incorporado con los recursos de la Adición No. 3. El Colegio Néstor Forero Alcalá – Sede C se encuentra ubicado en la Calle 69A No. 70-55, localidad de Engativá. La intervención consiste en la construcción de divisiones en muros livianos para la estructuración de oficinas.

1.4 Aspectos generales del proyecto

1.4.1 Información general del contrato de obra

El contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155350 tiene por objeto adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores orientadas a la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias. Su ejecución está a cargo del Consorcio Educativo 25, bajo la supervisión de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED (Director Ing. Andrés Ivanno Galeano Toro, con el apoyo a la supervisión del Ing. Hernán Darío López Páez). El valor inicial del contrato corresponde a $2.551.797.666, con fecha de inicio el 03 de octubre de 2025 y fecha inicial de terminación el 02 de mayo de 2026.

Mediante el Modificatorio No. 1 se adicionaron $645.761.648 (Adición No. 1); mediante el Modificatorio No. 2, suscrito el 30 de abril de 2026, se adicionaron $461.699.955 (Adición No. 2) y se prorrogó el plazo en cuatro (4) meses, hasta el 02 de septiembre de 2026; y mediante el Modificatorio No. 3 se adicionaron $310.000.000 destinados a la atención de emergencias (Adición No. 3) y se prorrogó el plazo en tres (3) meses y veintinueve (29) días (Prórroga No. 2). En consecuencia, a la fecha el valor total del contrato asciende a $3.969.259.269, el plazo total es de catorce (14) meses y veintinueve (29) días y la fecha de terminación vigente es el 31 de diciembre de 2026. Las garantías correspondientes al Modificatorio No. 3 se encuentra en proceso de estructuración y validación

Durante el periodo reportado no se registraron suspensiones del contrato, por lo cual las fechas de suspensión y reinicio se mantienen como no aplicables.

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
R.L. del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 18"
FECHA DE INICIO	03 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL	Siete (7) meses – terminación inicial 02/05/2026
PRÓRROGA No. 1 (Modificatorio No. 2)	Cuatro (4) meses – terminación 02/09/2026
PRÓRROGA No. 2 (Modificatorio No. 3)	Tres (3) meses y veintinueve (29) días
PLAZO TOTAL	Catorce (14) meses y veintinueve (29) días
FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE	31 de diciembre de 2026
ESTADO	En ejecución

Composición del valor del contrato de obra

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato (incluye AIU 33,17 %)	**$2.551.797.666,00**
AIU (33,17 %)	$846.431.285,81
Costo directo	$1.705.366.380,19
Valor ofertado obras contractuales	$2.322.865.467,00
Valor inicial para emergencias (incluye diferencia de $128.932.199)	$228.932.199,00
Adición No. 1 (Modificatorio No. 1)	**$645.761.648,00**
Obras contractuales	$445.761.648,00
Emergencias	$200.000.000,00
Adición No. 2 (Modificatorio No. 2)	**$461.699.955,00**
Obras contractuales	$261.699.955,00

CONCEPTO	VALOR
Emergencias	$200.000.000,00
Adición No. 3 (Modificatorio No. 3) – Emergencias	**$310.000.000,00**
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	**$3.030.327.070,00**
VALOR TOTAL PARA EMERGENCIAS	**$938.932.199,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$3.969.259.269,00**

Contrato de interventoría

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	$796.278.928,00
Valor adicional No. 01 (26 de diciembre de 2025)	$139.026.666,00
Valor adicional No. 02 (01 de mayo de 2026)	$219.541.737,00
Valor adicional No. 03	$178.451.454,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**$1.333.298.785,00**

1.4.2 Información general del contratista de obra

El contratista responsable es el Consorcio Educativo 25, identificado con NIT 901.973.696-9, conformado por Constructora Grupo ADIN (50 %) y CSS Construcción S.A.S. (50 %), vinculado mediante el contrato CO1.PCCNTR.8155350. Su representante legal es Dayanna Alejandra Baquero Aguilar, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.918.202.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
NIT	901.973.696-9
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155350
REPRESENTANTE LEGAL	Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.121.918.202
CORREO	consorcioeducativo25@gmail.com
DIRECTOR DE OBRA	Ing. Diego Armando Rey Olarte
RESIDENTE DE OBRA	Arq. Hugo Ferley López

1.4.3 Aspectos generales del contrato de interventoría

La interventoría del proyecto está a cargo de PROBINTEC S.A.S., identificada con NIT 829.001.061-1, mediante el contrato CO1.PCCNTR.8168931. La representante legal es Diana Esperanza Moreno Flórez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957. Este contrato regula la supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y de SST del lote objeto de interventoría.

Contratista	PROBINTEC S.A.S.
NIT	829.001.061-1
No. Contrato	CO1.PCCNTR.8168931
Representante Legal	Diana Esperanza Moreno Flórez
Cédula Representante Legal	1.096.244.957
Objeto del Contrato de Interventoría	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote No. 6.

1.5 Obligaciones específicas del contrato

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas del contrato de interventoría, cuyo cumplimiento se verificó durante el periodo:

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR-10 frente a los apartados que corresponden en el marco de las intervenciones locativas.
2. Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de interventoría de la SED, publicados en la página web de la entidad.
3. Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión del seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc.), atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que imparta la SED a través de la supervisión o quien esta designe.
4. Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.
5. Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
6. Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.
7. Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo la descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes asignadas, el organigrama propuesto, el plan de calidad y los indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de interventoría.

8. Pagar oportunamente los honorarios o salarios de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios que establezcan las leyes colombianas, garantizando que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL).
9. Realizar el pago del impuesto de timbre durante los diez (10) días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios por la Secretaría de Educación del Distrito, en virtud del Decreto 175 de 2025 y del artículo 519 del Estatuto Tributario.
10. Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones frente a prórrogas, adiciones, modificaciones y suspensiones, y reportar su incumplimiento.
11. Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de interventoría y de obra.
12. Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra reporte sobre las consultas a las entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable a los predios y sus posibles afectaciones.
13. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
14. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.
15. Garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.
16. Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al supervisor, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.
17. En caso de retrasos en el cronograma de actividades, solicitar al contratista un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, aprobarlo en un (1) día hábil y, si los atrasos persisten, radicar ante la SED en máximo cinco (5) días hábiles un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.
18. Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual.
19. Mantener el equipo profesional y técnico propuesto durante la ejecución del contrato, de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.
20. Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida, citando anticipadamente al contratista de obra, al supervisor y al personal de apoyo requerido.
21. Presentar al supervisor un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.

22. Efectuar las revisiones periódicas necesarias a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.
23. Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las instrucciones impartidas, solicitudes, observaciones, recomendaciones, acuerdos y determinaciones relacionadas con la ejecución de los proyectos.
24. Mantener un archivo organizado de la interventoría respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, planos, cálculos, memorias e inventarios que sirven de base para el recibo mensual de las obras, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.
25. Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles y acompañar el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.
26. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de interventoría, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.
27. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor los informes semanales, mensuales y final de interventoría, de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos, y cargarlos en SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su aprobación.
28. Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra.
29. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, emitir el concepto correspondiente y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo.
30. Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras.
31. Reportar a la SED los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al reporte del contratista, conceptuando sobre los hechos y las medidas a tomar.
32. Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra.
33. Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.
34. Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista implemente en caso de hallazgos de interés arqueológico, histórico o turístico, e informar detalladamente a la supervisión.
35. Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo.
36. Certificar que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.

37. Realizar el acompañamiento y la verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra para los predios aledaños, espacio público, vías de acceso y zonas del colegio que no se intervendrán.
38. Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto.
39. Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente las solicitudes del contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados.
40. Emitir concepto técnico y jurídico ante solicitudes de modificación, suspensión o reinicio del contrato, o sin que sea requerido cuando evidencie la necesidad, en un término no mayor a tres (3) días hábiles.
41. Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar.
42. Para la etapa de liquidación, certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados.
43. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra y elaborar las actas correspondientes.
44. Entregar los informes contables que se requieran en un término de diez (10) días calendario desde el requerimiento de la supervisión.
45. Ante modificaciones del cronograma por causas imputables al contratista, requerir un plan de contingencia detallado en tres (3) días hábiles y aprobarlo en dos (2) días hábiles.
46. Realizar, con el acompañamiento de la SED, un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, para planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesarios.

Durante el periodo, la Interventoría dio cumplimiento a las obligaciones anteriores mediante el seguimiento diario de los frentes, la elaboración de los informes semanales No. 44 a No. 48, la revisión y trámite del Acta Parcial No. 9, la revisión y aprobación de las garantías del Modificatorio No. 3, el trámite de ítems no previstos y la revisión de los informes mensuales de SST y ambiental del contratista.

1.6 Informes semanales

Los informes semanales de interventoría correspondientes al periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026 se incluyen como anexo del presente informe:

- Informe Semanal No. 044, del lunes 03 de agosto de 2026 al domingo 09 de agosto de 2026.
- Informe Semanal No. 045, del lunes 10 de agosto de 2026 al domingo 16 de agosto de 2026.
- Informe Semanal No. 046, del lunes 17 de agosto de 2026 al domingo 23 de agosto de 2026.
- Informe Semanal No. 047, del lunes 24 de agosto de 2026 al domingo 30 de agosto de 2026.
- Informe Semanal No. 048, del lunes 31 de agosto de 2026 al domingo 06 de septiembre de 2026 (incluye el cierre del periodo, 02 de septiembre de 2026).

1.7 Personal aprobado

1.7.1 Personal de interventoría: PROBINTEC S.A.S.

Durante el periodo la interventoría dio continuidad a la planta de profesionales establecida en los estudios previos. En el sitio de los trabajos se contó con el personal requerido y con el grupo de especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría al cierre del periodo:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Directora de Interventoría
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2
5	Diego Fernando Olarte Ortiz	Especialista Estructural
6	Christian Felipe Rodríguez Beltrán	Especialista Ambiental
7	Germán Adolfo Nivia Quintero	Especialista Redes Eléctricas
8	Robinson Villamil Rojas	Especialista Redes Hidrosanitarias
9	Katerin Carolina Núñez Osorio	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo
10	Christian Fabián Barrera Doncel	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra
11	Silvia Juliana Betancur Rodríguez	Asesora Jurídica
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector de Interventoría 2
14	Diosmery García Muñoz	Inspector de Interventoría 4
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo de Interventoría

1.7.2 Personal del contratista: Consorcio Educativo 25

De acuerdo con el Informe Mensual No. 11 del contratista, el personal dispuesto para la ejecución de las actividades del periodo es el siguiente:

No.	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	1032357215	Diego Armando Rey Olarte	Director de Obra
2	1049630740	Hugo Ferley López	Residente de Obra
3	1109384715	María Victoria Lozano	Profesional SST
4	1019052718	Viviana Luengas Amaya	Técnico SST 1
5	1121898446	Luisa Fernanda Parrado Londoño	Técnico SST 2
6	1031177244	Brayan Leonardo Moreno	Inspector de Obra 1
7	1049657250	Edison Zamir Sotelo Sepúlveda	Inspector de Obra 2

No.	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
8	1121918202	Dayanna Alejandra Baquero Aguilar	Profesional de Costos y Presupuestos
9	79510176	Mauricio Bermúdez Romero	Oficial Eléctrico
10	1014662676	Anderson Fabián Rodríguez Mejía	Eléctrico
11	PPT 5733294	Erick Xavier Flores González	Eléctrico
12	80270364	José Alfredo Garzón Osaza	Eléctrico
13	1094285458	Merlis Barrios García	Ing. Residente (eléctrico)
14	1013019980	Yojan Camilo Malambo	Ayudante
15	1019037328	Jhon Alexey Hernández	Oficial
16	13375363	Jorge González Solano	Maestro
17	1023893655	Wilson Alexander Mesa Ladino	Operario
18	79904525	Willington Niño Melo	Contratista
19	7571563	Hidalgo David Montero Gutiérrez	Aserrador
20	5124771	José Francisco Ortiz Llerena	Aserrador
21	1065828798	Osnaider Madera Cadena	Aserrador
22	1068136608	Tomás Jasler Caraballo Padilla	Instalador
23	80101901	Juan Gabriel Rojas Nieto	Instalador
24	119358891	Álvaro Alfonso Iriarte Borja	Instalador
25	1104413170	Ricardo Emiro Benítez Morelo	Instalador
26	5183103	Jhoan Manuel Méndez Méndez	Instalador
27	1026605930	Wilmer José Rivera David	Instalador
28	1083052683	Juan Jonys Mazenett David	Instalador
29	3135067	José Simeón Charry Sáenz	Aserrador
30	12436951	Jaider Rafael Rodríguez Villazón	Aserrador
31	1083463321	José Nerandy Olivera Saldaña	Instalador de Divisiones
32	1083559315	Luis Sneider Olivera Saldaña	Instalador de Divisiones
33	1134330353	Beiker David Castañeda Zabaleta	Instalador de Divisiones

1.7.3 Novedades de personal

- **Personal del contratista:** los ingresos y retiros del personal de obra durante el periodo se encuentran relacionados y soportados en el Informe Mensual SST No. 11 del contratista, aprobado por la

Interventoría mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-889, así como en las planillas de seguridad social aprobadas para el Acta No. 9 (oficio PROBINTEC-LOTE6-896).

1.8 Verificación de licencias y permisos vigentes

Con base en el alcance del contrato, se precisa que no se requiere licencia de construcción en ninguna de sus modalidades, debido a que las actividades ejecutadas corresponden exclusivamente a obras de adecuación, mantenimiento y obras menores. Para las intervenciones silviculturales, la Supervisión emite la ficha de atención correspondiente previa a su ejecución.

1.9 Pólizas actualizadas con modificaciones

A continuación, se presenta el historial de los amparos exigidos por la entidad contratante, cumpliendo las garantías según lo exigido en el contrato de obra. Todas las garantías son expedidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A.

Pólizas iniciales del contrato de obra

PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CV-100054114 Anexo 2	Cumplimiento	08/09/2025	10/12/2026	$510.359.536,00
CV-100054114 Anexo 2	Pago de salarios y prestaciones sociales	08/09/2025	10/04/2029	$255.179.768,00
CV-100054114 Anexo 2	Estabilidad de la obra	10/04/2026	10/04/2028	$510.359.536,00
CV-100015150 Anexo 0	Responsabilidad civil extracontractual (predios, labores y operaciones; patronal; contratistas y subcontratistas; vehículos propios y no propios)	08/09/2025	10/04/2026	$427.050.000,00
CV-100000111 Anexo 1	Todo riesgo construcción (daños materiales, terremoto, eventos naturales, AMIT-HMACC, mantenimiento)	08/09/2025	30/04/2026	$2.551.797.666,00

Pólizas según acta de inicio

PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CV-100054114 Anexo 4	Cumplimiento	03/10/2025	03/01/2027	$510.359.536,00
CV-100054114 Anexo 4	Pago de salarios y prestaciones sociales	03/10/2025	02/05/2029	$255.179.768,00
CV-100054114 Anexo 4	Estabilidad de la obra	02/05/2026	02/05/2029	$510.359.536,00
CV-100015150 Anexo 1	Responsabilidad civil extracontractual	08/09/2025	02/05/2026	$427.050.000,00
CV-100000111 Anexo 4	Todo riesgo construcción	03/10/2025	03/07/2026	$2.551.797.666,00

Pólizas según Modificatorio No. 1 (Adición No. 1)

PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CV-100054114 Anexo 5	Cumplimiento	03/10/2025	03/01/2027	$639.511.862,80
CV-100054114 Anexo 5	Pago de salarios y prestaciones sociales	03/10/2025	02/05/2029	$319.755.931,40
CV-100054114 Anexo 5	Estabilidad de la obra	02/05/2026	02/05/2029	$639.511.862,80
CV-100015150 Anexo 2	Responsabilidad civil extracontractual	08/09/2025	02/05/2026	$427.050.000,00
CV-100000111 Anexo 5	Todo riesgo construcción	03/10/2025	03/07/2026	$3.197.559.314,00

Pólizas según Modificatorio No. 2 (Adición No. 2 y Prórroga No. 1)

PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CV-100054114 Anexo 6	Cumplimiento	27/04/2026	03/05/2027	$731.851.853,80
CV-100054114 Anexo 6	Pago de salarios y prestaciones sociales	27/04/2026	02/09/2029	$365.925.926,90
CV-100054114 Anexo 6	Estabilidad de la obra	Tres (3) años a partir del vencimiento del plazo de ejecución		$731.851.853,80
CV-100015150 Anexo 4	Responsabilidad civil extracontractual	08/09/2025	03/09/2026	$525.271.500,00

Pólizas según Modificatorio No. 3 (Adición No. 3 y Prórroga No. 2) (En revisión y estructuración)

PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CV-100054114 Anexo 9	Cumplimiento	31/08/2026	02/09/2027	$793.851.853,80
CV-100054114 Anexo 9	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/08/2026	02/01/2030	$396.925.926,90
CV-100054114 Anexo 9	Estabilidad y calidad de las obras	02/01/2027	02/01/2030	$793.851.853,80
CV-100015150	Responsabilidad civil extracontractual	08/09/2025	02/01/2027	$700.362.000,00
CV-100000111 Anexo 18	Todo riesgo construcción (periodo de construcción 03/10/2025 – 02/01/2027; mantenimiento hasta 05/03/2027)	03/10/2025	05/03/2027	$3.969.259.269,00

En relación con el contrato de interventoría, a continuación se presenta el historial de las garantías expedidas por la Aseguradora Solidaria de Colombia (póliza No. 400-47-994000110040):

Pólizas del contrato de interventoría

PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Anexo 0 (inicial)	Cumplimiento	03/09/2025	03/12/2026	$159.255.785,60
Anexo 0 (inicial)	Pago de salarios y prestaciones sociales	03/09/2025	03/04/2029	$79.627.892,80
Anexo 0 (inicial)	Calidad del servicio	03/04/2026	03/04/2031	$159.255.785,60
Anexo 1 (acta de inicio)	Cumplimiento	19/09/2025	03/01/2027	$159.255.785,60
Anexo 1 (acta de inicio)	Pago de salarios y prestaciones sociales	19/09/2025	03/05/2029	$79.627.892,80
Anexo 1 (acta de inicio)	Calidad del servicio	03/05/2026	03/05/2031	$159.255.785,60
Anexo 2 (Adicional No. 001)	Cumplimiento	03/10/2025	18/01/2027	$187.061.118,80
Anexo 2 (Adicional No. 001)	Pago de salarios y prestaciones sociales	03/10/2025	18/07/2029	$93.530.559,40
Anexo 2 (Adicional No. 001)	Calidad del servicio	03/05/2026	18/05/2031	$187.061.118,80

Las garantías del contrato de obra se encuentran vigentes y cubren el valor y el plazo del contrato modificado. La información se incluye como anexo del presente informe.

1.10 Cumplimiento del artículo 3 del Decreto 332 de 2020 – vinculación de mujeres

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, que establece los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales, se verifica que el contratista mantiene la participación femenina en su planta de personal (dirección de costos y presupuestos, profesional y técnicas SST, entre otros cargos). La interventoría realiza el seguimiento correspondiente con el fin de verificar el mantenimiento de los porcentajes establecidos durante la ejecución del contrato. Se anexa cuadro con la relación del personal.

1.11 Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital

En el marco de la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital y la promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, el contratista adelanta las gestiones necesarias para favorecer la inclusión de esta población, y la interventoría realiza el seguimiento correspondiente. Para el periodo no se reportan labores ejecutadas por personas de esta población.

1.12 Incumplimientos o apremios del contrato

Durante el periodo no se presentaron hechos que dieran lugar a incumplimientos, apremios o al inicio de procedimientos administrativos sancionatorios contra el contratista de obra.

1.13 Verificación de la matriz de riesgos

Se verifica que la matriz de riesgos del contrato se encuentra debidamente elaborada y actualizada, identificando los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, sus controles, evaluación, medidas de mitigación, responsables y mecanismos de seguimiento. Con ocasión del Modificatorio No. 3 se revisaron los riesgos asociados a los nuevos frentes de emergencia, en particular el riesgo de ocupación informal del predio Plazuela de Álamos, cuyo tratamiento es la coordinación con la Supervisión para el ingreso al predio una vez se realice su desocupación.

1.14 Descripción de actividades desarrolladas en el periodo

A continuación, se describen por frente las actividades verificadas por la Interventoría durante el periodo, con base en los recorridos de obra y en los informes semanales No. 44 a No. 48.

Frentes contractuales y Adición No. 1

- **Colegio Rodolfo Llinás – Sede B:** frente terminado y entregado formalmente el 30 de abril de 2026. Sin actividades en el periodo.
- **Colegio Simón Bolívar – Sede A (contractual):** frente de obra terminado y entregado; se ejecutaron actividades de adecuación y mantenimiento de aulas, laboratorio y aula de informática, cambio de cubierta, suministro e instalación de aula modular y cárcamo. Sin actividades contractuales en el periodo.
- **Colegio Magdalena Ortega – Sede A:** frente contractual entregado formalmente el 04 de mayo de 2026.
- **Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede B:** frente terminado y entregado (desmonte y construcción de canchas, pintura y demarcación, pintura de fachadas, cuarto de basuras y espacio para guardas).
- **Colegio Tabora – Sede A:** frente contractual entregado formalmente el 20 de abril de 2026.
- **ITI Francisco José de Caldas – Sede A y Sede C:** frentes entregados; la Sede C fue entregada el 26 de mayo de 2026 (estructura metálica independiente para la cubierta de aulas modulares, muros aligerados, pintura de salones y del archivo).
- **Colegio Antonio Villavicencio – Sede B:** obras ejecutadas y entregadas mediante acta de reunión al almacenista, sin novedades.

- **Colegio Abel Rodríguez Céspedes – Sede A:** el contratista realizó la reposición por garantía de la bomba del sistema de presión, quedando el equipo nuevo instalado en sitio. En la visita de verificación de la semana 47, con el especialista hidráulico, se efectuaron las pruebas de funcionamiento y se solicitó corregir el empalme de la tubería eléctrica e instalar un flotador eléctrico adicional en uno de los tanques, con el fin de generar la alerta de rebose en cualquiera de los dos tanques. La Supervisión programó la instalación de soportes para la tubería de agua potable, el vaciado y limpieza de tanques y la capacitación en la operación del equipo de presión para el 11 y 12 de septiembre de 2026.

Frentes Adición No. 2

Colegio Técnico Palermo – Sede A

- **Actividades técnicas:** durante la semana 44 se ejecutaron remates, acabados, limpieza de elementos en superboard y mampostería y aseo fino para la entrega de la sede; en la semana 45 se instaló la puerta de 0,91 x 2,75 m del salón del primer piso y se retiraron salidas eléctricas; en la semana 46 se subsanaron las observaciones de entrega relacionadas con la instalación de guardaescoba y los remates de pintura y estuco del salón del primer piso. El frente quedó terminado y entregado, con un avance acumulado del 100 %.
- **SST:** se verificó el uso de EPP y las condiciones de orden y aseo durante las actividades finales; en las semanas posteriores a la entrega no se registró personal en el frente.
- **Ambiental:** se recomendó retirar los materiales acopiados al terminar las actividades y mantener las jornadas de orden y aseo conforme al PMA; el frente quedó libre de residuos.

Colegio República de Colombia – Sede B

- **Actividades técnicas:** en la semana 44 se terminó la fundida de la viga inferior del muro, dados y columnas, con aplicación de adhesivo epóxico para concreto; en la semana 45 se inició el levantamiento del muro perimetral en mampostería a la vista, con aislamiento en poliestireno expandido; en las semanas 46 y 47 se continuó el muro con refuerzo horizontal en grafil cada seis hiladas, el armado de canastillas (flejes cada 10 cm) para la viga de amarre, el relleno perimetral y la limpieza; en la semana 48 se terminó el muro, se armó y fundió la viga de amarre superior y las cintas perimetrales y se reinstaló el adoquín sobre arena de peña en la franja adyacente al muro.
- **Programación:** al cierre del periodo quedaron por ejecutar el tratamiento de fachada en ladrillo a la vista (reemboquillado, lavado e hidrófugo), los anclajes de varilla de 1/4" y el aseo general final, que se ejecutan dentro del plazo vigente del contrato. El frente registra un avance acumulado del 97,72 %.
- **SST:** en la semana 45 se identificó un andamio sin plataforma de trabajo adecuada (trabajadores apoyados sobre una tabla); la Interventoría ordenó suspender esta práctica y ajustar el sistema de acceso, lo cual fue atendido por el contratista. Se reiteró el uso permanente de EPP y las jornadas de orden y aseo.
- **Ambiental:** se evidenciaron residuos de excavación y RCD en volumen medio a bajo y deterioro del cerramiento en la semana 46; se requirió su disposición con gestores autorizados y el mantenimiento del cerramiento, conforme al PMA.

Emergencias y/u obras prioritarias

- **Dirección Local de Educación de Engativá (DILE):** avance del 72,45 %. El contratista se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la SED del ítem no previsto requerido para finalizar las actividades pendientes (mantenimiento de puertas de ingreso y baños).
- **Proyectos silviculturales (La Palestina – Sede B; ITI Francisco José de Caldas – Sede A, tres fichas; Tabora – Sede A):** actividades finalizadas sin novedad. En la semana 45 se ejecutó la poda de ramas del árbol del patio central del Colegio Tabora – Sede A y el acopio del material residual. El contratista debe remitir el informe de ejecución de actividades silviculturales para la autorización del pago, el cual es verificado por el especialista ambiental de la Interventoría.
- **Colegio Tabora – Sede A (obra):** rampas de acceso entre la zona verde y las aulas de primera infancia y columnetas de soporte para las puertas de acceso, terminadas (100 %).
- **Colegio Miguel Antonio Caro – Sede A:** desmonte de puertas existentes y suministro e instalación de puertas nuevas en salones, terminado (100 %).
- **Colegio Torquigua – Sede A:** primera etapa (cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) entregada el 14 de mayo de 2026; segunda etapa (intervención eléctrica del cuarto de neveras de la cocina) entregada a la institución sin novedades; tercera etapa (puerta con pintura electrostática y divisiones de baño en acero inoxidable) terminada (100 %).
- **Colegio Luicila Rubio de Laverde:** suministro e instalación de baños portátiles como medida de contingencia; emergencia atendida (100 %).
- **Colegio Juan del Corral – Sede A (Obra No. 1 – baños):** avance de 70 % a 95 % en el periodo. Se atendieron las correcciones solicitadas por la Interventoría: cambio de enchape en baños de hombres y mujeres del polideportivo (formato 19,8 x 19,8) y de la planta 3, instalación de win metálico en esquinas, reposición de piezas fracturadas, instalación de puertas y divisiones en tercer piso y polideportivo. La Supervisión solicitó el ajuste de las puertas de ingreso a los baños del polideportivo y se verificó una filtración en una batería sanitaria, cuya corrección hace parte de los remates finales.
- **Colegio Juan del Corral – Sede A (Obra No. 2 – red contra incendio):** sin avance físico (0 %). El contratista debe remitir el esquema de intervención requerido para el ajuste de la tubería de la RCI; el NP asociado se encuentra en trámite.
- **Colegio Simón Bolívar – Sede B:** avance de 0 % a 95 % en el periodo. Con el esquema de intervención aprobado por la Interventoría (semana 44), se realizó el armado y fundida de columnetas de confinamiento en la sala de sistemas, juntas de dilatación flexibles con poliestireno expandido entre viga y mampostería (tratamiento de fisuras escalonadas), reemboquillado y lavado con hidrófugo de la mampostería a la vista en el aula 10.
- **Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede A:** se identificó que el caudal actual no es suficiente para el funcionamiento del sistema y se aprobó la propuesta de ampliación de la red de desagüe; no obstante, la Supervisión solicitó aplazar la intervención por aspectos presupuestales hasta contar con la respectiva autorización (0 %).
- **Colegio San José Norte – Sede A:** el 21 de agosto de 2026 se realizó reunión con los especialistas eléctricos, en la que se definió la intervención de las redes eléctricas en zonas de circulación y áreas externas, así como en el tablero principal. El contratista adelanta las subsanaciones del NP asociado a la tubería metálica IMC conduit galvanizada para su revisión y aprobación (0 %).

- **Colegio Magdalena Ortega – Sede A:** avance de 50 % a 100 % en el periodo. Se aprobó y ejecutó el desmonte de las láminas deterioradas del punto fijo de la cubierta y su reemplazo por policarbonato translúcido, con personal anclado a línea de vida; adicionalmente, por solicitud de la Supervisión, se efectuó la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento. Actividades terminadas sin novedad.
- **Colegio Simón Bolívar – Sede A (emergencia):** avance de 62 % a 94 % en el periodo. Se ejecutó la estructura metálica de la pérgola, la placa de contrapiso con piso en tablón de gres 30 x 30 y franja en granito, el montaje y sellado de láminas de policarbonato de 5 mm, el mantenimiento del cerramiento perimetral (sustitución de malla eslabonada, soportes metálicos de refuerzo y anticorrosivo), la cañuela perimetral en concreto, tapa de caja de inspección, rectificación de la rejilla del cárcamo, pintura del aula de contingencia y mantenimiento de bancas. La Interventoría solicitó rematar la estructura de la pérgola y nivelar la caja ubicada en la placa frente al aula modular para eliminar el riesgo de tropiezo; el contratista programó su corrección.
- **Plazuela de Álamos – Colegio Ana Galvis Ortiz (Modificatorio No. 3):** se realizó visita conjunta con la Supervisión y el contratista en la que se definieron la ubicación y condiciones del cerramiento rígido con concertina y dos puertas, baño y campamento. El predio presenta ocupación informal; la Supervisión notificará la fecha de desocupación para el ingreso de materiales e inicio de la instalación (0 %).
- **Colegio Néstor Forero Alcalá – Sede C (Modificatorio No. 3):** se realizó visita de verificación conjunta con la coordinación de la sede y se levantó el acta de vecindad; el ingreso del contratista quedó programado para el 07 de septiembre de 2026 (0 %).

Adicionalmente, durante el periodo se realizaron mesas de trabajo con el apoyo a la supervisión con el fin de unificar criterios entre las partes y radicar los paquetes finales ante el área de estudios previos de la SED.

1.15 Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités de obra, cuyas actas se anexan al presente informe:

- Acta de comité de obra No. 21: 14/08/2026.
- Acta de comité de obra No. 22: 25/08/2026.

1.16 Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)

Como soporte documental del periodo se relacionan las principales comunicaciones emitidas por la Interventoría para el Lote 18. Las imágenes de la correspondencia se anexan al presente informe.

OFICIO	FECHA	ASUNTO
PROBINTEC-LOTE6-807	06/08/2026	Solicitud informe mensual ambiental No. 10 – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-812	10/08/2026	Aprobación informe mensual ambiental No. 10 – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-813	11/08/2026	Aprobación Informe Mensual SST No. 10 – V1 – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-815	11/08/2026	Radicación Informe Mensual SST No. 10 – V1 – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-823	12/08/2026	Aprobación planillas de seguridad social – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-827	12/08/2026	Radicación informe mensual ambiental No. 10 – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-830	19/08/2026	Remisión aprobación ítems no previstos NP 04 al 10 – Lote 18

OFICIO	FECHA	ASUNTO
PROBINTEC-LOTE6-843	29/08/2026	Radicación ítems no previstos NP 11, 12 y 17 al 21 – Lote 18

Con posterioridad al cierre del periodo y como parte de su trámite, se emitieron los oficios PROBINTEC-LOTE6-863 (solicitud informe ambiental No. 11), 880 (remisión y aprobación de pólizas del Modificatorio No. 3), 882 (observaciones NP 22 al 29), 888 (aprobación informe ambiental No. 11), 889 y 891 (aprobación y radicación del Informe SST No. 11) y 896 (aprobación de planillas de seguridad social del Acta No. 9).

1.17 Bitácora

La interventoría efectuó el control a la bitácora de obra de los frentes, en la que se registran diariamente el personal en obra y las actividades ejecutadas. Se anexa copia de la bitácora del periodo de los frentes:

- Colegio República de Colombia – Sede B.
- Colegio Simón Bolívar – Sede B.

1.18 Reseña fotográfica del periodo por semana

El registro fotográfico evidencia las condiciones observadas durante las visitas técnicas y los avances de las actividades ejecutadas en cada frente. Las imágenes documentan de manera objetiva el estado de los frentes de trabajo y facilitan el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los alcances. El registro se incluye en los informes semanales No. 44 a No. 48, anexos al presente informe.

1.19 Actividades no previstas del proyecto

Además de los ítems no previstos NP-001-2026 (guardaescoba en granito pulido biselado 33 x 7,3 cm), NP-002-2026 (sanitario institucional de tanque con sistema ahorrador de 4,8 L por descarga) y NP-003-2026 (rejilla peatonal en ángulos de acero de 5 mm para cárcamo de 60 cm) reportados en informes anteriores, durante el periodo se adelantó el siguiente trámite:

- Remisión a la SED de la aprobación de los ítems no previstos NP-04 al NP-10 (oficio PROBINTEC-LOTE6-830 del 19/08/2026).
- Radicación ante la SED de los ítems no previstos NP-11, NP-12 y NP-17 al NP-21 (oficio PROBINTEC-LOTE6-843 del 29/08/2026).
- Trámite de los NP asociados a la DILE, a la red contra incendio de Juan del Corral – Sede A y a la tubería IMC de San José Norte – Sede A, cuya ejecución se programa una vez se cuente con la aprobación de la SED.

Ponderación de elementos de calidad

Dentro del proceso constructivo se verifica cada una de las actividades y se seleccionan materiales que cumplen técnicamente y se ajustan a cada espacio. En el periodo se destacan los siguientes elementos de calidad:

- **Policarbonato translúcido (cubiertas y pérgolas):** resistencia a la intemperie y a los rayos UV, alta transmisión de luz y bajo peso. Utilizado en el Colegio Magdalena

Ortega – Sede A (reemplazo de láminas en el punto fijo de la cubierta) y en el Colegio Simón Bolívar – Sede A (cubierta de la pérgola, lámina de 5 mm).

- **Mampostería en ladrillo a la vista con tratamiento hidrófugo:** protección contra la humedad y durabilidad de las fachadas. Utilizada en el Colegio República de Colombia – Sede B (muro perimetral en ladrillo a la vista con hidrófugo en fachada) y en el Colegio Simón Bolívar – Sede B (reemboquillado, juntas de dilatación y lavado con hidrófugo en el aula 10).
- **Columnas en concreto acabado a la vista 3000 psi, incluye formaleta metálica para acabado a la vista (ítem 2.3.13):** resistencia estructural garantizada con concreto de 3.000 psi y acabado final sin necesidad de pañete ni pintura, gracias a la formaleta metálica. Utilizadas en el Colegio República de Colombia – Sede B (columnas del muro perimetral), con 2,73 m³ reconocidos en el Acta Parcial No. 9.
- **Divisiones sanitarias en acero inoxidable:** higiene, resistencia a la corrosión y bajo mantenimiento. Utilizadas en el Colegio Torquigua – Sede A (divisiones del baño, tercera etapa) y en el Colegio Juan del Corral – Sede A (divisiones de los baños del tercer piso y del polideportivo).

1.20 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría

Durante el periodo no se presentaron dificultades técnicas, administrativas ni contractuales que afectaran el normal desarrollo del contrato de interventoría. Las situaciones que condicionan el inicio de algunos frentes de emergencia (ocupación informal del predio Plazuela de Álamos, aprobación de NP por la SED y aplazamiento presupuestal de Jorge Gaitán Cortés – Sede A) son objeto de seguimiento conjunto con la Supervisión.

1.21 Programación y control de obra

De acuerdo con el seguimiento a la programación y control de obra, se realizó el monitoreo permanente del avance físico, emitiendo las alertas correspondientes ante posibles desviaciones. A continuación se presentan los avances programados y ejecutados, tomando como acumulado anterior el reportado en el Informe No. 10 y como acumulado actual el del informe semanal No. 48.

Frentes contractuales y Adiciones No. 1 y No. 2

Las obras contractuales del alcance inicial y de la Adición No. 1 se mantienen con un avance físico acumulado del 100 %. En cuanto a la Adición No. 2:

- Técnico Palermo – Sede A: alcanzó el 100 % ejecutado frente al 100 % programado, con un avance ejecutado de 17,67 % en el periodo; frente terminado.
- República de Colombia – Sede B: registra 97,72 % ejecutado frente a 100 % programado (diferencia de -2,28 %), con un avance ejecutado de 43,40 % en el periodo. El saldo corresponde a las actividades de acabado de fachada y aseo final, que se ejecutan dentro del plazo vigente.
- El total promedio de los frentes contractuales y de las Adiciones No. 1 y No. 2 alcanza el 99,79 % ejecutado frente al 100 % programado (diferencia de -0,21 %).

CPF	COLEGIO	PROG. ACUM. INF. 10	EJEC. ACUM. INF. 10	PROG. DEL MES	EJEC. DEL MES	PROG. ACUM. ACTUAL	EJEC. ACUM. ACTUAL
FRENTES CONTRACTUALES							
1078	Rodolfo Llinás – Sede B	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1052	Simón Bolívar – Sede A	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1066	Magdalena Ortega – Sede A	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1019	Jorge Gaitán Cortés – Sede B	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1001	Tabora – Sede A	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1061	ITI Francisco José de Caldas – Sede A	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1008	ITI Francisco José de Caldas – Sede C	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
FRENTES ADICIÓN No. 1							
1021	Antonio Villavicencio – Sede B	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1079	Abel Rodríguez Céspedes – Sede A	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
FRENTES ADICIÓN No. 2							
1301	Técnico Palermo – Sede A	64,29%	82,33%	35,71%	17,67%	100,00%	100,00%
1032	República de Colombia – Sede B	31,39%	54,32%	68,61%	43,40%	100,00%	97,72%
	Total promedio Adición No. 2	**47,84%**	**68,33%**	**52,16%**	**30,53%**	**100,00%**	**98,86%**
	TOTAL PROMEDIO CONTRACTUALES Y ADICIONES No. 1 – 2	**90,52%**	**94,24%**	**9,48%**	**5,55%**	**100,00%**	**99,79%**

Emergencias y/u obras prioritarias

Al cierre del periodo las emergencias registran un avance promedio del 69,80 %, igual al programado, con un valor asignado de $796.736.040,11 frente a un valor disponible para emergencias de $938.932.199,00 (incluida la Adición No. 3), quedando un saldo por asignar de $142.196.158,89. En el periodo se destacan los avances de Magdalena Ortega – Sede A (de 50 % a 100 %), Simón Bolívar – Sede B (de 0 % a 95 %), Juan del Corral – Sede A Obra No. 1 (de 70 % a 95 %) y Simón Bolívar – Sede A (de 62 % a 94 %). Permanecen pendientes de inicio Juan del Corral – Sede A Obra No. 2 y San José Norte – Sede A (sujetos a aprobación de NP), Jorge Gaitán Cortés – Sede A (aplazada por la Supervisión) y los frentes del Modificatorio No. 3 (Plazuela de Álamos y Néstor Forero Alcalá – Sede C).

CPF	EMERGENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR ASIGNADO
1057	La Palestina – Sede B (silvicultural)	100,00%	100,00%	$1.202.176,36
1061	ITI Francisco José de Caldas – Sede A (silvicultural)	100,00%	100,00%	$47.864.958,56
1061	ITI Francisco José de Caldas – Sede A (silvicultural)	100,00%	100,00%	$3.938.480,00
1001	Tabora – Sede A (silvicultural)	100,00%	100,00%	$2.442.377,00
1020	Dirección Local de Engativá	72,45%	72,45%	$30.745.060,45
1001	Tabora – Sede A (rampas)	100,00%	100,00%	$4.876.338,24
1025	Miguel Antonio Caro – Sede A	100,00%	100,00%	$19.445.268,58
1073	Torquigua – Sede A	100,00%	100,00%	$147.566.406,88
1080	Luicila Rubio de Laverde	100,00%	100,00%	$5.658.378,00
1049	Juan del Corral – Sede A (Obra No. 1)	95,00%	95,00%	$77.517.148,78

CPF	EMERGENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR ASIGNADO
1050	Juan del Corral – Sede A (Obra No. 2 – RCI)	0,00%	0,00%	$22.483.797,00
–	Simón Bolívar – Sede B	95,00%	95,00%	$10.066.280,00
–	San José Norte – Sede A	0,00%	0,00%	$93.938.430,00
1066	Magdalena Ortega – Sede A	100,00%	100,00%	$6.823.040,00
1052	Simón Bolívar – Sede A	94,00%	94,00%	$112.835.798,06
–	Plazuela de Álamos – Ana Galvis Ortiz	0,00%	0,00%	$149.667.331,20
–	Néstor Forero Alcalá – Sede C	0,00%	0,00%	$59.664.771,00
1016	Jorge Gaitán Cortés – Sede A	0,00%	0,00%	$0,00
	TOTAL PROMEDIO / VALOR ASIGNADO	**69,80%**	**69,80%**	**$796.736.040,11**
	VALOR DISPONIBLE PARA EMERGENCIAS			**$938.932.199,00**
	SALDO POR ASIGNAR			**$142.196.158,89**

Nota: los frentes de emergencia no cuentan con programación porcentual independiente; su programado se registra igual al ejecutado una vez la Supervisión emite la ficha y se concilia el horario de intervención con la sede, conforme a la metodología de los informes semanales.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Control del plan de calidad y ensayos de material

En el periodo el seguimiento al Plan de Calidad de la obra se efectuó mediante la verificación en campo de los materiales, procedimientos constructivos y acabados, con acompañamiento de los especialistas estructural, eléctrico e hidráulico de la Interventoría. Se verificaron el refuerzo y confinamiento de la mampostería en República de Colombia – Sede B y Simón Bolívar – Sede B, las pruebas de funcionamiento del sistema de bombeo en Abel Rodríguez Céspedes y la calidad de enchapes en Juan del Corral – Sede A, cuyas correcciones fueron atendidas. De acuerdo con el Plan de Calidad aprobado y con lo reportado por el contratista en su Informe Mensual No. 11, en el periodo no se ejecutaron ítems que exigieran ensayos de laboratorio de materiales.

2.2 Estado de servicios públicos, trámites y licencias

No aplica para el periodo. Las intervenciones corresponden a obras menores que no requieren licencias ni trámites ante empresas de servicios públicos.

2.3 Pagos parafiscales

Se verificó la certificación expedida por el contador del Consorcio Educativo 25, Jaime Esteban Sotelo López, en la que consta que el contratista se encuentra a paz y salvo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y con los aportes parafiscales de sus empleados. Las planillas de seguridad social del periodo fueron revisadas y aprobadas por la Interventoría mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-896, como soporte del Acta No. 9. Los comprobantes se anexan al presente informe.

2.4 Verificación de la amortización del anticipo

No aplica. El contrato de obra no contempló la entrega de anticipo.

2.5 Estado financiero del contrato de obra

El contrato de obra ha tenido tres modificaciones en valor, de conformidad con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial del contrato	$2.551.797.666,00
Valor adicional No. 01 (Modificatorio No. 1)	$645.761.648,00
Valor adicional No. 02 (Modificatorio No. 2)	$461.699.955,00
Valor adicional No. 03 (Modificatorio No. 3)	$310.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$3.969.259.269,00**

A continuación, se relaciona el estado financiero del contrato de obra según las actas parciales tramitadas. Los porcentajes se calculan sobre el valor total vigente del contrato ($3.969.259.269,00).

DESCRIPCIÓN	VALOR	% DEL CONTRATO	ESTADO
Acta parcial No. 01	$401.759.151,00	10,12%	Pagada
Acta parcial No. 02	$392.605.364,00	9,89%	Pagada
Acta parcial No. 03	$419.080.656,00	10,56%	Pagada
Acta parcial No. 04	$335.248.214,00	8,44%	Pagada
Acta parcial No. 05	$340.158.088,00	8,57%	Pagada
Acta parcial No. 06	$962.858.748,00	24,26%	Pagada
Acta parcial No. 07	$267.388.536,00	6,74%	Pagada
Acta parcial No. 08	$220.148.211,00	5,55%	En trámite de pago
SUBTOTAL FACTURADO ACTAS 1 A 8	**$3.339.246.968,00**	**84,13%**	
Acta parcial No. 09 (periodo 03/08/2026 – 02/09/2026)	$157.122.219,00	3,96%	Autorizada 18/09/2026
TOTAL ACUMULADO ACTAS 1 A 9	**$3.496.369.187,00**	**88,09%**	
SALDO POR EJECUTAR	**$472.890.082,00**	**11,91%**	

El Acta Parcial No. 9, correspondiente al periodo del presente informe, fue revisada y avalada por la Interventoría el 15 de septiembre de 2026 por un valor a costo directo de $117.986.197,00, para un total de $157.122.219,00 incluido el AIU del 33,17 %, e incluye los frentes Magdalena Ortega – Sede A, ITI Francisco José de Caldas – Sede A, Abel Rodríguez Céspedes, Técnico Palermo, República de Colombia – Sede B y las obras prioritarias de Juan del Corral – Sede A, Simón Bolívar – Sede B y Simón Bolívar – Sede A. El pago fue autorizado mediante el Acta para Autorizar Pagos No. 09 del 18 de septiembre de 2026, con un porcentaje de avance acumulado del contrato del 88,1 %.

2.6 Aspectos sociales

Se realizan labores conjuntas entre los profesionales del contratista de obra, la interventoría y la profesional social de la SED, con seguimiento semanal a las actividades de cada frente, buscando alternativas que reduzcan o mitiguen las posibles afectaciones a la comunidad educativa. En el periodo se coordinaron los horarios de ingreso con las instituciones, se levantó el acta de vecindad del Colegio Néstor Forero Alcalá – Sede C y se articuló con la Supervisión la gestión de la desocupación del predio Plazuela de Álamos, previa al inicio del cerramiento.

2.7 Aspectos ambientales PIGA y PGRCD

Durante los recorridos se verificó la implementación del Plan de Manejo Ambiental y del PGRCD en los frentes activos, requiriendo el acopio, señalización y disposición de residuos con gestores autorizados, el mantenimiento de cerramientos y las jornadas periódicas de orden y aseo. El Informe Mensual Ambiental No. 11 del contratista fue revisado y aprobado por el especialista ambiental de la Interventoría mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-888. Se anexa el concepto técnico correspondiente.

2.8 Seguridad y salud en el trabajo

Se verificó la dotación del personal, el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), las charlas de seguridad, las inspecciones preoperacionales y el acompañamiento mediante inspecciones SST, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la Resolución 4272 de 2021 para trabajo en alturas. En el periodo se atendió la condición insegura de andamio identificada en República de Colombia – Sede B y se verificó el uso de línea de vida en los trabajos en cubierta de Magdalena Ortega – Sede A. El Informe Mensual SST No. 11 del contratista fue aprobado mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-889 y radicado ante la SED mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-891. Se anexa el concepto técnico emitido por la profesional SST.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

- Al cierre del periodo (02 de septiembre de 2026) los frentes contractuales y de las Adiciones No. 1 y No. 2 registran un avance físico promedio del 99,79 % frente al 100 % programado. Técnico Palermo – Sede A quedó terminado y República de Colombia – Sede B alcanzó el 97,72 %.
- Las emergencias registran un avance promedio del 69,80 %, con un valor asignado de $796.736.040,11 y un saldo por asignar de $142.196.158,89 sobre el valor disponible de $938.932.199,00.
- Con el Modificatorio No. 3 el contrato asciende a $3.969.259.269,00 y su plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026; las garantías fueron revisadas, aprobadas y remitidas a la SED mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-880.
- El valor facturado de las actas 1 a 8 asciende a $3.339.246.968,00 (84,13 %) y, con el Acta No. 9 por $157.122.219,00, el acumulado alcanza $3.496.369.187,00 (88,09 %).
- Se verificó el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades del periodo; los informes mensuales SST y ambiental No. 11 del contratista fueron aprobados y las planillas de seguridad social se encuentran verificadas.

- La Interventoría revisó y aprobó el Informe Mensual de Obra No. 11 del contratista, cuya lista de chequeo cumple en todos sus componentes aplicables.

3.2 Recomendaciones

- Culminar las actividades pendientes de República de Colombia – Sede B (tratamiento de fachada, anclajes y aseo final) y efectuar su entrega formal.
- Ejecutar los remates de la pérgola y la nivelación de la caja en la placa frente al aula modular de Simón Bolívar – Sede A, y los ajustes finales de puertas y la corrección de la filtración en Juan del Corral – Sede A, para proceder con su entrega.
- Presentar oportunamente los NP pendientes (DILE, RCI de Juan del Corral – Sede A e IMC de San José Norte – Sede A) con sus soportes completos, para agilizar su aprobación por la SED.
- Coordinar con la Supervisión la fecha de desocupación del predio Plazuela de Álamos e iniciar el frente de Néstor Forero Alcalá – Sede C según lo programado, presentando la programación de los frentes del Modificatorio No. 3.
- Mantener la conciliación de cantidades ejecutadas y facturadas y la consolidación de memorias y soportes, con miras al cierre contractual.

4. ANEXOS

A continuación, se relacionan los documentos que se incorporan como anexos del presente informe:

4.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados
4.2 Informes semanales No. 44 a No. 48
4.3 Vinculación de mujeres
4.4 Matriz de riesgos
4.5 Actas de comité de obra No. 21 y No. 22
4.6 Relación de correspondencia
4.7 Bitácora de obra
4.8 Programación de obra
4.9 Pago de parafiscales (oficio PROBINTEC-LOTE6-896 y certificación)
4.10 Aspectos ambientales (oficio PROBINTEC-LOTE6-888)
4.11 Seguridad y salud en el trabajo (oficios PROBINTEC-LOTE6-889 y 891)
4.12 Reseña fotográfica del periodo por semana
4.13 Lista de chequeo del Informe Mensual de Obra No. 11 del contratista

5. DOCUMENTACIÓN SECOP II

5.1 Acta de inicio

Se anexa el acta de inicio del contrato de obra, suscrita el 03 de octubre de 2025.

5.2 Garantías

Se anexan las garantías del contrato de obra, incluidas las correspondientes al Modificatorio No. 3 (oficio PROBINTEC-LOTE6-880).

5.3 Designación del supervisor

Se anexa la designación del apoyo a la supervisión, Ing. Hernán Darío López Páez.

5.4 Informes mensuales

El presente documento hace parte del ítem en mención.

5.5 Actas parciales

Se anexan las actas parciales de obra No. 1 a No. 9.

5.6 Modificaciones

Se anexan el Modificatorio No. 1 (Adición No. 1), el Modificatorio No. 2 (Adición No. 2 y Prórroga No. 1) y el Modificatorio No. 3 (Adición No. 3 y Prórroga No. 2).

5.7 Suspensión

No aplica. Durante el periodo no se presentaron suspensiones del contrato.

5.8 Prórroga a la suspensión

No aplica.

5.9 Acta de terminación

No aplica. El contrato se encuentra en ejecución.

5.10 Acta de entrega

No aplica. El contrato se encuentra en ejecución.

5.11 Reinicio a la suspensión

No aplica.

5.12 Acta de liquidación

No aplica. El contrato se encuentra en ejecución.

6. PROFESIONALES PARTÍCIPES DEL PROYECTO OFERTADOS

6.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Directora de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte Ortiz	Especialista Estructural	30%
6	Christian Felipe Rodríguez Beltrán	Especialista Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia Quintero	Especialista Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil Rojas	Especialista Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katerin Carolina Núñez Osorio	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Christian Fabián Barrera Doncel	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur Rodríguez	Asesora Jurídica	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector de Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector de Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo de Interventoría	100%

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 44

CO1.PCCNTR.8155350

LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N° 44 DEL 3/08/2026 (DD-MM-AA) AL 9/08/2026 (DD-MM-AA)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 310 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°: CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)

LOTE COP: 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,666.00
AIU	33.17% $ 846,431,285.81
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00
Valor adicional No. 3:	$ 310,000,000.00
Valor inicial No. 3 emergencias:	$
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ 310,000,000.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,969,259,269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 628,932,199.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,340,327,070.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/01/2027

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/01/2027


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	2.31%	93.07%	Obra Física Ejecutada (%)	0.95%	96.94%
Valor de la Obra Programada:	$ 77,070,455.00	$ 3,694,081,349.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 31,733,107.00	$ 3,847,799,935.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	90.76%	95.99%	3.86%
Durante el periodo	2.31%	0.95%	
Acumulado actual	93.07%	96.94%	

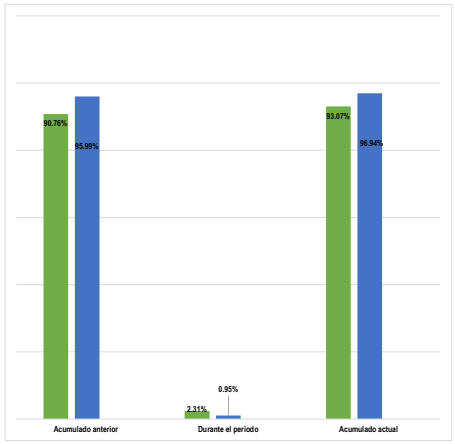

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	8.58%	7.02%	-1.56%	72.71%	100.00%	27.29%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	16.80%	3.43%	-13.37%	51.09%	66.30%	15.21%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			12.69%	5.23%	-7.47%	61.90%	83.15%	21.25%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			2.31%	0.95%	-1.36%	93.07%	96.94%	3.86%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	$ 23,556,324.45		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,202,176.36		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,970,364.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,347,316.24		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 16,445,268.58		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 126,636,146.95		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 12,894,594.56		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,378.00		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	70.00%	70.00%	0.00%	$ 104,218,947.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	20.00%	20.00%	0.00%	$ 10,066,280.00		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 98,338,906.00		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 93,938,430.00		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	50.00%	50.00%	0.00%	$ 6,823,040.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	70.00%	70.00%	0.00%	$ 123,079,032.60		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL)	90.00%	90.00%	0.00%	$ 2,867,956.44		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			73.33%	71.50%	-1.84%	$ 667,043,161.18	$ 628,932,199.00	-$ 38,110,962.18

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	$ 3,969,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401,759,151.00
VALOR PARCIAL N°2	$ 392,605,364.00
VALOR PARCIAL N°3	$ 419,080,656.00
VALOR PARCIAL N°4	$ 335,248,214.00
VALOR PARCIAL N°5	$ 340,158,088.00
VALOR PARCIAL N°6	$ 960,277,947.00
VALOR PARCIAL N°6	$ 267,388,536.00
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3,116,517,956.00
SUMAS IGUALES	$ 852,741,313.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 3,116,517,956.00	$ 3,116,517,956.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	93.07%	96.94%	3.86%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	310	11.98

CURVA S

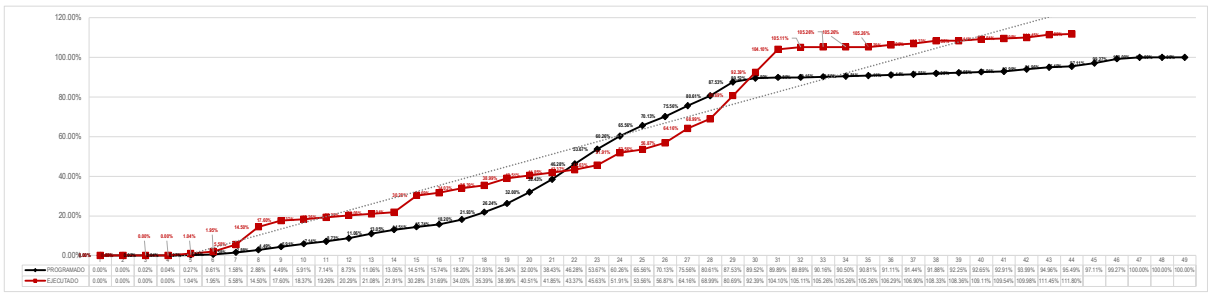

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ 6,389,251.00	0.23%	1.04%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.04%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	6/11/2025	$ 9,620,826.00	0.34%	0.91%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.95%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	13/11/2025	$ 27,550,191.00	0.98%	3.63%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.58%	$ 44,738,268.00	5.58%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	20/11/2025	$ 36,491,532.00	1.29%	8.91%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.88%	$ 81,229,800.00	14.50%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	27/11/2025	$ 45,682,077.00	1.62%	3.10%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.49%	$ 126,911,877.00	17.60%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	4/12/2025	$ 39,901,460.00	1.41%	0.77%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.91%	$ 166,813,337.00	18.37%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	11/12/2025	$ 34,900,709.00	1.24%	0.89%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.14%	$ 201,714,046.00	19.26%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	18/12/2025	$ 44,803,303.00	1.59%	1.03%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.73%	$ 246,517,349.00	20.29%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	25/12/2025	$ 65,790,932.00	2.33%	0.79%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.06%	$ 312,308,281.00	21.08%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	1/01/2026	$ 56,247,989.00	1.99%	0.83%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.05%	$ 368,556,270.00	21.91%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	8/01/2026	$ 41,234,728.00	1.46%	8.37%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.51%	$ 409,790,998.00	30.28%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	15/01/2026	$ 34,958,790.00	1.24%	1.41%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.74%	$ 444,749,788.00	31.69%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	22/01/2026	$ 69,362,324.00	2.46%	2.34%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.20%	$ 514,112,112.00	34.03%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	29/01/2026	$ 105,342,386.00	3.73%	1.36%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	21.93%	$ 619,454,498.00	35.39%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	5/02/2026	$ 121,849,038.00	4.31%	3.60%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.24%	$ 741,303,536.00	38.99%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	12/02/2026	$ 162,551,206	5.75%	1.52%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.00%	$ 903,854,742.00	40.51%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	19/02/2026	$ 181,799,979.00	6.44%	1.34%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.43%	$ 1,085,654,721.00	41.85%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	26/02/2026	$ 221,633,716	7.85%	1.52%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.28%	$ 1,307,288,437.00	43.37%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	5/03/2026	$ 208,747,364	7.39%	2.26%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	53.67%	$ 1,516,035,801.00	45.63%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	12/03/2026	$ 186,145,269	6.59%	6.28%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.26%	$ 1,702,181,070.00	51.91%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	19/03/2026	$ 149,758,087	5.30%	1.65%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	65.56%	$ 1,851,939,157.00	53.56%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	26/03/2026	$ 129,089,554	4.57%	3.31%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.13%	$ 1,981,028,711.00	56.87%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	2/04/2026	$ 153,455,255	5.43%	7.29%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	75.56%	$ 2,134,483,966.00	64.16%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	9/04/2026	$ 142,675,377	5.05%	4.83%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	80.61%	$ 2,277,159,343.00	68.99%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	16/04/2026	$ 195,438,873	6.92%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	87.53%	$ 2,472,598,216.00	80.69%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	23/04/2026	$ 56,148,389	1.99%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	89.52%	$ 2,528,746,605.00	92.39%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	30/04/2026	$ 10,449,797	0.37%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	89.89%	$ 2,539,196,402.00	104.10%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	7/05/2026	$ -	0.00%	1.01%	$ 28,542,222.29	-$ 28,542,222.29	89.89%	$ 2,539,196,402.00	105.11%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	14/05/2026	$ 7,610,997.19	0.27%	0.15%	$ 4,238,766.24	$ 3,372,230.95	90.16%	$ 2,546,807,399.19	105.26%	$ 2,973,374,185.53
34	SEM 34	21/05/2026	$ 9,768,829.83	0.35%	0.00%	$ 77,556.48	$ 9,691,273.35	90.50%	$ 2,556,576,229.02	105.26%	$ 2,973,451,742.01
35	SEM 35	28/05/2026	$ 8,748,496.46	0.31%	0.00%	$ 77,556.48	$ 8,670,939.98	90.81%	$ 2,565,324,725.48	105.26%	$ 2,973,529,298.49
36	SEM 36	4/06/2026	$ 8,435,451.79	0.30%	1.03%	$ 29,141,324.08	-$ 20,705,872.29	91.11%	$ 2,573,760,177.27	106.29%	$ 3,002,670,622.57
37	SEM 37	11/06/2026	$ 9,377,523.99	0.33%	0.60%	$ 17,088,844.05	-$ 7,711,320.06	91.44%	$ 2,583,137,701.26	106.90%	$ 3,019,759,466.62
38	SEM 38	18/06/2026	$ 12,438,524.11	0.44%	1.44%	$ 40,567,420.99	-$ 28,128,896.88	91.88%	$ 2,595,576,225.37	108.33%	$ 3,060,326,887.61
39	SEM 39	25/06/2026	$ 10,342,404.12	0.37%	0.03%	$ 759,662.73	$ 9,582,741.39	92.25%	$ 2,605,918,629.49	108.36%	$ 3,061,086,550.34
40	SEM 40	2/07/2026	$ 11,368,920.36	0.40%	0.74%	$ 21,019,420.25	-$ 9,650,499.89	92.65%	$ 2,617,287,549.85	109.11%	$ 3,082,105,970.59
41	SEM 41	9/07/2026	$ 7,414,110.12	0.26%	0.44%	$ 12,298,490.01	-$ 4,884,379.89	92.91%	$ 2,624,701,659.97	109.54%	$ 3,094,404,460.60
42	SEM 42	16/07/2026	$ 30,285,878.89	1.07%	0.44%	$ 12,458,803.48	$ 17,827,075.41	93.99%	$ 2,654,987,538.86	109.98%	$ 3,106,863,264.08
43	SEM 43	23/07/2026	$ 27,404,109.91	0.97%	1.47%	$ 41,599,471.97	-$ 14,195,362.06	94.96%	$ 2,682,391,648.77	111.45%	$ 3,148,462,736.05
44	SEM 44	30/07/2026	$ 14,952,840.10	0.53%	0.35%	$ 9,829,625.97	$ 5,123,214.13	95.49%	$ 2,697,344,488.87	111.80%	$ 3,158,292,362.02
45	SEM 45	6/08/2026	$ 45,762,755.02	1.62%	0.00%	$ -	$ 45,762,755.02	97.11%	$ 2,743,107,243.89		$ 3,158,292,362.02
46	SEM 46	13/08/2026	$ 61,169,408.68	2.17%	0.00%	$ -	$ 61,169,408.68	99.27%	$ 2,804,276,652.57		$ 3,158,292,362.02
47	SEM 47	20/08/2026	$ 20,603,614.88	0.73%	0.00%	$ -	$ 20,603,614.88	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,158,292,362.02
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,158,292,362.02
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,158,292,362.02
			$ 2,824,880,267.45								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 44 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 44 (Consecutivo) **DEL** 3/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 9/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 310 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron labores de fundida de placa. Asimismo, se continúa con las actividades de mantenimiento del cerramiento.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la ejecución de anclajes y refuerzos de columnetas, así como a la instalación de bajantes. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo adecuado de las actividades y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la ejecución de las labores.
Asimismo, se evidenció el uso apropiado de los EPP por parte del personal y la realización de jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones seguras y adecuadas en el frente de trabajo.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos en lonas, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo AmbientalSe realizó recorrido en el frente, cuenta con cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos en lonas, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 44 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 44 (Consecutivo) **DEL** 3/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 9/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 310 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se termina fundida de viga inferior del muro. De igual manera la fundida de las columnas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la fundida total de vigas y dados, así como al armado de formaletas para la fundida de columnas. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las actividades y la implementación de las medidas de seguridad requeridas para la ejecución de las labores.
Asimismo, se recomendó al contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener las áreas de trabajo libres de materiales y residuos que puedan generar condiciones inseguras. De igual manera, se reiteró la importancia del uso adecuado de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades desarrolladas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos (volumen medio-alto), por lo que se recomienda señalizarlo y acopiarlos, disponerlo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se definio que esta sede debera encontrarse finalizada el 2 de septiembre

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizan detalles para entrega de la sede

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al aseo y la limpieza del pasillo, así como a la ejecución de remates y labores de limpieza en elementos de superboard y mampostería, entre otras actividades complementarias. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las labores y el mantenimiento de condiciones adecuadas en el área intervenida.
Asimismo, se recomendó fortalecer las jornadas de orden y aseo, con el propósito de conservar los espacios de trabajo libres de residuos y materiales innecesarios. De igual manera, se reiteró la importancia del uso adecuado de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, retirar todo al terminar las actividades e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Durante el comité realizado en la presente semana, se programó una visita de verificación de obra para la semana comprendida entre el 10 y el 14 de agosto de 2026.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La zona fue entregada a la instutucion y a la fecha no se reportan novedades

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la reposición de la bomba mediante garantía, encontrándose el equipo nuevo en sitio, pendiente de verificación.
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: La supervicion emite ficha para atencion de emergencia silvicultural. El contratista se encuentra ejecutando las actividades de poda correspondientes

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 44 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 44 (Consecutivo) **DEL** 3/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 9/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 310 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: la emergencia ya fue atendida

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se han ejecutado actividades de pañetado en los baños; sin embargo, se solicita mejorar la calidad de los acabados. De igual manera, se recuerda que en los baños del tercer piso se debe realizar el retiro de las piezas de enchape que se encuentran fracturadas, con el fin de permitir la instalación de las puertas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra, se identificaron observaciones formuladas por la interventoría, las cuales se encuentran pendientes de subsanación por parte del contratista.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoría solicita mejorar los acabados de los baños, debido a deficiencias en la aplicación de la boquilla, presencia de excedentes de material y desalineaciones, por lo que se requiere mayor cuidado en la ejecución de los acabados.
Adicionalmente, se evidenció que las divisiones fijas presentan movimiento, por lo que se solicitó reforzar su fijación para garantizar su estabilidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se aprobo esquema radicado. Se realiza armado y fundida de columnetas.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos en lonas (Volumen medio), se recomienda realizar jornadas de orden y aseo, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Con base en el balance presentado por el contratista, en el comité del 17 de julio se definio que quedará suspendida esta emergencia hasta contar con recursos adicionales que permitan ejecutar las actividades correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Con base en el balance presentado por el contratista, en el comité del 17 de julio se definio que quedará suspendida esta emergencia hasta contar con recursos adicionales que permitan ejecutar las actividades correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades durante la semana en este frente

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista informa que durante la próxima semana se iniciará actividad en este frente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección del mismo por solicitud de la supervision.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRÁULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 44 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 44 (Consecutivo) **DEL** 3/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 9/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Instalación de bajantes de canaletas

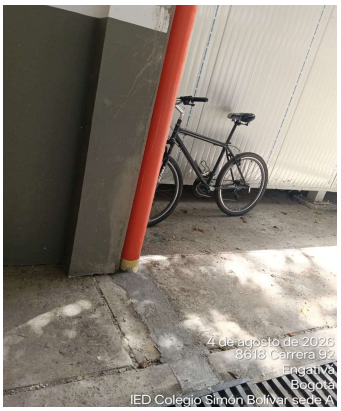

Resane de placa para desague de bajante

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 44 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 44 (Consecutivo) **36** 3/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 9/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Armado de refuerzo estructural y armado de encofrado para fundida de columna



Fundida de viga, dados y columnas.



Aplicación de Sikadur, adherente de concreto.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 44 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 44 (Consecutivo) **DEL** 3/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 9/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO

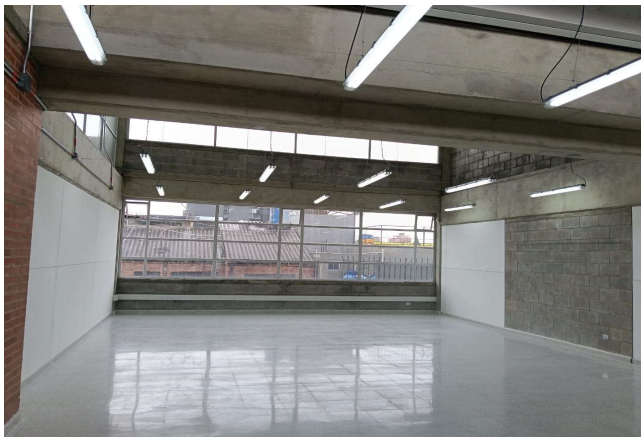

Remates y acabados



Aseo fino

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No. 45 — **LOTE COP No.18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	45	**DEL**	10/08/2026 (DD-MM-AA)	**AL**	16/08/2026 (DD-MM-AA)	**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato**	317 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°**	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)	**LOTE COP**	18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,866.00
AIU	33.17% $ 846,431,285.81
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00
Valor adicional No. 3:	$ -
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ 310,000,000.00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ -
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,969,259,269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ **938,932,199.00**
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ **3,030,327,070.00**
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/01/2027

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/01/2027


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.39%	97.38%	**Obra Fisica Ejecutada (%)**	0.00%	97.79%
Valor de la Obra Programada:	$ 11,708,082.00	$ 3,865,120,339.00	**Valor de la Obra Ejecutada:**	$ -	$ 3,881,538,639.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96.99%	97.79%	0.40%
Durante el periodo	0.39%	0.00%	
Acumulado actual	97.38%	97.79%	

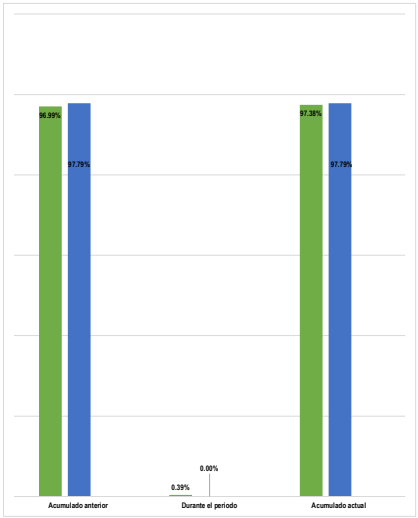

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	4.25%	0.00%	-4.25%	71.20%	75.65%	4.45%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			**2.13%**	**0.00%**	**-2.13%**	**85.60%**	**87.83%**	**2.23%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			**0.39%**	**0.00%**	**-0.39%**	**97.38%**	**97.79%**	**0.40%**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,202,176.36		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,970,364.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,447,297.28		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,447,297.28		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 2,867,956.44		
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	$ 23,556,324.45		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,347,316.24		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 16,445,268.58		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 126,636,146.95		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,378.00		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	75.00%	75.00%	0.00%	$ 104,218,947.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	35.00%	35.00%	0.00%	$ 10,066,280.00		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 98,338,906.00		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 93,938,430.00		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	50.00%	50.00%	0.00%	$ 6,823,040.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	89.00%	89.00%	0.00%	$ 123,079,032.60		
	ENGATIVA	PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ	0.00%	0.00%	0.00%	$ 2,867,956.44		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**73.47%**	**71.85%**	**-1.62%**	**$ 669,911,117.82**	**$ 938,932,199.00**	**$ 269,021,081.38**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,969,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401,759,151.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 392,605,364.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 419,080,656.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 335,248,214.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 340,158,088.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 960,277,947.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 267,388,536.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3,116,517,956.00	
SUMAS IGUALES		$ 852,741,313.00

INDICADOR FINACIERO	**VALOR FACTURADO**	**% DE AVANCE FINANCIERO**
	$ 3,116,517,956.00	78.52%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 852,741,313.00	


NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA ADICION EN VALOR DE LA MODIFICATORIA N°3 SE REDUCE EL PORCENTAJE FINACIERO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	**% AVANCE PROGRAMADO**	**% AVANCE EJECUTADO**	**% RETRASO - % ADELANTO +**
	97.38%	97.79%	0.40%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	**DIAS TOTAL DEL CONTRATO**	**RETRASO**
	457	1.85

CURVA S

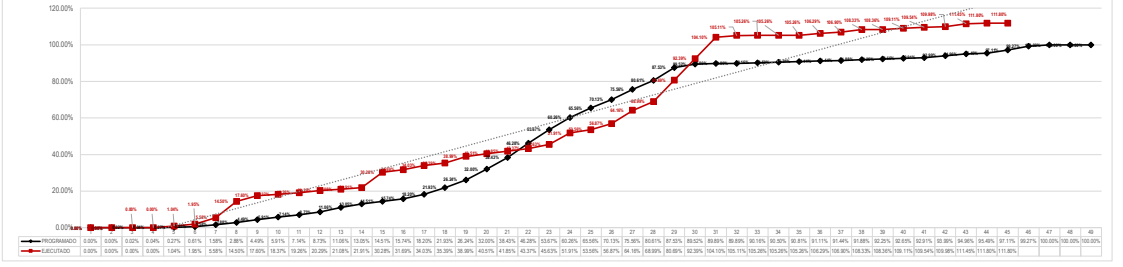

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2026	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	21/10/2026	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	28/10/2026	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	4/11/2026	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	11/11/2026	$ 6,389,251.00	0.23%	1.04%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.04%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	18/11/2026	$ 9,620,826.00	0.34%	0.91%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.95%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	25/11/2026	$ 27,550,191.00	0.98%	3.63%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.58%	$ 44,738,268.00	5.58%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	2/12/2026	$ 36,491,532.00	1.29%	8.91%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.88%	$ 81,229,800.00	14.50%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	9/12/2026	$ 45,682,077.00	1.62%	3.10%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.49%	$ 126,911,877.00	17.60%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	16/12/2026	$ 39,901,460.00	1.41%	0.77%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.91%	$ 166,813,337.00	18.37%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	23/12/2026	$ 34,900,709.00	1.24%	0.89%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.14%	$ 201,714,046.00	19.26%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	30/12/2026	$ 44,803,303.00	1.59%	1.03%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.73%	$ 246,517,349.00	20.29%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	6/01/2027	$ 65,790,932.00	2.33%	0.79%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.06%	$ 312,308,281.00	21.08%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	13/01/2027	$ 56,247,989.00	1.99%	0.83%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.05%	$ 368,556,270.00	21.91%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	20/01/2027	$ 41,234,728.00	1.46%	8.37%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.51%	$ 409,790,998.00	30.28%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	27/01/2027	$ 34,958,790.00	1.24%	1.41%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.74%	$ 444,749,788.00	31.69%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	3/02/2027	$ 69,362,324.00	2.46%	2.34%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.20%	$ 514,112,112.00	34.03%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	10/02/2027	$ 105,342,386.00	3.73%	1.36%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	21.93%	$ 619,454,498.00	35.39%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	17/02/2027	$ 121,849,038.00	4.31%	3.60%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.24%	$ 741,303,536.00	38.99%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	24/02/2027	$ 162,551,206	5.75%	1.52%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.00%	$ 903,854,742.00	40.51%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	3/03/2027	$ 181,799,979.00	6.44%	1.34%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.43%	$ 1,085,654,721.00	41.85%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	10/03/2027	$ 221,633,716	7.85%	1.52%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.28%	$ 1,307,288,437.00	43.37%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	17/03/2027	$ 208,747,364	7.39%	2.26%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	53.67%	$ 1,516,035,801.00	45.63%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	24/03/2027	$ 186,145,269	6.59%	6.28%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.26%	$ 1,702,181,070.00	51.91%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	31/03/2027	$ 149,758,087	5.30%	1.65%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	65.56%	$ 1,851,939,157.00	53.56%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	7/04/2027	$ 129,089,554	4.57%	3.31%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.13%	$ 1,981,028,711.00	56.87%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	14/04/2027	$ 153,455,255	5.43%	7.29%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	75.56%	$ 2,134,483,966.00	64.16%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	21/04/2027	$ 142,675,377	5.05%	4.83%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	80.61%	$ 2,277,159,343.00	68.99%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	28/04/2027	$ 195,438,873	6.92%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	87.53%	$ 2,472,598,216.00	80.69%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	5/05/2027	$ 56,148,389	1.99%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	89.52%	$ 2,528,746,605.00	92.39%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	12/05/2027	$ 10,449,797	0.37%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	89.89%	$ 2,539,196,402.00	104.10%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	19/05/2027	$ -	0.00%	1.01%	$ 28,542,222.29	-$ 28,542,222.29	89.89%	$ 2,539,196,402.00	105.11%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	26/05/2027	$ 7,610,997.19	0.27%	0.15%	$ 4,238,766.24	$ 3,372,230.95	90.16%	$ 2,546,807,399.19	105.26%	$ 2,973,374,185.53
34	SEM 34	2/06/2027	$ 9,768,829.83	0.35%	0.00%	$ 77,556.48	$ 9,691,273.35	90.50%	$ 2,556,576,229.02	105.26%	$ 2,973,451,742.01
35	SEM 35	9/06/2027	$ 8,748,496.46	0.31%	0.00%	$ 77,556.48	$ 8,670,939.98	90.81%	$ 2,565,324,725.48	105.26%	$ 2,973,529,298.49
36	SEM 36	16/06/2027	$ 8,435,451.79	0.30%	1.03%	$ 29,141,324.08	-$ 20,705,872.29	91.11%	$ 2,573,760,177.27	106.29%	$ 3,002,670,622.57
37	SEM 37	23/06/2027	$ 9,377,523.99	0.33%	0.60%	$ 17,088,844.05	-$ 7,711,320.06	91.44%	$ 2,583,137,701.26	106.90%	$ 3,019,759,466.62
38	SEM 38	30/06/2027	$ 12,438,524.11	0.44%	1.44%	$ 40,567,420.99	-$ 28,128,896.88	91.88%	$ 2,595,576,225.37	108.33%	$ 3,060,326,887.61
39	SEM 39	7/07/2027	$ 10,342,404.12	0.37%	0.03%	$ 759,662.73	$ 9,582,741.39	92.25%	$ 2,605,918,629.49	108.36%	$ 3,061,086,550.34
40	SEM 40	14/07/2027	$ 11,368,920.36	0.40%	0.74%	$ 21,019,420.25	-$ 9,650,499.89	92.65%	$ 2,617,287,549.85	109.11%	$ 3,082,105,970.59
41	SEM 41	21/07/2027	$ 7,414,110.12	0.26%	0.44%	$ 12,298,490.01	-$ 4,884,379.89	92.91%	$ 2,624,701,659.97	109.54%	$ 3,094,404,460.60
42	SEM 42	28/07/2027	$ 30,285,878.89	1.07%	0.44%	$ 12,458,803.48	$ 17,827,075.41	93.99%	$ 2,654,987,538.86	109.98%	$ 3,106,863,264.08
43	SEM 43	4/08/2027	$ 27,404,109.91	0.97%	1.47%	$ 41,599,471.97	-$ 14,195,362.06	94.96%	$ 2,682,391,648.77	111.45%	$ 3,148,462,736.05
44	SEM 44	11/08/2027	$ 14,952,840.10	0.53%	0.35%	$ 9,829,625.97	$ 5,123,214.13	95.49%	$ 2,697,344,488.87	111.80%	$ 3,158,292,362.02
45	SEM 45	18/08/2027	$ 45,762,755.02	1.62%	0.00%	$ -	$ 45,762,755.02	97.11%	$ 2,743,107,243.89	111.80%	$ 3,158,292,362.02
46	SEM 46	25/08/2027	$ 61,169,408.68	2.17%	0.00%	$ -	$ 61,169,408.68	99.27%	$ 2,804,276,652.57		$ 3,158,292,362.02
47	SEM 47	1/09/2027	$ 20,603,614.88	0.73%	0.00%	$ -	$ 20,603,614.88	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,158,292,362.02
48	SEM 48	8/09/2027		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,158,292,362.02
49	SEM 49	15/09/2027		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,158,292,362.02
			$ 2,824,880,267.45								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizaron actividades de adecuación y mantenimiento en aulas, laboratorio y aula de informática, a los cuales se les realizó el cambio de cubierta. De igual manera, se efectuó el suministro e instalación de un aula modular y ejecucion de carcamo en parte posterior a las aulas intervenidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizó el desmonte de las canchas existentes, seguido de actividades de excavación, conformación de subbase y ejecución de placa de concreto. Posteriormente, se efectuaron trabajos de pintura y demarcación de la cancha, incluyendo la señalización de los juegos infantiles. De igual manera, se realizó la pintura de las fachadas de todo el bloque y se ejecutó la adecuación de un cuarto de basuras y de un espacio destinado para los guardas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Frente de obra entregado

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Las obras fueron ejecutadas y entregadas mediante acta de reunión al almacenista, sin registrarse novedades.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizó la instalación de una estructura metálica independiente para la cubierta de las aulas modulares, con el fin de independizar este bloque y garantizar el soporte de la cubierta mediante su propia estructura. Adicionalmente, se ejecutaron muros aligerados para dividir y aislar el área destinada a las aulas, así como la pintura interna de los salones. También se intervino el salón de archivo ubicado en la zona de oficinas, realizando trabajos de pintura.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la reposición de la bomba mediante garantía, encontrándose el equipo nuevo en sitio, pendiente de verificación.
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Se da inicio a la elaboracion de muro

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al levantamiento de muro en mampostería. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el uso de andamio para la ejecución de estas labores; sin embargo, se identificó que este no cuenta con los elementos de soporte y condiciones requeridas para garantizar un acceso y posicionamiento seguro, evidenciándose que los trabajadores se apoyan sobre una tabla para alcanzar el nivel de trabajo.
Ante esta condición, la Interventoría recomendó al contratista suspender esta práctica y realizar los ajustes necesarios al sistema de acceso y trabajo, garantizando que el andamio cuente con una plataforma de trabajo adecuada, estable y segura, de acuerdo con las condiciones requeridas para la actividad, evitando el uso de elementos improvisados que puedan generar riesgo de caída.
Asimismo, se reiteró la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP y la dotación correspondiente a las actividades ejecutadas, así como fortalecer la supervisión de las condiciones de seguridad del frente de obra, con el fin de prevenir incidentes y accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: •TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS
•SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
•ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos (volumen bajo-medio), por lo que se recomienda disponerlo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se definio que esta sede debera encontrarse finalizada el 2 de septiembre

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución, teniendo en cuenta que el frente de obra se encuentra próximo a la entrega. En consecuencia, no se registró presencia de personal ejecutando labores ni actividades relacionadas con el componente de SST
La Interventoría recomienda que, en caso de requerirse el ingreso de personal para la atención de observaciones o actividades pendientes previo a la entrega, se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo el uso adecuado de los EPP la señalización y delimitación de las áreas de trabajo y las condiciones adecuadas de orden y aseo

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, retirar todo al terminar las actividades e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

- **LA PALESTINA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 04 de junio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 08 de julio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 15 de diciembre del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **TABORA - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron rampas de acceso que permiten la comunicación entre la zona verde y las aulas de primera infancia, facilitando el ingreso y tránsito hacia los salones. Adicionalmente, se construyeron columnetas como elementos de soporte para las puertas de acceso a las aulas, las cuales permiten delimitar y garantizar la seguridad entre la zona verde y los espacios destinados a primera infancia.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se ejecutó actividad de desmonte de puertas existentes y suministro e instalación de puertas nuevas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La zona fue entregada a la instutucion y a la fecha no se reportan novedades

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizaron actividades de actividades de pintura en electrostática y suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizó el suministro e instalación de baños portátiles como medida de contingencia ante la afectación de los baños principales de la sede

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se han avanzado en actividad de enchape en los baños en respuesta a la solicitud de mejorar la calidad de los acabados. De igual manera, se recuerda que en los baños del tercer piso se debe realizar el retiro de las piezas de enchape que se encuentran fracturadas, con el fin de permitir la instalación de las puertas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al cambio de enchape de muro en el baño de hombres del polideportivo. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las actividades y las condiciones de seguridad del área intervenida.
Asimismo, se recomendó al contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo, realizando el retiro oportuno de los escombros, residuos y demás materiales que aún permanecen en las instalaciones de la institución, con el fin de evitar condiciones inseguras y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. De igual manera, se reiteró la importancia de mantener las áreas de trabajo organizadas y libres de obstáculos durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos y material de construcción acopiados, por lo que se recomienda disponer adecuadamente los residuos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoría solicita mejorar los acabados de los baños, debido a deficiencias en la aplicación de la boquilla, presencia de excedentes de material y desalineaciones, por lo que se requiere mayor cuidado en la ejecución de los acabados.
Adicionalmente, se evidenció que las divisiones fijas presentan movimiento, por lo que se solicitó reforzar su fijación para garantizar su estabilidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realiza armado y fundida de columnetas en sala de sistemas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencio el retiro de los residuos y material de construcción, al igual realizo jornada de orden y aseo e implemento todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se identificó que el caudal actual no es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Se realizará una visita de verificación en sitio. Se aprueba la propuesta recientemente radicada por el contratista. Dicha propuesta contempla la ampliación del sistema de desagüe, incluyendo la ampliacion del sistema de desague, la instalación de redes internas y la construccion de una caja de inspección.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se contempla la realización de una reunión entre los especialistas eléctricos, con el fin de determinar y aprobar el alcance de la intervención.
Posteriormente, se llevará a cabo la intervención en las redes eléctricas de la institución, orientada a ejecutar trabajos en el tablero principal.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza verificarion de estado actual y propuesta de intervencion del punto fijo, se socializa entre contratista, supervision e interventoria y se aprueba para ser ejecutada los proximos dias

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizará el reemplazo de las láminas. El contratista propone ampliar la sección lateral para evitar salpique por lluvia y darle un acabado curvo tipo teja para lograr una mayor prolongación.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección del mismo por solicitud de la supervision.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron labores de pintura en el aula de contingencia. De igual manera se realizo la instalacion de estructura metalica de la pergola y desmonde y monte de nuevas puertas

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a trabajos de reforzamiento y confinamiento estructural, mediante la construcción de machones fundidos e integrados a los muros existentes de mampostería. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que el frente de obra contaba con cerramiento perimetral en adecuadas condiciones, garantizando la delimitación del área intervenida.
Asimismo, se evidenciaron jornadas de orden y aseo, contribuyendo al mantenimiento de condiciones seguras en el área de trabajo. La Interventoría recomendó al contratista continuar fortaleciendo el uso adecuado de los EPP, mantener la correcta señalización y delimitación de las áreas intervenidas y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y control establecidas para las actividades de reforzamiento estructural, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se contempla actividades de mantenimiento en el cerramiento, la conformación del espacio para pérgola que incluye placa de base, y la construcción de una placa adicional frente a las aulas modulares, la cual incluye cárcamo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El lote actualmente presenta ocupacion informal, por lo que posterior al retido de la poblacion que habita el espacion se realizara cerramiento.

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A




Soldadura de perfiles metalicos para pergola



Cambio de reja para cerramiento perimetral del colegio



Cambio de marco y resane de vanos en coordinacion y orientacion.

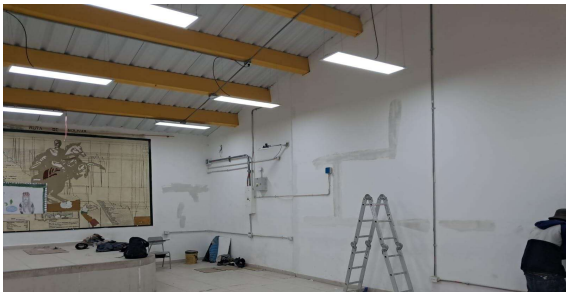

Estucado y resane de muros en el aula multiple.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **36** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Levantamiento de muro en mamposteria.



Aislamiento estructural en poliestireno expandido



Aplicación de Sikadur, adherente de concreto.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO



Instlación de puerta de .91x 2.75 en salon de la planta 1



Retiro de salidas electricas en salon de la planta 1

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

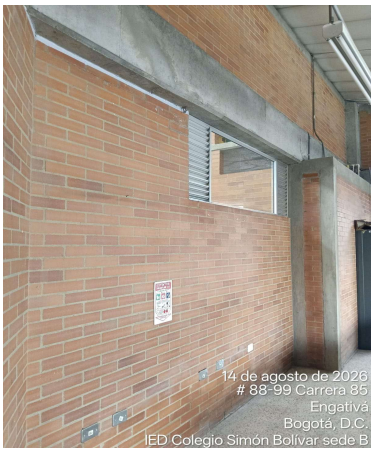

Fundia de machones en salon de sistemas



Uso de poliestireno expandido para junta de dilatacion flexible entre viga y mamposteria

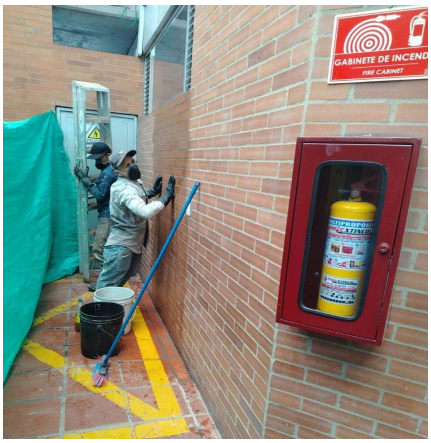

Limpieza con hidrófugo en mamposteria



Re emboquillado en justas de mamposteria

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA SEDE A



Poda de ramas en el arbol del patio central de la institución.



Acopio de material residual de poda.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUAN DE CORRAL SEDE A



Retiro de enchape de muro en el baño de hombres del polideportivo

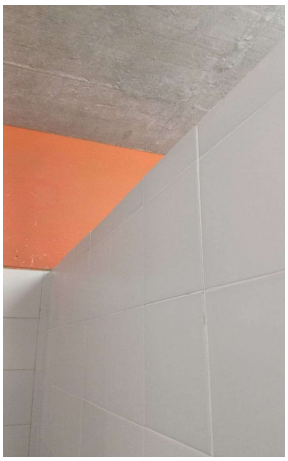

Reinstalacion de enchape de muro en el baño de hombres del polideportivo

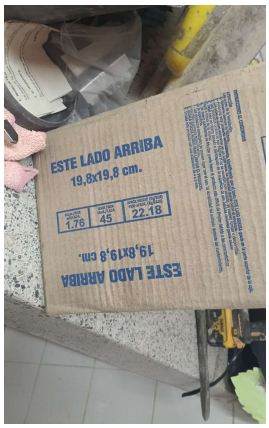

Enchape de 19,8x19,8 instalado en baño de mujeres y hombres del polideportivo.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No. 46 — LOTE COP No.18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	46	DEL	17/08/2026 (DD-MM-AA)	AL	23/08/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	324 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)			LOTE COP	18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA


CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25	INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR	RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"	OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,551,797,666.00	VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
AIU	33.17% $ 846,431,285.81	VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,705,366,380.19	VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,322,865,467.00	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,422,865,467.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128,932,199.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228,932,199.00		
Valor adicional No. 1:	$ 645,761,648.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445,761,648.00		
Valor adicional No. 2:	$ 461,699,955.00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261,699,955.00		
Valor adicional No. 3:	$ -		
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ 310,000,000.00		
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ -		
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,969,259,269.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 938,932,199.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,030,327,070.00		
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES	PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES	PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025	FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026	FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026	FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/01/2027	FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/01/2027

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Proqramada (%)	1.12%	98.50%	Obra Fisica Ejecutada (%)	0.79%	98.06%
Valor de la Obra Proqramada:	$ 34,022,308.00	$ 3,909,828,632.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 24,022,229.00	$ 3,892,363,892.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	97.38%	97.27%	
Durante el periodo	1.12%	0.79%	-0.45%
Acumulado actual	98.50%	98.06%	

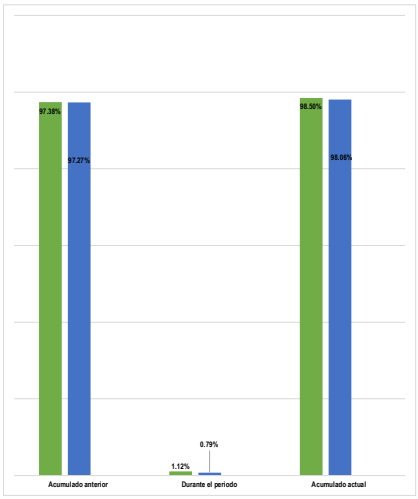

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	12.35%	8.72%	-3.63%	83.55%	78.62%	-4.93%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			6.18%	4.36%	-1.82%	91.78%	89.31%	-2.47%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			1.12%	0.79%	-0.33%	98.50%	98.06%	-0.45%
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,202,176.36		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,970,364.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,447,297.28		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,447,297.28		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 2,867,956.44		
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	$ 23,556,324.45		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 6,347,316.24		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 16,445,268.58		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 126,636,146.95		
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,658,378.00		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	82.00%	82.00%	0.00%	$ 104,218,947.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	35.00%	35.00%	0.00%	$ 10,066,280.00		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 98,338,906.00		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 93,938,430.00		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	92.00%	92.00%	0.00%	$ 6,823,040.00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	90.00%	90.00%	0.00%	$ 123,079,032.60		
	ENGATIVA	PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ	0.00%	0.00%	0.00%	$ 2,867,956.44		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			76.41%	74.79%	-1.62%	$ 669,911,117.62	$ 938,932,199.00	$ 269,021,081.38

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,969,259,269.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401,759,151.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 392,605,364.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 419,080,656.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 335,248,214.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 340,158,088.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 960,277,947.00	
VALOR PARCIAL N°7	$ 267,388,536.00	
VALOR PARCIAL N°8	$ 220,148,211.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3,336,666,167.00	
SUMAS IGUALES		$ 632,593,102.00

INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 3,336,666,167.00	84.06%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 632,593,102.00	


NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA ADICION EN VALOR DE LA MODIFICATORIA N°3 SE REDUCE EL PORCENTAJE FINACIERO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	98.50%	98.06%	-0.45%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	457	-2.05

CURVA S

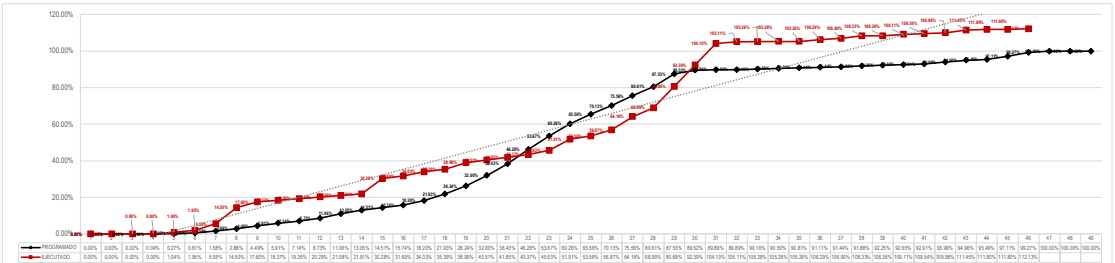

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2026	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	21/10/2026	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	28/10/2026	$ 452,000.00	0.02%	0.00%	$ -	$ 452,000.00	0.02%	$ 452,000.00	0.00%	$ -
4	SEM 4	4/11/2026	$ 726,000.00	0.03%	0.00%	$ -	$ 726,000.00	0.04%	$ 1,178,000.00	0.00%	$ -
5	SEM 5	11/11/2026	$ 6,389,251.00	0.23%	1.04%	$ 29,416,873.00	-$ 23,027,622.00	0.27%	$ 7,567,251.00	1.04%	$ 29,416,873.00
6	SEM 6	18/11/2026	$ 9,620,826.00	0.34%	0.91%	$ 25,779,255.00	-$ 16,158,429.00	0.61%	$ 17,188,077.00	1.95%	$ 55,196,128.00
7	SEM 7	25/11/2026	$ 27,550,191.00	0.98%	3.63%	$ 102,559,453.00	-$ 75,009,262.00	1.58%	$ 44,738,268.00	5.58%	$ 157,755,581.00
8	SEM 8	2/12/2026	$ 36,491,532.00	1.29%	8.91%	$ 251,731,418.00	-$ 215,239,886.00	2.88%	$ 81,229,800.00	14.50%	$ 409,486,999.00
9	SEM 9	9/12/2026	$ 45,682,077.00	1.62%	3.10%	$ 87,572,933.00	-$ 41,890,856.00	4.49%	$ 126,911,877.00	17.60%	$ 497,059,932.00
10	SEM 10	16/12/2026	$ 39,901,460.00	1.41%	0.77%	$ 21,793,589.00	$ 18,107,871.00	5.91%	$ 166,813,337.00	18.37%	$ 518,853,521.00
11	SEM 11	23/12/2026	$ 34,900,709.00	1.24%	0.89%	$ 25,093,898.00	$ 9,806,811.00	7.14%	$ 201,714,046.00	19.26%	$ 543,947,419.00
12	SEM 12	30/12/2026	$ 44,803,303.00	1.59%	1.03%	$ 29,099,062.00	$ 15,704,241.00	8.73%	$ 246,517,349.00	20.29%	$ 573,046,481.00
13	SEM 13	6/01/2027	$ 65,790,932.00	2.33%	0.79%	$ 22,343,565.00	$ 43,447,367.00	11.06%	$ 312,308,281.00	21.08%	$ 595,390,046.00
14	SEM 14	13/01/2027	$ 56,247,989.00	1.99%	0.83%	$ 23,469,005.00	$ 32,778,984.00	13.05%	$ 368,556,270.00	21.91%	$ 618,859,051.00
15	SEM 15	20/01/2027	$ 41,234,728.00	1.46%	8.37%	$ 236,488,719.00	-$ 195,253,991.00	14.51%	$ 409,790,998.00	30.28%	$ 855,347,770.00
16	SEM 16	27/01/2027	$ 34,958,790.00	1.24%	1.41%	$ 39,956,792.00	-$ 4,998,002.00	15.74%	$ 444,749,788.00	31.69%	$ 895,304,562.00
17	SEM 17	3/02/2027	$ 69,362,324.00	2.46%	2.34%	$ 66,086,806.00	$ 3,275,518.00	18.20%	$ 514,112,112.00	34.03%	$ 961,391,368.00
18	SEM 18	10/02/2027	$ 105,342,386.00	3.73%	1.36%	$ 38,340,595.00	$ 67,001,791.00	21.93%	$ 619,454,498.00	35.39%	$ 999,731,963.00
19	SEM 19	17/02/2027	$ 121,849,038.00	4.31%	3.60%	$ 101,726,291.00	$ 20,122,747.00	26.24%	$ 741,303,536.00	38.99%	$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	24/02/2027	$ 162,551,206	5.75%	1.52%	$ 42,982,940.00	$ 119,568,266.00	32.00%	$ 903,854,742.00	40.51%	$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	3/03/2027	$ 181,799,979.00	6.44%	1.34%	$ 37,731,200.00	$ 144,068,779.00	38.43%	$ 1,085,654,721.00	41.85%	$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	10/03/2027	$ 221,633,716	7.85%	1.52%	$ 42,847,295.00	$ 178,786,421.00	46.28%	$ 1,307,288,437.00	43.37%	$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	17/03/2027	$ 208,747,364	7.39%	2.26%	$ 63,951,186.00	$ 144,796,178.00	53.67%	$ 1,516,035,801.00	45.63%	$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	24/03/2027	$ 186,145,269	6.59%	6.28%	$ 177,464,542.00	$ 8,680,727.00	60.26%	$ 1,702,181,070.00	51.91%	$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	31/03/2027	$ 149,758,087	5.30%	1.65%	$ 46,684,366.00	$ 103,073,721.00	65.56%	$ 1,851,939,157.00	53.56%	$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	7/04/2027	$ 129,089,554	4.57%	3.31%	$ 93,368,732.00	$ 35,720,822.00	70.13%	$ 1,981,028,711.00	56.87%	$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	14/04/2027	$ 153,455,255	5.43%	7.29%	$ 205,922,820.00	-$ 52,467,565.00	75.56%	$ 2,134,483,966.00	64.16%	$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	21/04/2027	$ 142,675,377	5.05%	4.83%	$ 136,535,783.00	$ 6,139,594.00	80.61%	$ 2,277,159,343.00	68.99%	$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	28/04/2027	$ 195,438,873	6.92%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 135,109,820.00	87.53%	$ 2,472,598,216.00	80.69%	$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	5/05/2027	$ 56,148,389	1.99%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 274,400,304.00	89.52%	$ 2,528,746,605.00	92.39%	$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	12/05/2027	$ 10,449,797	0.37%	11.70%	$ 330,548,693.00	-$ 320,098,896.00	89.89%	$ 2,539,196,402.00	104.10%	$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	19/05/2027	$ -	0.00%	1.01%	$ 28,542,222.29	-$ 28,542,222.29	89.89%	$ 2,539,196,402.00	105.11%	$ 2,969,135,419.29
33	SEM 33	26/05/2027	$ 7,610,997.19	0.27%	0.15%	$ 4,238,766.24	$ 3,372,230.95	90.16%	$ 2,546,807,399.19	105.26%	$ 2,973,374,185.53
34	SEM 34	2/06/2027	$ 9,768,829.83	0.35%	0.00%	$ 77,556.48	$ 9,691,273.35	90.50%	$ 2,556,576,229.02	105.26%	$ 2,973,451,742.01
35	SEM 35	9/06/2027	$ 8,748,496.46	0.31%	0.00%	$ 77,556.48	$ 8,670,939.98	90.81%	$ 2,565,324,725.48	105.26%	$ 2,973,529,298.49
36	SEM 36	16/06/2027	$ 8,435,451.79	0.30%	1.03%	$ 29,141,324.08	-$ 20,705,872.29	91.11%	$ 2,573,760,177.27	106.29%	$ 3,002,670,622.57
37	SEM 37	23/06/2027	$ 9,377,523.99	0.33%	0.60%	$ 17,088,844.05	-$ 7,711,320.06	91.44%	$ 2,583,137,701.26	106.90%	$ 3,019,759,466.62
38	SEM 38	30/06/2027	$ 12,438,524.11	0.44%	1.44%	$ 40,567,420.99	-$ 28,128,896.88	91.88%	$ 2,595,576,225.37	108.33%	$ 3,060,326,887.61
39	SEM 39	7/07/2027	$ 10,342,404.12	0.37%	0.03%	$ 759,662.73	$ 9,582,741.39	92.25%	$ 2,605,918,629.49	108.36%	$ 3,061,086,550.34
40	SEM 40	14/07/2027	$ 11,368,920.36	0.40%	0.74%	$ 21,019,420.25	-$ 9,650,499.89	92.65%	$ 2,617,287,549.85	109.11%	$ 3,082,105,970.59
41	SEM 41	21/07/2027	$ 7,414,110.12	0.26%	0.44%	$ 12,298,490.01	-$ 4,884,379.89	92.91%	$ 2,624,701,659.97	109.54%	$ 3,094,404,460.60
42	SEM 42	28/07/2027	$ 30,285,878.89	1.07%	0.44%	$ 12,458,803.48	$ 17,827,075.41	93.99%	$ 2,654,987,538.86	109.98%	$ 3,106,863,264.08
43	SEM 43	4/08/2027	$ 27,404,109.91	0.97%	1.47%	$ 41,599,471.97	-$ 14,195,362.06	94.96%	$ 2,682,391,648.77	111.45%	$ 3,148,462,736.05
44	SEM 44	11/08/2027	$ 14,952,840.10	0.53%	0.35%	$ 9,829,625.97	$ 5,123,214.13	95.49%	$ 2,697,344,488.87	111.80%	$ 3,158,292,362.02
45	SEM 45	18/08/2027	$ 45,762,755.02	1.62%	0.00%	$ -	$ 45,762,755.02	97.11%	$ 2,743,107,243.89	111.80%	$ 3,158,292,362.02
46	SEM 46	25/08/2027	$ 61,169,408.68	2.17%	0.33%	$ 9,379,500.35	$ 51,789,908.33	99.27%	$ 2,804,276,652.57	112.13%	$ 3,167,671,862.37
47	SEM 47	1/09/2027	$ 20,603,614.88	0.73%	0.00%	$ -	$ 20,603,614.88	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,167,671,862.37
48	SEM 48	8/09/2027		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,167,671,862.37
49	SEM 49	15/09/2027		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,824,880,267.45		$ 3,167,671,862.37
			$ 2,824,880,267.45								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 324 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizaron actividades de adecuación y mantenimiento en aulas, laboratorio y aula de informática, a los cuales se les realizó el cambio de cubierta. De igual manera, se efectuó el suministro e instalación de un aula modular y ejecucion de carcamo en parte posterior a las aulas intervenidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizó el desmonte de las canchas existentes, seguido de actividades de excavación, conformación de subbase y ejecución de placa de concreto. Posteriormente, se efectuaron trabajos de pintura y demarcación de la cancha, incluyendo la señalización de los juegos infantiles. De igual manera, se realizó la pintura de las fachadas de todo el bloque y se ejecutó la adecuación de un cuarto de basuras y de un espacio destinado para los guardas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Frente de obra entregado

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Las obras fueron ejecutadas y entregadas mediante acta de reunión al almacenista, sin registrarse novedades.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizó la instalación de una estructura metálica independiente para la cubierta de las aulas modulares, con el fin de independizar este bloque y garantizar el soporte de la cubierta mediante su propia estructura. Adicionalmente, se ejecutaron muros aligerados para dividir y aislar el área destinada a las aulas, así como la pintura interna de los salones. También se intervino el salón de archivo ubicado en la zona de oficinas, realizando trabajos de pintura.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la reposición de la bomba mediante garantía, encontrándose el equipo nuevo en sitio.
2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizará una visita de verificación conjunta por parte de los profesionales del área hidráulica, con el fin de efectuar las pruebas de funcionamiento de los equipos instalados en el cuarto de bombas y verificar su correcta operación.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 324 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Se continua con la **e**laboracion de muro en mamposteria e inicio de armado de acero para viga

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al levantamiento de muros en mampostería, verificándose la instalación de refuerzo horizontal con grafiles cada seis hiladas, así como el armado de canastillas para el desarrollo de las actividades estructurales. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los Equipos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con los riesgos asociados a las labores ejecutadas. Asimismo, se recomendó implementar jornadas de orden y aseo durante y al finalizar la jornada laboral, garantizando el adecuado almacenamiento de materiales, herramientas y residuos, con el fin de mantener condiciones seguras en el frente de obra y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
MURO EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral en mal estado, se evidencia residuos (volumen bajo), por lo que se recomienda disponerlo, al igual que realizar el mantenimiento al cerramiento, jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se definio que esta sede debera encontrarse finalizada el 2 de septiembre

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución, teniendo en cuenta que el frente de obra se encuentra próximo a la entrega. En consecuencia, no se registró presencia de personal ejecutando labores ni actividades relacionadas con el componente de SST
La Interventoría recomienda que, en caso de requerirse el ingreso de personal para la atención de observaciones o actividades pendientes previo a la entrega, se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo el uso adecuado de los EPP la señalización y delimitación de las áreas de trabajo y las condiciones adecuadas de orden y aseo

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se subsanan las observaciones correspondientes a la entrega, relacionadas con la instalación de guardaescoba y los acabados en el salón del primer piso, incluyendo remates de pintura y estuco.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

- **LA PALESTINA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 04 de junio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 08 de julio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 15 de diciembre del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **TABORA - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron rampas de acceso que permiten la comunicación entre la zona verde y las aulas de primera infancia, facilitando el ingreso y tránsito hacia los salones. Adicionalmente, se construyeron columnetas como elementos de soporte para las puertas de acceso a las aulas, las cuales permiten delimitar y garantizar la seguridad entre la zona verde y los espacios destinados a primera infancia.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 324 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se ejecutó actividad de desmonte de puertas existentes y suministro e instalación de puertas nuevas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La zona fue entregada a la instutucion y a la fecha no se reportan novedades

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizaron actividades de actividades de pintura en electrostática y suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizó el suministro e instalación de baños portátiles como medida de contingencia ante la afectación de los baños principales de la sede

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: La interventoría solicita al contratista realizar correcciones relacionadas con el enchape y win metálico.
Actualmente, el contratista continúa trabajando en las actividades de enchape. Queda pendiente la instalación de las puertas y las divisiones de los orinales, las cuales, de acuerdo con lo informado por el contratista, se ejecutarán durante la próxima semana.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución, teniendo en cuenta que el frente de obra se encuentra próximo a la entrega. En consecuencia, no se registró presencia de personal ejecutando labores ni actividades relacionadas con el componente de SST
La Interventoría recomienda que, en caso de requerirse el ingreso de personal para la atención de observaciones o actividades pendientes previo a la entrega, se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo el uso adecuado de los EPP la señalización y delimitación de las áreas de trabajo y las condiciones adecuadas de orden y aseo

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio el trasiego de los residuos de obra, por lo que se recomienda disponerlo adecuadamente a los gestores autorizados, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoría solicita mejorar los acabados de los baños, debido a deficiencias en la aplicación de la boquilla, presencia de excedentes de material y desalineaciones, requiriendo mayor cuidado en la ejecución. En atención a estas observaciones, se han adelantado actividades de corrección y mejora del enchape.
Adicionalmente, se evidenció movimiento en las divisiones fijas, por lo que se solicitó reforzar su fijación para garantizar su estabilidad. Se recuerda que en los baños del tercer piso se debe realizar el retiro de las piezas de enchape fracturadas, con el fin de permitir la instalación de las puertas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI. A la espera de aprobacion de NP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realiza armado y fundida de columnetas en sala de sistemas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencio el retiro de los residuos y material de construcción, al igual realizo jornada de orden y aseo e implemento todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se identificó que el caudal actual no es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Se realizará una visita de verificación en sitio. Se aprueba la propuesta recientemente radicada por el contratista. Dicha propuesta contempla la ampliación del sistema de desagüe, incluyendo la ampliacion del sistema de desague, la instalación de redes internas y la construccion de una caja de inspección.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: El día 21 de agosto se realizó una reunión con los especialistas eléctricos, en la cual se revisó la necesidad de intervención de las redes eléctricas en zonas de circulación y áreas externas. Como resultado, el contratista remitirá un NP asociado al ítem de tubería metálica IMC conduit galvanizado, requerido para la ejecución de las redes en las zonas mencionadas. Se encuentra pendiente que el contratista remita la propuesta final y el respectivo NP, con el fin de continuar con el debido proceso para su revisión y aprobación.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se contempla la realización de una reunión entre los especialistas eléctricos, con el fin de determinar y aprobar el alcance de la intervención.
Posteriormente, se llevará a cabo la intervención en las redes eléctricas de la institución, orientada a ejecutar trabajos en el tablero principal.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza el desmonte de las láminas transparentes existentes en el punto fijo de la cubierta y su reemplazo mediante el suministro e instalación de policarbonato translúcido, conservando las condiciones y características requeridas para la zona.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio el desmonte de la cubierta, por lo que se recomienda disponerlo adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 324 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección de tanques por solicitud de la supervision.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR

1. Actividades Tecnicas: En la zona de la pérgola se ejecutaron actividades correspondientes a remates en la estructura. De igual manera se evidencia que llego el policarbonato requerido para su instalación. En el area de contingencia, se ejecutaron labores de pintura.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en el aula múltiple, aplicación de pintura en bajantes y trasiego de materiales. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las actividades y las condiciones de seguridad del frente de obra.
Asimismo, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a cada una de las actividades ejecutadas. De igual manera, se recomendó implementar jornadas de orden y aseo durante y al finalizar la jornada laboral, realizando el adecuado almacenamiento de materiales y herramientas y el retiro oportuno de residuos, con el fin de mantener condiciones seguras en las áreas intervenidas y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos (volumen alto), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo AmbientalSe realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos (volumen alto), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se realizan observaciones de la estructura de la pérgola, la cual debe ser rematada correctamente. De igual manera, se presentan observaciones sobre la placa ejecutada frente al aula modular, debido a la presencia de una caja que genera un desnivel y puede ocasionar tropiezos, representando una condición de riesgo. Se solicita realizar el ajuste correspondiente para garantizar una superficie segura y adecuada para la circulación. El contratista se compromete a ejecutar dicha corrección durante la próxima semana.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El lote actualmente presenta ocupacion informal, por lo que posterior al retido de la poblacion que habita el espacion se realizara cerramiento.

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	**ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO** APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	**ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRÁN** ESPECIALISTA AMBIENTAL	**ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL** PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	
ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	**ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS** ESPECIALISTA HIDRÁULICO	**ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ** ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Resane y trata de superficies



Aplicación de la primera mano de pintura tipo vinilo.

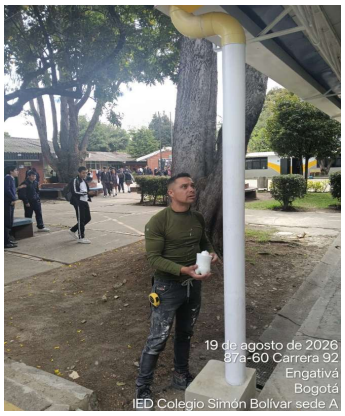

Aplicación de pintura en bajantes



Mantenimiento del cerramiento perimetral mediante el desmonte de mallas y marcos deteriorados, fijación de soportes metálicos de refuerzo y aplicación de pintura de protección (esmalte anticorrosivo).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **36** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Armado de canastilla: Flejes cada 10cm, para viga de amarre



Levantamiento de muro en mampostería.



Se evidencia refuerzo horizontal con grafiles cada 6 hiladas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18


ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO SEDE A



Se procedió al desmonte de la teja existente, la cual presentaba un alto grado de deterioro, suciedad y opacidad



Se evidencia al personal debidamente anclado a la línea de vida, para la ejecución segura de las actividades en altura.

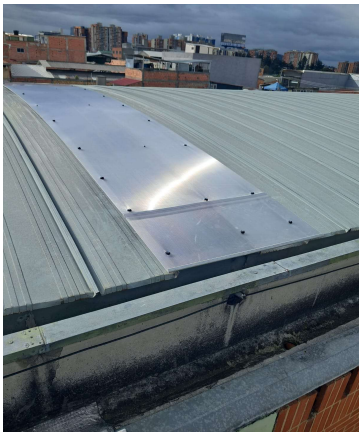

Se realizó el suministro e instalación de una nueva lámina de policarbonato.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUAN DE CORRAL SEDE A



Instalacion de enchape de muro en baño de hombres y mujeres del polideportivo.



Instalacion de win en todas las divisiones de los baños.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No. 47 — **LOTE COP No.18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	47	DEL	24/08/2026 (DD-MM-AA)	AL	30/08/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	331 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155350 (Numero del contrato)	LOTE COP	18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.551.797.666,00
AIU	33,17% $ 846.431.285,81
COSTO DIRECTO	$ 1.705.366.380,19
OFERTADO	$ 2.322.865.467,00
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.422.865.467,00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 128.932.199,00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 228.932.199,00
Valor adicional No. 1:	$ 645.761.648,00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 445.761.648,00
Valor adicional No. 2:	$ 461.699.955,00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ 200.000.000,00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 261.699.955,00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3.659.259.269,00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 628.932.199,00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3.030.327.070,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796.278.922,00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139.026.666,00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219.541.737,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.154.847.325,00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1,50%	100,00%	Obra Física Ejecutada (%)	0,01%	98,07%
Valor de la Obra Programada:	$ 45.317.164,00	$ 3.659.092.939,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 303.033,00	$ 3.588.635.565,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	98,50%	98,06%	-1,93%
Durante el periodo	1,50%	0,01%	
Acumulado actual	100,00%	98,07%	

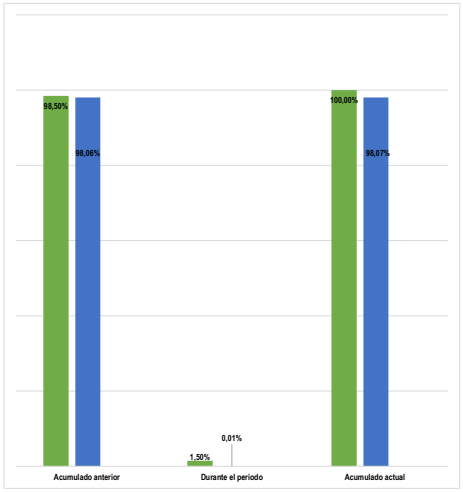

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	16,45%	0,11%	-16,34%	100,00%	78,73%	-21,27%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			**8,23%**	**0,06%**	**-8,17%**	**100,00%**	**89,37%**	**-10,64%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			**1,50%**	**0,01%**	**-1,49%**	**100,00%**	**98,07%**	**-1,93%**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 1.202.176,36		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 47.864.958,56		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 3.938.480,00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00%	100,00%	0,00%	$ 2.442.377,00		
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	72,45%	72,45%	0,00%	$ 30.745.060,45		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 4.876.338,24		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 19.445.268,58		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 147.566.406,88		
1080	ENGATIVA	LUCILA RUBIO DE LAVERDE	100,00%	100,00%	0,00%	$ 5.658.378,00		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	85,00%	85,00%	0,00%	$ 77.517.148,78		
1050	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 22.483.797,00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE B	70,00%	70,00%	0,00%	$ 10.066.280,00		
	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 93.938.430,00		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%	$ 6.823.040,00		
	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	90,00%	90,00%	0,00%	$ 112.835.798,06		
	ENGATIVA	PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ	0,00%	0,00%	0,00%	$ 149.667.331,20		
	ENGATIVA	NESTOR FORERO DE ALCALA - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	$ 59.664.771,00		
1016	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**71,61%**	**71,61%**	**0,00%**	**$ 796.736.040,11**	**$ 628.932.199,00**	**-$ 167.803.841,11**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3.659.259.269,00
VALOR PARCIAL N°1	$ 401.759.151,00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 392.605.364,00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 419.080.656,00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 335.248.214,00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 340.158.088,00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 962.858.748,00	
VALOR PARCIAL N°7	$ 267.388.536,00	
VALOR PARCIAL N°8	$ 220.148.211,00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 3.339.246.968,00	
SUMAS IGUALES		$ 320.012.301,00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 3.339.246.968,00	91,25%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 320.012.301,00	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	100,00%	98,07%	-1,93%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	457	-8,84

CURVA S

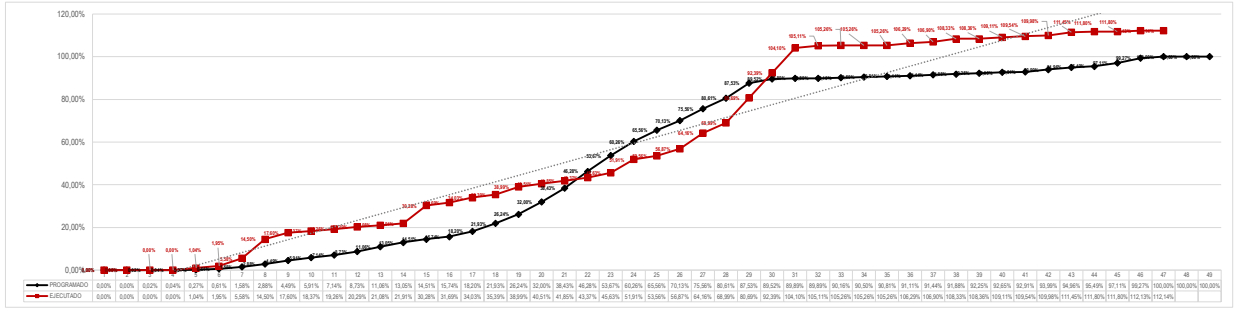

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2026	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
2	SEM 2	21/10/2026	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -
3	SEM 3	28/10/2026	$ 452.000,00	0,02%	0,00%	$ -	$ 452.000,00	0,02%	$ 452.000,00	0,00%	$ -
4	SEM 4	4/11/2026	$ 726.000,00	0,03%	0,00%	$ -	$ 726.000,00	0,04%	$ 1.178.000,00	0,00%	$ -
5	SEM 5	11/11/2026	$ 6.389.251,00	0,23%	1,04%	$ 29.416.873,00	-$ 23.027.622,00	0,27%	$ 7.567.251,00	1,04%	$ 29.416.873,00
6	SEM 6	18/11/2026	$ 9.620.826,00	0,34%	0,91%	$ 25.779.255,00	-$ 16.158.429,00	0,61%	$ 17.188.077,00	1,95%	$ 55.196.128,00
7	SEM 7	25/11/2026	$ 27.550.191,00	0,98%	3,63%	$ 102.559.453,00	-$ 75.009.262,00	1,58%	$ 44.738.268,00	5,58%	$ 157.755.581,00
8	SEM 8	2/12/2026	$ 36.491.532,00	1,29%	8,91%	$ 251.731.418,00	-$ 215.239.886,00	2,88%	$ 81.229.800,00	14,50%	$ 409.486.999,00
9	SEM 9	9/12/2026	$ 45.682.077,00	1,62%	3,10%	$ 87.572.933,00	-$ 41.890.856,00	4,49%	$ 126.911.877,00	17,60%	$ 497.059.932,00
10	SEM 10	16/12/2026	$ 39.901.460,00	1,41%	0,77%	$ 21.793.589,00	$ 18.107.871,00	5,91%	$ 166.813.337,00	18,37%	$ 518.853.521,00
11	SEM 11	23/12/2026	$ 34.900.709,00	1,24%	0,89%	$ 25.093.898,00	$ 9.806.811,00	7,14%	$ 201.714.046,00	19,26%	$ 543.947.419,00
12	SEM 12	30/12/2026	$ 44.803.303,00	1,59%	1,03%	$ 29.099.062,00	$ 15.704.241,00	8,73%	$ 246.517.349,00	20,29%	$ 573.046.481,00
13	SEM 13	6/01/2027	$ 65.790.932,00	2,33%	0,79%	$ 22.343.565,00	$ 43.447.367,00	11,06%	$ 312.308.281,00	21,08%	$ 595.390.046,00
14	SEM 14	13/01/2027	$ 56.247.989,00	1,99%	0,83%	$ 23.469.005,00	$ 32.778.984,00	13,05%	$ 368.556.270,00	21,91%	$ 618.859.051,00
15	SEM 15	20/01/2027	$ 41.234.728,00	1,46%	8,37%	$ 236.488.719,00	-$ 195.253.991,00	14,51%	$ 409.790.998,00	30,28%	$ 855.347.770,00
16	SEM 16	27/01/2027	$ 34.958.790,00	1,24%	1,41%	$ 39.956.792,00	-$ 4.998.002,00	15,74%	$ 444.749.788,00	31,69%	$ 895.304.562,00
17	SEM 17	3/02/2027	$ 69.362.324,00	2,46%	2,34%	$ 66.086.806,00	$ 3.275.518,00	18,20%	$ 514.112.112,00	34,03%	$ 961.391.368,00
18	SEM 18	10/02/2027	$ 105.342.386,00	3,73%	1,36%	$ 38.340.595,00	$ 67.001.791,00	21,93%	$ 619.454.498,00	35,39%	$ 999.731.963,00
19	SEM 19	17/02/2027	$ 121.849.038,00	4,31%	3,60%	$ 101.726.291,00	$ 20.122.747,00	26,24%	$ 741.303.536,00	38,99%	$ 1.101.458.254,00
20	SEM 20	24/02/2027	$ 162.551.206	5,75%	1,52%	$ 42.982.940,00	$ 119.568.266,00	32,00%	$ 903.854.742,00	40,51%	$ 1.144.441.194,00
21	SEM 21	3/03/2027	$ 181.799.979,00	6,44%	1,34%	$ 37.731.200,00	$ 144.068.779,00	38,43%	$ 1.085.654.721,00	41,85%	$ 1.182.172.394,00
22	SEM 22	10/03/2027	$ 221.633.716	7,85%	1,52%	$ 42.847.295,00	$ 178.786.421,00	46,28%	$ 1.307.288.437,00	43,37%	$ 1.225.019.689,00
23	SEM 23	17/03/2027	$ 208.747.364	7,39%	2,26%	$ 63.951.186,00	$ 144.796.178,00	53,67%	$ 1.516.035.801,00	45,63%	$ 1.288.970.875,00
24	SEM 24	24/03/2027	$ 186.145.269	6,59%	6,28%	$ 177.464.542,00	$ 8.680.727,00	60,26%	$ 1.702.181.070,00	51,91%	$ 1.466.435.417,00
25	SEM 25	31/03/2027	$ 149.758.087	5,30%	1,65%	$ 46.684.366,00	$ 103.073.721,00	65,56%	$ 1.851.939.157,00	53,56%	$ 1.513.119.783,00
26	SEM 26	7/04/2027	$ 129.089.554	4,57%	3,31%	$ 93.368.732,00	$ 35.720.822,00	70,13%	$ 1.981.028.711,00	56,87%	$ 1.606.488.515,00
27	SEM 27	14/04/2027	$ 153.455.255	5,43%	7,29%	$ 205.922.820,00	-$ 52.467.565,00	75,56%	$ 2.134.483.966,00	64,16%	$ 1.812.411.335,00
28	SEM 28	21/04/2027	$ 142.675.377	5,05%	4,83%	$ 136.535.783,00	$ 6.139.594,00	80,61%	$ 2.277.159.343,00	68,99%	$ 1.948.947.118,00
29	SEM 29	28/04/2027	$ 195.438.873	6,92%	11,70%	$ 330.548.693,00	-$ 135.109.820,00	87,53%	$ 2.472.598.216,00	80,69%	$ 2.279.495.811,00
30	SEM 30	5/05/2027	$ 56.148.389	1,99%	11,70%	$ 330.548.693,00	-$ 274.400.304,00	89,52%	$ 2.528.746.605,00	92,39%	$ 2.610.044.504,00
31	SEM 31	12/05/2027	$ 10.449.797	0,37%	11,70%	$ 330.548.693,00	-$ 320.098.896,00	89,89%	$ 2.539.196.402,00	104,10%	$ 2.940.593.197,00
32	SEM 32	19/05/2027	$ -	0,00%	1,01%	$ 28.542.222,29	-$ 28.542.222,29	89,89%	$ 2.539.196.402,00	105,11%	$ 2.969.135.419,29
33	SEM 33	26/05/2027	$ 7.610.997,19	0,27%	0,15%	$ 4.238.766,24	$ 3.372.230,95	90,16%	$ 2.546.807.399,19	105,26%	$ 2.973.374.185,53
34	SEM 34	2/06/2027	$ 9.768.829,83	0,35%	0,00%	$ 77.556,48	$ 9.691.273,35	90,50%	$ 2.556.576.229,02	105,26%	$ 2.973.451.742,01
35	SEM 35	9/06/2027	$ 8.748.496,46	0,31%	0,00%	$ 77.556,48	$ 8.670.939,98	90,81%	$ 2.565.324.725,48	105,26%	$ 2.973.529.298,49
36	SEM 36	16/06/2027	$ 8.435.451,79	0,30%	1,03%	$ 29.141.324,08	-$ 20.705.872,29	91,11%	$ 2.573.760.177,27	106,29%	$ 3.002.670.622,57
37	SEM 37	23/06/2027	$ 9.377.523,99	0,33%	0,60%	$ 17.088.844,05	-$ 7.711.320,06	91,44%	$ 2.583.137.701,26	106,90%	$ 3.019.759.466,62
38	SEM 38	30/06/2027	$ 12.438.524,11	0,44%	1,44%	$ 40.567.420,99	-$ 28.128.896,88	91,88%	$ 2.595.576.225,37	108,33%	$ 3.060.326.887,61
39	SEM 39	7/07/2027	$ 10.342.404,12	0,37%	0,03%	$ 759.662,73	$ 9.582.741,39	92,25%	$ 2.605.918.629,49	108,36%	$ 3.061.086.550,34
40	SEM 40	14/07/2027	$ 11.368.920,36	0,40%	0,74%	$ 21.019.420,25	-$ 9.650.499,89	92,65%	$ 2.617.287.549,85	109,11%	$ 3.082.105.970,59
41	SEM 41	21/07/2027	$ 7.414.110,12	0,26%	0,44%	$ 12.298.490,01	-$ 4.884.379,89	92,91%	$ 2.624.701.659,97	109,54%	$ 3.094.404.460,60
42	SEM 42	28/07/2027	$ 30.285.878,89	1,07%	0,44%	$ 12.458.803,48	$ 17.827.075,41	93,99%	$ 2.654.987.538,86	109,98%	$ 3.106.863.264,08
43	SEM 43	4/08/2027	$ 27.404.109,91	0,97%	1,47%	$ 41.599.471,97	-$ 14.195.362,06	94,96%	$ 2.682.391.648,77	111,45%	$ 3.148.462.736,05
44	SEM 44	11/08/2027	$ 14.952.840,10	0,53%	0,35%	$ 9.829.625,97	$ 5.123.214,13	95,49%	$ 2.697.344.488,87	111,80%	$ 3.158.292.362,02
45	SEM 45	18/08/2027	$ 45.762.755,02	1,62%	0,00%	$ -	$ 45.762.755,02	97,11%	$ 2.743.107.243,89	111,80%	$ 3.158.292.362,02
46	SEM 46	25/08/2027	$ 61.169.408,68	2,17%	0,33%	$ 9.379.500,35	$ 51.789.908,33	99,27%	$ 2.804.276.652,57	112,13%	$ 3.167.671.862,37
47	SEM 47	1/09/2027	$ 20.603.614,88	0,73%	0,01%	$ 171.214,75	$ 20.432.400,13	100,00%	$ 2.824.880.267,45	112,14%	$ 3.167.843.077,12
48	SEM 48	8/09/2027		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.824.880.267,45		$ 3.167.843.077,12
49	SEM 49	15/09/2027		0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.824.880.267,45		$ 3.167.843.077,12
			$ 2.824.880.267,45								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP´S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

0% 0%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizaron actividades de adecuación y mantenimiento en aulas, laboratorio y aula de informática, a los cuales se les realizó el cambio de cubierta. De igual manera, se efectuó el suministro e instalación de un aula modular y ejecucion de carcamo en parte posterior a las aulas intervenidas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizó el desmonte de las canchas existentes, seguido de actividades de excavación, conformación de subbase y ejecución de placa de concreto. Posteriormente, se efectuaron trabajos de pintura y demarcación de la cancha, incluyendo la señalización de los juegos infantiles. De igual manera, se realizó la pintura de las fachadas de todo el bloque y se ejecutó la adecuación de un cuarto de basuras y de un espacio destinado para los guardas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Frente de obra entregado

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el dia 26 de mayo

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Las obras fueron ejecutadas y entregadas mediante acta de reunión al almacenista, sin registrarse novedades.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizó la instalación de una estructura metálica independiente para la cubierta de las aulas modulares, con el fin de independizar este bloque y garantizar el soporte de la cubierta mediante su propia estructura. Adicionalmente, se ejecutaron muros aligerados para dividir y aislar el área destinada a las aulas, así como la pintura interna de los salones. También se intervino el salón de archivo ubicado en la zona de oficinas, realizando trabajos de pintura.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ

1. Actividades Tecnicas: De acuerdo con la visita de verificación de labores, se solicitó corregir el empalme de la tubería eléctrica e instalar un flotador eléctrico adicional en uno de los tanques de almacenamiento de agua, con el fin de generar la alerta en caso de rebosamiento de cualquiera de los dos tanques.

2. Seguridad Social y SST: N/A
3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Se continua con la **e**laboracion de muro en mamposteria, armado de acero para viga y aseo

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al levantamiento de muro en mampostería, así como jornadas de orden y aseo en el frente de obra. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el desarrollo de las actividades y las condiciones de seguridad implementadas.
Asimismo, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las labores ejecutadas. De igual manera, se reiteró la importancia de continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo, garantizando el adecuado almacenamiento de materiales y herramientas, así como el retiro oportuno de residuos y escombros, con el fin de mantener condiciones seguras y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)
LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos y material de construcción, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se definio que esta sede debera encontrarse finalizada el 2 de septiembre

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución, en consecuencia, no se registró presencia de personal ejecutando labores ni actividades relacionadas con el componente de SST
La Interventoría recomienda que, en caso de requerirse el ingreso de personal para la atención de observaciones o actividades pendientes, se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, incluyendo el uso adecuado de los EPP la señalización y delimitación de las áreas de trabajo y las condiciones adecuadas de orden y aseo

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

- **LA PALESTINA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 04 de junio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 08 de julio del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 15 de diciembre del 2025. Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.
- **TABORA - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobacion por parte de la SED de NP

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron rampas de acceso que permiten la comunicación entre la zona verde y las aulas de primera infancia, facilitando el ingreso y tránsito hacia los salones. Adicionalmente, se construyeron columnetas como elementos de soporte para las puertas de acceso a las aulas, las cuales permiten delimitar y garantizar la seguridad entre la zona verde y los espacios destinados a primera infancia.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se ejecutó actividad de desmonte de puertas existentes y suministro e instalación de puertas nuevas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra:

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina)

1. Actividades Tecnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: La zona fue entregada a la instutucion y a la fecha no se reportan novedades

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizaron actividades de actividades de pintura en electrostática y suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUICILA RUBIO LA VERDE

1. Actividades Tecnicas: Las labores ya se finalizaron

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizó el suministro e instalación de baños portátiles como medida de contingencia ante la afectación de los baños principales de la sede

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: La interventoría solicita al contratista realizar correcciones relacionadas con el enchape y win metálico.
Se realizaron las actividades de cambio de enchape previamente solicitadas. Sin embargo, se encuentra pendiente la instalación de las divisiones, la cual se tiene prevista para la próxima semana.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes al desmonte de puerta y cambio de enchapes en los baños de hombres y mujeres ubicados en la planta 3. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades de desmonte y enchape. De igual manera, se recomendó implementar jornadas de orden y aseo, realizando el retiro oportuno de escombros, residuos y materiales producto de las actividades, con el fin de mantener condiciones seguras y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: La interventoría solicita mejorar los acabados de los baños, debido a deficiencias en la aplicación de la boquilla, presencia de excedentes de material y desalineaciones, requiriendo mayor cuidado en la ejecución. En atención a estas observaciones, se han adelantado actividades de corrección y mejora del enchape.
Adicionalmente, se evidenció movimiento en las divisiones fijas, por lo que se solicitó reforzar su fijación para garantizar su estabilidad. Se recuerda que en los baños del tercer piso se debe realizar el retiro de las piezas de enchape fracturadas, con el fin de permitir la instalación de las puertas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra:
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tuberia RCI. A la espera de aprobacion de NP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realiza reemboquillado, junta de dilatacion y lavado de mampostreria en aula No.10

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al reemboquillado y lavado de mampostería en el aula 10, así como a la elaboración de junta de dilatación en la misma área. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que los materiales se encontraban adecuadamente acopiados y organizados.
Sin embargo, se recomendó al contratista implementar la respectiva señalización y delimitación de los materiales acopiados, con el fin de facilitar su identificación y evitar condiciones inseguras para el personal y la comunidad educativa. Asimismo, se reiteró la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencio el retiro de los residuos y material de construcción, al igual realizo jornada de orden y aseo e implemento todas las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se identificó que el caudal actual no es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La supervisión solicita aplazar la intervención debido a aspectos presupuestales. Por lo anterior, no se realizará la intervención en la sede hasta contar con la respectiva autorización.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: El día 21 de agosto se realizó una reunión con los especialistas eléctricos, en la cual se revisó la necesidad de intervención de las redes eléctricas en zonas de circulación y áreas externas. Como resultado, el contratista remitirá un NP asociado al ítem de tubería metálica IMC conduit galvanizado, requerido para la ejecución de las redes en las zonas mencionadas. Se encuentra pendiente que el contratista remita la propuesta final y el respectivo NP, con el fin de continuar con el debido proceso para su revisión y aprobación.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza el desmonte de las láminas transparentes existentes en el punto fijo de la cubierta y su reemplazo mediante el suministro e instalación de policarbonato translúcido, conservando las condiciones y características requeridas para la zona.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Actividades terminada sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuaron las labores de limpieza y desinfección de tanques por solicitud de la supervision.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR

1. Actividades Tecnicas: Se realizó el suministro e instalación de piso en el área de la pérgola. De igual manera, se avanzó en el mantenimiento del cerramiento y se continuó con la aplicación de pintura en el área de contingencia.

2. Seguridad Social y SST: Se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a cada una de las actividades ejecutadas. De igual manera, se recomendó implementar jornadas de orden y aseo durante y al finalizar la jornada laboral, realizando el adecuado almacenamiento de materiales y herramientas y el retiro oportuno de residuos, con el fin de mantener condiciones seguras en las áreas intervenidas y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos (volumen medio), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Se realizan observaciones de la estructura de la pérgola, la cual debe ser rematada correctamente. De igual manera, se presentan observaciones sobre la placa ejecutada frente al aula modular, debido a la presencia de una caja que genera un desnivel y puede ocasionar tropiezos, representando una condición de riesgo. Se solicita realizar el ajuste correspondiente para garantizar una superficie segura y adecuada para la circulación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PLAZUELA DE ALAMOS - ANA GALVIS ORTIZ

1. Actividades Tecnicas: Se realizó visita conjunta con la supervisión, interventoría y obra, en la cual se definieron la ubicación y las condiciones para la instalación del cerramiento. La supervisión informó que notificará con anticipación la fecha de evacuación de los habitantes del lote, con el fin de que el contratista coordine el ingreso temprano del material y este se encuentre disponible en sitio para iniciar oportunamente la instalación del cerramiento rígido.
De igual manera, se estableció la instalación de concertina sobre el cerramiento, el cual contará con dos puertas, así como la disposición de un baño y campamento.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El lote actualmente presenta ocupacion informal, por lo que posterior al retido de la poblacion que habita el espacion se realizara cerramiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realizó visita de verificacion conjunta contratista e interventoria en compañia de la coordinadora y se levanta acta de vecindad

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

OBSERVACION: Se actualizacion en la tabla de los valores unitarios de las emergencias

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS FIMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRÁN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRÁULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRIGUEZ
ASESOR JURÍDICO

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Corte, desmonte y sustitución de un tramo de malla eslabonada deteriorada en el cerramiento perimetral (0.80 X 2.50).



Se realiza la fabricación en sitio de la tapa de concreto reforzado y la fijación del marco metálico para una caja de inspección de alcantarillado.



Ejecución de segunda mano de pintura tipo vinilo sobre muros interiores en el área del aula múltiple, previa preparación de superficie y resanes puntuales.



Replanteo, figuración e instalación de piso en tablón de gres (0.30 X 0. 30) sobre placa de contrapiso en el área de la pérgola metálica.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **36** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Levantamiento de muro en mampostería



Armado de estructura y formaletas para fundida de viga de amarre



Relleno perimetral al muro



Limpieza de area y retiro de escombros

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 18**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO SEDE A



Retiro de la hilada de ladrillo a la vista adosada a la cara inferior de la viga de concreto reforzado para permitir la junta de dilatación



Afinado y reposición de junta de mortero en muros de ladrillo a la vista que presentaban desgaste o faltantes de pega.



Elaboración de junta de dilatación en el aula 10.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JUAN DE CORRAL SEDE A



Desmonte de puerta y reposicion de enchape en los baños de la planta 3



Instalacion total de enchape en baño del polideportivo

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA
CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, la empresa PROBINTEC contó, durante el mes de agosto de 2026, con ocho (8) mujeres vinculadas para el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución del contrato. La información relacionada con la vinculación del personal corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos soportes laborales, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad, cuando corresponda.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales y para los fines pertinentes.

Se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC S.A.S. – NIT 829001061-1

INFORMACIÓN DE PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN SEXO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL – FECHA DE REPORTE: ago-26

VARIABLE	MUJERES	HOMBRES
Total contratados en el mes	8	8
Rango salarial mínimo	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Rango salarial máximo	$ 9.900.000	$ 9.900.000
Discapacidad	0	0
Pertenencia étnica	0	0
Víctimas del conflicto armado	0	0
Cuidador(a)	0	0

MATRIZ DE RIESGOS – SEGUIMIENTO DEL PERIODO

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8168931 – Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155350 – Lote 18
Informe Mensual de Interventoría No. 11 – Periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026

No.	TIPO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MEDIDA DE TRATAMIENTO / CONTROL	RESPONSABLE	ESTADO AL CORTE
1	Técnico	Retraso en la aprobación de ítems no previstos (DILE, RCI Juan del Corral, IMC San José Norte) que impide terminar o iniciar frentes de emergencia.	Media	Medio	Seguimiento semanal en comité; remisión oportuna de NP a la SED (oficios 830 y 843); requerimiento de soportes completos al contratista.	Interventoría / Contratista	En seguimiento
2	Técnico	Actividades pendientes en República de Colombia – Sede B (fachada, anclajes, aseo final) al cierre de la Adición No. 2.	Baja	Medio	Control diario de la programación; ejecución dentro del plazo vigente (31/12/2026); entrega formal del frente.	Contratista	En seguimiento
3	Social / Predial	Ocupación informal del predio Plazuela de Álamos que impide iniciar el cerramiento (Modificatorio No. 3).	Alta	Medio	Coordinación con la Supervisión para la desocupación; ingreso anticipado de materiales una vez se notifique la fecha.	SED / Contratista	En seguimiento
4	Financiero	Agotamiento del rubro de emergencias frente a nuevas solicitudes (saldo por asignar $142.196.158,89).	Media	Alto	Control del balance de emergencias en cada informe semanal; priorización de frentes con la Supervisión (aplazamiento Jorge Gaitán Cortés – Sede A).	Interventoría / SED	Controlado
5	Contractual	Vencimiento o insuficiencia de garantías frente al Modificatorio No. 3.	Baja	Alto	Revisión y aprobación de pólizas (oficio 880); verificación de vigencias hasta 02/01/2027 y valores sobre $3.969.259.269.	Interventoría	Controlado
6	SST	Trabajo en alturas con andamios o accesos inadecuados (República de Colombia – Sede B, cubiertas Magdalena Ortega – Sede A).	Media	Alto	Inspecciones SST, exigencia de plataformas de trabajo, línea de vida, certificados de alturas y ATS; suspensión de prácticas inseguras.	Contratista / Interventoría SST	Controlado
7	Ambiental	Acumulación de RCD y material en frentes activos.	Media	Bajo	Recorridos ambientales semanales; disposición con gestores autorizados conforme al PMA y PGRCD; jornadas de orden y aseo.	Contratista / Interventoría ambiental	Controlado

No.	TIPO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MEDIDA DE TRATAMIENTO / CONTROL	RESPONSABLE	ESTADO AL CORTE
8	Calidad	Deficiencias en acabados (enchapes y divisiones en Juan del Corral – Sede A; remates de pérgola en Simón Bolívar – Sede A).	Media	Medio	Visitas de verificación, solicitudes de corrección y recibo condicionado a subsanación.	Contratista	En seguimiento
9	Operativo	Afectación a la comunidad educativa por intervenciones en jornada escolar.	Media	Medio	Conciliación de horarios con las instituciones, cerramientos y señalización; acompañamiento de la profesional social de la SED.	Contratista / SED	Controlado
10	Financiero	Diferencia entre obra ejecutada y facturada al cierre contractual.	Media	Medio	Conciliación de cantidades y memorias en cada acta parcial (Acta No. 9 autorizada el 18/09/2026).	Interventoría / Contratista	En seguimiento

_____

ARQ. ROCÍO LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Directora de Interventoría – PROBINTEC S.A.S.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8168931 – Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155350 – Lote 18
Informe Mensual de Interventoría No. 11 – Periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026

Comunicaciones emitidas en el periodo (03/08/2026 – 02/09/2026)

OFICIO	FECHA	TIPO	DESTINATARIO	ASUNTO
PROBINTEC-LOTE6-807	06/08/2026	Salida	Consorcio Educativo 25	Solicitud informe mensual ambiental No. 10 – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-812	10/08/2026	Salida	Consorcio Educativo 25	Aprobación informe mensual ambiental No. 10 – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-813	11/08/2026	Salida	Consorcio Educativo 25	Aprobación Informe Mensual SST No. 10 – V1
PROBINTEC-LOTE6-815	11/08/2026	Salida	SED	Radicación Informe Mensual SST No. 10 – V1
PROBINTEC-LOTE6-823	12/08/2026	Salida	SED / Consorcio Educativo 25	Aprobación planillas de seguridad social – Acta No. 8
PROBINTEC-LOTE6-827	12/08/2026	Salida	SED	Radicación informe mensual ambiental No. 10 – Lote 18
PROBINTEC-LOTE6-830	19/08/2026	Salida	SED	Remisión aprobación ítems no previstos NP 04 al 10
PROBINTEC-LOTE6-843	29/08/2026	Salida	SED	Remisión aprobación ítems no previstos NP 11, 12 y 17 al 21

Comunicaciones emitidas con posterioridad al corte, relacionadas con el periodo

OFICIO	FECHA	TIPO	DESTINATARIO	ASUNTO
PROBINTEC-LOTE6-863	07/09/2026	Salida	Consorcio Educativo 25	Solicitud informe mensual ambiental No. 11
PROBINTEC-LOTE6-880	09/09/2026	Salida	SED	Remisión y aprobación de pólizas Modificatorio No. 3
PROBINTEC-LOTE6-882	09/09/2026	Salida	Consorcio Educativo 25	Observaciones ítems no previstos NP 22 al 29
PROBINTEC-LOTE6-888	11/09/2026	Salida	Consorcio Educativo 25	Aprobación informe mensual ambiental No. 11
PROBINTEC-LOTE6-889	11/09/2026	Salida	Consorcio Educativo 25	Aprobación Informe Mensual SST No. 11 – V1
PROBINTEC-LOTE6-891	11/09/2026	Salida	SED	Radicación Informe Mensual SST No. 11 – V1
PROBINTEC-LOTE6-896	15/09/2026	Salida	SED / Consorcio Educativo 25	Aprobación planillas de seguridad social – Acta No. 9

Se anexan a continuación las copias de los oficios relacionados.

BITACORA COLEGIO SIMON BOLIVAR AGOSTO 2026

Sabado, 1 de agosto 2026
personal Ingoriente 1 of - 2ay.
Actividades:
- Ingresa material de tuberia para bajantes.
- Se instalan bajantes en aula informatica.

Res. Obra.

Lunes, 3 de agosto 2026
personal Ingorientes 1 of - 3 ayud.
Actividades:
- Se inicia cortes de placa para instalación de bajantes cortado trafero aulas 1-2 y informatica.
- Se intala y se funden tuberia en los espacios anteriores nombrados.

Res. Obra

Martes, 4 de agosto 2026
Personal 1 oF, 3 ayu.
Actividades:
- se ajustan niveles y se funde canvela en espacio de placa frente modular.

-

Res Obra

000372

Miercoles, 5 de agosto 2026
personal : 1 of, 3 ayu.

Actividades :
- Se realiza realce de caja de aguas negras
- Se realiza nivelacion de cañuela en zona de pergola y zona verde.
- Se inicia a instalar estructura metalica con parales 10x10.
-

Res. Obra.

Jueves, 6 de agosto 2026
Personal : 1 of, 3 ayud.
Actividades :
- Se realiza fundida de cañuela en zona de pergola
-

Viernes, 7 de agosto 2026.
personal en obra : 1 instalador.

Se realiza instalacion de (pasto) Cesped en zona de pergola.

Sabado, 8 de agosto. 2026.
El personal se traslada a otra obra para apoyo de actividades

Lunes, 10 Agosto 2026.
Personal en obra. 1 Oficial
2 Ayudantes.
Se realiza fundida de dados bajantes de los canales.
Se inicio instalacion estructura Metalica pergola.

Martes, 11 de agosto 2026
personal en obra, 1 oficial
3 Ayudantes.

Se realiza desmbre de dados bajantes.
Se continua con instalacion estructura metalica pergola..
Se inicia con la desinstalacion y arreglo de vanos para cambio de puertas en rectoria, Administracion y orientacion.

Miercoles 12, Agosto 2026.
Personal en Obra. 1 Oficial
3 Ayudantes.
2 Ornamentadores.

Se continua con instalacion de estructura metalica de la pergola.
Se continua con arreglo de vanos para instalacion de Puertas.
Se inicia cambio de Mallas Cerramiento perimetral

Jueves. 13 Agosto 2026
Personal en obra. 1Oficial
2Ayudantes.

Se instala Puerta de Oficina Rector.
Se continua con estuco y pintura de Vanos para puerta Admin.
Se Continua con Mantenimiento de Cerramiento Perimetral.

Viernes 14 agosto 2026.
Personal en obra 1Oficial
3Ayudantes.
1Ornamentador.
Se inicia con estuco en Aula Multiple
Se Continua con la instalacion de puertas en las oficinas.
Se Continua con Mantenimiento al cerramiento Perimetral

Sabado 15 agosto 2026.
Personal en obra. 1Oficial
3Ayudantes.
Se continua con estuco y lijado en aula Multiple
Instalación de Mallas en Cerramiento Perimetral
Instalacion estructura Metalica Pergola.

Norma

Powered by CamScanner

000375

Lunes. 17 agosto 2026.

Dia Festivo.

Martes, 18 agosto 2026.
personal en obra. 2 Oficiales.
4 Ayudantes.

Se continua con instalacion de Mallas y angulos en el cerramiento perimetral.

Miercoles. 19 agosto 2026.
personal en obra. 1 Ornamentador.
4 Ayudantes
1 Oficial

Se continua con estuco y lijado de Aula Multiple.
Se realiza retiro de escombros.
Se realizo pintura de bajantes de Canales.

Jueves 20 Agosto 2026.
personal en Obra. 4 Ayudantes.
1 Oficial
1 Ornamentador.
Se inicia pintura de Muros en Aula Multiple
Se continua con instalacion de Mallas y Angulos Cerramiento Perimetral.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes, 21 Agosto 2026.
Personal en obra. 2 Ayudantes.

Se Continua con resanes y Pintura en aula Multiple.

Sabado, 22 Agosto 2026.
Personal en obra 2 Ayudantes.

Se Continua con resanes y pintura en aula Multiple.

Lunes, 24 Agosto 2026.
Personal en Obra 2 oficiales
3 Ayudantes.

Se realiza polido de placa al frente de aula Multiple.
Se Continua con instalacion de malla y Angulos en Cerramiento perimetral.
llega pipa en Greo para area de pergola.

Martes, 25 Agosto 2026.
personal en obra 2 oficiales.
1 Ayudante
1 ornamentador.

Se realiza pintura en dados de bayonetas de la Cercles.

Powered by CamScanner

000377

Se realiza lijado y posterior pintura en estructura metalica de la pergola.
Llega policarbonato para la pergola.
Se inicia instalacion de grez (piso) zona de pergola.
Se continua con instalacion de malla y angulos cerramiento perimetral.

Miercoles 26 Agosto 2026.
personal en obra 1 ornamentador.
3 Ayudantes.

Se realiza enchape de piso grez zona pergola.
Pintura en aula multiple.
Instalacion Angulos en Cerramiento.

Jueves 27 Agosto 2026.
Personal en obra. 1 oficial
1 ornamentador.
Se continua con instalacion de grez en zona de pergola.
Se continua con instalacion de malla y angulos en cerramiento perimetral.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes, 28 agosto 2026
Personal en obra. 1 Oficial
1 Ayudante.

Se continua con instalacion de piso en gres en zona de pergola.
Se realiza Corte para cañuela en placa al frente Aula Multiple.

Sabado, 29 Agosto 2026.
Personal en Obra. 1 Oficial
1 Ayudante.

Se continua con instalacion de piso en Gres zona pergola.
Se realiza emboquillado de piso gres.

Lunes. 31 agosto 2026.
Personal en Obra. 1 Oficial
1 Ayudante.

Se realiza emboquillado de piso en gres zona Pergola.
Se inicia instalación de Grouilla mona en zona de pergola.

Powered by CamScanner

000379

Martes 1 de septiembre 2026.
personal en obra 1 oficial
1 Ayudante.

Se realiza jornada de orden y aseo
Se hace recolección de chatarra
Se finaliza instalación de Gradilla Mona.

Miercoles 2 de septiembre 2026.
personal en obra. 1 oficial
4 Ayudantes.

Se realiza aseo en aula Multiple.
Se realiza Dyoote en rejillas de Sarcamo
Se hace excavación para sarcomo placa
al lado de aula Multiple.

Norma

Powered by CamScanner

Jueves	6 Agosto 2026. Personal en obra 1 oficial De diciembre 4 colamco. Jornada de 9 den 4 0 2 0 0.
Sabado.	8 Agosto 2026 Personal en obra 1 Maestro 2 Ayudantes 2 oficiales. Llega ladrillo para muros. descargue de camión trasiego de ladrillo.

Scanned with CamScanner

CONDOR

lunes.	10 Agosto 2026. Personal en obra. 1 oficial 1 Ayudante. llega material para mezcla pega mampostería. Se Inicia modulación de ladrillo para muro mampostería
Martes	11 Agosto 2026. Personal en obra. 1 oficial 1 Ayudante. Se inicia levantamiento de muros en mampostería del eje 14 al 13 Se realiza instalación de Grapa cada 6 Hiladas.

Miercoles	12 Agosto 2026 personal en obra. 1 Ayudante 1 Oficial Se continua con levantamiento de muros en mampostería.
Jueves	13 Agosto 2026. personal en obra 1 Oficial 1 Ayudante. Se continua con levantamiento de muros en mampostería.

Scanned with CamScanner

CONDOR

En recorrido con interventoria donde se llega a acuerdo en el muro existente de colegio al costado oriente y muro nuevo.
- Se deja dilatado con icopor.
- Se deja dovela con acero de refuerzo

Viernes 14 Agosto 2026.
personal en obra. 1 oficial
1 Ayudante.

Se continua con levantamiento de muros en mampostería.


Sabado	15 Agosto 2026 Personal en obra. 2oficiales. 1maestro. Se continua con levantamiento de muros en Mampostería.
Martes	18 Agosto 2026. Personal en obra. 1 oficial 2 Ayudantes. Se continua con levantamiento de muros en Mampostería. Figurado de Refuerzo longitudinal para Viga de Amarre.

Scanned with CamScanner

CONDOR

En comité de obra: se define lo siguiente:

- Continuar con la sección de viga corona propuesta 0.12 x 0.20 y continuar la sección de columna hasta la parte alta de la viga corona. (0.25x0.25)

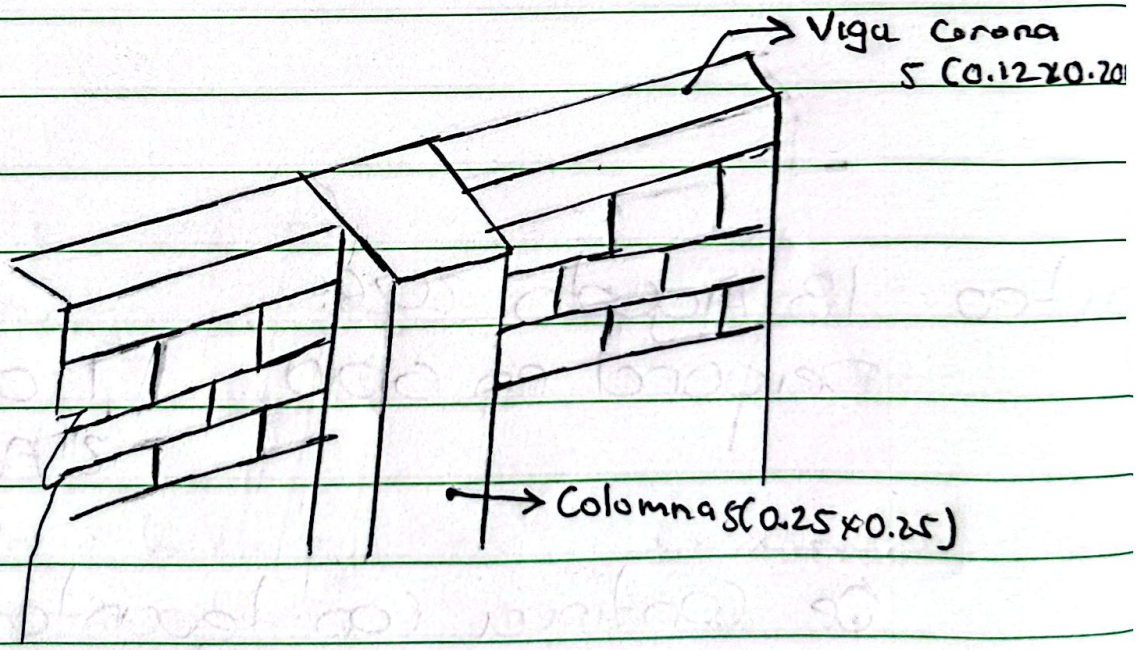

Miercoles,	19 de agosto 2026 Personal 1 Maestro 2 oficiales Actividades: - Se continua la instalacion de mamposteria, grafil y 100por. - Se inicia el amarrado acero en viga corona.
Jueves,	20 de agosto 2026 Personal 1 Maestro 1 oficiales Actividades - Se continua la instalacion de mamposteria, grafil 4mm y 100por 1cm. - Se continua el amarre de acero en viga Corona.

Scanned with CamScanner

CONDOR

Viernes,	21 de agosto 2026
	Personal : 2 oficiales
	- Se continua la instalación de mampostería
	- Se ingresa madera para viga amarre o viga corona.
Sabado,	22 de agosto 2026
	Personal : 1 maestro
	- Se continua con el amarrado de acero.

Scanned with CamScanner

Lunes, 24 de agosto 2026

Personal : 1 maestro
1 ayudantes

- Se realiza jornada de aseo
- Se ingresa tierra negra para relleno al costado sur de la viga.
- Se continua con el amarre de la viga

Martes, 25 de agosto 2026

Personal : 1 maestro
2 ayudantes

- Se continua con el lleno de tierra negra en el costado sur de la viga
- Se continua con la tierra negra en compactacion
- Se continua con mamposteria en los ejes 3-4-5.
- Se realiza mantenimiento en cerramiento.

Scanned with CamScanner

CONDOR

Miercoles,	26 de Agosto 2026 Personal 2 ayudantes 1 oficial - Se continua con la instalacion de mampusteria de los ejes 2-3 y se inicia 1-2. - Se realiza instalacion de adoquin en el costado de la sede A.
Jueves,	27 de agusto 2026 personal 1 oficial 3 ayudantes - Se realiza armado formaleta viga co - Se finaliza la mampusteria - Se inicia el armado de acero de los muros ya finalizado

Scanned with CamScanner

Viernes,	28 de agosto 2026 Personal 1 oficial 3 ayudantes - Se realiza la fundida de viga-corona
Sabado,	29 de agosto 2026 Personal 1 oficial 3 ayudantes - Se desencofra la viga-corona - Se realiza aseo en area - Se realiza lavado con acido - Se realiza placa de concreto en curtado side A - Oeciendente. -

Scanned with CamScanner

CONDOR

Domingo, 30 de agosto 2026

personal 1 oficial
4 ayudantes

- Se continua el tarreado de mamposterías con acido costado B.
- Se inicia el impermeabilizado con hidrofugo en el costado sede A

Lunes, 31 de agosto 2026

personal 1 oficial
3 ayudantes

- Se continua con hidrofugo de fachada.
- Se realiza retiro de Cerramiento
- Se realiza aseo de obra y retiro de escombro.

Scanned with CamScanner

Martes, 1 de septiembre 2026

Personal · 1 Oficial
3 ayudantes.

- Se continua con hidrofugo de fachada.
- Se realizan remates de columnas.


Miercoles, 2 de septiembre 2026

Personal 1 oficial
3 ayudantes

- Se realiza aseo de obra.

Scanned with CamScanner


Id	Modo de	Item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1			**PROGRAMACIÓN DE OBRA V1 IED TÈCNICO PALERMO**			**87 días**	**mar 19/05/26**	**jue 27/08/26**		**$ 161,660,123.47**
2			**INICIO DE OBRA**			**0 días**	**mar 19/05/26**	**mar 19/05/26**		**$ 0.00**
3		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**58 días**	**mar 19/05/26**	**lun 27/07/26**		**$ 7,197,586.82**
4		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**20 días**	**mar 19/05/26**	**jue 11/06/26**		**$ 1,571,978.63**
5		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	356.41	20 días	mar 19/05/26	jue 11/06/26	2	$ 1,571,978.63
6		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**36 días**	**jue 11/06/26**	**jue 23/07/26**		**$ 4,885,366.76**
7		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	33.50	7 días	jue 11/06/26	vie 19/06/26	5	$ 778,210.86
8		1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.45	7 días	jue 11/06/26	vie 19/06/26	7CC	$ 84,662.83
9		1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.79	7 días	sáb 20/06/26	mar 30/06/26	8	$ 697,733.56
10		1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35.47	7 días	mar 30/06/26	mar 7/07/26	9	$ 950,707.29
11		1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	65.00	7 días	mar 7/07/26	mié 15/07/26	10	$ 810,292.84
12		1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	48.00	5 días	mié 15/07/26	mar 21/07/26	11	$ 373,493.91
13		1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	120.00	5 días	mar 7/07/26	lun 13/07/26	11CC	$ 548,926.74
14		1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.52	5 días	lun 13/07/26	sáb 18/07/26	13	$ 271,324.55
15		1.2.47	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.52	5 días	lun 13/07/26	sáb 18/07/26	14CC	$ 86,324.79
16		1.2.49	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	8.38	5 días	sáb 18/07/26	jue 23/07/26	15	$ 283,689.39
17		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**58 días**	**mar 19/05/26**	**lun 27/07/26**		**$ 740,241.43**
18		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20	M3	14.00	45 días	mar 19/05/26	sáb 11/07/26	2	$ 506,402.90
19		1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	14.36	2 días	vie 24/07/26	lun 27/07/26	6	$ 233,838.53
20		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**vie 24/07/26**	**vie 31/07/26**		**$ 12,517,904.09**
21		**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**vie 24/07/26**	**vie 31/07/26**		**$ 12,517,904.09**
22		2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	563.85	7 días	vie 24/07/26	vie 31/07/26	6	$ 12,517,904.09
23		**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**11 días**	**jue 13/08/26**	**mar 25/08/26**		**$ 23,150,002.47**
24		5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN	4.00	2 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26	37	$ 528,770.13
25		5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	4.00	2 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26	24CC	$ 129,521.14
26		5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	86.41	3 días	jue 13/08/26	lun 17/08/26	25CC	$ 2,098,571.43
27		5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	86.41	3 días	lun 17/08/26	jue 20/08/26	26	$ 1,446,457.92
28		5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESOR	UN	48.00	3 días	lun 17/08/26	jue 20/08/26	27CC	$ 9,016,397.37
29		5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS	UN	48.00	5 días	jue 20/08/26	mar 25/08/26	28	$ 9,930,284.48

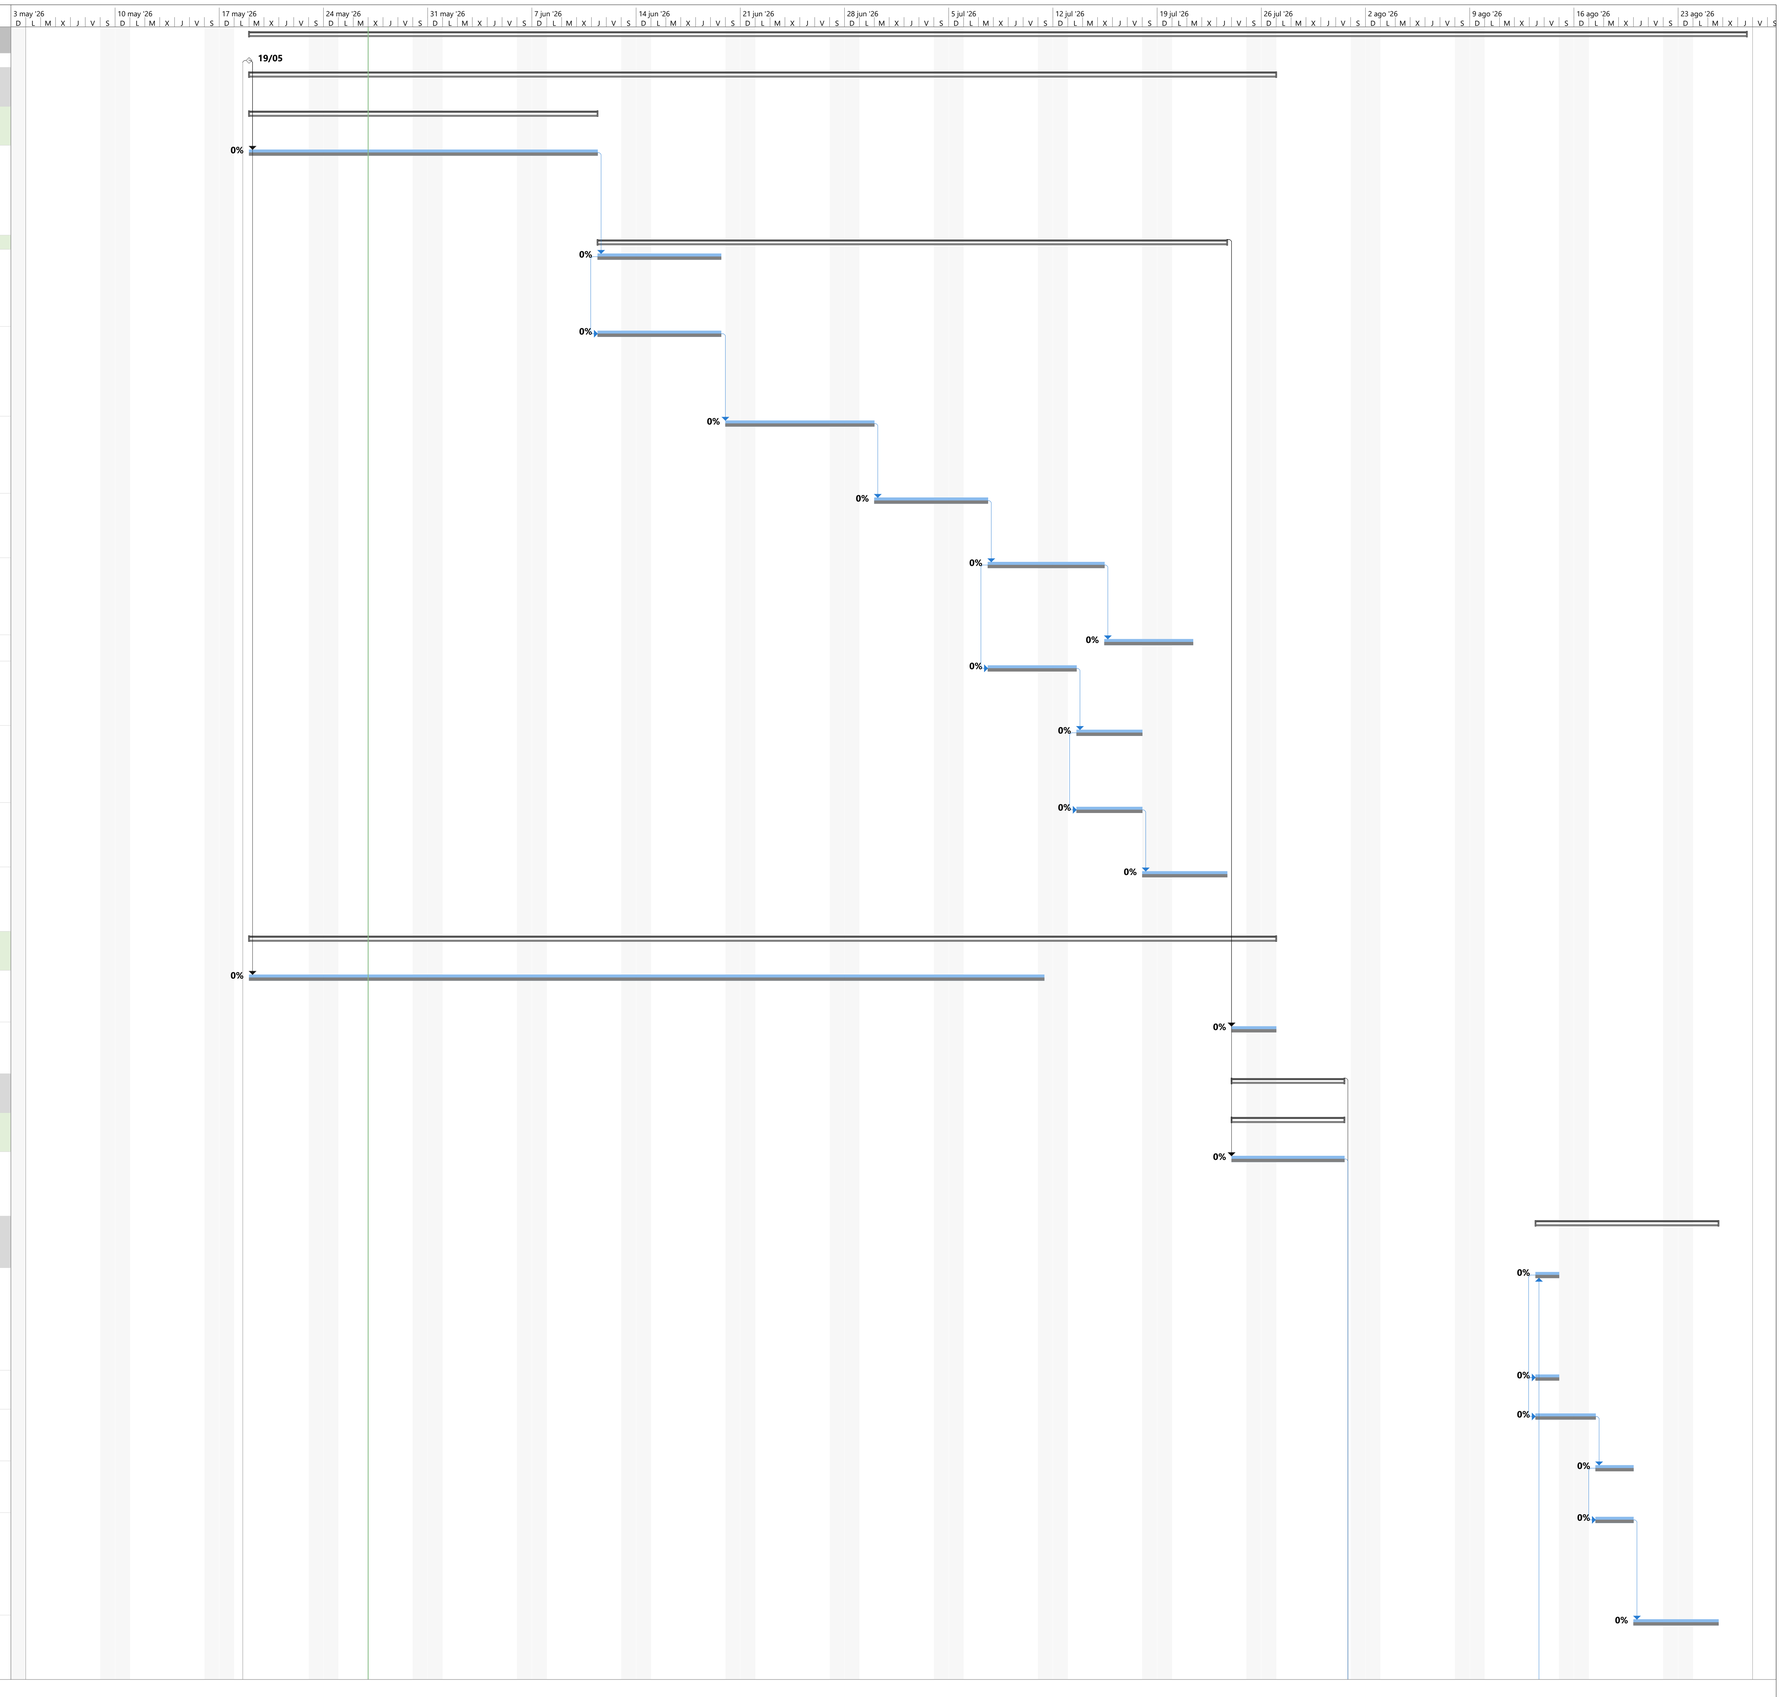

Proyecto: PROGRAMACIÓN V1
Fecha: mié 27/05/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de	Item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
30		**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**17 días**	**vie 31/07/26**	**jue 20/08/26**		**$ 3,657,487.41**
31		**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**vie 31/07/26**	**sáb 8/08/26**		**$ 473,414.02**
32		7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	11.52	7 días	vie 31/07/26	sáb 8/08/26	20	$ 473,414.02
33		**7.2**	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**10 días**	**sáb 8/08/26**	**jue 20/08/26**		**$ 3,184,073.39**
34		7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	11.52	7 días	sáb 8/08/26	lun 17/08/26	32	$ 2,526,401.36
35		7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	8.38	3 días	lun 17/08/26	jue 20/08/26	34	$ 657,672.03
36		**8**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**11 días**	**vie 31/07/26**	**jue 13/08/26**		**$ 53,664,131.48**
37		8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	323.69	11 días	vie 31/07/26	jue 13/08/26	22	$ 53,664,131.48
38		**9**	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**lun 24/08/26**	**jue 27/08/26**		**$ 23,783,084.65**
39		**9.2**	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**lun 24/08/26**	**jue 27/08/26**		**$ 23,783,084.65**
40		9.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS BASCULANTES SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO 4 MM INCOLORO, PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE	M2	28.22	4 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26	44	$ 15,577,560.75
41		9.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 3 CUERPOS DE VIDRIO LAMINADO 3+3 O PERSIANA INFERIOR, PELICULA SAMBLASTIADA HORIZONTAL DE 1CM, CERRADURA TIPO TEJO CON MARIPOSA INTERIOR Y MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE ANCLAJES Y DE ACUERDO A	M2	14.69	4 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26	40CC	$ 8,205,523.90
42		**12**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**6 días**	**mié 19/08/26**	**mar 25/08/26**		**$ 15,297,000.86**
43		**12.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**6 días**	**mié 19/08/26**	**mar 25/08/26**		**$ 15,297,000.86**
44		12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	647.39	4 días	mié 19/08/26	lun 24/08/26	49	$ 14,565,673.83
45		12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	40.80	2 días	lun 24/08/26	mar 25/08/26	44	$ 731,327.03
46		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**44 días**	**vie 29/05/26**	**mié 22/07/26**		**$ 1,731,455.03**
47		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	356.41	44 días	vie 29/05/26	mié 22/07/26	2CC+10 días	$ 1,731,455.03
48		**NP**	**NO PREVISTOS**			**25 días**	**mié 22/07/26**	**mié 19/08/26**		**$ 20,661,470.66**
49		**NP 006**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO TIPO FRESCASA Eco Foil 3-1/2Pg 15.24x1.22m 18m2	M2	323.69	5 días	jue 13/08/26	mié 19/08/26	37	$ 20,661,470.66
50			**FIN DE OBRA**			**0 días**	**mié 22/07/26**	**mié 22/07/26**	**47**	**$ 0.00**

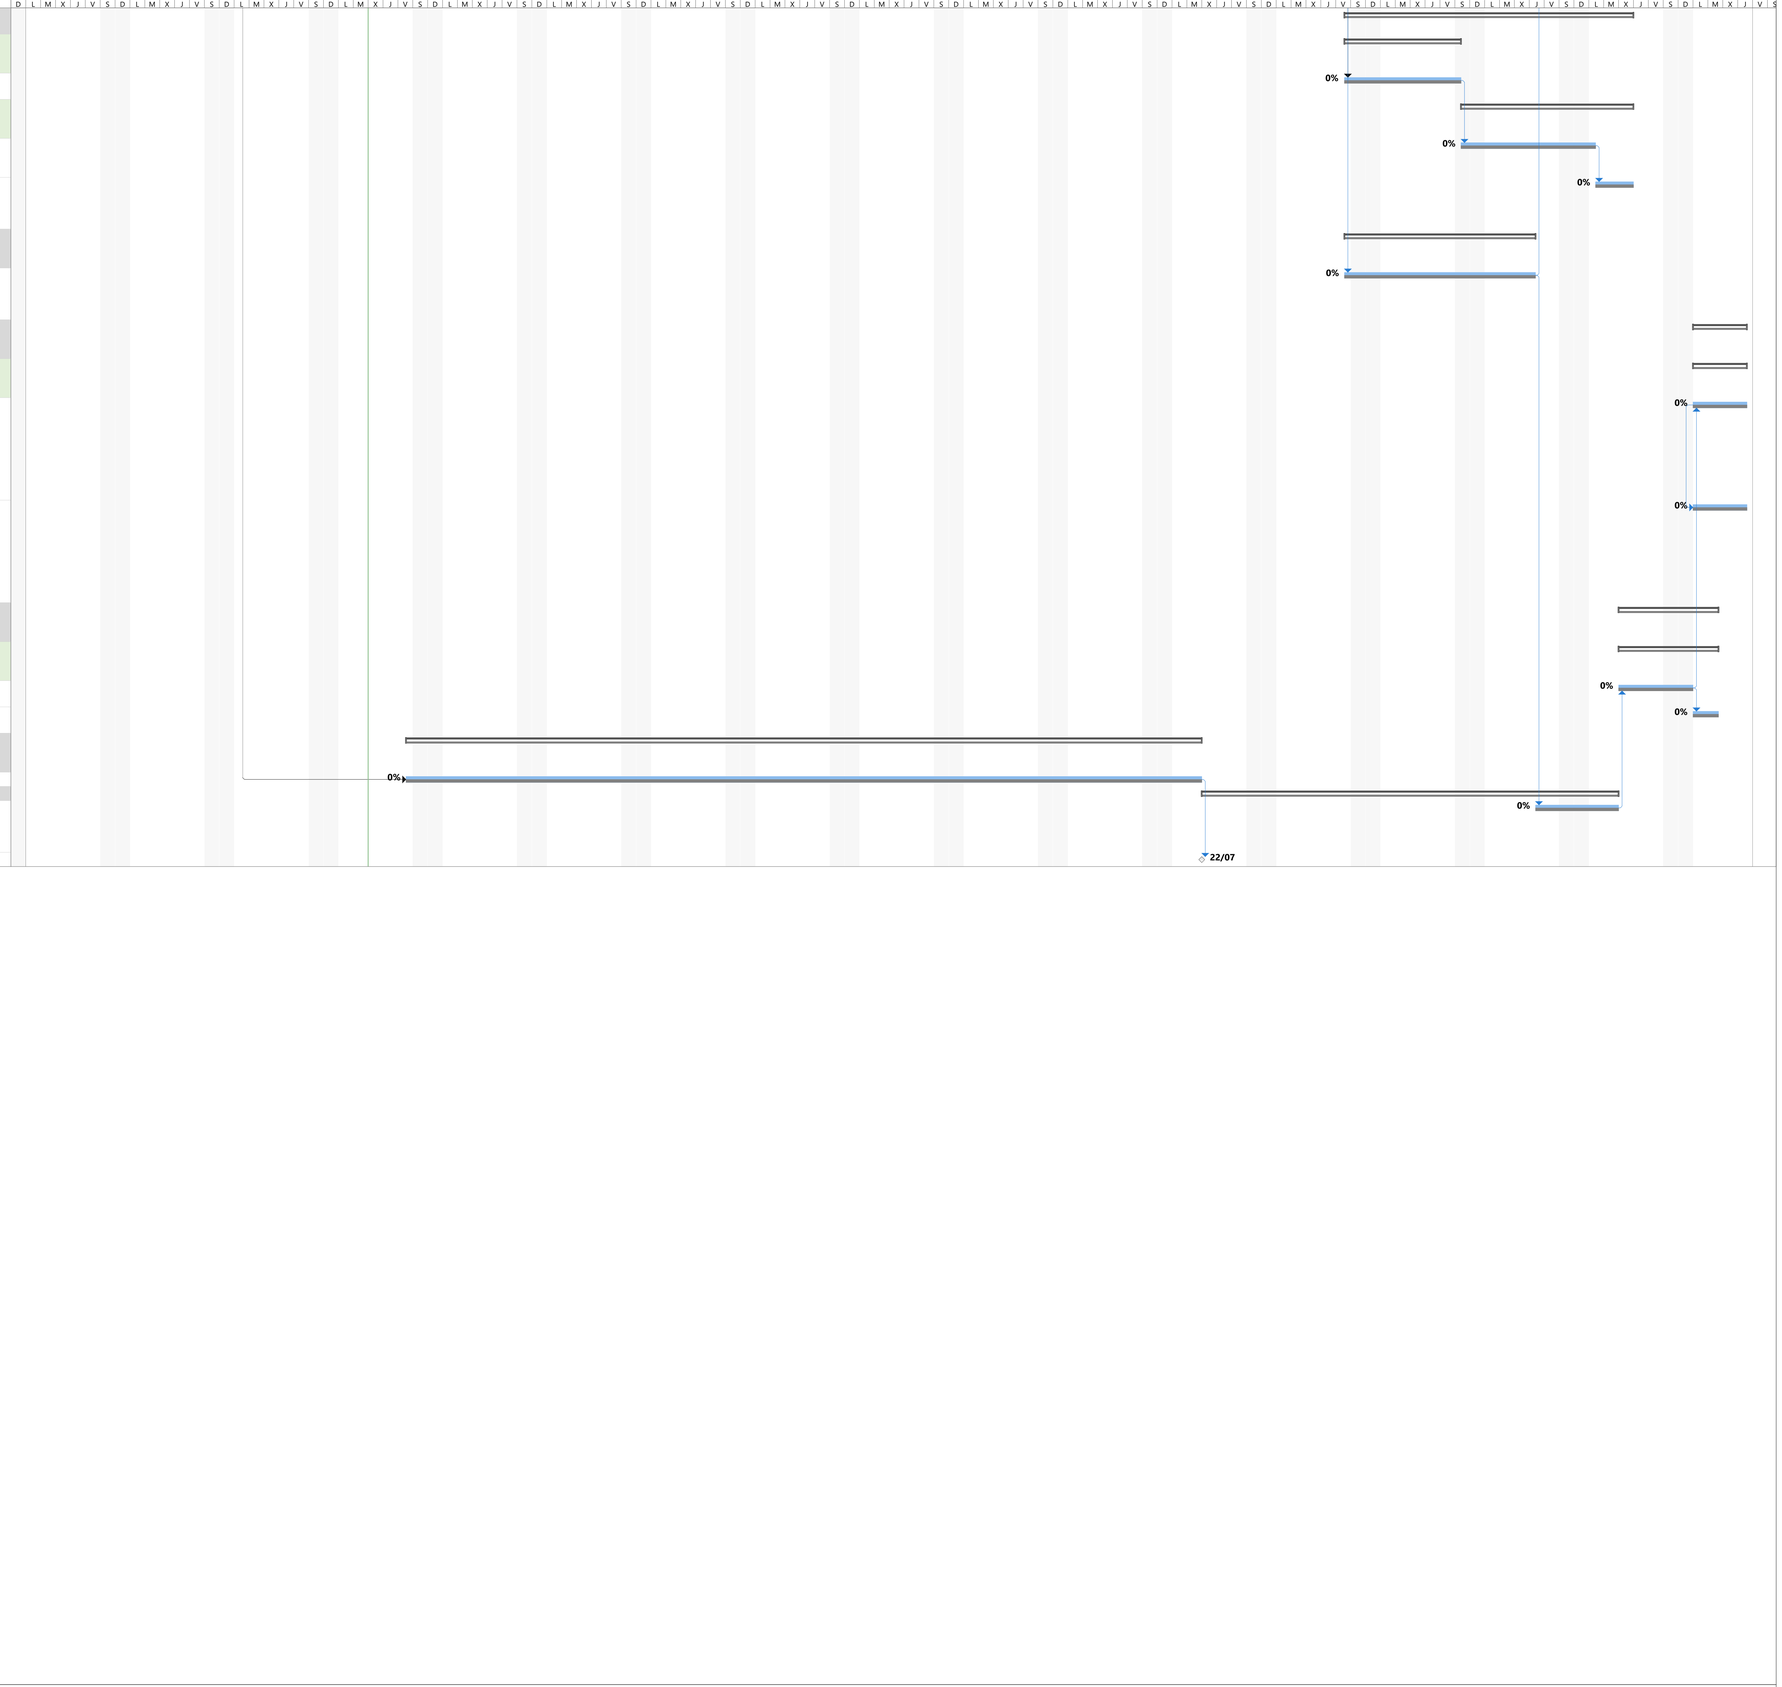

Proyecto: PROGRAMACIÓN V1
Fecha: mié 27/05/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

Id	Modo de	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
1			**PROGRAMACIÓN DE OBRA V1 I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA**			**83.5 días**	**sáb 16/05/26**	**lun 24/08/26**		**$ 121,638,748.43**
2			INICIO DE OBRA			0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26		$ 0.00
3		**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**70 días**	**sáb 16/05/26**	**vie 7/08/26**		**$ 21,601,971.79**
4		**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**55 días**	**sáb 16/05/26**	**mié 22/07/26**		**$ 10,113,971.18**
5		1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoria autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	110.76	20 días	sáb 16/05/26	mié 10/06/26	2	$ 488,516.83
6		1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado	M2	90.00	20 días	mié 10/06/26	lun 6/07/26	5	$ 2,916,502.90
7		1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica	M	45.00	15 días	lun 6/07/26	mié 22/07/26	6	$ 6,708,951.45
8		**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**15 días**	**mié 22/07/26**	**vie 7/08/26**		**$ 6,785,688.01**
9		1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	8.52	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	7	$ 2,437,558.33
10		1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	10.40	2 días	vie 24/07/26	lun 27/07/26	9	$ 1,269,420.39
11		1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	110.00	7 días	lun 27/07/26	mar 4/08/26	10	$ 2,555,319.23
12		1.2.27	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	1.00	2 días	mar 4/08/26	mié 5/08/26	11	$ 107,821.09
13		1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00	2 días	jue 6/08/26	vie 7/08/26	12	$ 415,568.97
14		**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**			**40 días**	**mié 20/05/26**	**mar 7/07/26**		**$ 4,702,312.60**
15		1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	130.00	40 días	mié 20/05/26	mar 7/07/26		$ 4,702,312.60
16		**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**13.5 días**	**lun 3/08/26**	**mar 18/08/26**		**$ 36,979,706.96**
17		**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**11.5 días**	**lun 3/08/26**	**vie 14/08/26**		**$ 3,067,873.24**
18		2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M3	12.00	3 días	lun 3/08/26	mié 5/08/26	8CC+10 días	$ 1,692,420.24
19		2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	7.50	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	22CC+1 día	$ 1,375,453.00
20		**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5.5 días**	**lun 10/08/26**	**vie 14/08/26**		**$ 16,814,719.37**
21		2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	3.00	1.5 días	lun 10/08/26	mar 11/08/26	18CC+2 días;26CC días	$ 3,197,490.27
22		2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	85.20	4 días	mar 11/08/26	vie 14/08/26	21	$ 13,617,229.10
23		**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**2 días**	**sáb 15/08/26**	**mar 18/08/26**		**$ 5,005,278.35**
24		2.3.13	COLUMNAS EN CONCRETO ACABADO A LA VISTA 3000 PSI INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA	M3	3.50	2 días	sáb 15/08/26	mar 18/08/26	22;26	$ 5,005,278.35
25		**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**jue 6/08/26**	**mar 11/08/26**		**$ 12,091,836.00**
26		2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	1,600.00	5 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	18CC+3 días	$ 12,091,836.00
27		**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**7 días**	**sáb 15/08/26**	**lun 24/08/26**		**$ 26,097,015.94**
28		**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**5 días**	**mar 18/08/26**	**lun 24/08/26**		**$ 24,161,789.50**
29		3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	101.66	5 días	mar 18/08/26	lun 24/08/26	24CC+2 dí	$ 15,474,817.43
30		3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	220.00	3 días	jue 20/08/26	lun 24/08/26	29CC+2 días	$ 2,228,360.24
31		3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E	M2	220.00	3 días	jue 20/08/26	lun 24/08/26	29CC+2 días	$ 6,458,611.83
32		**3.3**	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**4 días**	**sáb 15/08/26**	**mié 19/08/26**		**$ 1,935,226.44**
33		3.3.2	ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25 M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	CM	200.00	4 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	22	$ 1,935,226.44
34		**18**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**55 días**	**sáb 16/05/26**	**mié 22/07/26**		**$ 1,003,734.25**
35		18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	206.61	55 días	sáb 16/05/26	mié 22/07/26	2	$ 1,003,734.25
36		**19**	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**15 días**	**mar 16/06/26**	**vie 3/07/26**		**$ 35,956,319.49**

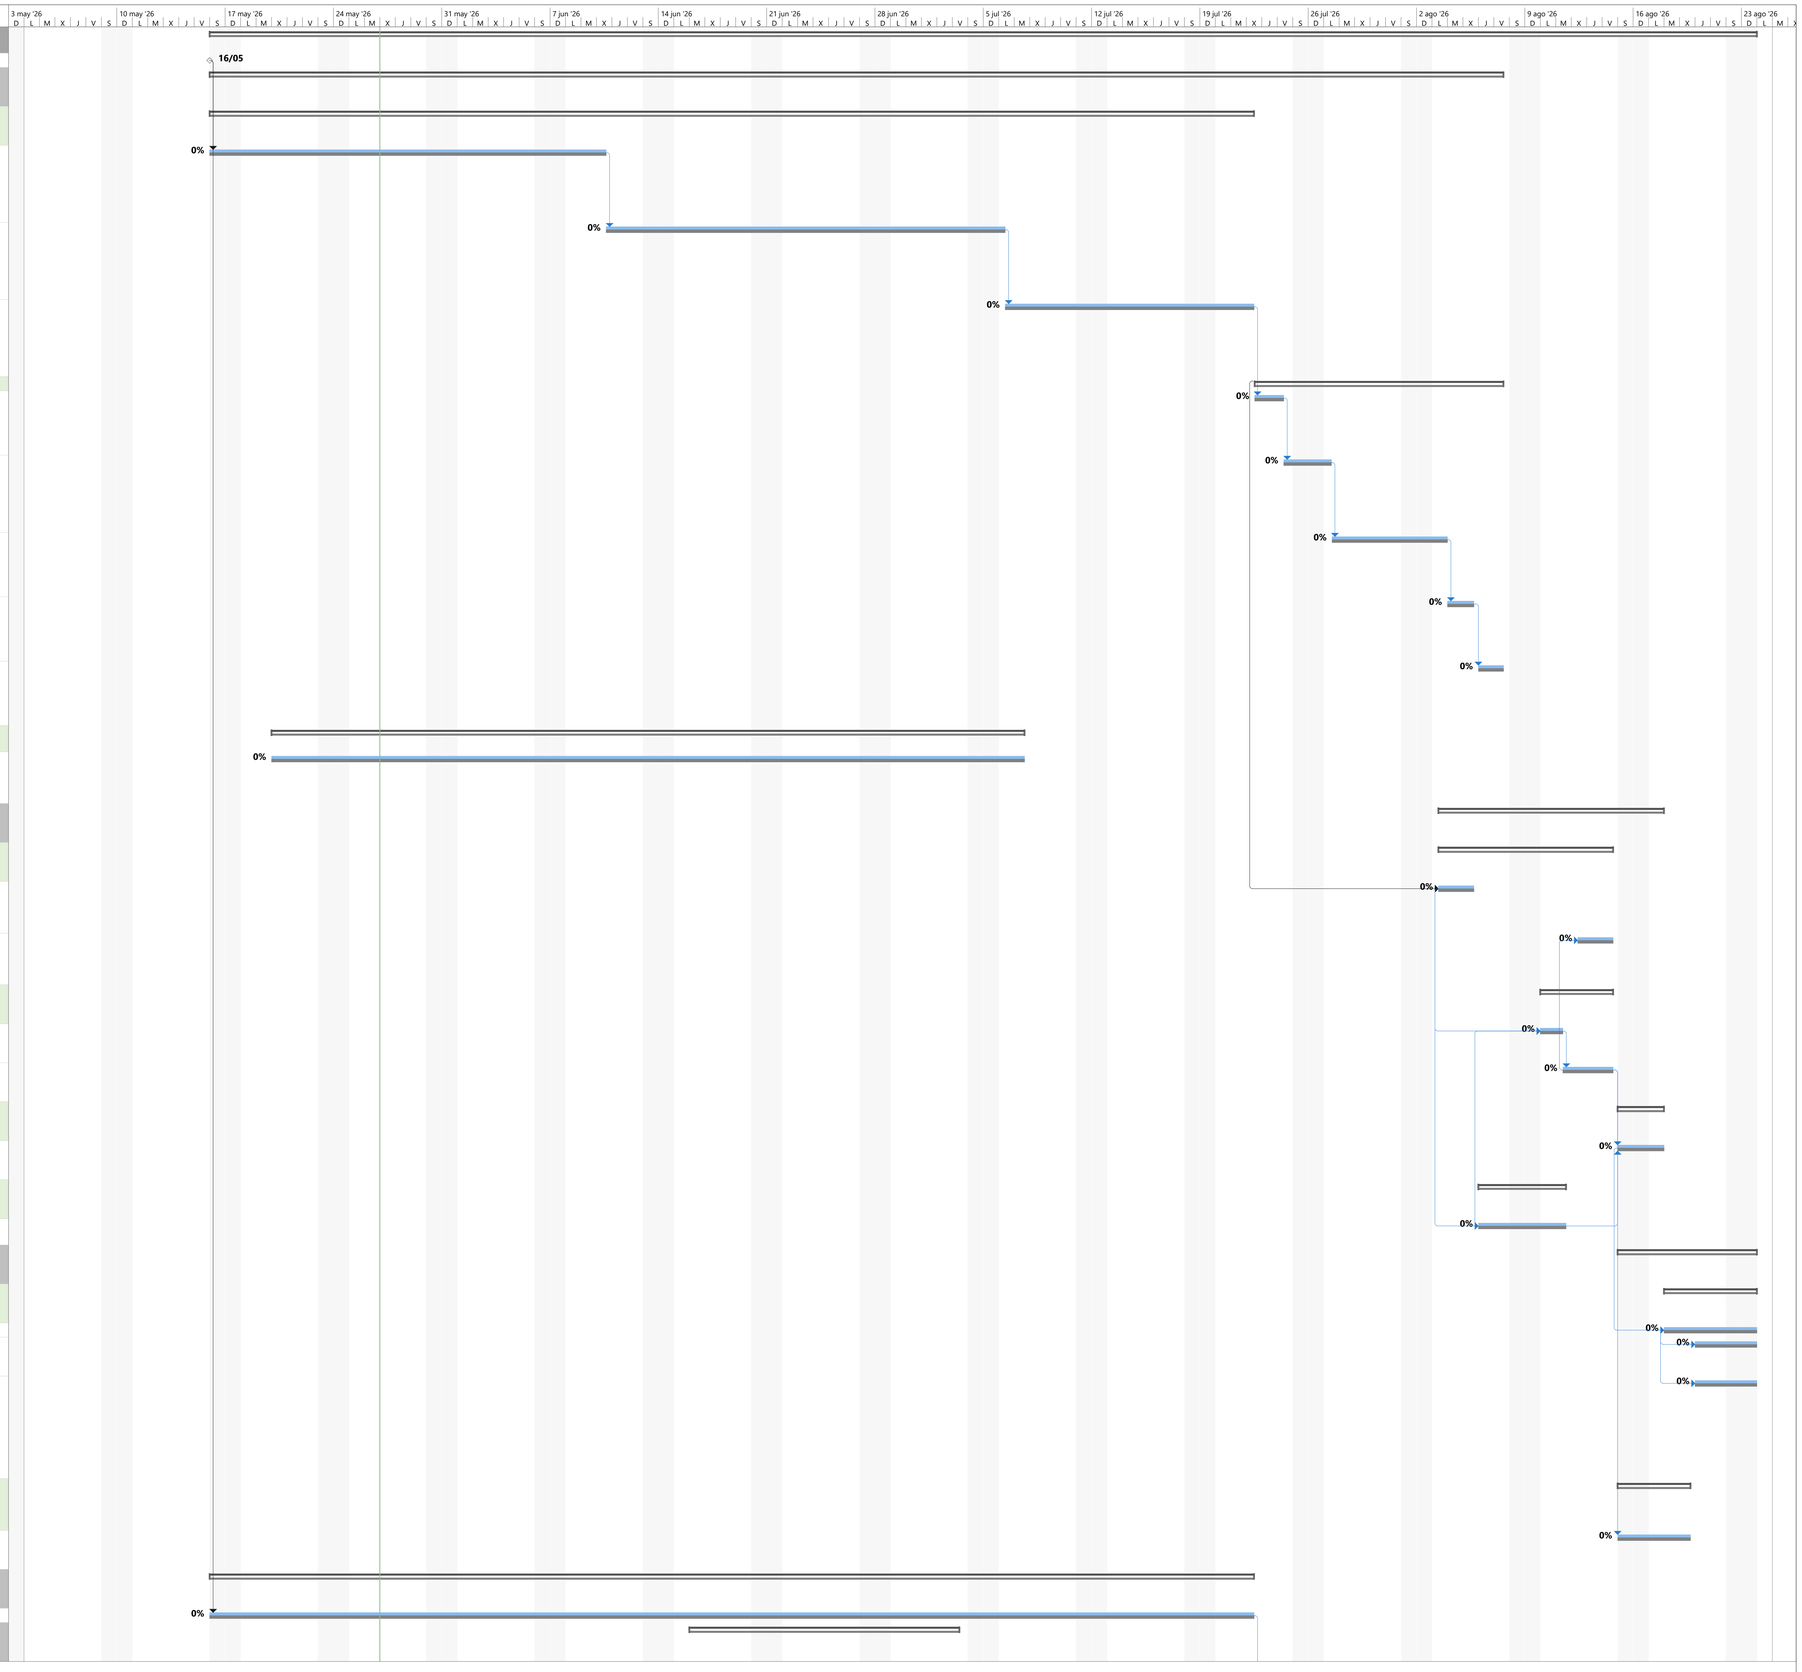

Proyecto: PROGRAMACIÓN V1
Fecha: mié 27/05/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de	ITEM	Nombre de tarea	UNIDAD	CANTIDAD	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
37		19.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2	45.00	15 días	mar 16/06/26	vie 3/07/26		$ 35,956,319.49
38			FIN DE OBRA			0 días	mié 22/07/26	mié 22/07/26	35	$ 0.00



Proyecto: PROGRAMACIÓN V1
Fecha: mié 27/05/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

CERTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE VALORES DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA

Que los valores correspondientes al personal ofertado en la propuesta económica para el mes de agosto de 2026 corresponden a los valores efectivamente contratados y reconocidos al personal vinculado para la ejecución del contrato. Asimismo, se certifica que dichos valores corresponden a los ingresos base y valores reportados en las respectivas planillas de pago de Seguridad Social del personal ofertado y vinculado al contrato, de conformidad con la normatividad aplicable. La información contenida en la presente certificación corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos contratos laborales, documentos de nómina y planillas de pago de Seguridad Social, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad cuando sea requerido.

Se expide en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC S.A.S. – NIT 829001061-1

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VÍNCULO
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	$ 9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	$ 6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta (hasta 30/08/2026) / Pedro Enrique Galeano Santana (desde 31/08/2026)	Residente 1	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista Estructural	30%	$ 9.900.000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista Ambiental	60%	$ 9.900.000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	$ 9.900.000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	$ 9.900.000	Obra Laboral
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	$ 7.000.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%	$ 6.000.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	$ 3.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	$ 2.700.000	Obra Laboral
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	$ 1.750.905	Obra Laboral

PROBINTEC-LOTE6-896

Bogotá, 15 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO EDUCATIVO 25
Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 18".*

Asunto: Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 9 Pago al Contratista _Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato me permito APROBAR las planillas de Seguridad Social remitidas por el contratista, las cuales se presentan como soporte del Acta Parcial de Obra N.º 9, correspondiente al periodo comprendido entre el 3 de agosto 2026 y el 2 de septiembre de 2026.

Sin otro particular

Cordialmente,

KATERIN NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROBINTEC S.A.S

El suscrito **CONTADOR PUBLICO** identificado con cedula de ciudadanía No. 8.773.411 de Soledad y tarjeta profesional No. 62403-T y la **REPRESENTANTE LEGAL** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.821.650 de Bogotá.

CERTIFICAN QUE:

Que la empresa **CONSTRUCTORA GRUPO ADIN SAS BIC**, sociedad legalmente constituida con numero de Nit. 901.490.558-7, debidamente inscrito; luego de examinar de acuerdo con las normas Internacionales de Auditoria NIA, los estados financieros de la compañía, certificamos que nos encontramos al día con el pago de obligaciones de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Se expide la certificación a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

SANDRA MONICA VILLAVECES CIFUENTES
Identificación No. C.C. 51.821.650 de Bogotá
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL.
CONSTRUCTORA GRUPO ADIN SAS BIC
NIT: 901.490.558-7

ALEXANDER MANUEL RUIZ BUSTOS
Identificación No. C.C. 8.773.411 de Soledad
En calidad de: Contador Público
CONSTRUCTORA GRUPO ADIN SAS BIC
NIT: 901.490.558-7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.773.411

RUIZ BUSTOS

APELLIDOS

ALEXANDER MANUEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1972

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

04-SEP-1990 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


DICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A 0500150 00140893 M 0008773411-20081221 0008560490A 1 6020025079



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
62463-T
ALEXANDER MANUEL
RUIZ BUSTOS
C.C. 8773411
RESOLUCION INSCRIPCION 216
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
FECHA 17/12/98
Presidente
Registro

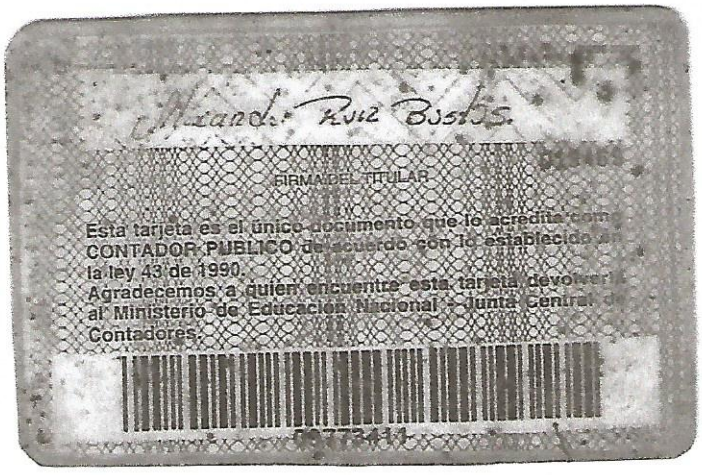

Alexander Ruiz Bustos
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.
8773411

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C1281689AED8B200F9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDER MANUEL RUIZ BUSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8773411 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 62403-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

El suscrito **CONTADOR PUBLICO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.019.076.409 de Bogotá y tarjeta profesional No. 308430-T y el **REPRESENTANTE LEGAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.020.816.410 de Bogotá y tarjeta profesional No T.P. 091037-0687626 CND.

CERTIFICAN QUE:

Que la empresa **CSS CONSTRUCCIÓN SOTENIBLE Y SUSTENTABLE SAS**, sociedad legalmente constituida con numero de Nit. 901.645.174-1, debidamente inscrita; luego de examinar de acuerdo con las normas Internacionales de Auditoria NIA, los estados financieros de la compañía, certificamos que nos encontramos al día con el pago de obligaciones de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Se expide la certificación a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER MAYORGA GOMEZ
Identificación No. C.C. 1.020.816.410 de Bogotá
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL.
CSS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE SAS
NIT: 901.645.174-1

JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ PARRA
Identificación No. C.C. 1.019.076.409 de Bogotá
En calidad de: Contador Público
CSS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE SAS
NIT: 901.645.174-1


FECHA DE NACIMIENTO
21-OCT-1992
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
25-NOV-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
ÍNDICE DERECHO
A-1500150-01047158-F-1019076409-20181126
0063281762A 1
9906547090


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.019.076.409
RODRIGUEZ PARRA
APELLIDOS
JOHANNA ANDREA
NOMBRES
FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

308430-T



JOHANNA ANDREA
RODRIGUEZ PARRA
C.C. 1019076409
RES. INSCRIPCION 150 DEL 03/05/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

357811 358511

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3BBF3A32ECD92A7C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019076409 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 308430-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

El suscrito **CONTADOR PUBLICO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.019.057.491 de Bogotá y tarjeta profesional No. 261375-T y el **REPRESENTANTE LEGAL** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.918.202 de Villavicencio y tarjeta profesional No T.P. 25202-435019 CND.

CERTIFICAN QUE:

Que el **CONSORCIO EDUCATIVO 25**, sociedad legalmente constituida con numero de Nit. 901.973.696-9, debidamente inscrito; luego de examinar de acuerdo con las normas Internacionales de Auditoria NIA, los estados financieros de la compañía, certificamos que nos encontramos al día con el pago de obligaciones de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Se expide la certificación a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veintiseis (2026).

Atentamente,



DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
Identificación No. C.C. 1.121.918.202 de Villavicencio
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL.
CONSORCIO EDUCATIVO 25
NIT: 901.973.696-9



JAIME ESTEBAN LOPEZ SOTELO
Identificación No. C.C. 1.019.057.491 de Bogotá
En calidad de: Contador Público
CONSORCIO EDUCATIVO 25
NIT: 901.973.696-9



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.019.057.491

Apellidos
LOPEZ SOTELO

Nombres
JAIME ESTEBAN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
M

Fecha de nacimiento
12 FEB 1991

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
20 FEB 2009, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
16 MAR 2033

Firma



.CO

020270137

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020270137415001<<<<<<<<<<<
9102125M3303160COL1019057491<0
LOPEZ<SOTELO<<JAIME<ESTEBAN<<<



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

261375-T

JAIME ESTEBAN
LOPEZ SOTELO
C.C. 1019057491
RES. INSCRIPCION 677 DEL 09/08/2019
FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273656 291769

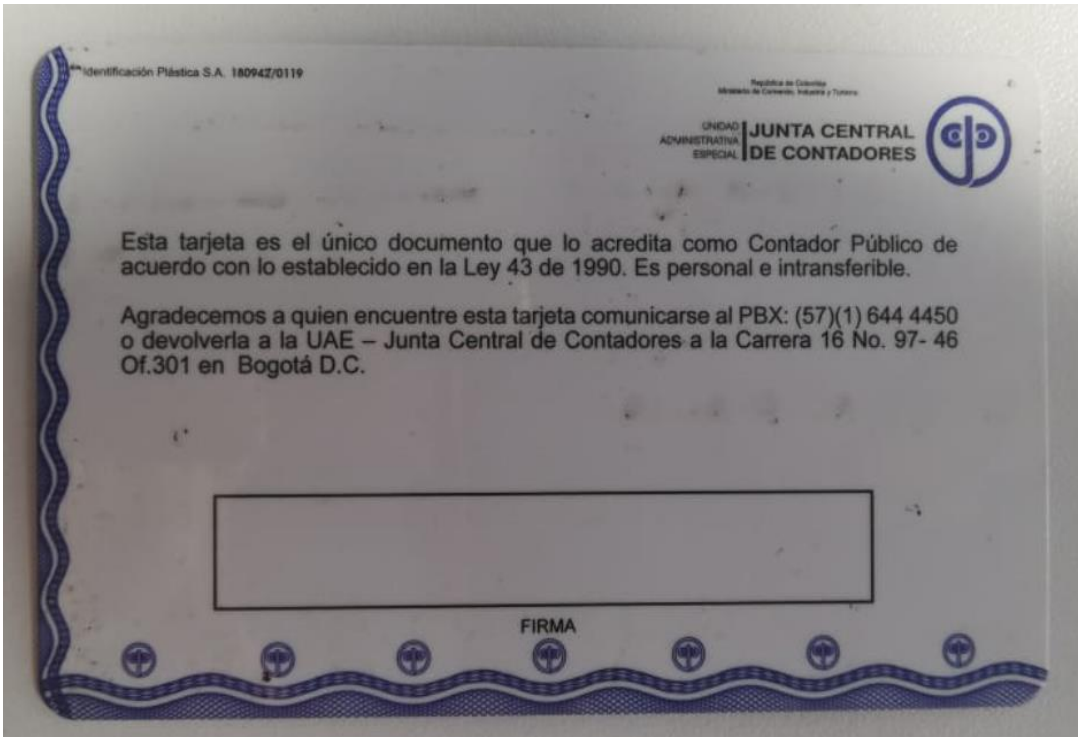

Identificación Plástica S.A. 18094Z/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EE500AB9B437B700

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ESTEBAN LOPEZ SOTELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019057491 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 261375-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901734321-8	TRED INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	Cr 56 No. 167 03 Ap 808	3137640402	tredingenieriaysoluciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	ADMINISTRATIVO	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93872520	06/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	Y	$0	$121.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	121.900	121.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901734321-8	TRED INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	Cr 56 No. 167 03 Ap 808	3137640402	tredingenieriaysoluciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	ADMINISTRATIVO	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93872520	06/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	Y	$0	$121.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1070010996	GALINDO MOLANO DANIELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	0		14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901973696-9	CONSORCIO EDUCATIVO 25	CR 71 D 73 A 51	7640402	CONSORCIOEDUCATIVO25@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94385968		6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$17,599,095	$5.449.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	232.000	0		0		0	0	0	0	232.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.047.900	0	0	0	0	0	0		2.047.900	4
231001	Colfondos	800227940-6	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.225.100				1.225.100	0	0	1.225.100			12.251	1.225.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	704.000	0	0	704.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	704.000	704.000
Pensión	3	2.815.900	2.815.900
Riesgos Laborales	1	1.225.100	1.225.100
CCF	1	704.000	704.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.449.000	5.449.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901973696-9	CONSORCIO EDUCATIVO 25	CR 71 D 73 A 51	7640402	CONSORCIOEDUCATIVO25@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94385968		6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$17,599,095	$5.449.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019052718	LUENGAS AMAYA VIVIANA PATRICIA	1	0			S																	231001	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	5	153.200	CCF24	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
2	CC 1022409418	JIMENEZ PARDO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS002	2.600.000	30	104.000	14-11	2.600.000	30	5	181.000	CCF24	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
3	CC 1031177244	MORENO REYES BRAYAN LEONARDO	1	0			S																	230201	2.600.000	30	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	30	104.000	14-11	2.600.000	30	5	181.000	CCF24	2.600.000	30	104.000	0	0	0	0	0
4	CC 1032357215	REY OLARTE DIEGO ARMANDO	1	0			S	X																230301	3.599.095	30	575.900	0	0	0	0	EPS008	3.599.095	30	144.000	14-11	3.599.095	30	5	250.500	CCF24	3.599.095	30	144.000	0	0	0	0	0
5	CC 1049630740	LOPEZ PAEZ HUGO FERLEY	1	0			S																	230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	5	194.900	CCF24	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
6	CC 1049657250	SOTELO SEPULVEDA EDISON ZAMIR	1	0			S																	230301	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS041	3.800.000	30	152.000	14-11	3.800.000	30	5	264.500	CCF24	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070010996		GALINDO MOLANO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 96 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6210189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	540039759	9509118267	I	2026/08/26	2026/08/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,026,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1070010996	GALINDO DANIELA																		230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$450,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$1,026,000
Total	**Afiliados(1)**																						$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$1,026,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070010996		GALINDO MOLANO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 96 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6210189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	540039759	9509118267	I	2026/08/26	2026/08/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,026,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$0	$0	$576,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$576,000	$0	$0	$576,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$0	$450,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$450,000	$0	$0	$450,000
TOTAL				1	$1,026,000	$0	$0	$1,026,000

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1001111735		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MALAVER DIAZ WILSON ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF22	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1016065457		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF22	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1019126630		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ DIAZ ANDRES FELIPE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30				F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF22	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1233893473		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CAITA RODRIGUEZ MAICOL SEBASTIAN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	1	1	1	1			F	$ 1.750.905	25-14		16 %	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 58.364	$ 4.100	CCF22	4 %	$ 58.364	$ 2.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 4.100	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
	CC 1118563916									
Tipo Cotizante	01	00				S	TORRES REYES JORMAN ALEJANDRO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	1	1	1	1			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	EPSC34		4 %	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 58.364	$ 4.100	CCF22	4 %	$ 58.364	$ 2.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 4.100	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1023893638		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BOCANEGRA VALLEJO ANGELICA YOBANA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$280.200	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF22	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1013601920		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MALAMBO BOCANEGRA YOJAN CAMILO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	25-14		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF22	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1001111869		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ DIAZ KEVIN MATEO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF22	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1019037328		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					HERNANDEZ PIEDRAHITA JHON ALEXEY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF22	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1070009663		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					NAVARRETE MUÑOZ OMAR FERNEY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X	X														0	2	2	2	2		F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 116.727	$ 8.200	CCF22	4 %	$ 116.727	$ 4.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 8.200	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-08, 09:02:21 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1085000587

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202608

Cliente: NI900337484 INGORIENTE SAS

PAGADA 2026-09-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGORIENTE SAS				
Documento	NI 900337484	**Dirección**	CR 32C SUR #10 - 26		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3195559689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	11
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	**Identificación**	CC 1032356337		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 13375363		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ SOLANO JORGE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	15	15	15	15			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 875.453	$ 35.050	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 875.453	$ 60.950	CCF22	4 %	$ 875.453	$ 35.050	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 35.050	$ 60.950	$ 35.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.150

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901770193-4	CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN	CARRERA 71 D 73 A 51	3204757087	SGSST@TREDING.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		META	PUERTO LÓPEZ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94850838		9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$6,351,994	$1.968.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.400	0		0		0	0	0	0	2.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	102.400	0		0		0	0	0	0	102.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.800	0		0		0	0	0	0	4.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	2.400	0		0		0	0	0	0	2.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	2.400	0		0		0	0	0	0	2.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	18.800	0	0	0	0	0	0		18.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	569.800	0	0	0	0	0	0		569.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	428.200	0	0	0	0	0	0		428.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	442.400				442.400	0	0	442.400			4.424	442.400	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	170.100	0	0	170.100	2
CCF34	Cofrem	892000146-3	84.500	0	0	84.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	254.600	254.600
Pensión	3	1.016.800	1.016.800
Riesgos Laborales	1	442.400	442.400
CCF	2	254.600	254.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	1.968.400	1.968.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901770193-4	CONSORCIO MANTENIMIENTOS CSS ADIN		CARRERA 71 D 73 A 51	3204757087	SGSST@TREDING.CO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			META	PUERTO LÓPEZ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94850838		9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$6,351,994	$1.968.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016065457	VILLAMIZAR DIMAS ALBERTO	1	0			S		X															230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF34	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
2	CC 1026288574	RODRIGUEZ PEÑA DEISI GERALDINE	1	0			S		X															230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF34	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
3	CC 1074809666	MONCADA DIAZ JAIDER ALEJANDRO	1	0			S		X															25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS041	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF34	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
4	CC 1120867412	GONZALEZ MARTINEZ LUIS RICARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1121898446	PARRADO LONDOÑO LUISA FERNANDA	1	0			S																	25-14	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF24	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
6	CC 1123114066	GONZALEZ MARTINEZ ELIZABETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 52266454	RUIZ BELTRAN ERIKA PAOLA	1	0			S		X															25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF34	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
8	CC 79623231	PATARROYO LOPEZ CRISTIAM RODOLFO	1	0			S		X															25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF34	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
9	CC 86057062	VILLAFAÑE SOGAMOSO LUIS ALEJANDRO	1	0			S		X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF34	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901793450	1	VIVAHOME S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 B N 81 F 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3223116149	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	620379206	9510706555	E	2026/09/11	2026/09/03	NEQUI	0	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
1	CC	1109384715 LOZANO MARIA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901793450	1	VIVAHOME S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 B N 81 F 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3223116149	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	620379206	9510706555	E	2026/09/11	2026/09/03	NEQUI	0	$542,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$542,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$121,900
$121,900
$70,100
$70,100
$70,100
$70,100
$542,300

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1084154309 **Fecha de creación del** miércoles, 19 de agosto de 2026 03:57:11 AM **Período de Cotización:** 2026-07

Período de Servicio: 2026-08

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 18/08/2026

Se certifica que en la fecha 2026-08-18, la empresa ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS con documento de identificación NI901495759, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1000001369	GARCIA RODRIGUEZ SEBASTIAN	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1001269924	BUITRAGO MONSALVE JEISSON STEVEN	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1002128185	PATIÑO MENA JUAN MIGUEL	PORVENIR	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007519597	CARO VALENCIA BAYRON SANTIAGO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1012318407	MARTINEZ LEON HENRY ORLANDO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1012350124	MARTINEZ RINCON JAROL SEBASTIAN	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1012415126	RIVERA AYALA ELVER DANILO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1013646845	PINZON RAMIREZ MAICOL ANDRES	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1013646845	PINZON RAMIREZ MAICOL ANDRES	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014662676	RODRIGUEZ MEJIA ANDERSON FABIAN	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014662676	RODRIGUEZ MEJIA ANDERSON FABIAN	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023018329	CARVAJAL RAMIREZ DIVER ERLEY	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023868376	RINCON JIMENEZ CARLOS ALONSO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023868376	RINCON JIMENEZ CARLOS ALONSO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023886794	GOMEZ DIAZ DIEGO ALEJANDRO	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024590416	BERMUDEZ RODRIGUEZ BRAYAN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024600034	USMA FLOREZ BRAHIAN STEVEN	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026559871	OROZCO GUEVARA LUIS ARMANDO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1030681258	SIERRA BERNAL BRAYAN YUSEPPE	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1030694494	ARIAS DUARTE HERVIN STIL	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033731422	MURIEL MUÑOZ ANDRES ANTONIO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Se certifica que en la fecha 2026-08-18, la empresa ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS con documento de identificación NI901495759, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1048944969	FLOREZ HERRERA JORGE LUIS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1087114634	ROJAS RIOS NIKOL FERNANDA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1087555881	MALLAMA ORDOÑEZ ADRIAN FELIPE	PROTECCION	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1087555881	MALLAMA ORDOÑEZ ADRIAN FELIPE	PROTECCION	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1087555881	MALLAMA ORDOÑEZ ADRIAN FELIPE	PROTECCION	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1087556304	VELEZ OSPINA WILMAR ANDRES	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SI	SI	NO	NO	NO
CC 1088265813	SALAZAR SALDARRIAGA JORGE ORLANDO	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1094285458	BARRIOS GARCIA MERLIS	PORVENIR	EPS-S COOSALUD	ARL SURA	COMFAMILIAR CARTAGENA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1103106582	GAMBOA NIETO JESUS ARMANDO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1110176717	MORENO MORENO CINDY HASLEY	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 12436949	RODRIGUEZ PINTO STIVINSON	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
PT 1279536	GONZALEZ CARDENAS JOSE RENE	COLPENSIONES	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
PT 1363476	ALEN FEBRES JOAQUIN RAFAEL	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 14566490	DIAZ CASTAÑEDA MILTON FABIAN	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	NO	NO	NO	NO	NO
CC 19377191	MERCHAN MERCHAN GUSTAVO	NINGUNA AFP	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 25001323	HERNANDEZ RESTREPO CLAUDIA ALEYDE	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMILIAR RISARALDA	NO	NO	NO	NO	NO
PT 5733294	FLORES GONZALEZ ERICK XAVIER	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79488477	RIVERA BERMUDEZ JESUS ANTONIO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79510176	BERMUDEZ ROMERO MAURICIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79510176	BERMUDEZ ROMERO MAURICIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79510176	BERMUDEZ ROMERO MAURICIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79741711	GALINDO TIRIAT WILMAR GUIOVANI	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79973284	RAMIREZ RATIVA JOSE VICENTE	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80110841	MUÑOZ PAMPLONA FABIO RAUL	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80270364	GARZON ISAZA JOSE ALFREDO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80744760	MORA RUEDA ANDRES MAURICIO	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80748776	RINCON GRANANDOS LUIS FERNANDO	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901734321-8	TRED INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS		Cr 56 No. 167 03 Ap 808	3137640402	tredingenieriaysoluciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	ADMINISTRATIVO	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93879040	05/08/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$14,201,810	$4.004.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	568.200	0		0		0	0	0	0	568.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.712.000	0	0	0	0	0	0		1.712.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	875.900				875.900	0	0	875.900			8.759	875.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	568.200	0	0	568.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	568.200	568.200
Pensión	2	1.992.200	1.992.200
Riesgos Laborales	1	875.900	875.900
CCF	1	568.200	568.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	4.004.500	4.004.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901734321-8	TRED INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	Cr 56 No. 167 03 Ap 808	3137640402	tredingenieriaysoluciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	ADMINISTRATIVO 005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93879040	05/08/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$14,201,810	$4.004.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018405240	BRITO SUAREZ JAVIER DAVID	1	0			S																	230201	5.350.000	30	856.000	0	0	0	0	EPS008	5.350.000	30	214.000	14-11	5.350.000	30	5	372.400	CCF24	5.350.000	30	214.000	0	0	0	0	0
2	CC 1032357215	REY OLARTE DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1121918202	BAQUERO AGUILAR DAYANNA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	5.350.000	30	856.000	0	0	0	0	EPS008	5.350.000	30	214.000	14-11	5.350.000	30	5	372.400	CCF24	5.350.000	30	214.000	0	0	0	0	0
4	CC 41372611	PARRA MARIA ROSALBA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-08, 02:36:27 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084931258

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 04/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILLINGTON NIÑO MELO		
Documento	CC79904525	**Dirección**	DIAG 77 B 116 B 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112041456
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79904525	WILLINGTON NIÑO MELO	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 250.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200	$ 0	$ 709.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-04, 10:49:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084901429

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 03/09/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WNM INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	EMPLEADOS	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900174002	**Dirección**	CL 95 71 75 TR 2 AP 2502		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6504934		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	NINO MELO WILINTON	**Identificación**	CC 79904525		
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020797404	CRISTIAN CAMILO NIÑO ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1023893655	WILSON ALEXANDER MESA LADINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1073600197	CARLOS ALBERTO VELEZ TORRES	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 3121681	DIEGO ALEXANDER PACHON TORRES	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 93123070	JOSE AGUSTIN SANCHEZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.369.443	$ 5.369.443	$ 5.369.443	$ 5.369.443	$ 859.400	$ 215.100	$ 373.900	$ 215.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.663.500	$ 3.000	$ 1.666.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PROBINTEC-LOTE6-888

Bogotá, 11 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO EDUCATIVO 25
Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 18".*

Asunto: Aprobación Informe ambiental mensual N°11

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia, nos permitimos informar que una vez revisado el documento de Informe ambiental mensual N°11, recibido el día 10 de septiembre en medio digital con el oficio 26-1009-0907, titulado "*Informe mensual ambiental No.11"*. Se da aprobación a este, ya que cuenta con la información solicitada por esta interventoría, las cuales se recuerda tener en cuenta para próximos informes, además se reiteran las siguientes:

- Verificar el informe y la totalidad de los anexos antes de ser enviado a la interventoría.
- Todos los anexos deben estar respectivamente firmados si aplica.
- Se radique en los tiempos establecidos.
- Se recuerda que todo documento remitido a la interventoría debe venir con su oficio.
- El informe debe estar estructurado bajo la lista de chequeo presentada por la SDE.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto.

Atentamente,



Christian Felipe Rodríguez
Especialista ambiental
PROBINTEC S.A.S - NIT 829.001.061-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL SST No. 011
Periodo del informe: 03 DE AGOSTO 2026 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..5
   1.1. Introducción. 5
   1.2. Objetivos....6
   1.3. Delimitación Área De Influencia Directa. 7
   1.4. Información Contrato de obra 12
   1.5. Información general de Contrato de obra. 12
   1.6. Información general del Contrato de interventoría....13
2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS INTERVENTORÍA.....13
   2.1 Ingreso de personal de Obra.....15
   2.2 Personal Operativo de Obra.....15
   2.3 Registro de exámenes de ingreso.....17
   2.4 Personal Retirado.....17
   2.5 Porcentaje de Personal Femenino (Decreto 332 del 2020).....18
   2.6 Directiva Distrital N.° 1 de 2011. 18
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 18
4. SEÑALIZACIÓN. 20
   4.1 Señalización del campamento 20
   4.2 Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos. 21
   4.3 Señalización Plan de Emergencia. 21
   4.4 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo. 21
   4.5 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad. 21
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 23
   5.1 Registro Uso de los EPP. 23
6. ADMINISTRAACIÓN DE LOS RIESGOS. 23
   6.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos 23

6.2 Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo. 23

6.3 Permisos de trabajo para labores de alto riesgo. 24

6.4 Inspecciones SST. 24

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 25

7.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos. 26

7.2 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos. 26

7.3 Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos. 26

7.4 Horarios de trabajo de la maquinaria. 27

7.5 Control diario de horómetro 27

7.6 Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos. 27

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 27

8.1 Pagos de Seguridad Social. 27

8.2. Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: Cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral 27

9. EMERGENCIAS 30

9.1 Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.. 30

9.2 Conformación de las Brigadas de Emergencia.. 31

9.3 Simulacros de Emergencia.. 31

10. BIENESTAR 31

10.1 Instalaciones Provisionales.. 31

10.2 Baterías de Baños. 32

10.3 Sistema de Hidratación.. 32

11. ORDEN Y ASEO 32

11.1 Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra. 32

12. DIVULGACIÓN 33

12.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.. 42

12.2 Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST.. 33

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 33

14. INDICADORES SST 33

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 34

15.1 Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros 34

15.2 Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST 35

15.3 Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes 35

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35

17. ANEXOS 36

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

1.1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del contrato de interventoría **No. CO1. PCCNTR.8168931 de 2025**, PROBINTEC, en su calidad de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual No 11 en el cual se realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155350, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO EDUCATIVO 25, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 18.

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (PROBINTEC) y contratista de obra (Consorcio Educativo 25) desde el área SST para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026. Para el periodo reportado, se anexan las planillas correspondientes al pago de la Seguridad Social del personal de interventoría, que incluyen los aportes a EPS, ARL y AFP.

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de la interventoría:

- **Actividades SST**
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de vehículos
  - Inducción, notificación de riesgos, evaluación inducción de personal operativo
  - Análisis de la actividad a ejecutar – ATS
  - Compilación de planillas de seguridad
  - Entrega de dotación y EPP´S
  - Inspección de elementos SST
  - Inspecciones preoperacionales
  - Charla de 5 minutos y capacitación mensual
  - Señalización de áreas
  - Demarcación y delimitación de zonas
  - Pausas activas

En relación con los aspectos de SST, el contratista no presenta de la documentación de ingreso del personal, durante el periodo reportado. Así mismo, tanto el contratista como la interventoría anexan las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo correspondiente a este periodo**. (Ver anexo 5. Planillas de Seguridad Social).**

El contratista, dentro del informe de gestión SST, anexa los respectivos ATS correspondientes a las actividades ejecutadas en la obra, para un total de 11 ATS durante el periodo evaluado. Se informa que en este periodo se realizaron 2 permisos de trabajo en alturas y 04 permisos de trabajo en caliente.

Asimismo, el contratista incluye las inspecciones de las herramientas disponibles en la obra y presenta el registro de 24 charlas diarias. De igual manera, el contratista presenta la documentación de ingreso del personal, la cual fue presentada previo al inicio de labores en los frentes de trabajo asignados.

A nivel administrativo, durante el periodo reportado no se registraron accidentes laborales; en consecuencia, no se generaron investigaciones de accidentes, informes FURAT, lecciones aprendidas ni socializaciones asociadas.

Se evidencia que todo el personal ingresó a la obra con las afiliaciones correspondientes a ARL, EPS, AFP, así como con el examen médico de ingreso. Esta información se encuentra adjunta en el informe presentado por el contratista e incluye la respectiva firma de aprobación de esta interventoría. Del mismo modo, el personal de interventoría cuenta con esta documentación desde antes del inicio de las actividades de obra.

1.2. OBJETIVOS.

- Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas durante el período en mención.
- Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentada por el Contratista
- Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 a la obra.
- Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría.
- Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026.
- Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos ATS asociados.
- Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos de seguridad social correspondientes.
- Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra.
- Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra.
- Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de interventoría.

- Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED.(**Ver Anexo 1. Lista de Chequeo de la SED)**

1.3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

- **Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas - Sede B**

  La IED Rodolfo Llinas – Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CALLE 87 No 112-55 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – Localización IED Distrital Rodolfo Llinas – SEDE B, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Simón Bolivar – Sede A**

  La IED Simón Bolívar– Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 92 # 87 A - 60 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 2 – Localización IED Simón Bolivar – Sede A Fuente Google Earth.

- **Institución Educativa Distrital Magdalena Ortega – Sede A**

La IED Magdalena Ortega – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 69 B # 78 A - 36 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 3 – Localización IED Magdalena Ortega – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Jorge Gaitán Cortés – Sede B**

La IED Jorge Gaitán Cortés – Sede B La Española, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 84 # 83 - 71 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización Jorge Gaitán Cortés – Sede B, Fuente Google Earth.

- **Institución Educativa Distrital Tabora – Sede A**

La IED Tabora – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 77 B # 74 A – 02 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 5 – Localización IED Tabora– Sede A, Fuente Google Earth

- **Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A**

  La ITI Francisco José de Caldas – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección Avenida Carrera 63 No 68-82 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede A, Google Earth.

- **Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede C**

La ITI Francisco José de Caldas – Sede C – Clemencia de Caicedo, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CL 68 A # 68 D - 51 -- KR 60 # 67 - 84 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede C, Google Earth.

1.4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

1.5. Información general del contrato.

CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.8155350 de 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.551.797.666
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/11/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

1.6. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8168931 de 2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
INTERVENTORÍA	PROBINTEC SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la Secretaria Distrital de Integración Social.

Tabla 1. Personal Interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

2.1. Ingreso Personal de Obra

En el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se pudo evidenciar que el contratista no presentó documentación de ingreso de trabajadores operativos, Esta información se encuentra en el Anexo 5 Planilla de Seguridad Social vigentes del informe SST No 11 del contratista.

2.2. Personal Operativo de Obra

CONSORCIO EDUCATIVO 25.

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 se cuenta con los siguientes trabajadores:

Tabla 1. Personal Operativo Aprobado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Mauricio Bermúdez Romero	79.510.176	Oficial Eléctrico	20-1-26	Energiza
Anderson Fabián Rodríguez Mejía	1.014.662.676	Eléctrico	20-1-26	Energiza
Cristian Kevin Sánchez Bravo	1016063698	Eléctrico		Energiza
Erick Xavier Flores González	Ppt 5733294	Eléctrico	6-4-26	Energiza
José Alfredo Garzon Osaza	80270364	Eléctrico	6-4-26	Energiza
Jeferson Soriano Cadena	1024555679	Eléctrico	8-4-26	Energiza
Jorman Alejandro Torres Reyes	1118563916	Oficial de obra	14-3-26	Ingoriente
Cristan Andrés Ordoñez	1033715273	Ayudante de obra	13-3-26	Ingoriente
Maicol Sebastián Caita Rodríguez	1233893473	Oficial de obra	23-3-26	Ingoriente
Pedro Alexander Murcia Buitafo	97610891	Ayudante de obra	14-3-26	Ingoriente
Diego Alejandro Valencia Ordoñez	1014857538	Ayudante de obra	14-3-26	Ingoriente
Merlis Barrios García	1094285458	Ing. residente		Energiza
Jhoan Emigio Gutiérrez	1075660551	Oficial		Ingoriente

baracaldo				

Cabe resaltar que el personal aprobado y debidamente radicado durante el periodo evaluado es rotado por el contratista entre los diferentes frentes de obra asignados, de acuerdo con la programación de actividades y las necesidades operativas del proyecto. Dicha rotación se realiza bajo la responsabilidad del contratista, garantizando en todo momento que el personal cuente con los soportes legales vigentes, afiliaciones al sistema de seguridad social al día, capacitación en SST y los elementos de protección personal requeridos para cada frente de trabajo.

Tabla 2. Personal rotativo Radicado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Hidalgo David Montero Gutiérrez	7.571.563	Aserrador	20-12-25	Tala y Poda
José Francisco Ortiz Llerena	5.124.771	Aserrador	20-12-25	Tala y Poda
Osnaider Madera Cadena	1.065.828.798	Aserrador	20-12-25	Tala y Poda
Tomas Jasler Caraballo Padilla	1.068.136.608	Instalador	22-1-26	ALUVID INSTALACIONES S.A.S
Juan Gabriel Rojas Nieto	80.101.901	Instalador	22-1-26	ALUVID INSTALACIONES S.A.S
Álvaro Alfonso Iriarte Borja	119.358.891	Instalador	22-1-26	ALUVID INSTALACIONES S.A.S
Ricardo Emiro Benítez Morelo	1.104.413.170	Instalador	22-1-26	ALUVID INSTALACIONES S.A.S
Jhoan Manuel Méndez Méndez	5.183.103	Instalador	25-02-2026	Ornamentacion L&M
Wilmer José Rivera David	1.026.605.930	Instalador	25-02-2026	Ornamentacion L&M
Juan Jonys Mazenett David	1.083.052.683	Instalador	25-02-2026	Ornamentacion L&M
José Simeón Charry Saenz	3.135.067	Aserrador	09-02-2026	Tala y Poda

Jaider Rafael Rodríguez Villazon	12.436.951	Aserrador	09-02-2026	Tala y Poda
José Nerandy Olivera Saldaña	1.083.463.321	Instalador Divisiones	18-12-25	Inoxideas
Beiker David Castañeda Zabaleta	1.134.330.353	Instalador Divisiones	18-12-25	Inoxideas
Devinson Alberto Noriega Castro	1005675745	Instalador	Personal Flotante	Aluvid
José Orlando Salinas Acosta	79599683	Plantador	Personal Flotante	Bosque andino
Pedro Antonio Chiquillo Caraballo	8167095	Plantador	Personal Flotante	Bosque andino

2.3. Registro de exámenes de ingreso

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del plan de trabajo establecido, La interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, enfocada en el tema “Señales tempranas que pueden anticipar un accidente”. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la capacidad del personal de interventoría para identificar de manera oportuna señales, condiciones y comportamientos que puedan anticipar la ocurrencia de un accidente, promoviendo la intervención preventiva y la toma de acciones seguras durante las visitas y recorridos de obra. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual.**

Personal Interventoría

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 por parte de la interventoría no se presenta personal retirado.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presenta retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 11 se evidencian la paz y salvos presentados.

2.4. Porcentaje Personal Femenino (Decreto 332 del 2020).

- **Personal Interventoría**

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se cuenta con el equipo de 16 trabajadores de interventoría, de los cuales 09 son mujeres y 07 son hombres lo que corresponde al 56,25% de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje mínimo que exigió la SED en la etapa contractual.

Tabla 3. Personal Femenino Interventoría

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	09	56,25%
Hombres	07	43,75%
TOTAL	16	100%

- **Personal Contratista**

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista cuenta con 5 mujeres y 15 hombres, lo que corresponde al 28 % de personal femenino vinculado a la empresa contratista.

Tabla 4. Personal Femenino Contratista

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	5	28%
Hombres	13	72%
TOTAL	20	100%

2.5. Directiva Distrital N.° 1 de 2011

De acuerdo con la Directiva Distrital N.° 1 de 2011, durante el periodo evaluado no se reporta la presencia de trabajadores en situación de vulnerabilidad dentro de la obra. Todo el personal cumple con las condiciones de salud y requisitos para el desarrollo seguro de sus actividades, por lo que no se requieren medidas especiales adicionales para este grupo.

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del plan de trabajo establecido, La interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, enfocada en el tema “Señales tempranas que pueden anticipar un accidente”. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la capacidad del personal de

interventoría para identificar de manera oportuna señales, condiciones y comportamientos que puedan anticipar la ocurrencia de un accidente, promoviendo la intervención preventiva y la toma de acciones seguras durante las visitas y recorridos de obra. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual**.

- **Capacitaciones y charlas de Seguridad**

Durante el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista Consorcio Educativo 25 realizó 24 charlas seguridad al personal de obra, donde el firme propósito de las charlas realizadas en obra comúnmente conocidas "charlas de 5 minutos" se abordaron temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diversas áreas de trabajo

- **Charlas de Seguridad**
  IED Simón Bolívar

No	TEMA	FECHA
1	Soporte vital Básico	3-8-2026
2	Medio Ambiente	5-8-2026
3	Vibraciones	7-8-2026
4	Primeros auxilios	11-8-2026
5	Operación maquinaria de corte	13-8-2026
6	Trabajo en equipo	16-8-2026
7	Escaleras de tijeras	19-8-2026
8	Prisa en el trabajo	20-8-2026
9	Lesiones de los ojos	21-8-2026
10	Resbalones y Caídas	24-8-2026
11	Botiquín	26-8-2026
12	Lesiones en las manos	28-8-2026

IED Republica de Colombia

No	TEMA	FECHA
1	Lumbalgia	3-8-26
2	Síndrome de Burnout	4-8-26
3	Ergonomía	5-8-26
4	Señalización de Áreas	6-8-26
5	Contaminación del Aire	7-8-26
6	Riesgo Biológico	11-8-26
7	Generador de energía eléctrica	12-8-26
8	Propiedades Físicas y Químicas del Aire	14-8-26

9	Protección Respiratoria	18-8-26
10	La Comunicación	19-8-26
11	Contaminación Ambiental	27-8-26
12	Instalación de tuberías	29-8-26

Los registros de asistencias y soportes se encuentran en el Anexo 6. Inducciones Personal y Anexo 9. Charlas y Capacitaciones, informe SST del contratista No 11 mes de Agosto.

Registro Fotográfico – Inducciones y Capacitaciones Consorcio Educativo 25	
	

4. SEÑALIZACIÓN


Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 adelantó la instalación de la señalización y demarcación correspondiente a las áreas de acopio de materiales, así como la señalización preventiva, de prohibición y de obligatoriedad en todos los frentes de obra. De igual manera, se ejecutó la demarcación de las rutas y puntos de evacuación como parte de la señalización de emergencia.
Asimismo, para este periodo, el contratista anexó la inspección de los equipos y maquinaria utilizados en la obra, evidenciando el cumplimiento de los controles establecidos en materia de SST. Esta información se encuentra en el Anexo 12. Registro Fotográfico.

4.1. Señalización del campamento

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25 realiza la señalización del campamento, de cada una de las áreas de trabajo y respectivos senderos peatonales como se evidencia en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización



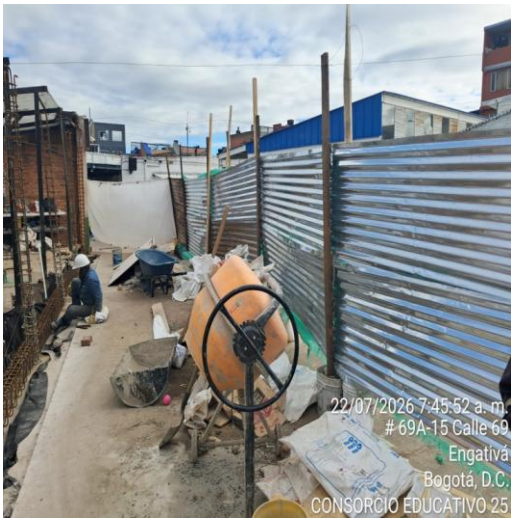


4.2. Señalización y Demarcación de Maquinaria

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 se contó con señalización de maquinaria, en razón a que durante el periodo evaluado se registró el ingreso y la operación de maquinaria en la obra, por lo cual fue necesario implementar la señalización correspondiente para garantizar la seguridad en las áreas intervenidas.

4.3. Señalización Plan de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25 ha implementado la señalización de acuerdo al plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias, de igual manera se encuentra señalizado las rutas de evacuación en acuerdo al plan de emergencia de obra como se evidencian en las siguientes fotografías.

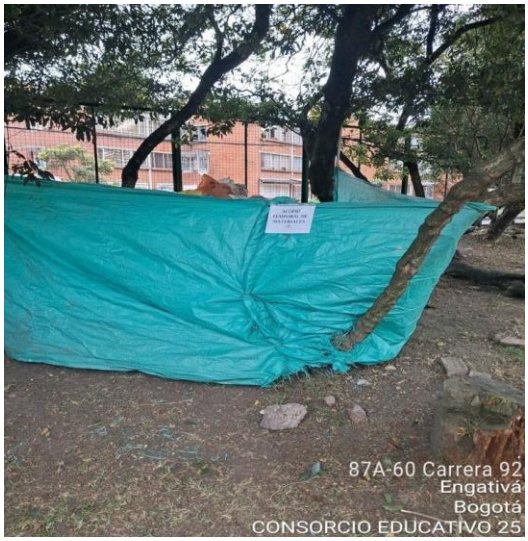Registro Fotográfico – Señalización	
	

4.4. Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25 realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra la respectiva señalización prohibitiva.

4.5. Señalización de las áreas destinadas para la movilidad.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25, realiza la instalación de señalización con cinta de peligro en aras de identificar las áreas de tránsito para el personal vinculado a obra y visitantes que ingresan a la misma; de igual manera, se encuentran demarcados y señalizados los senderos peatonales siendo estas áreas las que se encuentran al interior de obra destinadas para el paso seguro de todo personal vinculado al proyecto, como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización


5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para este periodo, se pudo evidenciar que todo el personal, tanto de interventoría como del contratista hizo uso de los respectivos EPP en obra.

5.1. Registro Uso de los EPP

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25, anexó el formato de entrega de EPP de los trabajadores operativos, al igual que el registro fotográfico donde se evidencia su uso adecuado en obra. Esta información se encuentra en el Anexo 8. Entrega de dotación - EPP y en el Anexo 8, informe mensual SST No 11 Contratista.

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

6.1. Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos.


El Consorcio Educativo 25 para este periodo 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 anexa la matriz IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en los procesos constructivos y riesgo identificados, donde se realizó la previa socialización de esta con el personal vinculado a obra a la fecha. Esta información se encuentra en el informe SST No 11 del contratista.

6.2. Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.

El Consorcio Educativo 25 para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, anexa el diligenciamiento de 11 análisis de trabajo seguro de las actividades que se realizaron en este

periodo en la obra. Esta información se encuentra contenida en el Anexo 1. ATS, informe Mensual SST No 11 del contratista.

Registro Fotográfico – Actividades – ATS

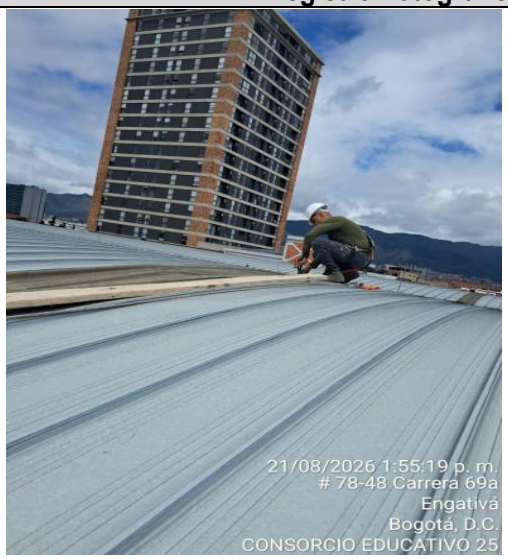



6.3. Permisos de trabajo para labores de alto riesgo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 realizó actividades de alto riesgo, por consiguiente, el contratista realizó el diligenciamiento de 2 permisos de trabajo en alturas y 4 permisos de trabajo en caliente. Esta información se encuentra en el Anexo 2. Permisos de trabajo y Anexo, informe Mensual SST No 11 del contratista.

6.4. Inspecciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 realiza 6 inspección en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada. Esta información se encuentra en el Anexo 3. Inspecciones Preoperacionales de obra del informe Mensual SST No 11 del contratista.

Institución Educativa Magdalena Ortega

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de Arnes	1
2	Inspección de Eslinga	1

Institución Educativa Republica de Colombia

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de Pulidora	2

Institución Educativa Simón Bolívar

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de Pulidora	2

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

7.1. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 cuenta con la aprobación de los siguientes vehículos.

Clase De Vehículo	Placa	SOAT	RUNT	Oficio De Aprobación	Fecha De Ingreso	Fecha De Retiro
Camión	JTY293	27/09/2026	28/07/2026	PROBINTEC-LOTE6-227	23/01/2026	Retirada
Volqueta	KFC608	08/1272026	29/09/2026	PROBINTEC-LOTE6-197	19/01/2026	Retirada
Volqueta	OSA414	07/05/2026	15/04/2026	PROBINTEC-LOTE6-197	19/01/2026	Retirada
Volqueta	CAH842	11/20/2026	09/12/2026	PROBINTEC-LOTE6-197	19/01/2026	Retirada
Volqueta	FCD 229	12/03/2026	21/03/2026	PROBINTEC-LOTE6-206	20/01/2026	Retirada
Volqueta	EWE764	28/04/2026	14/07/2026	PROBINTEC-LOTE6-210	21/01/2026	Retirada
Volqueta	SNJ658	01/07/2026	08/09/2026	PROBINTEC-LOTE6-214	22/01/2026	Retirada

Volqueta	JOA390	22/09/2026	21/04/2026	PROBINTEC-LOTE6-214	22/01/2026	Retirada
Volqueta	ZOA920	06/01/2027	18/01/2027	PROBINTEC-LOTE6-214	22/01/2026	Retirada
Volqueta	OWH435	21/07/2026	05/01/2026	PROBINTEC-LOTE6-214	22/01/2026	Retirada
Camión Furgón	WCD449	27/09/2026	28/07/2026	PROBINTEC-LOTE6-227	23/01/2026	Retirada

Clase De Vehículo	N° Tarjeta Registro	Serial	Mantenimiento	Oficio De Aprobación	Fecha De Ingreso
Excavadora Sobre Orugas	152115	66SE07EJNM0001334	06/01/2026	PROBINTEC-LOTE6-174	13/01/2026

7.2. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25, no se registraron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo asociadas a dichos equipos. La situación fue informada por el contratista como parte del reporte operativo del periodo.

7.3. Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25, no realizo inspección preoperacional de equipos y vehículos.

Horarios de trabajo de la maquinaria

De acuerdo con los lineamientos del contrato el Consorcio Educativo 25, no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra.

7.4. Control diario de Horómetro

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Educativo 25 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra.

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Pagos de Seguridad Social

Personal Interventoría

Probintec SAS, para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 anexó el soporte de pago de la Seguridad Social correspondiente a los 16 profesionales (Ver Anexo 2. Planillas de SS) que conforman el equipo de interventoría. Dicho pago se encuentra registrado bajo la planilla No 9508329491 cumpliendo así con las obligaciones laborales y contractuales establecidas.

8.2. Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: Cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VINCULACIÓN LABORAL
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	$9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	$6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%	$8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	$8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%	$3.000.000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%	$3.000.000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	$3.000.000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	$3.000.000	Obra Laboral

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VINCULACIÓN LABORAL
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	$2.700.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos	30%	$2.700.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	$1.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	$2.700.000	Obra Laboral
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	$2.500.000	Obra Laboral
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	$2.500.000	Obra Laboral
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	$1.750.000	Obra Laboral

Personal Contratista

Consorcio Educativo 25

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Diego Armando Rey Olarte	94385968	AFP- julio Salud – agosto	03/09/2026	$1.750.905	Director de Obra
Hugo Ferley López Páez	94385968	AFP- julio Salud – agosto	03/09/2026	$2.800.000	Residente de Obra
María Victorina Lozano	9510706555	AFP- agosto Salud – septiembre	03/09/2026	$1.750.905	Profesional SST
Viviana Luengas Amaya	94385968	AFP- julio Salud – agosto	03/09/2026	$2.200.000	Técnico SST1
Luisa Fernanda Parrado Londoño	94850838	AFP- agosto Salud – septiembre	07/09/2026	$2.500.000	Técnico SST 2
Brayan Leonardo Moreno Reyes	94385968	AFP- julio Salud – agosto	03/09/2026	$ 2.600.000	Inspector de Obra 1
Daniela Galindo Molano	9507439261	AFP- julio Salud – julio	04/08/2026	$3,600,000	Especialista Ambiental

Dayanna Alejandra Baquero	93879040	AFP- julio Salud – agosto	05/08/2026	$ 5.350.000	Profesional Costos y Presupuestos

ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Mauricio Bermúdez Romero	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Oficial Eléctrico
Anderson Fabián Rodríguez Mejía	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Eléctrico
Erick Xavier Flores González	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Eléctrico
José Alfredo Garzón Isaza	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Eléctrico
Jeferson Soriano Cadena	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	16/07/2026	$ 1.800.00	Eléctrico
Sebastián García Rodríguez	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.800.00	Eléctrico
Merlis Barrios García	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Ing. residente

INGORIENTE

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Jorman Alejandro Torres Reyes	1085000587	AFP- julio Salud – agosto	08-09-2026	$ 1.750.905	Oficial de obra
Maicol Sebastián Caita Rodriguez	1085000587	AFP- julio Salud – agosto	08-09-2026	$ 1.750.905	Oficial de obra
Yojan Camilo Malambo	1085000587	AFP- julio Salud – agosto	08-09-2026	$ 1.750.905	Ayudante de obra
Jhon Alexey Hernández	1085000587	AFP- julio Salud – agosto	08-09-2026	$ 1.750.905	Oficial de obra
Jorge González	1085000587	AFP- julio	08-09-2026	$ 1.750.905	Maestro de obra

solano		Salud – agosto			

WNM Ingenieros

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Wilson Alexander Mesa Ladino	1084901429	AFP- agosto Salud – septiembre	03-09-2026	$ 1.750.905	Operario
Willington Niño Melo	1084931258	AFP- agosto Salud – agosto	08-09-2026	$ 2.000.000	Contratista
Carlos Alberto Velez Torres	1084901429	AFP- agosto Salud – septiembre	03-09-2026	$ 1.750.905	Oficial de obra
Diego Alexander Pachón	1084901429	AFP- agosto Salud – septiembre	03-09-2026	$ 1.750.905	Auxiliar de obra

9. EMERGENCIAS

9.1. Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 instala los equipos de emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro, cada frente de obra cuenta con la señalización de 1 botiquín tipo A, 1 camilla rígida, 1 extintor de 10 libras ABC de emergencia.



Plan de Emergencia

9.2. Conformación de las Brigadas de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio Educativo 25, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se evidencia que el contratista conforma las brigadas, cumpliendo los lineamientos de la lista de chequeo de la SED. Estas brigadas fueron conformadas de primeros auxilios, contra incendios, y de evacuación.

9.3. Simulacros de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25, no realiza simulacro se ejecutó simulacros de emergencia en los frentes de obra. Esta situación fue reportada en la información mensual del contratista, indicando que la actividad será programada para un periodo posterior conforme al plan de emergencias establecido.

10. BIENESTAR

10.1 Instalaciones Provisionales

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Educativo 25, se evidenció la presencia y adecuación de un campamento permanente de obra. Este espacio cuenta

con las áreas básicas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el apoyo logístico y la gestión en campo.

10.2. Baterías de Baños

De acuerdo con lo evidenciado en los diferentes frentes de obra, durante este periodo el Consorcio Educativo 25 hizo uso de las baterías sanitarias fijas existentes en cada institución educativa, las cuales fueron asignadas exclusivamente para el personal del consorcio. Esta medida garantiza la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados durante la ejecución de las actividades en obra.

10.3. Sistema de hidratación

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Educativo 25 se evidencia puntos de hidratación (botellón agua) dispuesto en áreas comunes de fácil acceso, visible y libre de obstáculos, estos puntos de hidratación son para el uso del personal vinculado a obra.

11. ORDEN Y ASEO

11.1.Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra

Se pudo evidenciar que el Consorcio Educativo 25 realiza jornadas de orden y aseo diarias en cada uno de los frentes de obra, como se evidencia en el registro fotográfico





Orden y Aseo

12. DIVULGACIÓN

12.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidenció que el Consorcio Educativo 25 para este periodo, se evidencia la divulgación del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en las Charlas realizas.

12.2. Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST

El Consorcio Educativo 25, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, realizó 38 charlas de 5 minutos, con ello se cumple con el cronograma y programa de capacitaciones y charlas del SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Consorcio Educativo 25, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, hace entrega de la reunión mensual de:

COPASST: El contratista anexa la conformación del COPASST

14. INDICADORES SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presentan accidentes de obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

- **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo**

$$IF\ AT = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

$$IF\ AT = 0\%$$

- **Índice de severidad de accidente de trabajo**

$$IS\ AT = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes + No. de días cargados en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

$$IS\ AT = 0\%$$

- **Proporción de letalidad de accidentes de trabajo**

Letalidad AT = No. de AT mortales que se presentaron en el año *100

No. Total de AT que se presentaron en el año

Letalidad AT = 0%

- **Indicador de prevalencia de enfermedad laboral**

Enfermedad Laboral = No. Casos de enfermedad laboral *100000

Promedio de trabajadores en el año

Prevalencia EL = 0%

- **Ausentismo con causa médica**

Ausentismo por causa médica = No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes*100

No. Días programados de trabajo en el mes

Ausentismo por causa médica = 0/0*100 = 0%

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

15.1. Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST. (Ver Anexo 7 Certificado de accidentalidad emitido por la ARL del contratista).

15.2. Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.3.Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa planes derivados de la investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- ✓ En el mes el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 esta interventoría realiza verificación a la documentación y registros presentados por el contratista de obra de acuerdo con las actividades a realizadas.
- ✓ Durante el periodo en mención se realizaron visitas a obra para verificar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los frentes de obra, de lo cual se realiza verificación a señalización, equipos de emergencia en buen estado, dotación y EPP al manual de marca y en buen estado. Sin embargo, por parte de esta interventoría se realizan observaciones y recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento en obra.
- ✓ Durante el periodo reportado, el contratista no registra la ocurrencia de accidentes de trabajo ni incidentes asociados a las actividades ejecutadas en el frente de obra. Esta condición evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en SG-SST, así como la adecuada implementación de las medidas preventivas definidas para el control de los riesgos identificados.
- ✓ Se evidencia el compromiso del personal con el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo el trabajo seguro en los diferentes frentes de obra y contribuyendo a la prevención de incidentes y accidentes laborales. Así mismo, se recomienda continuar fortaleciendo la implementación de buenas prácticas seguras en los frentes de obra, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y prevenir la materialización de riesgos durante la ejecución de las actividades.

17. ANEXOS SST

Anexo 1. Lista de Chequeo_03/07/2026 – 02/08/2026

Anexo 2. Planillas de Seguridad Social Interventoría agosto 2026

Anexo 3. Capacitación Mensual agosto 2026

Elaboró	Aprobó
Katerin Carolina Núñez Osorio	**Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez**
Profesional SST	Director de interventoría
	

Anexos SST

Proyecto:	Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas				
Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	**Interventoría:**	PROBINTEC		
Contrato:	No. CO1.PCCNTR.8155350	**Contrato:**	No. CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	No 11 - Agosto 2026	**Periodo:**	03 de Agosto al 02 de Septiembre del 2026		

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				*La Interventoría cumplió con la entrega oportuna del informe mensual de gestión SST, conforme a la fecha acordada con la supervisión del proyecto*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X				*La información se encuentra relacionada en el informe Mensual SST No 11 del contratista e interventoría*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X				*El informe mensual de gestión SST se presenta conforme a los lineamientos de la SED, en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X				*El personal del contratista y de la Interventoría cuenta con afiliación vigente a ARL, EPS y AFP, según lo evidenciado en el Informe Mensual SST N.° 11*
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X				*Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se recopila la documentación obligatoria de cada trabajador. Así mismo, el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra se actualiza de manera semanal y es remitido como soporte a la supervisión del proyecto todas las semanas, a través de los grupos de WhatsApp establecidos para la comunicación oficial*
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X				*Se realizan y verifican los exámenes médicos de ingreso y egreso por cargo y se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal, esta información se puede evidenciar en el informe Mensual SST No 11*
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.			X		*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento establecido en el SGSST. Por parte de la Interventoría, se realizaron las capacitaciones correspondientes al personal de acuerdo con el periodo reportado, las cuales se encuentran debidamente soportadas en el Informe Mensual SST N.° 11Anexo 3 de Interventoría y en el Informe Mensual Anexo 6 del contratista*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X				*Todos los trabajadores son notificados de los riesgos asociados al cargo a desempeñar antes de iniciar las labores propias del mismo, y se cuenta con los respectivos soportes de ejecución de la actividad. Durante el periodo reportado no se generaron ingresos de personal por parte de la Interventoría; sin embargo, se continúa con la notificación de riesgos al personal vinculado del contratista*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.°7*
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*

	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con los EPP adecuados para la actividad a desarrollar, los cuales se encuentran normalizados y son utilizados de manera permanente al interior de la obra. El Contratista garantiza el recambio oportuno de los EPP y lleva un registro formal de entrega, así como la reposición e inspección periódica de los mismos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Anexo 8 Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con la dotación adecuada para la actividad a desarrollar, Esta información se encuentra debidamente soportada en el Anexo 8 Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X				*El contratista mantiene actualizado y divulgado el Panorama de Factores de Riesgo y ejecuta los planes de acción derivados de la Matriz de Riesgos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11*
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	6.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación	X				*El contratista envía la documentación de vehículos y maquinaria, la cual es revisada y aprobada por la Interventoría previo al ingreso a la obra. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.	X				*El contratista remite a la interventoría los mantenientos preventivos realizados a la maquinaria antes del ingreso al frente de obra, esta información se encuentra en el Anexo 13 Documentos de maquinaria y volquetas del informe Mensual SST No 11 del contratista e interventoría*
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente	X				*El contratista realiza los preoperacionales de las maquinarias y volquetas ingresadas en el periodo, esta información se encuentra relacionada en el informe Mensual SST No 11 del contratista.*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.	X				*De acuerdo con los lineamientos del contrato el Consorcio Educativo 25, no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra.*
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.	X				*De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Educativo 25 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra*
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.	X				*El contratista 2 días antes envía mediante oficio el ingreso de maquinaria y volquetas a los frentes de obra*
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.	X				*El contratista presenta a interventoría el certificado de idoneidad del operador de la maquinaria*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X				*El contratista como interventoría se encuentran al día en el pago de seguridad social. Dicha información se encuentra en el informe mensual SST anexos 2. Pago de Planillas de SS de interventoría y en el informe mensual SST No 11. Anexo 5 del*
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
9. EMERGECIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.			X		*Durante el periodo reportado no se han registrado emergencias en los frentes de obra.*
	9.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.	X				
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	10.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.			X		*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	13.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	14.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X		Durante este periodo del 03 de agosto del 2026 al 02 de septiembre del 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X		Durante este periodo del 03 deagosto del 2026 al 02 de septiembre del 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ: Katerin Nuñez Osorio

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

NOMBRE:
CARGO: Profesional SST
EMPRESA: PROBINTEC
FECHA: 11/09/2026

FECHA: *11/09/2026*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	557472989	9508329491	E	2026/09/14	2026/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$33,105,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN																		230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,857,600
2	CC	1095921445	BETANCUR DOMINGUEZ SILVIA JULIANA																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
3	CC	79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO																		230201	30	$6,350,000	$1,016,000	EPS008	30	$6,350,000	$254,000	CCF24	30	$6,350,000	$254,000	14-11	30	$6,350,000	$442,000	30	$0	$0	Si	$1,966,000
4	CC	53094602	GARCIA MUÑOZ DIOSMERY																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
5	CC	1019117937	JACINTO RODRIGUEZ ERIKA ALEJANDRA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	1000591167	JARAMILLO CHAVEZ CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
7	CC	1002550163	MARTINEZ MORALES PAULA ANDREA																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS037	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
8	CC	1073246437	MORA LA ROTTA NELLY NATALIA		X																230201	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS008	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
9	CC	7316778	NIVIA QUINTERO GERMAN ADOLFO																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
10	CC	1054552084	NUÑEZ OSORIO KATERIN CAROLINA																		25-14	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS037	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0	Si	$2,167,200
11	CC	80199878	OLARTE ORTIZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS001	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
12	CC	1012451349	REYES SALCEDO YENI DANIELA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS008	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
14	CC	1049627513	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROCIO LORENA																		25-14	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS037	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
15	CC	14395377	SERRANO RUEDA CARLOS FERNANDO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
16	CC	1128627947	TORO CARDONA ANGIE PAOLA																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
17	CC	79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON																		25-14	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
Total	**Afiliados(17)**																					$104,750,905	$17,434,400			$104,750,905	$4,190,100			$104,750,905	$4,190,100			$104,750,905	$7,291,200		$0	$0		$33,105,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	557472989	9508329491	E	2026/09/14	2026/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$33,105,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$17,434,400					$0	$17,434,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$5,046,000	$99,000	$0	$99,000	$0	$0	$5,046,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$9,850,800	$193,300	$0	$193,300	$0	$0	$9,850,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$2,537,600	$44,800	$0	$44,800	$0	$0	$2,537,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$7,291,200					$0	$7,291,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$7,291,200	$0	$0	$0	$0	$0	$7,291,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$4,190,100					$0	$4,190,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$4,190,100	$0	$0	$0	$0	$0	$4,190,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$4,190,100					$0	$4,190,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$396,000	$0	$0	$0	$0	$0	$396,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,318,100	$0	$0	$0	$0	$0	$1,318,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,244,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,244,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,032,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,032,000
TOTAL				17	$33,105,800	$337,100	$0	$337,100	$0	$0	$33,105,800

	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 03/10/2025
FECHA: 24/08/2026 LUGAR: Interventoría	Capacitación [X] Charla [ ] Reunión Gerencial [ ]	Inducción [ ] Otra/Cual:

HORA INICIO: 8:10 am HORA FIN: 9.00 am

TEMA: Señales tempranas que pueden anticipar un accidente

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Identificar de manera apertura señales, condiciones y comportamientos que pueden anticipar la ocurrencia de un accidente.

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angie Paola Toro Cardona	1.128.627.947	Técnico SST	
2	Dismery García Muñoz	53894602	Inspector	
3	Cristian Rodriguez	1014363316	Espe. Ambiental	
4	Yeni Daniela Reyes	1012451349	Apoyo. Interventl	Daniela Reyes.
5	Luis Emiro Blanco	79800692	Apoyo Inter	
6	Carlos Fernando Serrano	14395777	Inspector	Carlos Serrano
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

CARGO: Profesional SST

Scanned with CamScanner

PROBINTEC S.A.S

NIT: 829.001.061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo **ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANIA 1.096.202.099** y con **tarjeta profesional 207279-T** de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **PROBINTEC S.A.S** con **NIT 829.001.061-1**, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barrancabermeja, luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 10 (diez) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 207279-T
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo, **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.096.244.957** de Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal Principal de **PROBINTEC S.A.S** identificada con **NIT 829.001.061-1,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiera lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 10 (Diez) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

CERTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE VALORES DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA

Que los valores correspondientes al personal ofertado en la propuesta económica para el mes de agosto de 2026 corresponden a los valores efectivamente contratados y reconocidos al personal vinculado para la ejecución del contrato.
Asimismo, se certifica que dichos valores corresponden a los ingresos base y valores reportados en las respectivas planillas de pago de Seguridad Social del personal ofertado y vinculado al contrato, de conformidad con la normatividad aplicable.
La información contenida en la presente certificación corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos contratos laborales, documentos de nómina y planillas de pago de Seguridad Social, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de entidad cuando sea requerido.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VÍNCULO LABORAL
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	$ 9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	$ 6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%	$9,900,000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%	$9,900,000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	$9,900,000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	$9,900,000	Obra Laboral
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	$ 7.000.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%	$ 6.000.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	$ 3.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	$ 2.700.000	Obra Laboral
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	$1.750.905	Obra Laboral

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, la empresa PROBINTEC contó, durante el mes de agosto de 2026, con ocho (8) mujeres vinculadas para el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución del contrato. .
La información relacionada con la vinculación del personal corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos soportes laborales, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad, cuando corresponda.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales y para los fines pertinentes.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

INFORMACION DE PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN SEXO PARA CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								
SUBSECRETARIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL						**FECHA DE REPORTE:**	agosto-26
	Construcción	Transporte y Almacenamiento	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	Actividades Inmobiliarias	Información y Telecomunicaciones	Industria Manufacterara	Comercio y Reparación de Vehículos	Otras ramas económicas
Total mujeres Contratadas	8							
Rango salarial minimo mujeres	1.750.905							
Rango salarial máximo mujeres	9.900.000							
Rango etario minimo mujeres	26							
Rango etario máximo mujeres	52							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) muejeres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) muejeres	190							
Discapacidad mujeres	0							
Pertenencia étnica mujeres	0							
Victimas del conflicto armado mujeres	0							
Mujer Cuidadora	0							
Total Hombres Contratados	**7**							
Rango salarial minimo hombres	1.750.905							
Rango salarial máximo hombres	9.900.000							
Rango etario minimo hombres	28							
Rango etario máximo hombres	63							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) hombres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) hombres	190							
Discapacidad hombres	0							
Pertenencia étnica hombres	0							
Victimas del conflicto armado hombres	0							
Hombre Cuidador	0							

PROBINTEC-LOTE6-889

Bogotá, 11 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO EDUCATIVO 25
Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 18".*


Asunto: Aprobación Informe Mensual SST No 11– V1 correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre del 2026 Rta oficio 26-0908-1015- Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato me permito APROBAR el Informe Mensual SST No 11 V1 correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre del 2026, recibido mediante el oficio 26-0908-1015, dado que incorpora la información solicitada por esta interventoría.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y que sean requeridas por la Secretaría Distrital de Educación.

Cordialmente,



KATERIN NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROBINTEC S.A.S

PROBINTEC-LOTE6-891

Bogotá, 11 de septiembre de 2026

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Hernán López
Supervisor SED
Bogotá D.C

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 18".*

Asunto: Radicación Informe Mensual SST No 11– V1 correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre del 2026- Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.


Cordial Saludo,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, nos permitimos radicar el Informe Mensual SST No 11 V1 correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre del 2026 y sus anexos correspondientes al contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18 objeto de ref. 2, previamente revisado y aprobado por esta interventoría mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-889 el cual es insumo base en cumplimiento del componente SST.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y que sean requeridas por la Secretaría de Educación Distrital (SED).

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,



KATERIN NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROBINTEC S.A.S

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 18**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 18

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TABORA SEDE A



Poda de ramas en el arbol del patio central de la institución.



Acopio de material residual de poda.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155350 del 8 de septiembre de 2025.

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **Dayanna Alejandra Baquero Aguilar** identificado con cédula No. **1.121.918.202 de Villavicencio (Meta)** quien funge como Representante Legal de **CONSORCIO EDUCATIVO 25**, con NIT. **901973696-9** como Contratista de Obra y **Sandra Stella Moreno Buitrago**, identificado con cédula No. 35.254.078 de Fusagasugá (Cund), en calidad de representante legal de la firma **PROBINTEC S.A.S.** con NIT 829.001.061-1, como Contratista de Interventoría, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: N° 5175 con fecha del 09 de septiembre de 2025.
N° 5176 con fecha del 09 de septiembre de 2025

APROBACION DE GARANTIA: 03 de OCTUBRE de 2025.

OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 25

VALOR: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($2.551.797.666), incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

PLAZO: siete (07) meses

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 02 de mayo de 2026

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

SANDRA STELLA MORENO B.

CONTRATISTA DE OBRA
Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
C.C. **1.121.918.202 de Villavicencio**
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO 25
NIT **901973696-9**

INTERVENTOR
SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
C.C. 35.254.078 FUSAGASUGA (CUND).
Representante Legal
PROBINTEC S.A.S
NIT. 829.001.061-1

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

En mi calidad de Interventor del contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Supervisión de la entidad y en el procedimiento de aprobación de pólizas, me permito solicitar a la Oficina de Contratos la verificación y aprobación de las garantías presentadas por el contratista, de conformidad con lo establecido en el contrato de obra y la normatividad vigente.

1. Información básica del contrato de obra

Dato	Información
Número del contrato de obra	CO1.PCCNTR.8155350 - 2025
Fecha de suscripción del contrato de obra	03 de septiembre de 2025
Plataforma	SECOP II
Contratista	CONSORCIO EDUCATIVO 25
Supervisor	PROBINTEC S.A.S. Contrato de interventoría No CO1.PCCNTR.8168931 - 2025
Fecha de recepción de las garantías SED	07 de septiembre del 2026
Tipo de garantías que se remiten para aprobación	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ESTABILIDAD DE LA OBRA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN

2. Verificación realizada

El suscrito Interventor, Supervisor Designado y apoyo a la Supervisión del Contrato de interventoría deja constancia de que revisó las garantías aportadas por el contratista y verificó que cumplen con lo establecido en el contrato de obra y la normatividad vigente, conforme a la siguiente información:

Beneficiario	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, NIT 899.999.061-9
Tomador	CONSORCIO EDUCATIVO 25
Asegurado	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, NIT 899.999.061-9

Amparo	Vigencia (Desde - Hasta)	Valor Asegurado
Cumplimiento General.	31/08/2026 - 02/09/2027	793.851.853,80
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	31/08/2026 - 02/01/2030	396.925.926,90
Estabilidad y Calidad de las Obras.	02/01/2027 - 02/01/2030	793.851.853,80
Responsabilidad Civil Extracontractual.	08/09/2025 - 02/01/2027	700.362.000,00
Todo Riesgo en Construcción	03/11/2026 - 05/03/2027	3.969.259.269,00

Así mismo, se deja constancia de que las pólizas o garantías se encuentran cargadas en SECOP II

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC S.A.S - NIT: 829.001.061-1
Interventoría - Contrato interventoría
No. CO1.PCCNTR. 8168931-2025

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 9

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 03 DE AGOSTO DE 2026 HASTA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350 DE 2025

CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO 25

DIRECCION : CRA 71 D 73 A 51

C.C. ó NIT : 901.973.696-9

TELEFONO : 3.137.640.402

INTERVENTOR : PROBINTEC SAS

DIRECCION : BARRANCABERMEJA

C.C. ó NIT : 829.001.061-1

TELEFONO : 3161147965

OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – LOTE 18".

ESTABLECIMIENTOS : IED LA PALESTINA SEDE B, IED JORGE GAITAN CORTES SEDE B, IED MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO SEDE A, IED RODOLFO LLINAS SEDE B, IED SIMON BOLIVAR SEDE A, IED TABORA SEDE A, IED TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE C, IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A, LUCILA FERNANDEZ LAVERDE, DILE, ABEL RODRIGUEZ CESPEDES, Y ANTONIO VILLAVICENCIO, IED TECNICO PALERMO, IED REPUBLICA DE COLOMBIA, IED JUAN DEL CORRAL SEDE A

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $ 2.551.797.666,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL : $ 645.761.648,00

VR. ADICIONAL 2 : $ 461.699.955,00

VR. FINAL : $ 3.659.259.269,00

PLAZO INICIAL : 7 MESES

FECHA INICIACION : 3 de octubre de 2025

FECHA TERMINAC.INICIAL : 2 de mayo de 2026

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRA : 4 MESES

TIEMPO SUSPENDIDO :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 11 MESES

FECHA FINAL : 2 de septiembre de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20-feb-25	5175	8-sep-25	$ 2.426.686.122,00			
2294	21-mar-25	5176	8-sep-25	$ 125.111.544,00			
3709	5-dic-25	7586	23-dic-25	$ 645.761.648,00			
522	12-mar-26	3043	4-may-26	$ 461.699.955,00	$ 320.012.301,00	$ 157.122.219,00	$ 162.890.082,00
TOTAL				**$ 3.659.259.269,00**	**$ 320.012.301,00**	**$ 157.122.219,00**	**$ 162.890.082,00**
							$ 162.890.082,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 157.122.219,00** SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE.

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTASFÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DELDISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRASMENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓNDE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICASPRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURAFÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDESADMINISTRATIVAS - lote 18	GLB	1,00	$ 3.659.259.269,00	$ 3.659.259.269,00			-				
	COLEGIO IED SIMON BOLIVAR SEDE A							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				330,63	$ 1.458.408,93	330,63	$ 1.458.408,93	
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 7.338,00				1.365,93	$ 10.023.194,34	1.365,93	$ 10.023.194,34	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				151,83	$ 4.920.202,98	151,83	$ 4.920.202,98	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado físico.	M		$ 149.088,00				97,91	$ 14.597.206,08	97,91	$ 14.597.206,08	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 286.098,00				2,96	$ 846.850,08	2,96	$ 846.850,08	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.894,00				328,63	$ 9.824.065,22	328,63	$ 9.824.065,22	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				67,74	$ 1.573.600,20	67,74	$ 1.573.600,20	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.851,00				4,10	$ 48.589,10	4,10	$ 48.589,10	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.654,00				58,08	$ 1.664.224,32	58,08	$ 1.664.224,32	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00				5,17	$ 68.119,92	5,17	$ 68.119,92	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 27.898,00				86,62	$ 2.416.524,76	86,62	$ 2.416.524,76	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				31,77	$ 1.097.844,12	31,77	$ 1.097.844,12	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.616,00				73,15	$ 2.239.560,40	73,15	$ 2.239.560,40	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 28.418,00				20,00	$ 568.360,00	20,00	$ 568.360,00	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 21.572,00				10,74	$ 231.683,28	10,74	$ 231.683,28	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 161.222,00				3,00	$ 483.666,00	3,00	$ 483.666,00	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.411,00				337,29	$ 11.943.776,19	337,29	$ 11.943.776,19	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.803,00				94,83	$ 2.541.728,49	94,83	$ 2.541.728,49	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 12.466,00				30,00	$ 373.980,00	30,00	$ 373.980,00	
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN		$ 66.232,00				1,00	$ 66.232,00	1,00	$ 66.232,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.781,00				47,00	$ 365.707,00	47,00	$ 365.707,00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 4.574,00				241,63	$ 1.105.215,62	241,63	$ 1.105.215,62	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.641,00				10,00	$ 256.410,00	10,00	$ 256.410,00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.552,00				310,31	$ 7.308.421,12	310,31	$ 7.308.421,12	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 9.333,00				16,50	$ 153.994,50	16,50	$ 153.994,50	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 15.281,00				20,00	$ 305.620,00	20,00	$ 305.620,00	
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 48.723,00				142,04	$ 6.920.614,92	142,04	$ 6.920.614,92	
1.2.49	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 33.853,00				21,63	$ 732.240,39	21,63	$ 732.240,39	
1.2.50	DESINSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES Y REUBICACIÓN DE LOS MISMOS EN OTRO SITIO.	UN		$ 91.520,00				1,00	$ 91.520,00	1,00	$ 91.520,00	
1.3	**MANTENIMIENTOS**							-				
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2		$ 56.101,00				4,86	$ 272.650,86	4,86	$ 272.650,86	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				151,19	$ 5.468.844,68	151,19	$ 5.468.844,68	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00				98,68	$ 1.606.905,12	98,68	$ 1.606.905,12	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				

2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00				50,82	$ 7.167.398,70	50,82	$ 7.167.398,70		
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 183.394,00				29,86	$ 5.476.144,84	29,86	$ 5.476.144,84		
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 202.079,00				14,61	$ 2.952.374,19	14,61	$ 2.952.374,19		
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00				143,04	$ 17.174.240,64	143,04	$ 17.174.240,64		
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.299.850,00				1,22	$ 1.585.817,00	1,22	$ 1.585.817,00		
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.3.5	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).	M		$ 44.238,00				58,90	$ 2.605.618,20	58,90	$ 2.605.618,20		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				158,37	$ 1.196.802,09	158,37	$ 1.196.802,09		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.399,00				334,44	$ 2.474.521,56	334,44	$ 2.474.521,56		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				2.294,65	$ 50.943.524,65	2.294,65	$ 50.943.524,65		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2		$ 68.115,00				2,77	$ 188.678,55	2,77	$ 188.678,55		
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				2.930,00	$ 4.896.030,00	2.930,00	$ 4.896.030,00		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 149.583,00				56,99	$ 8.524.735,17	56,99	$ 8.524.735,17		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 95.406,00				12,00	$ 1.144.872,00	12,00	$ 1.144.872,00		
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 679.563,00				3,00	$ 2.038.689,00	3,00	$ 2.038.689,00		
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 912.438,00				1,00	$ 912.438,00	1,00	$ 912.438,00		
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 1.133.895,00				1,00	$ 1.133.895,00	1,00	$ 1.133.895,00		
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 79.253,00				1,00	$ 79.253,00	1,00	$ 79.253,00		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 132.193,00				5,00	$ 660.965,00	5,00	$ 660.965,00		
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 162.740,00				6,00	$ 976.440,00	6,00	$ 976.440,00		
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 220.519,00				18,00	$ 3.969.342,00	18,00	$ 3.969.342,00		
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.547,00				13,00	$ 397.111,00	13,00	$ 397.111,00		
5.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 14.598,00				11,74	$ 171.380,52	11,74	$ 171.380,52		
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.286,00				108,37	$ 2.631.873,82	108,37	$ 2.631.873,82		
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 35.105,00				14,40	$ 505.512,00	14,40	$ 505.512,00		
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00				237,87	$ 3.981.705,93	237,87	$ 3.981.705,93		
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 83.083,00				18,47	$ 1.534.543,01	18,47	$ 1.534.543,01		
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 187.842,00				58,00	$ 10.894.836,00	58,00	$ 10.894.836,00		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 206.881,00				62,00	$ 12.826.622,00	62,00	$ 12.826.622,00		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 41.095,00				257,81	$ 10.594.701,95	257,81	$ 10.594.701,95		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				257,81	$ 56.539.279,86	257,81	$ 56.539.279,86		
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 68.496,00				14,61	$ 1.000.726,56	14,61	$ 1.000.726,56		
7.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2		$ 142.340,00				47,59	$ 6.773.960,60	47,59	$ 6.773.960,60		
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 25.261,00				10,68	$ 269.787,48	10,68	$ 269.787,48		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2		$ 220.846,00				94,83	$ 20.942.826,18	94,83	$ 20.942.826,18		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS; INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 736.730,00				15,50	$ 11.419.315,00	15,50	$ 11.419.315,00		
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 848.735,00				12,60	$ 10.694.061,00	12,60	$ 10.694.061,00		
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M2		$ 1.166.826,00				11,86	$ 13.838.556,36	11,86	$ 13.838.556,36		
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					

9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 558.579,00				51,06	$ 28.521.043,74	51,06	$ 28.521.043,74	
9.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO CON ALFAJIA Y REFUERZOS ANTI FLEXIÓN CADA 50CM. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 552.004,00				5,21	$ 2.875.940,84	5,21	$ 2.875.940,84	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37.702,00				131,05	$ 4.940.847,10	131,05	$ 4.940.847,10	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.048,00				301,66	$ 3.936.059,68	301,66	$ 3.936.059,68	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 9.801,00				321,94	$ 3.155.333,94	321,94	$ 3.155.333,94	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				462,46	$ 10.997.298,80	462,46	$ 10.997.298,80	
12.1.11	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 8.838,00				420,59	$ 3.717.174,42	420,59	$ 3.717.174,42	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.499,00				723,10	$ 16.269.026,90	723,10	$ 16.269.026,90	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 17.925,00				227,52	$ 4.078.296,00	227,52	$ 4.078.296,00	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 31.026,00				121,51	$ 3.769.969,26	121,51	$ 3.769.969,26	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00				420,59	$ 8.700.745,33	420,59	$ 8.700.745,33	
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 9.550,00				196,78	$ 1.879.249,00	196,78	$ 1.879.249,00	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 98.345,00				18,94	$ 1.862.654,30	18,94	$ 1.862.654,30	
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
15.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2	UN		$ 222.000.000,00				1,00	$ 222.000.000,00	1,00	$ 222.000.000,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU	M2		$ 275.800,00				289,87	$ 79.946.146,00	289,87	$ 79.946.146,00	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$ 134.038,00				27,06	$ 3.627.068,28	27,06	$ 3.627.068,28	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 318.243,00				54,76	$ 17.426.986,68	54,76	$ 17.426.986,68	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				1.326,30	$ 6.443.165,40	1.326,30	$ 6.443.165,40	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.501,00				11.853,99	$ 41.500.818,99	11.853,99	$ 41.500.818,99	
	COLEGIO IED (IT) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				98,07	$ 432.586,77	98,07	$ 432.586,77	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				233,92	$ 7.580.411,52	233,92	$ 7.580.411,52	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el ítem incluye revision periodica de su estado físico.	M		$ 149.088,00				230,12	$ 34.308.130,56	230,12	$ 34.308.130,56	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				5,58	$ 401.631,66	5,58	$ 401.631,66	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				4,48	$ 104.070,40	4,48	$ 104.070,40	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.654,00				218,16	$ 6.251.156,64	218,16	$ 6.251.156,64	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00				62,79	$ 827.321,04	62,79	$ 827.321,04	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 27.898,00				50,77	$ 1.416.381,46	50,77	$ 1.416.381,46	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				27,30	$ 943.378,80	27,30	$ 943.378,80	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.616,00				15,72	$ 481.283,52	15,72	$ 481.283,52	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.411,00				366,29	$ 12.970.695,19	366,29	$ 12.970.695,19	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 12.466,00				14,00	$ 174.524,00	14,00	$ 174.524,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.781,00				5,00	$ 38.905,00	5,00	$ 38.905,00	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 15.281,00				12,00	$ 183.372,00	12,00	$ 183.372,00	
1.3	**MANTENIMIENTOS**							-				
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2		$ 56.101,00				100,45	$ 5.635.345,45	100,45	$ 5.635.345,45	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 22.753,00		17,57	$ 399.770,21	-		17,57	$ 399.770,21	
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 19.467,00				77,44	$ 1.507.524,48	77,44	$ 1.507.524,48	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				64,36	$ 2.328.029,92	64,36	$ 2.328.029,92	
2.5	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				3.422,57	$ 75.984.476,57	3.422,57	$ 75.984.476,57	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M		$ 34.775,00				11,43	$ 397.478,25	11,43	$ 397.478,25	
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				2.460,00	$ 4.110.660,00	2.460,00	$ 4.110.660,00	

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 95.406,00		8,00	$ 763.248,00	-		8,00	$ 763.248,00		
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 66.179,00				9,00	$ 595.611,00	9,00	$ 595.611,00		
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 66.580,00				2,00	$ 133.160,00	2,00	$ 133.160,00		
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 190.080,00				45,00	$ 8.553.600,00	45,00	$ 8.553.600,00		
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.797,00				27,07	$ 156.924,79	27,07	$ 156.924,79		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 132.193,00				2,00	$ 264.386,00	2,00	$ 264.386,00		
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 158.635,00				1,00	$ 158.635,00	1,00	$ 158.635,00		
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 264.291,00				4,00	$ 1.057.164,00	4,00	$ 1.057.164,00		
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.547,00				3,00	$ 91.641,00	3,00	$ 91.641,00		
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 10.500,00				18,60	$ 195.300,00	18,60	$ 195.300,00		
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.286,00				69,57	$ 1.689.577,02	69,57	$ 1.689.577,02		
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00				132,96	$ 2.225.617,44	132,96	$ 2.225.617,44		
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 21.656,00				156,42	$ 3.387.431,52	156,42	$ 3.387.431,52		
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 187.842,00				37,00	$ 6.950.154,00	37,00	$ 6.950.154,00		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 206.881,00				37,00	$ 7.654.597,00	37,00	$ 7.654.597,00		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 78.481,00				0,90	$ 70.632,90	0,90	$ 70.632,90		
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 67.335,00				72,28	$ 4.866.973,80	72,28	$ 4.866.973,80		
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 102.315,00				3,98	$ 407.213,70	3,98	$ 407.213,70		
7.2.38	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA No 3 LAVADA. INCLUYE DILATACIÓN PLÁSTICA H=10 CM Y ESPESOR=1 CM	M		$ 59.575,00				38,37	$ 2.285.892,75	38,37	$ 2.285.892,75		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 831.620,00				3,81	$ 3.168.472,20	3,81	$ 3.168.472,20		
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 558.579,00				21,03	$ 11.746.916,37	21,03	$ 11.746.916,37		
9.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO CON ALFAJIA Y REFUERZOS ANTI FLEXIÓN CADA 50CM. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 552.004,00				4,26	$ 2.351.537,04	4,26	$ 2.351.537,04		
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 855.114,00				12,00	$ 10.261.368,00	12,00	$ 10.261.368,00		
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 804.605,00				13,00	$ 10.459.865,00	13,00	$ 10.459.865,00		
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 42.843,00				4,00	$ 171.372,00	4,00	$ 171.372,00		
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 34.968,00				9,00	$ 314.712,00	9,00	$ 314.712,00		
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 943.063,00				8,00	$ 7.544.504,00	8,00	$ 7.544.504,00		
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 953.261,00				25,20	$ 24.022.177,20	25,20	$ 24.022.177,20		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.030.552,00				4,86	$ 5.008.482,72	4,86	$ 5.008.482,72		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.921,00				2,42	$ 103.868,82	2,42	$ 103.868,82		
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.048,00				109,11	$ 1.423.667,28	109,11	$ 1.423.667,28		
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 9.801,00				267,09	$ 2.617.749,09	267,09	$ 2.617.749,09		
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				321,76	$ 7.651.452,80	321,76	$ 7.651.452,80		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.360,00				20,29	$ 676.874,40	20,29	$ 676.874,40		
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 31.026,00				76,80	$ 2.382.796,80	76,80	$ 2.382.796,80		
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00		8,00	$ 165.496,00	213,89	$ 4.424.742,43	221,89	$ 4.590.238,43		
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 17.943,00				188,87	$ 3.388.894,41	188,87	$ 3.388.894,41		
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 9.550,00				683,85	$ 6.530.767,50	683,85	$ 6.530.767,50		
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$ 206.616,00				2,47	$ 510.341,52	2,47	$ 510.341,52		
14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS	M2		$ 49.117,00				2,47	$ 121.318,99	2,47	$ 121.318,99		

16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 110.694,00				78,91	$ 8.734.863,54	78,91	$ 8.734.863,54		
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 74.234,00				11,81	$ 876.703,54	11,81	$ 876.703,54		
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANEZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 318.243,00				14,15	$ 4.503.138,45	14,15	$ 4.503.138,45		
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M		$ 201.566,00				15,00	$ 3.023.490,00	15,00	$ 3.023.490,00		
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 167.749,00				366,22	$ 61.433.038,78	366,22	$ 61.433.038,78		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				786,38	$ 3.820.234,04	786,38	$ 3.820.234,04		
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.501,00				8.210,00	$ 28.743.210,00	8.210,00	$ 28.743.210,00		
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$ 7.468,00				314,29	$ 2.347.117,72	314,29	$ 2.347.117,72		
	COLEGIO IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A							-					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				31,37	$ 138.373,07	31,37	$ 138.373,07		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				41,90	$ 1.357.811,40	41,90	$ 1.357.811,40		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-					
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				20,05	$ 1.443.138,85	20,05	$ 1.443.138,85		
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 112.874,00				7,18	$ 810.435,32	7,18	$ 810.435,32		
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				64,07	$ 2.214.002,92	64,07	$ 2.214.002,92		
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33.926,00				1,00	$ 33.926,00	1,00	$ 33.926,00		
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.803,00				151,39	$ 4.057.706,17	151,39	$ 4.057.706,17		
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 15.281,00				26,00	$ 397.306,00	26,00	$ 397.306,00		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				19,38	$ 701.013,36	19,38	$ 701.013,36		
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00				10,73	$ 1.513.305,55	10,73	$ 1.513.305,55		
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3		$ 183.394,00				7,65	$ 1.402.964,10	7,65	$ 1.402.964,10		
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00				28,84	$ 3.462.703,44	28,84	$ 3.462.703,44		
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 172.844,00				15,68	$ 2.710.193,92	15,68	$ 2.710.193,92		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				155,03	$ 1.171.561,71	155,03	$ 1.171.561,71		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.399,00				68,56	$ 507.275,44	68,56	$ 507.275,44		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				454,73	$ 10.095.460,73	454,73	$ 10.095.460,73		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M		$ 34.775,00				57,39	$ 1.995.737,25	57,39	$ 1.995.737,25		
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				280,00	$ 467.880,00	280,00	$ 467.880,00		
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 95.406,00				2,30	$ 219.433,80	2,30	$ 219.433,80		
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 42.026,00				2,00	$ 84.052,00	2,00	$ 84.052,00		
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**							-					
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN		$ 19.656,00				7,00	$ 137.592,00	7,00	$ 137.592,00		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.613,00				16,50	$ 257.614,50	16,50	$ 257.614,50		
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 66.179,00				1,00	$ 66.179,00	1,00	$ 66.179,00		
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 189.414,00				1,00	$ 189.414,00	1,00	$ 189.414,00		
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 71.876,00				1,00	$ 71.876,00	1,00	$ 71.876,00		
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 79.253,00				1,00	$ 79.253,00	1,00	$ 79.253,00		
4.8	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2		$ 12.218,00				13,01	$ 158.956,18	13,01	$ 158.956,18		
4.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 17.315,00				17,57	$ 304.224,55	17,57	$ 304.224,55		
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					

4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 66.580,00				1,00	$ 66.580,00	1,00	$ 66.580,00		
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 190.080,00				148,00	$ 28.131.840,00	148,00	$ 28.131.840,00		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL. CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 132.193,00				1,00	$ 132.193,00	1,00	$ 132.193,00		
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.547,00				1,00	$ 30.547,00	1,00	$ 30.547,00		
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.286,00				35,93	$ 872.595,98	35,93	$ 872.595,98		
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00				80,06	$ 1.340.124,34	80,06	$ 1.340.124,34		
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) Y 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 187.842,00				2,00	$ 375.684,00	2,00	$ 375.684,00		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 206.881,00				2,00	$ 413.762,00	2,00	$ 413.762,00		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 47.175,00				9,99	$ 471.278,25	9,99	$ 471.278,25		
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.169,00				9,71	$ 254.100,99	9,71	$ 254.100,99		
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 83.273,00				9,71	$ 808.580,83	9,71	$ 808.580,83		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				9,99	$ 2.190.866,94	9,99	$ 2.190.866,94		
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 78.481,00				2,66	$ 208.759,46	2,66	$ 208.759,46		
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 16.014,00				4,05	$ 64.856,70	4,05	$ 64.856,70		
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 102.315,00				20,39	$ 2.086.202,85	20,39	$ 2.086.202,85		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2		$ 194.315,00				25,72	$ 4.997.781,80	25,72	$ 4.997.781,80		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS; INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y	M2		$ 831.620,00				5,62	$ 4.673.704,40	5,62	$ 4.673.704,40		
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 66.199,00				4,87	$ 322.389,13	4,87	$ 322.389,13		
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 524.004,00				10,37	$ 5.433.921,48	10,37	$ 5.433.921,48		
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 421.466,00				26,00	$ 10.958.116,00	26,00	$ 10.958.116,00		
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 34.968,00				1,00	$ 34.968,00	1,00	$ 34.968,00		
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 953.261,00				245,34	$ 233.873.053,74	245,34	$ 233.873.053,74		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.030.552,00				9,88	$ 10.181.853,76	9,88	$ 10.181.853,76		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37.702,00				1,43	$ 53.913,86	1,43	$ 53.913,86		
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.048,00				1,43	$ 18.658,64	1,43	$ 18.658,64		
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				1,80	$ 42.804,00	1,80	$ 42.804,00		
12.1.11	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 8.838,00				14,01	$ 123.820,38	14,01	$ 123.820,38		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 17.925,00				251,83	$ 4.514.052,75	251,83	$ 4.514.052,75		
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.360,00				254,61	$ 8.493.789,60	254,61	$ 8.493.789,60		
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 31.026,00				15,29	$ 474.387,54	15,29	$ 474.387,54		
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00				21,85	$ 452.010,95	21,85	$ 452.010,95		
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 26.747,00				251,83	$ 6.735.697,01	251,83	$ 6.735.697,01		
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 17.943,00				6,88	$ 123.447,84	6,88	$ 123.447,84		
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 23.479,00				245,49	$ 5.763.859,71	245,49	$ 5.763.859,71		
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 120.705,00				9,12	$ 1.100.829,60	9,12	$ 1.100.829,60		
13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 126.425,00				1,00	$ 126.425,00	1,00	$ 126.425,00		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 110.694,00				5,18	$ 573.394,92	5,18	$ 573.394,92		
16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 70.953,00				4,57	$ 324.255,21	4,57	$ 324.255,21		
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 74.234,00				2,98	$ 221.217,32	2,98	$ 221.217,32		
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 167.749,00				14,49	$ 2.430.683,01	14,49	$ 2.430.683,01		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				551,82	$ 2.680.741,56	551,82	$ 2.680.741,56		
	I.E.D COLEGIO TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE C							-					

1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				34,72	$ 153.149,92	34,72	$ 153.149,92		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 32.406,00				78,54	$ 2.545.167,24	78,54	$ 2.545.167,24		
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 149.088,00				81,81	$ 12.196.889,28	81,81	$ 12.196.889,28		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-					
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 263.491,00				0,61	$ 160.729,51	0,61	$ 160.729,51		
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.894,00				43,05	$ 1.286.936,70	43,05	$ 1.286.936,70		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				18,19	$ 422.553,70	18,19	$ 422.553,70		
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00				10,73	$ 141.378,48	10,73	$ 141.378,48		
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				12,22	$ 422.274,32	12,22	$ 422.274,32		
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.616,00				3,34	$ 102.257,44	3,34	$ 102.257,44		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Q TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.411,00				110,51	$ 3.913.269,61	110,51	$ 3.913.269,61		
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 12.466,00				2,00	$ 24.932,00	2,00	$ 24.932,00		
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.796,00				38,14	$ 716.879,44	38,14	$ 716.879,44		
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.552,00				3,13	$ 73.717,76	3,13	$ 73.717,76		
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 15.281,00				1,00	$ 15.281,00	1,00	$ 15.281,00		
1.3	**MANTENIMIENTOS**							-					
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2		$ 56.101,00				263,02	$ 14.755.685,02	263,02	$ 14.755.685,02		
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN		$ 176.971,00				4,00	$ 707.884,00	4,00	$ 707.884,00		
1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN		$ 136.161,00				1,00	$ 136.161,00	1,00	$ 136.161,00		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.4.4	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 16.407,00				31,07	$ 509.765,49	31,07	$ 509.765,49		
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00				47,18	$ 768.279,12	47,18	$ 768.279,12		
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 95.820,00				9,73	$ 932.328,60	9,73	$ 932.328,60		
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00				0,27	$ 38.079,45	0,27	$ 38.079,45		
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 183.394,00				4,34	$ 795.929,96	4,34	$ 795.929,96		
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.515,00				4,80	$ 295.272,00	4,80	$ 295.272,00		
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00				26,61	$ 3.194.956,26	26,61	$ 3.194.956,26		
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.3.5	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M		$ 44.238,00				0,82	$ 36.275,16	0,82	$ 36.275,16		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				57,99	$ 438.230,43	57,99	$ 438.230,43		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.399,00				51,61	$ 381.862,39	51,61	$ 381.862,39		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				437,51	$ 9.713.159,51	437,51	$ 9.713.159,51		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 29.357,00				42,35	$ 1.243.268,95	42,35	$ 1.243.268,95		
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				660,00	$ 1.102.860,00	660,00	$ 1.102.860,00		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 95.406,00				11,71	$ 1.117.204,26	11,71	$ 1.117.204,26		
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$ 42.451,00				1,00	$ 42.451,00	1,00	$ 42.451,00		
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 82.006,00				2,20	$ 180.413,20	2,20	$ 180.413,20		
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN		$ 29.490,00				2,00	$ 58.980,00	2,00	$ 58.980,00		
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 135.133,00				1,00	$ 135.133,00	1,00	$ 135.133,00		
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**							-					
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.613,00				25,92	$ 404.688,96	25,92	$ 404.688,96		
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 66.179,00				1,00	$ 66.179,00	1,00	$ 66.179,00		
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 189.414,00				1,00	$ 189.414,00	1,00	$ 189.414,00		
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 71.876,00				1,00	$ 71.876,00	1,00	$ 71.876,00		

4.8	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2		$ 12.218,00				33,45	$ 408.692,10	33,45	$ 408.692,10		
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 66.580,00				1,00	$ 66.580,00	1,00	$ 66.580,00		
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 190.080,00				30,00	$ 5.702.400,00	30,00	$ 5.702.400,00		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 132.193,00				2,00	$ 264.386,00	2,00	$ 264.386,00		
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 220.519,00				4,00	$ 882.076,00	4,00	$ 882.076,00		
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.547,00				2,00	$ 61.094,00	2,00	$ 61.094,00		
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.286,00				25,30	$ 614.435,80	25,30	$ 614.435,80		
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00				34,59	$ 579.002,01	34,59	$ 579.002,01		
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 187.842,00				9,00	$ 1.690.578,00	9,00	$ 1.690.578,00		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 206.881,00				9,00	$ 1.861.929,00	9,00	$ 1.861.929,00		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 47.175,00				5,24	$ 247.197,00	5,24	$ 247.197,00		
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 72.582,00				31,07	$ 2.255.122,74	31,07	$ 2.255.122,74		
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.169,00				48,78	$ 1.276.523,82	48,78	$ 1.276.523,82		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				5,24	$ 1.149.163,44	5,24	$ 1.149.163,44		
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 78.481,00				1,90	$ 149.113,90	1,90	$ 149.113,90		
7.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	M		$ 79.200,00				49,08	$ 3.887.136,00	49,08	$ 3.887.136,00		
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 85.604,00				7,90	$ 676.271,60	7,90	$ 676.271,60		
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 67.335,00				78,80	$ 5.305.998,00	78,80	$ 5.305.998,00		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 111.923,00				16,12	$ 1.804.198,76	16,12	$ 1.804.198,76		
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 165.789,00				22,56	$ 3.740.199,84	22,56	$ 3.740.199,84		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 736.730,00				3,28	$ 2.416.474,40	3,28	$ 2.416.474,40		
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 848.735,00				5,24	$ 4.447.371,40	5,24	$ 4.447.371,40		
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 831.620,00				3,99	$ 3.318.163,80	3,99	$ 3.318.163,80		
9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO, ACCESO A CUBIERTA EN TUBO AGUAS NEGRAS EN 1-1/4" Y PASO EN TUBO DE 1"	M		$ 451.859,00				11,10	$ 5.015.634,90	11,10	$ 5.015.634,90		
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJÍA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 558.579,00				6,80	$ 3.798.337,20	6,80	$ 3.798.337,20		
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 66.199,00				3,07	$ 203.230,93	3,07	$ 203.230,93		
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 34.968,00				8,00	$ 279.744,00	8,00	$ 279.744,00		
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 953.261,00				1,71	$ 1.630.076,31	1,71	$ 1.630.076,31		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.030.552,00				1,32	$ 1.360.328,64	1,32	$ 1.360.328,64		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.048,00				215,01	$ 2.805.450,48	215,01	$ 2.805.450,48		
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A .60 CM	M		$ 9.801,00				331,11	$ 3.245.209,11	331,11	$ 3.245.209,11		
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				54,73	$ 1.301.479,40	54,73	$ 1.301.479,40		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.499,00				94,42	$ 2.124.355,58	94,42	$ 2.124.355,58		
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 17.925,00				180,38	$ 3.233.311,50	180,38	$ 3.233.311,50		
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.360,00				6,00	$ 200.160,00	6,00	$ 200.160,00		
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 31.026,00				122,14	$ 3.789.515,64	122,14	$ 3.789.515,64		
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00				176,09	$ 3.642.773,83	176,09	$ 3.642.773,83		
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 17.096,00				11,70	$ 200.023,20	11,70	$ 200.023,20		
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 17.943,00				14,86	$ 266.632,98	14,86	$ 266.632,98		
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 23.479,00				10,64	$ 249.816,56	10,64	$ 249.816,56		
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					

12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 9.550,00				152,06	$ 1.452.173,00	152,06	$ 1.452.173,00	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 120.705,00				6,00	$ 724.230,00	6,00	$ 724.230,00	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 98.345,00				0,21	$ 20.652,45	0,21	$ 20.652,45	
14.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2		$ 184.780,00				0,63	$ 116.411,40	0,63	$ 116.411,40	
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
15.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2		$ 126.553,00				15,82	$ 2.002.068,46	15,82	$ 2.002.068,46	
15.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2		$ 30.842,00				20,79	$ 641.205,18	20,79	$ 641.205,18	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 110.694,00				19,60	$ 2.169.602,40	19,60	$ 2.169.602,40	
16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 70.953,00				3,00	$ 212.859,00	3,00	$ 212.859,00	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 96.720,00				33,96	$ 3.284.611,20	33,96	$ 3.284.611,20	
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 270.757,00				90,62	$ 24.535.999,34	90,62	$ 24.535.999,34	
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 167.749,00				35,67	$ 5.983.606,83	35,67	$ 5.983.606,83	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				221,46	$ 1.075.852,68	221,46	$ 1.075.852,68	
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
19.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3		$ 268.957,00				2,08	$ 559.430,56	2,08	$ 559.430,56	
	I.E.D COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE B							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				299,70	$ 9.712.078,20	299,70	$ 9.712.078,20	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado físico.	M		$ 149.088,00				225,79	$ 33.662.579,52	225,79	$ 33.662.579,52	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 263.491,00				0,86	$ 226.602,26	0,86	$ 226.602,26	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 122.060,00				3,00	$ 366.180,00	3,00	$ 366.180,00	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				39,12	$ 2.815.740,24	39,12	$ 2.815.740,24	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.894,00				202,76	$ 6.061.307,44	202,76	$ 6.061.307,44	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				10,20	$ 236.946,00	10,20	$ 236.946,00	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.654,00				131,60	$ 3.770.866,40	131,60	$ 3.770.866,40	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00				2,29	$ 30.173,04	2,29	$ 30.173,04	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				14,75	$ 509.701,00	14,75	$ 509.701,00	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 12.466,00				3,00	$ 37.398,00	3,00	$ 37.398,00	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.796,00				33,44	$ 628.538,24	33,44	$ 628.538,24	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.552,00				138,02	$ 3.250.647,04	138,02	$ 3.250.647,04	
1.3	**MANTENIMIENTOS**							-				
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2		$ 56.101,00				321,34	$ 18.027.495,34	321,34	$ 18.027.495,34	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M		$ 11.000,00				65,20	$ 717.200,00	65,20	$ 717.200,00	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				23,95	$ 866.319,40	23,95	$ 866.319,40	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00				16,80	$ 273.571,20	16,80	$ 273.571,20	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 630.130,00				0,31	$ 195.340,30	0,31	$ 195.340,30	
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.065.830,00				0,32	$ 341.065,60	0,32	$ 341.065,60	
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 159.827,00				8,70	$ 1.390.494,90	8,70	$ 1.390.494,90	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00				31,30	$ 3.758.065,80	31,30	$ 3.758.065,80	
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				90,91	$ 687.006,87	90,91	$ 687.006,87	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				57,74	$ 1.281.885,74	57,74	$ 1.281.885,74	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.1.3	MURO BLOQUE HUECO No. 4 (HASTA 30 CM)	M		$ 41.357,00				9,00	$ 372.213,00	9,00	$ 372.213,00	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 152.221,00				12,30	$ 1.872.318,30	12,30	$ 1.872.318,30	
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 10.129,00				19,70	$ 199.541,30	19,70	$ 199.541,30	

3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				180,00	$ 300.780,00	180,00	$ 300.780,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 220.519,00				3,00	$ 661.557,00	3,00	$ 661.557,00	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00				80,41	$ 1.345.982,99	80,41	$ 1.345.982,99	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 41.095,00				138,02	$ 5.671.931,90	138,02	$ 5.671.931,90	
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 72.582,00				32,13	$ 2.332.059,66	32,13	$ 2.332.059,66	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.169,00				163,64	$ 4.282.295,16	163,64	$ 4.282.295,16	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				138,02	$ 30.268.614,12	138,02	$ 30.268.614,12	
7.2.8	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO=30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 64.607,00				2,59	$ 167.332,13	2,59	$ 167.332,13	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 831.620,00				14,75	$ 12.266.395,00	14,75	$ 12.266.395,00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				18,08	$ 429.942,40	18,08	$ 429.942,40	
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.499,00				16,32	$ 367.183,68	16,32	$ 367.183,68	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 17.925,00				65,84	$ 1.180.182,00	65,84	$ 1.180.182,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 110.694,00				37,39	$ 4.138.848,66	37,39	$ 4.138.848,66	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 96.720,00				39,22	$ 3.793.358,40	39,22	$ 3.793.358,40	
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M		$ 24.808,00				4,52	$ 112.132,16	4,52	$ 112.132,16	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				305,05	$ 1.481.932,90	305,05	$ 1.481.932,90	
	I.E.D COLEGIO TABORA SEDE A							-					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				150,93	$ 665.752,23	150,93	$ 665.752,23	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				141,59	$ 4.588.365,54	141,59	$ 4.588.365,54	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado físico.	M		$ 149.088,00				79,05	$ 11.785.406,40	79,05	$ 11.785.406,40	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-					
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				4,70	$ 338.291,90	4,70	$ 338.291,90	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.654,00				24,00	$ 687.696,00	24,00	$ 687.696,00	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00				11,24	$ 148.098,24	11,24	$ 148.098,24	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				18,67	$ 645.160,52	18,67	$ 645.160,52	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.411,00				63,06	$ 2.233.017,66	63,06	$ 2.233.017,66	
1.2.28	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 153.862,00				13,00	$ 2.000.206,00	13,00	$ 2.000.206,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.781,00				10,00	$ 77.810,00	10,00	$ 77.810,00	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 15.281,00				14,00	$ 213.934,00	14,00	$ 213.934,00	
1.2.41	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL)	M2		$ 68.539,00				61,09	$ 4.187.047,51	61,09	$ 4.187.047,51	
1.3	**MANTENIMIENTOS**							-					
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN		$ 176.971,00				2,00	$ 353.942,00	2,00	$ 353.942,00	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				95,06	$ 3.438.510,32	95,06	$ 3.438.510,32	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00				46,00	$ 6.487.610,00	46,00	$ 6.487.610,00	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3		$ 183.394,00				32,89	$ 6.031.828,66	32,89	$ 6.031.828,66	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.299.850,00				1,10	$ 1.429.835,00	1,10	$ 1.429.835,00	
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M		$ 171.652,00				9,40	$ 1.613.528,80	9,40	$ 1.613.528,80	
2.3.10	CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 CMS X 20 CMS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		$ 90.368,00				44,92	$ 4.059.330,56	44,92	$ 4.059.330,56	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				21,49	$ 162.399,93	21,49	$ 162.399,93	

2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				349,11	$ 7.750.591,11	349,11	$ 7.750.591,11		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 10.129,00				41,40	$ 419.340,60	41,40	$ 419.340,60		
3.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN ANDENES EXTERIORES - INCLUYE BASE EN ARENA DE 5CM, DISPOSICIÓN DE ADOQUINES EN ARCILLA 10X20X6 CMS Y SELLO ENTRE JUNTAS	M2		$ 118.596,00				53,73	$ 6.372.163,08	53,73	$ 6.372.163,08		
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.2.2	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M		$ 34.775,00				18,15	$ 631.166,25	18,15	$ 631.166,25		
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				160,00	$ 267.360,00	160,00	$ 267.360,00		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN		$ 19.656,00				48,00	$ 943.488,00	48,00	$ 943.488,00		
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN		$ 5.206,00				70,00	$ 364.420,00	70,00	$ 364.420,00		
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 190.080,00				40,00	$ 7.603.200,00	40,00	$ 7.603.200,00		
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.797,00				56,00	$ 324.632,00	56,00	$ 324.632,00		
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 30.527,00				5,00	$ 152.635,00	5,00	$ 152.635,00		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 206.881,00				10,00	$ 2.068.810,00	10,00	$ 2.068.810,00		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 67.335,00				82,08	$ 5.526.856,80	82,08	$ 5.526.856,80		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 111.923,00				11,24	$ 1.258.014,52	11,24	$ 1.258.014,52		
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN		$ 1.027.538,00				2,00	$ 2.055.076,00	2,00	$ 2.055.076,00		
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 421.466,00				14,00	$ 5.900.524,00	14,00	$ 5.900.524,00		
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 42.843,00				2,00	$ 85.686,00	2,00	$ 85.686,00		
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 953.261,00				20,06	$ 19.122.415,66	20,06	$ 19.122.415,66		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.030.552,00				1,10	$ 1.133.607,20	1,10	$ 1.133.607,20		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				28,00	$ 665.840,00	28,00	$ 665.840,00		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.360,00				96,79	$ 3.228.914,40	96,79	$ 3.228.914,40		
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		$ 23.002,00				29,96	$ 689.139,92	29,96	$ 689.139,92		
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 9.550,00				108,18	$ 1.033.119,00	108,18	$ 1.033.119,00		
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$ 206.616,00				11,20	$ 2.314.099,20	11,20	$ 2.314.099,20		
14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS	M2		$ 49.117,00				11,20	$ 550.110,40	11,20	$ 550.110,40		
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
15.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2		$ 126.553,00				29,96	$ 3.791.527,88	29,96	$ 3.791.527,88		
15.1.15	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 569.532,00				3,00	$ 1.708.596,00	3,00	$ 1.708.596,00		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 270.757,00				95,12	$ 25.754.405,84	95,12	$ 25.754.405,84		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				122,74	$ 596.270,92	122,74	$ 596.270,92		
19	**MANTENIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
19.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3		$ 268.957,00				8,29	$ 2.229.653,53	8,29	$ 2.229.653,53		
19.1.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE HELECHO ARBOREO "CYATHEA COOPERI" ALTURA 50 A 80 CM.	UN		$ 127.884,00				20,00	$ 2.557.680,00	20,00	$ 2.557.680,00		
	I.E.D COLEGIO JORGE GAITAN CORTES							-					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				423,75	$ 1.869.161,25	423,75	$ 1.869.161,25		
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 7.338,00				1.999,00	$ 14.668.662,00	1.999,00	$ 14.668.662,00		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				178,60	$ 5.787.711,60	178,60	$ 5.787.711,60		

1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el ítem incluye revision periodica de su estado físico.	M		$ 149.088,00				83,00	$ 12.374.304,00	83,00	$ 12.374.304,00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				438,56	$ 31.566.233,12	438,56	$ 31.566.233,12	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				3,60	$ 83.628,00	3,60	$ 83.628,00	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.851,00				96,24	$ 1.140.540,24	96,24	$ 1.140.540,24	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.616,00				1,69	$ 51.741,04	1,69	$ 51.741,04	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 21.572,00				18,00	$ 388.296,00	18,00	$ 388.296,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.781,00				2,00	$ 15.562,00	2,00	$ 15.562,00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 4.574,00				48,91	$ 223.714,34	48,91	$ 223.714,34	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 415.569,00				2,00	$ 831.138,00	2,00	$ 831.138,00	
1.3	**MANTENIMIENTOS**							-				
1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN		$ 136.161,00				2,00	$ 272.322,00	2,00	$ 272.322,00	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				354,66	$ 12.828.761,52	354,66	$ 12.828.761,52	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00				123,45	$ 2.010.259,80	123,45	$ 2.010.259,80	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00				443,02	$ 62.481.325,70	443,02	$ 62.481.325,70	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 22.607,00				65,45	$ 1.479.628,15	65,45	$ 1.479.628,15	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 183.394,00				249,57	$ 45.769.640,58	249,57	$ 45.769.640,58	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 630.130,00				0,03	$ 18.903,90	0,03	$ 18.903,90	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 101.129,00				16,00	$ 1.618.064,00	16,00	$ 1.618.064,00	
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 202.079,00				0,77	$ 155.600,83	0,77	$ 155.600,83	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00				64,14	$ 7.701.033,24	64,14	$ 7.701.033,24	
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.3.11	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 X 35 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		$ 124.061,00				4,72	$ 585.567,92	4,72	$ 585.567,92	
2.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M		$ 356.097,00				32,00	$ 11.395.104,00	32,00	$ 11.395.104,00	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				3,41	$ 25.769,37	3,41	$ 25.769,37	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.399,00				2.412,21	$ 17.847.941,79	2.412,21	$ 17.847.941,79	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				291,10	$ 6.462.711,10	291,10	$ 6.462.711,10	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 152.221,00				2,00	$ 304.442,00	2,00	$ 304.442,00	
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 29.357,00				30,91	$ 907.424,87	30,91	$ 907.424,87	
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				480,00	$ 802.080,00	480,00	$ 802.080,00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 149.583,00				45,14	$ 6.752.176,62	45,14	$ 6.752.176,62	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 95.406,00				4,40	$ 419.786,40	4,40	$ 419.786,40	
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**							-				
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.613,00				27,61	$ 431.074,93	27,61	$ 431.074,93	
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 66.179,00				1,00	$ 66.179,00	1,00	$ 66.179,00	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 189.414,00				1,00	$ 189.414,00	1,00	$ 189.414,00	
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 71.876,00				1,00	$ 71.876,00	1,00	$ 71.876,00	
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	M2						-				
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 679.563,00				1,00	$ 679.563,00	1,00	$ 679.563,00	
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 912.438,00				1,00	$ 912.438,00	1,00	$ 912.438,00	
4.8	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 17.315,00				504,30	$ 8.731.954,50	504,30	$ 8.731.954,50	
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 66.580,00				1,00	$ 66.580,00	1,00	$ 66.580,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				

5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 132.193,00				1,00	$ 132.193,00	1,00	$ 132.193,00	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 158.635,00				1,00	$ 158.635,00	1,00	$ 158.635,00	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.547,00				1,00	$ 30.547,00	1,00	$ 30.547,00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.286,00				38,78	$ 941.811,08	38,78	$ 941.811,08	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00				48,91	$ 818.704,49	48,91	$ 818.704,49	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 187.842,00				4,00	$ 751.368,00	4,00	$ 751.368,00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 206.881,00				4,00	$ 827.524,00	4,00	$ 827.524,00	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 47.175,00				11,59	$ 546.758,25	11,59	$ 546.758,25	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.169,00				19,57	$ 512.127,33	19,57	$ 512.127,33	
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 83.273,00				8,82	$ 734.467,86	8,82	$ 734.467,86	
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA E=0,10m. INCLUYE IMPRIMANTE EPOXICO BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS EN PISOS DE CANCHAS (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2		$ 136.731,00				413,98	$ 56.603.899,38	413,98	$ 56.603.899,38	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**							-				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				11,59	$ 2.541.756,54	11,59	$ 2.541.756,54	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 78.481,00				2,71	$ 212.683,51	2,71	$ 212.683,51	
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 68.496,00				590,29	$ 40.432.503,84	590,29	$ 40.432.503,84	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M		$ 19.130,00				188,22	$ 3.600.648,60	188,22	$ 3.600.648,60	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M		$ 25.304,00				196,63	$ 4.975.525,52	196,63	$ 4.975.525,52	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 102.315,00				18,97	$ 1.940.915,55	18,97	$ 1.940.915,55	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA).	M2		$ 194.315,00				44,11	$ 8.571.234,65	44,11	$ 8.571.234,65	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y	M2		$ 831.620,00				6,04	$ 5.022.984,80	6,04	$ 5.022.984,80	
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 500.662,00				3,66	$ 1.832.422,92	3,66	$ 1.832.422,92	
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 66.199,00				3,49	$ 231.034,51	3,49	$ 231.034,51	
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							-				
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 34.968,00				1,00	$ 34.968,00	1,00	$ 34.968,00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.921,00				96,24	$ 4.130.717,04	96,24	$ 4.130.717,04	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				75,72	$ 1.800.621,60	75,72	$ 1.800.621,60	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.360,00				6,69	$ 223.178,40	6,69	$ 223.178,40	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 31.026,00				370,75	$ 11.502.889,50	370,75	$ 11.502.889,50	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00				1.085,97	$ 22.465.461,39	1.085,97	$ 22.465.461,39	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 29.596,00				5,12	$ 151.531,52	5,12	$ 151.531,52	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 120.705,00				11,59	$ 1.398.970,95	11,59	$ 1.398.970,95	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 110.894,00				6,40	$ 708.441,60	6,40	$ 708.441,60	
16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 70.953,00				6,50	$ 461.194,50	6,50	$ 461.194,50	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 74.234,00				3,00	$ 222.702,00	3,00	$ 222.702,00	
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,9MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 167.749,00				18,88	$ 3.167.101,12	18,88	$ 3.167.101,12	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				1.591,44	$ 7.731.215,52	1.591,44	$ 7.731.215,52	
	I.E.D COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO SEDE B							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.411,00				165,82	$ 5.871.852,02	165,82	$ 5.871.852,02	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.803,00				45,62	$ 1.222.752,86	45,62	$ 1.222.752,86	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				180,54	$ 4.008.168,54	180,54	$ 4.008.168,54	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				

7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M		$ 29.644,00				13,72	$ 406.715,68	13,72	$ 406.715,68	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 165.789,00				45,62	$ 7.563.294,18	45,62	$ 7.563.294,18	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.499,00				5,07	$ 114.069,93	5,07	$ 114.069,93	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00				67,74	$ 1.401.337,38	67,74	$ 1.401.337,38	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 29.596,00				425,86	$ 12.603.752,56	425,86	$ 12.603.752,56	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 23.479,00				118,03	$ 2.771.226,37	118,03	$ 2.771.226,37	
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		$ 23.002,00				42,18	$ 970.224,36	42,18	$ 970.224,36	
12.3.4	ESMALTE A DOS MANOS SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EXISTENTES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, PROCESO DE LIMPIEZA Y GRATA, WASH PRIMER Y CORRECCION DE ANCLAJE)	M2		$ 24.166,00				13,39	$ 323.582,74	13,39	$ 323.582,74	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 110.694,00				13,00	$ 1.439.022,00	13,00	$ 1.439.022,00	
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 167.749,00				188,44	$ 31.610.621,56	188,44	$ 31.610.621,56	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				291,76	$ 1.417.370,08	291,76	$ 1.417.370,08	
	I.E.D COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				1,53	$ 110.124,81	1,53	$ 110.124,81	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.851,00				1,22	$ 14.458,22	1,22	$ 14.458,22	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00				1,22	$ 16.074,72	1,22	$ 16.074,72	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.552,00				1,53	$ 36.034,56	1,53	$ 36.034,56	
1.2.47	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 7.493,00				1,53	$ 11.464,29	1,53	$ 11.464,29	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 19.467,00				28,00	$ 545.076,00	28,00	$ 545.076,00	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00				17,90	$ 291.483,60	17,90	$ 291.483,60	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				1,92	$ 69.450,24	1,92	$ 69.450,24	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00				19,84	$ 2.382.109,44	19,84	$ 2.382.109,44	
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2		$ 127.409,00	9,60	$ 1.223.126,40		-		9,60	$ 1.223.126,40	
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.3.5	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M		$ 44.238,00				8,50	$ 376.023,00	8,50	$ 376.023,00	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.399,00				39,55	$ 292.630,45	39,55	$ 292.630,45	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00	320,00	$ 534.720,00		-		320,00	$ 534.720,00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**							-				
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 27.465,00				71,37	$ 1.960.177,05	71,37	$ 1.960.177,05	
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1-1/4"	UN		$ 162.390,00	2,00	$ 324.780,00		2,00	$ 324.780,00	4,00	$ 649.560,00	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 120.399,00	1,00	$ 120.399,00		-		1,00	$ 120.399,00	
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 84.752,00				2,00	$ 169.504,00	2,00	$ 169.504,00	
4.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1-1/4"	UN		$ 327.064,00	1,00	$ 327.064,00		1,00	$ 327.064,00	2,00	$ 654.128,00	
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR ELÉCTRICO PARA TANQUES DE AGUA	UN		$ 123.915,00	1,00	$ 123.915,00		-		1,00	$ 123.915,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 220.519,00	4,00	$ 882.076,00		-		4,00	$ 882.076,00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.286,00	1,35	$ 32.786,10		-		1,35	$ 32.786,10	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00	1,35	$ 22.597,65		-		1,35	$ 22.597,65	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				1,53	$ 335.538,18	1,53	$ 335.538,18	
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M		$ 19.382,00				1,20	$ 23.258,40	1,20	$ 23.258,40	

7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 85.604,00				1,30	$ 111.285,20	1,30	$ 111.285,20	
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 67.335,00				4,08	$ 274.726,80	4,08	$ 274.726,80	
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 102.315,00				1,16	$ 118.685,40	1,16	$ 118.685,40	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 42.843,00		2,00	$ 85.686,00	-		2,00	$ 85.686,00	
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN		$ 798.903,00				2,00	$ 1.597.806,00	2,00	$ 1.597.806,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				65,00	$ 315.770,00	65,00	$ 315.770,00	
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
19.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON 2 BOMBAS DE 2HP 110/220 TANQUE HIDRONEUMATICO POR MEMBRANA DE 200LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON NORMA RETIE (INCLUYE 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN CAUDAL 2.33LP/S H.MAQ 50MT 1 TANQUE HIDROACUMULADOR MEMBRANA 200LTS VERTICAL CON MANOMETRO ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 3" INCLUYE COPA DE DESCARGA 3 A 2, 2 REGISTROS EN BRONCE TIPO COMPUERTA, 2 VÁLVULAS CHEQUE HIDRONEUMATICO EN BRONCE, 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE 2- PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANOMETRO EN GLICERINA CON CARATULA DE 2" (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UN		$ 18.361.232,00				1,00	$ 18.361.232,00	1,00	$ 18.361.232,00	
19.1.16	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN	M2		$ 90.115,00				4,56	$ 410.924,40	4,56	$ 410.924,40	
	I.E.D COLEGIO TECNICO PALERMO							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				398,47	$ 1.757.651,17	398,47	$ 1.757.651,17	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				21,81	$ 706.774,86	21,81	$ 706.774,86	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 286.098,00				0,82	$ 234.600,36	0,82	$ 234.600,36	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				0,90	$ 64.779,30	0,90	$ 64.779,30	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.894,00				16,31	$ 487.571,14	16,31	$ 487.571,14	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				41,83	$ 971.710,90	41,83	$ 971.710,90	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.851,00				1,09	$ 12.917,59	1,09	$ 12.917,59	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00				1,09	$ 14.361,84	1,09	$ 14.361,84	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				8,56	$ 295.799,36	8,56	$ 295.799,36	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.616,00				49,58	$ 1.517.941,28	49,58	$ 1.517.941,28	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 28.418,00				1,00	$ 28.418,00	1,00	$ 28.418,00	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.803,00				36,39	$ 975.361,17	36,39	$ 975.361,17	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 12.466,00		18,00	$ 224.388,00	51,00	$ 635.766,00	69,00	$ 860.154,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.781,00				45,00	$ 350.145,00	45,00	$ 350.145,00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.552,00				16,31	$ 384.133,12	16,31	$ 384.133,12	
1.2.39	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	UN		$ 58.254,00				1,00	$ 58.254,00	1,00	$ 58.254,00	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.641,00				1,49	$ 38.205,09	1,49	$ 38.205,09	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 15.281,00				3,00	$ 45.843,00	3,00	$ 45.843,00	
1.2.50	DESINSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES Y REUBICACIÓN DE LOS MISMOS EN OTRO SITIO.	UN		$ 91.520,00				1,00	$ 91.520,00	1,00	$ 91.520,00	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				5,40	$ 195.328,80	5,40	$ 195.328,80	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00				24,08	$ 392.118,72	24,08	$ 392.118,72	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				462,29	$ 10.263.300,29	462,29	$ 10.263.300,29	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 10.129,00				61,40	$ 621.920,60	61,40	$ 621.920,60	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.9.13	SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 30.527,00				1,00	$ 30.527,00	1,00	$ 30.527,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 132.193,00				5,00	$ 660.965,00	5,00	$ 660.965,00	
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 220.519,00				10,00	$ 2.205.190,00	10,00	$ 2.205.190,00	
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 746.905,00				1,00	$ 746.905,00	1,00	$ 746.905,00	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.547,00				7,00	$ 213.829,00	7,00	$ 213.829,00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.286,00		1,90	$ 46.143,40	72,27	$ 1.755.149,22	74,17	$ 1.801.292,62	
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 35.105,00				33,82	$ 1.187.251,10	33,82	$ 1.187.251,10	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00		-5,19	$ 86.875,41	191,27	$ 3.201.668,53	186,08	$ 3.114.793,12	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 187.842,00				63,00	$ 11.834.046,00	63,00	$ 11.834.046,00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 206.881,00				63,00	$ 13.033.503,00	63,00	$ 13.033.503,00	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN		$ 814.545,00				1,00	$ 814.545,00	1,00	$ 814.545,00	

7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 41.095,00				16,31	$ 670.259,45	16,31	$ 670.259,45		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				14,03	$ 3.076.863,18	14,03	$ 3.076.863,18		
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 78.481,00				31,27	$ 2.454.100,87	31,27	$ 2.454.100,87		
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M		$ 29.644,00				24,46	$ 725.092,24	24,46	$ 725.092,24		
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 67.335,00				342,63	$ 23.070.991,05	342,63	$ 23.070.991,05		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 165.789,00				105,48	$ 17.487.423,72	105,48	$ 17.487.423,72		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS BASCULANTES SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 609.181,00				63,17	$ 38.481.963,77	63,17	$ 38.481.963,77		
9.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 3 CUERPOS DE VIDRIO LAMINADO 3+3 O PERSIANA INFERIOR, PELICULA SAMBLASTIADA HORIZONTAL DE 1CM, CERRADURA TIPO TEJO CON MARIPOSA INTERIOR Y MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE ANCLAJES Y DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2		$ 558.579,00	2,51	$ 1.402.033,29		16,94	$ 9.462.328,26	19,45	$ 10.864.361,55		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.499,00				263,11	$ 5.919.711,89	263,11	$ 5.919.711,89		
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 17.925,00				50,48	$ 904.854,00	50,48	$ 904.854,00		
13	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							-					
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 120.705,00	-0,76	$ 91.735,80		61,05	$ 7.369.040,25	60,29	$ 7.277.304,45		
13.1.4	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 6 MM UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN ÁREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	M		$ 84.366,00	19,22	$ 1.621.514,52		-		19,22	$ 1.621.514,52		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				467,57	$ 2.271.455,06	467,57	$ 2.271.455,06		
	I.E.D COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA							-					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				109,72	$ 483.974,92	109,72	$ 483.974,92		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00	27,20	$ 881.443,20		43,50	$ 1.409.661,00	70,70	$ 2.291.104,20		
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado físico.	M		$ 149.088,00	27,20	$ 4.055.193,60		42,20	$ 6.291.513,60	69,40	$ 10.346.707,20		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-					
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 286.098,00				7,84	$ 2.243.008,32	7,84	$ 2.243.008,32		
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 122.060,00				11,90	$ 1.452.514,00	11,90	$ 1.452.514,00		
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				37,14	$ 2.673.225,78	37,14	$ 2.673.225,78		
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				100,44	$ 2.333.221,20	100,44	$ 2.333.221,20		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.781,00				1,00	$ 7.781,00	1,00	$ 7.781,00		
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 415.569,00	0,50	$ 207.784,50		-		0,50	$ 207.784,50		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00	34,27	$ 1.239.614,44		12,05	$ 435.872,60	46,32	$ 1.675.487,04		
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00	6,40	$ 104.217,60		42,20	$ 687.184,80	48,60	$ 791.402,40		
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00	0,91	$ 128.341,85				0,91	$ 128.341,85		
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 183.394,00	0,91	$ 166.888,54				0,91	$ 166.888,54		
2.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.065.830,00				2,21	$ 2.355.484,30	2,21	$ 2.355.484,30		
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 159.827,00				42,20	$ 6.744.699,40	42,20	$ 6.744.699,40		
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 101.129,00	42,20	$ 4.267.643,80		-		42,20	$ 4.267.643,80		
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.515,00	2,60	$ 159.939,00		-		2,60	$ 159.939,00		
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00	17,22	$ 2.067.536,52		-		17,22	$ 2.067.536,52		
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2		$ 127.409,00	0,58	$ 73.897,22		-		0,58	$ 73.897,22		
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.3.13	COLUMNAS EN CONCRETO ACABADO A LA VISTA 3000 PSI INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA	M3		$ 1.430.079,00				2,73	$ 3.904.115,67	2,73	$ 3.904.115,67		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00	258,46	$ 1.953.182,22		1.237,25	$ 9.349.898,25	1.495,71	$ 11.303.080,47		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 10.129,00	184,46	$ 1.868.395,34		-		184,46	$ 1.868.395,34		
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					

3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN		$ 1.671,00		3.200,00	$ 5.347.200,00	-		3.200,00	$ 5.347.200,00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.8	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2		$ 12.218,00				69,53	$ 849.517,54	69,53	$ 849.517,54	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M	M2		$ 42.628,00				18,44	$ 786.060,32	18,44	$ 786.060,32	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00		687,86	$ 3.341.623,88	-		687,86	$ 3.341.623,88	
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
19.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3		$ 268.957,00		4,37	$ 1.175.342,09	-		4,37	$ 1.175.342,09	
19.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES	M2		$ 799.029,00				71,70	$ 57.290.379,30	71,70	$ 57.290.379,30	
	EMERGENCIAS Y OBRAS PRIORITARIAS											
	COLEGIO IED (IT) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A											
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				356,48	$ 12.894.594,56	356,48	$ 12.894.594,56	
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.942.798,00				18,00	$ 34.970.364,00	18,00	$ 34.970.364,00	
	I.E D COLEGIO TABORA SEDE A							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				17,40	$ 563.864,40	17,40	$ 563.864,40	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				5,12	$ 118.937,60	5,12	$ 118.937,60	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				4,75	$ 171.817,00	4,75	$ 171.817,00	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00				34,46	$ 561.146,64	34,46	$ 561.146,64	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00				0,76	$ 107.186,60	0,76	$ 107.186,60	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 183.394,00				0,38	$ 69.689,72	0,38	$ 69.689,72	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.515,00				4,95	$ 304.499,25	4,95	$ 304.499,25	
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 202.079,00				2,51	$ 507.218,29	2,51	$ 507.218,29	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				12,86	$ 97.183,02	12,86	$ 97.183,02	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				260,00	$ 434.460,00	260,00	$ 434.460,00	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 524.004,00				2,36	$ 1.236.649,44	2,36	$ 1.236.649,44	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CUIATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				14,85	$ 353.133,00	14,85	$ 353.133,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				72,16	$ 350.553,28	72,16	$ 350.553,28	
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
19.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 735.489,00				2,00	$ 1.470.978,00	2,00	$ 1.470.978,00	
	I.E D COLEGIO LA PALESTINA SEDE B							-				
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				6,38	$ 230.777,36	6,38	$ 230.777,36	
19	**MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 971.399,00				1,00	$ 971.399,00	1,00	$ 971.399,00	
	DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE ENGATIVA (DILE)							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				3,60	$ 259.117,20	3,60	$ 259.117,20	

1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.894,00				14,18	$ 423.896,92	14,18	$ 423.896,92	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00				1,59	$ 36.935,70	1,59	$ 36.935,70	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.552,00				14,18	$ 333.967,36	14,18	$ 333.967,36	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 33.071,00				6,03	$ 199.418,13	6,03	$ 199.418,13	
1.3	**MANTENIMIENTOS**							-				
1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN		$ 136.161,00				1,00	$ 136.161,00	1,00	$ 136.161,00	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				6,92	$ 250.310,24	6,92	$ 250.310,24	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00				3,57	$ 503.494,95	3,57	$ 503.494,95	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 174.443,00				2,39	$ 416.918,77	2,39	$ 416.918,77	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00				4,50	$ 540.297,00	4,50	$ 540.297,00	
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 149.583,00				9,02	$ 1.349.238,66	9,02	$ 1.349.238,66	
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 912.438,00				1,00	$ 912.438,00	1,00	$ 912.438,00	
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
4.9.11	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 190.080,00				10,00	$ 1.900.800,00	10,00	$ 1.900.800,00	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 47.175,00				14,18	$ 668.941,50	14,18	$ 668.941,50	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.169,00				28,13	$ 736.133,97	28,13	$ 736.133,97	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				14,18	$ 3.109.759,08	14,18	$ 3.109.759,08	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M		$ 90.012,00				28,13	$ 2.532.037,56	28,13	$ 2.532.037,56	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M		$ 19.130,00				3,20	$ 61.216,00	3,20	$ 61.216,00	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 943.063,00				6,00	$ 5.658.378,00	6,00	$ 5.658.378,00	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.921,00				0,55	$ 23.606,55	0,55	$ 23.606,55	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.048,00				25,66	$ 334.811,68	25,66	$ 334.811,68	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.360,00				12,05	$ 401.988,00	12,05	$ 401.988,00	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 31.026,00				25,66	$ 796.127,16	25,66	$ 796.127,16	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00				55,36	$ 1.145.232,32	55,36	$ 1.145.232,32	
12.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 26.747,00				7,58	$ 202.742,26	7,58	$ 202.742,26	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICAD	M		$ 110.694,00				5,00	$ 553.470,00	5,00	$ 553.470,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				14,18	$ 68.886,44	14,18	$ 68.886,44	
	COLEGIO IED LUCILA FERNANDEZ LAVERDE							-				
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 943.063,00				6,00	$ 5.658.378,00	6,00	$ 5.658.378,00	
	COLEGIO IED TORQUIGUA SEDE A							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				83,04	$ 366.289,44	83,04	$ 366.289,44	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (Incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00				51,25	$ 1.660.807,50	51,25	$ 1.660.807,50	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 286.098,00				0,05	$ 14.304,90	0,05	$ 14.304,90	
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00				12,34	$ 888.196,18	12,34	$ 888.196,18	
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.654,00				0,32	$ 9.169,28	0,32	$ 9.169,28	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00				0,32	$ 4.216,32	0,32	$ 4.216,32	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				4,00	$ 138.224,00	4,00	$ 138.224,00	
1.2.31	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE HASTA 24 CIRCUITOS (INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA)	UN		$ 66.232,00				1,00	$ 66.232,00	1,00	$ 66.232,00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 4.574,00				78,80	$ 360.431,20	78,80	$ 360.431,20	

1.3	**MANTENIMIENTOS**							-					
1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M		$ 10.955,00				5,95	$ 65.182,25	5,95	$ 65.182,25	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00				4,83	$ 174.710,76	4,83	$ 174.710,76	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00				12,20	$ 198.664,80	12,20	$ 198.664,80	
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00				22,13	$ 3.121.104,55	22,13	$ 3.121.104,55	
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3		$ 183.394,00				10,89	$ 1.997.160,66	10,89	$ 1.997.160,66	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 159.827,00				4,55	$ 727.212,85	4,55	$ 727.212,85	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00				49,22	$ 5.909.648,52	49,22	$ 5.909.648,52	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 172.844,00				21,48	$ 3.712.689,12	21,48	$ 3.712.689,12	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				30,63	$ 231.470,91	30,63	$ 231.470,91	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.399,00				227,82	$ 1.685.640,18	227,82	$ 1.685.640,18	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00				851,36	$ 18.901.043,36	851,36	$ 18.901.043,36	
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00				1.280,00	$ 2.138.880,00	1.280,00	$ 2.138.880,00	
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 95.406,00				8,50	$ 810.951,00	8,50	$ 810.951,00	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 82.006,00				4,43	$ 363.286,58	4,43	$ 363.286,58	
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**							-					
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 20.985,00				14,64	$ 307.220,40	14,64	$ 307.220,40	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.613,00				32,51	$ 507.578,63	32,51	$ 507.578,63	
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 66.179,00				1,00	$ 66.179,00	1,00	$ 66.179,00	
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 189.414,00				1,00	$ 189.414,00	1,00	$ 189.414,00	
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 5000 LTS	UN		$ 5.016.517,00				1,00	$ 5.016.517,00	1,00	$ 5.016.517,00	
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 66.580,00				1,00	$ 66.580,00	1,00	$ 66.580,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 132.193,00				1,00	$ 132.193,00	1,00	$ 132.193,00	
5.1.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 264.291,00				15,00	$ 3.964.365,00	15,00	$ 3.964.365,00	
5.1.8	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA PATA TRABADA 20A 250V TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 2N°12 (F) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN		$ 349.309,00				6,00	$ 2.095.854,00	6,00	$ 2.095.854,00	
5.1.9	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA TRIFÁSICA 50A 250V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 10-50R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3N°12 (F) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7 M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN		$ 315.188,00				2,00	$ 630.376,00	2,00	$ 630.376,00	
5.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 885.997,00				1,00	$ 885.997,00	1,00	$ 885.997,00	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.547,00				13,00	$ 397.111,00	13,00	$ 397.111,00	
5.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN		$ 85.389,00				6,00	$ 512.334,00	6,00	$ 512.334,00	
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN		$ 192.207,00				2,00	$ 384.414,00	2,00	$ 384.414,00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.286,00				158,20	$ 3.842.045,20	158,20	$ 3.842.045,20	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 16.739,00				416,40	$ 6.970.119,60	416,40	$ 6.970.119,60	
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 21.656,00				100,80	$ 2.182.924,80	100,80	$ 2.182.924,80	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 187.842,00				2,00	$ 375.684,00	2,00	$ 375.684,00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 206.881,00				2,00	$ 413.762,00	2,00	$ 413.762,00	
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL TOTALIZADOR 3X125 A. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN		$ 814.545,00				2,00	$ 1.629.090,00	2,00	$ 1.629.090,00	
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 47.175,00				12,14	$ 572.704,50	12,14	$ 572.704,50	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.169,00				13,17	$ 344.645,73	13,17	$ 344.645,73	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 219.306,00				12,14	$ 2.662.374,84	12,14	$ 2.662.374,84	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 78.481,00				1,97	$ 154.607,57	1,97	$ 154.607,57	
7.2.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 28.911,00				11,30	$ 326.694,30	11,30	$ 326.694,30	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 85.604,00				13,17	$ 1.127.404,68	13,17	$ 1.127.404,68	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					

8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 111.923,00				27,43	$ 3.070.047,89	27,43	$ 3.070.047,89	
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 165.789,00				34,31	$ 5.688.220,59	34,31	$ 5.688.220,59	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 831.620,00				4,22	$ 3.509.436,40	4,22	$ 3.509.436,40	
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 66.199,00				3,25	$ 215.146,75	3,25	$ 215.146,75	
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 524.004,00				28,99	$ 15.190.875,96	28,99	$ 15.190.875,96	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 34.968,00				1,00	$ 34.968,00	1,00	$ 34.968,00	
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN		$ 798.903,00				1,00	$ 798.903,00	1,00	$ 798.903,00	
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 953.261,00				3,84	$ 3.660.522,24	3,84	$ 3.660.522,24	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 33.360,00				13,98	$ 466.372,80	13,98	$ 466.372,80	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 31.026,00				33,11	$ 1.027.270,86	33,11	$ 1.027.270,86	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00				26,23	$ 542.620,01	26,23	$ 542.620,01	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 29.596,00				8,00	$ 236.768,00	8,00	$ 236.768,00	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 120.705,00				13,98	$ 1.687.455,90	13,98	$ 1.687.455,90	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 110.694,00				10,40	$ 1.151.217,60	10,40	$ 1.151.217,60	
16.1.2	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 70.953,00				9,60	$ 681.148,80	9,60	$ 681.148,80	
16.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 74.234,00				2,20	$ 163.314,80	2,20	$ 163.314,80	
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 270.757,00				22,32	$ 6.043.296,24	22,32	$ 6.043.296,24	
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 167.749,00				43,11	$ 7.231.659,39	43,11	$ 7.231.659,39	
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							-				
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				87,90	$ 427.018,20	87,90	$ 427.018,20	
	COLEGIO IED MIGUEL ANTONIO CARO							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00				19,18	$ 662.784,08	19,18	$ 662.784,08	
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 848.735,00				13,78	$ 11.695.568,30	13,78	$ 11.695.568,30	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 863.805,00				2,07	$ 1.788.076,35	2,07	$ 1.788.076,35	
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
9.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA EN ALUMINIO CON ALFAJIA Y REFUERZOS ANTI FLEXIÓN CADA 50CM. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 552.004,00				3,34	$ 1.843.693,36	3,34	$ 1.843.693,36	
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 9.801,00				63,58	$ 623.147,58	63,58	$ 623.147,58	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				63,58	$ 1.511.932,40	63,58	$ 1.511.932,40	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 17.943,00				73,57	$ 1.320.066,51	73,57	$ 1.320.066,51	
	I.E.D COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A							-				
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-				
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 286.098,00				0,23	$ 65.802,54	0,23	$ 65.802,54	
1.2.11	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 11.851,00		0,80	$ 9.480,80	78,06	$ 925.089,06	78,86	$ 934.569,86	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 13.176,00		0,80	$ 10.540,80	51,55	$ 679.222,80	52,35	$ 689.763,60	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00		4,00	$ 138.224,00	42,30	$ 1.461.718,80	46,30	$ 1.599.942,80	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 28.418,00				3,00	$ 85.254,00	3,00	$ 85.254,00	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 26.803,00				1,44	$ 38.596,32	1,44	$ 38.596,32	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-				
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00		2,50	$ 90.430,00	-		2,50	$ 90.430,00	

1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00		16,00	$ 260.544,00	74,28	$ 1.209.575,52	90,28	$ 1.470.119,52		
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 101.129,00				3,63	$ 367.098,27	3,63	$ 367.098,27		
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.515,00				11,28	$ 693.889,20	11,28	$ 693.889,20		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				13,06	$ 98.694,42	13,06	$ 98.694,42		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 16.014,00				22,56	$ 361.275,84	22,56	$ 361.275,84		
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 953.261,00		5,86	$ 5.586.109,46	35,01	$ 33.373.667,61	40,87	$ 38.959.777,07		
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.030.552,00		1,00	$ 1.030.552,00	0,88	$ 906.885,76	1,88	$ 1.937.437,76		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 42.921,00				73,38	$ 3.149.542,98	73,38	$ 3.149.542,98		
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00				28,04	$ 666.791,20	28,04	$ 666.791,20		
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00				175,37	$ 851.947,46	175,37	$ 851.947,46		
	COLEGIO IED SIMON BOLIVAR SEDE A							-					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.411,00				25,16	$ 110.980,76	25,16	$ 110.980,76		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00		49,58	$ 1.606.689,48	-		49,58	$ 1.606.689,48		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-					
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 71.977,00		0,91	$ 65.499,07	10,53	$ 757.917,81	11,44	$ 823.416,88		
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 112.874,00		17,60	$ 1.986.582,40	-		17,60	$ 1.986.582,40		
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 34.556,00		7,51	$ 259.515,56	-		7,51	$ 259.515,56		
1.2.28	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICIÓN DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 153.862,00				4,00	$ 615.448,00	4,00	$ 615.448,00		
1.3	**MANTENIMIENTOS**							-					
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2		$ 56.101,00		226,80	$ 12.723.706,80	-		226,80	$ 12.723.706,80		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.172,00		22,67	$ 820.019,24	75,94	$ 2.746.901,68	98,61	$ 3.566.920,92		
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00		6,40	$ 104.217,60	-		6,40	$ 104.217,60		
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.035,00		7,55	$ 1.064.814,25	32,08	$ 4.524.402,80	39,63	$ 5.589.217,05		
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 22.607,00				20,22	$ 457.113,54	20,22	$ 457.113,54		
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 183.394,00		4,43	$ 812.435,42	29,57	$ 5.422.960,58	34,00	$ 6.235.396,00		
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 120.066,00		16,48	$ 1.978.687,68	124,78	$ 14.981.835,48	141,26	$ 16.960.523,16		
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.299.850,00		1,38	$ 1.793.793,00	0,16	$ 207.976,00	1,54	$ 2.001.769,00		
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.3.3	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M		$ 171.652,00		22,05	$ 3.784.926,60	-		22,05	$ 3.784.926,60		
2.3.5	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M		$ 44.238,00		3,20	$ 141.561,60	-		3,20	$ 141.561,60		
2.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M		$ 356.097,00				36,21	$ 12.894.272,37	36,21	$ 12.894.272,37		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00				21,49	$ 162.399,93	21,49	$ 162.399,93		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.399,00		50,84	$ 376.165,16	293,99	$ 2.175.232,01	344,83	$ 2.551.397,17		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.201,00		409,11	$ 9.082.651,11	-		409,11	$ 9.082.651,11		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.671,00		160,00	$ 267.360,00	-		160,00	$ 267.360,00		

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVCS 6"	UN		$ 182.665,00		4,00	$ 730.660,00	-		4,00	$ 730.660,00		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 95.406,00		26,17	$ 2.496.775,02	-		26,17	$ 2.496.775,02		
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 78.221,00				1,00	$ 78.221,00	1,00	$ 78.221,00		
4.8	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
4.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 17.315,00				39,56	$ 684.981,40	39,56	$ 684.981,40		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 10.500,00		25,27	$ 265.335,00	-		25,27	$ 265.335,00		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 47.175,00		24,80	$ 1.169.940,00	-		24,80	$ 1.169.940,00		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 64.607,00		27,78	$ 1.794.782,46	-		27,78	$ 1.794.782,46		
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 126.442,00		17,13	$ 2.165.951,46	-		17,13	$ 2.165.951,46		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M		$ 19.130,00				20,68	$ 395.608,40	20,68	$ 395.608,40		
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.3	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 524.004,00		28,46	$ 14.913.153,84	-		28,46	$ 14.913.153,84		
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
10.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN		$ 798.903,00				2,00	$ 1.597.806,00	2,00	$ 1.597.806,00		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 9.801,00		104,90	$ 1.028.124,90	-		104,90	$ 1.028.124,90		
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00		67,44	$ 1.603.723,20	-		67,44	$ 1.603.723,20		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.499,00		349,67	$ 7.867.225,33	-		349,67	$ 7.867.225,33		
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 17.925,00		115,46	$ 2.069.620,50	-		115,46	$ 2.069.620,50		
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.687,00		28,60	$ 591.648,20	-		28,60	$ 591.648,20		
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		$ 23.002,00				-					
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
15.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2		$ 30.842,00		125,85	$ 3.881.465,70	-		125,85	$ 3.881.465,70		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 110.894,00				5,95	$ 658.629,30	5,95	$ 658.629,30		
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 270.757,00		28,42	$ 7.694.913,94	-		28,42	$ 7.694.913,94		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00		526,03	$ 2.555.453,74	-		526,03	$ 2.555.453,74		
19	**MANTENIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
19.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE TERRENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TIERRA.	M3		$ 268.957,00		12,58	$ 3.383.479,06	-		12,58	$ 3.383.479,06		
	COLEGIO IED SIMON BOLIVAR SEDE B							-					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado físico.	M		$ 32.406,00		9,31	$ 301.699,86	-		9,31	$ 301.699,86		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-					
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.230,00		2,94	$ 68.296,20	-		2,94	$ 68.296,20		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.284,00		33,74	$ 549.422,16	-		33,74	$ 549.422,16		
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 101.129,00		3,86	$ 390.357,94	-		3,86	$ 390.357,94		
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.515,00		10,31	$ 634.219,65	-		10,31	$ 634.219,65		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.557,00		41,14	$ 310.894,98	-		41,14	$ 310.894,98		

3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 152.221,00		0,18	$ 27.399,78	-		0,18	$ 27.399,78		
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 29.357,00		270,29	$ 7.934.903,53	-		270,29	$ 7.934.903,53		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
7.2.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 28.911,00		11,52	$ 333.054,72	-		11,52	$ 333.054,72		
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.780,00		21,94	$ 521.733,20	-		21,94	$ 521.733,20		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00		342,52	$ 1.663.962,16	-		342,52	$ 1.663.962,16		
	COLEGIO IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A							-					
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**							-					
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.411,00		12,54	$ 444.053,94	-		12,54	$ 444.053,94		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 270.757,00		27,09	$ 7.334.807,13	-		27,09	$ 7.334.807,13		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**							-					
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.858,00		33,60	$ 163.228,80	-		33,60	$ 163.228,80		
								-					
	COSTO TOTAL CONTRATO				**$ 3.659.259.269,00**		**$ 154.044.168,59**		**$ 3.269.753.669,19**		**$ 3.423.797.837,78**		**93,6%**

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS)

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	ITEM NO PREVISTOS											
	COLEGIO IED SIMON BOLIVAR SEDE A											
NP-001-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO O (ZÓCALO EN GRANO MARMOL) BISELADO EN FORMATO (33 CM X 7.3 CM) INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y DEMÁS SUMINISTROS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 71.716,00				124,05	$ 8.896.369,80	124,05	$ 8.896.369,80	
	COLEGIO IED (IT) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A											
NP-002-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA A UNA DESCARGA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA. CAPACIDAD MÍNIMA DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS.	UN		$ 1.053.592,00				20,00	$ 21.071.840,00	20,00	$ 21.071.840,00	
	COLEGIO IED (IT) FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE C											
NP-001-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO O (ZÓCALO EN GRANO MARMOL) BISELADO EN FORMATO (33 CM X 7.3 CM) INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y DEMÁS SUMINISTROS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN			$ 71.716,00				20,25	$ 1.452.249,00	20,25	$ 1.452.249,00	
	I.E.D COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE B											
NP-001-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO O (ZÓCALO EN GRANO MARMOL) BISELADO EN FORMATO (33 CM X 7.3 CM) INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y DEMÁS SUMINISTROS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 71.716,00				79,22	$ 5.681.341,52	79,22	$ 5.681.341,52	
NP-003-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS DE ACERO DE 5MM , INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 60 CM	M		$ 373.411,00	°			65,20	$ 24.346.397,20	65,20	$ 24.346.397,20	
	I.E.D COLEGIO TECNICO PALERMO											
NP-001-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO O (ZÓCALO EN GRANO MARMOL) BISELADO EN FORMATO (33 CM X 7.3 CM) INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y DEMÁS SUMINISTROS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M		$ 71.716,00		42,92	$ 3.078.050,72	112,18	$ 8.045.100,88	155,10	$ 11.123.151,60	
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL						**$ 3.078.050,72**		**$ 69.493.298,40**		**$ 72.571.349,12**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL (A.I.U. = 33,17%)	**$ 3.659.259.269,00**	**$ 157.122.219,31**	**$ 3.339.246.967,59**	**$ 3.496.369.186,90**	**95,5%**
VALOR TOTAL	**$ 3.659.259.269,00**	**$ 157.122.219,31**	**$ 3.339.246.967,59**	**$ 3.496.369.186,90**	**95,5%**
VALOR A PAGAR		**$ 157.122.219,31**	**$ 3.339.246.967,59**	**$ 3.496.369.186,90**	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA		**-$ 0,31**	**$ 0,41**	**$ 0,10**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		**$ 157.122.219,00**	**$ 3.339.246.968,00**	**$ 3.496.369.187,00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 162.890.082,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO EDUCATIVO 25**
C.C. O NIT : 901.973.696-9
REP. LEGAL : DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
C.C. : 1121918202

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **PROBINTEC SAS**
C.C. O NIT : 829.001.061-1
REP. LEGAL : DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
C.C. : 1.098.244.957

PRESENTACIÓN DE ACTA PARCIAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA PARCIAL No. 9


Por medio del presente documento, por parte de la Interventoría, **PROBINTEC S.A.S identificada** con **NIT 829001061-1**, yo, **ROCIO LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ** en calidad de director de Interventoría, adscritos como personal del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8168931** de 2025 suscrito con la Secretaría de Educación, indicamos con la suscripción del presente documento, que hemos revisado en el marco de nuestras competencias las cantidades que generaron el **ACTA PARCIAL No. 9** tanto en cada uno de los frentes intervenidos, como en las memorias que acompañan.

Los frentes que fueron verificados, revisados y aprobados corresponden a las siguientes Intervenciones: **COLEGIO IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A, IED COLEGIO TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A, IED COLEGIO ABEL RODRIGUEZ CESPEDES, IED COLEGIO TECNICO PALERMO, IED COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA Y OBRAS PRIORITARIAS: IED COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A, COLEGIO IED SIMON BOLIVAR SEDE B, COLEGIO IED SIMON BOLIVAR SEDE A** y la sumatoria de la multiplicación de las cantidades por los valores unitarios contractuales suman el valor a costo directo de **$117.986.197,00** para un total de **$157.122.219,00** incluido el AIU del **33,17%**, según la propuesta económica del contratista. Teniendo en cuenta la cláusula 10 *"OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR, numeral 25 Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la interventoría para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos."*


De igual forma, se indica que las cantidades revisadas y aprobadas por el equipo de Interventoría, fueron analizadas en forma conjunta, con los profesionales del CONTRATO DE OBRA No. **CO1.PCCNTR.8155350** de 2025 en su calidad de contratista y CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **CO1.PCCNTR.8168931** de 2025 en su calidad de Interventoría.

Por lo anterior se da aval al contenido del acta y se solicita se dé continuidad al trámite de presentación del **ACTA PARCIAL No. 09** con sus respectivos soportes ante la secretaria de Educación del Distrito.

Se firma en Bogotá a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2026, por los suscritos,




Interventoría
ROCIO LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
PROBINTEC S.A.S



Interventoría
PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
PROBINTEC S.A.S



Contratista de obra
DIEGO ARMANDO REY
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EDUCATIVO 25



Contratista de obra
FERLEY LOPEZ PAEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO EDUCATIVO 25

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS No. 09

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Correspondiente al periodo: del 03 de agosto del 2026 al 02 de septiembre del 2026, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron las siguientes personas: **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**, identificado con **C.C 1.096.244.957** de Barrancabermeja en su calidad de Representante Legal de **PROBINTEC S.A.S** identificado con **NIT 829.001.061-1** en calidad de Interventor, y **DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR**, identificado con **C.C 1.121.918.202** de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **CONSORCIO EDUCATIVO 25** identificado con **NIT 901.973.696-9** en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote No. 18."
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial $ 2.551.797.666,00 (Incluido AIU) Valor adición No. 1 $ 645.761.648,00 (Incluido AIU) Valor adición No. 2 $ 461.699.955,00 (Incluido AIU) Valor adición No. 3 $ 310.000.000,00 (Incluido AIU) Valor total $ 3.969.259.269,00 (Incluido AIU)
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. c. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. d. Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago. e. Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. f. En el evento que el Contratista no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, no habrá lugar a trámite alguno hasta tanto el contratista no cumpla con la obligación, por tanto, no existe retraso en

	el pago y consecuentemente no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. g. En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del contratista. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre vigente. h. Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios u obra objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. i. En el evento que el Contratista no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del Contratista y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. j. El Contratista deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. k. Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo. l. Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. m. El contratista está obligado a incluir en cada informe que corresponda a un soporte de pago, el detalle de la aprobación de ítem No. previsto (NP) por parte del interventor, soporte de su ejecución, aprobación del acta de obra y actualización del balance de obra aprobado por la interventoría. Lo anterior, se realizará mediante aprobación por correo electrónico del supervisor o apoyo a la Supervisión OBRA. n. Salvo eventos excepcionales, el plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista, como lo es la radicación en debida forma de factura y/o cuenta de cobro y/o documento equivalente. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la recepción del bien o servicio. o. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Parágrafo: La Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho de realizar la retención de los valores que adeude el contratista respecto del pago del impuesto de timbre, en los términos establecidos en el Decreto 175 de 2025 y en el Estatuto Tributario. Lo anterior, en cumplimiento de los procedimientos internos de la entidad para el recaudo del mencionado impuesto.
PLAZO PACTADO	Plazo Inicial: siete (7) Meses. Prórroga No. 1: cuatro (4) Meses. Prórroga No. 2: tres (3) Meses y veintinueve (29) días calendario. Plazo Total: diez (14) Meses y veintinueve (29) días calendario.

(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	
FECHA DE INICIO:	03 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre del 2026
INTERVENTOR:	PROBINTEC S.A.S

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales (personal de Interventoría prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación y pagos realizados de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en los estudios previos y la propuesta presentada, validando que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la seguridad social de todo el personal ofertado en la propuesta), para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 09, el cual corresponde a un valor de **$ 157.122.219,00 M/CTE CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE**, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de **88,1%**.

De la misma manera la interventoría certifica que para el pago del contratista de obra, se adelantó la validación de la información correspondiente a las cantidades de obra y actividades desarrolladas en el marco del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
CONSORCIO EDUCATIVO 25
DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.121.918.202 de Bogotá

Diana Moreno Florez

Interventoría
PROBINTEC S.A.S
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
CC 1.096.244.957 de Barrancabermeja

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL SST No. 011
Periodo del informe: 03 DE AGOSTO 2026 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..5
   1.1. Introducción. 5
   1.2. Objetivos....6
   1.3. Delimitación Área De Influencia Directa. 7
   1.4. Información Contrato de obra 12
   1.5. Información general de Contrato de obra. 12
   1.6. Información general del Contrato de interventoría....13
2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS INTERVENTORÍA.....13
   2.1 Ingreso de personal de Obra.....15
   2.2 Personal Operativo de Obra.....15
   2.3 Registro de exámenes de ingreso.....17
   2.4 Personal Retirado.....17
   2.5 Porcentaje de Personal Femenino (Decreto 332 del 2020).....18
   2.6 Directiva Distrital N.° 1 de 2011. 18
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 18
4. SEÑALIZACIÓN. 20
   4.1 Señalización del campamento 20
   4.2 Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos. 21
   4.3 Señalización Plan de Emergencia. 21
   4.4 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo. 21
   4.5 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad. 21
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 23
   5.1 Registro Uso de los EPP. 23
6. ADMINISTRAACIÓN DE LOS RIESGOS. 23
   6.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos 23

6.2 Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo. 23

6.3 Permisos de trabajo para labores de alto riesgo. 24

6.4 Inspecciones SST. 24

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 25

7.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos. 26

7.2 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos. 26

7.3 Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos. 26

7.4 Horarios de trabajo de la maquinaria. 27

7.5 Control diario de horómetro 27

7.6 Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos. 27

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 27

8.1 Pagos de Seguridad Social. 27

8.2. Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: Cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral 27

9. EMERGENCIAS 30

9.1 Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.. 30

9.2 Conformación de las Brigadas de Emergencia.. 31

9.3 Simulacros de Emergencia.. 31

10. BIENESTAR 31

10.1 Instalaciones Provisionales.. 31

10.2 Baterías de Baños. 32

10.3 Sistema de Hidratación.. 32

11. ORDEN Y ASEO 32

11.1 Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra. 32

12. DIVULGACIÓN 33

12.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.. 42

12.2 Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST.. 33

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 33

14. INDICADORES SST 33

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 34

15.1 Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros 34

15.2 Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST 35

15.3 Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes 35

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35

17. ANEXOS 36

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

1.1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del contrato de interventoría **No. CO1. PCCNTR.8168931 de 2025**, PROBINTEC, en su calidad de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual No 11 en el cual se realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155350, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO EDUCATIVO 25, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 18.

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (PROBINTEC) y contratista de obra (Consorcio Educativo 25) desde el área SST para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026. Para el periodo reportado, se anexan las planillas correspondientes al pago de la Seguridad Social del personal de interventoría, que incluyen los aportes a EPS, ARL y AFP.

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de la interventoría:

- **Actividades SST**
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de vehículos
  - Inducción, notificación de riesgos, evaluación inducción de personal operativo
  - Análisis de la actividad a ejecutar – ATS
  - Compilación de planillas de seguridad
  - Entrega de dotación y EPP´S
  - Inspección de elementos SST
  - Inspecciones preoperacionales
  - Charla de 5 minutos y capacitación mensual
  - Señalización de áreas
  - Demarcación y delimitación de zonas
  - Pausas activas

En relación con los aspectos de SST, el contratista no presenta de la documentación de ingreso del personal, durante el periodo reportado. Así mismo, tanto el contratista como la interventoría anexan las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo correspondiente a este periodo**. (Ver anexo 5. Planillas de Seguridad Social).**

El contratista, dentro del informe de gestión SST, anexa los respectivos ATS correspondientes a las actividades ejecutadas en la obra, para un total de 11 ATS durante el periodo evaluado. Se informa que en este periodo se realizaron 2 permisos de trabajo en alturas y 04 permisos de trabajo en caliente.

Asimismo, el contratista incluye las inspecciones de las herramientas disponibles en la obra y presenta el registro de 24 charlas diarias. De igual manera, el contratista presenta la documentación de ingreso del personal, la cual fue presentada previo al inicio de labores en los frentes de trabajo asignados.

A nivel administrativo, durante el periodo reportado no se registraron accidentes laborales; en consecuencia, no se generaron investigaciones de accidentes, informes FURAT, lecciones aprendidas ni socializaciones asociadas.

Se evidencia que todo el personal ingresó a la obra con las afiliaciones correspondientes a ARL, EPS, AFP, así como con el examen médico de ingreso. Esta información se encuentra adjunta en el informe presentado por el contratista e incluye la respectiva firma de aprobación de esta interventoría. Del mismo modo, el personal de interventoría cuenta con esta documentación desde antes del inicio de las actividades de obra.

1.2. OBJETIVOS.

- Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas durante el período en mención.
- Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentada por el Contratista
- Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 a la obra.
- Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría.
- Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026.
- Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos ATS asociados.
- Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos de seguridad social correspondientes.
- Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra.
- Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra.
- Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de interventoría.

- Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED.(**Ver Anexo 1. Lista de Chequeo de la SED)**

1.3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

- **Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas - Sede B**

  La IED Rodolfo Llinas – Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CALLE 87 No 112-55 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – Localización IED Distrital Rodolfo Llinas – SEDE B, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Simón Bolivar – Sede A**

  La IED Simón Bolívar– Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 92 # 87 A - 60 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 2 – Localización IED Simón Bolivar – Sede A Fuente Google Earth.

- **Institución Educativa Distrital Magdalena Ortega – Sede A**

La IED Magdalena Ortega – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 69 B # 78 A - 36 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 3 – Localización IED Magdalena Ortega – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Jorge Gaitán Cortés – Sede B**

La IED Jorge Gaitán Cortés – Sede B La Española, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 84 # 83 - 71 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización Jorge Gaitán Cortés – Sede B, Fuente Google Earth.

- **Institución Educativa Distrital Tabora – Sede A**

La IED Tabora – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 77 B # 74 A – 02 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 5 – Localización IED Tabora– Sede A, Fuente Google Earth

- **Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A**

  La ITI Francisco José de Caldas – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección Avenida Carrera 63 No 68-82 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede A, Google Earth.

- **Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede C**

La ITI Francisco José de Caldas – Sede C – Clemencia de Caicedo, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CL 68 A # 68 D - 51 -- KR 60 # 67 - 84 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede C, Google Earth.

1.4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

1.5. Información general del contrato.

CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.8155350 de 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.551.797.666
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/11/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

1.6. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8168931 de 2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
INTERVENTORÍA	PROBINTEC SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la Secretaria Distrital de Integración Social.

Tabla 1. Personal Interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

2.1. Ingreso Personal de Obra

En el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se pudo evidenciar que el contratista no presentó documentación de ingreso de trabajadores operativos, Esta información se encuentra en el Anexo 5 Planilla de Seguridad Social vigentes del informe SST No 11 del contratista.

2.2. Personal Operativo de Obra

CONSORCIO EDUCATIVO 25.

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 se cuenta con los siguientes trabajadores:

Tabla 1. Personal Operativo Aprobado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Mauricio Bermúdez Romero	79.510.176	Oficial Eléctrico	20-1-26	Energiza
Anderson Fabián Rodríguez Mejía	1.014.662.676	Eléctrico	20-1-26	Energiza
Cristian Kevin Sánchez Bravo	1016063698	Eléctrico		Energiza
Erick Xavier Flores González	Ppt 5733294	Eléctrico	6-4-26	Energiza
José Alfredo Garzon Osaza	80270364	Eléctrico	6-4-26	Energiza
Jeferson Soriano Cadena	1024555679	Eléctrico	8-4-26	Energiza
Jorman Alejandro Torres Reyes	1118563916	Oficial de obra	14-3-26	Ingoriente
Cristan Andrés Ordoñez	1033715273	Ayudante de obra	13-3-26	Ingoriente
Maicol Sebastián Caita Rodríguez	1233893473	Oficial de obra	23-3-26	Ingoriente
Pedro Alexander Murcia Buitafo	97610891	Ayudante de obra	14-3-26	Ingoriente
Diego Alejandro Valencia Ordoñez	1014857538	Ayudante de obra	14-3-26	Ingoriente
Merlis Barrios García	1094285458	Ing. residente		Energiza
Jhoan Emigio Gutiérrez	1075660551	Oficial		Ingoriente

baracaldo				

Cabe resaltar que el personal aprobado y debidamente radicado durante el periodo evaluado es rotado por el contratista entre los diferentes frentes de obra asignados, de acuerdo con la programación de actividades y las necesidades operativas del proyecto. Dicha rotación se realiza bajo la responsabilidad del contratista, garantizando en todo momento que el personal cuente con los soportes legales vigentes, afiliaciones al sistema de seguridad social al día, capacitación en SST y los elementos de protección personal requeridos para cada frente de trabajo.

Tabla 2. Personal rotativo Radicado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Fecha de ingreso	Contratista
Hidalgo David Montero Gutiérrez	7.571.563	Aserrador	20-12-25	Tala y Poda
José Francisco Ortiz Llerena	5.124.771	Aserrador	20-12-25	Tala y Poda
Osnaider Madera Cadena	1.065.828.798	Aserrador	20-12-25	Tala y Poda
Tomas Jasler Caraballo Padilla	1.068.136.608	Instalador	22-1-26	ALUVID INSTALACIONES S.A.S
Juan Gabriel Rojas Nieto	80.101.901	Instalador	22-1-26	ALUVID INSTALACIONES S.A.S
Álvaro Alfonso Iriarte Borja	119.358.891	Instalador	22-1-26	ALUVID INSTALACIONES S.A.S
Ricardo Emiro Benítez Morelo	1.104.413.170	Instalador	22-1-26	ALUVID INSTALACIONES S.A.S
Jhoan Manuel Méndez Méndez	5.183.103	Instalador	25-02-2026	Ornamentacion L&M
Wilmer José Rivera David	1.026.605.930	Instalador	25-02-2026	Ornamentacion L&M
Juan Jonys Mazenett David	1.083.052.683	Instalador	25-02-2026	Ornamentacion L&M
José Simeón Charry Saenz	3.135.067	Aserrador	09-02-2026	Tala y Poda

Jaider Rafael Rodríguez Villazon	12.436.951	Aserrador	09-02-2026	Tala y Poda
José Nerandy Olivera Saldaña	1.083.463.321	Instalador Divisiones	18-12-25	Inoxideas
Beiker David Castañeda Zabaleta	1.134.330.353	Instalador Divisiones	18-12-25	Inoxideas
Devinson Alberto Noriega Castro	1005675745	Instalador	Personal Flotante	Aluvid
José Orlando Salinas Acosta	79599683	Plantador	Personal Flotante	Bosque andino
Pedro Antonio Chiquillo Caraballo	8167095	Plantador	Personal Flotante	Bosque andino

2.3. Registro de exámenes de ingreso

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del plan de trabajo establecido, La interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, enfocada en el tema “Señales tempranas que pueden anticipar un accidente”. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la capacidad del personal de interventoría para identificar de manera oportuna señales, condiciones y comportamientos que puedan anticipar la ocurrencia de un accidente, promoviendo la intervención preventiva y la toma de acciones seguras durante las visitas y recorridos de obra. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual.**

Personal Interventoría

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 por parte de la interventoría no se presenta personal retirado.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presenta retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 11 se evidencian la paz y salvos presentados.

2.4. Porcentaje Personal Femenino (Decreto 332 del 2020).

- **Personal Interventoría**

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se cuenta con el equipo de 16 trabajadores de interventoría, de los cuales 09 son mujeres y 07 son hombres lo que corresponde al 56,25% de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje mínimo que exigió la SED en la etapa contractual.

Tabla 3. Personal Femenino Interventoría

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	09	56,25%
Hombres	07	43,75%
TOTAL	16	100%

- **Personal Contratista**

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista cuenta con 5 mujeres y 15 hombres, lo que corresponde al 28 % de personal femenino vinculado a la empresa contratista.

Tabla 4. Personal Femenino Contratista

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	5	28%
Hombres	13	72%
TOTAL	20	100%

2.5. Directiva Distrital N.° 1 de 2011

De acuerdo con la Directiva Distrital N.° 1 de 2011, durante el periodo evaluado no se reporta la presencia de trabajadores en situación de vulnerabilidad dentro de la obra. Todo el personal cumple con las condiciones de salud y requisitos para el desarrollo seguro de sus actividades, por lo que no se requieren medidas especiales adicionales para este grupo.

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del plan de trabajo establecido, La interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, enfocada en el tema “Señales tempranas que pueden anticipar un accidente”. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la capacidad del personal de

interventoría para identificar de manera oportuna señales, condiciones y comportamientos que puedan anticipar la ocurrencia de un accidente, promoviendo la intervención preventiva y la toma de acciones seguras durante las visitas y recorridos de obra. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual**.

- **Capacitaciones y charlas de Seguridad**

Durante el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista Consorcio Educativo 25 realizó 24 charlas seguridad al personal de obra, donde el firme propósito de las charlas realizadas en obra comúnmente conocidas "charlas de 5 minutos" se abordaron temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diversas áreas de trabajo

- **Charlas de Seguridad**
  IED Simón Bolívar

No	TEMA	FECHA
1	Soporte vital Básico	3-8-2026
2	Medio Ambiente	5-8-2026
3	Vibraciones	7-8-2026
4	Primeros auxilios	11-8-2026
5	Operación maquinaria de corte	13-8-2026
6	Trabajo en equipo	16-8-2026
7	Escaleras de tijeras	19-8-2026
8	Prisa en el trabajo	20-8-2026
9	Lesiones de los ojos	21-8-2026
10	Resbalones y Caídas	24-8-2026
11	Botiquín	26-8-2026
12	Lesiones en las manos	28-8-2026

IED Republica de Colombia

No	TEMA	FECHA
1	Lumbalgia	3-8-26
2	Síndrome de Burnout	4-8-26
3	Ergonomía	5-8-26
4	Señalización de Áreas	6-8-26
5	Contaminación del Aire	7-8-26
6	Riesgo Biológico	11-8-26
7	Generador de energía eléctrica	12-8-26
8	Propiedades Físicas y Químicas del Aire	14-8-26

9	Protección Respiratoria	18-8-26
10	La Comunicación	19-8-26
11	Contaminación Ambiental	27-8-26
12	Instalación de tuberías	29-8-26

Los registros de asistencias y soportes se encuentran en el Anexo 6. Inducciones Personal y Anexo 9. Charlas y Capacitaciones, informe SST del contratista No 11 mes de Agosto.

Registro Fotográfico – Inducciones y Capacitaciones Consorcio Educativo 25	
	

4. SEÑALIZACIÓN


Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 adelantó la instalación de la señalización y demarcación correspondiente a las áreas de acopio de materiales, así como la señalización preventiva, de prohibición y de obligatoriedad en todos los frentes de obra. De igual manera, se ejecutó la demarcación de las rutas y puntos de evacuación como parte de la señalización de emergencia.
Asimismo, para este periodo, el contratista anexó la inspección de los equipos y maquinaria utilizados en la obra, evidenciando el cumplimiento de los controles establecidos en materia de SST. Esta información se encuentra en el Anexo 12. Registro Fotográfico.

4.1. Señalización del campamento

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25 realiza la señalización del campamento, de cada una de las áreas de trabajo y respectivos senderos peatonales como se evidencia en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización



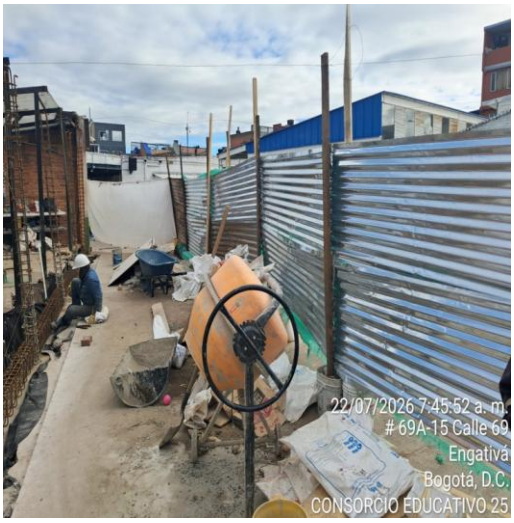


4.2. Señalización y Demarcación de Maquinaria

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 se contó con señalización de maquinaria, en razón a que durante el periodo evaluado se registró el ingreso y la operación de maquinaria en la obra, por lo cual fue necesario implementar la señalización correspondiente para garantizar la seguridad en las áreas intervenidas.

4.3. Señalización Plan de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25 ha implementado la señalización de acuerdo al plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias, de igual manera se encuentra señalizado las rutas de evacuación en acuerdo al plan de emergencia de obra como se evidencian en las siguientes fotografías.

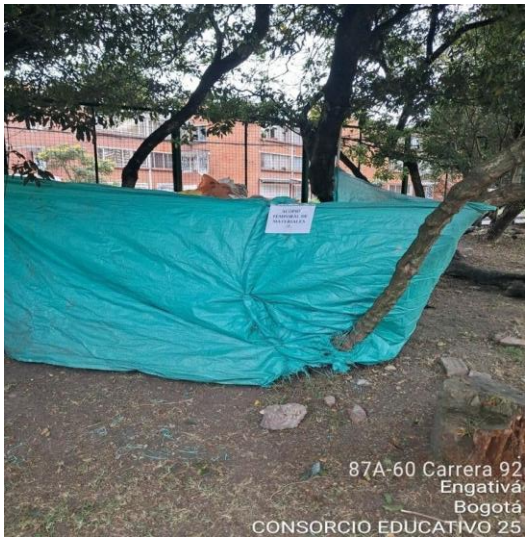Registro Fotográfico – Señalización	
	

4.4. Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25 realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra la respectiva señalización prohibitiva.

4.5. Señalización de las áreas destinadas para la movilidad.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25, realiza la instalación de señalización con cinta de peligro en aras de identificar las áreas de tránsito para el personal vinculado a obra y visitantes que ingresan a la misma; de igual manera, se encuentran demarcados y señalizados los senderos peatonales siendo estas áreas las que se encuentran al interior de obra destinadas para el paso seguro de todo personal vinculado al proyecto, como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización


5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para este periodo, se pudo evidenciar que todo el personal, tanto de interventoría como del contratista hizo uso de los respectivos EPP en obra.

5.1. Registro Uso de los EPP

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, Consorcio Educativo 25, anexó el formato de entrega de EPP de los trabajadores operativos, al igual que el registro fotográfico donde se evidencia su uso adecuado en obra. Esta información se encuentra en el Anexo 8. Entrega de dotación - EPP y en el Anexo 8, informe mensual SST No 11 Contratista.

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

6.1. Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos.


El Consorcio Educativo 25 para este periodo 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 anexa la matriz IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en los procesos constructivos y riesgo identificados, donde se realizó la previa socialización de esta con el personal vinculado a obra a la fecha. Esta información se encuentra en el informe SST No 11 del contratista.

6.2. Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.

El Consorcio Educativo 25 para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, anexa el diligenciamiento de 11 análisis de trabajo seguro de las actividades que se realizaron en este

periodo en la obra. Esta información se encuentra contenida en el Anexo 1. ATS, informe Mensual SST No 11 del contratista.

Registro Fotográfico – Actividades – ATS

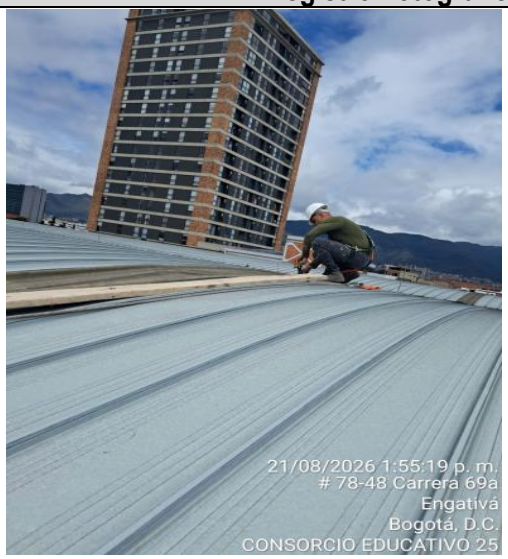



6.3. Permisos de trabajo para labores de alto riesgo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 realizó actividades de alto riesgo, por consiguiente, el contratista realizó el diligenciamiento de 2 permisos de trabajo en alturas y 4 permisos de trabajo en caliente. Esta información se encuentra en el Anexo 2. Permisos de trabajo y Anexo, informe Mensual SST No 11 del contratista.

6.4. Inspecciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 realiza 6 inspección en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada. Esta información se encuentra en el Anexo 3. Inspecciones Preoperacionales de obra del informe Mensual SST No 11 del contratista.

Institución Educativa Magdalena Ortega

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de Arnes	1
2	Inspección de Eslinga	1

Institución Educativa Republica de Colombia

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de Pulidora	2

Institución Educativa Simón Bolívar

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de Pulidora	2

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

7.1. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 cuenta con la aprobación de los siguientes vehículos.

Clase De Vehículo	Placa	SOAT	RUNT	Oficio De Aprobación	Fecha De Ingreso	Fecha De Retiro
Camión	JTY293	27/09/2026	28/07/2026	PROBINTEC-LOTE6-227	23/01/2026	Retirada
Volqueta	KFC608	08/1272026	29/09/2026	PROBINTEC-LOTE6-197	19/01/2026	Retirada
Volqueta	OSA414	07/05/2026	15/04/2026	PROBINTEC-LOTE6-197	19/01/2026	Retirada
Volqueta	CAH842	11/20/2026	09/12/2026	PROBINTEC-LOTE6-197	19/01/2026	Retirada
Volqueta	FCD 229	12/03/2026	21/03/2026	PROBINTEC-LOTE6-206	20/01/2026	Retirada
Volqueta	EWE764	28/04/2026	14/07/2026	PROBINTEC-LOTE6-210	21/01/2026	Retirada
Volqueta	SNJ658	01/07/2026	08/09/2026	PROBINTEC-LOTE6-214	22/01/2026	Retirada

Volqueta	JOA390	22/09/2026	21/04/2026	PROBINTEC-LOTE6-214	22/01/2026	Retirada
Volqueta	ZOA920	06/01/2027	18/01/2027	PROBINTEC-LOTE6-214	22/01/2026	Retirada
Volqueta	OWH435	21/07/2026	05/01/2026	PROBINTEC-LOTE6-214	22/01/2026	Retirada
Camión Furgón	WCD449	27/09/2026	28/07/2026	PROBINTEC-LOTE6-227	23/01/2026	Retirada

Clase De Vehículo	N° Tarjeta Registro	Serial	Mantenimiento	Oficio De Aprobación	Fecha De Ingreso
Excavadora Sobre Orugas	152115	66SE07EJNM0001334	06/01/2026	PROBINTEC-LOTE6-174	13/01/2026

7.2. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25, no se registraron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo asociadas a dichos equipos. La situación fue informada por el contratista como parte del reporte operativo del periodo.

7.3. Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25, no realizo inspección preoperacional de equipos y vehículos.

Horarios de trabajo de la maquinaria

De acuerdo con los lineamientos del contrato el Consorcio Educativo 25, no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra.

7.4. Control diario de Horómetro

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Educativo 25 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra.

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Pagos de Seguridad Social

Personal Interventoría

Probintec SAS, para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 anexó el soporte de pago de la Seguridad Social correspondiente a los 16 profesionales (Ver Anexo 2. Planillas de SS) que conforman el equipo de interventoría. Dicho pago se encuentra registrado bajo la planilla No 9508329491 cumpliendo así con las obligaciones laborales y contractuales establecidas.

8.2. Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: Cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VINCULACIÓN LABORAL
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	$9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	$6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%	$8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	$8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%	$3.000.000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%	$3.000.000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	$3.000.000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	$3.000.000	Obra Laboral

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VINCULACIÓN LABORAL
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	$2.700.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos	30%	$2.700.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	$1.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	$2.700.000	Obra Laboral
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	$2.500.000	Obra Laboral
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	$2.500.000	Obra Laboral
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	$1.750.000	Obra Laboral

Personal Contratista

Consorcio Educativo 25

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Diego Armando Rey Olarte	94385968	AFP- julio Salud – agosto	03/09/2026	$1.750.905	Director de Obra
Hugo Ferley López Páez	94385968	AFP- julio Salud – agosto	03/09/2026	$2.800.000	Residente de Obra
María Victorina Lozano	9510706555	AFP- agosto Salud – septiembre	03/09/2026	$1.750.905	Profesional SST
Viviana Luengas Amaya	94385968	AFP- julio Salud – agosto	03/09/2026	$2.200.000	Técnico SST1
Luisa Fernanda Parrado Londoño	94850838	AFP- agosto Salud – septiembre	07/09/2026	$2.500.000	Técnico SST 2
Brayan Leonardo Moreno Reyes	94385968	AFP- julio Salud – agosto	03/09/2026	$ 2.600.000	Inspector de Obra 1
Daniela Galindo Molano	9507439261	AFP- julio Salud – julio	04/08/2026	$3,600,000	Especialista Ambiental

Dayanna Alejandra Baquero	93879040	AFP- julio Salud – agosto	05/08/2026	$ 5.350.000	Profesional Costos y Presupuestos

ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Mauricio Bermúdez Romero	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Oficial Eléctrico
Anderson Fabián Rodríguez Mejía	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Eléctrico
Erick Xavier Flores González	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Eléctrico
José Alfredo Garzón Isaza	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Eléctrico
Jeferson Soriano Cadena	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	16/07/2026	$ 1.800.00	Eléctrico
Sebastián García Rodríguez	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.800.00	Eléctrico
Merlis Barrios García	1084154309	AFP- julio Salud – agosto	18-08-2026	$ 1.750.905	Ing. residente

INGORIENTE

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Jorman Alejandro Torres Reyes	1085000587	AFP- julio Salud – agosto	08-09-2026	$ 1.750.905	Oficial de obra
Maicol Sebastián Caita Rodriguez	1085000587	AFP- julio Salud – agosto	08-09-2026	$ 1.750.905	Oficial de obra
Yojan Camilo Malambo	1085000587	AFP- julio Salud – agosto	08-09-2026	$ 1.750.905	Ayudante de obra
Jhon Alexey Hernández	1085000587	AFP- julio Salud – agosto	08-09-2026	$ 1.750.905	Oficial de obra
Jorge González	1085000587	AFP- julio	08-09-2026	$ 1.750.905	Maestro de obra

solano		Salud – agosto			

WNM Ingenieros

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Wilson Alexander Mesa Ladino	1084901429	AFP- agosto Salud – septiembre	03-09-2026	$ 1.750.905	Operario
Willington Niño Melo	1084931258	AFP- agosto Salud – agosto	08-09-2026	$ 2.000.000	Contratista
Carlos Alberto Velez Torres	1084901429	AFP- agosto Salud – septiembre	03-09-2026	$ 1.750.905	Oficial de obra
Diego Alexander Pachón	1084901429	AFP- agosto Salud – septiembre	03-09-2026	$ 1.750.905	Auxiliar de obra

9. EMERGENCIAS

9.1. Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25 instala los equipos de emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro, cada frente de obra cuenta con la señalización de 1 botiquín tipo A, 1 camilla rígida, 1 extintor de 10 libras ABC de emergencia.



Plan de Emergencia

9.2. Conformación de las Brigadas de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio Educativo 25, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se evidencia que el contratista conforma las brigadas, cumpliendo los lineamientos de la lista de chequeo de la SED. Estas brigadas fueron conformadas de primeros auxilios, contra incendios, y de evacuación.

9.3. Simulacros de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio Educativo 25, no realiza simulacro se ejecutó simulacros de emergencia en los frentes de obra. Esta situación fue reportada en la información mensual del contratista, indicando que la actividad será programada para un periodo posterior conforme al plan de emergencias establecido.

10. BIENESTAR

10.1 Instalaciones Provisionales

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Educativo 25, se evidenció la presencia y adecuación de un campamento permanente de obra. Este espacio cuenta

con las áreas básicas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el apoyo logístico y la gestión en campo.

10.2. Baterías de Baños

De acuerdo con lo evidenciado en los diferentes frentes de obra, durante este periodo el Consorcio Educativo 25 hizo uso de las baterías sanitarias fijas existentes en cada institución educativa, las cuales fueron asignadas exclusivamente para el personal del consorcio. Esta medida garantiza la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados durante la ejecución de las actividades en obra.

10.3. Sistema de hidratación

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Educativo 25 se evidencia puntos de hidratación (botellón agua) dispuesto en áreas comunes de fácil acceso, visible y libre de obstáculos, estos puntos de hidratación son para el uso del personal vinculado a obra.

11. ORDEN Y ASEO

11.1.Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra

Se pudo evidenciar que el Consorcio Educativo 25 realiza jornadas de orden y aseo diarias en cada uno de los frentes de obra, como se evidencia en el registro fotográfico





Orden y Aseo

12. DIVULGACIÓN

12.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidenció que el Consorcio Educativo 25 para este periodo, se evidencia la divulgación del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en las Charlas realizas.

12.2. Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST

El Consorcio Educativo 25, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, realizó 38 charlas de 5 minutos, con ello se cumple con el cronograma y programa de capacitaciones y charlas del SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Consorcio Educativo 25, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, hace entrega de la reunión mensual de:

COPASST: El contratista anexa la conformación del COPASST

14. INDICADORES SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presentan accidentes de obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

- **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo**

$$IF\ AT = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

$$IF\ AT = 0\%$$

- **Índice de severidad de accidente de trabajo**

$$IS\ AT = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes + No. de días cargados en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

$$IS\ AT = 0\%$$

- **Proporción de letalidad de accidentes de trabajo**

Letalidad AT = No. de AT mortales que se presentaron en el año *100

No. Total de AT que se presentaron en el año

Letalidad AT = 0%

- **Indicador de prevalencia de enfermedad laboral**

Enfermedad Laboral = No. Casos de enfermedad laboral *100000

Promedio de trabajadores en el año

Prevalencia EL = 0%

- **Ausentismo con causa médica**

Ausentismo por causa médica = No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes*100

No. Días programados de trabajo en el mes

Ausentismo por causa médica = 0/0*100 = 0%

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

15.1. Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST. (Ver Anexo 7 Certificado de accidentalidad emitido por la ARL del contratista).

15.2. Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.3.Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa planes derivados de la investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- ✓ En el mes el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 esta interventoría realiza verificación a la documentación y registros presentados por el contratista de obra de acuerdo con las actividades a realizadas.
- ✓ Durante el periodo en mención se realizaron visitas a obra para verificar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los frentes de obra, de lo cual se realiza verificación a señalización, equipos de emergencia en buen estado, dotación y EPP al manual de marca y en buen estado. Sin embargo, por parte de esta interventoría se realizan observaciones y recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento en obra.
- ✓ Durante el periodo reportado, el contratista no registra la ocurrencia de accidentes de trabajo ni incidentes asociados a las actividades ejecutadas en el frente de obra. Esta condición evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en SG-SST, así como la adecuada implementación de las medidas preventivas definidas para el control de los riesgos identificados.
- ✓ Se evidencia el compromiso del personal con el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo el trabajo seguro en los diferentes frentes de obra y contribuyendo a la prevención de incidentes y accidentes laborales. Así mismo, se recomienda continuar fortaleciendo la implementación de buenas prácticas seguras en los frentes de obra, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y prevenir la materialización de riesgos durante la ejecución de las actividades.

17. ANEXOS SST

Anexo 1. Lista de Chequeo_03/07/2026 – 02/08/2026

Anexo 2. Planillas de Seguridad Social Interventoría agosto 2026

Anexo 3. Capacitación Mensual agosto 2026

Elaboró	Aprobó
Katerin Carolina Núñez Osorio	**Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez**
Profesional SST	Director de interventoría
	

Anexos SST

Proyecto:	Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas				
Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25	**Interventoría:**	PROBINTEC		
Contrato:	No. CO1.PCCNTR.8155350	**Contrato:**	No. CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	No 11 - Agosto 2026	**Periodo:**	03 de Agosto al 02 de Septiembre del 2026		

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				*La Interventoría cumplió con la entrega oportuna del informe mensual de gestión SST, conforme a la fecha acordada con la supervisión del proyecto*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X				*La información se encuentra relacionada en el informe Mensual SST No 11 del contratista e interventoría*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X				*El informe mensual de gestión SST se presenta conforme a los lineamientos de la SED, en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X				*El personal del contratista y de la Interventoría cuenta con afiliación vigente a ARL, EPS y AFP, según lo evidenciado en el Informe Mensual SST N.° 11*
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X				*Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se recopila la documentación obligatoria de cada trabajador. Así mismo, el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra se actualiza de manera semanal y es remitido como soporte a la supervisión del proyecto todas las semanas, a través de los grupos de WhatsApp establecidos para la comunicación oficial*
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X				*Se realizan y verifican los exámenes médicos de ingreso y egreso por cargo y se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal, esta información se puede evidenciar en el informe Mensual SST No 11*
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.			X		*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento establecido en el SGSST. Por parte de la Interventoría, se realizaron las capacitaciones correspondientes al personal de acuerdo con el periodo reportado, las cuales se encuentran debidamente soportadas en el Informe Mensual SST N.° 11Anexo 3 de Interventoría y en el Informe Mensual Anexo 6 del contratista*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X				*Todos los trabajadores son notificados de los riesgos asociados al cargo a desempeñar antes de iniciar las labores propias del mismo, y se cuenta con los respectivos soportes de ejecución de la actividad. Durante el periodo reportado no se generaron ingresos de personal por parte de la Interventoría; sin embargo, se continúa con la notificación de riesgos al personal vinculado del contratista*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.°7*
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*

	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con los EPP adecuados para la actividad a desarrollar, los cuales se encuentran normalizados y son utilizados de manera permanente al interior de la obra. El Contratista garantiza el recambio oportuno de los EPP y lleva un registro formal de entrega, así como la reposición e inspección periódica de los mismos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Anexo 8 Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con la dotación adecuada para la actividad a desarrollar, Esta información se encuentra debidamente soportada en el Anexo 8 Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X				*El contratista mantiene actualizado y divulgado el Panorama de Factores de Riesgo y ejecuta los planes de acción derivados de la Matriz de Riesgos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11*
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	6.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación	X				*El contratista envía la documentación de vehículos y maquinaria, la cual es revisada y aprobada por la Interventoría previo al ingreso a la obra. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.	X				*El contratista remite a la interventoría los mantenientos preventivos realizados a la maquinaria antes del ingreso al frente de obra, esta información se encuentra en el Anexo 13 Documentos de maquinaria y volquetas del informe Mensual SST No 11 del contratista e interventoría*
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente	X				*El contratista realiza los preoperacionales de las maquinarias y volquetas ingresadas en el periodo, esta información se encuentra relacionada en el informe Mensual SST No 11 del contratista.*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.	X				*De acuerdo con los lineamientos del contrato el Consorcio Educativo 25, no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra.*
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.	X				*De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Educativo 25 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra*
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.	X				*El contratista 2 días antes envía mediante oficio el ingreso de maquinaria y volquetas a los frentes de obra*
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.	X				*El contratista presenta a interventoría el certificado de idoneidad del operador de la maquinaria*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X				*El contratista como interventoría se encuentran al día en el pago de seguridad social. Dicha información se encuentra en el informe mensual SST anexos 2. Pago de Planillas de SS de interventoría y en el informe mensual SST No 11. Anexo 5 del*
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
9. EMERGECIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.			X		*Durante el periodo reportado no se han registrado emergencias en los frentes de obra.*
	9.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.	X				
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	10.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.			X		*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	13.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	14.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11del contratista*
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X		Durante este periodo del 03 de agosto del 2026 al 02 de septiembre del 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X		Durante este periodo del 03 deagosto del 2026 al 02 de septiembre del 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ: Katerin Nuñez Osorio

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

NOMBRE:
CARGO: Profesional SST
EMPRESA: PROBINTEC
FECHA: 11/09/2026

FECHA: *11/09/2026*

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	557472989	9508329491	E	2026/09/14	2026/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$33,105,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN																		230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,857,600
2	CC	1095921445	BETANCUR DOMINGUEZ SILVIA JULIANA																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
3	CC	79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO																		230201	30	$6,350,000	$1,016,000	EPS008	30	$6,350,000	$254,000	CCF24	30	$6,350,000	$254,000	14-11	30	$6,350,000	$442,000	30	$0	$0	Si	$1,966,000
4	CC	53094602	GARCIA MUÑOZ DIOSMERY																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
5	CC	1019117937	JACINTO RODRIGUEZ ERIKA ALEJANDRA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	1000591167	JARAMILLO CHAVEZ CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
7	CC	1002550163	MARTINEZ MORALES PAULA ANDREA																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS037	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
8	CC	1073246437	MORA LA ROTTA NELLY NATALIA		X																230201	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS008	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
9	CC	7316778	NIVIA QUINTERO GERMAN ADOLFO																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
10	CC	1054552084	NUÑEZ OSORIO KATERIN CAROLINA																		25-14	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS037	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0	Si	$2,167,200
11	CC	80199878	OLARTE ORTIZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS001	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
12	CC	1012451349	REYES SALCEDO YENI DANIELA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS008	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
14	CC	1049627513	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROCIO LORENA																		25-14	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS037	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
15	CC	14395377	SERRANO RUEDA CARLOS FERNANDO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
16	CC	1128627947	TORO CARDONA ANGIE PAOLA																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
17	CC	79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON																		25-14	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
Total	**Afiliados(17)**																					$104,750,905	$17,434,400			$104,750,905	$4,190,100			$104,750,905	$4,190,100			$104,750,905	$7,291,200		$0	$0		$33,105,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	557472989	9508329491	E	2026/09/14	2026/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$33,105,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$17,434,400					$0	$17,434,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$5,046,000	$99,000	$0	$99,000	$0	$0	$5,046,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$9,850,800	$193,300	$0	$193,300	$0	$0	$9,850,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$2,537,600	$44,800	$0	$44,800	$0	$0	$2,537,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$7,291,200					$0	$7,291,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$7,291,200	$0	$0	$0	$0	$0	$7,291,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$4,190,100					$0	$4,190,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$4,190,100	$0	$0	$0	$0	$0	$4,190,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$4,190,100					$0	$4,190,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$396,000	$0	$0	$0	$0	$0	$396,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,318,100	$0	$0	$0	$0	$0	$1,318,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,244,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,244,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,032,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,032,000
TOTAL				17	$33,105,800	$337,100	$0	$337,100	$0	$0	$33,105,800

	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 03/10/2025
FECHA: 24/08/2026 LUGAR: Interventoría	Capacitación [X] Charla [ ] Reunión Gerencial [ ]	Inducción [ ] Otra/Cual:

HORA INICIO: 8:10 am HORA FIN: 9.00 am

TEMA: Señales tempranas que pueden anticipar un accidente

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Identificar de manera apertura señales, condiciones y comportamientos que pueden anticipar la ocurrencia de un accidente.

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angie Paola Toro Cardona	1.128.627.947	Técnico SST	
2	Dismery García Muñoz	53894602	Inspector	
3	Cristian Rodriguez	1014363316	Espe. Ambiental	
4	Yeni Daniela Reyes	1012451349	Apoyo. Interventl	Daniela Reyes.
5	Luis Emiro Blanco	79800692	Apoyo Inter	
6	Carlos Fernando Serrano	14395777	Inspector	Carlos Serrano
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

CARGO: Profesional SST

Scanned with CamScanner

PROBINTEC S.A.S

NIT: 829.001.061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo **ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANIA 1.096.202.099** y con **tarjeta profesional 207279-T** de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **PROBINTEC S.A.S** con **NIT 829.001.061-1**, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barrancabermeja, luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 10 (diez) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 207279-T
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo, **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.096.244.957** de Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal Principal de **PROBINTEC S.A.S** identificada con **NIT 829.001.061-1,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiera lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 10 (Diez) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

CERTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE VALORES DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA

Que los valores correspondientes al personal ofertado en la propuesta económica para el mes de agosto de 2026 corresponden a los valores efectivamente contratados y reconocidos al personal vinculado para la ejecución del contrato.
Asimismo, se certifica que dichos valores corresponden a los ingresos base y valores reportados en las respectivas planillas de pago de Seguridad Social del personal ofertado y vinculado al contrato, de conformidad con la normatividad aplicable.
La información contenida en la presente certificación corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos contratos laborales, documentos de nómina y planillas de pago de Seguridad Social, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de entidad cuando sea requerido.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VÍNCULO LABORAL
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	$ 9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	$ 6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%	$9,900,000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%	$9,900,000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	$9,900,000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	$9,900,000	Obra Laboral
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	$ 7.000.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%	$ 6.000.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	$ 3.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	$ 2.700.000	Obra Laboral
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	$1.750.905	Obra Laboral

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, la empresa PROBINTEC contó, durante el mes de agosto de 2026, con ocho (8) mujeres vinculadas para el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución del contrato. .
La información relacionada con la vinculación del personal corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos soportes laborales, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad, cuando corresponda.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales y para los fines pertinentes.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

INFORMACION DE PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN SEXO PARA CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								
SUBSECRETARIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL						**FECHA DE REPORTE:**	agosto-26
	Construcción	Transporte y Almacenamiento	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	Actividades Inmobiliarias	Información y Telecomunicaciones	Industria Manufacterara	Comercio y Reparación de Vehículos	Otras ramas económicas
Total mujeres Contratadas	8							
Rango salarial minimo mujeres	1.750.905							
Rango salarial máximo mujeres	9.900.000							
Rango etario minimo mujeres	26							
Rango etario máximo mujeres	52							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) muejeres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) muejeres	190							
Discapacidad mujeres	0							
Pertenencia étnica mujeres	0							
Victimas del conflicto armado mujeres	0							
Mujer Cuidadora	0							
Total Hombres Contratados	**7**							
Rango salarial minimo hombres	1.750.905							
Rango salarial máximo hombres	9.900.000							
Rango etario minimo hombres	28							
Rango etario máximo hombres	63							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) hombres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) hombres	190							
Discapacidad hombres	0							
Pertenencia étnica hombres	0							
Victimas del conflicto armado hombres	0							
Hombre Cuidador	0							

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8155350

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 11
Periodo del informe: 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Elaboró	Aprobó
Christian Felipe Rodríguez	Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez
Profesional Ambiental	**Director de interventoría**
	

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
   - 2.1 OBJETIVO GENERAL 4
   - 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. Localización 5
   - Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas - Sede B 5
   - Institución Educativa Distrital Simón Bolivar – Sede A 5
   - Institución Educativa Distrital Magdalena Ortega – Sede A 6
   - Institución Educativa Distrital Tabora – Sede A 7
   - Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede C 8
4. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTION 9
5. PERSONAL INTERVENTORIA 10
6. RESUMEN DE OBRAS EN FASE DE EJECUCION 11
7. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZAS POR LA INTERVENTORIA 11
8. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZAS POR EL CONTRATISTA (ASPECTOS AMBIENTALES PIGA Y PGRCD) 14
9. PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES 22
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
11. ANEXOS 24

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del contrato de interventoría **No CO1. PCCNTR. 8168931 DE 2025**, PROBINTEC SAS, presenta a la Secretaría de Educación Distrital – SED – el Informe Mensual Ambiental No 11 correspondiente al **Lote 18** para el periodo 03 de agosto al 02 de septiembre del 2026, en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 8155350 de 2025, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO –SED- y el CONSORCIO EDUCATIVO 25, cuyo objeto es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

En el presente documento se relacionan los requisitos cumplidos por parte del contratista y objeto de seguimiento por parte de interventoría para el este periodo frente al componente ambiental. De igual manera se hace una verificación sobre lo estipulado en el PMA correspondiente ya que allí se consigna todas las medidas e indicadores que se deben aplicar en esta fase del contrato.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar información clara y detallada, que permita tener una visión integral de cada una de las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la Gestión Ambiental, durante el desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8155350 de 2025.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar de manera descriptiva el avance en cada una de las actividades de la gestión ambiental realizadas durante el período comprendido del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026.
- Verificar el reporte de avance mensual de la gestión ambiental presentada por el Contratista.
- Verificar el cumplimiento del proyecto en el componente ambiental, entregando el análisis de los aspectos más relevantes del periodo
- Presentar las acciones, recomendaciones y conclusiones de la Interventoría de acuerdo a la gestión ambiental del periodo.

3. Localización

- Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas - Sede B

La IED Rodolfo Llinas – Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CALLE 87 No 102-55 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – Localización IED Distrital Rodolfo Llinas – SEDE B, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Distrital Simón Bolivar – Sede A

La IED Simón Bolívar– Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 92 # 87 A - 60 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 2 – Localización IED Simón Bolivar – Sede A Fuente Google Earth.

- Institución Educativa Distrital Magdalena Ortega – Sede A

La IED Magdalena Ortega – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 69 B # 78 A - 36 en el Noroccidente de la ciudad.

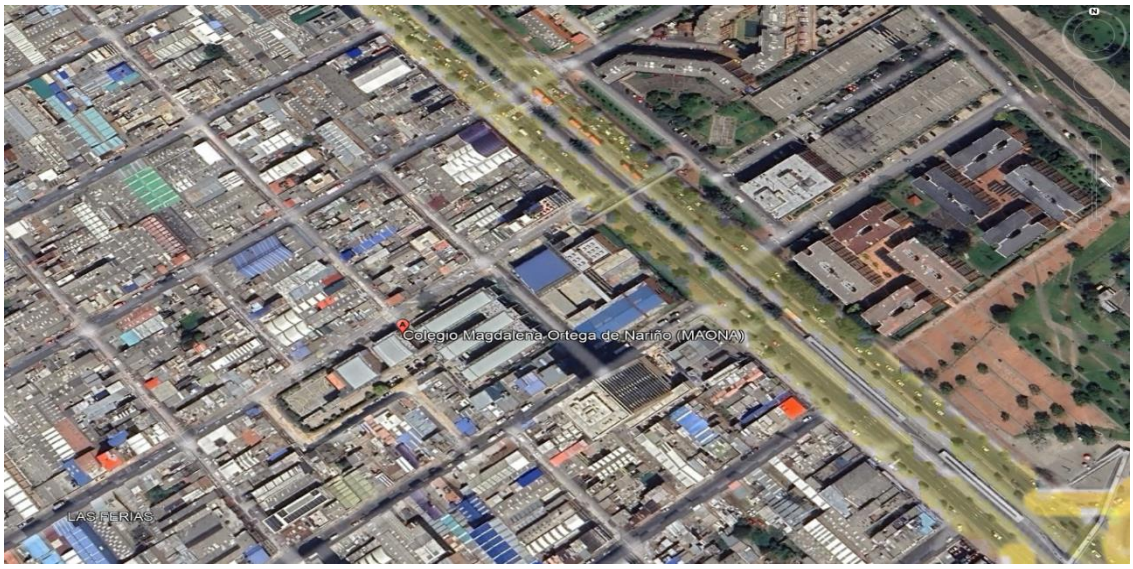


Imagen 3 – Localización IED Magdalena Ortega – Sede A, Fuente Google Earth

- Institución Educativa Jorge Gaitán Cortés – Sede B

La IED Jorge Gaitán Cortés – Sede B La Española, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 84 # 83 - 71 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización Jorge Gaitán Cortés – Sede B, Fuente Google Earth.

- Institución Educativa Distrital Tabora – Sede A

La IED Tabora – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 77 B # 74 A – 02 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 5 – Localización IED Tabora– Sede A, Fuente Google Earth

- Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A

La ITI Francisco José de Caldas – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección Avenida Carrera 63 No 68-82 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede A, Google Earth.

- Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede C

La ITI Francisco José de Caldas – Sede C – Clemencia de Caicedo, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CL 68 A # 68 D - 51 -- KR 60 # 67 - 84 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede C, Google Earth.

4. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTION

CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	$2.551.797.666
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2/05/2026
PRORROGA No.1	04(cuatro) meses
FECHA DE TERMINACION FINAL:	2/09/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

5. PERSONAL INTERVENTORIA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Integración Social.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Yuri Andrea Gamboa Bello	Técnico SST 2	100%
14	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%
15	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%
16	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo interventoría	100%

6. RESUMEN DE OBRAS EN FASE DE EJECUCION

Durante el periodo reportado el contratista realizo actividades en los frentes de obra

IED SIMON BOLIVAR SEDE A

- Instalación de piso
- Pintura de bajantes de las canales
- Estuco y pintura aula múltiple (contingencia)

ITI REPUBLICA DE COLOMBIA

- Armado de muros en mampostería
- Fundida de columnas
- Amarre de hierro y fundida viga corona

7. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZAS POR LA INTERVENTORIA

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

  ✓ Contrato de Obra

  ✓ Apéndice Ambiental

  ✓ Anexo técnico

  ✓ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE

  ✓ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA

  ✓ Revisión del presupuesto

- **Factor de sostenibilidad**

  Programa de capacitaciones

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
$\frac{N°\ de\ personas\ capacitadas}{Total\ personal}\ x100$	$\frac{7}{16}\ x\ 100 = 43,75\%$	Se realizo una capacitación durante el periodo, como anexo se presenta la planilla de capacitación
$\frac{N°\ de\ \ capacitaciones\ realizadas}{N°\ de\ capacitaciones\ programadas}\ x100$	$\frac{1}{1}$ x 100 = 100%	Se realizo una capacitación respecto al orden y aseo

Programa de reciclaje

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
$\frac{Peso\ residuos\ aprovechados}{Peso\ total\ residuos\ generados}\ x100$	$\frac{0,14\ kg}{0,14\ kg} x100 = 100\%$	Se reutilizo el papel que se utilizó para la impresión a doble cara en otros formatos, por lo que se estaría aprovechando el material al igual se comparte la ficha técnica del papel como anexo

Programa de movilidad sostenible

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
Visitas /mes	**14 visitas**	Se ha optimizado las visitas por medio de movilidad sostenible como lo es en bicicleta o caminata entre puntos cercanos, al igual que se ha realizado visitas de manera grupal.
$\frac{Reuniones\ virtuales}{Total\ de\ reuniones\ al\ mes}\ x100$	$\frac{5}{10} x100 = 50\%$	Se ha optimizado por reuniones virtuales en

		este periodo, en temas que no requieren la visita técnica en campo, por lo que presenta porcentaje de 50%

8. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

- Se dio Apertura del PIN Ambiental con el numero 27807 el día 16 de octubre ante la secretaria Distrital de Ambiente (SDA)
- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

✓ Contrato de Obra

✓ Apéndice Ambiental

✓ Anexo técnico

✓ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE

✓ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA y normatividad vigente nacional

CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación ambiental	Estado	Observaciones
1	Cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA	Cumple	Se carga información del mes de agosto, se informa que faltan unos certificados
2	Plan de manejo ambiental (PMA) y plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD)	Cumple	El contratista presento el documento y fue aprobado por esta interventoría mediante oficio

			PROBINTEC-LOTE6-079 y PROBINTEC-LOTE6-092
3	Anexo I-5 Reportes mensuales de la generación y gestión de los RCD	Entregado	Se verifico este anexo durante el cargue del Pin Ambiental
4	Relación transporte de RCD	Entregado	Se relaciono en el informe del contratista, transporte aprobado por interventoría
5	Anexo V. Aprovechamiento IN SITU	Entregado	Se verifico este anexo durante el cargue del Pin Ambiental
6	Anexo VI	Aplica	Durante el periodo no se realizo compra de material de centros de aprovechamiento
7	Anexo X	No aplica	Durante el periodo, No se ha solicitado el cierre del PIN Ambiental
8	Indicador de Aprovechamiento	Aplica	Durante el periodo el contratista dispuso 21 m3 a Cemex, en espera del certificado
9	Indicador de circularidad	Aplica	Anteriormente se ha realizado compra de centro de aprovechamiento GRECO por 242, 20 Toneladas, por lo que la meta de circularidad del 8% se estaría cumpliendo
10	Soportes disposición y transporte RCD	Aplica	El contratista durante el periodo reporto los vales de Cemex
11	Registro de cargue de reportes RESPEL generado en el aplicativo web de la SDA	Aplica	El contratista no genero ni dispuso RESPEL durante el periodo

12	Protocolo manejo de asbesto	Entregado	El contratista anteriormente presento el protocolo de manejo de asbesto (Anexo informe N°2)
13	Inventario de sumideros y forestal	No aplica	Respecto a las visitas no se encuentran sumideros

ASPECTOS AMBIENTALES PIGA Y PGRCD

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante el periodo, el contratista cuenta con el plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) Y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados mediante los oficios PROBINTEC-LOTE6-079 y PROBINTEC-LOTE6-092. El contratista hasta la fecha hizo la entrega del informe ambiental N°11 respecto al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026.

8.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS

El espacio destinado para el campamento ira cambiando de acuerdo con el orden de las intervenciones y el contratista de obra. Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre se encuentran campamentos dentro de las instalaciones de los colegios activos.

8.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran debidamente protegidos y demarcados, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), evitando afectaciones al entorno. La información pertinente a los materiales se encuentra anexo al informe mensual N°11 presentado por el contratista.

MATERIAL	PROVEEDOR	CANTIDAD (m3)
Mixto	Deposito	21
	Total	21

- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, la mezcla de concreto se realiza en batea metálica y/o sobre plástico, evitando el contacto directo con el suelo y previniendo así su contaminación, en concordancia con las buenas prácticas ambientales establecidas.



- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, no se utilizó madera en los frentes de obra

- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, se emplean materiales provenientes exclusivamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y la trazabilidad de los insumos utilizados. La información pertinente a los materiales se encuentra anexo al informe mensual N°11 presentado por el contratista

8.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, el campamento y las zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA)

- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, no se generaron ni dispusieron residuos sólidos convencionales.

8.5. MANEJO DE RCD

- El proyecto Cuenta con el PIN Ambiental numero 27807 para el manejo aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Durante el periodo la información respecto a los RCD de la obra se ha realizado hasta el mes de agosto, se manifiesta que no se ha recibido algunos certificados correspondientes para el mes de agosto, cuando se reciba estos documentos, se hará el cargue respectivo de los certificados.

MES	N° RADICADO
Diciembre	2026ER20057
Enero	2026ER20081
Febrero	2026ER68643
Marzo	2026ER92719
Abril	2026ER119255
Mayo	2026ER127012
Junio	2026ER144120
Julio	2026ER169069
Agosto	2026ER199970

- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) son acopiados y clasificados correctamente al interior de la obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión de RCD (PGRCD)





- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre no se ha realizado reutilización dentro de la obra, se realizó la disposición de 21 m3 a Cemex y Tecno minerales para su debida reutilización o reciclaje, se describe todo el material dispuesto:

PERIODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD (Ton)
AGO	CEMEX	21	30,765
	Total	21	30,765

META DE CIRCULARIDAD - 8%	Anteriormente se ha realizado compra de centro de aprovechamiento GRECO por 242, 20 Toneladas, por lo que la meta de circularidad del 8% se estaría cumpliendo
META DE APROVECHAMIENTO – 50%	Durante el periodo el contratista dispuso 21 m3 a Cemex, en espera del certificado

MES	Aprovechables (Ton)	No aprovechables (Ton)	Excavación (Ton)	RESPEL (Ton)
OCTUBRE	0	0	0	0
NOVIEMBRE	32,52	0	0	0
DICIEMBRE	14,09	0	0	3,64
ENERO	229,66	0	0	6,28
FEBRERO	21,68	10,255	0	3,95
MARZO	19,79	0	0	0,531
ABRIL	10,06	0	8,98	0
MAYO	8,96	0	10,255	4,57
JUNIO	10,836	0	8,98	0
JULIO	10,836	0	474,28	0
TOTAL	358,432	10,255	502,495	18,971

Meta de aprovechamiento:

$$\frac{Cantidad\ de\ RCD\ a\ centros\ de\ aprovechamiento}{Cantidad\ de\ RCD\ generado\ (No\ excavacion)}\ x100$$

$$\frac{358{,}432\ Ton}{387{,}658\ Ton}\ x100 = 92{,}46\%$$

8.6 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, el contratista no genero ni dispuso residuos peligrosos y especiales.

8.7. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, el contratista ingreso varias sustancias químicas, las cuales contaban con su ficha de seguridad y se le hizo seguimiento a que cumplieran con las indicaciones del producto al igual que del Plan de Manejo ambiental aprobado por esta interventoría





8.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, el contratista de obra reporta que los trabajadores cuentan con un baño fijo que le presta cada una de las instituciones, los cuales estén conectados a la red de alcantarillado.

8.9 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, se reporta el cerramiento perimetral adecuado, asimismo se reporta que ingreso volquetas, camiones y maquinaria aprobadas por esta interventoría ya que contaba con la documentación al día, al igual que todas las actividades como limpieza, mantenimiento o reparación de estas, se realizó teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental adecuadas.



8.10 MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, no se evidencian afectación en las zonas verdes ni individuos arbóreos en los frentes.

8.11 MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, el contrato no requiere tramite de valla de obra ni publicidad exterior visual en los frentes de obra

8.12. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, el contratista reporto dos (2) capacitaciones ambientales sobre señalización de áreas y medio ambiente a 4 asistentes en las diferentes instituciones, como anexo a este informe se presenta la planilla de capacitaciones presentada por el contratista

8.13. ORDEN Y ASEO

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre, los frentes de obra se encuentran debidamente demarcados y señalizados. Al igual el contratista en cada frente ha garantizado semanalmente jornadas de orden y aseo.



8.14. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre no se realizaron visitas ni requerimientos por la Autoridad Ambiental

9. CORRESPONDENCIA

A continuación, se resume la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

FECHA DE ENVIO	OFICIO	ENVIADA A	TIPO	OBJETIVO
06/08/2026	PROBINTEC-LOTE6-807	Consorcio Educativo 25	Ambiental	Solicitud informe ambiental mensual N°10
10/08/2026	PROBINTEC-LOTE6-812	Consorcio Educativo 25	Ambiental	Aprobación informe ambiental mensual N°10
12/08//2026	PROBINTEC-LOTE6-827	SED	Ambiental	Radicación Informe ambiental mensual N°10

Como respuesta a los comunicados anteriormente evidenciados, se presentan los siguientes reportes de correspondencia recibida.

FECHA DE ENVIO	OFICIO	ENVIADA POR	TIPO	OBJETIVO
09/08/2026	26-0908-1714	Consorcio Educativo 25	Ambiental	Informe del componente ambiental N°10

10. PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

Concesión de aguas: No se requiere porque el agua será suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o por un tercero, lo cual se verificará en su momento.

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD): Se está en la elaboración del documento, dentro del cual se especificarán los materiales, estimaciones de las cantidades, estimación de costos del manejo de RCD e indicadores y demás información conforme a la Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD establecido por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).

Permiso de valla fija: De conformidad con los documentos contractuales, no se requiere la instalación de la valla ni tramito ante autoridad ambiental.

Permiso de ocupación de cauce: No se requiere porque no se realizará ninguna intervención que requiera un permiso de ocupación de cauce.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza la vinculación del profesional ambiental y SST.
- Se recomienda al contratista reportar los materiales que ingresan de centro de aprovechamiento y la disposición de los RCD para mantener actualizada la información respecto al cargue mensual al PIN Ambiental
- Se recomienda implementar en el plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) Y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) actividades y/o programas que garanticen el uso adecuado de manejo de residuos, control de emisiones de polvo y ruido, protección de fuentes hídricas, manejo responsable de materiales peligrosos y conservación de las áreas intervenidas, implementando capacitaciones y inspecciones periódicas que permita prevenir impactos dentro del proyecto

- El contratista realizo la entrega del informe N°11 hasta la fecha de este informe

12. ANEXOS

- Lista de chequeo Interventoría Lote 18
- Cronograma de Capacitaciones Probintec S.A.S
- Planilla de capacitación Probintec S.A.S
- Ficha técnica Papel
- Vales RCD
- Aprovechamiento IN SITU
- Planilla de Capacitaciones Consorcio Educativo 25
- Oficio PROBINTEC-LOTE6-807 Solicitud informe ambiental mensual N°10
- Oficio PROBINTEC-LOTE6-812 Aprobación informe ambiental mensual N°10
- Oficio PROBINTEC-LOTE6-827 Radicación Informe ambiental mensual N°10
- Cargue Julio 2026
- Certificación no intervención zonas verdes

Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.						
Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO 25		**Interventoría:**		PROBINTEC S.A.S		
Contrato:	CO1.PCCNTR.8155350		**Contrato:**		CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	11		**Periodo:**		03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME AMBIENTAL							
REQUERIMIENTO AMBIENTAL	**ÍTEM**	**PARÁMETRO A EVALUAR**	**CUMPLE 100%**	**NO CUMPLE 0%**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS Y SOPORTES**
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto.	X			El contratista realizo la entrega del informe ambiental mensual N°11 y fue aprobado por esta interventoria	*Aprobación de la interventoría del informe mensual de gestión ambiental del contratista de obra*
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			Se encuentra documentacion actualizada en el campamento de obra	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.			X	No se han requerido permisos y licencias ambientales para el contrato	*Lista de chequeo de cada una de las obligaciones y disposiciones de los actos administrativos emitidos para el proyecto y relación de la respectiva evidencia aceptada por la Interventoría*
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoría"	X			Se presenta informe mensual de gestion ambiental bajo estructura y lineamientos de la SED	*El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo*
	1.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los materiales de construccion se encuentran acopiados y protegidos en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X			Las mezclas de concreto se realizan generalmente en una batea metalica	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones.			X	No se ha utilizado madera en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X			Las zonas verdes se encuentran libres de material o residuos	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.5.	Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos.	X			En el PMA presentado por el contratista se presenta los proveedores y antes de entrar, se aprueban por interventoria	*La interventoría verifica la legalidad de los proveedores utilizados*
	2.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos al igual se realiza la debida separacion y recoleccion de los residuos solidos convencionales	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X			En el PMA Y PGRCD presentado por el contratista se verifico los gestores para realizar la disposicion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA.	X			Se realiza la apertura del Pin Ambiental con numero 27807 y se mantiene informacion actualizada hasta el mes de agosto, se realiza el cargue mes vencido por los certificados	*Revisión y aprobación de la documentación cargada al aplicativo web de la SDA del PIN del proyecto*
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X			En los frentes de obra se encuentran acopiados y clasificados RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X			En los frentes de obra se encuentran protegidos y demarcados los RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.4.	Se realiza reutilización temporal o permantente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente.			X	No se han reutilzado los RCD generados en este periodo	*Información diligenciada y registro fotográfico reportado en el Anexo 3 del PIN.*
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.	X			Se ha realizado la respectiva disposicion al gestor durante el periodo	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.	X			Se realizo la disposicion de material RCD, las volquetas no excedian la capacidad	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del archivo CSV mensual de registro de viajes de volquetas del PIN cargado al aplicativo web de la SDA. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.7.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Las cantidades generadas y los certificados de disposición se incluyeron correctamente en el reporte mensual de RCD del PIN ambiental y están disponibles en el aplicativo web de la SDA*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			Las sustancias quimicas cuentan con la ficha de seguridad y se garantizo la manipulacion adecuada	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del seguimiento al inventario de sustancias químicas. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

QUÍMICOS	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.		X		No cuentan con kit de derrames en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	6.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Garantizar que el documento permanezca en la obra y que el Contratista reporte su seguimiento en todos los informes mensuales*
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Lista de chequeo y registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría del estado de cada uno de los sumideros inventariados. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.	X			Se garantizo el manejo adecuado de las aguas residuales dometicas generadas	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría y verificación de la documentación presentada por el Contratista. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.	X			Se garantizo el tratamiento de agua	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.	X			No se realizan actividades de obra que alteren las coindiciones de las fuentes hidricas	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.	X			Los acopios de materiales estan alejados de sumideros y cuerpos de agua	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.	X			No se encuentran granulares finos al igual todo material se encuentra acopiado	*Cuando aplique*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X			En todos los frentes de obra cuentan con cerramiento perimetral	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.3.	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión.	X			Se acopian adecuadamente los materiales y RCD en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte).			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.	X			Despues del ingreso de las volquetas, se realizo limpieza de las vias de acceso para evitar la dispersion de material particulado	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.	X			Se conto con la limpieza adecuada de las llantas de las volquetas antes de salir del frente de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.	X			Previo al ingreso de los vehiculos y maquinaria deben ser aprobados por interventoria	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacía la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.	X			Las volquetas contaban con el cubrimiento total y adecuado de la carga	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.10.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal).			X	No se ha requerido esta actividad ya que no cuenta con individuos arboreos en el frente	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X	No se han presentado ni requerido programacion para tratamientos de vegetacion	*Programación de tratamientos silviculturales*
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de avifauna*
	9.4.	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.5.	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Fichas de registro y seguimiento de árboles trasladado. Plano de localización georeferenciada*
	9.6.	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de manejo de zonas verdes*
	9.7.	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Relación de volúmenes generados y dispuestos. Certificación de disposición final de residuos vegetales*
	9.8.	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Consolidado de especies plantadas vs especies propuestas*

	9.9.	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra ya que no se encuentran individuos arboreos	*Consolidado de especies plantadas vs especies propuesta. Actas de reunión con JBB para asignación de sitios de plantación y aprobación del diseño. Acta JBB asignación códigos SIGAU. Plano de localización georeferenciada de los árboles*
	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Fichas de seguimietno de árboles trasladados*
	9.11.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	El contratista radica en interventoría la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días depués de firmada el acta de inicio			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.2	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría.*
	10.3	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado			X	No se requiere para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.4	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente			X	No se requiere para el contrato	*Montaje del aviso*
	10.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.	X			el contratista reporto dos capacitaciones ambientales sobre señalización de áreas y medio ambiente a 4 asistentes en las diferentes instituciones	*Seguimiento de la ejecución de las capacitaciones programadas por el Contratista, acompañada de registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Lista de chequeo de asistentes vs el personal convocado por cada mes.*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.	X			Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			Todos los frentes de obra cuentan con un campamento adecuado	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
	13.1.	La Interventoría realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Relación de observaciones realizadas por la SED y su correspondiente respuesta y subsanación, acompañada de la gestión realizada por la Interventoría.*

13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría.			X	No se han realizado visitas de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Relación y respuesta a las visitas realizadas por la SDA. Se entrega toda la documentación relacionada y aprobada por la Interventoría.*
	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X	No se han realizado visitas de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	13.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ:

NOMBRE: Christian Felipe Rodriguez
CARGO: Especialista ambiental
EMPRESA: Probintec S.A.S
FECHA: 10 de septiembre

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA:

PLAN/ PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	ACCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11			
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
INDUCCION	1	Inducción al Personal nuevo. Generalidades del PAI componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					E					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FORMACION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION INTERVENTORIA	2	Problemática ambiental/ disposicion y getion de residuos solidos	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P						X																																		
					E						X																																			
	3	Programa de transporte sostenible	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P									X																									X								
					E									X																									X								
	4	Manejo de cerramiento de los frentes	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P													X																													
					E													X																													
	5	Posconsumo	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P																	X																									
					E																	X																									
	6	Manejo de materiales de construcción	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P																					X																					
					E																					X																					
	7	Orden y aseo	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P											X																													X		
					E											X																													X		
	8	Uso eficiente de ahorro de agua y energia	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P															X																									X		
					E															X																									X		
	9	Conocimiento y manejo de sustancias químicas y hojas de seguridad	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P																			X																							
					E																			X																							
	10	Actualización Requisitos legales ambientales.	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P																							X																		
					E																							X																		
	11	Manejo de residuos peligrosos	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P																									X																
					E																									X																
	12	Protocolo manejo de asbesto	Especialista ambiental interventoria	Personal de CTO CO1.PCCNTR.816833 (INT)	P																											X														
					E																											X														

PROGRAMADO	
EJECUTADO	
INCUMPLIMIENTO	
REPROGRAMADO	

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3
	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3
	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 12/10/2025

FECHA: 18-agosto-2026

LUGAR: Virtual

Capacitación ☐ Charla ☒ Reunión Gerencial ☐

Inducción ☐ Otra/Cual: _____

HORA INICIO: 11:10 am HORA FIN: 11:50 am

TEMA: orden y aseo

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Control y supervision orientada a garantizar que las actividades se ejecuten en entornos limpios, organizados y seguros

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angie Paola Toro	1128627947	Técnico SST	
2	Katherine Nuñez	1056 95 99	profesional SST	
3	Carlos serrano	14795779	inspector	Carlos Serrano
4	Diasmery garcia	5309602	inspector	
5	Luis Blanco	79800592	Apoyo IDT	
6	Natalia Mora	1073146477	Residente	
7	Lorena Rodriguez	1099628517	Director IDT	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____


CARGO: Especialista ambiental

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m²	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES

- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m²	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES

- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 20.08.2026 07:58:41
FOLIO: 506266416
PEDIDO: 506266415

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN CONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

RCD
CEMEX
20 AGO 2026
Espacio para Sello
DESPACHADO

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones
Espacio para Observaciones
VAC 129

CLIENTE
Usuario :Yeimy Lorena Perez Ga
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

Scanned with CamScanner

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATER

FECHA Y HORA 31.08.2026 10:01
FOLIO: 506355141
PEDIDO: 506355140

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN CONCRETOSENCILLO
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

CEMEX
RCD
Espacio para Sello
31 AGO 2026
DESPACHADO

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones fl 65028
Espacio para Observaciones

CLIENTE
Usuario :Camilo Alfonso Sanchez Altamar
ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATER

CEMEX 29 AGO 2026 DESPACHADO RCD

FECHA Y HORA 29.08.2026 09:38

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO
FOLIO: 506348337
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
PEDIDO: 506348336
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

Espacio para Sello

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:

CLIENTE

Observaciones

Espacio para Observaciones

Usuario :EDIN DAVIDI ORTIZ ANGULO

ORIGINAL

H6J028

Este documento presta merito ejecutivo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	**ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU**

Mes del Aprovechamiento: 01 al 31 de AGOSTO el 2026	
Nombre del Proyecto:	MANTENIMIENTO LOCATIVO SED
PIN-GEN:	27807

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción: NA

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCDs (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

NA

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

NA

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

NA

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU
5. Registro fotográfico durante la reutilización: NA
6. Descripción: NA
6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización: NA
Información de la Reutilización
7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento: 5,8 (Ton)
7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): NA
8. Volumen total reutilizado: NA
9. Duración del proceso: NA
10. Área final recuperada: NA
11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: Se reporta ingreso de subbase reciclada proveniente de CTA certificado.
12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización: Durante el periodo del presente informe no se ejecutaron actividades de aprovechamiento en obra dado a que, el material no cumple con las características para ser aprovechado, por lo tanto se remite a planta de aprovechamiento y/o disposición final.

Firma del Representante Legal o Director de obra : DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO

CONSORCIO EDUCATIVO 25
901.073.696-9

CERTIFICADODENOAPROVECHAMIENTO DE RCD

La empresa CONSORCIO EDUCATIVO 25 identificado con numero de NIT 901.073696-9 en calidad de contratista del contrato de obra No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, cuyo objeto es "*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS*"; certifica que en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de AGOSTO del 2026, no se realizaron actividades de aprovechamiento de RCD dado a que los residuos generados no cuentan con las características técnicas para ser utilizados en obra, razón por la cual, fueron llevados a planta de aprovechamiento y sitio de disposición final respectivamente.

El presente certificado se expide a los 10 días del mes de septiembre del 2026 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,



Dayanna Alejandra Baquero

Representante legal

CONSORCIO EDUCATIVO 25	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FTGHU-006
		VER. 1
	LISTA DE ASISTENCIA	28-28-2025

LUGAR / PROYECTO:	Republica de Colombia.	FECHA:	6-8-26.
INSTRUCTOR:	Viviana Longas.	HORA:	

TEMA	TIPO DE ACTIVIDAD
Señalizacion de Areas.	Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	angelica Tatiana Bocanegra	1023893638	OFU	
2	Yoran Camilo malamba	1013001920	OP	Camilo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones:

Instructor:

Firma: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO 21	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FTGHU-006
		VER. 1
	LISTA DE ASISTENCIA	28-28-2025

LUGAR / PROYECTO:	Republica de Colombia.	FECHA:	7-8-26.
INSTRUCTOR:	Viviana Arenas.	HORA:	

TEMA	TIPO DE ACTIVIDAD
Contaminacion del Aire.	Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Angelica Tatiana Bocanegra	1023895638	OFI	
2	Yesan Camila malamba	1013001920	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones:

Instructor:

Firma: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO 23	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FTGHU-006
		VER. 1
	LISTA DE ASISTENCIA	28-28-2025

LUGAR / PROYECTO:	República de Colombia.	FECHA:	21-8-26.
INSTRUCTOR:	Diana Lenguas.	HORA:	

TEMA	TIPO DE ACTIVIDAD
Demolicion con maquinaria.	Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	angelica Ineana Becerra	1023893638	OFV	
2	Yesan camila malambo	1013601920	OF	Camila
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones:

Instructor:

Firma: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FTGHU-006
		VER. 1
	LISTA DE ASISTENCIA	28-28-2025

LUGAR / PROYECTO:	República de Colombia.	FECHA:	27-8-26.
INSTRUCTOR:	Viviana Luengas.	HORA:	

TEMA	TIPO DE ACTIVIDAD
Contaminacion Ambiental.	Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	angelica Ioana Bocanegra	1023093638	SSV	
2	Yoxon camila malamba	1013601020	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones:

Instructor:

Firma: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FTGHU-006
		VER. 1
	LISTA DE ASISTENCIA	28-28-2025

LUGAR / PROYECTO:	Simon Bolivar.	FECHA:	5-8-2026
INSTRUCTOR:	Wilson Lerenco	HORA:	

TEMA	TIPO DE ACTIVIDAD
Medio Ambiente.	Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Jose L Sarmiento	93123010	OPX	
2	Wilson Mesa	1023893655	Tec.	Wilson M.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones:

Instructor:

Firma: _____

Powered by CamScanner

PROBINTEC S.A.S

NIT: 829001061-1

PROBINTEC-LOTE6-807

Bogotá, 06 de agosto de 2026

Señores:
CONSORCIO EDUCATIVO 25
Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 18".*

Asunto: Solicitud Informe mensual ambiental N°10

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia, se evidencia que a la fecha no se ha recibido la entrega del informe ambiental mensual N°10, incumpliendo lo establecido en el cronograma de entregables y en las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión ambiental del proyecto.

La falta de presentación oportuna de estos informes afecta el proceso de verificación técnica, el seguimiento a medidas de mitigación y la trazabilidad institucional ante los entes de control. En consecuencia, se requiere:

1. **Remitir en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles** los informes ambientales pendientes, debidamente estructurados con soporte fotográfico técnico y documental.
2. **Asegurar la entrega periódica** de los informes ambientales subsiguientes.

Agradezco su atención y quedamos atentos a la pronta remisión de lo requerido.

Sin otro particular, cordialmente,

Christian Felipe Rodríguez
Especialista ambiental
PROBINTEC S.A.S - NIT 829.001.061-1

Barrancabermeja
numero de contacto: 3161147965
Correo electrónico: probintecsas@gmail.com

PROBINTEC-LOTE6-812

Bogotá, 10 de agosto de 2026

Señores:
CONSORCIO EDUCATIVO 25
Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 18".*

Asunto: Aprobación Informe ambiental mensual N°10

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia, nos permitimos informar que una vez revisado el documento de Informe ambiental mensual N°10, recibido el día 09 de agosto en medio digital con el oficio 26-0908-1714, titulado "*Informe mensual ambiental No.10"*. Se da aprobación a este, ya que cuenta con la información solicitada por esta interventoría, las cuales se recuerda tener en cuenta para próximos informes, además se reiteran las siguientes:

- Verificar el informe y la totalidad de los anexos antes de ser enviado a la interventoría.
- Todos los anexos deben estar respectivamente firmados si aplica.
- Se radique en los tiempos establecidos.
- Se recuerda que todo documento remitido a la interventoría debe venir con su oficio.
- El informe debe estar estructurado bajo la lista de chequeo presentada por la SDE.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto.

Atentamente,

Christian Felipe Rodríguez
Especialista ambiental
PROBINTEC S.A.S - NIT 829.001.061-1

PROBINTEC-LOTE6-827

Bogotá, 12 de agosto de 2026

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
HERNAN LOPEZ
Supervisor SED
Bogotá D.C

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 18".*

Asunto: Radicación Informe ambiental mensual N°10

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia, nos permitimos radicar el informe ambiental N°10 correspondiente al periodo del 03 de julio al 02 de agosto de 2026 del contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 – Lote 18, previamente revisados y aprobados por esta interventoría mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-812.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y que sean requeridas por la Secretaría de Educación Distrital (SED).

Cordialmente,

Christian Felipe Rodríguez
Especialista ambiental
PROBINTEC S.A.S - NIT 829.001.061-1

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2026ER199970
Fecha inicio	2026-09-09 13:53:15
Fecha fin	2026-09-10 09:05:01
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

CERTIFICACION NO INTERVENCION ZONAS VERDES

Contrato No. CO1.PCCNTR.8168931

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control establecidas en el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8168931 y dándole seguimiento al contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8155350 a cargo del CONSORCIO EDUCATIVO 25 , cuyo objeto es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*** Se deja constancia de lo siguiente:

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre, no se realizó intervención en las zonas verdes de las instituciones, se evidencia en iguales condiciones a las iniciales.



ING CHRISTIAN RODRIGUEZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL
PROBINTEC SAS
NIT – 829001061-1
