CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	VALOR COSTO DIRECTO DE OBRA CIVIL				**$ 3,917,361,867.69**		**$ 1,369,793,460.31**		**$ 1,361,699,340.85**				**$ 2,555,662,526.85**
	ADMINISTRACIÓN	%	29.00%		$ 1,136,034,923.35		$ 397,240,103.49		$ 394,892,808.85				$ 741,142,114.50
	IMPREVISTOS	%	1%		$ 39,173,618.05		$ 13,697,934.60		$ 13,616,993.41				$ 25,556,624.64
	UTILIDADES	%	4%		$ 156,694,472.19		$ 54,791,738.41		$ 54,467,973.63				$ 102,226,498.56
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 1,331,903,013.59**		**$ 465,729,776.51**		**$ 462,977,775.89**				**$ 868,925,237.70**
	TOTAL OBRA CIVIL				**$ 5,249,264,881.28**		**$ 1,835,523,236.82**		**$ 1,824,677,116.74**				**$ 3,424,587,764.55**
16.00	**TRAMITES DE LEGALIZACIÓN RED ELÉCTRICA**				**$ 39,368,450.86**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 39,368,450.86**
16.01	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE	UN	1.00	$ 6,967,961.14	$ 6,967,961.14	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 6,967,961.14
16.02	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	1.00	$ 7,711,492.01	$ 7,711,492.01	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 7,711,492.01
16.03	REVISION Y APROBACIÓN DE DISEÑOS ELECTRICOS (TARIFA TRANSFORMADOR HASTA 112,5 KVA URBANO - VIGENCIA AÑO 2023 EMSA)	UN	1.00	$ 661,145.87	$ 661,145.87	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 661,145.87
16.04	PRUEBAS VLF CABLE RED DE MEDIA TENSIÓN	UN	1.00	$ 3,980,000.00	$ 3,980,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 3,980,000.00
I.C. 16.05	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS	UN	56.00	$ 54,425.66	$ 3,047,836.96	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	56.00	$ 3,047,836.96
I.C. 16.06	INSPECCION Y CERTIFICACIÓN RETIE SISTEMA FOTOVOLTAICO	UN	1.00	$ 9,500,000.00	$ 9,500,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 9,500,000.00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 16.07	TRAMITES DE CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN OPERADOR DE RED PARA RED ELECTRICA Y SISTEMA FOTOVOLTAICO	UN	1.00	$ 7,500,014.88	$ 7,500,014.88	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 7,500,014.88
17.00	**SUMINISTROS**				**$ 83,179,399.80**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 83,179,399.80**
I.C. 17.01	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR	UN	20.00	$ 2,075,880.00	$ 41,517,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	20.00	$ 41,517,600.00
I.C. 17.02	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 18000 BTU UNIDAD INTERIOR/EXTERIOR, INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 6,969,000.00	$ 6,969,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 6,969,000.00
I.C. 17.03	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 24000 BTU UNIDAD INTERIOR/EXTERIOR, INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 7,209,000.00	$ 14,418,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 14,418,000.00
I.C. 17.04	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU UNIDAD INTERIOR/EXTERIOR,	UN	2.00	$ 9,039,000.00	$ 18,078,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 18,078,000.00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS												
I.C. 17.05	SUMINISTRO DE CORTINA DE AIRE PARA ACCESO PRINCIPAL	UN	2.00	$ 1,098,399.90	$ 2,196,799.80	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2,196,799.80
	SUMINISTROS				**$ 83,179,399.80**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 83,179,399.80**
	ADMINISTRACIÓN		29.00%		$ 24,122,025.94		$ 0.00		$ 0.00				$ 24,122,025.94
	TOTAL SUMINISTROS				**$ 107,301,425.74**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 107,301,425.74**
	TOTAL OBRA CIVIL				**$ 5,249,264,881.28**		**$ 1,835,523,236.82**		**$ 1,824,677,116.74**				**$ 3,424,587,764.55**
	TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN RED ELÉCTRICA				**$ 39,368,450.86**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 39,368,450.86**
	TOTAL SUMINISTROS				**$ 107,301,425.74**		**$ 0.00**		**$ 0.00**				**$ 107,301,425.74**
	VALOR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				**$ 84,806,736.00**		**$ 79,945,080.00**		**$ 75,501,936.00**				**$ 9,304,800.00**
	VALOR PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				**$ 31,478,020.20**		**$ 24,066,901.70**		**$ 19,855,262.70**				**$ 11,622,757.50**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 5,512,219,514.09**		**$ 1,939,535,218.52**		**$ 1,920,034,315.44**				**$ 3,592,185,198.65**

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

13. RELACIÓN DE LABORATORIOS

Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026, la Interventoría realizó el seguimiento y verificación de las actividades de control de calidad adelantadas por el Contratista, con el fin de constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales y procesos constructivos ejecutados. La Interventoría verificó los ensayos de laboratorio efectuados, los cuales permitieron validar las características de los concretos, materiales granulares y demás elementos incorporados a la obra, constatando que las actividades ejecutadas cumplieran con los requisitos establecidos en los diseños, las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad aplicable. Se precisa que, en el marco del Plan de Contingencia formulado en virtud de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, las actividades de vigas aéreas, columnas y placa de contrapiso de la planta mayor correspondiente a la sección de mayor área de la edificación fueron ejecutadas con concreto premezclado y acelerado a 3 días de resistencia, con el fin de garantizar un mayor rendimiento en la ejecución de dichas actividades, razón por la cual los ensayos de laboratorio correspondientes fueron tomados y verificados por esta Interventoría conforme a dicha condición. Los resultados obtenidos, así como los certificados de materiales correspondientes, fueron revisados y avalados por la Interventoría, y se anexan al presente informe.

CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS TOMADOS POR LA INTERVENTORIA VS OBRA

DATOS GENERALES			RESULTADOS DE ENSAYOS - OBRA			RESULTADOS DE ENSAYOS - INTERVENTORIA			DIFERENCIA POCENTUAL	CONCEPTO
FECHA	ESTRUCTURA	RESISTENCIA DE DISEÑO	RESULTADOS DE RESISTENCIAS (P.S.I)			RESULTADOS DE RESISTENCIAS (P.S.I)				
			7 dias	14 dias	28 dias	7 dias	14 dias	28 dias		
6/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2173.19	2517.69	3073.28	2314.40	2538.50	3063.00	0.334%	CUMPLE
8/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2209.61	2607.12	3160.43	2266.30	2732.60	3162.60	0.069%	CUMPLE
10/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2211.31	2519.3	3135.06	221.60	2580.10	3213.10	2.429%	CUMPLE
6/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2138.86	2428.62	3150.95	2007.70	2416.10	3192.40	1.298%	CUMPLE
8/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2196.74	2485.77	3032.35	2184.30	2573.00	3034.80	0.081%	CUMPLE
10/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2104.3	2483.1	3117.16	2129.00	2141.00	3157.80	1.287%	CUMPLE
13/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2133.62	2619.69	3044.47	2061.20	2537.30	3072.20	0.903%	CUMPLE
14/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2197.94	2624.38	3082.55	2025.60	2499.90	3057.70	0.806%	CUMPLE
15/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000 PSI	2179.72	2478.99	3228.62	2107.60	2521.30	3295.50	2.029%	CUMPLE
10/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000	3000 PSI	2221.38	2464.48	3240.05	2212.80	2671.40	3252.30	0.377%	CUMPLE

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS TOMADOS POR LA INTERVENTORIA VS OBRA

DATOS GENERALES			RESULTADOS DE ENSAYOS - OBRA			RESULTADOS DE ENSAYOS - INTERVENTORIA			DIFERENCIA POCENTUAL	CONCEPTO
FECHA	ESTRUCTURA	RESISTENCIA A DE DISEÑO	RESULTADOS DE RESISTENCIAS (P.S.I)			RESULTADOS DE RESISTENCIAS (P.S.I)				
			7 dias	14 dias	28 dias	7 dias	14 dias	28 dias		
	PSI PARA PEDESTALES DE CIMENTACION									
14/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES DE CIMENTACION	3000 PSI	2096.04	2499.23	3034.78	2161.10	2557.70	3148.70	3.618%	CUMPLE
15/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES DE CIMENTACION	3000 PSI	2113.7	2533.54	3021.97	2061.20	2548.00	3132.90	3.541%	CUMPLE
16/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES DE CIMENTACION	3000 PSI	2296.06	2613.05	3100.76	2186.00	2627.70	3218.60	3.661%	CUMPLE
20/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	3000 PSI	2175.78	2391.96	3086.01	2145.00	2544.40	3099.00	0.419%	CUMPLE
22/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	3000 PSI	2262.36	2608.63	3272.94	2219.90	2642.50	3082.20	5.828%	CUMPLE
24/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	3000 PSI	2232.40	2625.62	3156.97	2164.70	2501.70	3082.90	2.346%	CUMPLE
27/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	3000 PSI	2121.82	2519.00	3135.06	2234.20	2622.90	3091.00	1.405%	CUMPLE
29/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	3000 PSI	2184.26	2663.70	3089.47	2078.70	2456.30	3047.30	1.365%	CUMPLE
30/04/2026	RESISTENCIA A COMPRESION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	3000 PSI	2105.93	2597.93	3104.32	2306.60	2704.60	3297.30	7.135%	CUMPLE
06/08/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000	2201.08	2578.19	3090.10	2038.50	2417.80	3090.10	0.00%	CUMPLE
08/08/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000	2163.77	2604.89	3072.20	2125.90	2471.30	3054.40	0.59%	CUMPLE
11/08/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000	2156.40	2608.99	3068.20	2230.80	2576.50	3024.90	1.44%	CUMPLE
12/08/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000	2118.12	2551.89	3054.40	2125.90	2471.30	3054.40	0.00%	CUMPLE

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS TOMADOS POR LA INTERVENTORIA VS OBRA										
DATOS GENERALES			RESULTADOS DE ENSAYOS - OBRA			RESULTADOS DE ENSAYOS - INTERVENTORIA			DIFERENCIA POCENTUAL	CONCEPTO
FECHA	ESTRUCTURA	RESISTENCIA DE DISEÑO	RESULTADOS DE RESISTENCIAS (P.S.I)			RESULTADOS DE RESISTENCIAS (P.S.I)				
			7 dias	14 dias	28 dias	7 dias	14 dias	28 dias		
13/08/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	3000	2094.63	2531.18	3012.30	2038.50	2417.80	3090.10	2.59%	CUMPLE
13/08/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTALES	3000	2135.11	—	—	2198.50	2489.20	—	2.11%	CUMPLE
14/08/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	3000	2240.25	2638.94	3012.30	2139.90	2458.10	3012.30	0.00%	CUMPLE
19/08/2026	RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO	3000	2167.90	2466.80	—	2198.50	2489.20	—	0.75%	CUMPLE

14. PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

La Interventoría realizó la verificación de la vinculación, permanencia y disponibilidad del personal administrativo, profesional, técnico y operativo exigido contractualmente para la ejecución del proyecto, constatando su participación efectiva en las actividades desarrolladas durante el período objeto de cobro. Así mismo, se revisó la documentación laboral correspondiente, incluyendo afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, encontrando cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte de la Unión Temporal. De igual manera, se verificó la existencia de los respectivos paz y salvos, soportes de pago y documentación asociada al personal retirado durante el período de ejecución, evidenciando que los procesos de desvinculación se realizaron conforme a la normatividad laboral vigente y sin generar observaciones que afecten el trámite de pago de la presente acta parcial.

FEBRERO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168016991	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168016991	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168016991	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168016991	PORVENIR	SANITAS	SURA
MARIA FERNANDA PULIDO RODRÍGUEZ	1.049.653.548	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168016991	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168016991	PORVENIR	SANITAS	SURA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168016991	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168016991	PORVENIR	SANITAS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168016991	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168016991	PORVENIR	CAJACOPI	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168016991	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA

MARZO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168381746	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168381746	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168381746	PORVENIR	SANITAS	SURA
MARIA FERNANDA PULIDO RODRÍGUEZ	1.049.653.548	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168381746	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168381746	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168381746	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168381746	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168381746	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168381746	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA

ABRIL

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168896592	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168896592	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168896592	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	FAMISANAR	SURA

MAYO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168986796	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168986796	COLPENSIONES	SANITAS	SURA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168986796	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168986796	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168986796	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168986796	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168986796	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168986796	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PROTECCIÓN	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PROTECCIÓN	FAMISANAR	SURA

JUNIO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5169061125	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5169061125	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5169061125	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	5169061125	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5169061125	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	5169061125	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	PROTEGER	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5169061125	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5169061125	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5169061125	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PROTECCION	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PROTECCION	FAMISANAR	SURA
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	5169061125	PORVENIR	FAMISANAR	SURA

JULIO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	1751659971	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1751659971	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	1751659971	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	1751659971	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1751659971	PORVENIR	SANITAS	SURA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	1751659971	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	1751659971	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PORVENIR	PROTEGER	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1751659971	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1751659971	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1751659971	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PROTECCION	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PROTECCION	FAMISANAR	SURA
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1751659971	PORVENIR	FAMISANAR	SURA

AGOSTO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5169240119	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5169240119	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5169240119	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	5169240119	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	5169240119	PORVENIR	FAMISANAR	SURA

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5169240119	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5169240119	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.208	OFICIAL DE OBRA	5169240119	COLFONDOS	COOSALUD	SURA
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	CONTROLADOR VIAL	5169240119	COLPENSIONES	CAPITAL SALUD	SURA
JORGE VERGARA	1.010.026.192	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.565.981	OFICIAL DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.811	ING. DE APOYO TECNICO	5169240119	PORVENIR	COOSALUD	SURA
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	86.060.299	ING. DE APOYO TECNICO	5169240119	PORVENIR	SANITAS	SURA
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88.249.434	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	SAVIA SALUD	SURA
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
PABLO REYES CHIPIAJE	PPP 5140206	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1.070.597.147	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	SANITAS	SURA
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1.124.818.451	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA

SEPTIEMBRE

Para el mes de septiembre, en cuanto al personal vinculado, se relaciona el correspondiente al corte del 15 de septiembre de 2026.

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5169288812	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5169288812	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5169288812	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	5169288812	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5169288812	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	5169288812	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5169288812	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5169288812	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.208	OFICIAL DE OBRA	5169288812	COLFONDOS	COOSALUD	SURA
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	CONTROLADOR VIAL	5169288812	COLPENSIONES	CAPITAL SALUD	SURA
JORGE VERGARA	1.010.026.192	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.565.981	OFICIAL DE OBRA	5169288812	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.811	ING. DE APOYO TECNICO	5169288812	PORVENIR	COOSALUD	SURA
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88.249.434	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	SAVIA SALUD	SURA
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

15. INGRESOS Y RETIROS DE PERSONAL DE OBRA.

A continuación, la Interventoría relaciona los respectivos ingresos y retiros del personal de obra verificados durante el periodo reportado:

FEBRERO

DATOS BÁSICOS										NOVEDADES			
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	COL.	EXT.	LIQ SOLO FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO									APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1006783220	DEPENDIENTE	MORA GARZÓN CRISTIAN ALEXANDER				SI	$1,750,905	FIJO	X	17		
CC	1049653548	DEPENDIENTE	PULIDO RODRÍGUEZ MARÍA FERNANDA				SI	$1,750,905	FIJO	X	1		
CC	1121829244	DEPENDIENTE	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER				SI	$1,750,905	FIJO	X	16		
CC	1121946586	DEPENDIENTE	PÁEZ MONTERO DIEGO LEONARDO				SI	$1,750,905	FIJO	X	1		
CC	1124818810	DEPENDIENTE	AYALA ROJAS DANIEL ANDRÉS				SI	$1,750,905	FIJO	X	27		
CC	1124818911	DEPENDIENTE	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL				SI	$1,750,905	FIJO	X	19		
CC	1124991535	DEPENDIENTE	PÉREZ CARIBAN WALFRAN				SI	$1,750,905	FIJO	X	19		
CC	3215459	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO				SI	$1,750,905	FIJO	X	27		
CC	40186168	DEPENDIENTE	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA				SI	$1,750,905	FIJO	X	16		
CC	52481418	DEPENDIENTE	MARTÍNEZ MOLINA DENISE ROCIÓ				SI	$2,000,000	FIJO	X	16		
CC	86062096	DEPENDIENTE	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO				SI	$2,000,000	FIJO	X	16		

MARZO

DATOS BÁSICOS										NOVEDADES			
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	COL.	EXT.	LIQ SOLO FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO									APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1006691448	DEPENDIENTE	RODRÍGUEZ VEGA CAMILO ANDRÉS				SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	1006776906	DEPENDIENTE	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO				SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	1049653548	DEPENDIENTE	PULIDO RODRÍGUEZ MARIA FERNANDA				SI	$1.750.905	FIJO			X	31
CC	7248128	DEPENDIENTE	SÁNCHEZ USECHE JOSÉ				SI	$2.500.000	FIJO	X	10		
CC	74325151	DEPENDIENTE	HERNÁNDEZ CALDERÓN JABIER DARÍO				SI	$1.750.905	FIJO	X	9		
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM				SI	$1.750.905	FIJO	X	16		

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ABRIL

DATOS BÁSICOS										NOVEDADES			
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	COL.	EXT.	LIQ SOLO FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO									APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1052413449	DEPENDIENTE	JAIMES CAAMANO DANY FABIAN				SI	$1.750.905	FIJO	X	7		
CC	1134450031	DEPENDIENTE	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN				SI	$1.750.905	FIJO	X	7		

MAYO

DATOS BÁSICOS										NOVEDADES			
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	COL.	EXT.	LIQ SOLO FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO									APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1124818810	DEPENDIENTE	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES				SI	$1.750.905	FIJO			X	30

JUNIO

IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	EXT.	LIQ SOLO FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO								APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1006691448	DEPENDIENTE	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	1006691448	DEPENDIENTE	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES			SI	$1.750.905	FIJO	X	16	X	30
CC	1006776906	DEPENDIENTE	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	1006783220	DEPENDIENTE	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1023879760	DEPENDIENTE	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO			SI	$1.750.905	FIJO	X	1		
CC	1052413449	DEPENDIENTE	JAIMES CAAMAÑO DANY FABIAN			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	1121829244	DEPENDIENTE	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1121946586	DEPENDIENTE	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1124818911	DEPENDIENTE	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	1124818911	DEPENDIENTE	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL			SI	$1.750.905	FIJO	X	18		
CC	1124991535	DEPENDIENTE	PEREZ CARIBAN WALFRAN			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	1124991535	DEPENDIENTE	PEREZ CARIBAN WALFRAN			SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	1134450031	DEPENDIENTE	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	1134450031	DEPENDIENTE	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN			SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	3215459	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	3215459	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO			SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	40186168	DEPENDIENTE	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	52481418	DEPENDIENTE	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO			SI	$2.000.000	FIJO				
CC	7248128	DEPENDIENTE	SANCHEZ USECHE JOSE			SI	$2.500.000	FIJO				
CC	74325151	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	74325151	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO			SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM			SI	$1.750.905	FIJO			X	5
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM			SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	86062096	DEPENDIENTE	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO			SI	$2.000.000	FIJO				

JULIO

IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	COL.	EXT.	LIQ SOLO FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO									APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1006776906	DEPENDIENTE	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO				SI	$1.750.905	FIJO	X	1		
CC	1006783220	DEPENDIENTE	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1023879760	DEPENDIENTE	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1052413449	DEPENDIENTE	JAIMES CAAMAÑO DANY FABIAN				SI	$1.750.905	FIJO	X	1	X	22
CC	1121829244	DEPENDIENTE	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1121946586	DEPENDIENTE	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1124818911	DEPENDIENTE	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL				SI	$1.750.905	FIJO			X	31
CC	1124991535	DEPENDIENTE	PEREZ CARIBAN WALFRAN				SI	$1.750.905	FIJO			X	31
CC	1134450031	DEPENDIENTE	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN				SI	$1.750.905	FIJO			X	31
CC	3215459	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO				SI	$1.750.905	FIJO			X	31
CC	40186168	DEPENDIENTE	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	52481418	DEPENDIENTE	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO				SI	$2.000.000	FIJO				
CC	7248128	DEPENDIENTE	SANCHEZ USECHE JOSE				SI	$2.500.000	FIJO				
CC	74325151	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86062096	DEPENDIENTE	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO				SI	$2.000.000	FIJO				

AGOSTO

IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	EXT.	LIQ SOLO FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO								APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1006776906	DEPENDIENTE	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1006783220	DEPENDIENTE	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1006822811	DEPENDIENTE	LOPEZ LANDAETA LAURA JULIANA			SI	$1.750.905	FIJO	X	20		
CC	1010026192	DEPENDIENTE	VERGARA JORGE			SI	$1.750.905	FIJO	X	5		
CC	1023374553	DEPENDIENTE	GUZMAN PEREZ JUAN CAMILO			SI	$1.750.905	FIJO	X	5		
CC	1023879760	DEPENDIENTE	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1070597147	DEPENDIENTE	ESGUERRA TRIANA JHON ALEXANDER			SI	$1.750.905	FIJO	X	27		
CC	1121417962	DEPENDIENTE	ACERO QUESADA LIBER AGUSTO			SI	$1.750.905	FIJO	X	27		
CC	1121829244	DEPENDIENTE	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1121946586	DEPENDIENTE	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1124818451	DEPENDIENTE	RAMIREZ CAMILO ANDRES			SI	$1.750.905	FIJO	X	28		
CC	13565981	DEPENDIENTE	HERNANDEZ QUINTANA JULIO ELIAS			SI	$1.750.905	FIJO	X	18		
CC	18959208	DEPENDIENTE	ESCORCIA SILVA ENMANUEL RAFAEL			SI	$1.750.905	FIJO	X	3		
CC	40186168	DEPENDIENTE	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	52481418	DEPENDIENTE	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO			SI	$2.000.000	FIJO				
CC	7248128	DEPENDIENTE	SANCHEZ USECHE JOSE			SI	$2.500.000	FIJO				
CC	74325151	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM			SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86060299	DEPENDIENTE	RAMIREZ CASTRO EDWIN GEOVANNY			SI	$1.750.905	FIJO	X	21	X	30
CC	86062096	DEPENDIENTE	BAQUERO MUNOZ CARLOS EDUARDO			SI	$2.000.000	FIJO				
CC	88249434	DEPENDIENTE	FLOREZ RODRIGUEZ JIM MARIO			SI	$1.750.905	FIJO	X	26		
PT	5140206	DEPENDIENTE	REYES CHIPIAJE PABLO			SI	$1.750.905	FIJO	X	27		

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

SEPTIEMBRE

IDENTIFICACIÓN		TIPO DE COTIZANTE	APELLIDOS Y NOMBRES	COL.	EXT.	LIQ SOL O FSP.	REFORMA TRIBUTARIA	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING		RET	
TIPO	NÚMERO									APLICA	DIA	APLICA	DIA
CC	1006776906	DEPENDIENTE	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1006783220	DEPENDIENTE	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1006822811	DEPENDIENTE	LOPEZ LANDAETA LAURA JULIANA				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1010026192	DEPENDIENTE	VERGARA JORGE				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1023374553	DEPENDIENTE	GUZMAN PEREZ JUAN CAMILO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1023879760	DEPENDIENTE	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1053744562	DEPENDIENTE	LEITON LEON STIVEN ARLEY				SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	1070597147	DEPENDIENTE	ESGUERRA TRIANA JHON ALEXANDER				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1121417962	DEPENDIENTE	ACERO QUESADA LIBER AGUSTO				SI	$1.750.905	FIJO			X	15
CC	1121829244	DEPENDIENTE	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1121946586	DEPENDIENTE	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	1124818451	DEPENDIENTE	RAMIREZ CAMILO ANDRES				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	13565981	DEPENDIENTE	HERNANDEZ QUINTANA JULIO ELIAS				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	18959208	DEPENDIENTE	ESCORCIA SILVA ENMANUEL RAFAEL				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	40186168	DEPENDIENTE	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	4165694	DEPENDIENTE	MARTINEZ CARO GUSTAVO				SI	$1.750.905	FIJO	X	16		
CC	52481418	DEPENDIENTE	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO				SI	$2.000.000	FIJO				
CC	7248128	DEPENDIENTE	SANCHEZ USECHE JOSE				SI	$2.500.000	FIJO				
CC	74325151	DEPENDIENTE	HERNANDEZ CALDERON JABIER DARIO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86047574	DEPENDIENTE	TRIGOS MORENO WILLIAM				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	86062096	DEPENDIENTE	BAQUERO MUNOZ CARLOS EDUARDO				SI	$2.000.000	FIJO				
CC	88249434	DEPENDIENTE	FLOREZ RODRIGUEZ JIM MARIO				SI	$1.750.905	FIJO				
CC	97611039	DEPENDIENTE	DEANTONIO GARCIA GUSTAVO ANTONIO				SI	$1.750.905	FIJO	X	3	X	15
PT	5140206	DEPENDIENTE	REYES CHIPIAJE PABLO				SI	$1.750.905	FIJO				

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

16. RELACIÓN DE PAZ Y SALVOS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona los paz y salvos del personal de obra verificados acordes a los lineamientos de vinculación de personal establecido por el contratista.

EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INICIO	FECHA RETIRO
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	INGENIERO DE APOYO TECNICO	1/02/2026	31/03/2026
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	27/02/2026	30/05/2026
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	27/02/2026	5/06/2026
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	9/03/2026	5/06/2026
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	16/03/2026	5/06/2026
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	16/03/2026	5/06/2026
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	16/03/2026	5/06/2026
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	5/06/2026
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	5/06/2026
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	5/06/2026
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	19/02/2026	5/06/2026
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	22/07/2026
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	16/06/2026	31/07/2026
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	31/07/2026
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	18/06/2026	31/07/2026
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	16/06/2026	31/07/2026
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	86.060.299	ING. DE APOYO TECNICO	21/08/2026	30/08/2026
GUSTAVO ANTONIO DEANTONIO GARCIA	97.611.039	OFICIAL DE OBRA	3/09/2026	15/09/2026
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	15/09/2026

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

17. CONCLUSIONES

1. La Interventoría realizó la revisión integral de las cantidades de obra ejecutadas, memorias de cálculo, registros topográficos, resultados de laboratorio, certificados de materiales, registros fotográficos, bitácora de obra, informes técnicos y demás soportes presentados por el Contratista para la presente Acta Parcial No. 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026, verificando que las actividades ejecutadas corresponden a las efectivamente construidas en campo y cumplen con las especificaciones técnicas, diseños aprobados y obligaciones contractuales establecidas para el proyecto, incluidas las incorporadas mediante la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01.

2. La Interventoría verificó que, en virtud de la formalización de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, aprobada el 12 de agosto de 2026, el Contrato de Obra No. 1700 de 2025 pasó de un valor inicial de CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.002.449.758,46) a un valor total actualizado de CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.512.219.514,09), como resultado de una Adición por valor de MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.509.769.755,63), condiciones sobre las cuales se sustenta la presente Acta Parcial No. 1.

3. Durante la revisión efectuada se verificó la correcta ejecución de las actividades correspondientes a los capítulos de preliminares, demoliciones, movimiento de tierras, cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, cubierta, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, transporte de materiales, implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y ejecución del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), encontrándose debidamente soportadas mediante registros de obra, controles de calidad, certificados de disposición final de residuos, soportes administrativos y demás documentos exigidos contractualmente. Se verificó, así mismo, que las actividades de vigas aéreas, columnas y placa de contrapiso de la planta mayor fueron ejecutadas con concreto premezclado y acelerado a 3 días de resistencia, en el marco del Plan de Contingencia formulado por el Contratista y avalado por esta Interventoría con el fin de garantizar el cumplimiento del alto volumen de actividades previsto en la reprogramación derivada de la modificatoria contractual, así como que las actividades de mampostería y cubierta correspondieron a labores desarrolladas por los respectivos subcontratistas.

4. La Interventoría verificó igualmente el cumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista, incluyendo la acreditación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal directo y subcontratado vinculado al proyecto, así como la permanencia del personal profesional exigido contractualmente para la ejecución de las actividades objeto de cobro, dando así mismo cumplimiento a sus propias obligaciones en materia de seguridad social respecto del personal a su cargo.

5. Así mismo, se verificó la vigencia de las garantías contractuales, actualizadas conforme a las nuevas condiciones derivadas de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, y el cumplimiento de los requisitos administrativos, técnicos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables al contrato, evidenciando conformidad con las condiciones establecidas por la entidad contratante.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6. Se revisaron los ensayos y controles de calidad ejecutados durante el periodo reportado, verificando la correspondencia entre los resultados obtenidos, las especificaciones técnicas del proyecto y las actividades ejecutadas en obra, encontrándose conformes para efectos de recibo y pago.

7. Como resultado de las verificaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales y de calidad realizadas, la Interventoría emite concepto favorable y avala para trámite de pago la Acta Parcial No. 1 por un valor total de **MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.920.034.315,44),** equivalente al 34,832% del valor total actualizado del Contrato de Obra, correspondiente al primer cobro efectuado dentro del contrato, por encontrarse debidamente ejecutado, soportado y ajustado a las condiciones contractuales vigentes.

8. En cuanto al componente ambiental, la Interventoría verificó que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) también fue objeto de ajuste mediante la Modificatoria No. 01, quedando su valor total actualizado en OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($84.806.736,00). Como resultado de la verificación de las actividades ambientales ejecutadas, la Interventoría avala para trámite de pago en la presente acta un valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($75.501.936,00),** equivalente al 89,03% del valor total actualizado del PMA, quedando un saldo por cobrar de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($9.304.800,00).

9. De igual manera, en cuanto al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la Interventoría verificó que su valor total fue actualizado mediante la misma modificatoria a TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($31.478.020,20). Como resultado de la verificación de las medidas de manejo de tránsito ejecutadas, la Interventoría avala para trámite de pago en la presente acta un valor de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($19.855.262,70),** equivalente al 63,08% del valor total actualizado del PMT, quedando un saldo por cobrar de ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($11.622.757,50).

10. En consecuencia, la Interventoría considera procedente la aprobación de la presente Acta Parcial No. 1, dejando constancia de que las cantidades reconocidas corresponden exclusivamente a actividades verificadas en campo y recibidas a satisfacción durante el periodo objeto de evaluación, y que continuará ejerciendo el seguimiento permanente a la ejecución del contrato y a la implementación del Plan de Contingencia hasta la culminación del proyecto.

Fernando villegas

ING. FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25

RAFAEL PERREIRA ARQUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

18.LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. Aval PMA
ANEXO 2. Avala PMT

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co

6339

ANEXO 1. AVAL PMA

AVAL DE INTERVENTORÍA

COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

COBRO ACTA PARCIAL No. 1

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, financiera, ambiental y contractual establecidas para la Interventoría del Contrato de Obra No. 1700 de 2025, cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META", se realizó la revisión integral de los soportes presentados por el Contratista para el cobro de las actividades correspondientes al componente del Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluidas en la presente Acta Parcial No. 1, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026. Se precisa que, en virtud de la formalización de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, aprobada el 12 de agosto de 2026, el valor total del componente PMA fue actualizado a OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($84.806.736,00), condición sobre la cual se sustenta la presente revisión.

Como resultado de la revisión efectuada, la Interventoría verificó el cumplimiento de las actividades asociadas al personal profesional requerido para la implementación del componente ambiental del proyecto. Para tal efecto, se constató la vinculación contractual del profesional ambiental al equipo de trabajo de la Unión Temporal CONFISCA 25, su participación efectiva en la ejecución de las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo objeto de cobro y el cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes, precisando que dicho profesional es remunerado con recursos del PMA conforme a la dedicación establecida en el presupuesto de dicho plan. Así mismo, se revisaron y validaron los soportes de pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y demás documentos exigidos contractualmente, encontrándose conformes con los requisitos establecidos para su reconocimiento.

De igual manera, la Interventoría verificó la correcta ejecución de las actividades correspondientes al programa de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) generados por las labores de demolición, excavación y demás actividades constructivas desarrolladas durante la ejecución del proyecto. Como parte de esta verificación se evidenció que los materiales fueron manejados conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, realizando su respectivo acopio temporal, cargue, transporte y disposición final mediante gestor autorizado.

Particularmente, se verificó la disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) en la ZODME GUATIQUÍA S.A.S., identificada con NIT 901.313.682-5, ubicada en el municipio de Villavicencio, Meta, sitio autorizado para la recepción y disposición de este tipo de materiales. Como soporte de dicha actividad, la Interventoría revisó y avaló los certificados de disposición final correspondientes a las actividades de demolición, excavación y transporte ejecutadas durante el periodo objeto de la presente acta, documentos mediante los cuales se acredita la adecuada gestión y disposición de los residuos generados por el proyecto, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

Con fundamento en las verificaciones realizadas en campo, la revisión documental efectuada y la conformidad de los soportes presentados por el Contratista, esta Interventoría considera procedente el reconocimiento de las actividades correspondientes al componente ambiental incluidas en la presente Acta Parcial No. 1, precisando que para el presente cobro únicamente se avalan los conceptos relacionados con:

- Personal profesional ambiental vinculado a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental.
- Actividades de cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) mediante gestor autorizado.

Como resultado de la revisión técnica, ambiental, administrativa y financiera efectuada sobre los soportes aportados por el Contratista, la Interventoría encuentra procedente el reconocimiento de recursos por valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($75.501.936,00),** correspondiente al 89,03% del valor total actualizado del componente del Plan de Manejo Ambiental (PMA), valor que comprende exclusivamente las actividades relacionadas con el personal profesional ambiental vinculado a la ejecución del proyecto y las actividades de cargue, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) mediante gestor autorizado, las cuales fueron objeto de revisión y validación por parte de esta Interventoría, quedando un saldo por cobrar de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($9.304.800,00).

En consecuencia, la Interventoría emite concepto técnico favorable y otorga su aval para el trámite de reconocimiento y pago de las actividades anteriormente descritas, por encontrarse debidamente ejecutadas, soportadas y acordes con las obligaciones contractuales y ambientales aplicables al proyecto.

Fernando villegas

ING. FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
INGENIERO CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
NIT 902017391-1

Daira Camacho H.

DAIRA CAMACHO HERNANDEZ
M.P. 25238-380898 CND
Ingeniera Ambiental, Especialista.
Asesor Ambiental Interventoría

Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

Evidencia fotográfica.













Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co













Código Postal 502041
Calle 10 N°10-60 Barrio Centro, Palacio Municipal
Teléfonos: 3203750721 / 3128854597
alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co

ANEXO 2. AVAL PMT

CONSORCIO
INTERFISCA GAITAN25

AVAL DE INTERVENTORÍA

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT

COBRO ACTA PARCIAL NRO.1 CONTRATO DE OBRA

Una vez revisada la documentación presentada por el Contratista correspondiente al cobro del componente Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026, la Interventoría realizó la verificación técnica, administrativa y contractual de las actividades ejecutadas, así como de los soportes que respaldan la solicitud de pago. Se precisa que, en virtud de la formalización de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, aprobada el 12 de agosto de 2026, el valor total del componente PMT fue actualizado a TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($31.478.020,20), condición sobre la cual se sustenta la presente revisión.

Durante el proceso de revisión se verificó en campo la implementación de las medidas establecidas en el PMT aprobado para el proyecto, evidenciando la permanencia de la señalización preventiva e informativa, la delimitación de las áreas de trabajo, el mantenimiento de los corredores de circulación peatonal y la ejecución de las actividades necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial en el área de influencia de la obra.

De igual manera, la Interventoría verificó la vinculación, permanencia y disponibilidad del personal encargado del control y apoyo a la movilidad, constatando el cumplimiento de sus funciones mediante registros de campo, informes de seguimiento y evidencias fotográficas. Así mismo, se revisaron los soportes correspondientes a la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales aplicables al personal vinculado para la ejecución de este componente.

Producto de la revisión efectuada, la Interventoría constató que las actividades objeto de cobro fueron ejecutadas conforme a las obligaciones establecidas en el contrato y en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la autoridad competente, encontrando que los soportes técnicos, administrativos y financieros presentados son suficientes para respaldar la solicitud de pago.

En consecuencia, la Interventoría emite concepto favorable y avala para trámite de pago la suma de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($19.855.262,70),** correspondiente a las actividades ejecutadas en desarrollo del componente PMT durante el periodo reportado, valor equivalente al 63,08 % del valor total actualizado establecido para este componente dentro del contrato, quedando un saldo por cobrar de ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($11.622.757,50).

La Interventoría deja constancia de que las actividades verificadas contribuyeron al mantenimiento de condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial en el entorno del proyecto, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y normativos aplicables durante el periodo objeto de evaluación.

Correo: consorciointerfiscagaitan25@gmail.com
BL N TORRE 29 AP 203 URBANIZACIÓN LAS MARGARITAS - FLOR AMARILLO
Tel.: 315-361-9997


6346

CONSORCIO
INTERFISCA GAITAN25

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



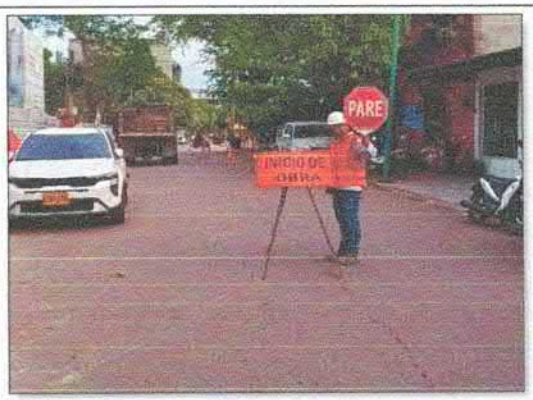


El presente aval se genera a los 15 días del mes de septiembre de 2026 para el trámite correspondiente

Fernando villegas

ING. FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
INGENIERO CIVIL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
NIT 902017391-1

6347

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

FORMATO ACTA PARA PAGO

Puerto Gaitán – Meta

311 386 8024

Confisca25@gmail.com

6348

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ACTA PARA PAGO PARCIAL O FINAL			Puerto Gaitán
	Infraestructura Pública			
	Codigo: INF-FR-28	Version: 05	Vigencia: 09/06/2025	

ACTA PARA PAGO

PAGO PARCIAL No. 01	**PAGO FINAL** _____
CONTRATO No:	1700 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
VALOR INICIAL :	$ 4.002.449.758,46
VALOR ADICION No. 01	$ 1.509.769.755,63
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICACION No. 01 :	$ 5.512.219.514,09
VALOR REDUCCION DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICACION No. _____ :	$ -
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO :	$ 5.512.219.514,09
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS:	CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25 NIT-902.013.441-0
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 DE FEBRERO DE 2027
PRORROGA 01:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15 DE ABRIL DE 2027
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CATORCE (14) MESES
FECHA PRESENTE ACTA:	29 SEP 2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25 NIT 902.017.391-1
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES Secretario de Infraestructura

RESUMEN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	4.002.449.758,46
VALOR ANTICIPO RECIBIDO 00%	$	-
VALOR ADICION No. 01	$	1.509.769.755,63
VALOR ANTICIPO ADICION No. 01 RECIBIDO 00%	$	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 1 FUENTE 1041-1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON REGISTRO PRESUPUESTAL (RES.2026004274)	$	519.946.374,40
VALOR ACTA PARCIAL N° 1 FUENTE 1081-1.2.3.2.06 - CONTR CONTRATOS DE OBRA PUB - FONSET CON REGISTRO PRESUPUESTAL (RES.2026004274)	$	77.650.049,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 1 FUENTE 1041-1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON REGISTRO PRESUPUESTAL (RES.2026000007)	$	1.322.437.892,04
VALOR ACTA PARCIAL N° 1 FUENTE 1041-1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON REGISTRO PRESUPUESTAL (RES.2026002321)	$	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 1 FUENTE 1081-1.2.3.2.06 - CONTR CONTRATOS DE OBRA PUB - FONSET CON REGISTRO PRESUPUESTAL (RES.2026002321)	$	-
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	$	-
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL N° 1 FUENTE 1041-1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON REGISTRO PRESUPUESTAL (RES.2026004274)	$	519.946.374,40
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL N° 1 FUENTE 1081-1.2.3.2.06 - CONTR CONTRATOS DE OBRA PUB - FONSET CON REGISTRO PRESUPUESTAL (RES.2026004274)	$	77.650.049,00
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL N° 1 FUENTE 1041-1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CON REGISTRO PRESUPUESTAL (RES.2026000007)	$	1.322.437.892,04
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$	-
VALOR TOTAL A PAGAR EN ACTA PARCIAL N° 1	$	1.920.034.315,44
SALDO POR PAGAR	$	3.592.185.198,65

6349

ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO ACTA PARA PAGO PARCIAL O FINAL			Puerto Gaitán
	Infraestructura Pública			
	Codigo: INF-FR-28	Version: 05	Vigencia: 09/06/2025	

VALOR DEL CONTRATO		**$ 4.002.449.758,46**
VALOR ADICION No. 01 AL CONTRATO		**$ 1.509.769.755,63**
VALOR ACTAS ANTERIORES	**$ -**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL Nº 01	**$ 1.920.034.315,44**	
SALDO POR PAGAR	**$ 3.592.185.198,65**	
SUMAS IGUALES:	**$ 5.512.219.514,09**	**$ 5.512.219.514,09**

El valor a pagar en la presente acta es la suma de **MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 1.920.034.315,44)**

Con la firma de la presente acta, el contratista recibe el pago parcial del 34,83% para un acumulado de 34,83% de la obra ejecutada, quedando un saldo del 65,17% del valor total del contrato por ejecutar. Lo anterior teniendo en cuenta la revision previa y aprobacion por parte de la interventoria segun el acta parcial de obra No. 01 que forma parte integral del presente tramite conforme a lo indicado en el articulo 2 de la ley 1882 de 2018 y demas ley vigente.

Se firma en Puerto Gaitán, Meta, a los 29 SEP 2026.

ADOLFO VÁSQUEZ MOSCOSO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

Aprobo: FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

Vo.Bo. MARIA LUISA BELTRAN ACEVEDO
APOYO A LA SUPERVISION
Cto 1399 del 2025

VoBo. LUZ ADRIANA HERNÁNDEZ CANTOR
DIRECTOR TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

VoBo. CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

6350

ACTA PARCIAL N° 01

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6351

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ACTA PARCIAL			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo: INF-FR-11	Versión: 05	Vigencia:09-06-2025	

ACTA PARCIAL No. 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.01 ☑

CONTRATO No. 1708 de 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT: 902.013.442-0
R/L: ADOLFO VÁSQUEZ MOSCOSO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25

NIT: 902.017.391-1
R/L: FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ

SUPERVISOR: CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES

FECHA DE INICIO:	**16 DE FEBRERO DE 2026**
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	**15 DE FEBRERO DE 2027**
VALOR INICIAL:	**$ 4,002,449,758.46**
VALOR ADICION No. 01:	**$ 1,509,769,755.63**
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	**$ 5,512,219,514.09**
PRORROGA No. 1:	**DOS (2) MESES**
PLAZO INICIAL:	CATORCE (14) MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	**15 DE ABRIL DE 2027**

VALOR PRESENTE ACTA: **$ 1,920,034,315.44**

FECHA PRESENTE ACTA: 29 SEP 2026

PERIODO PRESENTE ACTA: **DESDE** 2025-02-16 **HASTA** 2025-09-15

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los 29 SEP 2026 se reunieron el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25 representando legalmente por ADOLFO VÁSQUEZ MOSCOSO, el CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25 representado legalmente por FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ como Interventor y CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES secretario de infraestructura publica, quien ejerce las actividades de supervisión del contrato, en representación de la alcaldia municipal de Puerto Gaitán - Meta, con el fin de dar aprobación al ACTA PARCIAL Nº 01 en la ejecución del contrato en mención, como se detalla a continuación:

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.00	**PRELIMINARES**				**$ 83,170,367.90**		**$ 82,802,733.36**		**$ 82,802,733.36**				**$ 367,574.54**
1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	1,108.42	$ 3,573.41	$ 3,960,839.11	1108.42	$ 3,960,839.11	1108.42	$ 3,960,839.11	1,108.42	$3,960,839.11	0.00	$ -
1.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	573.24	$ 8,164.82	$ 4,680,401.42	573.24	$ 4,680,401.42	573.24	$ 4,680,401.42	573.24	$4,680,401.42	0.00	$ -
1.03	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	117.87	$ 434,003.88	$ 51,156,037.34	117.87	$ 51,156,037.34	117.87	$ 51,156,037.34	117.87	$51,156,037.34	0.00	$ -
1.04	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	21.00	$ 87,788.13	$ 1,843,550.73	21.00	$ 1,843,550.73	21.00	$ 1,843,550.73	21.00	$1,843,550.73	0.00	$ -
1.05	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	338.84	$ 14,784.06	$ 5,009,430.89	338.84	$ 5,009,430.89	338.84	$ 5,009,430.89	338.84	$5,009,430.89	0.00	$ -
1.06	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	338.84	$ 19,936.73	$ 6,755,361.59	338.84	$ 6,755,361.59	338.84	$ 6,755,361.59	338.84	$6,755,361.59	0.00	$ -
1.07	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	5.00	$ 40,824.08	$ 204,120.40	5.00	$ 204,120.40	5.00	$ 204,120.40	5.00	$204,120.40	0.00	$ -
1.08	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	5.00	$ 32,659.27	$ 163,296.35	5.00	$ 163,296.35	5.00	$ 163,296.35	5.00	$163,296.35	0.00	$ -
1.09	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	10.00	$ 19,179.97	$ 191,799.70	10.00	$ 191,799.70	10.00	$ 191,799.70	10.00	$191,799.70	0.00	$ -
1.11	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	538.79	$ 13,071.21	$ 7,042,637.24	538.79	$ 7,042,637.24	538.79	$ 7,042,637.24	538.79	$7,042,637.24	0.00	$ -
I.C. 1.12	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	280.92	$ 6,390.64	$ 1,795,258.59	280.92	$ 1,795,258.59	280.92	$ 1,795,258.59	280.92	$1,795,258.59	0.00	$ -
I.C. 1.13	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	0.40	$ 333,873.84	$ 133,549.54	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	0.40	$ 133,549.54
I.C. 1.14	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFÁLTICA)	ML	20.00	$ 11,701.25	$ 234,025.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	20.00	$ 234,025.00
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS**				**$ 263,183,732.34**		**$ 166,993,026.95**		**$ 166,993,689.62**				**$ 96,190,042.72**
2.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	678.97	$ 141,475.86	$ 96,057,118.26	645.74	$ 91,356,492.69	645.74	$ 91,357,155.36	645.74	$91,357,155.36	33.22	$ 4,699,962.90
2.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	80.23	$ 791,806.67	$ 63,526,649.13	67.63	$ 53,549,885.09	67.63	$ 53,549,885.09	67.63	$53,549,885.09	12.60	$ 9,976,764.04
2.04	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	46.62	$ 164,062.08	$ 7,648,107.97	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	46.62	$ 7,648,107.97
2.05	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 39 KG/CM2 O 3.9 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	50.54	$ 1,304,305.58	$ 65,919,604.01	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	50.54	$ 65,919,604.01
I.C. 2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REPARCHEO INC. TRANSPORTE	M3	0.40	$ 1,300,423.57	$ 520,169.43	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	0.40	$ 520,169.43

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
LC. 2.07	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	361.45	$ 81,648.18	$ 29,512,083.54	270.510	$ 22,086,649.17	270.51	$ 22,086,649.17	270.51	$22,086,649.17	90.94	$ 7,425,434.37
3.00	**CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO**				**$ 505,281,877.67**		**$ 420,242,701.62**		**$ 418,621,348.74**				**$ 86,660,528.93**
3.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	5.31	$ 765,478.57	$ 4,064,691.21	3.73	$ 2,855,235.07	3.73	$ 2,855,235.07	3.73	$2,855,235.07	1.58	$ 1,209,456.14
3.02	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	16,455.10	$ 9,269.90	$ 152,546,443.66	14770.07	$ 136,917,099.70	14770.07	$ 136,917,071.89	14770.07	$136,917,071.89	1,686.03	$ 15,629,371.77
3.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2,418.57	$ 10,020.32	$ 24,234,845.34	1750.39	$ 17,539,467.92	1710.73	$ 17,142,062.03	1710.73	$17,142,062.03	707.84	$ 7,092,783.31
3.04	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	37.10	$ 1,108,306.18	$ 41,118,159.28	28.56	$ 31,653,224.50	28.56	$ 31,653,224.50	28.56	$31,653,224.50	8.54	$ 9,464,934.78
3.05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.00	$ 1,187,623.39	$ 36,816,325.09	22.16	$ 26,317,734.32	22.16	$ 26,317,734.32	22.16	$26,317,734.32	8.84	$ 10,498,590.77
3.06	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31.60	$ 978,215.29	$ 30,911,603.16	31.60	$ 30,911,603.16	30.88	$ 30,207,288.16	30.88	$30,207,288.16	0.72	$ 704,315.01
3.07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36.95	$ 1,538,402.88	$ 56,843,986.42	34.78	$ 53,505,652.17	34.78	$ 53,505,652.17	34.78	$53,505,652.17	2.17	$ 3,338,334.25
3.08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	25.01	$ 1,581,881.51	$ 39,562,856.57	19.36	$ 30,625,226.03	19.36	$ 30,625,226.03	19.36	$30,625,226.03	5.65	$ 8,937,630.53
3.09	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	ML	340.13	$ 188,951.20	$ 64,267,971.66	335.69	$ 63,429,028.33	335.69	$ 63,429,028.33	335.69	$63,429,028.33	4.44	$ 838,943.33
3.10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.61	$ 2,270,004.57	$ 1,384,721.09	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	0.61	$ 1,384,721.09
3.11	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5.42	$ 2,644,834.51	$ 14,335,003.04	4.56	$ 12,060,445.37	4.56	$ 12,060,445.37	4.56	$12,060,445.37	0.86	$ 2,274,557.68
3.15	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2.49	$ 1,712,874.27	$ 4,265,056.93	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.49	$ 4,265,056.93
LC. 3.16	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.12	$ 1,383,422.86	$ 9,849,970.76	3.82	$ 5,284,675.33	3.82	$ 5,284,675.33	3.82	$5,284,675.33	3.30	$ 4,565,295.44
LC. 3.17	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	89.11	$ 117,412.67	$ 10,462,643.02	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	89.11	$ 10,462,643.02
LC. 3.18	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	40.60	$ 121,225.28	$ 4,921,746.37	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	40.60	$ 4,921,746.37
LC. 3.19	SUMINISTRO, MEZCLA Y COLOCACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI PARA TANQUE SUBTERRÁNEO. INCLUYE CURADOR BASE AGUA	M3	2.88	$ 1,688,546.03	$ 4,863,012.57	2.88	$ 4,863,012.57	2.60	$ 4,390,219.68	2.60	$4,390,219.68	0.28	$ 472,792.89
LC. 3.20	ENTIBADO TIPO 2 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)	M2	15.64	$ 141,594.24	$ 2,214,533.91	15.64	$ 2,214,533.91	15.64	$ 2,214,533.91	15.64	$2,214,533.91	0.00	$ -
LC. 3.21	REALCE DE CAJA DE INSPECCIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, INC INSTALACIÓN DE TAPA	UN	1.00	$ 552,544.35	$ 552,544.35	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 552,544.35
LC. 3.22	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN POLIETILENO CAL. 6	M2	394.96	$ 5,230.31	$ 2,065,763.24	394.96	$ 2,065,763.24	386.01	$ 2,018,951.96	386.01	$2,018,951.96	8.95	$ 46,811.27
4.00	**ACERO ESTRUCTURAL**				**$ 359,654,217.13**		**$ 69,056,610.89**		**$ 69,056,610.89**				**$ 290,597,606.24**
4.01	PERFIL CAJON PHR NEGRO 305X80X2.5MM CAL 12	ML	270.04	$ 255,727.34	$ 69,056,610.89	270.04	$ 69,056,610.89	270.04	$ 69,056,610.89	270.04	$69,056,610.89	0.00	$ -
4.02	PERFIL CIRC. 4" (E=4 MM) FY = 3500 KG/CM2	ML	28.00	$ 30,066.41	$ 841,859.48	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	28.00	$ 841,859.48
4.03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	7,958.14	$ 35,173.50	$ 279,915,637.29	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	7,958.14	$ 279,915,637.29
LC. 4.04	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	275.92	$ 35,699.15	$ 9,850,109.47	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	275.92	$ 9,850,109.47
5.00	**MUROS, PAÑETES Y PINTURAS**				**$ 347,923,991.30**		**$ 78,434,400.10**		**$ 72,133,046.41**				**$ 275,790,944.89**
5.01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	1,327.95	$ 64,279.85	$ 85,360,426.81	1020.85	$ 65,620,084.87	922.82	$ 59,318,731.18	922.82	$59,318,731.18	405.13	$ 26,041,695.63
5.04	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	236.63	$ 16,026.36	$ 3,792,317.57	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	236.63	$ 3,792,317.57
5.05	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1,503.36	$ 13,296.56	$ 19,989,516.44	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1,503.36	$ 19,989,516.44
5.06	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR (DOS MANOS)	M2	36.75	$ 34,470.13	$ 1,266,777.28	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	36.75	$ 1,266,777.28
5.07	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.67	$ 2,119,002.09	$ 3,538,733.49	1.01	$ 2,140,192.11	1.01	$ 2,140,192.11	1.01	$2,140,192.11	0.66	$ 1,398,541.38
5.08	ESTUCO PLÁSTICO	M2	1,650.21	$ 19,236.94	$ 31,744,990.76	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1,650.21	$ 31,744,990.76
LC. 5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST ANTIHONGO PARA MUROS, INCLUYE PINTURA BASE 1 MANO	M2	683.07	$ 75,755.05	$ 51,746,002.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	683.07	$ 51,746,002.00
LC. 5.11	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	UN	1,329.00	$ 13,443.48	$ 17,866,384.92	794.00	$ 10,674,123.12	794.00	$ 10,674,123.12	794.00	$10,674,123.12	535.00	$ 7,192,261.80
LC. 5.12	RECUBRIMIENTO EN MALLA VENA PARA BAJANTES E=15CM	ML	29.44	$ 90,528.25	$ 2,665,151.68	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	29.44	$ 2,665,151.68

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 5.13	IMPERMEABILIZACIÓN PARA MUROS DE FACHADA	M2	41.11	$ 66,648.92	$ 2,739,937.10	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	41.11	$ 2,739,937.10
I.C. 5.14	PAÑETE PARA MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y REMATES PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS Y DEMÁS ELEMENTOS CON ANCHOS ENTRE 0.2 Y 0.7M.	M2	1,557.34	$ 41,462.26	$ 64,570,835.99	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1,557.34	$ 64,570,836.99
I.C. 5.15	PAÑETE PARA MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y REMATES PARA COLUMNAS, VIGAS, VIGUETAS Y DEMÁS ELEMENTOS CON ANCHOS ENTRE 0.2 Y 0.7M.	M2	936.76	$ 53,354.18	$ 49,980,061.66	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	936.76	$ 49,980,061.66
I.C. 5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE MUROS EN POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M2	384.76	$ 32,911.05	$ 12,662,855.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	384.76	$ 12,662,855.60
6.00	**PISOS Y ENCHAPES**				**$ 165,851,878.23**		**$ -**		**$ -**				**$ 165,851,878.23**
6.02	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	86.31	$ 142,067.86	$ 12,261,877.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	86.31	$ 12,261,877.00
6.03	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0,035 m	M2	32.00	$ 108,681.15	$ 3,477,796.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	32.00	$ 3,477,796.80
6.06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	391.59	$ 41,916.64	$ 16,414,137.06	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	391.59	$ 16,414,137.06
6.07	PORCELANATO BEIGE	M2	346.43	$ 155,336.17	$ 53,813,109.37	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	346.43	$ 53,813,109.37
6.08	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 60X10	ML	316.69	$ 43,736.79	$ 13,851,004.03	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	316.69	$ 13,851,004.03
6.10	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD)	ML	21.33	$ 15,350.42	$ 327,424.46	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	21.33	$ 327,424.46
6.12	DEMARCACION EN PISO	ML	99.66	$ 9,875.46	$ 984,188.34	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	99.66	$ 984,188.34
6.13	CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	16.68	$ 60,273.80	$ 1,005,366.98	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	16.68	$ 1,005,366.98
I.C. 6.14	PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO LIBRE	M2	84.20	$ 114,209.52	$ 9,616,441.58	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	84.20	$ 9,616,441.58
I.C. 6.15	GUARDAESCOBA DE PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE WING METÁLICO	ML	18.42	$ 65,808.22	$ 1,212,187.41	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	18.42	$ 1,212,187.41
I.C. 6.16	TOPELLANTAS PLÁSTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 49,712.27	$ 497,122.70	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	10.00	$ 497,122.70
I.C. 6.17	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO DE 15CM	ML	17.55	$ 104,881.01	$ 1,840,661.73	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	17.55	$ 1,840,661.73
I.C. 6.18	PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 M CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO INCLUYE CORTES, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CORDÓN Y SELLO	M2	127.16	$ 397,535.08	$ 50,550,560.77	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	127.16	$ 50,550,560.77
7.00	**CIELORASOS Y CUBIERTAS**				**$ 203,420,328.33**		**$ 112,203,623.21**		**$ 112,203,623.21**				**$ 91,216,705.12**
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE PERFILERIA METALICA	M2	395.83	$ 160,535.68	$ 63,544,838.21	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	395.83	$ 63,544,838.21
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	171.95	$ 133,206.09	$ 22,904,787.18	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	171.95	$ 22,904,787.18
I.C. 7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO 15CM	ML	62.06	$ 28,971.26	$ 1,797,956.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	62.06	$ 1,797,956.40
I.C. 7.07	FLANCHE PARA CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	ML	23.61	$ 94,743.00	$ 2,236,882.23	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	23.61	$ 2,236,882.23
I.C. 7.08	MARCO EN ALUMINIO 60X60 PARA ENSAMBLE EN CIELO RASO PVC	UN	10.00	$ 73,217.81	$ 732,178.10	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	10.00	$ 732,178.10
I.C. 7.09	TAPA EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE MARCO, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UN	4.00	$ 1,182,411.79	$ 4,729,647.16	4.00	$ 4,729,647.16	4.00	$ 4,729,647.16	4.00	$4,729,647.16	0.00	$ -
I.C. 7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. INCLUYE REMATE LATERAL DE TEJA	M2	391.46	$ 269,595.31	$ 105,535,780.05	391.46	$ 105,535,780.05	391.46	$ 105,535,780.05	391.46	$105,535,780.05	0.00	$ -
I.C. 7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA PANEL METÁLICO	ML	21.67	$ 89,441.44	$ 1,938,196.00	21.67	$ 1,938,196.00	21.67	$ 1,938,196.00	21.67	$1,938,196.00	0.00	$ -
8.00	**PUERTAS,VENTANAS,BARANDAS,VIDRIOS**				**$ 325,968,477.79**		**$ -**		**$ -**				**$ 325,968,477.79**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18.	M2	22.55	$ 819,356.13	$ 18,476,480.73	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	22.55	$ 18,476,480.73
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 10 MM	M2	49.17	$ 628,251.10	$ 30,891,106.59	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	49.17	$ 30,891,106.59
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	9.45	$ 871,927.21	$ 8,239,712.13	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	9.45	$ 8,239,712.13
8.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	10.62	$ 1,398,650.32	$ 14,853,666.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	10.62	$ 14,853,666.40
8.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SEGURIDAD TAQUILLA MARCO EN ALUMINIO	M2	4.40	$ 286,966.77	$ 1,262,653.79	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	4.40	$ 1,262,653.79
8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	4.00	$ 365,117.21	$ 1,460,468.84	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	4.00	$ 1,460,468.84
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	M2	69.68	$ 2,968,520.32	$ 206,846,495.90	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	69.68	$ 206,846,495.90
8.10	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2.98	$ 178,662.58	$ 532,414.49	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.98	$ 532,414.49
8.11	SANDBLASTING BLANCO	M2	66.18	$ 118,518.40	$ 7,843,547.71	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	66.18	$ 7,843,547.71
I.C. 8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO CON SISTEMA BISAGRA Y MARCO	M2	12.29	$ 998,202.09	$ 12,267,903.69	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	12.29	$ 12,267,903.69
I.C. 8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	1.85	$ 650,015.39	$ 1,202,528.47	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.85	$ 1,202,528.47

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 14	M2	6.18	$ 557,669.99	$ 3,446,400.54	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	6.18	$ 3,446,400.54
I.C. 8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIAS EN ALUMINIO PARA VENTANAS, ANCHO DE 10 CMS.	ML	23.13	$ 38,857.39	$ 898,771.43	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	23.13	$ 898,771.43
I.C. 8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO POMO PARA PUERTA EN ALUMINIO	UN	12.00	$ 146,408.10	$ 1,756,897.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	12.00	$ 1,756,697.20
I.C. 8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INC. PORTA CERRADURAS	UN	16.00	$ 353,130.13	$ 5,650,082.08	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	16.00	$ 5,650,082.08
I.C. 8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MANIJA RECTA 60-40CM ACERO INOX.	UN	19.00	$ 290,808.10	$ 5,525,353.90	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	19.00	$ 5,525,353.90
I.C. 8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PIVOTES PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 100-300KG	UN	19.00	$ 253,368.10	$ 4,813,993.90	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	19.00	$ 4,813,993.90
9.00	**RED HIDRÁULICA Y VARIOS**				**$ 8,174,759.58**		**$ 1,115,257.43**		**$ 943,214.14**				**$ 7,231,545.44**
9.03	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	68.40	$ 12,703.77	$ 868,937.87	44.73	$ 568,239.63	36.61	$ 465,085.02	36.61	$465,085.02	31.79	$ 403,852.85
9.04	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	51.14	$ 18,838.52	$ 963,401.91	21.97	$ 413,882.28	20.08	$ 378,277.48	20.08	$378,277.48	31.06	$ 585,124.43
9.05	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 33,283.88	$ 133,135.52	4.00	$ 133,135.52	3.00	$ 99,851.64	3.00	$99,851.64	1.00	$ 33,283.88
9.06	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	15.00	$ 56,868.85	$ 853,032.75	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	15.00	$ 853,032.75
9.07	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31.00	$ 5,989.39	$ 185,671.09	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	31.00	$ 185,671.09
9.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUPERFICIAL CENTRÍFUGA, SUCCIÓN X DESCARGA DE 1" POTENCIA 1HP	UN	1.00	$ 2,301,696.13	$ 2,301,696.13	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 2,301,696.13
I.C. 9.09	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	3.00	$ 52,398.28	$ 157,194.84	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	3.00	$ 157,194.84
I.C. 9.10	TAPA REGISTRO PLASTICA 20 x 20	UN	5.00	$ 26,181.34	$ 130,906.70	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	5.00	$ 130,906.70
I.C. 9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR 1/2" INC CAJA PLASTICA.	UN	1.00	$ 434,380.27	$ 434,380.27	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 434,380.27
I.C. 9.12	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	15.00	$ 3,587.73	$ 53,815.95	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	15.00	$ 53,815.95
I.C. 9.13	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7.00	$ 72,753.07	$ 509,271.49	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	7.00	$ 509,271.49
I.C. 9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PLASTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS	UN	2.00	$ 791,657.53	$ 1,583,315.06	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 1,583,315.06
10.00	**RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜES**				**$ 44,736,274.50**		**$ 27,141,346.58**		**$ 27,141,314.31**				**$ 17,594,960.19**
	RED SANITARIA					0.00							
10.01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	69.39	$ 32,273.41	$ 2,239,484.19000000000	69.39	$ 2,239,484.19	69.39	$ 2,239,451.92	69.39	$2,239,451.92	0.00	$ 32.27
10.02	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	38.65	$ 78,033.55	$ 3,015,996.71	23.54	$ 1,836,909.77	23.54	$ 1,836,909.77	23.54	$1,836,909.77	15.11	$ 1,179,086.94
10.03	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33.00	$ 12,090.01	$ 398,970.33	33.00	$ 398,970.33	33.00	$ 398,970.33	33.00	$398,970.33	0.00	$ -
10.04	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	44.00	$ 36,496.94	$ 1,605,865.36	27.00	$ 985,417.38	27.00	$ 985,417.38	27.00	$985,417.38	17.00	$ 620,447.98
10.05	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 94,875.87	$ 379,503.48	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	4.00	$ 379,503.48
10.06	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	12.00	$ 72,838.95	$ 874,067.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	12.00	$ 874,067.40
10.07	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	2.00	$ 83,819.58	$ 167,639.16	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 167,639.16
10.08	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 91,118.36	$ 364,473.44	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	4.00	$ 364,473.44
	RED PLUVIAL					0.00							$ -
10.09	TUBERÍA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106.93	$ 40,371.09	$ 4,316,880.65	106.93	$ 4,316,880.65	106.93	$ 4,316,880.65	106.93	$4,316,880.65	0.00	$ -
10.10	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	44.75	$ 30,430.02	$ 1,361,743.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	44.75	$ 1,361,743.40
10.11	CANAL LAMINA GAL C.16 LD=1.22M,ANTICO Y PINT, INCLUYE MALLA DE PROTECCION	ML	79.81	$ 236,861.23	$ 18,903,894.77	62.03	$ 14,692,502.10	62.03	$ 14,692,502.10	62.03	$14,692,502.10	17.78	$ 4,211,392.67
10.12	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15.63	$ 124,656.86	$ 1,948,386.72	15.63	$ 1,948,386.72	15.63	$ 1,948,386.72	15.63	$1,948,386.72	0.00	$ -
I.C. 10.13	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	12.00	$ 23,188.73	$ 278,264.76	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	12.00	$ 278,264.76
I.C. 10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PARA EVAPORADORA TIPO CASETTE INCLUYE AISLANTE TERMICO 7/8"X3/4"	ML	33.88	$ 87,876.27	$ 2,977,248.03	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	33.88	$ 2,977,248.03
I.C. 10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PARA EVAPORADORA TIPO SPLIT INCLUYE AISLANTE TERMICO 7/8"X3/4"	ML	111.07	$ 44,917.14	$ 4,988,946.74	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	111.07	$ 4,988,946.74
I.C. 10.16	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 180,698.86	$ 722,795.44	4.00	$ 722,795.44	4.00	$ 722,795.44	4.00	$722,795.44	0.00	$ -
I.C. 10.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	2.00	$ 96,056.96	$ 192,113.92	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 192,113.92
11.00	**APARATOS SANITARIOS Y VARIOS**				**$ 18,795,865.16**		**$ -**		**$ -**				**$ 18,795,865.16**
11.01	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	3.00	$ 458,712.20	$ 1,376,136.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	3.00	$ 1,376,136.60
11.02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	3.00	$ 615,001.02	$ 1,845,003.06	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	3.00	$ 1,845,003.06
11.04	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	1.00	$ 1,117,237.34	$ 1,117,237.34	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 1,117,237.34
11.05	SUMINISTRO E INTALACIÓN MUEBLE BAJO 80 CM	ML	1.72	$ 1,640,013.68	$ 2,820,823.53	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.72	$ 2,820,823.53
11.07	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	2.00	$ 1,003,199.82	$ 2,006,399.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 2,006,399.64

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
11.08	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UNI	2.00	$ 758,278.47	$ 1,516,556.94	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 1,516,556.94
11.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE TECHO, INCLUYE SISTEMAS CONEXIÓN Y EXTRACCIÓN POR TECHO.	UNI	7.00	$ 895,275.12	$ 6,266,925.84	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	7.00	$ 6,266,925.84
I.C. 11.10	LAVAMANOS DE PEDESTAL EN CERAMICA SANITARIA CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UNI	1.00	$ 770,047.28	$ 770,047.28	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 770,047.28
I.C. 11.11	SANITARIO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA TIPO CORONA AQUAJET O SIMILAR, INC. GRIFERIA TIPO MANIJA	UNI	1.00	$ 1,076,734.93	$ 1,076,734.93	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 1,076,734.93
12.00	**RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS**				**$ 1,085,950,494.10**		**$ 17,968,261.57**		**$ 17,968,261.57**				**$ 1,067,982,232.53**
	PRELIMINARES												
12.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0.23	$ 376,196.31	$ 86,525.15	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	0.23	$ 86,525.15
	CAJAS Y CANALIZACIONES												
12.24	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UNI	1.00	$ 1,251,756.90	$ 1,251,756.90	0.00	$ -	0.00		0.00	$0.00	1.00	$ 1,251,756.90
12.25	CANALIZACIÓN CS208 2 DUCTOS DE 4" PVC	ML	48.98	$ 387,906.99	$ 19,001,153.77	0.00	$ -	0.00		0.00	$0.00	48.98	$ 19,001,153.77
	RED MEDIA TENSION												
I.C. 12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SUMERGIBLE DE 112,5 KVA 13.200V/208-120V	UNI	1.00	$ 57,939,367.63	$ 57,939,367.63	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 57,939,367.63
I.C. 12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO XLPE 1/0 AL 133%	ML	55.98	$ 133,234.74	$ 7,458,480.75	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	55.98	$ 7,458,480.75
I.C. 12.50	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 290 PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE MEDIA TENSIÓN	UNI	1.00	$ 7,777,339.52	$ 7,777,339.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 7,777,339.52
I.C. 12.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINALES TIPO CODO DE 200 AMP PARA CABLE AL XLPE 1/0 CINTA 133%	UNI	1.00	$ 1,084,470.34	$ 1,084,470.34	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 1,084,470.34
I.C. 12.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TERMINALES TIPO CODO DE 600 AMP PARA CABLE AL XLPE 1/0 CINTA 133%	UNI	1.00	$ 3,687,690.34	$ 3,687,690.34	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 3,687,690.34
I.C. 12.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DPS 15 KV	UNI	1.00	$ 3,391,716.58	$ 3,391,716.58	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 3,391,716.58
I.C. 12.54	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS	UNI	1.00	$ 5,266,804.59	$ 5,266,804.59	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 5,266,804.59
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA												
I.C. 12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA, INCLUYE CABLE, VARILLAS, BENTONITA Y SOLDADURA.	UNI	1.00	$ 17,968,261.57	$ 17,968,261.57	1.00	$ 17,968,261.57	1.00	$ 17,968,261.57	1.00	$17,968,261.57	0.00	$ -
I.C. 12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUSBAR PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UNI	2.00	$ 551,709.60	$ 1,103,419.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 1,103,419.20
I.C. 12.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG	ML	5.00	$ 113,628.69	$ 568,143.45	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	5.00	$ 568,143.45
I.C. 12.58	CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30CM PARA PUESTA A TIERRA CONSTRUIDA EN LADRILLO TOLETE CON TAPA	UNI	1.00	$ 294,451.31	$ 294,451.31	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 294,451.31
	RED BAJA TENSION												
I.C. 12.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2X(3X250+250+4/0T) CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	26.55	$ 1,614,234.05	$ 42,857,914.03	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	26.55	$ 42,857,914.03
I.C. 12.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2x1/0+1/0+2T CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	40.94	$ 286,413.83	$ 11,725,782.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	40.94	$ 11,725,782.20
I.C. 12.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2x2+2+4T CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	8.88	$ 192,593.02	$ 1,710,226.02	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	8.88	$ 1,710,226.02
I.C. 12.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2x10+10T CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	11.18	$ 41,317.14	$ 461,925.63	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	11.18	$ 461,925.63
I.C. 12.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12 T CU LIBRE DE HALOGENOS	ML	335.42	$ 31,341.45	$ 10,512,549.16	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	335.42	$ 10,512,549.16
I.C. 12.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 1X12+12+12T+12T CU LIBRE DE HALOGENOS CON DOBLE TIERRA PARA SISTEMA REGULADO	ML	262.82	$ 35,206.40	$ 9,252,946.05	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	262.82	$ 9,252,946.05
I.C. 12.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO EMT DE 1/2"	ML	16.83	$ 24,600.26	$ 414,022.38	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	16.83	$ 414,022.38
I.C. 12.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2"	ML	82.28	$ 14,422.08	$ 1,186,648.74	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	82.28	$ 1,186,648.74
I.C. 12.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA 20X8 CM (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, DIVISIÓN, TAPA Y ATERRIZAJE)	ML	117.06	$ 140,705.18	$ 16,470,948.37	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	117.06	$ 16,470,948.37
	TABLEROS ELECTRICOS												
I.C. 12.68	CELDA MEDIDA SEMIDIRECTA AE-319, IP 66. INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X350 AMP, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y MEDIDOR DE MEDIDA SEMIDIRECTA	UNI	1.00	$ 6,049,217.31	$ 6,049,217.31	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 6,049,217.31
I.C. 12.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS DE FABRICACION ESPECIAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (INCLUYE BREAKERS Y ACCESORIO DE INSTALACION)	UNI	1.00	$ 12,614,928.39	$ 12,614,928.39	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 12,614,928.39
I.C. 12.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PARA TOMAS E ILUMINACION	UNI	1.00	$ 1,355,901.97	$ 1,355,901.97	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 1,355,901.97

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL PARA RED REGULADA DE FABRICACION ESPECIAL SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (INCLUYE BREAKERS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	1.00	$ 3,275,139.42	$ 3,275,139.42	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 3,275,139.42
	GRUPO ELECTROGENO												
I.C. 12,72	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA CABINADA DE 125 KVA INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	UN	1.00	$ 126,336,466.32	$ 126,336,466.32	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 126,336,466.32
I.C. 12,73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE PARA PLANTA ELECTRICA	ML	6.70	$ 1,441,371.22	$ 9,657,187.17	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	6.70	$ 9,657,187.17
I.C. 12,74	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE SALIDA DE AIRE CALIENTE PARA PLANTA ELECTRICA CABINADA	ML	1.68	$ 1,188,644.64	$ 1,996,923.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.68	$ 1,996,923.00
	ILUMINACIÓN												
I.C. 12,75	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE 40W	UN	60.00	$ 229,893.54	$ 13,793,612.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	60.00	$ 13,793,612.40
I.C. 12,76	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DE 2x18W	UN	23.00	$ 126,071.61	$ 2,899,647.03	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	23.00	$ 2,899,647.03
I.C. 12,77	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18W	UN	53.00	$ 117,146.50	$ 6,208,764.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	53.00	$ 6,208,764.50
I.C. 12,78	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2x1,5 W	UN	21.00	$ 177,495.80	$ 3,727,411.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	21.00	$ 3,727,411.80
	SALIDAS ELECTRICAS												
I.C. 12,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	14.00	$ 274,020.23	$ 3,836,283.22	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	14.00	$ 3,836,283.22
I.C. 12,80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE BIFASICO (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	1.00	$ 234,299.46	$ 234,299.46	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 234,299.46
I.C. 12,81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, INCLUYE TROQUEL Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (NO INCLUYE CABLEADO NI TUBERÍA)	UN	19.00	$ 99,371.84	$ 1,888,064.96	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	19.00	$ 1,888,064.96
I.C. 12,82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA, INCLUYE TROQUEL Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (NO INCLUYE CABLEADO NI TUBERÍA)	UN	59.00	$ 113,668.76	$ 6,706,456.84	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	59.00	$ 6,706,456.84
I.C. 12,83	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	2.00	$ 335,617.47	$ 671,234.94	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 671,234.94
I.C. 12,84	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	136.00	$ 352,876.80	$ 47,991,244.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	136.00	$ 47,991,244.80
I.C. 12,85	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	21.00	$ 372,631.50	$ 7,825,261.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	21.00	$ 7,825,261.50
I.C. 12,86	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONEXIÓN PARA EXTRACTORES (INCLUYE CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	7.00	$ 375,158.84	$ 2,626,111.88	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	7.00	$ 2,626,111.88
I.C. 12,87	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30X8CM GALVANIZADA EN CALIENTE CON DIVISION (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, FIGURAS Y ATERRIZAJE)	ML	77.13	$ 327,497.44	$ 25,259,877.55	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	77.13	$ 25,259,877.55
I.C. 12,88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA BANDEJA PORTACABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	ML	77.13	$ 103,160.91	$ 7,956,800.99	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	77.13	$ 7,956,800.99
	CONTROL ELECTROBOMBA												
I.C. 12,89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO	UN	2.00	$ 246,188.10	$ 492,376.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 492,376.20
I.C. 12,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA ELECTROBOMBA	UN	1.00	$ 2,792,361.78	$ 2,792,361.78	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 2,792,361.78
I.C. 12,91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14	ML	29.01	$ 36,349.88	$ 1,054,510.02	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	29.01	$ 1,054,510.02
	SISTEMA PARA AIRES ACONDICIONADOS												
I.C. 12,92	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA (3X2/0+2/0+1/0T) CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	10.19	$ 451,330.43	$ 4,599,057.08	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	10.19	$ 4,599,057.08
I.C. 12,93	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA (2x8+8-8T) CU-LIBRE DE HALOGENOS	ML	569.09	$ 77,361.60	$ 44,025,712.94	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	569.09	$ 44,025,712.94
I.C. 12,94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO PARA SEÑALES DE MANEJADORAS (4X16)CU	ML	353.15	$ 53,979.53	$ 19,062,871.02	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	353.15	$ 19,062,871.02
I.C. 12,95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL PARA AIRES ACONDICIONADOS	UN	1.00	$ 11,338,808.39	$ 11,338,808.39	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 11,338,808.39
I.C. 12,96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" PARA LLEGADA A EVAPORADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	ML	72.15	$ 45,333.11	$ 3,270,783.89	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	72.15	$ 3,270,783.89
I.C. 12,97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	ML	37.50	$ 69,066.73	$ 2,590,002.38	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	37.50	$ 2,590,002.38

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	VOZ Y DATOS												
I.C. 12,98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK CENTRAL DE 48 SALIDAS DE DATOS	UN	2.00	$ 14,601,924.63	$ 29,203,849.26	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 29,203,849.26
I.C. 12,99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" PARA LLEGADA A PUNTOS DE VOZ Y DATOS (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	ML	153.21	$ 46,333.61	$ 7,098,772.39	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	153.21	$ 7,098,772.39
I.C. 12,100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 DUCTO PVC CONDUIT 3/4"(NO INCLUYE CABLEADO)	ML	86.88	$ 16,466.64	$ 1,430,621.68	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	86.88	$ 1,430,621.68
I.C. 12,101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 PARA CONEXIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 INCLUYE FACE PLATE Y TROQUEL PARA SALIDA DE DATOS	UN	34.00	$ 72,093.49	$ 2,451,178.66	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	34.00	$ 2,451,178.66
I.C. 12,102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 PARA CONEXIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 INCLUYE CAJA Y FACE PLATE PARA SALIDA DE DATOS	UN	22.00	$ 59,609.09	$ 1,311,399.98	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	22.00	$ 1,311,399.98
I.C. 12,103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6 INC VELCRO DE AMARRE - NO INCLUYE TUBERÍA NI CANALETA	ML	1,259.97	$ 47,246.58	$ 59,529,273.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1,259.97	$ 59,529,273.40
I.C. 12,104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TIPO ONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN, CAPACIDAD NOMINAL 15 KVA / 15 KW, TENSIÓN DE ENTRADA/SALIDA 220V, FACTOR DE POTENCIA 1.0, CON MÓDULO INTERNO DE BATERÍAS DE AUTONOMÍA ESTÁNDAR, INC. ANCLAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES DE FIJACIÓN	UN	1.00	$ 21,540,084.41	$ 21,540,084.41	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 21,540,084.41
	REGULADOR DE TENSION Y OTROS												
I.C. 12,105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE TENSIÓN ENTRADA 190-230 SALIDA 220+-4,5%- CON POTENCIA DE 40KVA	UN	1.00	$ 18,918,411.71	$ 18,918,411.71	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 18,918,411.71
I.C. 12,106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO DE 0,50X0,40 MTS, INCLUYE LAMINA DE ALFAJOR DE 1/8,ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE ATERRIZAJE Y BANDEJA PORTACABLE DE 0,40 MTS	ML	9.09	$ 828,903.18	$ 7,535,002.61	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	9.09	$ 7,535,002.61
	ADECUACIONES DE REDES AEREAS												
I.C. 12,107	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 8 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1.00	$ 2,087,809.53	$ 2,087,809.53	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 2,087,809.53
I.C. 12,108	CANALIZACIÓN DE 2 DUCTOS PVC CONDUIT DE 3". NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI RELLENO	ML	89.55	$ 61,919.56	$ 5,544,896.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	89.55	$ 5,544,896.60
I.C. 12,109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO CS400 PARA DUCTOS DE 3". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 1,405,916.71	$ 2,811,833.42	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 2,811,833.42
I.C. 12,110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+4/0 AL	ML	49.50	$ 143,595.35	$ 7,107,989.83	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	49.50	$ 7,107,989.83
I.C. 12,111	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO	UN	3.00	$ 664,692.61	$ 1,994,077.83	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	3.00	$ 1,994,077.83
I.C. 12,112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONCÉNTRICO ANTIFRAUDE 1X8+8+ CU	ML	28.63	$ 35,023.42	$ 1,002,720.51	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	28.63	$ 1,002,720.51
	ILUMINACION EXTERIOR												
I.C. 12,113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DE 40W (INCLUYE MASTIL, PANELES, BATERIA Y CANASTILLA)	UN	5.00	$ 9,140,483.56	$ 45,702,417.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	5.00	$ 45,702,417.80
I.C. 12,114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR SOLAR DE HASTA 40W (INCLUYE PANELES, BATERIA Y CANASTILLA)	UN	3.00	$ 6,015,826.28	$ 18,047,478.84	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	3.00	$ 18,047,478.84
	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ALIMENTACION												
I.C. 12,115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA UN (1) PANEL SOLAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN.	UN	60.00	$ 481,515.13	$ 28,890,967.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	60.00	$ 28,890,967.80
I.C. 12,116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 645 WP, MONOCRISTALINO	UN	60.00	$ 1,539,474.17	$ 92,368,450.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	60.00	$ 92,368,450.20
I.C. 12,117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PORTACABLE TIPO ESCALERA GALVANIZADA DE 10MMX8MM	ML	50.00	$ 182,318.06	$ 9,115,903.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	50.00	$ 9,115,903.00
I.C. 12,118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA PARA CONEXIÓN A TIERRA DE BANDEJA METÁLICA PORTACABLE	UN	27.00	$ 41,131.12	$ 1,110,540.24	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	27.00	$ 1,110,540.24
I.C. 12,119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SOLAR CU 6 MM2	ML	604.00	$ 61,195.03	$ 36,961,798.12	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	604.00	$ 36,961,798.12
I.C. 12,120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SOLAR MC4	UN	28.00	$ 21,267.81	$ 595,498.68	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	28.00	$ 595,498.68
I.C. 12,121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA CONEXIÓN A TIERRA No 6 AWG	ML	196.00	$ 62,297.15	$ 12,210,241.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	196.00	$ 12,210,241.40
I.C. 12,122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AFLEX 3/4"	ML	24.00	$ 33,281.66	$ 798,759.84	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	24.00	$ 798,759.84
I.C. 12,123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA CORAZA AFLEX 3/4"	UN	12.00	$ 19,377.46	$ 232,529.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	12.00	$ 232,529.52
I.C. 12,124	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INVERSOR TRIFÁSICO DE INYECCIÓN A RED DE 50 KW, 60 HZ , 208 VAC	UN	1.00	$ 48,442,712.62	$ 48,442,712.62	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 48,442,712.62

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
I.C. 12,125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRADOR DE DATOS PROTOCOLO RS485 PARA MONITOREO Y COMUNICACIONES DEL SISTEMA SOLAR	UN	1.00	$ 1,938,941.92	$ 1,938,941.92	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 1,938,941.92
I.C. 12,126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1.00	$ 4,565,869.48	$ 4,565,869.48	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 4,565,869.48
I.C. 12,127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x2/0(F)+1x2/0(N)+2T CU LIBRE DE HALÓGENOS	ML	20.00	$ 362,308.51	$ 7,246,170.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	20.00	$ 7,246,170.20
I.C. 12,128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL	UN	1.00	$ 4,544,449.79	$ 4,544,449.79	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 4,544,449.79
13.00	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**				**$ 49,074,602.88**		**$ -**		**$ -**				**$ 49,074,602.88**
I.C. 13.04	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR	UN	20.00	$ 331,145.36	$ 6,622,907.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	20.00	$ 6,622,907.20
I.C. 13.05	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 18000/24000/36000 BTU INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR	UN	5.00	$ 496,718.05	$ 2,483,590.25	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	5.00	$ 2,483,590.25
I.C. 13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE O SPLIT	ML	198.15	$ 198,363.94	$ 39,305,814.71	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	198.15	$ 39,305,814.71
I.C. 13.07	INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE PARA ACCESO PRINCIPAL	UN	2.00	$ 331,145.36	$ 662,290.72	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 662,290.72
14.00	**ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES**		**4.00**	**$ 126,737.79**	**$ 5,624,228.41**		**$ -**		**$ -**				**$ 5,624,228.41**
14.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA, APTA PARA JARDÍN	M3	4.36	$ 275,114.10	$ 1,199,497.48	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	4.36	$ 1,199,497.48
14.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLORES ISABELLA H=40CM	UN	80.00	$ 44,219.58	$ 3,537,566.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	80.00	$ 3,537,566.40
14.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL FLOR AMARILLO-H=1.0 M	UN	4.00	$ 126,737.79	$ 506,951.16	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	4.00	$ 506,951.16
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL FLOR ROSADO H=1.0 M	UN	3.00	$ 126,737.79	$ 380,213.37	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	3.00	$ 380,213.37
15.00	**TRANSPORTES**			**$ 2,067.73**	**$ 450,540,832.37**		**$ 393,835,498.60**		**$ 393,835,498.60**				**$ 56,705,333.77**
15.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	128,222.94	$ 1,723.11	$ 220,942,230.14	114167.66	$ 196,723,436.62	**114167.66**	$ 196,723,436.62	114167.66	$196,723,436.62	14,055.28	$ 24,218,793.52
I.C. 15.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES PRODUCTO DE DEMOLICION	M3/KM	31,394.27	$ 2,240.04	$ 70,324,420.57	31394.27	$ 70,324,420.57	**31394.27**	$ 70,324,420.57	31394.27	$70,324,420.57	0.00	$ -
I.C. 15.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3/KM	77,028.52	$ 2,067.73	$ 159,274,181.66	61317.31	$ 126,787,641.41	**61317.31**	$ 126,787,641.41	61317.31	$126,787,641.41	15,711.21	$ 32,486,540.25

VALOR COSTO DIRECTO DE OBRA CIVIL			$ 3,917,361,867.69367	$ 1,369,793,460.31	$ 1,361,699,340.85	$ 2,555,662,526.85
ADMINISTRACIÓN		29.00%	$ 1,136,034,923.35	$ 397,240,103.49	$ 394,892,808.85	$ 741,142,114.50
IMPREVISTOS	%	1%	$ 39,173,618.05	$ 13,697,934.60	$ 13,616,993.41	$ 25,556,624.64
UTILIDADES		4%	$ 156,694,472.19	$ 54,791,738.41	$ 54,467,973.63	$ 102,226,498.56
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 1,331,903,013.59**	**$ 465,729,776.51**	**$ 462,977,775.89**	**$ 868,925,237.70**
TOTAL OBRA CIVIL			**$ 5,249,264,881.28**	**$ 1,835,523,236.82**	**$ 1,824,677,116.74**	**$ 3,424,587,764.55**

16.00	**TRAMITES DE LEGALIZACIÓN RED ELÉCTRICA**				**$ 39,368,450.86**		**$ -**		**$ -**				**$ 39,368,450.86**
16.01	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE	UN	1.00	$ 6,967,961.14	$ 6,967,961.14	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 6,967,961.14
16.02	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	1.00	$ 7,711,492.01	$ 7,711,492.01	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 7,711,492.01
16.03	REVISION Y APROBACIÓN DE DISEÑOS ELECTRICOS (TARIFA TRANSFORMADOR HASTA 112,5 KVA URBANO - VIGENCIA AÑO 2023 EMSA)	UN	1.00	$ 661,145.87	$ 661,145.87	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 661,145.87
16.04	PRUEBAS VLF CABLE RED DE MEDIA TENSIÓN	UN	1.00	$ 3,980,000.00	$ 3,980,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 3,980,000.00
I.C. 16.05	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS	UN	56.00	$ 54,425.66	$ 3,047,836.96	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	56.00	$ 3,047,836.96
I.C. 16.06	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE SISTEMA FOTOVOLTAICO	UN	1.00	$ 9,500,000.00	$ 9,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 9,500,000.00
I.C. 16.07	TRAMITES DE CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN OPERADOR DE RED PARA RED ELECTRICA Y SISTEMA FOTOVOLTAICO	UN	1.00	$ 7,500,014.88	$ 7,500,014.88	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 7,500,014.88
17.00	**SUMINISTROS**				**$ 83,179,399.80**		**$ -**		**$ -**				**$ 83,179,399.80**
I.C. 17.01	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR	UN	20.00	$ 2,075,880.00	$ 41,517,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	20.00	$ 41,517,600.00
I.C. 17.02	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 18000 BTU UNIDAD INTERIOR/EXTERIOR, INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 6,969,000.00	$ 6,969,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	1.00	$ 6,969,000.00
I.C. 17.03	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 24000 BTU UNIDAD INTERIOR/EXTERIOR, INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 7,209,000.00	$ 14,418,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 14,418,000.00
I.C. 17.04	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU UNIDAD INTERIOR/EXTERIOR, INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 9,039,000.00	$ 18,078,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 18,078,000.00
I.C. 17.05	SUMINISTRO DE CORTINA DE AIRE PARA ACCESO PRINCIPAL	UN	2.00	$ 1,098,399.90	$ 2,196,799.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$0.00	2.00	$ 2,196,799.80

6359

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01						EJECUTADO FISICO ACUMULADO		PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO ACTAS PARCIALES		POR EJECUTAR FINANCIERAMENTE	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SUMINISTROS				$ 83,179,399.80		$ 0.00		$ 0.00				$ 83,179,399.80
	ADMINISTRACIÓN 29.00%				$ 24,122,025.94		$ 0.00		$ 0.00				$ 24,122,025.94
	TOTAL SUMINISTROS				$ 107,301,425.74		$ 0.00		$ 0.00				$ 107,301,425.74
	TOTAL OBRA CIVIL				$ 5,249,264,881.26		$ 1,835,523,236.82		$ 1,824,677,116.74				$ 3,424,587,764.55
	TRAMITES DE LEGALIZACIÓN RED ELECTRICA				$ 39,368,450.86		$ 0.00		$ 0.00				$ 39,368,450.86
	TOTAL SUMINISTROS				$ 107,301,425.74		$ 0.00		$ 0.00				$ 107,301,425.74
	VALOR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 84,806,736.00		$ 79,945,080.00		$ 75,501,936.80				$ 9,304,800.00
	VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 31,479,020.20		$ 24,066,901.70		$ 19,855,262.70				$ 11,622,757.50
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 5,512,219,514.09		$ 1,939,535,218.52		$ 1,920,034,315.44				$ 3,592,185,198.65

BALANCE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO		
Valor Inicial del contrato	$	4,002,449,758.46
Adición Nro. 1	$	1,509,769,755.63
Valor actualizado del contrato	$	5,512,219,514.09
Total ejecutado	$	1,939,535,218.52
Valor facturado actas parciales anteriores	$	-
Valor facturado presente acta parcial 01	$	1,920,034,315.44
Valor a amortizar presente acta parcial 01	$	-
Saldo a cancelar	$	1,920,034,315.44
Saldo por cobrar	$	3,592,185,198.64

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1									
2									
	TOTALES		$ -	0,000%					

Valor a pagar en letras y números: MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 1.920.034.315,44)
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los cantavos por exceso o por defecto.
Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del interventor y el contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de modificación, los que en ella intervinieron,a los 29 SEP 2026

Firma
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

Firma
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

VBO.
MARIA VIRGA BELTRAN ACEVEDO
APOYO A LA SUPERVISION
Cto 1399 del 2025

Firma
FERNANDO JOSE VILLEGAS DIAZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

Firma
RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

VBO.
LUZ ADRIANA HERNANDEZ CANTOR
DIRECTOR TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

VBO.
CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

6360

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

MEMORIAS DE CALCULO

Puerto Gaitán – Meta

311 386 8024

Confisca25@gmail.com

6361

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN


ACTA MODIFICATORIA Nº	1	FECHA	DD	16	MM	2	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO 1,00 PRELIMINARES

6362

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
	Infraestructura										
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN											
ACTA PARCIAL No. 1	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025			

CAPITULO	1.00	ITEM	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	1.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

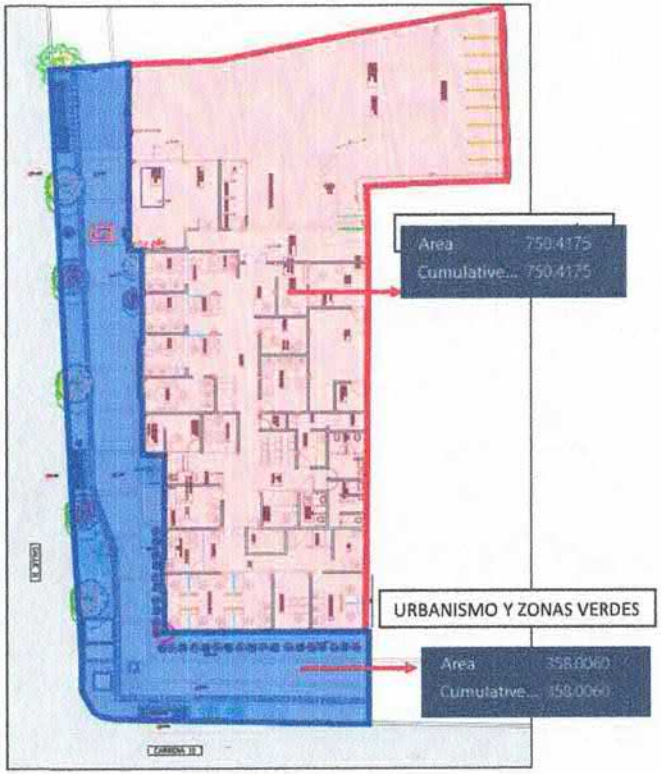

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	TOTAL
Modulo edificacion			750.42			750.42
Urbanismo y zonas verdes			358.00			358

6363

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA PARCIAL No. 1	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	1.00	ITEM	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	1.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

CARTERA TOPOGRÁFICA

6365

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CARTERA TOPOGRÁFICA
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Sistema de Coordenadas: Magna Sirgas - Este Central

Se localizan los ejes con un desfase de 1.5m externo

PUNTO	NORTE	ESTE
A1	968695.537	888573.430
A2	968695.993	888574.859
A3	968696.997	888578.002
A3'	968697.127	888578.407
A4	968697.475	888579.498
A5	968697.956	888581.003
A6	968698.185	888581.719
A6'	968698.282	888582.022
A7	968698.733	888583.433
A7'	968698.982	888584.213
A8	968700.118	888587.768
8A	968701.547	888587.311
8B	968705.404	888586.079
8C	968708.556	888585.072
8D	968710.895	888584.324
8D'	968711.385	888584.168
8E	968713.614	888583.456
8F	968716.303	888582.597
8G	968718.755	888581.813
8H	968721.841	888580.827
8I	968724.556	888579.960
8J	968726.541	888579.325
8K	968727.327	888579.074
1A	968696.509	888571.545
1B	968700.366	888570.312
1C	968703.519	888569.305
1D	968705.858	888568.558
1D'	968706.347	888568.401
1E	968708.576	888567.689
1F	968711.265	888566.830
1G	968713.717	888566.047
1H	968716.804	888565.060
1I	968719.518	888564.193
1J	968721.504	888563.559
1K	968722.290	888563.308
K1	968724.175	888564.280
K2	968724.631	888565.708
K3	968725.636	888568.852
K3'	968725.765	888569.257
K4	968726.114	888570.349
K5	968726.595	888571.854
K6	968726.823	888572.569
K6'	968726.921	888572.873
K7	968727.371	888574.284
K7'	968727.620	888575.063
K8	968728.756	888578.618
CUARTO ELÉCTRICO		
A1	968721.327	888564.247
A2	968722.477	888567.848
A3	968723.706	888571.694
3B	968726.925	888572.239
3C	968731.466	888570.788
C1	968730.059	888561.457
C2	968731.210	888565.057
C3	968732.438	888568.903
1A	968722.299	888562.362
1B	968723.632	888561.936
1C	968728.174	888560.485

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA

ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
R/L. UNION TEMPORAL CONFISCA 25

6366

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6367

111/25

CERTIFICAMOS QUE:

LA ESTACION TOTALGEOMAX ZOOM 40 No.865958

Fue verificada y colimada en nuestro taller de mantenimiento, encontrándose en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante.

Revisión del sistema mecánico

- Conjunto nivelante.....
- Ejes Hz y Ver.....
- Desplazamiento de tornillo de movimiento fino.....
- Desplazamiento del enfoque.....
- Verticalidad .....

Revisión del sistema electrónico

- Procesamiento y calculo.....
- Medición de distancias (fina, intermitente y normal) .....
- Medición de coordenadas.....

Revisión del sistema óptico

- Ausencia de humedad y hongos.....
- Eje óptico.....
- Desplazamiento de plomada laser en 180 Grados..... +1.5mm

Ángulos Horizontales, verticales y mediciones efectuadas con colimador óptico

- Angulo vertical (cierre 360 Grados) ..... + 55seg
- Angulo Horizontal (cierre 180 Grados) ..... + 00seg

Medición en distancia

- En distancias medias y larga (160 mts. 1.850 mts patronados) ..... +1.4mm

Mediciones efectuadas en campo

Ángulo Vertical		Ángulo Horizontal	
Posición 1:	82° 54′ 05″	Posición 1:	90° 28′ 10″
Posición 2:	277° 05′ 00″	Posición 2:	89° 31′ 50″
	359° 59′ 05″		**180° 00′ 00″**

CL.5B No.33B-01 Tel. 3108032568
E-mail topografiapp@hotmail.com
VILLAVICENCIO-META.

6368

Especificaciones

Alcance:	Con un prisma	3.000 Mts
	Con tres prismas	5.000 Mts
	Sin prisma	**500 Mts**
Anteojo:	Imagen directa de	30X
Precisión:	En distancia	(+5mm + 5ppm)
	En medición angular	1 seg.

Patrón utilizado: Colimador óptico marca KERN GK-23 No. 265608 con micrómetro óptico y exactitud de 0.7mm

Se expide a solicitud de: **DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO**

Fecha de Calibración: **30 de diciembre 2025**
Recomendamos revisión: **30 de junio 2026**

Cordialmente,

PEDRO E. GARNICA LOPEZ
Técnico Opto-Mecánico.

CL.5B No.33B-01 Tel. 3108032568
E-mail topografiapp@hotmail.com
VILLAVICENCIO-META.

6369

Galileo instruments

GPS192

Certificado de Mantenimiento y Verificación de Equipos.

Instrumento: GPS
Marca: CHCNAV
Número de Serie: 3209438
Fecha de Expedición: 03/03/2025
Cliente: DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO

Tipo de Equipo: Antena GNSS
Modelo: I50
Ciudad de Expedición: Bogotá - D.C.
Próxima Revisión: 03/03/2026

Certificado vigente hasta: 03/03/2026, bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El **mantenimiento** se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

Diagnóstico y Ajuste.

Descripción	Ajuste
Firmware Interno	Aplica
Configuración de Software	Aplica
Hardware	Aplica
Sistema de Coordenadas	Aplica
Datum de Mapa	No aplica
Conexión Baterías	Aplica
Conexión Cables	Aplica
Puertos de Descarga	Aplica
Revisión de Antena	Aplica
Revisión Cables	Aplica
Registro de Información	No aplica
Volcado de Memoria	No aplica
Ajustes de Coordenadas	Aplica
Teclado de Operación	Aplica
Pantalla Gráfica	No aplica
Operación	Aplica
Revisión de Teclado	Aplica
Programación de Parámetros	Aplica
Entrada y Salida de Datos	Aplica
Configuración Básica	Aplica

La **verificación** se efectuó siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.

Test de Verificación de Posicionamiento Horizontal.

Patrón Referencia: Bogotá - D.C.

Datos	Latitud	Longitud
Datos Patrón	4° 40' 02,37001" N	74° 03' 37,93263" W
Datos GPS	4° 40' 02,37014" N	74° 03' 37,93237" W

El equipo cumple bajo los parámetros de tolerancia en la precisión de posicionamiento.

Test de Verificación de Posicionamiento Vertical.

Patrón Referencia (Vértice Geodésico de Referencia): Bogotá - D.C.
Patrón: 2,579.050 m
Lectura: 2,579.027 m
Error Estadístico en Altura: 0.021m

Aspectos Encontrados: El equipo es apto para posicionamiento GPS, con buenas condiciones de rastreo satelital.

El equipo cumple bajo los parámetros de tolerancia en la precisión de posicionamiento.

Otros Ajustes y Diagnósticos.

Parámetro o Componente	Error Permitido	Cumple	Ajuste
		Sí o No	Sí o No
Altímetro	+/- 3 mts.	Sí	No
Proyección	Por Azimut & Coordenadas	Sí	No
Tiempo de Recepción	Inferior al Metro	Sí	No
Reloj de Precisión	Con la Hora Local	Sí	No
Recepción de Satélites	+/- 1	Sí	No

Imágenes asociadas al Chequeo GPS192.

Tipo de Equipo: Antena GNSS
Marca: CHCNAV
Modelo: I50
Número de Serie: 3209438

Imágenes en la siguiente página...

6371



El presente Certificado fue generado el día: 03/03/2025
y puede ser verificado ingresando el código **bfKYIeGar24j9TobIBtgiE GPS192** o escaneando el código QR al pie del documento desde el sitio web: https://certificados.galileoinstruments.com.co.


6372

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	1.02	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

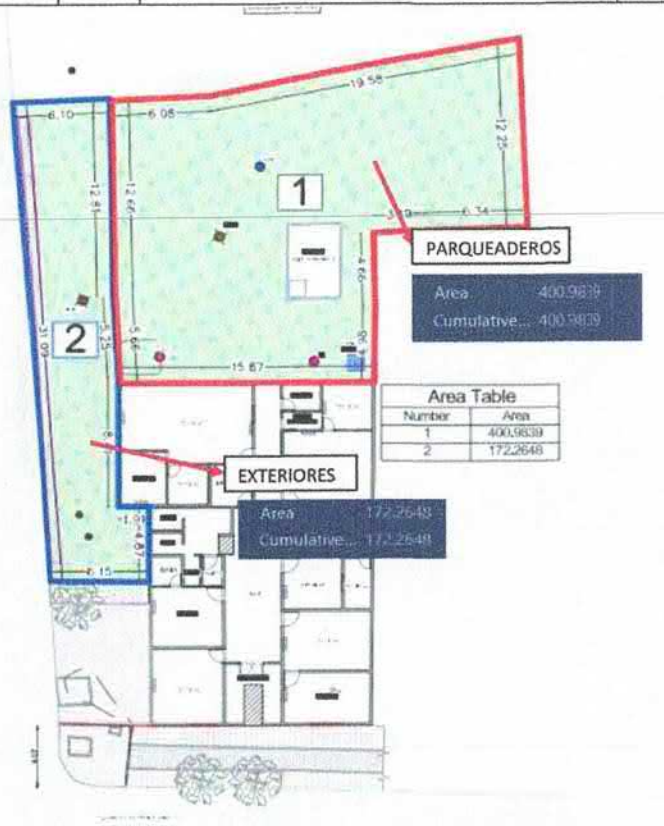

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	TOTAL
ZONAS VERDES EXISTENTES						
Parqueaderos			400.98			400.98
Exteriores			172.26			172.26

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**573.24**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	573.24
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**573.24**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO PAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	1.00	ITEM	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	1.02	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6374

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1.03	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

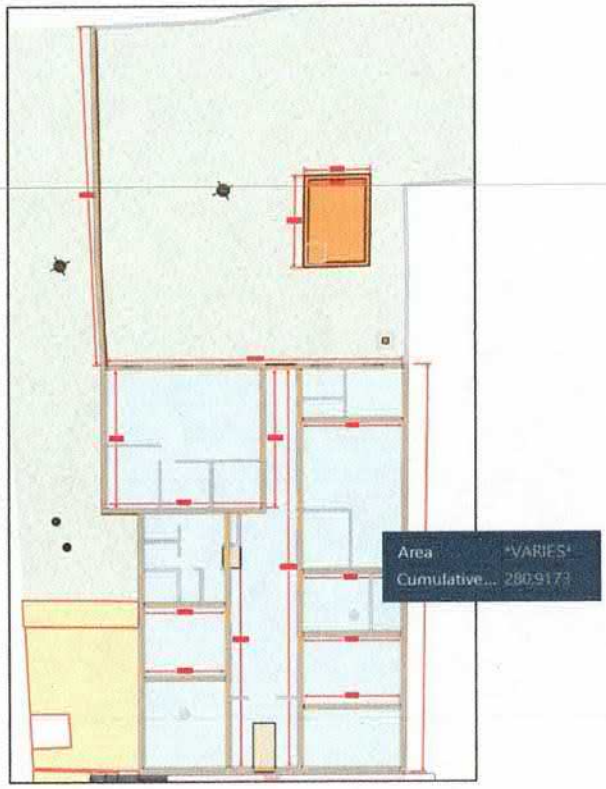

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	**TOTAL**
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE						
Vigas de cimentación inferidas	18.46	0.30	0.35		1.0	1.94
	15.42	0.30	0.35		1.0	1.62
	7.51	0.30	0.35		2.0	1.58
	8.52	0.30	0.35		1.0	0.89
	21.63	0.30	0.35		1.0	2.27
	5.11	0.30	0.35		4.0	2.15
	22.23	0.30	0.35		1.0	2.33
	4.14	0.30	0.35		2.0	0.87
	13.82	0.30	0.35		1.0	1.45
	13.8	0.30	0.35		1.0	1.45
	25.66	0.30	0.35		1.0	2.69
	12.19	0.30	0.35		1.0	1.28
	9.38	0.30	0.35		1.0	0.98
	9.78	0.30	0.35		1.0	1.03
Placa de contrapiso			0.15	280.92	1.00	42.14
Columnas de confinamiento inferidas	0.25	0.15	2.5		78.00	7.31
Vigas de confinamiento inferidas (N+2.5)	20.64	0.15	0.2		1.00	0.62
	8.01	0.15	0.2		1.00	0.24
	2.97	0.15	0.2		1.00	0.09
	3.42	0.15	0.2		1.00	0.1
	5.25	0.15	0.2		1.00	0.16
	8.21	0.15	0.2		1.00	0.25
	2.7	0.15	0.2		1.00	0.08
	7.96	0.15	0.2		1.00	0.24
	2.32	0.15	0.2		1.00	0.07
	2.94	0.15	0.2		1.00	0.09
	5.81	0.15	0.2		1.00	0.17
	2.69	0.15	0.2		1.00	0.08

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN	**CANTIDAD PRESENTE HOJA** **74.17**

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	ITEM	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1.03	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

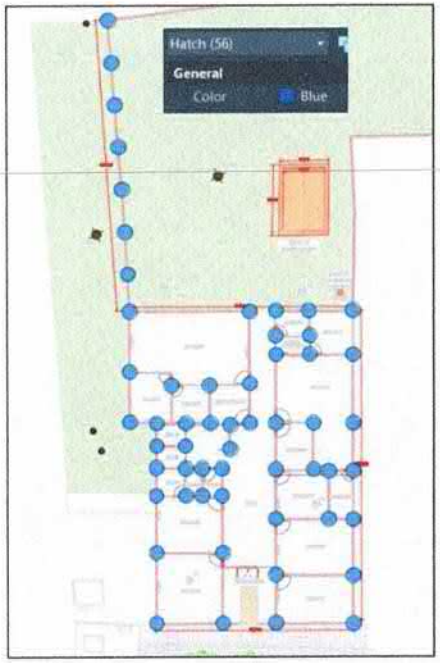

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	TOTAL
	3.26	0.15	0.2		1.00	0.1
	21.93	0.15	0.2		1	0.66
	14.22	0.15	0.2		1.00	0.43
	1.9	0.15	0.2		1.00	0.06
	3.1	0.15	0.2		1.00	0.09
	1.8	0.15	0.2		1.00	0.05
	0.9	0.15	0.2		1.00	0.03
	4.55	0.15	0.2		1.00	0.14
Vigas de confinamiento inferidas (N+2.5)	1.9	0.15	0.2		2.00	0.11
	4.44	0.15	0.2		2.00	0.27
	10.97	0.15	0.2		1.00	0.33
	3.51	0.15	0.2		1.00	0.11
	13.85	0.15	0.2		1.00	0.42
	2.69	0.15	0.2		1.00	0.08
	3.26	0.15	0.2		1.00	0.1
	5.42	0.15	0.2		3.00	0.49
	3.28	0.15	0.2		1.00	0.1
	22.23	0.15	0.2		1.00	0.67
	8.61	0.15	0.2		1.00	0.26
	8.77	0.15	0.2		1.00	0.26
Vigas de cubierta inferidas	8.2	0.15	0.2		1.00	0.25
	16.55	0.15	0.2		1.00	0.5
	13.95	0.15	0.2		1.00	0.42
				CANTIDAD PRESENTE HOJA		5.93
				VIENE HOJA 1		74.17
				SUBTOTAL		80.10

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6376

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	ITEM	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1.03	UNIDAD	M3	UBICACIÓN: CASCO URBANO PUERTO GAITAN

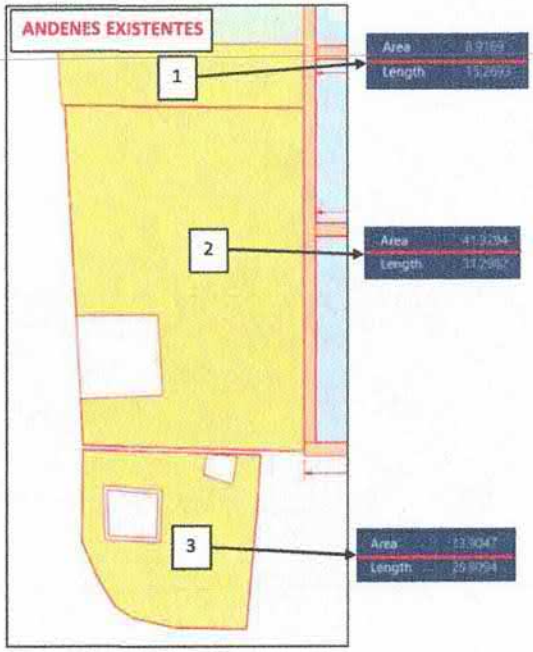

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	ÁREA (M2)	CANT.	TOTAL
TANQUE SUBTERRANEO						
Muros	4.00	0.3	3.3		2.0	7.92
	5.00	0.3	3.3		2.0	9.90
Placas	5.00	3.4	0.2		2.0	6.80
Andenes existentes (1)			0.15	8.92	1.00	1.34
Andenes existentes (2)			0.15	41.33	1.00	6.20
Andenes existentes (3)			0.15	13.91	1.00	2.09
Andenes existentes (4)			0.15	17.33	1.00	2.60
ESTRUCTURAS ELEVADAS						
Zapata de tanque elevado	1.2	1.20	0.3		1.00	0.43
Columnas tanque elevado	0.3	0.30	3.8		1.00	0.34
Placa para tanque elevado	1.00	1.00	0.15		1.00	0.15

CANTIDAD PRESENTE HOJA	**37.77**
VIENE HOJA 2	**80.10**
CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**117.87**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	117.87
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	117.87

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6377

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÀN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025
CAPITULO	1.00	ITEM	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1.03	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6378

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	ITEM	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.04	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

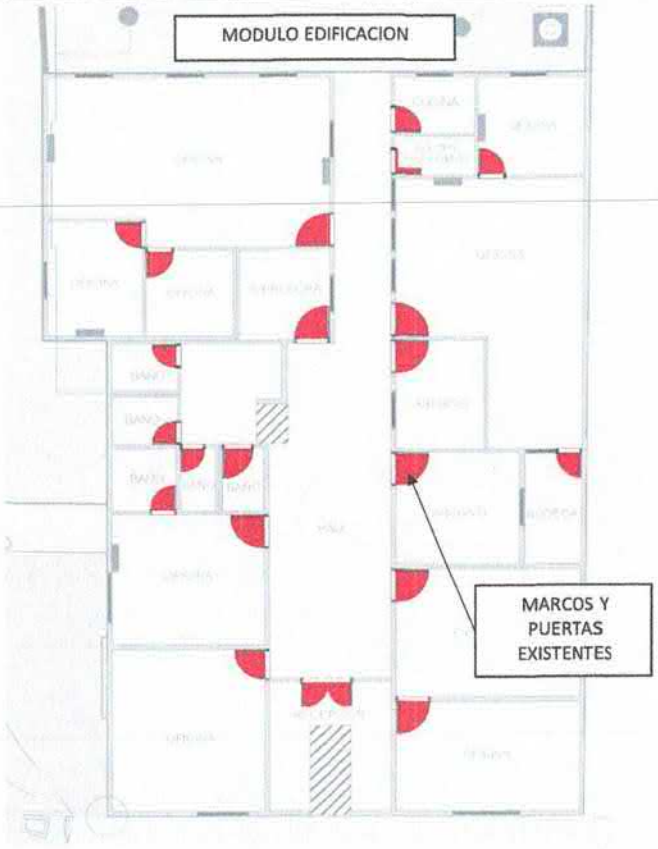

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	ALTO (m)	ÁREA (M2)	CANT.	TOTAL
Marcos y puertas existentes					21.00	21.00

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	21.00
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	21.00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	21.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025	

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.04	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6380

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / Versión: 04 / Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.05	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

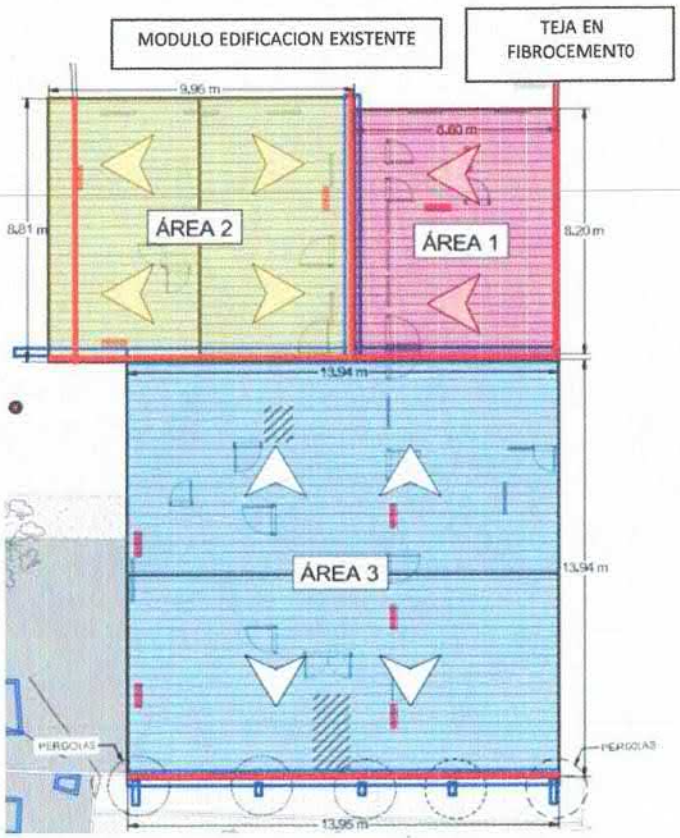

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (m)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	**TOTAL**
Área 1	6.60	8.20				54.12
Área 2	9.96	8.81				87.75
Área 3	13.94	14.13				196.97

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**338.84**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	338.84
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	338.84

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6381

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	1.00	ITEM	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.05	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6382

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.06	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

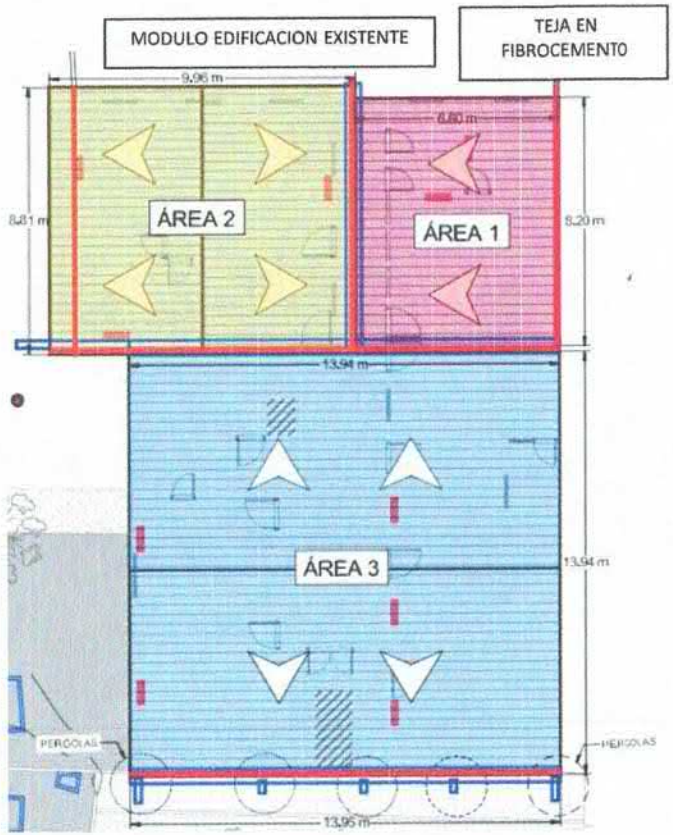

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (m)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	**TOTAL**
Área 1	6.60	8.20				54.12
Área 2	9.96	8.81				87.75
Área 3	13.94	14.13				196.97

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**338.84**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	338.84
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	338.84

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	1.00	ITEM	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.06	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FEBREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6384

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025		

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.07	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

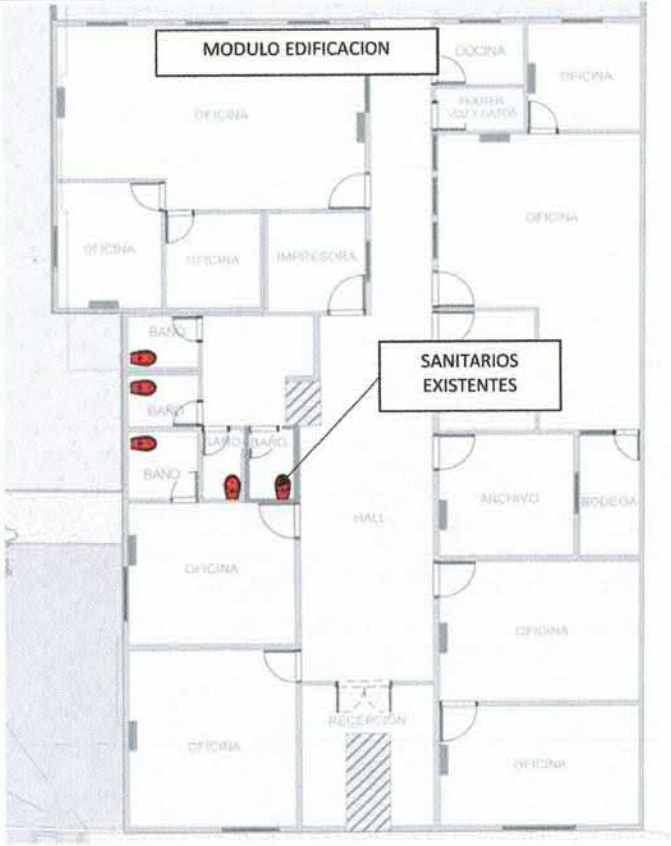

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	**TOTAL**
Sanitarios existente					5.00	5.00

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	1.00	ITEM	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.07	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BADUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.08	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

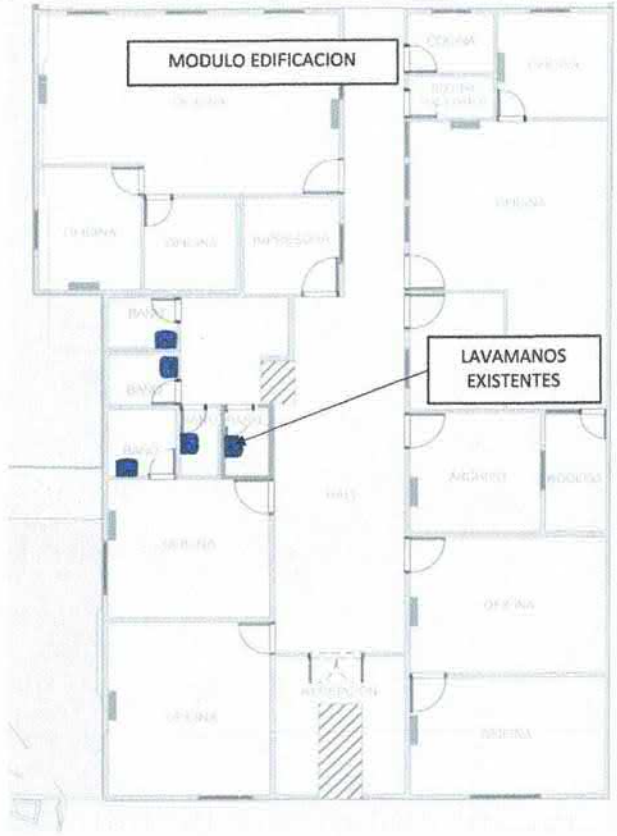

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (m)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	**TOTAL**
Lavamanos existente					5.00	5.00

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025
CAPITULO	1.00	ITEM	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.08	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.09	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

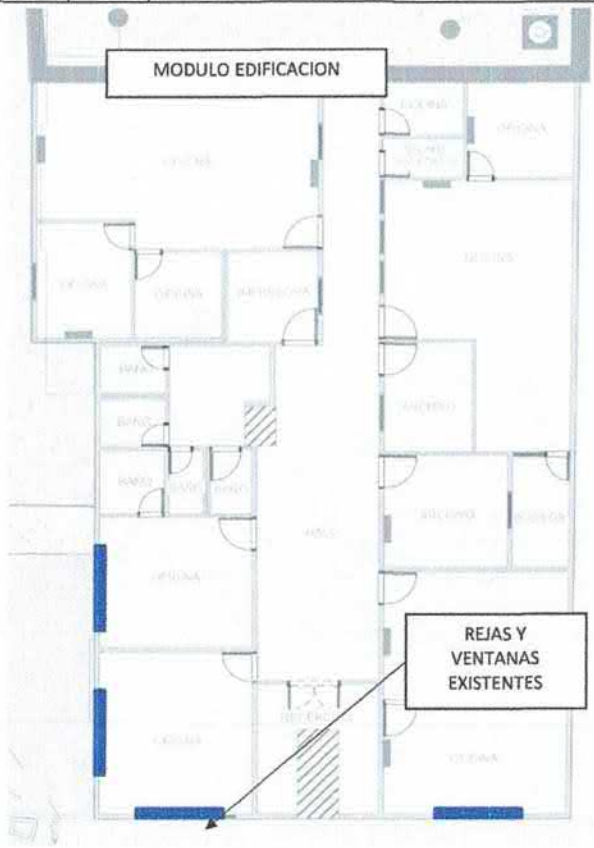

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (m)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	**TOTAL**
Rejas y ventanas existentes	2.50		1.00	2.50	4.00	10.00

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**10.00**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	10.00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	10.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por Interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025
CAPITULO	1.00	ITEM	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	1.09	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6390

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025	

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1.11	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

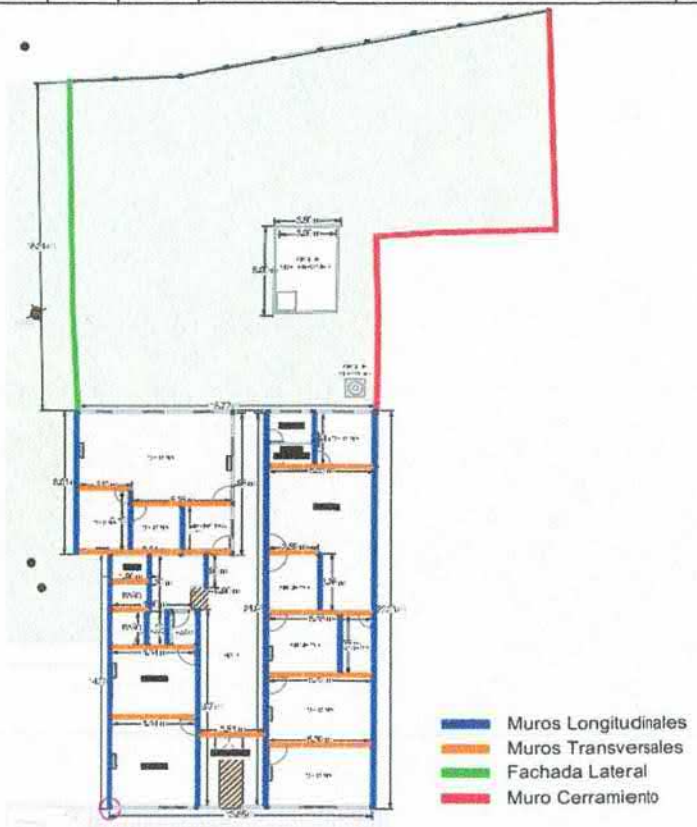

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL
ZONAS VERDES EXISTENTES					
Muros existentes longitudinales	104.43	2.5	261.07		261.07
Muros existentes transversales	56.23	2.5	140.58		140.58
Muro fachada lateral	18.31	3.2	58.59		58.59
Muro cerramiento existente	31.42	2.5	78.55		78.55
				CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**538.79**
				ACUMULADO ACTAS PARCIALES	538.79
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
				CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	538.79

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025
CAPITULO	1.00	ITEM	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	1.11	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6392

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025	

CAPITULO	1.00	**ITEM**	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	I.C. 1.12	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		

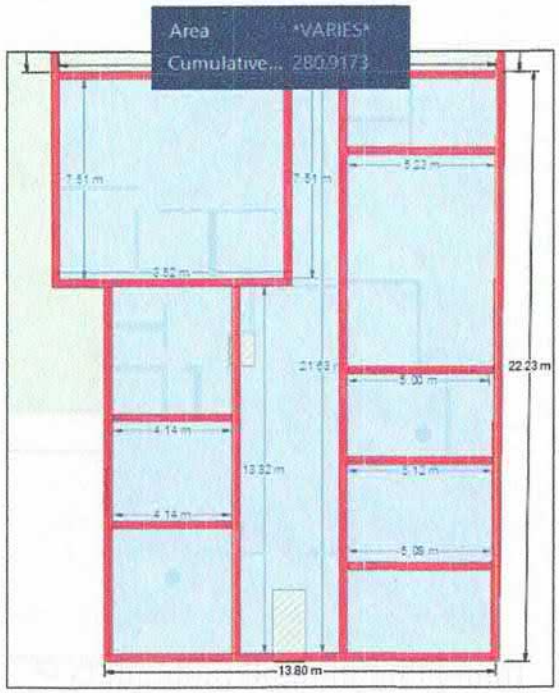

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (m)**	**ÁREA (M2)**	**CANT.**	**TOTAL**
Edificación existente				280.92	1.0	280.92

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	1.00	ITEM	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	I.C. 1.12	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	16	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO 2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS


6395

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	2.00	ITEM	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.	2.02	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

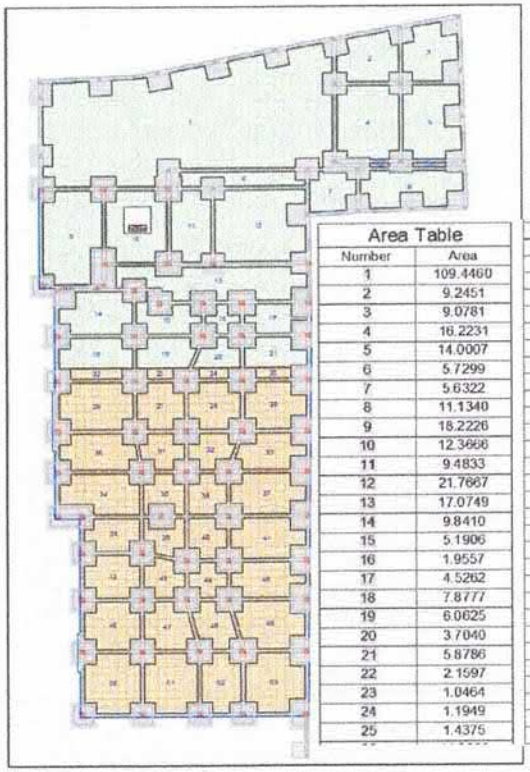

Area Table

Number	Area
1	109.4460
2	9.2451
3	9.0781
4	16.2231
5	14.0007
6	5.7299
7	5.6322
8	11.1340
9	18.2226
10	12.3666
11	9.4833
12	21.7667
13	17.0749
14	9.8410
15	5.1906
16	1.9557
17	4.5262
18	7.8777
19	6.0625
20	3.7040
21	5.8786
22	2.1597
23	1.0464
24	1.1949
25	1.4375

25	1.4375
26	11.8222
27	6.8493
28	7.5071
29	8.7050
30	9.2706
31	4.4233
32	4.4781
33	7.1059
34	10.6168
35	4.3562
36	4.5949
37	9.1929
38	5.9352
39	3.8492
40	4.5860
41	9.1259
42	7.6635
43	4.2707
44	3.2537
45	7.3587
46	6.8535
47	6.8986
48	5.3204
49	9.8371
50	11.4968
51	10.4839
52	7.1993
53	11.1854
54	0.2400
55	0.4074

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	CANT.	TOTAL
CIMENTACIÓN DENTRO DE ÁREA ESTRUCTURA EXISTENTE						
En vigas de cimentación	114.16	0.25	0.33	28.54	1.0	9.42
En placa de contrapiso			0.70	209.40	1.0	146.58
Alrededor de zapatas tipo 1			1.10	1.12	30.0	36.96
Alrededor de zapatas tipo 2			1.10	0.78	8.0	6.86
Alrededor de zapatas tipo 3			1.10	1.60	1.0	1.76
Sobre zapatas tipo 1			0.80	1.44	30.0	34.56
Sobre zapatas tipo 2			0.80	1.50	8.0	9.6
Sobre zapatas tipo 3			0.80	2.88	1.0	2.3
Descuento de columnas			0.80	4.58	1.0	-3.66
Descuento de vigas			0.22	22.85	1.0	-5.03
CIMENTACIÓN EN ZONA VERDE EXISTENTE						
En vigas de cimentación	52.61	0.25	0.44	13.1525	1.0	5.72
En placa de contrapiso			0.66	92.88	1.0	61.07
Relleno alrededor de zapatas tipo 1			1.10	1.12	10.0	12.32
Relleno alrededor de zapatas tipo 2			1.10	0.78	2.0	1.72
Relleno alrededor de zapatas tipo 3			1.10	1.60	1.00	1.76
Relleno alrededor de zapatas tipo 4			1.10	1.04	4.00	4.58
Relleno sobre zapatas tipo 1			0.80	1.44	10.0	11.52
Relleno sobre zapatas tipo 2			0.80	1.5	2.0	2.4
Relleno sobre zapatas tipo 3			0.80	2.88	1.00	2.3
Relleno sobre zapatas tipo 4			0.80	1.21	4.00	3.87
Descuento de columnas			0.80	1.61	1.0	-1.29
Descuento de vigas			0.27	8.17	1.0	-2.21

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 1. PRE-FIS-GAITAN

CANTIDAD PRESENTE HOJA 343.11

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6396


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION						
	Infraestructura						
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025		
	MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN						
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.	1700 de 2025

CAPITULO	2.00	ITEM	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.	2.02	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

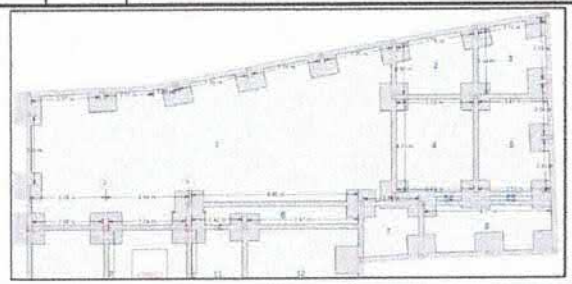





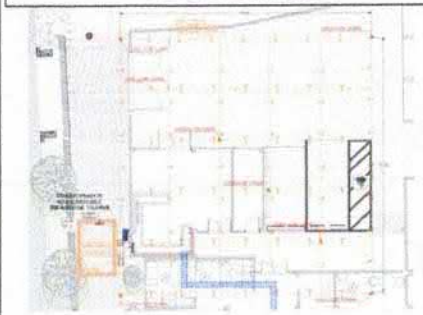



DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	CANT.	TOTAL
CIMENTACIÓN PÉRGOLA PARQUEADERO						
Relleno para zona de parqueadero			0.6	245.63	1.0	153.52
Alrededor de zapatas			1.00	0.96	7	6.72
Sobre zapatas			0.7	1.0	7	4.9
CIMENTACIÓN MURO PERIMETRAL						
Alrededor de Zapatas (TIPO 6)			1.00	0.68	5.00	3.4
Sobre zapatas			0.70	1.00	5.00	3.5
Descuento de columnas			0.70	0.06	5.0	-0.22
TANQUE SUBTERRANEO EXISTENTE						
Relleno para tanque existente	5.00	4.00	3.3	20	1	66.00
RED ELÉCTRICA						
CANALIZACIONES						
De caja mt2 a caja cs 290 trafo	30.00	0.5	0.9			13.50
De caja cs 290 trafo a celda medida	1.00	0.5	0.9			0.45
MALLA A TIERRA						
Malla a tierra parqueadero	180.00	0.4	0.5			36.00
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	287.77
					VIENE HOJA 1	343.11
					SUBTOTAL	630.88

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 2.0 MDT-CON-FIS- GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6397

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.	1700 de 2025

CAPITULO	2.00	ITEM	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.	2.02	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

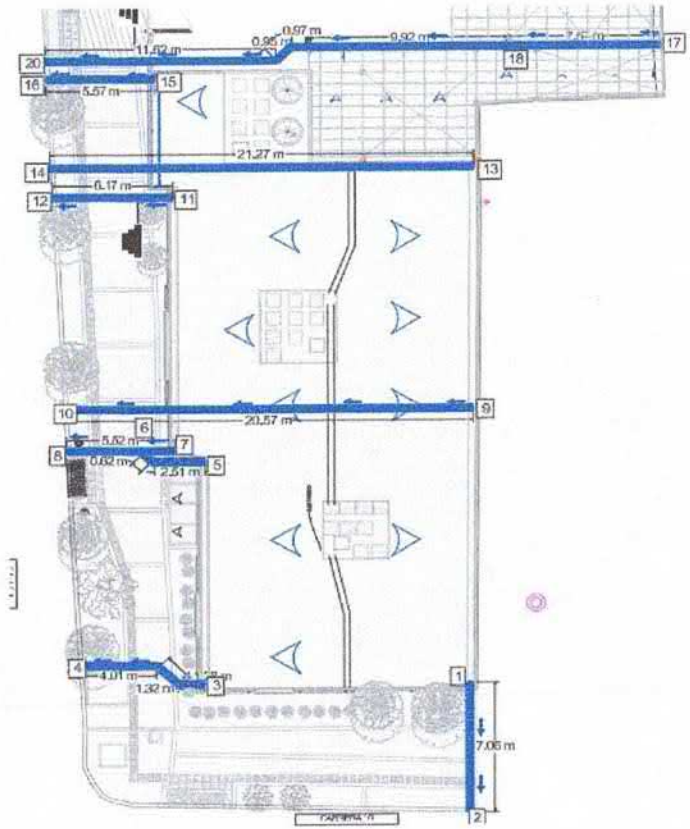

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	CANT.	TOTAL
RED PLUVIAL 4"	L	A	H	DC= AREA TUB * L	C	L*A*H*C-DC
Tramo 1 a 2	7.06	0.3016	0.2	0.057	1.0	0.37
Tramo 3 a 4	6.61	0.3016	0.2	0.054	1.0	0.34
Tramo 5 a 6	3.13	0.3016	0.2	0.025	1.0	0.16
Tramo 7 a 8	5.52	0.3016	0.2	0.045	1.0	0.29
Tramo 9 a 10	20.57	0.3016	0.2	0.167	1.0	1.07
Tramo 11 a 12	6.17	0.3016	0.2	0.05	1.0	0.32
Tramo 13 a 14	21.27	0.3016	0.2	0.172	1.0	1.11
Tramo 15 a 16	5.57	0.3016	0.2	0.045	1.0	0.29
Tramo 17 a 18	7.57	0.3016	0.2	0.061	1.0	0.40
Tramo 18 a 19	9.92	0.3016	0.2	0.08	1.0	0.52
Tramo 19 a 20	13.54	0.3016	0.2	0.11	1.0	0.71
RED SANITARIA 2"	L	A	H	DC= AREA TUB * L	C	L*A*H*C-DC
Tramo 1 a 2	29.230	0.2708	0.25	0.059	1.0	1.92
Tramo 4 a 5	5.714	0.2708	0.25	0.012	1.0	0.37
Tramo 6 a 7	2.323	0.2708	0.25	0.005	1.0	0.15
Tramo 10 a 11	5.269	0.2708	0.25	0.011	1.0	0.35
Tramo 12 a 13	5.943	0.2708	0.25	0.012	1.0	0.39
Tramo 14 a 15	1.017	0.2708	0.25	0.002	1.0	0.07
Tramo 16 a 17	2.913	0.2708	0.25	0.006	1.0	0.19
Tramo 18 a 19	1.196	0.2708	0.25	0.002	1.0	0.08
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	9.10
					VIENE HOJA 2	630.88
					SUBTOTAL	639.98

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 12.1 ELEC-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6398

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	2.00	ITEM	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.	2.02	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

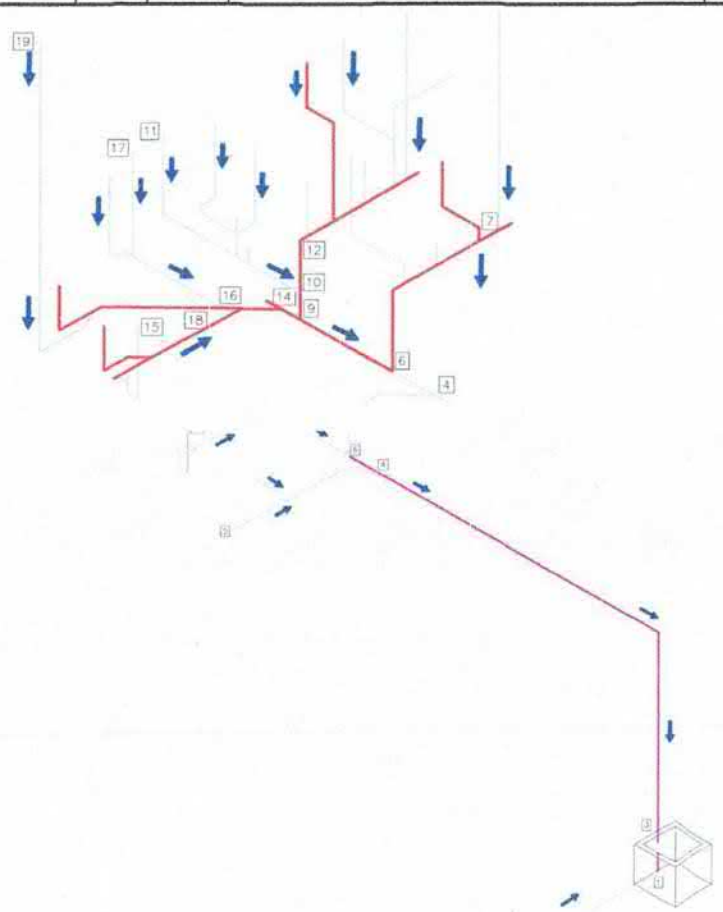

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (m)	DESCUENTO TUBO	CANT.	TOTAL
RED SANITARIA 4"						
Tramo 6 a 7	4.809	0.3216	0.30	0.039	1.0	0.42
Tramo 6 a 9	1.840	0.3216	0.30	0.015	1.0	0.16
Tramo 9 a 10	0.480	0.3216	0.30	0.004	1.0	0.04
Tramo 10 a 12	0.940	0.3216	0.30	0.008	1.0	0.08
Tramo 12 a 13	4.660	0.3216	0.30	0.038	1.0	0.41
Tramo 9 a 14	0.663	0.3216	0.30	0.005	1.0	0.06
Tramo 14 a 15	4.159	0.3216	0.30	0.034	1.0	0.37
Tramo 14 a 16	0.350	0.3216	0.30	0.003	1.0	0.03
Tramo 16 a 18	0.330	0.3216	0.30	0.003	1.0	0.03
Tramo 18 a 19	2.633	0.3216	0.30	0.021	1.0	0.23
RED SANITARIA 6"						
Tramo 1 a 2	29.230	0.3724	0.35	0.533	1.0	3.28
Tramo 4 a 5	5.714	0.3724	0.35	0.104	1.0	0.64

CANTIDAD PRESENTE HOJA	5.76
VIENE HOJA 3	639.98
CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	678.97
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	645.74
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	33.22
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	645.74

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. HIDRO-SA-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6399

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	2.00	ITEM	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG. COMPACTACIÓN MANUAL.	2.02	UNIDAD	M3		UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6400

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	2.00	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	2.03	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

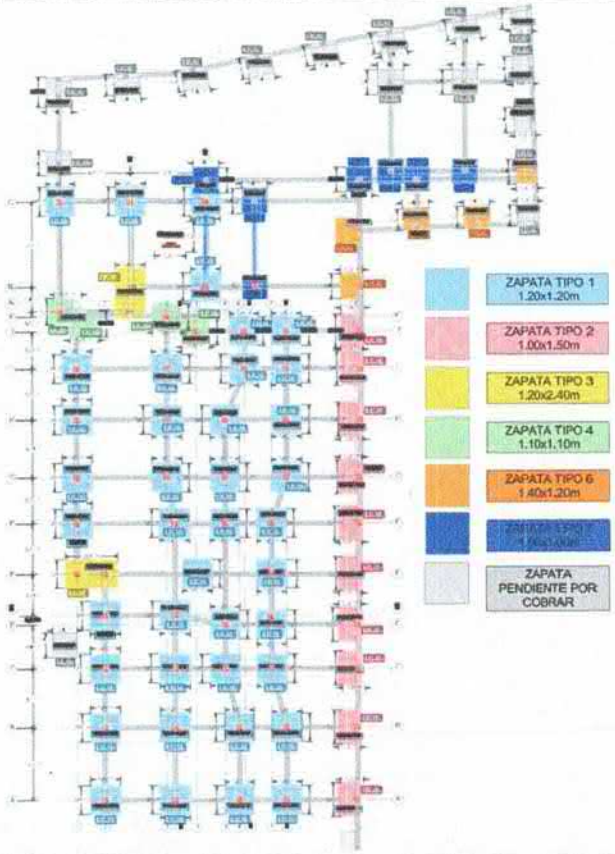

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (m)**	**PROFUNDIDAD (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
	L	**A**	**S**	**P**	**C**	**(L+2*S)*(A+2*S)*P*C**
CIMENTACIÓN EDIFICACIÓN						
Zapatas tipo 1	1.2	1.2	0.2	0.4	40.0	40.96
Zapatas tipo 2	1.5	1.0	0.2	0.4	10.0	10.64
Zapatas tipo 3	2.4	1.2	0.2	0.4	2.0	3.58
Zapatas tipo 4	1.10	1.1	0.2	0.4	4.0	3.6
CIMENTACIÓN PÉRGOLA PARQUEADERO						
Zapatas (TIPO 7)	1.00	1.00	0.2	0.4	7.0	5.49
CIMENTACIÓN MURO PERIMETRAL						
Zapatas (TIPO 6)	1.40	1.20		0.4	5.0	3.36

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**80.23**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	67.63
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	12.60
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	67.63

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 2.0 MDT-CON-FIS- GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BADILLO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	2.00	ITEM	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	2.03	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6402

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025


CAPITULO	2.00	ITEM	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	I.C. 2.07	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN










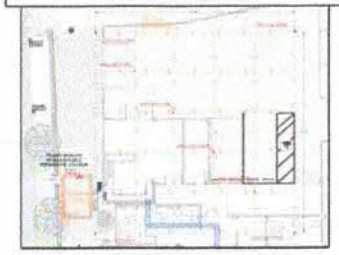



DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	SOBREANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	ÁREA (m2)	TOTAL
	L	A	S	P	Ar	P*Ar
EN ÁREA DE EDIFICACIÓN						
En zona de placa existente				0.15	280.92	42.14

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	ANCHO (M)	SOBREANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	CANT.	TOTAL
PARA ZAPATAS EDIFICACIÓN	L	A	S	P	C	(L+2*S)*(A+2*S)*P*C
Zapatas tipo 1	1.2	1.2	0.2	0.91	40.0	93.18
Zapatas tipo 2	1.5	1.0	0.2	0.91	10.0	20.75
Zapatas tipo 3	2.4	1.2	0.2	0.91	2.00	8.15
Zapatas tipo 4	1.10	1.1	0.2	0.91	4.00	8.19
Vigas de cimentación	166.77	0.25		0.3	1.00	12.51
CIMENTACIÓN PÉRGOLA PARQUEADERO						
Zapatas	1.00	1.00	0.2	0.49	7	6.72
CIMENTACIÓN MURO PERIMETRAL						
Zapatas (TIPO 6)	1.40	1.20		0.49	5	4.12
TANQUE SUBTERRANEO	L	A	S	P	C	(L+2*S)*(A+2*S)*P*C
	1.70	1.70	0.20	1.95	1	8.6
CANALIZACIONES						
De caja mt2 a caja cs 290 trafo	30.00	0.5	0.9			13.50
PUESTA A TIERRA						
Malla a tierra parqueadero	15.00	0.4	0.5		12.0	36.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver pianos 1. PRE-FIS-GAITAN

CANTIDAD PRESENTE HOJA: 253.86

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6403

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN								
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	2.00	ITEM	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	I.C. 2.07	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		

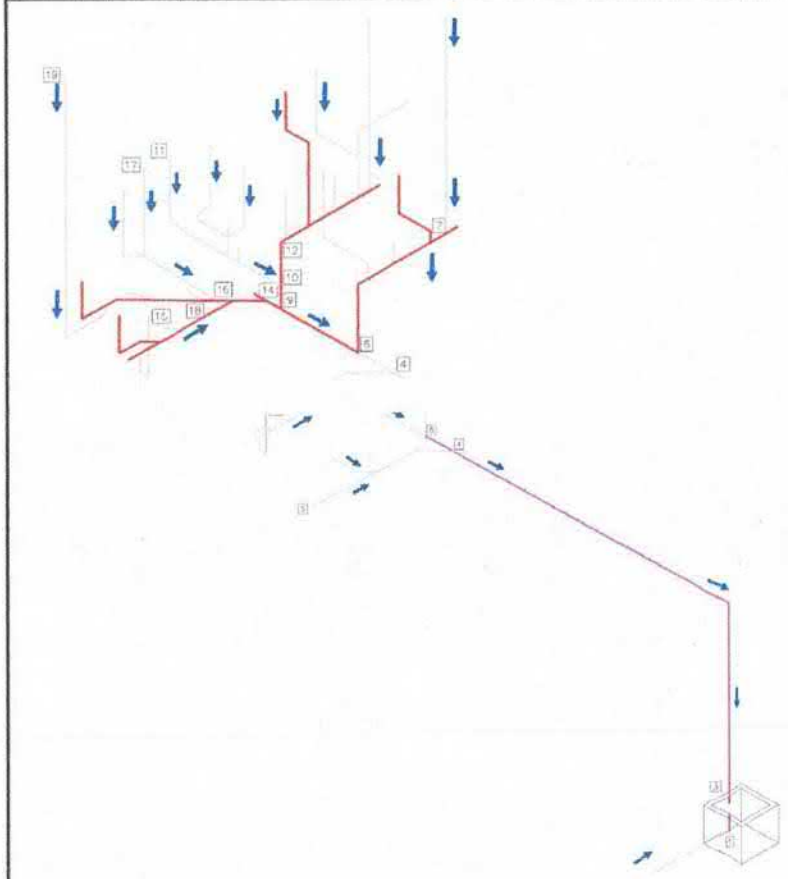

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO(m)	RECORRIDO	CANTIDAD	TOTAL
RED PLUVIAL						
Tramo 1 a 2	7.06	0.30	0.2		1.00	0.43
Tramo 3 a 4	6.61	0.30	0.2		1.00	0.40
Tramo 5 a 6	3.13	0.30	0.2		1.00	0.19
Tramo 7 a 8	5.52	0.30	0.2		1.00	0.33
Tramo 9 a 10	20.57	0.30	0.2		1.00	1.24
Tramo 11 a 12	6.17	0.30	0.2		1.00	0.37
Tramo 13 a 14	21.27	0.30	0.2		1.00	1.28
Tramo 15 a 16	5.57	0.30	0.2		1.00	0.34
Tramo 17 a 18	7.57	0.30	0.2		1.00	0.46
Tramo 18 a 19	9.92	0.30	0.2		1.00	0.60
Tramo 19 a 20	13.54	0.30	0.2		1.00	0.82
RED SANITARIA 2"						
Tramo 1 a 2	29.23	0.27	0.25		1.00	1.98
Tramo 4 a 5	5.71	0.27	0.25		1.00	0.39
Tramo 6 a 7	2.32	0.27	0.25		1.00	0.16
Tramo 10 a 11	5.27	0.27	0.25		1.00	0.36
Tramo 12 a 13	5.94	0.27	0.25		1.00	0.40
Tramo 14 a 15	1.02	0.27	0.25		1.00	0.07
Tramo 16 a 17	2.91	0.27	0.25		1.00	0.20
Tramo 18 a 19	1.20	0.27	0.25		1.00	0.08
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	10.10
					VIENE HOJA 1	253.86
					SUBTOTAL	263.96

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 12.1 ELEC-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6404

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	2.00	ITEM	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	I.C. 2.07	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

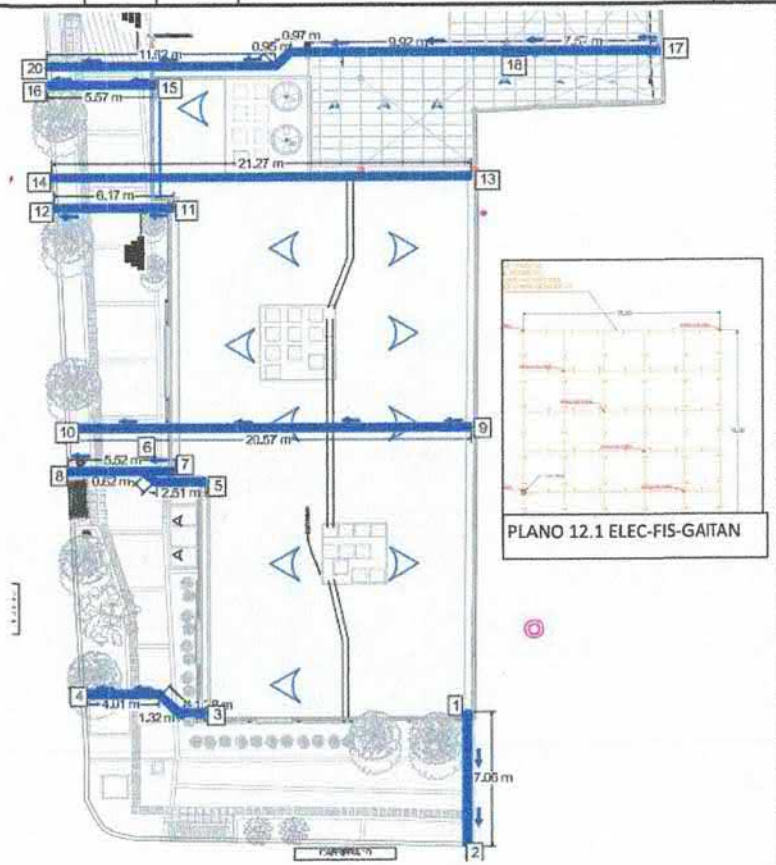

PLANO 12.1 ELEC-FIS-GAITAN

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO(m)	RECORRIDO	CANTIDAD	TOTAL
RED SANITARIA 4"						
Tramo 6 a 7	4.81	0.32	0.30		1.00	0.46
Tramo 6 a 9	1.84	0.32	0.30		1.00	0.18
Tramo 9 a 10	0.48	0.32	0.30		1.00	0.05
Tramo 10 a 12	0.94	0.32	0.30		1.00	0.09
Tramo 12 a 13	4.66	0.32	0.30		1.00	0.45
Tramo 9 a 14	0.66	0.32	0.30		1.00	0.06
Tramo 14 a 15	4.16	0.32	0.30		1.00	0.40
Tramo 14 a 16	0.35	0.32	0.30		1.00	0.03
Tramo 16 a 18	0.33	0.32	0.30		1.00	0.03
Tramo 18 a 19	2.63	0.32	0.30		1.00	0.25
RED SANITARIA 6"						
Tramo 1 a 2	29.23	0.37	0.35		1.00	3.81
Tramo 4 a 5	5.71	0.37	0.35		1.00	0.74

CANTIDAD PRESENTE HOJA	6.55
VIENE HOJA 2	263.96
CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	361.45
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	270.51
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	90.94
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	270.51

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. HIDRO-SA-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6405

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	2.00	ITEM	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	I.C. 2.07	UNIDAD	M3		UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN								
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	16	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO 3,00 CIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO


6407

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	3.01	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		

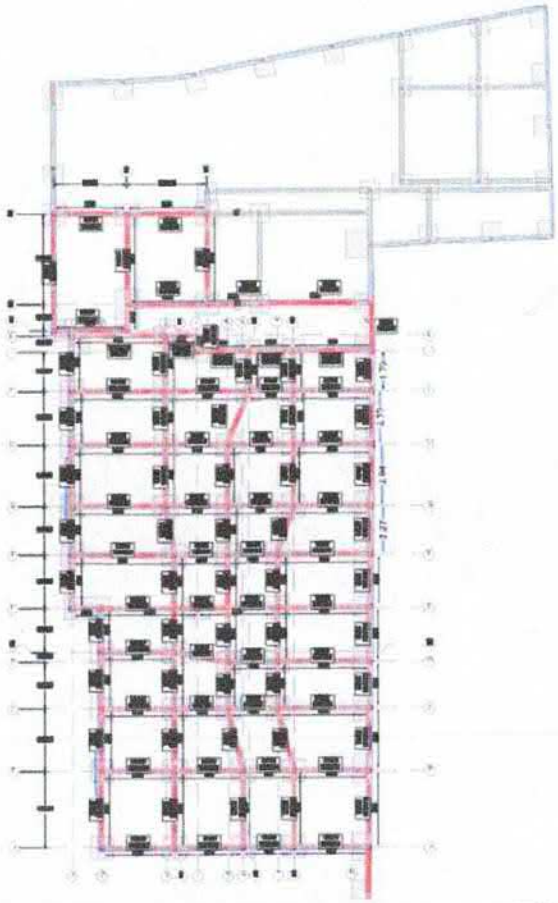

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	TOTAL
ESTRUCTURA PRINCIPAL VIGAS DE CIMENTACIÓN						
V-101	12.42	0.25		0.05	1	0.16
V-102	12.46	0.25		0.05	1	0.16
V-103	12.49	0.25		0.05	1	0.16
V-104	12.55	0.25		0.05	1	0.16
V-105	14.13	0.25		0.05	1	0.18
V-106	14.06	0.25		0.05	1	0.18
V-107	14.07	0.25		0.05	1	0.18
V-108	14.06	0.25		0.05	1	0.18
V-109	14.09	0.25		0.05	1	0.18
V-110-A	8.08	0.25		0.05	1	0.10
V-110-B	5.77	0.25		0.05	1	0.07
V-111	12.96	0.25		0.05	1	0.16
V-112	11.47	0.25		0.05	1	0.14
V-113	24.57	0.25		0.05	1	0.31
V-114	0.83	0.25		0.05	1	0.01
V-115	23.87	0.25		0.05	1	0.3
V-116	23.83	0.25		0.05	1	0.3
V-117	23.55	0.25		0.05	1	0.29
V-118	3.43	0.25		0.05	1	0.04
V-119	3.64	0.25		0.05	1	0.05
V-120	7.22	0.25		0.05	1	0.09
V-121	5.87	0.25		0.05	1	0.07
V-122	5.67	0.25		0.05	1	0.07
V-123	4.47	0.25		0.05	1	0.06
V-124	7.8	0.25		0.05	1	0.1
V-125	2.21	0.25		0.05	1	0.03
					CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	5.31
					ACUMULADO ACTAS PARCIALES	3.73
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	1.58
					CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	3.73

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 2.0 MDT-CON-FIS- GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6408

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025
CAPITULO	3.00	ITEM	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	3.01	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL ERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6409

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION


Infraestructura


Codigo:INF-FR-20 | Versión: 04 | Vigencia:10-01-2025


MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN


ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.	1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	3.02	UNIDAD	KG	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

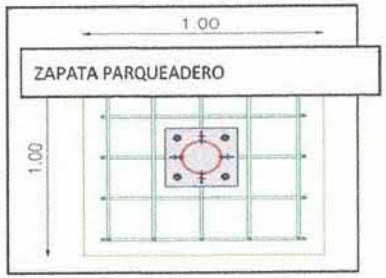

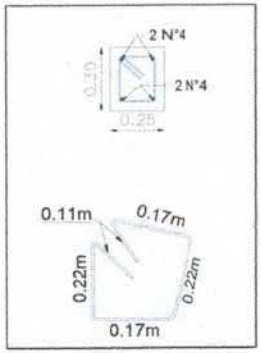

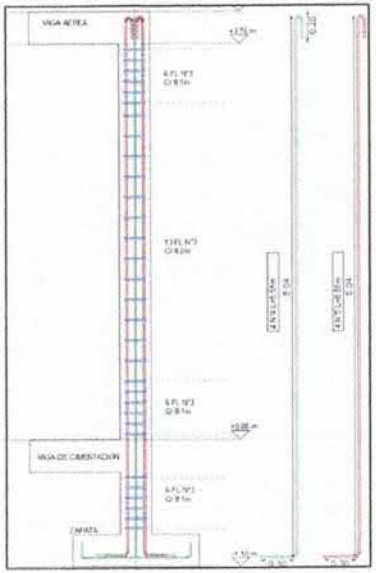

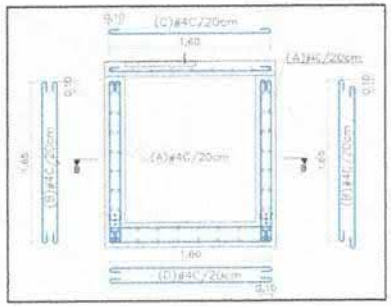

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	DIÁMETRO DE VARILLA (in)	PESO POR METRO (KG)	PESO TOTAL (KG)	CANTIDAD	TOTAL
Vigas de cimentación	2337.00	3/8	0.56	1308.72		2721.28
	1421.09	1/2	0.99	1412.56		
Vigas de aéreas	3486.00	3/8	0.56	1952.16		3598.12
	1576.27	1/2	0.99	1566.81		
	51.00	5/8	1.55	79.15		
Columnas y pedestales	2007.30	3/8	0.56	1124.09		4487.30
	1219.46	1/2	0.99	1212.14		
	1386.00	5/8	1.55	2151.07		
Zapatas	1040.35	1/2	0.99	1034.11		1034.11
Placa tanques y aires	669.46	1/2	0.99	665.44		665.44
Viga cinta	683.10	3/8	0.56	382.54		675.97
	295.20	1/2	0.99	293.43		

DESCRIPCIÓN	LONG. (M)	DIÁMETRO DE VARILLA (in)	PESO POR METRO (KG)	CANTIDAD VARILLAS	CANTIDAD ELEMENTOS	TOTAL
	L		P VAR	C var	C ele	(L x C var x P var) x C ele
ACERO DE TANQUE SUBTERRANEO						
Base y tapa (acero longitudinal)	1.8	1/2	0.99	16	2	57.25
Base y tapa (acero transversal)	1.8	1/2	0.99	16	2	57.25
Muro (acero longitudinal)	1.8	1/2	0.99	16	4	114.51
Muros (acero transversal)	1.8	1/2	0.99	16	4	114.51
Paso acceso	1.32	5/8	1.552	5	1	10.24
MURO PERIMETRAL						
Zapatas	1.15	1/2	0.99	10	17	194.33
Columnas	7.715	5/8	1.552	4	18	862.10
	0.74	3/8	0.56	37	1	15.33

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

CANTIDAD PRESENTE HOJA: 14,607.74

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6410

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION


Infraestructura


Codigo:INF-FR-20 | Versión: 04 | Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	3.02	**UNIDAD**	KG	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

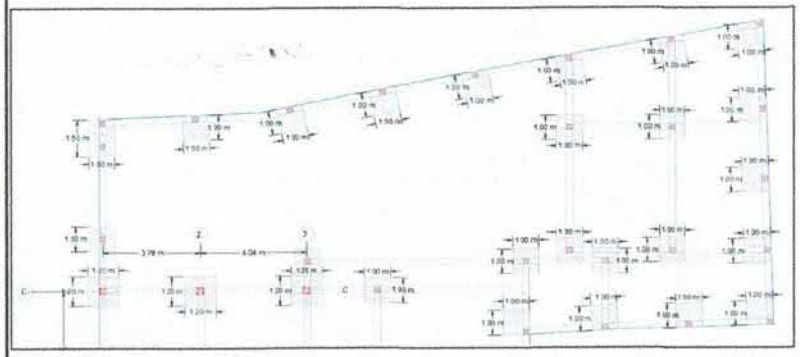

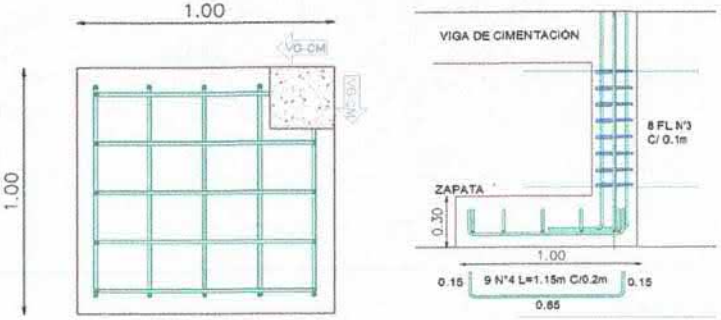

DESCRIPCIÓN	**LONG. (M)**	**DIÁMETRO DE VARILLA (In)**	**PESO POR METRO (KG)**	**CANTIDAD VARILLAS**	**CANTIDAD ELEMENTOS**	**TOTAL**
PERGOLA DE PARQUEADERO						
Zapatas	1.15	1/2	0.99	10	9	102.88
Pedestales	1.615	1/2	0.99	4	9	57.79
	0.74	3/8	0.56	4	1	1.66

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	3.02	UNIDAD	KG	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN		





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6412

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025			
	MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN							
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3.03	UNIDAD	KG	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		



DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DE MALLA	PESO X M2 DE MALLA (Kg)	ALTO (m)	TRASLAPO (m2)	CANTIDAD	TOTAL
Placa de contrapiso	7	4.071	386.01	34.22		1710.73

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	2,418.57
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	1,710.73
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	707.84
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	1,710.73

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 2.0 MDT-CON-FIS- GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025
CAPITULO	3.00	ITEM	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3.03	UNIDAD	KG	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN


ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.04	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

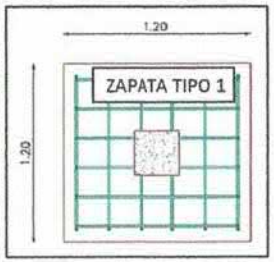


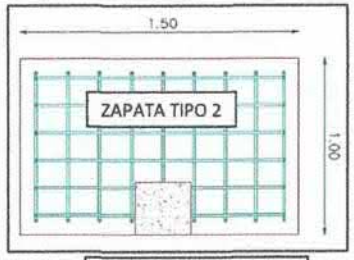


ZAPATA PARQUEADERO




ZAPATA TIPO 3



ZAPATA TIPO 4



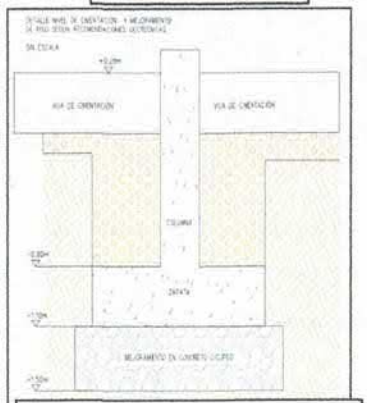

SECCION TRANSVERSAL CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
CIMENTACIÓN EDIFICACIÓN						
Zapatas tipo 1	1.2	1.2	0.3	0.43	40.0	17.28
Zapatas tipo 2	1.5	1.0	0.3	0.45	10.0	4.50
Zapatas tipo 3	2.4	1.2	0.3	0.86	2.00	1.73
Zapatas tipo 4	1.10	1.1	0.3	0.36	4.00	1.45
CIMENTACIÓN PÉRGOLA PARQUEADERO						
Zapatas (TIPO 7)	1.00	1.00	0.3	0.30	7.00	2.10
CIMENTACIÓN MURO PERIMETRAL						
Zapatas (TIPO 6)	1.00	1.00	0.3	0.30	5.00	1.50
					CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**37.10**
					ACUMULADO ACTAS PARCIALES	28.56
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	8.54
					CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**28.56**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO PACHECO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6415

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.04	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	



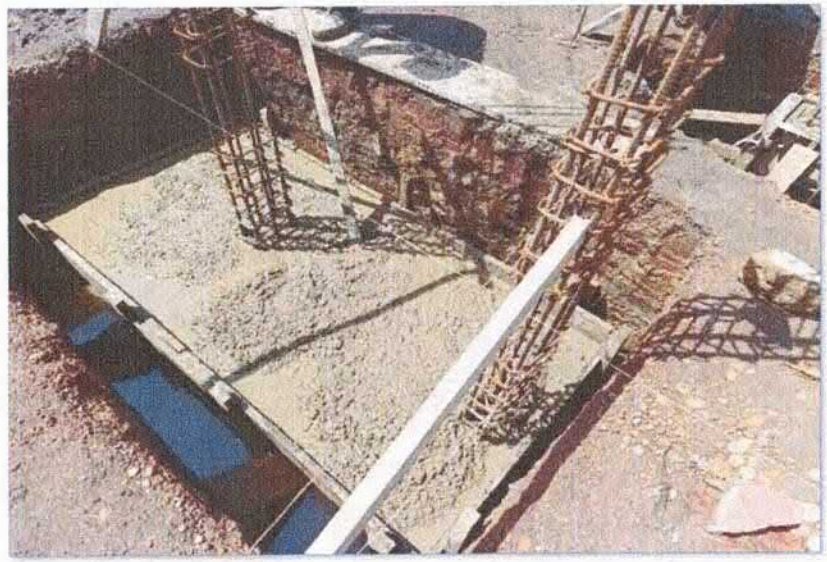

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6476

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	9020173991-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	9020134420		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.05	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		

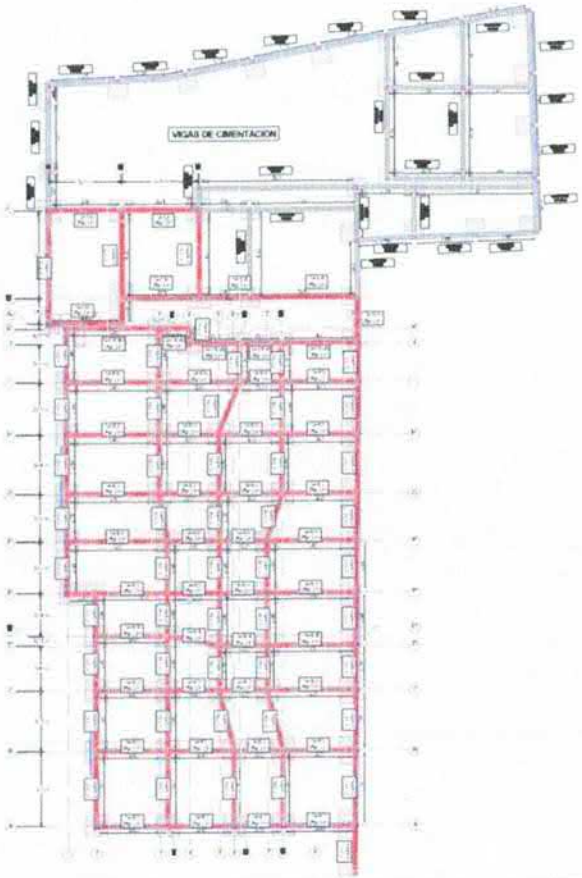

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	TOTAL
ESTRUCTURA PRINCIPAL VIGAS DE CIMENTACIÓN						
V-101	12.42	0.25		0.30	1	0.93
V-102	12.48	0.25		0.30	1	0.93
V-103	12.49	0.25		0.30	1	0.94
V-104	12.55	0.25		0.30	1	0.94
V-105	14.13	0.25		0.30	1	1.06
V-106	14.06	0.25		0.30	1	1.05
V-107	14.07	0.25		0.30	1	1.06
V-108	14.03	0.25		0.30	1	1.05
V-109	14.09	0.25		0.30	1	1.06
V-110-A	8.08	0.25		0.30	1	0.61
V-110-B	5.77	0.25		0.30	1	0.43
V-111	12.93	0.25		0.30	1	0.97
V-112	11.47	0.25		0.30	1	0.86
V-113	24.57	0.25		0.30	1	1.84
V-114	0.83	0.25		0.30	1	0.06
V-115	23.90	0.25		0.30	1	1.79
V-116	23.83	0.25		0.30	1	1.79
V-117	23.55	0.25		0.30	1	1.77
V-118	3.43	0.25		0.30	1	0.26
V-119	3.64	0.25		0.30	1	0.27
V-120	7.22	0.25		0.30	1	0.54
V-121	5.87	0.25		0.30	1	0.44
V-122	5.67	0.25		0.30	1	0.43
V-123	4.47	0.25		0.30	1	0.34
V-124	7.58	0.25		0.30	1	0.57
V-125	2.21	0.25		0.30	1	0.17
					CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA		31.00
					ACUMULADO ACTAS PARCIALES		22.16
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		8.84
					CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA		22.16

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO SAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA MARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6417

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025		
CAPITULO	3.00	ITEM	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.05	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN		





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6418

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.06	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ÁREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL
Placa contrapiso			0.08	386.01	1.0	30.88

6419

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.06	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN		





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6420

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.07	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		

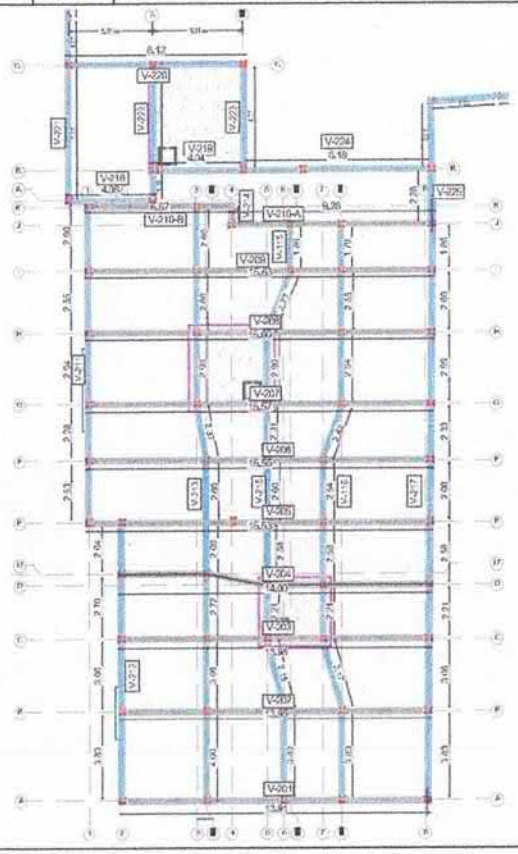

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIÓN N+4.06						
V-201	13.91	0.25	0.3	1.04	1.0	1.04
V-202	13.95	0.25	0.3	1.05	1.0	1.05
V-203	13.98	0.25	0.3	1.05	1.0	1.05
V-204	13.8	0.25	0.3	1.04	1.0	1.04
V-205	15.53	0.25	0.3	1.16	1.0	1.16
V-206	15.55	0.25	0.3	1.17	1.0	1.17
V-207	15.57	0.25	0.3	1.17	1.0	1.17
V-208	15.60	0.25	0.3	1.17	1.0	1.17
V-209	15.63	0.25	0.3	1.17	1.0	1.17
V-210A	9.28	0.25	0.3	0.70	1.0	0.70
V-210B	6.67	0.25	0.3	0.50	1.0	0.50
V-211	13.20	0.25	0.3	0.99	1.0	0.99
V-212	11.62	0.25	0.3	0.87	1.0	0.87
V-213	25.12	0.25	0.3	1.88	1.0	1.88
V-214	0.58	0.25	0.3	0.04	1.0	0.04
V-215	24.29	0.25	0.3	1.82	1.0	1.82
V-216	24.05	0.25	0.3	1.80	1.0	1.80
V-217	24.05	0.25	0.3	1.80	1.0	1.80
V-218	4.08	0.25	0.3	0.31	1.0	0.31
V-219	4.04	0.25	0.3	0.30	1.0	0.30
V-220	8.12	0.25	0.3	0.61	1.0	0.61
V-221	5.97	0.25	0.3	0.45	1.0	0.45
V-222	4.52	0.25	0.3	0.34	1.0	0.34
V-223	4.57	0.25	0.3	0.34	1.0	0.34
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	22.77

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.	1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.07	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN





DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
V-224	8.18	0.25	0.3	0.61	1.0	0.61
V-225	2.28	0.25	0.3	0.17	1.0	0.17
EDIFICACIÓN N+5.44						
V-303	2.85	0.25	0.3	0.21	1.0	0.21
V-304	2.85	0.25	0.3	0.21	1.0	0.21
V-307	3.45	0.25	0.3	0.26	1.0	0.26
V-308	3.45	0.25	0.3	0.26	1.0	0.26
V-313	3.02	0.25	0.3	0.23	1.0	0.23
V-315A	2.26	0.25	0.3	0.17	1.0	0.17
V-315B	3.02	0.25	0.3	0.23	1.0	0.23
V-316	2.26	0.25	0.3	0.17	1.0	0.17
V-319	4.29	0.25	0.3	0.32	1.0	0.32
V-320	4.29	0.25	0.3	0.32	1.0	0.32
V-322	4.57	0.25	0.3	0.34	1.0	0.34
V-323	4.57	0.25	0.3	0.34	2.0	0.69
CULATAS DE CUBIERTA						
Eje B	11.8	0.15	0.30	0.53	1.0	0.53
Eje C	9.28	0.15	0.30	0.42	1.0	0.42
Eje E	11.77	0.15	0.30	0.53	1.0	0.53
Eje F	13.06	0.15	0.30	0.59	1.0	0.59
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	6.26
					VIENE HOJA 1	22.77
					SUBTOTAL	29.03

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAPAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6422

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.07	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN





DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Eje G	9.94	0.15	0.30	0.45	1.0	0.45
Eje H	9.94	0.15	0.30	0.45	1.0	0.45
Eje I	13.02	0.15	0.30	0.59	1.0	0.59
Eje J-K	13.15	0.15	0.30	0.59	1.0	0.59
Eje 3'	26.64	0.15	0.30	1.20	1.0	1.20
Eje 6	27.27	0.15	0.30	1.23	1.0	1.23
Eje 7	27.47	0.15	0.30	1.24	1.0	1.24

CANTIDAD PRESENTE HOJA	**5.75**
VIENE HOJA 1	**29.03**
CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**36.95**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	34.78
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	2.17
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**34.78**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6423

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.07	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN


ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.08	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		


COLUMNA TIPO 1



COLUMNA TIPO 2




COLUMNA TIPO 3




COLUMNA TIPO 4



COLUMNETA TIPO 1



COLUMNETA TIPO 2



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIÓN						
Columna tipo 1	0.30	0.30	3.68	0.33	40.0	13.25
Columna tipo 2	0.25	0.35	3.68	0.32	10.0	3.22
Columna tipo 3	0.30	0.30	4.76	0.43	2.00	0.86
Columna tipo 4	0.25	0.35	4.76	0.42	4.00	1.67
ACCESO FUNCIONARIOS						
Columnas	0.30	0.30	3.98	0.36	1.0	0.36
					CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**25.01**
					ACUMULADO ACTAS PARCIALES	19.36
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	5.65
					CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**19.36**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA JARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6425

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.08	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6476

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION			
Infraestructura			
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	3.09	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN





DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Fachada frontal						
Fiscal 3 (V-8)	Vigueta	2.66				2.66
Fiscal 2 (V-7)	Vigueta	2.55				2.55
Fiscal 1 (V-4)	Vigueta	0.54				0.54
	Columneta	2.80				2.80
Sala de juntas (V-9)	Vigueta	2.28				2.28
Acceso (P-1)	Vigueta	2.04				2.04
Recepción (V-1)	Vigueta	1.21				1.21
	Columneta	2.26				2.26
Coordinador CTI (V-2)	Vigueta	3.01				3.01
Investigadores (V-3)	Vigueta	3.75				3.75
Fachada lateral						
Protección y monitoreo (V-9)	Vigueta	1.20				1.20
Investigadores (V-3)	Vigueta	3.43				3.43
Investigadores (V-3)	Vigueta	3.18				3.18
Entrevistas (V-2)	Vigueta	2.32				2.32
Investigadores (V-5)	Vigueta	3.49				3.49
Oficinas internas						
Cuarto eléctrico (P1.1)	Vigueta	3.47				3.47
Cuarto eléctrico (PE-4)	Vigueta	2.07				2.07
	Columneta	2.6				2.60
Cuarto eléctrico (P-1.3)	Vigueta	1.97				1.97
	Columneta	2.55				2.55

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

CANTIDAD PRESENTE HOJA: 49.38

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6427

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	3.09	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

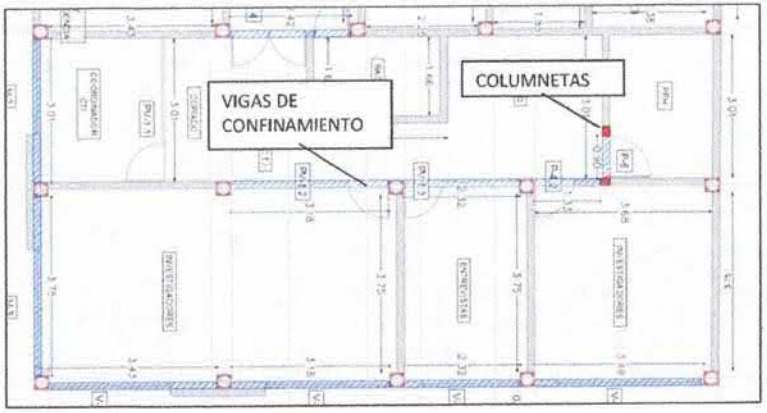

DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Residuos (V-6)	Vigueta	1.56				1.56
Residuos (V-6)	Vigueta	1.56				1.56
Residuos (PE-5)	Vigueta	4.47				4.47
Residuos (P-3)	Vigueta	1.56				1.56
Fiscal 3 (PV-1.7)	Vigueta	2.76				2.76
	Columneta	2.60				2.60
Fiscal 2 (PV-1.6)	Vigueta	2.81				2.81
	Columneta	2.60				2.60
Fiscal 1 (PV-1.5)	Vigueta	2.89				2.89
	Columneta	2.60				2.60
Sala de juntas (P-4.2)	Vigueta	1.65				1.65
Recepción y seguridad (P-7, V-1.1)	Vigueta	2.20				2.20
	Columneta	2.30				2.30
Orientador (PV-1.4)	Vigueta	2.30				2.30
Recepción y correspondencia (P-7)	Vigueta	0.90				0.90
	Columneta	2.30				2.30
Copiado (P-4.4)	Vigueta	2.43				2.43
Investigadores (PV-1.2)	Vigueta	3.18				3.18
Entrevistas (PV-1.3)	Vigueta	2.32				2.32
Investigadores (P-4.2)	Vigueta	1.33				1.33
	Columneta	2.30				2.30
Acceso a funcionarios (P-4.3)	Vigueta	2.35				2.35
Front office (V-1.1-1)	Vigueta	1.79				1.79
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	52.76
					VIENE HOJA 1	49.38
					SUBTOTAL	102.14

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL PERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	3.09	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

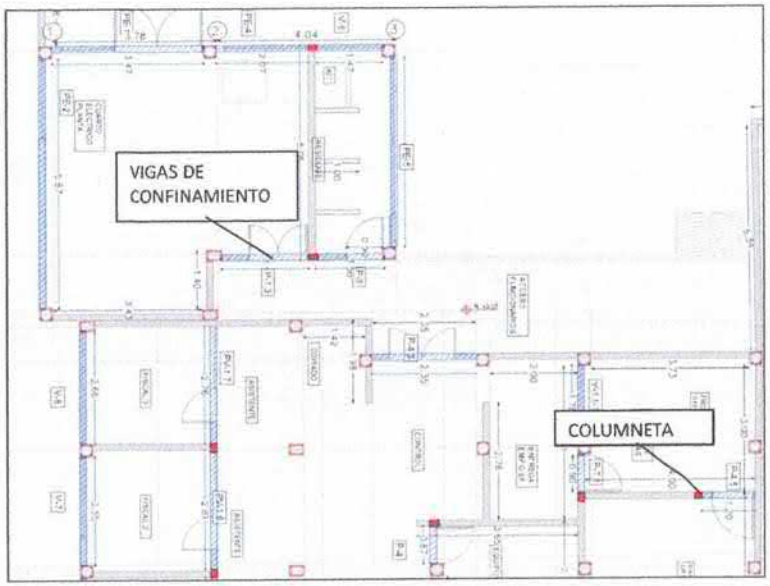

DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Front office (P-7.1)	Vigueta	0.90				0.90
	Columneta	2.30				2.30
Front office (P-4.5)	Vigueta	1.20				1.20
	Columneta	2.30				2.30
Cámara gessel	Vigueta	0.88				0.88
	Columneta	2.30				2.30
Entrevistas (P-4)	Vigueta	2.28				2.28
Cuarto seguridad (P-3.4)	Vigueta	1.22				1.22
	Columneta	2.30				2.30
Vestier celador (P-4)	Vigueta	0.96				0.96
	Columneta	2.30				2.30
Bodega (P-3)	Vigueta	0.95				0.95
	Columneta	2.30			2.0	4.60
Cafeteria (P-6)	Vigueta	1.95				1.95
	Columneta	2.30			2.0	4.60
W.C damas y caballeros (P-3.2)	Vigueta	1.55				1.55
	Columneta	2.30				2.30
Receptor denuncias (PV-1.8)	Vigueta	2.25				2.25
W.C Movilidad reducida	Vigueta	1.80				1.80
Laboratorio PPH	Vigueta	1.55				1.55
	Columneta	2.30				2.30
Antepechos muros de fachada lateral						
Viguetas		14.95				14.95
Columnetas	1	1.16			6.0	6.96
	2	1.86			2.0	3.72
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	68.42
					VIENE HOJA 2	102.14
					SUBTOTAL	170.56

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6429

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / Versión: 04 / Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	3.09	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

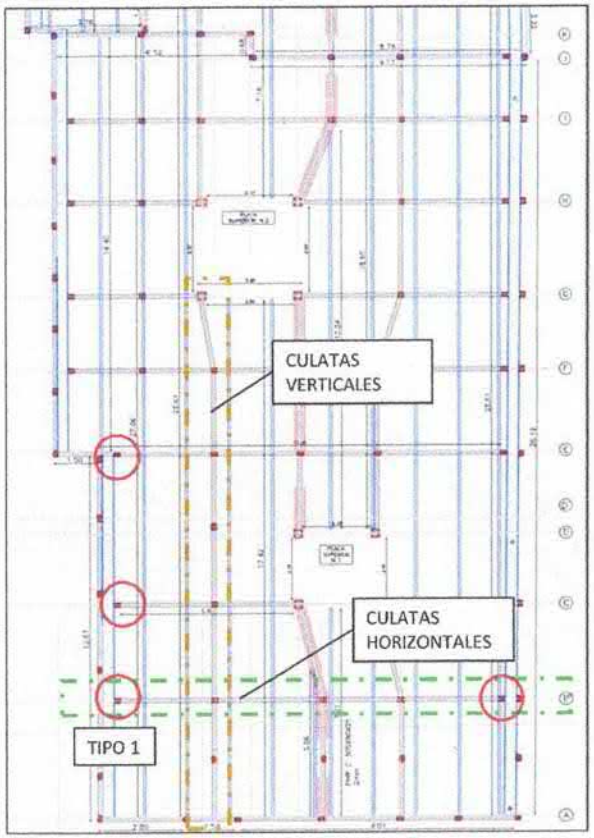

DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
ANTEPECHOS MUROS DE FACHADA PRINCIPAL						
Viguetas		33.85				33.85
Columnetas	1	1.16			8.0	9.28
	2	1.66			9.0	14.94
	3	0.71			1.0	0.71
ANTEPECHOS CUARTO ELÉCTRICO						
Viguetas		8.39			1.0	8.39
Columnetas		1.86			2.0	3.72
ANTEPECHOS ACCESO FUNCIONARIOS						
Viguetas		8.15			1.0	8.15
Columnetas		1.16			4.0	4.64
FACHADA COSTADO ESTE						
Viguetas		28.42			1.0	28.42
Columnetas		1.16			8.00	9.28
CULATAS DE CUBIERTA						
Columnetas culatas horizontales						
Tipo 1		0.42			16.0	6.72
Tipo 2		0.82			2.00	1.64
Tipo 3		1.08			1.0	1.08
Tipo 4		0.78			5.0	3.90
Tipo 5		1.20			2.0	2.40
Tipo 6		0.87			2.0	1.74
Tipo 7		0.65			5.0	3.25
Tipo 8		0.88			1.0	0.88
Tipo 9		1.30			2.0	2.60
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	145.59
					VIENE HOJA 3	170.56
					SUBTOTAL	316.15

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6430


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA Nº	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	ITEM	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	3.09	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN



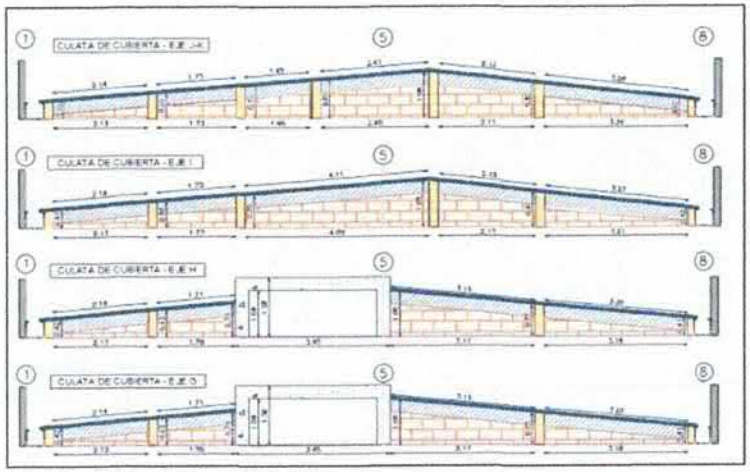

DESCRIPCIÓN	TIPO	LONGITUD (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Tipo 10		0.84			2.0	1.68
Tipo 11		1.01			1.0	1.01
Columnetas culatas verticales						
Tipo 1		0.84			1.0	0.84
Tipo 2		0.88			1.0	0.88
Tipo 3		0.73			5.0	3.65
Tipo 4		1.30			1.0	1.30
Tipo 5		1.20			2.0	2.40
Tipo 6		1.07			2.0	2.14
Tipo 7		0.78			5.0	3.90
Tipo 8		0.87			2.0	1.74

CANTIDAD PRESENTE HOJA	19.54
VIENE HOJA 4	316.15
CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	340.13
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	335.69
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	4.44
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	335.69

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6431

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS CONCRETO DE 2500PSI (0.15MX0.20M) PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2N4 FLEJES N3 CADA 20	3.09	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / Versión: 04 / Vigencia:10-01-2025	


MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.11	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

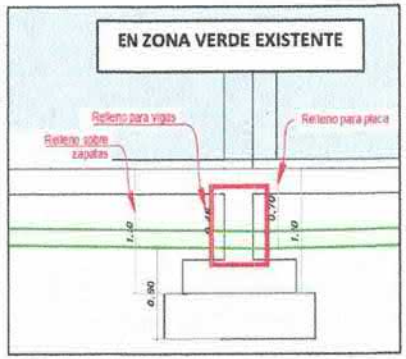

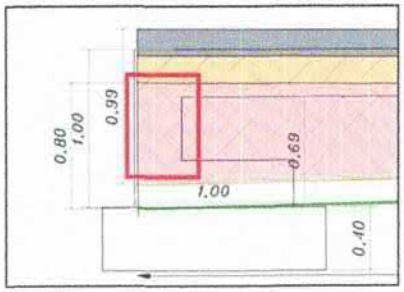

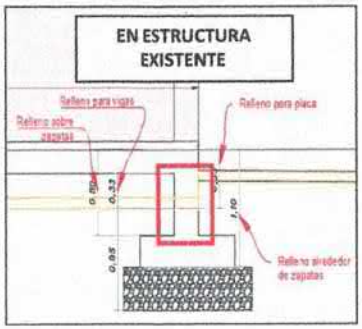

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIÓN						
Columna tipo 1	0.30	0.30	0.8	0.072	40.0	2.88
Columna tipo 2	0.25	0.35	0.8	0.070	10.0	0.7
Columna tipo 3	0.30	0.30	0.8	0.072	2.00	0.14
Columna tipo 4	0.25	0.35	0.8	0.070	4.00	0.28
MURO PERIMETRAL						
Columnas	0.25	0.25	0.70	0.044	4.0	0.18
PERGOLAS						
Parqueadero	0.25	0.25	0.70	0.044	7.0	0.31
Acceso	0.30	0.30	0.80	0.072	1.0	0.07
					CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**5.42**
					ACUMULADO ACTAS PARCIALES	4.56
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0.86
					CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**4.56**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3.11	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	



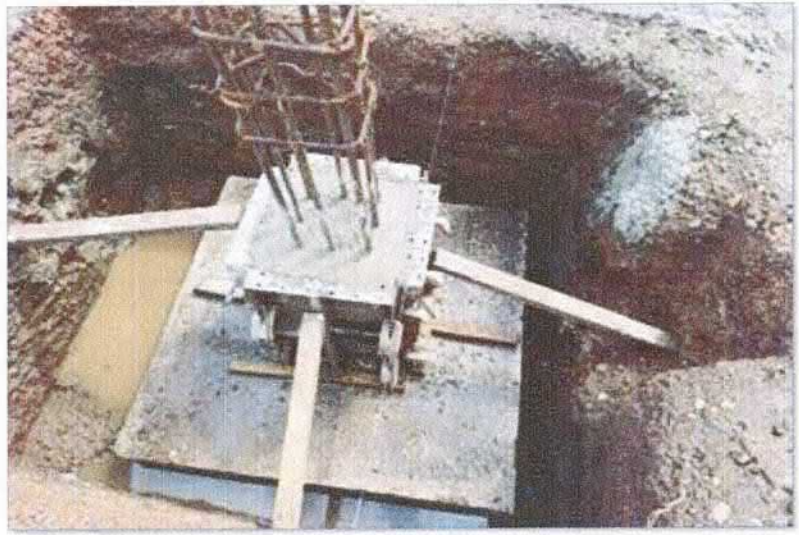

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL EZRREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6434


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	I.C. 3.16	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

PLACA SUPERIOR N°1 PLACA SUPERIOR N°2 PLACA SUPERIOR N°3

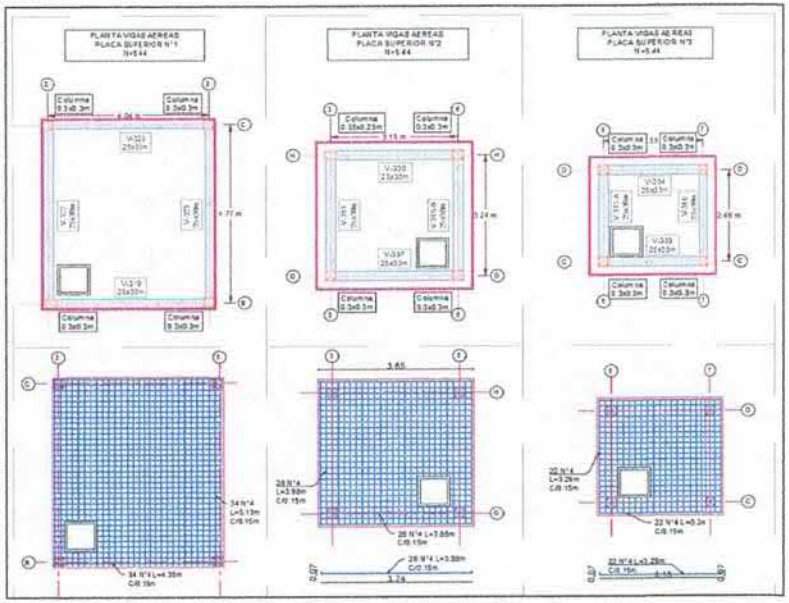

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIÓN						
Placa superior N° 2	3.85	3.94	0.15	2.28		2.28
Placa superior N° 3	3.25	3.16	0.15	1.54		1.54

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**7.12**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	3.82
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	3.30
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**3.82**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO CABRERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6935

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	I.C. 3.16	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BACUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6436

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	SUMINISTRO, MEZCLA Y COLOCACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI PARA TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE CURADOR BASE AGUA	I.C. 3.19	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

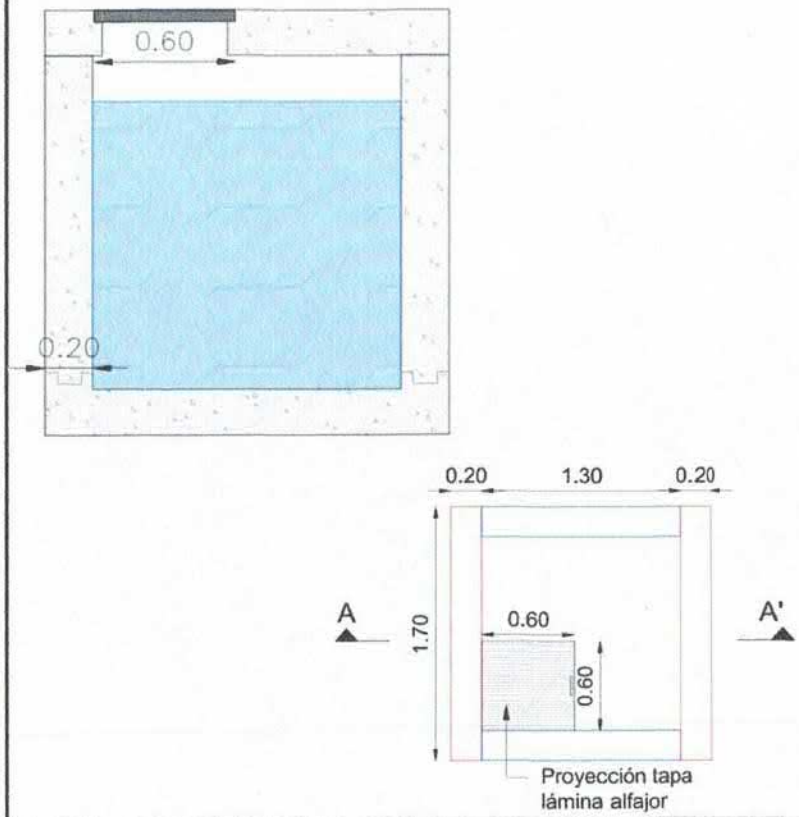

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE SUBTERRANEO						
Muros horizontales	1.70	0.20	0.34	1.500	2.0	1.02
Muros laterales	1.30	0.20	0.26	1.500	2.0	0.78
Placa de concreto	1.70	1.70	2.89	0.150	2.0	0.87
Descuento tapa tanque	0.70	0.70	0.49	0.150	1.0	-0.07

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**2.88**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	2.60
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0.28
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**2.60**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 3.0 DIS-EST-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6432

			MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
			Infraestructura							
			Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°			1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO			CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR			CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA			UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025
CAPITULO	3.00	ITEM	SUMINISTRO, MEZCLA Y COLOCACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI PARA TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE CURADOR BASE AGUA		I.C. 3.19	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL PERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025


CAPITULO	3.00	**ITEM**	ENTIBADO TIPO 2 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)	I.C. 3.20	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

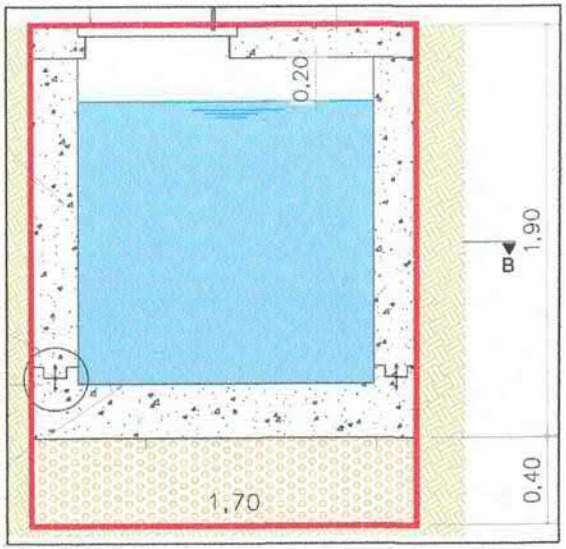

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE SUBTERRANEO						
Muros		1.70		2.300	4.0	15.64

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	ENTIBADO TIPO 2 (FORMALETA MADERA 1/7 UTILIZACIONES)	I.C. 3.20	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	



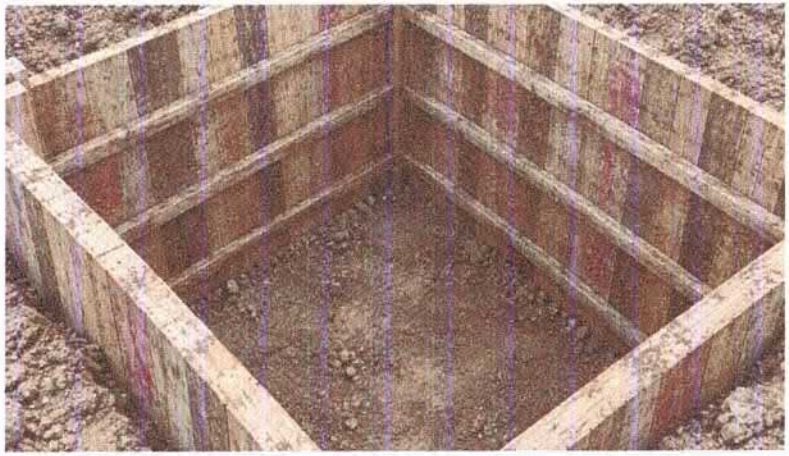

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6490

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	3.00	**ITEM**	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN POLIETILENO CAL. 6	I.C. 3.22	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

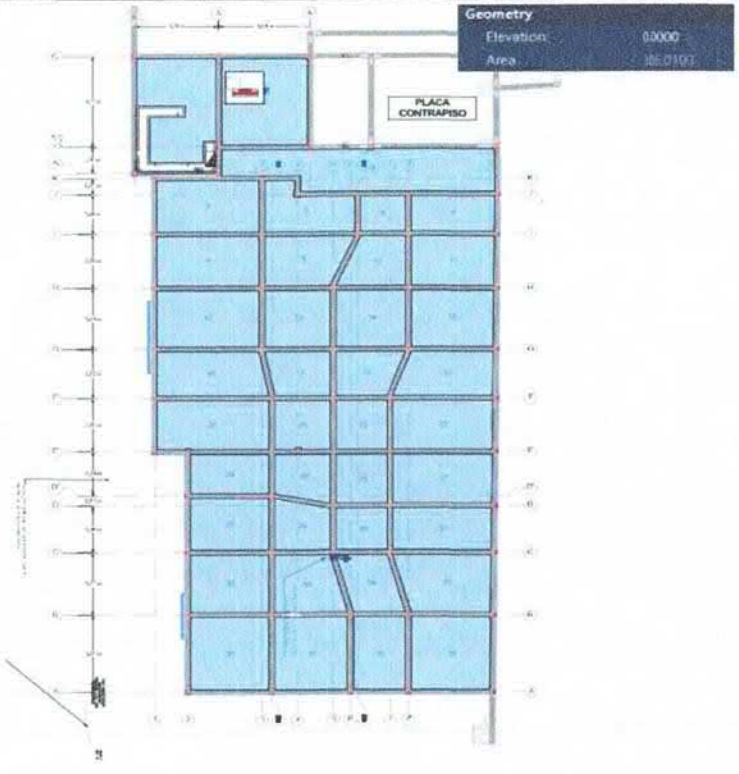

DESCRIPCIÓN	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**ÁREA (m2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Placa contrapiso				386.01	1.0	386.01

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**394.96**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	386.01
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	8.95
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**386.01**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 2.0 MDT-CON-FIS- GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6447

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	3.00	ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN POLIETILENO CAL. 6	I.C. 3.22	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BADUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	16	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO 4,00 ACERO ESTRUCTURAL


6943


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN


ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	4.00	**ITEM**	PERFIL CAJON PHR NEGRO 305X80X2.5MM CAL 12	4.01	**UNIDAD**	ML	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

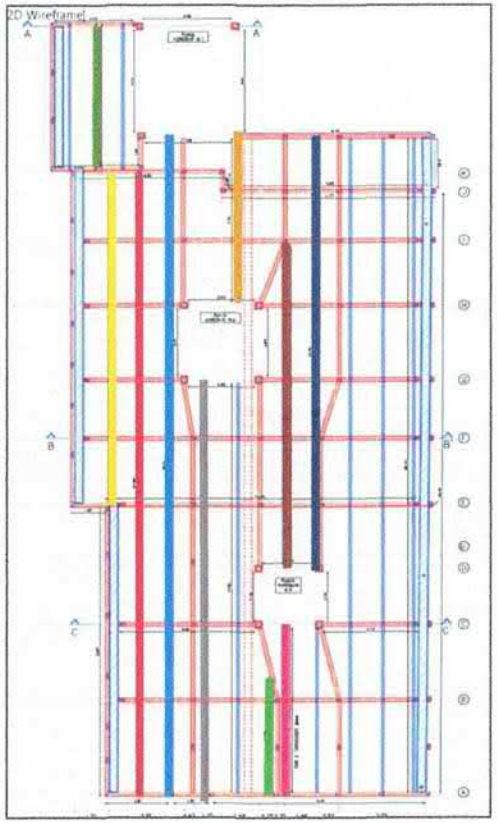



PERFI PHR 305X80X2.5m
SECCIÓN



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	TOTAL
PERFILES DE CUBIERTA MÓDULO PRINCIPAL						
Tipo 1	6.39				3.0	19.17
Tipo 2	14.40				1.0	14.40
Tipo 3	27.06				1.0	27.06
Tipo 4	28.61				4.0	114.44
Tipo 5	17.92				2.0	35.84
Tipo 6	7.16				1.0	7.16
Tipo 7	5.06				1.0	5.06
Tipo 8	13.84				1.0	13.84
Tipo 9	18.65				1.0	18.65
Tipo 10	7.21				2.0	14.42

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**270.04**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	270.04
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**270.04**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6449

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	

CAPITULO	4.00	ITEM	PERFIL CAJON PHR NEGRO 305X80X2.5MM CAL 12	4.01	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BACUSOO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6495

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	16	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO 5,00 MUROS, PAÑETES Y PINTURAS

6446

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		





FACHADA LATERAL DERECHA

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
FACHADA LATERAL ANTEPECHOS DE CUBIERTA						
Entre eje 1 - 2	1.35	1.16	1.57		1.00	1.57
Entre eje 2 - 3'	2.60	1.16	3.02		1.00	3.02
	1.50	1.66	2.49		1.00	2.49
Entre eje 3' - 6	2.55	1.16	2.96		1.00	2.96
Entre eje 6 - 7'	2.42	1.16	2.81		1.00	2.81
Entre eje 7' - 8	1.70	0.16	0.39		1.00	0.39
	1.75	1.16	1.97		2.00	3.94
FACHADA FRONTAL NIVEL 1						
Muro doble (Fiscal 1 - Sala juntas)	3.78	5.84	22.08		1.00	22.08
Muro doble (Coordinador CTI - Investigadores)	2.41	5.84	14.07		1.00	14.07
FACHADA FRONTAL ANTEPECHOS DE CUBIERTA						
Entre eje C y A	1.89	1.66	3.14		2.00	6.27
	1.90	1.66	3.15		1.00	3.15
Entre eje A y H	2.06	1.16	2.39		2.00	4.78
	2.08	1.16	2.41		1.00	2.41
Entre eje H y F	1.59	1.66	2.64		2.00	5.28
Entre eje G y E	1.96	1.16	2.27		2.00	4.55
Entre eje E y D'	1.84	0.71	1.31		1.00	1.31
Entre eje D' y C	2.44	1.16	2.83		2.00	5.66
Entre eje B y A	2.01	1.66	3.34		1.00	3.34
	1.28	1.16	1.48		2.00	2.97

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

CANTIDAD PRESENTE HOJA: 93.05

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		

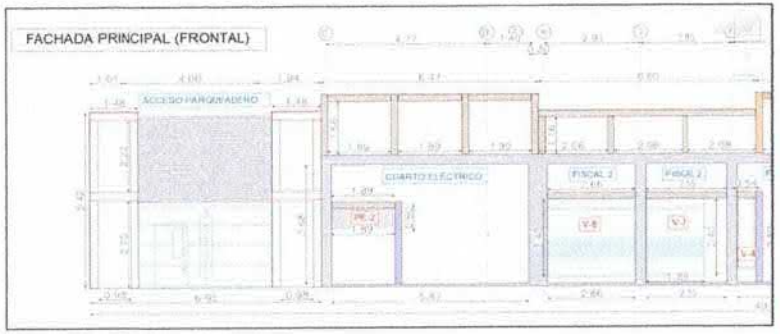

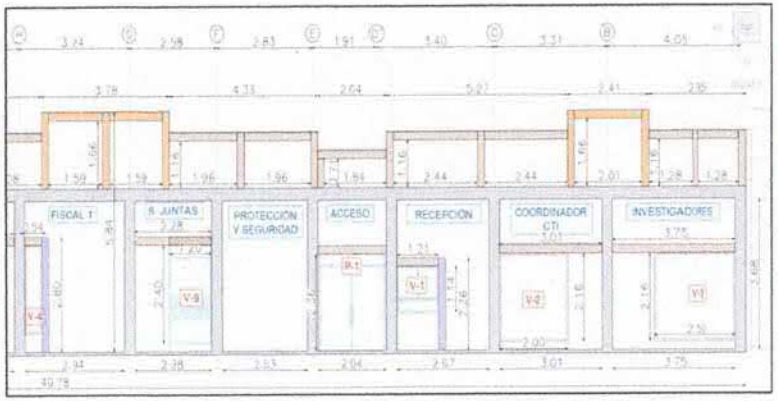

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
MUROS INTERNOS						
Fiscal 3						
Norte	4.45	3.68	16.376		1.00	16.38
Este	2.76	3.68	10.157		1.00	10.16
Descuento PV-1.7	2.41	2.4	5.784		1.00	-5.78
Sur	2.85	3.68	10.488		1.00	10.49
Copiado						
Norte	1.42	3.68	5.226		1.00	5.23
Este	1.98	3.68	7.286		1.00	7.29
Descuento columna	0.3	3.68	1.104		1.00	-1.10
Fiscal 2						
Este	2.85	3.68	10.488		1.00	10.49
Descuento PV-1.6	2.35	2.40	5.640		1.00	-5.64
Sur	2.85	3.68	10.488		1.00	10.49
Fiscal 1						
Este	2.94	3.68	10.819		1.00	10.82
Descuento PV-1.5	2.39	2.40	5.736		1.00	-5.74
Sala de juntas						
Norte	4.50	3.68	16.560		1.00	16.56
Descuento P-4.2	0.80	2.40	1.920		1.00	-1.92
Este	2.28	3.68	8.390		1.00	8.39
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	86.12
					VIENE HOJA 1	93.05
					SUBTOTAL	179.17

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Recepción y seguridad						
Norte	3.70	3.68	13.616		1.00	13.62
Este	2.98	3.68	10.966		1.00	10.97
Sur	2.20	3.68	8.096		1.00	8.1
Descuento V-1.1	1.30	1.14	1.482		1.00	-1.48
Descuento P-7	0.90	2.10	1.890		1.00	-1.89
Oeste	1.68	3.68	6.182		1.00	6.18
Orientador						
Norte	2.37	3.68	8.722		1.00	8.72
Este	2.78	3.68	10.230		1.00	10.23
Sur	2.3	3.68	8.464		1.00	8.46
Descuento PV-1.4	2.39	2.40	5.736		1.00	-5.74
Recepción y correspondencia						
Norte	3.43	3.68	12.622		1.00	12.62
Este	2.67	3.68	9.826		1.00	9.83
Descuento P-7	0.90	2.10	1.890		1.00	-1.89
Sur	3.43	3.68	12.622		1.00	12.62
Coordinador CTI						
Este	3.01	3.68	11.077		1.00	11.08
Descuento PV-1.1	3.01	2.40	7.224		1.00	-7.22
Investigadores						
Norte	6.9	3.68	25.392		1.00	25.39
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	118.50
					VIENE HOJA 2	179.17
					SUBTOTAL	297.67

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BACCERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6449

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN								
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

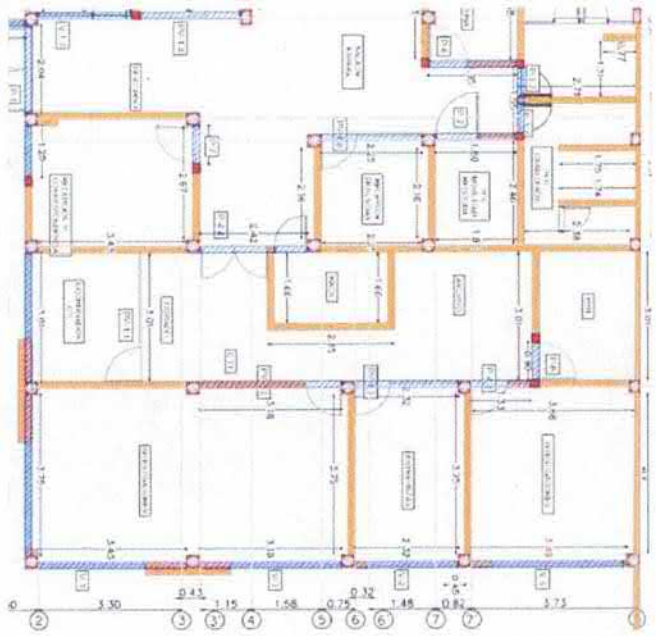

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Descuento PV-1.2	3.18	2.40	7.632		1.00	-7.63
Este	3.75	3.68	13.800		1.00	13.80
Entrevistas						
Norte	2.32	3.68	8.538		1.00	8.54
Descuento PV-1.3	2.32	2.40	5.568		1.00	-5.57
Este	3.75	3.68	13.800		1.00	13.80
Investigadores						
Norte	3.68	3.68	13.542		1.00	13.54
Descuento P-4.2	0.80	2.40	1.920		1.00	-1.92
Este	3.75	3.68	13.800		1.00	13.80
Acceso funcionarios						
Este	2.23	3.68	8.206		1.00	8.21
Sur	2.35	3.68	8.648		1.00	8.65
Descuento P-4.3	1.50	2.40	3.600		1.00	-3.60
Entrega EMP o EF						
Norte	2.00	3.68	7.360		1.00	7.36
Este	3.61	3.68	13.285		1.00	13.28
Descuento V-1.1-1	1.35	1.14	1.539		1.00	-1.54
Descuento P-7.1	0.90	2.10	1.890		1.00	-1.89
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
Oeste	2.76	3.68	10.157		1.00	10.16
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	86.79
					VIENE HOJA 3	297.67
					SUBTOTAL	384.46

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

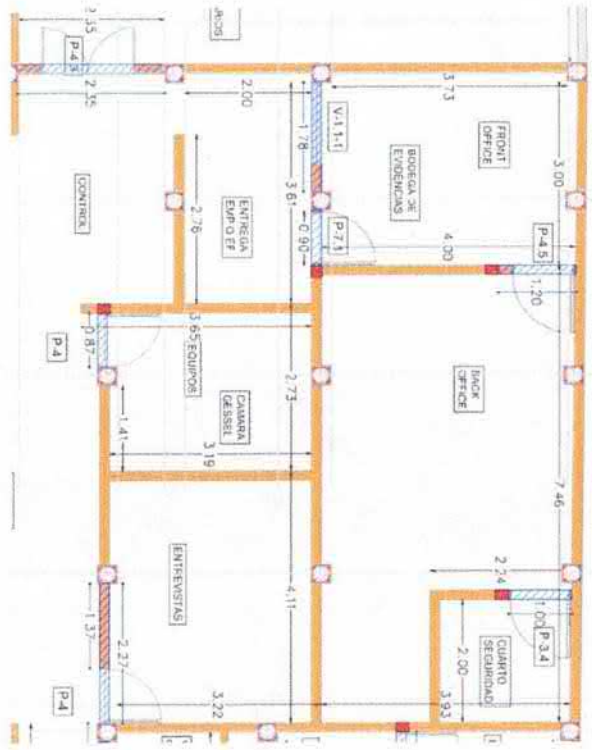

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Front office						
Norte	3.73	3.68	13.726		1.00	13.73
Este	3.00	3.68	11.040		1.00	11.04
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
Sur	4.00	3.68	14.720		1.00	14.72
Descuento P-4.5	1.00	2.40	2.400		1.00	-2.40
Equipos y cámara Gessel						
Norte	3.65	3.68	13.432		1.00	13.43
Este	2.73	3.68	10.046		1.00	10.05
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
Sur	3.19	3.68	11.739		1.00	11.74
Oeste	1.41	3.68	5.1888		1.00	5.19
	0.88	3.68	3.2384		1.00	3.24
Descuento P-4	0.88	2.40	2.112		1.00	-2.11
Entrevistas						
Este	4.11	3.68	15.1248		1.00	15.12
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
Sur	3.22	3.68	11.8496		1.00	11.85
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
Oeste	4.11	3.68	15.1248		1.00	15.12
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
Descuento P-4	0.90	2.40	2.160		1.00	-2.16
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	113.06
					VIENE HOJA 4	384.46
					SUBTOTAL	497.52

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6451

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

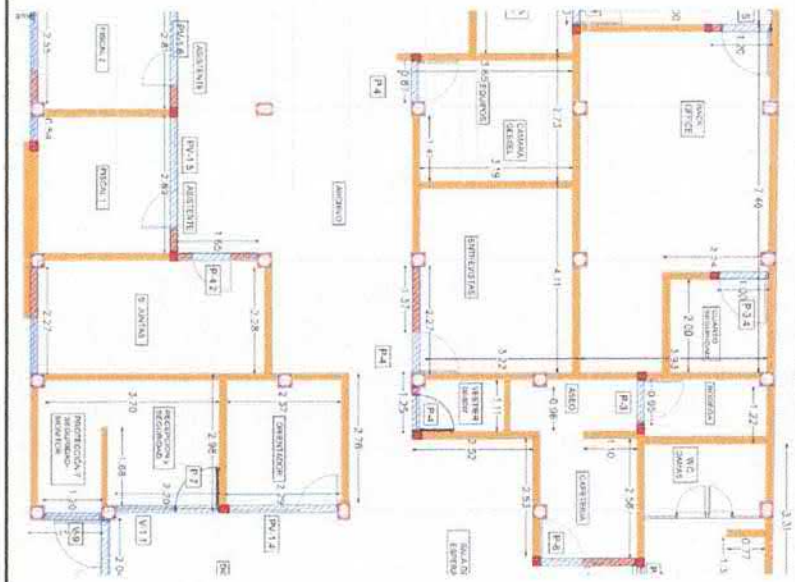

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Back office						
Este	7.46	3.68	27.4528		1.00	27.45
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		2.00	-2.21
Sur	3.93	3.68	14.4624		1.00	14.46
Cuarto seguridad						
Norte	2.24	3.68	8.2432		1.00	8.24
Descuento P-3.4	1.00	2.10	2.100		1.00	-2.10
Oeste	2.00	3.68	7.36		1.00	7.36
Vestier celador						
Este	1.11	3.68	4.0848		1.00	4.08
Sur	2.52	3.68	9.2736		1.00	9.27
Oeste	0.96	3.68	3.5328		1.00	3.53
Descuento P-3.1	0.80	2.10	1.680		1.00	-1.68
Aseo						
Poceta	0.96	0.6	0.576		1.00	0.58
Bodega						
Este	1.22	3.68	4.4896		1.00	4.49
Sur	2.59	3.68	9.5312		1.00	9.53
Oeste	1.22	3.68	4.4896		1.00	4.49
Descuento P-3	0.90	2.10	1.890		1.00	-1.89
Cafeteria						
Norte	1.10	3.68	4.048		1.00	4.05
Este	2.58	3.68	9.494		1.00	9.49
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	99.14
					VIENE HOJA 5	497.52
					SUBTOTAL	596.66

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6452

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

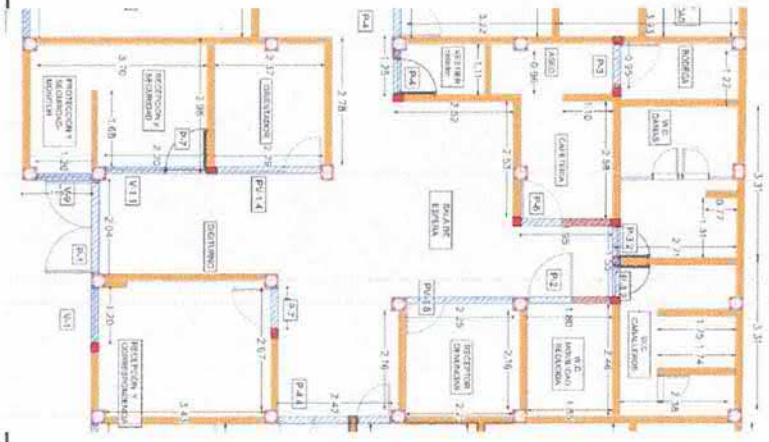

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Sur	2.15	3.68	7.912		1.00	7.91
Descuento P-6	0.90	2.10	1.890		1.00	-1.89
Oeste	2.88	3.68	10.598		1.00	10.60
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
W.C Damas						
Este	3.31	3.68	12.181		1.00	12.18
Descuento columna	0.35	3.68	1.288		1.00	-1.29
Divisorio lavamanos	0.77	0.90	0.693		1.00	0.69
Sur	2.71	3.68	9.9728		1.00	9.97
Oeste	0.7	3.68	2.576		1.00	2.58
Descuento P-3.2	0.70	2.10	1.470		1.00	-1.47
Receptor denuncias						
Norte	2.25	3.68	8.28		1.00	8.28
Descuento PV-1.8	2.25	2.40	5.400		1.00	-5.40
Este	2.16	3.68	7.949		1.00	7.95
Sur	2.25	3.68	8.28		1.00	8.28
Oeste	2.16	3.68	7.949		1.00	7.95
W.C. Movilidad reducida						
Norte	2.00	3.68	7.36		1.00	7.36
Descuento P-2	1.00	2.10	2.100		1.00	-2.10
Este	2.46	3.68	9.053		1.00	9.05
Sur	2.00	3.68	7.36		1.00	7.36
W.C. Caballeros						
Este	3.31	3.68	12.181		1.00	12.18
Descuento columna	0.30	3.68	1.104		1.00	-1.10
Muros divisorios	1.75	3.68	6.440		2.00	12.88
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	110.87
					VIENE HOJA 6	596.66
					SUBTOTAL	707.53

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

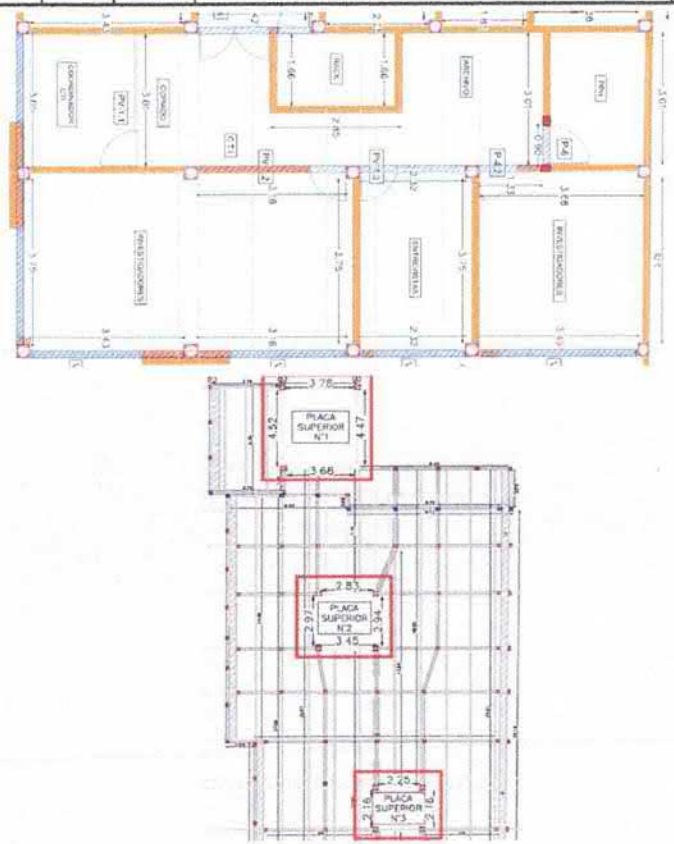

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Sur	2.38	3.68	8.758		1.00	8.76
Oeste	0.7	3.68	2.576		1.00	2.58
Descuento P-3.2	0.70	2.10	1.470		1.00	-1.47
Copiado						
Norte	1.53	3.68	5.6304		1.00	5.63
Descuento P-4.4	1.53	2.40	3.672		1.00	-3.67
Rack						
Norte	0.75	3.68	2.76		1.00	2.76
Descuento P-3.3	0.75	2.10	1.575		1.00	-1.58
Este	1.66	3.68	6.109		1.00	6.11
Sur	2.85	3.68	10.488		1.00	10.49
Oeste	1.81	3.68	6.661		1.00	6.66
Laboratorio PPH						
Este	3.01	3.68	11.077		1.00	11.08
Oeste	3.01	3.68	11.077		1.00	11.08
Descuento P-6	0.90	2.10	1.890		1.00	-1.89
Viguetas y columnetas para muros internos						
Descuento viguetas y columnetas	175.00	0.2	35.000		1.00	-35.00
Placa superior N°1						
Norte	3.78	1.08	4.082		1.00	4.08
Este	4.47	1.08	4.828		1.00	4.83
Sur	3.68	1.08	3.974		1.00	3.97
Oeste	4.52	1.08	4.882		1.00	4.88
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	39.30
					VIENE HOJA 7	707.53
					SUBTOTAL	746.83

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BADILLO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6454

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

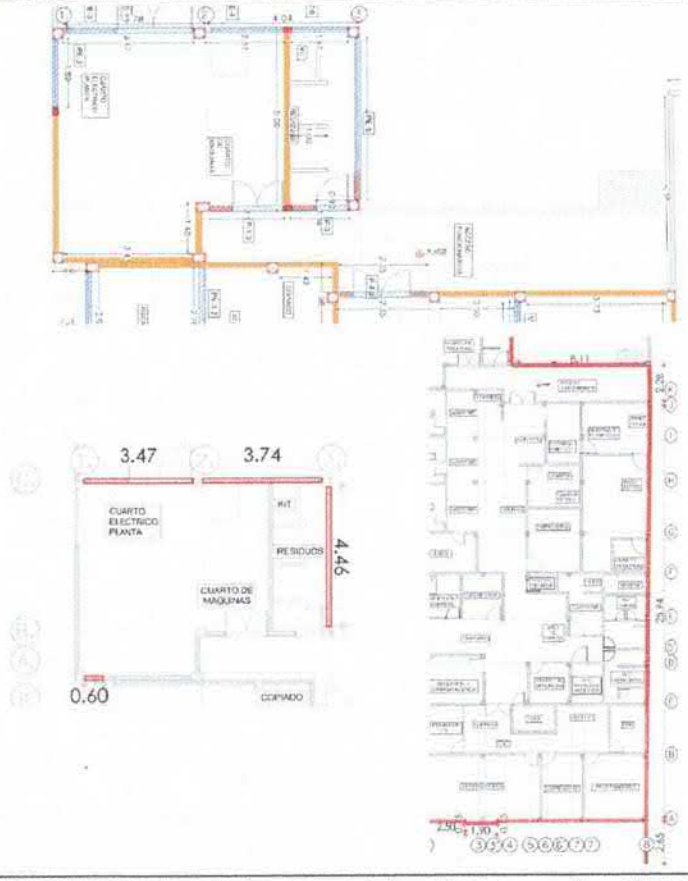

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Placa superior N°2						
Norte	2.83	1.08	3.056		1.00	3.06
Este	2.94	1.08	3.175		1.00	3.18
Sur	2.85	1.08	3.078		1.00	3.08
Oeste	2.97	1.08	3.208		1.00	3.21
Placa superior N°3						
Norte - Sur	2.25	1.08	2.430		2.00	4.86
Este -Oeste	2.16	1.08	2.333		2.00	4.67
ANTEPECHOS CUARTO ELÉCTRICO						
Cuarto eléctrico - Norte	3.47	1.66	5.760		1.00	5.76
Cuarto eléctrico - Norte en placa aerea	3.74	1.36	5.086		1.00	5.09
Cuarto eléctrico - Este	4.46	1.36	6.066		1.00	6.07
Cuarto eléctrico - Sur	0.60	1.66	0.996		1.00	1.00
ANTEPECHOS ACCESO FUNCIONARIOS						
Acceso funcionarios	8.11	1.16	9.408		1.00	9.41
Descuento columnetas	0.20	1.16	0.232		4.00	-0.93
FACHADA COSTADO ESTE						
Antepecho costado este	25.94	1.16	30.090		1.00	30.09
	2.28	1.16	2.645		1.00	2.64
	2.65	2.16	5.724		2.00	11.45
Descuento columnetas	0.20	1.16	0.232		8.00	-1.86
CULATAS DE CUBIERTA HORIZONTALES						
EJE B						
Muro 1			1.128		1.00	1.13
Muro 2			2.312		1.00	2.31
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	94.22
					VIENE HOJA 8	746.83
					SUBTOTAL	841.05

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.	1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

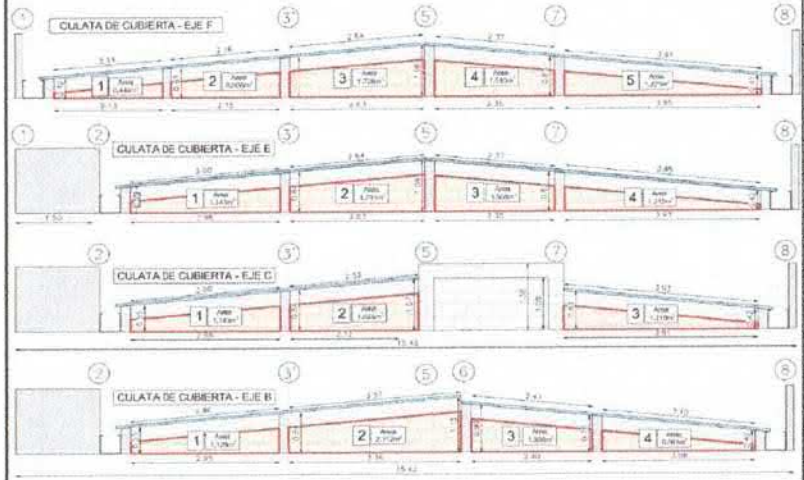

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Muro 3			1.368		1.00	1.37
Muro 4			0.861		1.00	0.86
EJE C						
Muro 1			1.143		1.00	1.14
Muro 2			1.644		1.00	1.64
Muro 3			1.218		1.00	1.22
EJE E						
Muro 1			1.143		1.00	1.14
Muro 2			1.731		1.00	1.73
Muro 3			1.508		1.00	1.51
Muro 4			1.212		1.00	1.21
EJE F						
Muro 1			0.444		1.00	0.44
Muro 2			0.908		1.00	0.91
Muro 3			1.728		1.00	1.73
Muro 4			1.510		1.00	1.51
Muro 5			1.221		1.00	1.22
EJE G						
Muro 1			0.444		1.00	0.44
Muro 2			0.682		1.00	0.68
Muro 3			1.916		1.00	1.92
Muro 4			0.859		1.00	0.86
EJE H						
Muro 1			0.444		1.00	0.44
Muro 2			0.682		1.00	0.68
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	22.65
					VIENE HOJA 9	841.05
					SUBTOTAL	863.70

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

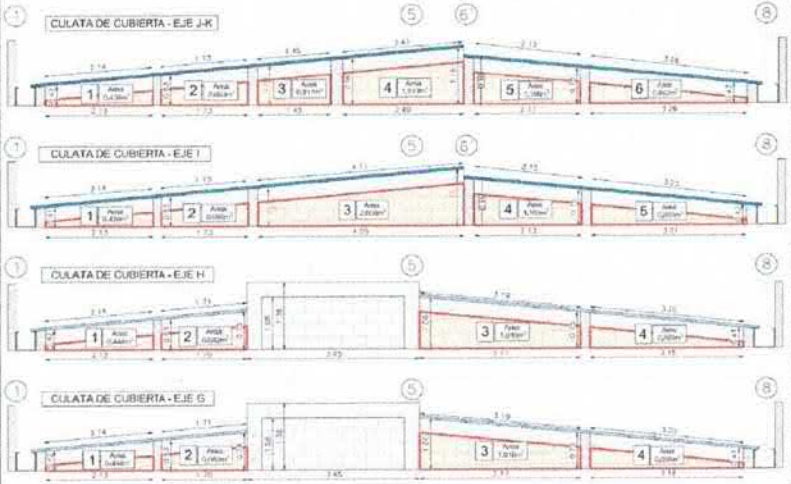

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Muro 3			1.916		1.00	1.92
Muro 4			0.860		1.00	0.86
EJE I						
Muro 1			0.438		1.00	0.44
Muro 2			0.695		1.00	0.70
Muro 3			2.808		1.00	2.81
Muro 4			1.169		1.00	1.17
Muro 5			0.850		1.00	0.85
EJE J-K						
Muro 1			0.438		1.00	0.44
Muro 2			0.693		1.00	0.69
Muro 3			0.817		1.00	0.82
Muro 4			1.833		1.00	1.83
Muro 5			1.156		1.00	1.16
Muro 6			0.862		1.00	0.86
Muro entre ejes J y K	0.68	1.3	0.884		1.00	0.88
CULATAS DE CUBIERTA VERTICALES						
EJE 3'						
Muro 1	2.84	0.54	1.534		1.00	1.53
Muro 2	2.65	0.54	1.431		1.00	1.43
Muro 3	2.35	0.58	1.363		1.00	1.36
Muro 4	2.75	0.43	1.183		1.00	1.18
Muro 5	2.36	0.43	1.015		1.00	1.01
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	21.94
					VIENE HOJA 10	863.70
					SUBTOTAL	885.64

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6457


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
	Infraestructura							
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025			
	MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN							
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5.01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN


CULATA DE CUBIERTA - EJE 3'



CULATA DE CUBIERTA - EJE 6



CULATA DE CUBIERTA - EJE 7



DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
Muro 6	2.53	0.43	1.088		1.00	1.09
Muro 7	3.16	0.43	1.359		1.00	1.36
Muro 8 y 9	1.89	0.43	0.813		2.00	1.63
Muro 10	1.25	0.54	0.675		1.00	0.68
EJE 6						
Muro 1	2.84	1.00	2.840		1.00	2.84
Muro 2	2.65	1.00	2.650		1.00	2.65
Muro 3	2.40	0.90	2.160		1.00	2.16
Muro 4	2.75	0.90	2.475		1.00	2.48
Muro 5	2.56	0.90	2.304		1.00	2.30
Muro 6	3.09	0.77	2.379		1.00	2.38
Muro 7 y 8	1.89	0.77	1.455		2.00	2.91
Muro 9	2.07	1	2.070		1.00	2.07
EJE 7						
Muro 1	2.84	0.48	1.363		1.00	1.36
Muro 2	2.70	0.48	1.296		1.00	1.30
Muro 3 y 7	3.09	0.48	1.483		2.00	2.97
Muro 4	2.43	0.48	1.166		1.00	1.17
Muro 5	2.75	0.57	1.568		1.00	1.57
Muro 6	2.56	0.57	1.459		1.00	1.46
Muro 8 y 9	1.89	0.48	0.907		2.00	1.81
Muro 10	2.07	0.48	0.994		1.00	0.99
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	37.18
					VIENE HOJA 11	885.64
					CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**1,327.95**
					ACUMULADO ACTAS PARCIALES	922.82
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	405.13
					CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**922.82**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025
CAPITULO	5,00	ITEM	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	5,01	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6459

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	**ITEM**	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	5.07	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

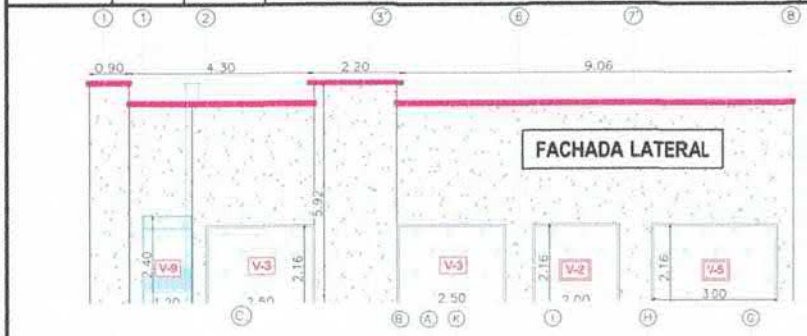

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
FACHADA LATERAL						
Eje 1 cuarto eléctrico	0.90	0.2	0.05		1.00	0.01
Entre eje 1 - 3	4.30	0.2	0.05		1.00	0.04
Entre eje 3' - muro doble	2.20	0.2	0.05		1.00	0.02
Eje 3' -8	9.06	0.2	0.05		1.00	0.09
FACHADA PRINCIPAL						
Eje C - A (Cuarto eléctrico)	6.17	0.2	0.05		1.00	0.06
Eje K - H	6.60	0.2	0.05		1.00	0.07
Entre eje G' - muro doble	4.08	0.2	0.05		1.00	0.04
Eje F - E	4.33	0.2	0.05		1.00	0.04
Eje E y D'	2.04	0.2	0.05		1.00	0.02
Eje D' - B	5.27	0.2	0.05		1.00	0.05
Eje B	2.41	0.2	0.05		1.00	0.02
Eje B - A	2.80	0.2	0.05		1.00	0.03
FACHADA POSTERIOR INTERNA						
Cuarto eléctrico - Norte	1.70	0.2	0.05		1.00	0.02
	1.75	1.16	0.05		1.00	0.10
Cuarto eléctrico - Oeste	1.40	0.2	0.05		1.00	0.01
Acceso funcionarios cara externa	8.20	0.2	0.05		1.00	0.08
FACHADA COSTADO ESTE						
Muro costado este	31.34	0.2	0.05		1.00	0.31

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**1.67**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	1.01
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0.66
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**1.01**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	5.00	ITEM	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	5.07	UNIDAD	M3	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.	1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	I.C. 5.11	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

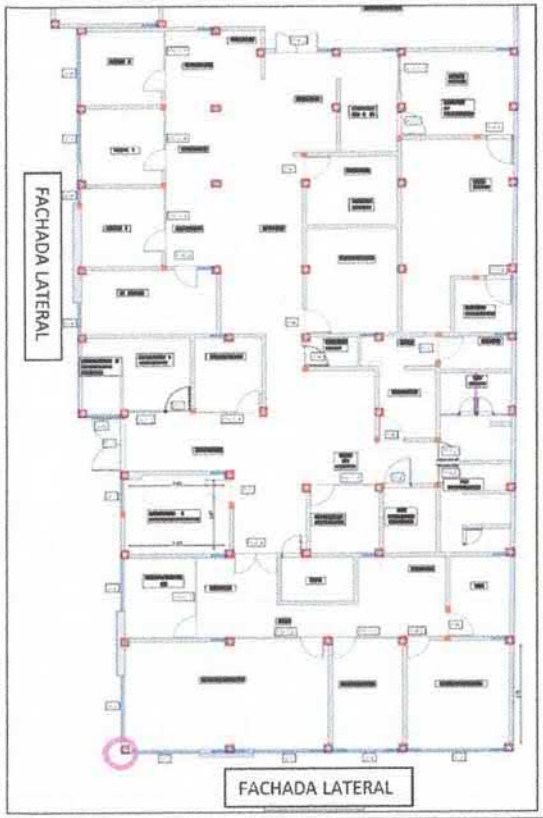

DESCRIPCIÓN	ALTO DE ANCLAJE (m)	LONGITUD (m)	SEPARACIÓN DE LOS ANCLAJES (m)	CANTIDAD POR MURO	CANTIDAD MUROS	TOTAL
	A		S			
FACHADA LATERAL NIVEL 1						
Protección y seguridad	3.68		0.45	8.18	2.0	16.00
Descuento V-9	2.40		0.45	-5.33	2.0	-10.00
Investigadores	3.68		0.45	8.18	4.0	32.00
Descuento V-3	2.16		0.45	-4.80	2.0	-10.00
Entrevistas	3.68		0.45	8.18	2.0	16.00
Descuento V-2	2.16		0.45	-4.80	1.0	-5.00
Investigadores	3.68		0.45	8.18	2.0	16.00
Descuento V-5	2.16		0.45	-4.80	1.0	-5.00
FACHADA FRONTAL NIVEL 1						
Cuarto eléctrico	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento PE-2	0.60		0.45	-1.33	1.00	-1.00
Fiscal 3	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento V-8	2.40		0.45	-5.33	2.00	-10.00
Fiscal 2	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento V-7	2.40		0.45	-5.33	1.00	-5.00
Fiscal 1	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento V-4	2.16		0.45	-4.80	1.00	-5.00
Sala de juntas	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento V-9	2.40		0.45	-5.33	1.00	-5.00
Protección y seguridad	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Acceso de usuarios	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento P-1	2.36		0.45	-5.24	2.00	-10.00
Recepción y correspondencia	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

CANTIDAD PRESENTE HOJA **142.00**

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	I.C. 5.11	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

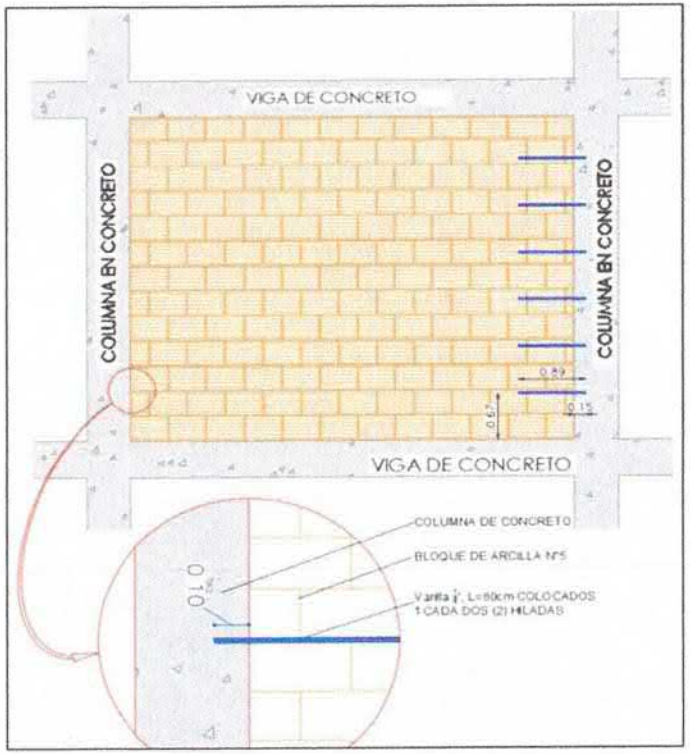

DESCRIPCIÓN	ALTO DE ANCLAJE (m)	LONGITUD (m)	SEPARACIÓN DE LOS ANCLAJES (m)	CANTIDAD POR MURO	CANTIDAD MUROS	TOTAL
Descuento V-1	1.14		0.45	-2.53	1.00	-3.00
Coordinador CTI	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento V-2	2.16		0.45	-4.80	1.00	-5.00
Investigadores	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento V-3	2.16		0.45	-4.80	1.00	-5.00
MUROS INTERNOS						
Copiado						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Sala de juntas						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Este	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Recepción y seguridad						
Norte	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Orientador						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Este	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Sur	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Descuento PV-1.4	2.40		0.45	-5.33	1.00	-5.00
Recepción y correspondencia						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	142.00
					VIENE HOJA 1	142.00
					SUBTOTAL	284.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	I.C. 5.11	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

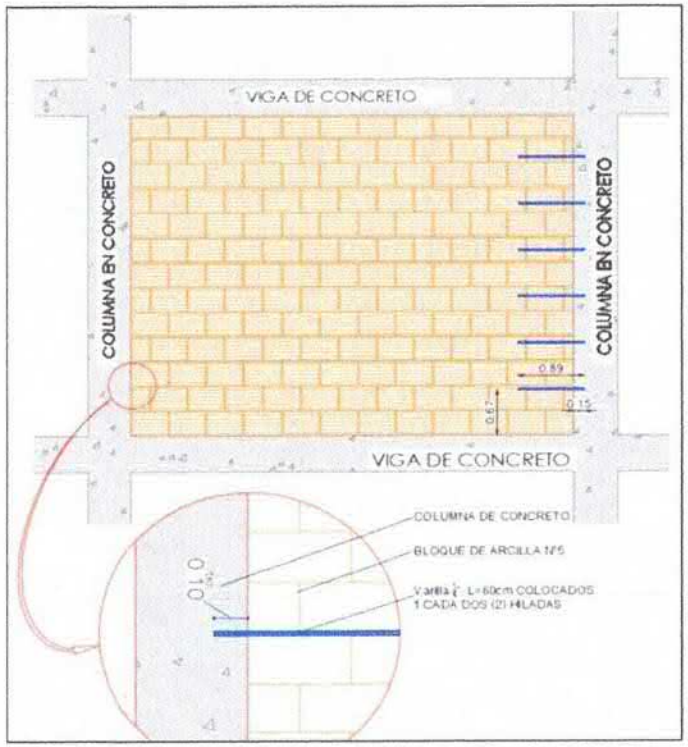

DESCRIPCIÓN	ALTO DE ANCLAJE (m)	LONGITUD (m)	SEPARACIÓN DE LOS ANCLAJES (m)	CANTIDAD POR MURO	CANTIDAD MUROS	TOTAL
Descuento P-7	2.10		0.45	-4.67	1.00	-5.00
Sur	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Investigadores						
Norte	3.68		0.45	8.18	4.00	32.00
Descuento PV-1.2	2.40		0.45	-5.33	2.00	-10.00
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Entrevistas						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento PV-1.3	2.40		0.45	-5.33	2.00	-10.00
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Investigadores						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento P-4.2	2.40		0.45	-5.33	1.00	-5.00
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Acceso funcionarios						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Entrega EMP o EF						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Este	3.68		0.45	8.18	3.00	24.00
Descuento V-1.1-1	1.14		0.45	-2.53	1.00	-3.00
Descuento P-7.1	2.10		0.45	-4.67	1.00	-5.00
Oeste	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	162.00
					VIENE HOJA 2	284.00
					SUBTOTAL	446.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6469

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / Versión: 04 / Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	ITEM	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	I.C. 5.11	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

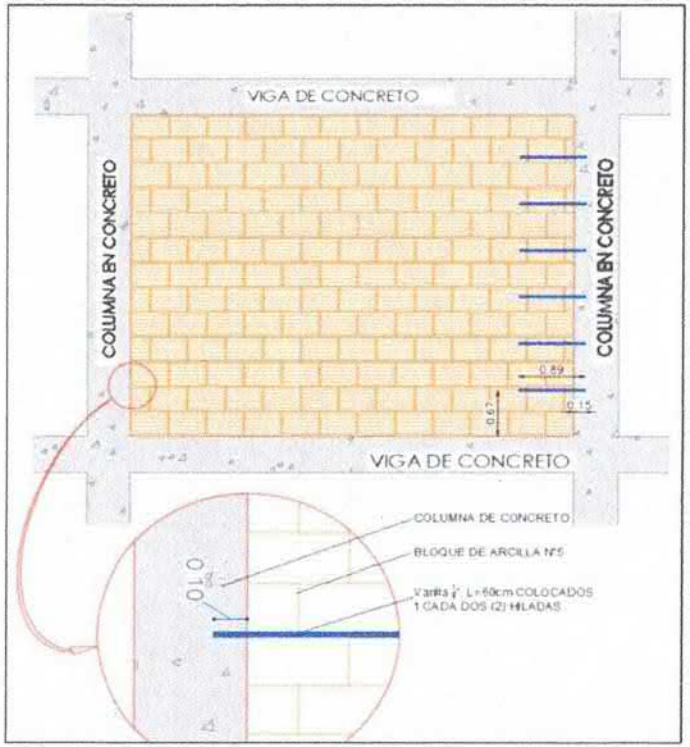

DESCRIPCIÓN	ALTO DE ANCLAJE (m)	LONGITUD (m)	SEPARACIÓN DE LOS ANCLAJES (m)	CANTIDAD POR MURO	CANTIDAD MUROS	TOTAL
Front office						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Este	3.68		0.45	8.18	3.00	24.00
Equipos y cámara Gessel						
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Oeste	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento P-4	2.40		0.45	-5.33	1.00	-5.00
Entrevistas						
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Oeste	3.68		0.45	8.18	3.00	24.00
Descuento P-4	2.40		0.45	-5.33	1.00	-5.00
Sur	3.68		0.45	8.18	3.00	24.00
Back office						
Este	3.68		0.45	8.18	5.00	40.00
Sur	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Vestier celador						
Oeste	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Bodega						
Este	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Cafetería						
Oeste	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
W.C Damas						
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
					CANTIDAD PRESENTE HOJA	222.00
					VIENE HOJA 3	446.00
					SUBTOTAL	668.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6465

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION


Infraestructura

Codigo:INF-FR-20 | Versión: 04 | Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	5.00	**ITEM**	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	I.C. 5.11	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

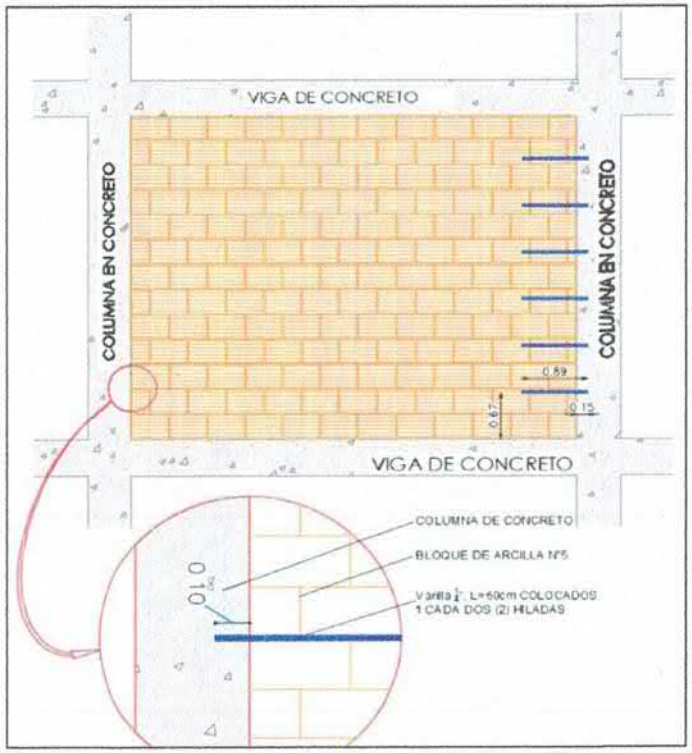

DESCRIPCIÓN	ALTO DE ANCLAJE (m)	LONGITUD (m)	SEPARACIÓN DE LOS ANCLAJES (m)	CANTIDAD POR MURO	CANTIDAD MUROS	TOTAL
Receptor denuncias						
Norte	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Descuento PV-1.8	2.40		0.45	-5.33	1.00	-5.00
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Sur	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
Oeste	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00
W.C. Movilidad reducida						
Norte	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Descuento P-2	2.10		0.45	-4.67	1.00	-5.00
Sur	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
W.C. Caballeros						
Este	3.68		0.45	8.18	3.00	24.00
Sur	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Copiado						
Norte	3.68		0.45	8.18	1.00	8.00
Laboratorio PPH						
Este	3.68		0.45	8.18	2.00	16.00

CANTIDAD PRESENTE HOJA	126.00
VIENE HOJA 4	668.00
CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**1,329.00**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	794.00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	535.00
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	794.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 5. MUR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO ESQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6466

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025		
CAPITULO	5.00	ITEM	ANCLAJE CON VARILLA DE 1/4" PARA MURO EN BLOQUE	I.C. 5.11	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN		



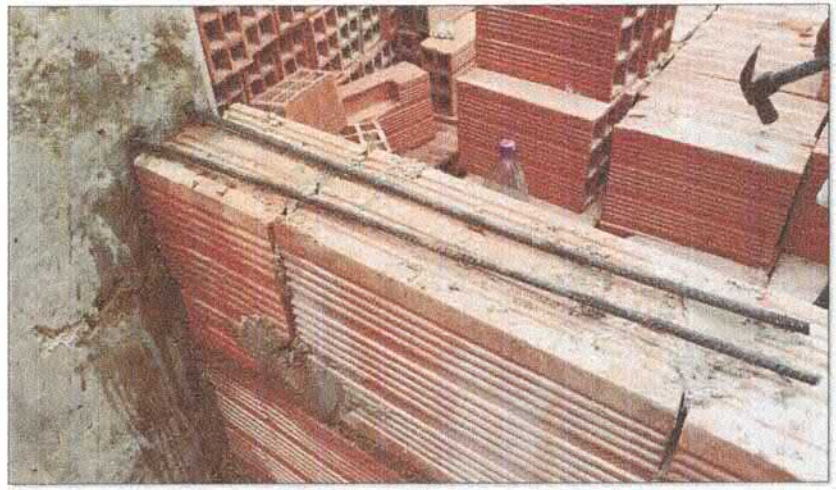

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN								
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	16	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025


CAPITULO 7,00 CIELORASOS Y CUBIERTAS

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	7.00	**ITEM**	TAPA EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE MARCO, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	I.C. 7.09	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

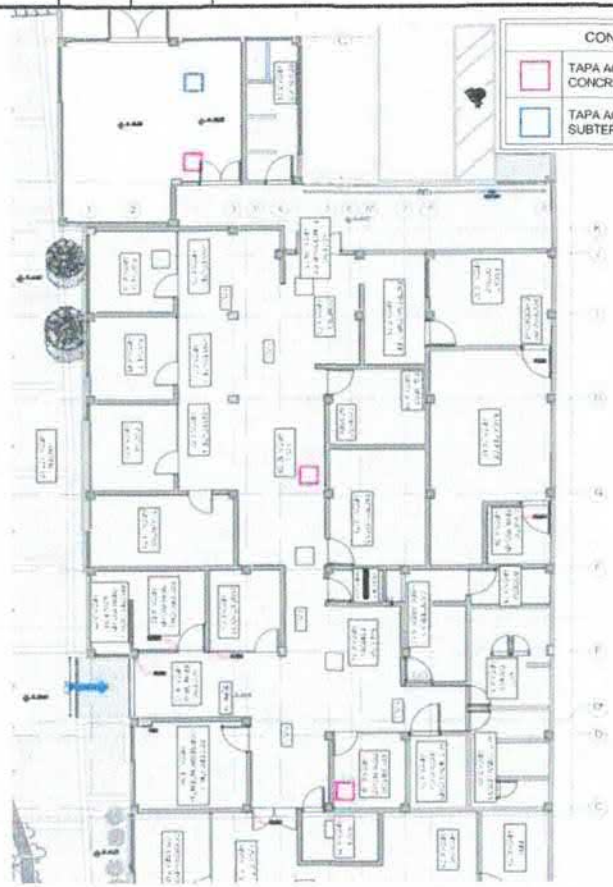

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (m)	VOL. (M3)	CANTIDAD	TOTAL
Placa 1					1.00	1.00
Placa 2					1.00	1.00
Placa 3					1.00	1.00
Tanque subterraneo					1.00	1.00
					CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**4.00**
					ACUMULADO ACTAS PARCIALES	4.00
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
					CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	4.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 7.0 CR-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18		MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.		1700 de 2025
CAPITULO	7,00	ITEM	TAPA EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE MARCO, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	I.C. 7.09	UNIDAD		UN	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6476

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	

CAPITULO	7.00	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. INCLUYE REMATE LATERAL DE TEJA	I.C. 7.10	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN



DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ALTO (M)	ALTO (m)	VOL. (M3)	CANTIDAD	TOTAL
Area Cubierta			1.10	391.46	1.00	391.46

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	391.46
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	391.46
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	391.46

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por Interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. ALL-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6471

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	7.00	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. INCLUYE REMATE LATERAL DE TEJA	I.C. 7.10	UNIDAD	M2	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL PEREIRA VASQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORÍA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORÍA


647C

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	7.00	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA PANEL METÁLICO	I.C. 7.11	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

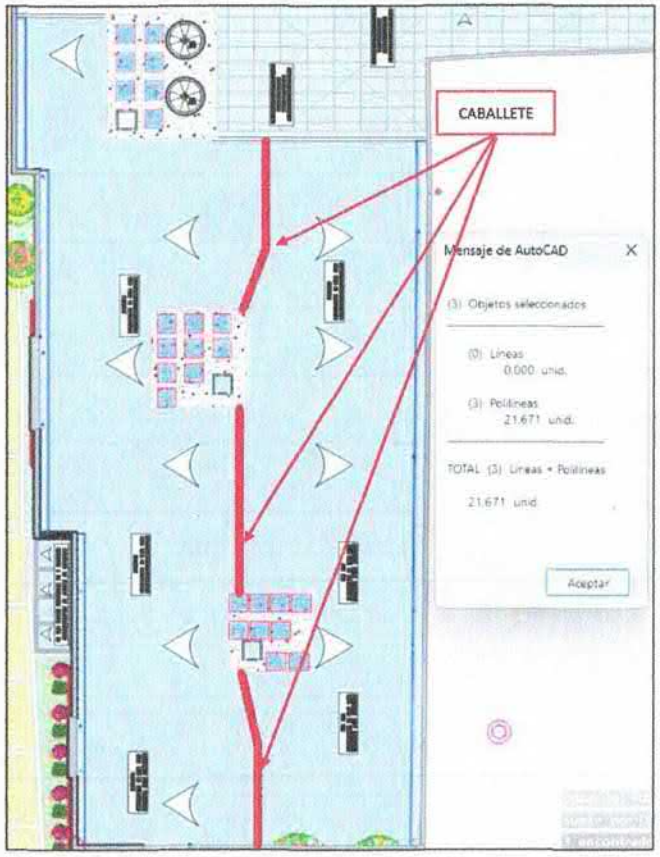

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ALTO (M)	ALTO (m)	VOL. (M3)	CANTIDAD	TOTAL
Cubierta general	21.67				1.00	21.67

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	21.67
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	21.67
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	21.67

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. ALL-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


CARLOS EDUARDO CAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6473

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	7.00	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA PANEL METÁLICO	I.C. 7.11	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	

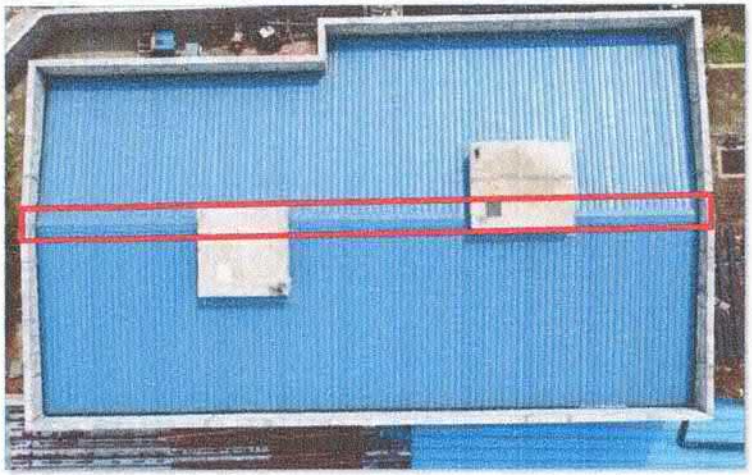



ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN								
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	16	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO 9,00 RED HIDRÁULICA Y VARIOS


6475

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	9.00	ITEM	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.03	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

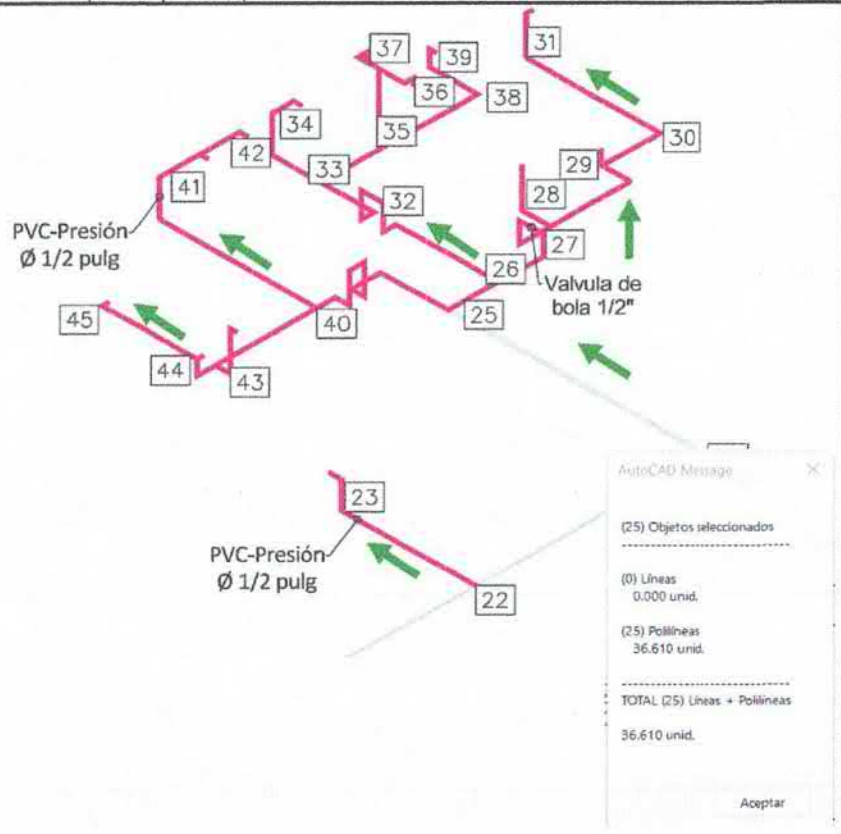

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LONGITUD TRAMO (M)	ALTO (m)	CANTIDAD DE TRAMOS	TOTAL
Nodo 23	2.7		1.00	2.70
Nodo 25	1.82		1.00	1.82
Nodo 26	2.26		1.00	2.26
Nodo 27	1.48		1.00	1.48
Nodo 28	2.31		1.00	2.31
Nodo 29	0.67		1.00	0.67
Nodo 30	2.98		1.00	2.98
Nodo 31	0.72		1.00	0.72
Nodo 32	1.54		1.00	1.54
Nodo 33	1.58		1.00	1.58
Nodo 34	1.05		1.00	1.05
Nodo 35	4.27		1.00	4.27
Nodo 36	0.25		1.00	0.25
Nodo 37	0.25		1.00	0.25
Nodo 38	0.75		1.00	0.75
Nodo 39	0.35		1.00	0.35
Nodo 40	6.4		1.00	6.40
Nodo 41	1.34		1.00	1.34
Nodo 42	0.75		1.00	0.75
Nodo 43	0.95		1.00	0.95
Nodo 44	0.62		1.00	0.62
Nodo 45	1.57		1.00	1.57
			CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	68.40
			ACUMULADO ACTAS PARCIALES	36.61
			CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	31.79

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 9. HIDRO-POT-FIS-GAITAN

CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA 36.61

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA MARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	9.00	ITEM	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.03	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUNOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6477

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017381-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	9.00	ITEM	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.04	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

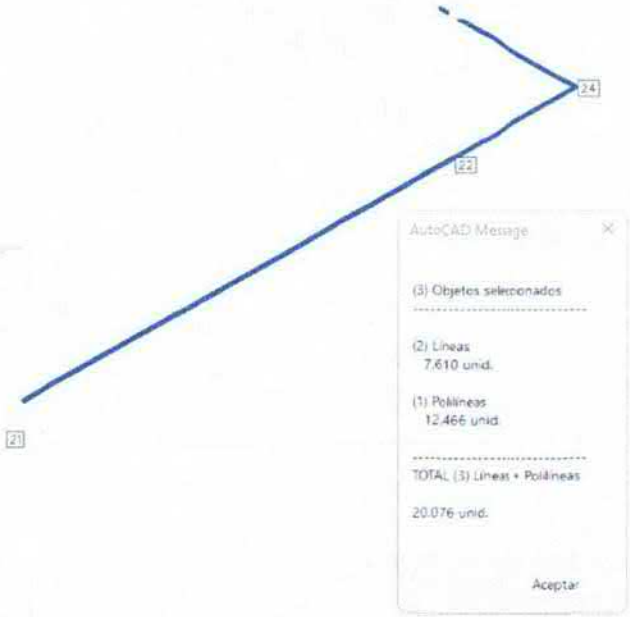

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LONGITUD TRAMO (M)	ALTO (m)	CANTIDAD DE TRAMOS	TOTAL
Nodo 21	12.47		1.00	12.47
Nodo 22	3.59		1.00	3.59
Nodo 24	4.02		1.00	4.02
			CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	51.14
			ACUMULADO ACTAS PARCIALES	20.08
			CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	31.06
			CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	20.08

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 9. HIDRO-POT-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO GUTIERREZ MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	9.00	ITEM	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.04	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	9.00	ITEM	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9.05	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

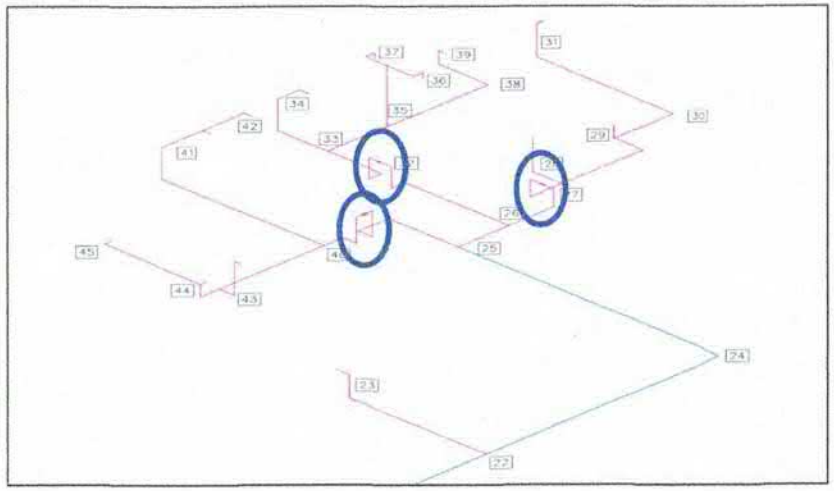

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ALTO (M)	ALTO (m)	VOL. (M3)	CANTIDAD	TOTAL
Valvula baño damas					1.00	1.00
Valvula baño caballeros					1.00	1.00
Valvula baño discapacitados					1.00	1.00

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	4.00
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	3.00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	1.00
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	3.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 9. HIDRO-POT-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BADUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6480

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025
CAPITULO	9.00	ITEM	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN		9.05	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN



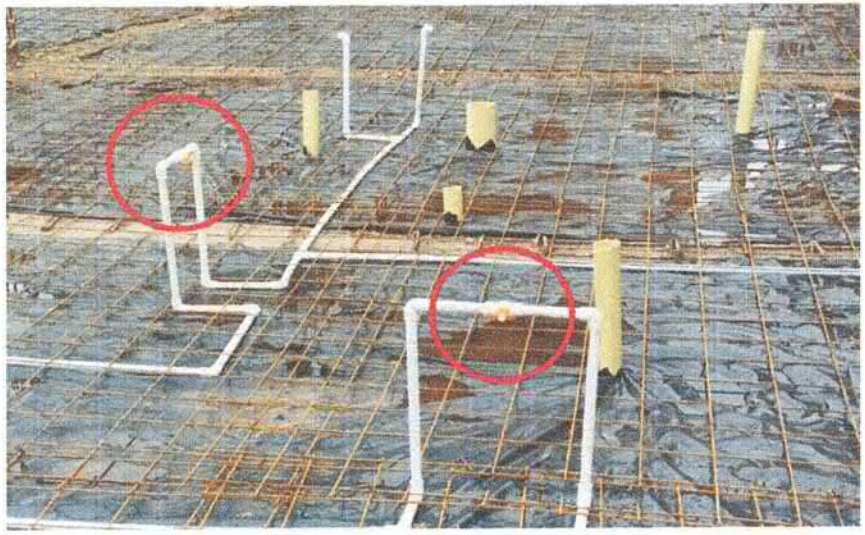

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6481

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	10.00	**ITEM**	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.01	**UNIDAD**	ML	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

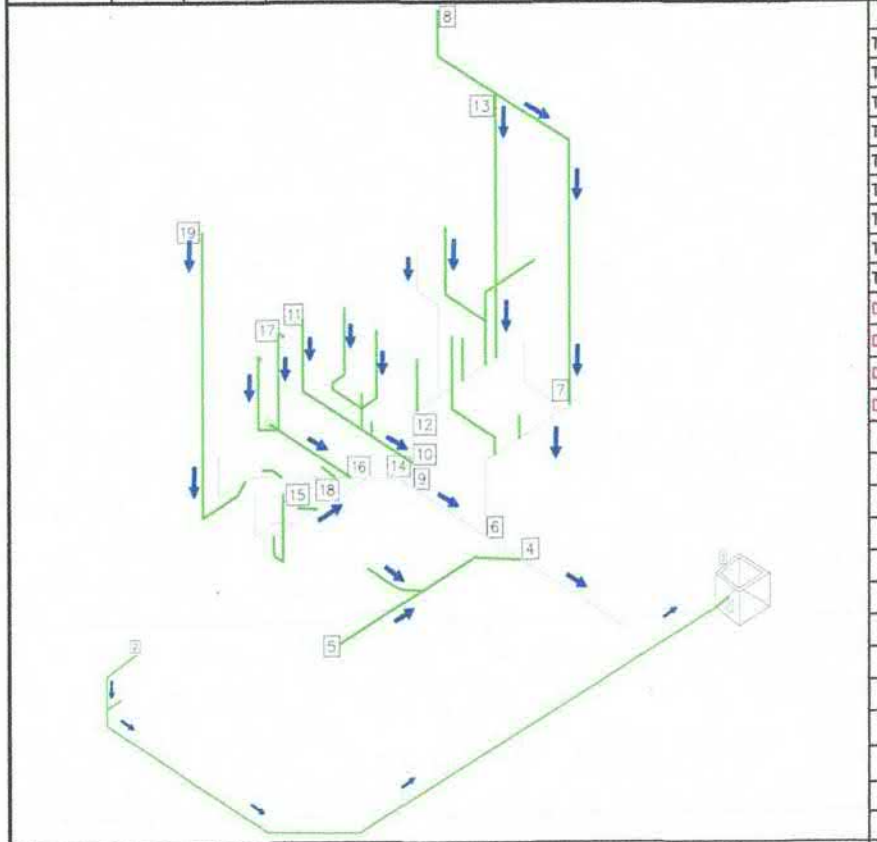

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ALTO (M)	ALTO (m)	VOL. (M3)	TOTAL
Tramo 1 a 2	29.23			1.00	29.23
Tramo 4 a 5	5.71			1.00	5.71
Tramo 6 a 7	3.23			1.00	3.23
Tramo 7 a 8	9.30			1.00	9.30
Tramo 10 a 11	9.28			1.00	9.28
Tramo 12 a 13	11.84			1.00	11.84
Tramo 14 a 15	2.32			1.00	2.32
Tramo 16 a 17	5.71			1.00	5.71
Tramo 18 a 19	7.52			1.00	7.52
Descuento long salida lavamanos	0.824			-4.00	-3.30
Descuento salida sifon de piso	0.550			-12.00	-6.60
Descuento salida lavaplatos	0.927			-2.00	-1.85
Descuento salida orinal	1.500			-2.00	-3.00
				CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**69.39**
				ACUMULADO ACTAS PARCIALES	69.39
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0.00
				CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**69.39**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. HIDRO-SA-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6489

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	10.00	ITEM	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.01	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	

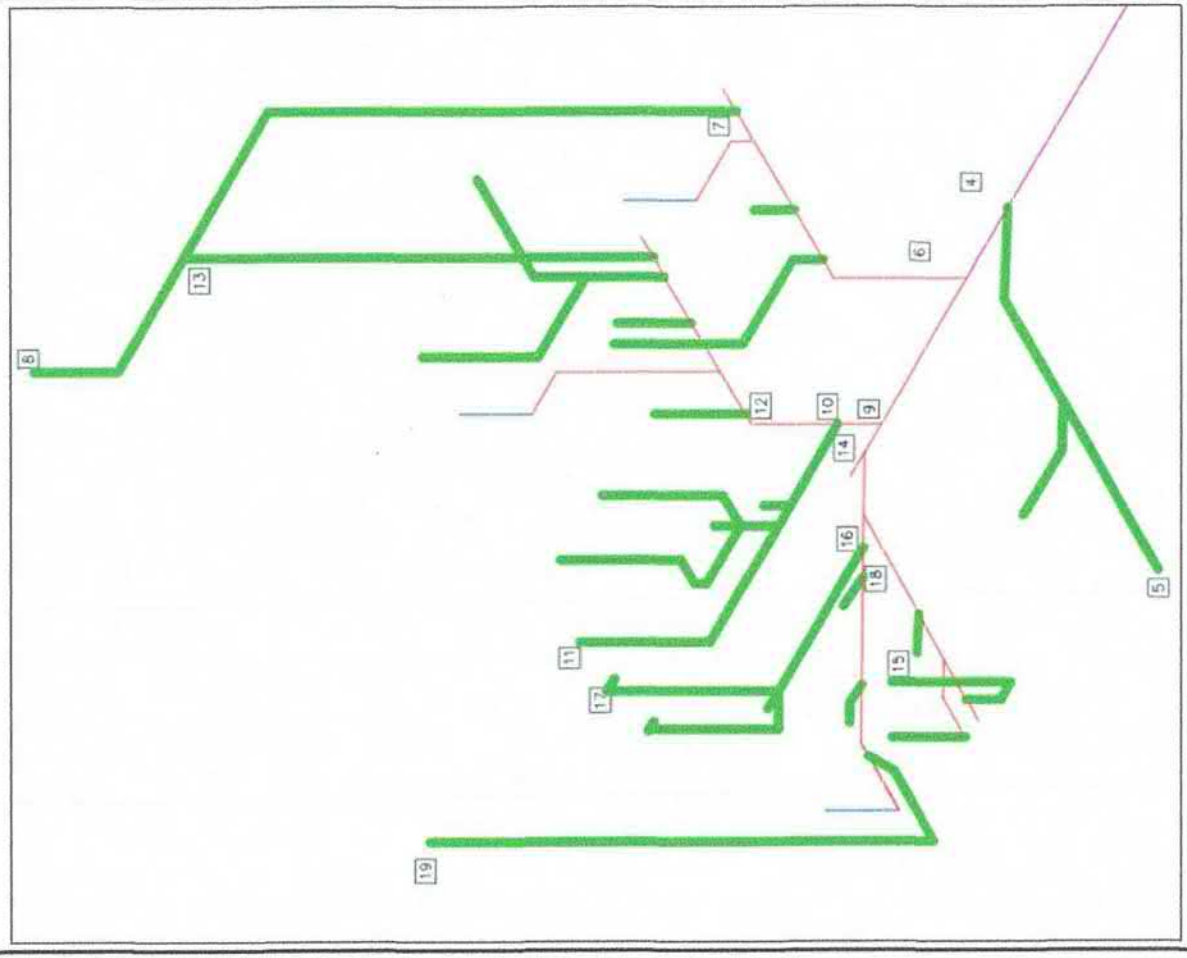

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO JAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	10.00	ITEM	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.01	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BADILLO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL PERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6484

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	10.00	**ITEM**	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	10.02	**UNIDAD**	ML	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

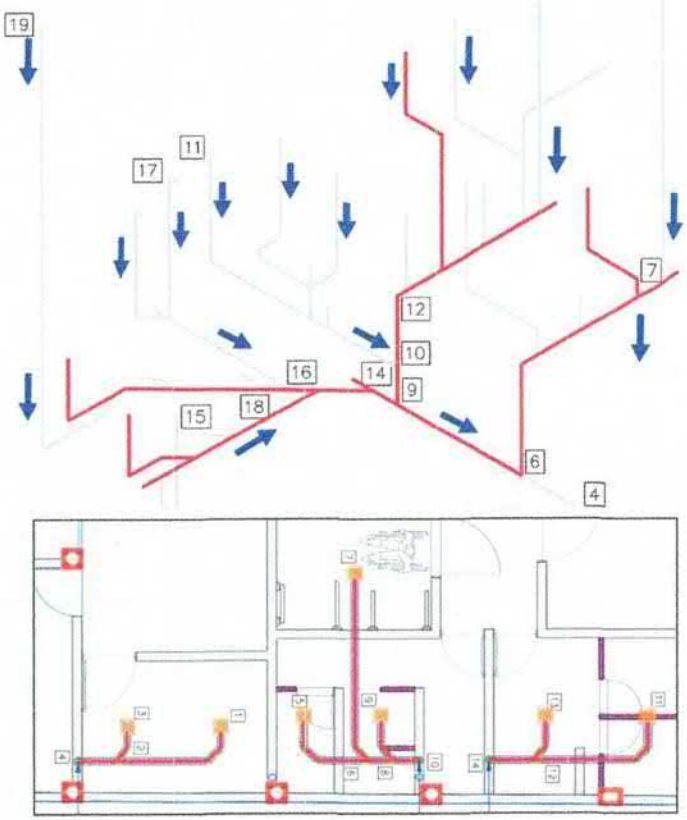

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ALTO (M)	ALTO (m)	CANTIDAD DE TRAMOS	TOTAL
Tramo 6 a 7	5.61			1.00	5.61
Tramo 6 a 9	1.84			1.00	1.84
Tramo 9 a 10	0.48			1.00	0.48
Tramo 10 a 12	0.94			1.00	0.94
Tramo 12 a 13	5.46			1.00	5.46
Tramo 9 a 14	0.66			1.00	0.66
Tramo 14 a 15	4.96			1.00	4.96
Tramo 14 a 16	0.35			1.00	0.35
Tramo 16 a 18	0.33			1.00	0.33
Tramo 18 a 19	3.43			1.00	3.43
Descuento salida sanitarios	0.52			-1.00	-0.52
				CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**38.65**
				ACUMULADO ACTAS PARCIALES	23.54
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	15.11
				CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**23.54**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. HIDRO-SA-FIS-GAITAN


ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL PERREIRA MARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
	Infraestructura										
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN											
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025		
CAPITULO	10.00	ITEM	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	10.02	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		

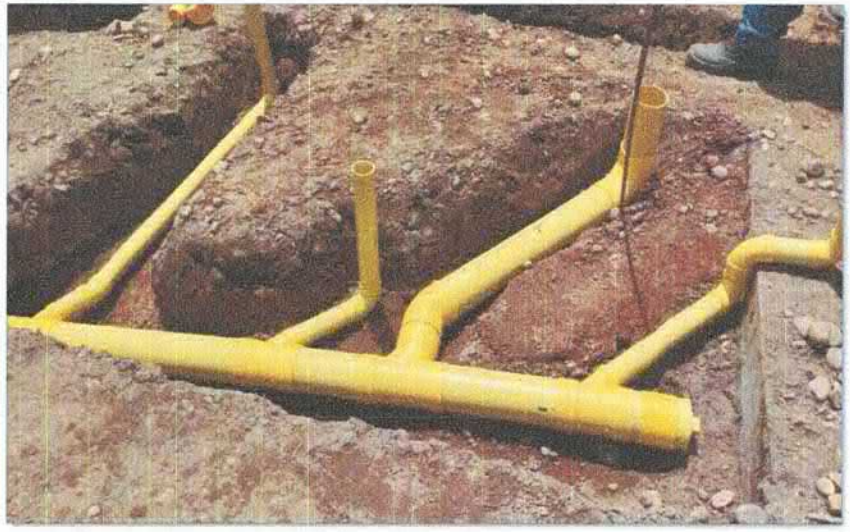



ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6496

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / Versión: 04 / Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA** 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	9020 17391-1		**CONTRATO No.**	1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	9020 13442-0		**CONTRATO No.**	1700 de 2025

CAPITULO	10.00	**ITEM**	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.03	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN** CASCO URBANO PUERTO GAITAN



DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CODO 90° 2"	CODO 45° 2"	ALTO (m)	YEE 2"	YEE DOBLE 2"	SIFON 2" 180°	TOTAL
Tramo de 1 a 2	2.00	4.00		1.00		2.00	9.00
Tramo 4 a 5	2.00	2.00		1.00		2.00	7.00
Tramo 6 a 7	3.00	1.00				1.00	5.00
Tramo 7 a 8	4.00		1.00				5.00
Tramo 10 a 11	7.00	1.00		3.00	1.00	1.00	13.00
Tramo 12 a 13	6.00			1.00		3.00	10.00
Tramo 14 a 15	3.00	1.00				1.00	5.00
Tramo 16 a 17	4.00				1.00		5.00
Tramo 18 a 19	4.00	2.00				2.00	8.00
Desc salida lavamanos (4)	-4.00						-4.00
Desc salida sifon de piso (12)	-12.00					-12.00	-24.00
Desc salida lavaplatos (2)	-2.00						-2.00
Desc salida orinal (2)	-4.00						-4.00

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**33.00**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	33.00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**33.00**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. HIDRO-SA-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6487

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	10.00	ITEM	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.03	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	

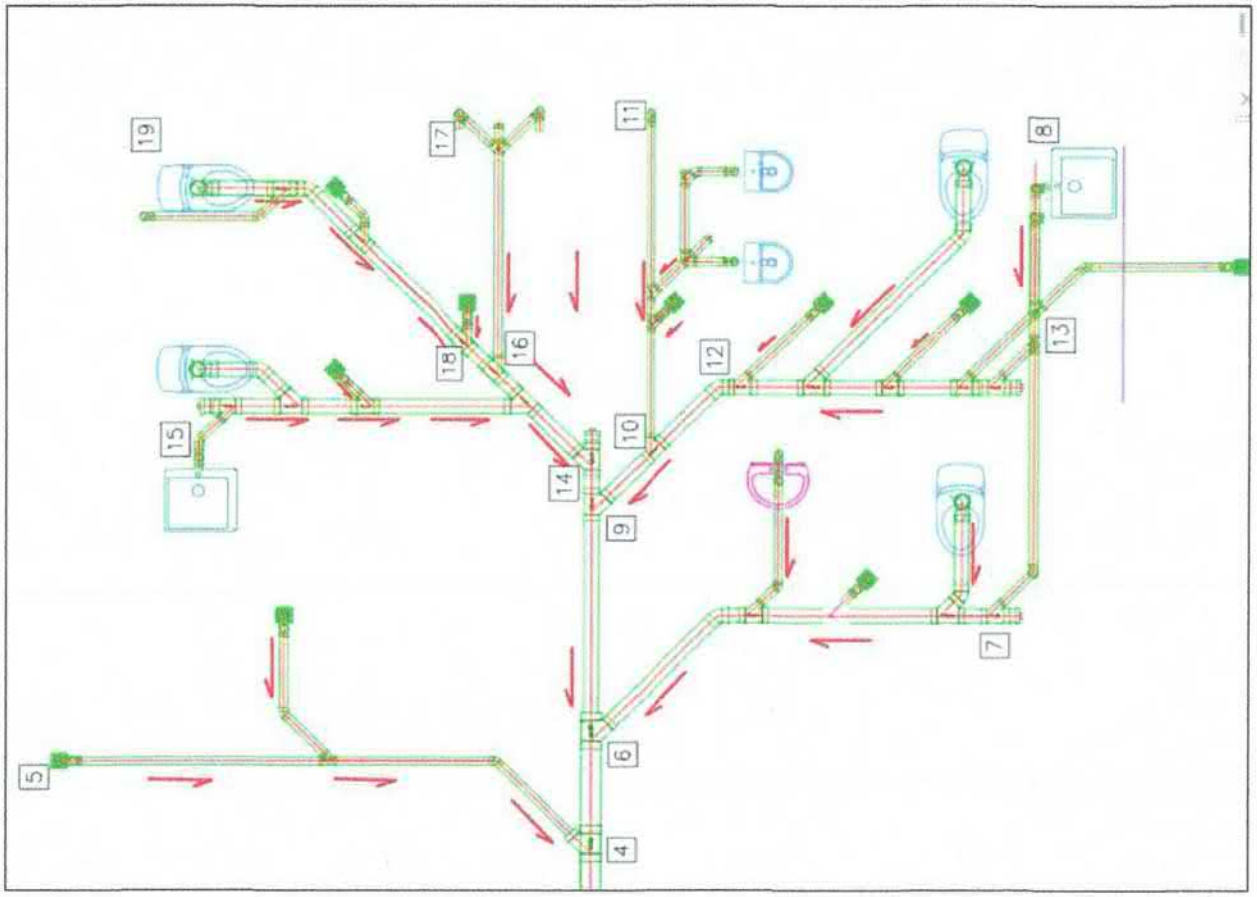

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO CABRERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL PERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	10.00	ITEM	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.03	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO CARDERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6489

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	10.00	**ITEM**	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.04	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

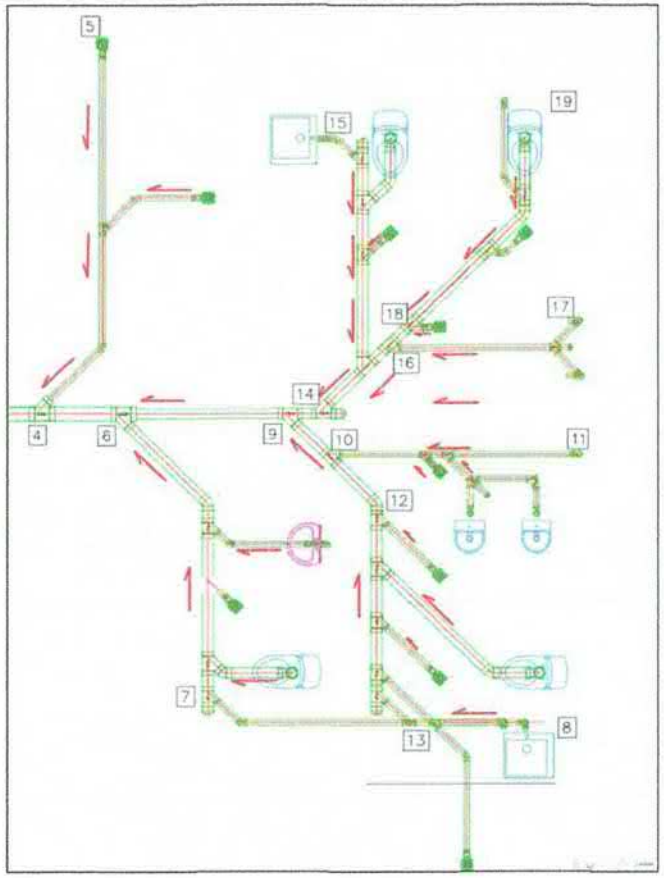

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CODO 90° 4"	CODO 45° 4"	ALTO (m)	YEE 4"	TAPON 4"	BUJE 4X2	TOTAL
Tramo 4 a 5						1.00	1.00
Tramo 6 a 7	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00		8.00
Tramo 6 a 9				1.00			1.00
Tramo 9 a 10			1.00				1.00
Tramo 10 a 12		1.00					1.00
Tramo 12 a 13	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00		8.00
Tramo 9 a 14				1.00	1.00		2.00
Tramo 14 a 15	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00		7.00
Tramo 14 a 16			1.00				1.00
Tramo 16 a 18			1.00				1.00
Tramo 18 a 19	1.00	1.00	2.00				4.00
Desc salida sanitario (4)	-4.00				-4.00		-8.00

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**44.00**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	27.00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	17.00
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**27.00**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. HIDRO-SA-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA VARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025		
CAPITULO	10.00	ITEM	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.04	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN		





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


CARLOS EDUARDO SAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6491

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
	Infraestructura										
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025				
	MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025			
CAPITULO	10.00	ITEM	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.09	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN		

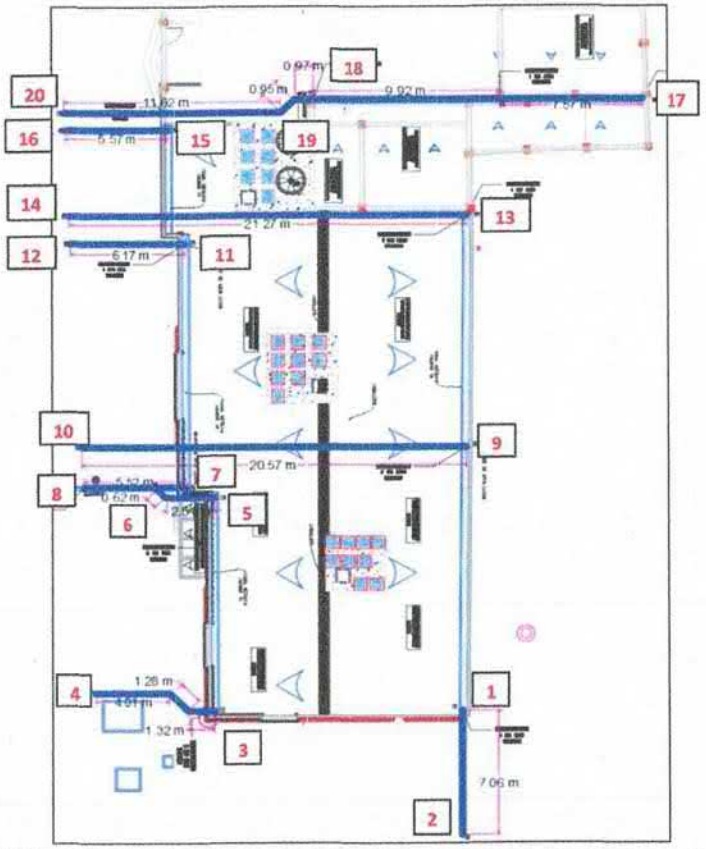

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ALTO (M)	ALTO (m)	VOL. (M3)	CANTIDAD	TOTAL
Tramo 1 a 2	7.06				1.00	7.06
Tramo 3 a 4	6.61				1.00	6.61
Tramo 5 a 6	3.13				1.00	3.13
Tramo 7 a 8	5.52				1.00	5.52
Tramo 9 a 10	20.57				1.00	20.57
Tramo 11 a 12	6.17				1.00	6.17
Tramo 13 a 14	21.27				1.00	21.27
Tramo 15 a 16	5.57				1.00	5.57
Tramo 17 a 18	7.57				1.00	7.57
Tramo 18 a 19	9.92				1.00	9.92
Tramo 19 a 20	13.54				1.00	13.54
					CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	106.93
					ACUMULADO ACTAS PARCIALES	106.93
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
					CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	106.93

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. ALL-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO SAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6497

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	10.00	ITEM	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.09	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6493

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	10.00	**ITEM**	CANAL LAMINA GAL C.16 LD=1.22M,ANTICO Y PINT, INCLUYE MALLA DE PROTECCION	10.11	**UNIDAD**	ML	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

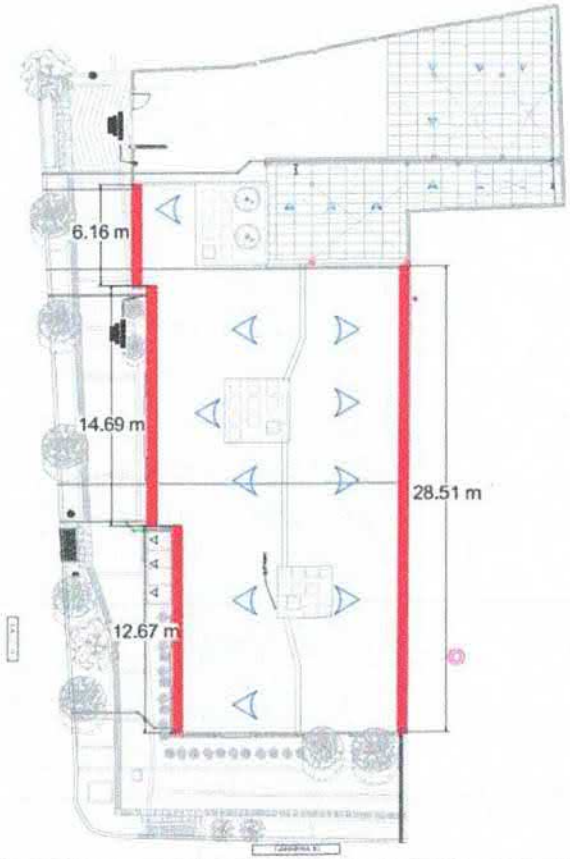

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ALTO (M)	ALTO (m)	VOL. (M3)	CANTIDAD	TOTAL
Canal posterior	28.51				1.00	28.51
Canal frontal 1	6.16				1.00	6.16
Canal frontal 2	14.69				1.00	14.69
Canal frontal 3	12.67				1.00	12.67

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**79.81**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	62.03
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	17.78
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**62.03**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. ALL-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA


RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6494

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÀN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	10.00	ITEM	CANAL LAMINA GAL C.16 LD=1.22M,ANTICO Y PINT, INCLUYE MALLA DE PROTECCION	10.11	UNIDAD	ML	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	



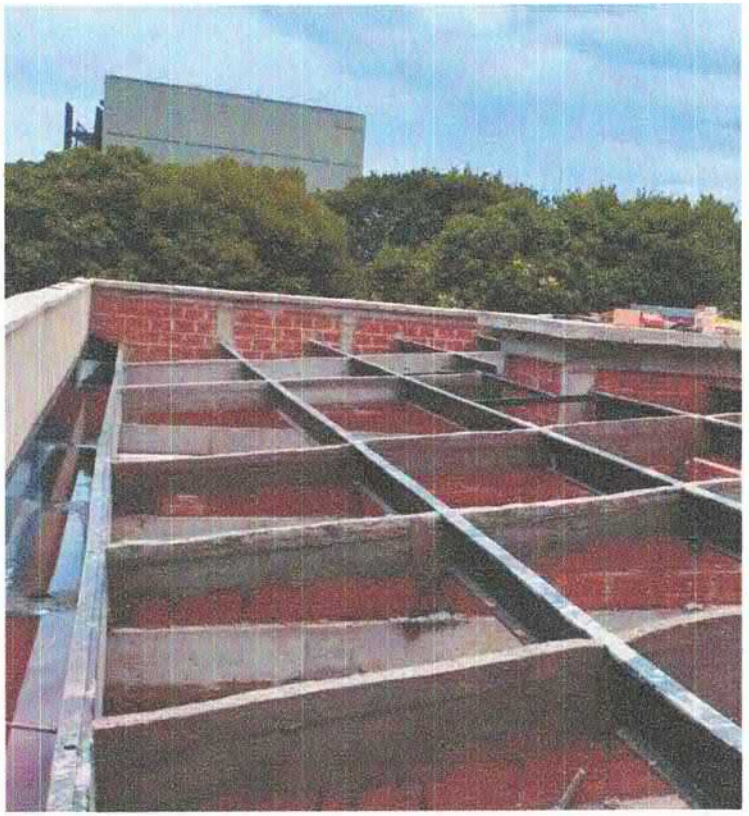

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6495

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION	
	Infraestructura	
	Codigo:INF-FR-20 / Versión: 04 / Vigencia:10-01-2025	Puerto Gaitán

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	10.00	**ITEM**	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.12	**UNIDAD**	ML	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

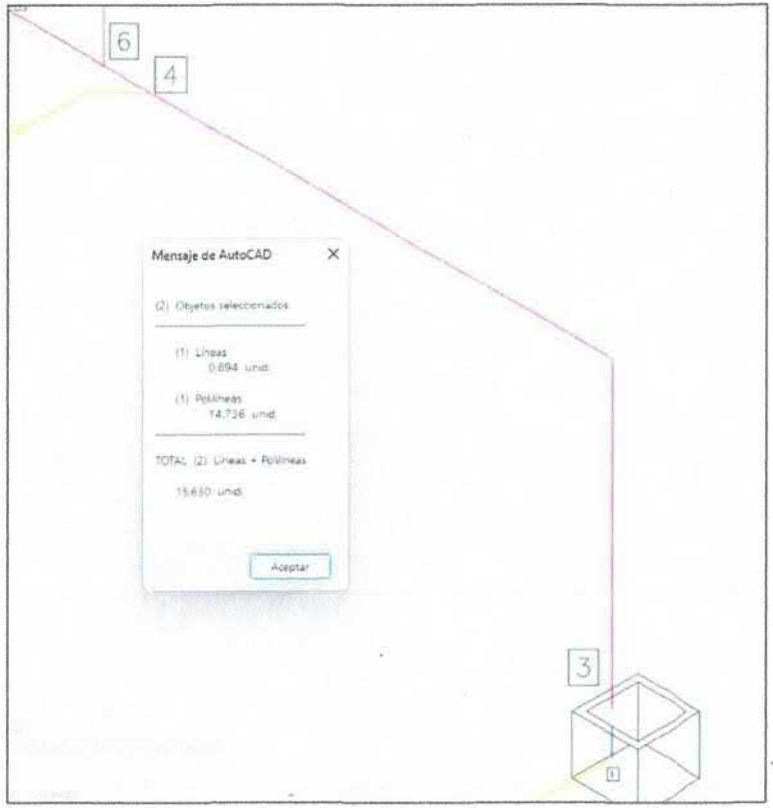

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	LARGO (M)	ALTO (M)	ALTO (m)	VOL. (M3)	CANTIDAD	TOTAL
Tramo 3 a 4	14.74				1.00	14.74
Tramo 4 a 6	0.89				1.00	0.89

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**15.63**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	15.63
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**15.63**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. HIDRO-SA-FIS-GAITAN


ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20		Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	10.00	ITEM	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10.12	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	

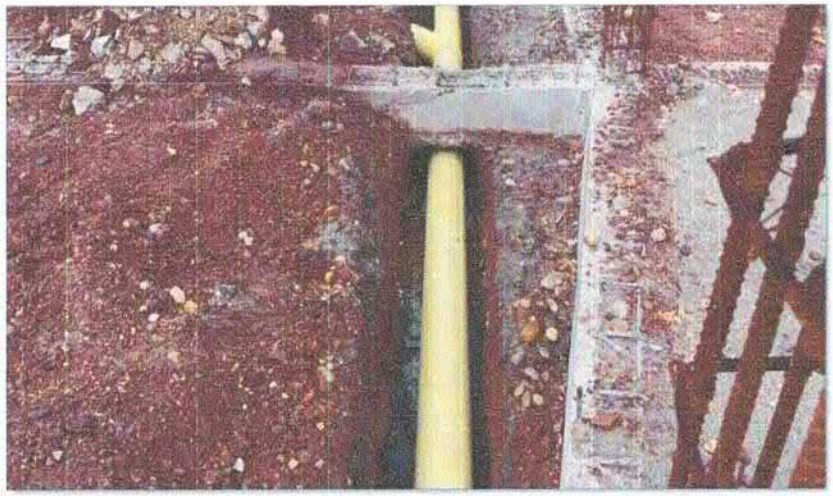



ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL CERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA


6497

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	9020 17391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	9020 13442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO	10.00	ITEM	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	I.C. 10.16	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

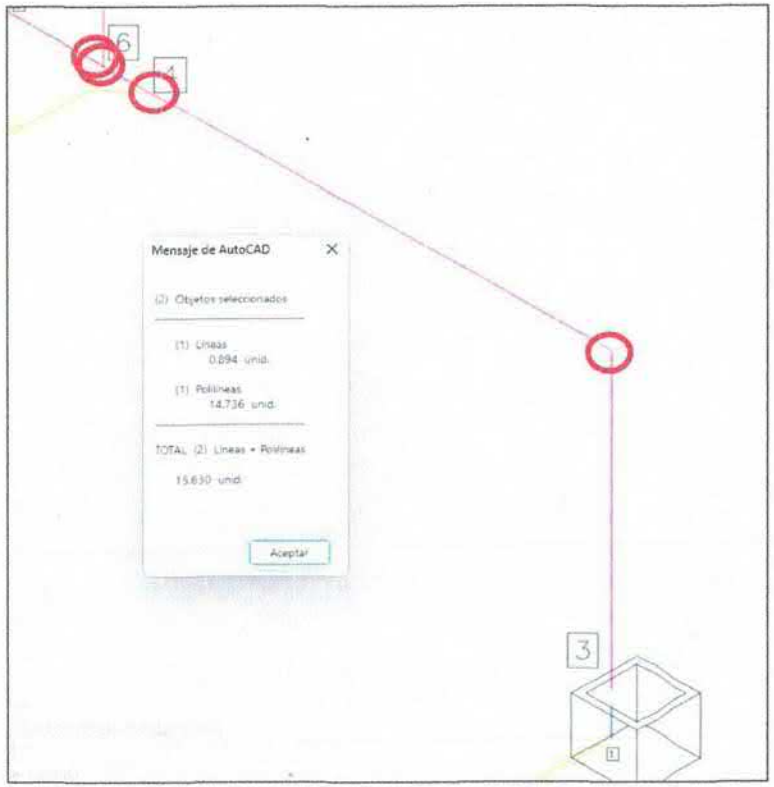

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	CODO 45°	YEE 6X4"	ALTO (m)	BUJE 6X4	CANTIDAD	TOTAL
Tramo 3 a 4	1.00	1.00			2.00	2.00
Tubería vertical			1.00	1.00	2.00	2.00

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	4.00
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	4.00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	4.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 10. HIDRO-SA-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BADILLO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
	Infraestructura								
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN									
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017381-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025
CAPITULO	10.00	ITEM	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	I.C. 10.16	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	16	**MM**	4	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO 12,00 RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS


6500

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1		**CONTRATO No.**		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0		**CONTRATO No.**		1700 de 2025

CAPITULO	12.00	**ITEM**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA. INCLUYE CABLE, VARILLAS, BENTONITA Y SOLDADURA.	I.C. 12.55	**UNIDAD**	UN	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN

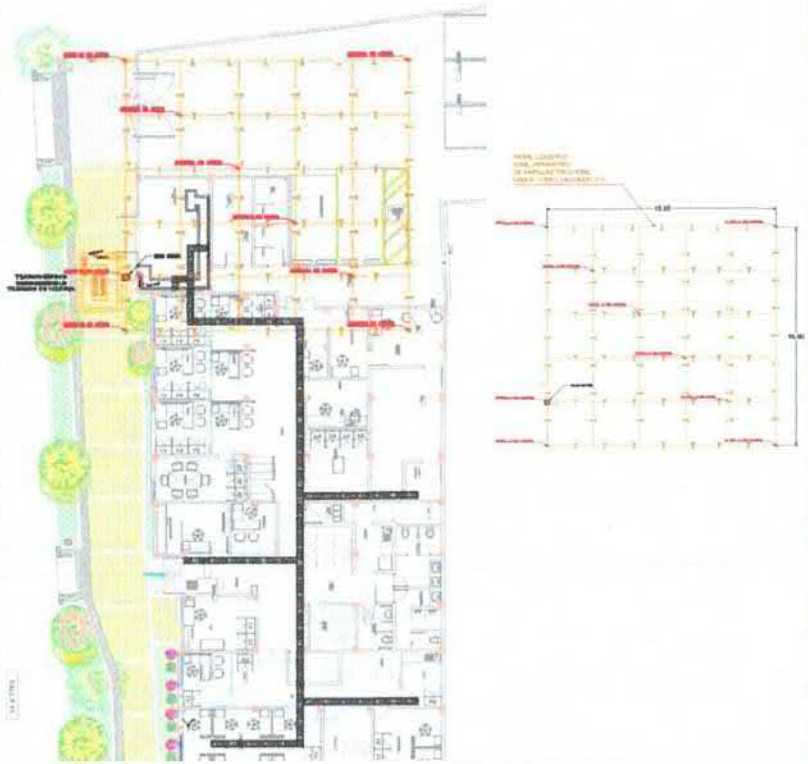

DESCRIPCIÓN	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**ÁREA (m2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Malla a tierra del proyecto					1.00	1.00

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**1.00**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	1.00
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	-
CANTIDAD OBRA ACTUALIZADA	1.00

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría, áreas determinadas con software AUTOCAD, ver planos 12.1 ELEC-FIS-GAITAN

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO PAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6501

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025	
CAPITULO	12.00	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA. INCLUYE CABLE, VARILLAS, BENTONITA Y SOLDADURA.	I.C. 12.55	UNIDAD	UN	UBICACIÓN		CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN


ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	16	MM	4	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.		1739 de 2025
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.		1700 de 2025

CAPITULO 15,00 TRANSPORTES

6503

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
	Infraestructura										
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN											
ACTA MODIFICATORIA N°	1		**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			**NIT**	902017391-1			**CONTRATO No.**	1739 de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			**NIT**	902013442-0			**CONTRATO No.**	1700 de 2025		

CAPITULO	15.00	**ITEM**	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	15.01	**UNIDAD**	M3/KM	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	

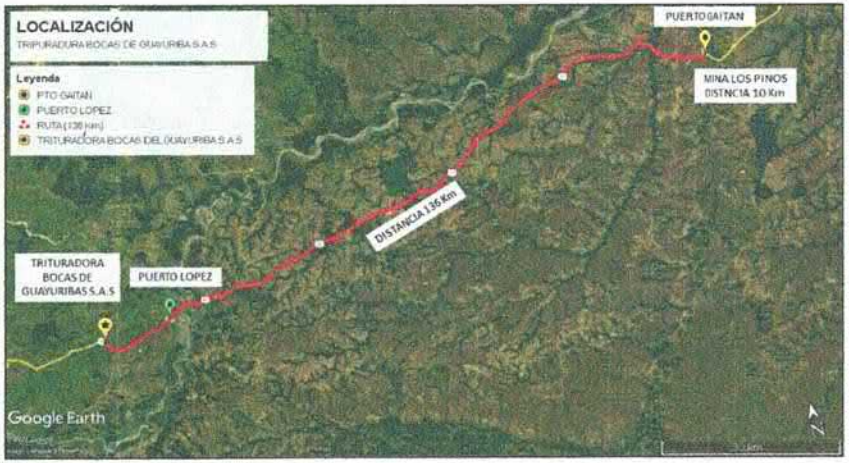

DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	ITEM	ALTO (m)	FACTOR DE EXPANSION	DISTANCIA	TOTAL
Relleno para estructuras con material granular tipo bg. compactación manual.	2.02	645.74	1.30	136.00	114,167.66

CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA	**128,222.94**
ACUMULADO ACTAS PARCIALES	114,167.66
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	14,055.28
CANTIDAD OBRA PRESENTE ACTA	**114,167.66**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoría

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6504

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	15.00	ITEM	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	15.01	UNIDAD	M3/KM	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN		





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6505

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-20	Versión: 04	Vigencia:10-01-2025	

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ACTA MODIFICATORIA N°	1	**FECHA**	**DD**	18	**MM**	9	**AA**	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		**NIT**	902017391-1			**CONTRATO No.**	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		**NIT**	902013442-0			**CONTRATO No.**	1700 de 2025	

CAPITULO	15.00	**ITEM**	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES PRODUCTO DE DEMOLICION	I.C. 15.03	**UNIDAD**	M3/KM	**UBICACIÓN**	CASCO URBANO PUERTO GAITAN



DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	ITEM	AREA M2	ALTO (m)	VOLUMEN M3	DISTANCIA	TOTAL
Demolicion concreto reforzado. incluye trasiego y cargue manual.	1.03			117.87	172.00	20,273.64
Demolicion manual muro divisorio bloque de arcilla. Incluye trasiego y cargue manual.	1.11	538.79	0.12	64.65	172.00	11,120.63
				CANTIDAD DE OBRA ACTUALIZADA		**31,394.27**
				ACUMULADO ACTAS PARCIALES		31,394.27
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		-
				CANTIDAD OBRA ACTUALIZADA		**31,394.27**

OBSERVACIONES: Revisado y aprobado por interventoria

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6506

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025	
CAPITULO	15.00	ITEM	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES PRODUCTO DE DEMOLICION	I.C. 15.03	UNIDAD	M3/KM		UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN	





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6567

INCONTECH SAS	INCONTECH SAS	CÓDIGO: SIG-OPS-F087	
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA	05/01/2023
	ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS	VERSIÓN:	001
NIT 901376424-1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1739 DE 2026: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"		

OT 1290-26 INC 3431-26

Villavicencio, Julio 04 del 2026.

Señor(es):
CONSORCIO INTERFISCA GAITÁN 25
Puerto Gaitan, Meta.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1739 DE 2026: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"

A continuación, presentamos el factor de abundamiento por cambio volumétrico de los escombros producidos durante la demolición de la edificación.

- Se tomo una muestra inalterada en campo, posteriormente se lleva la muestra en laboratorio donde se procede a disgregar el material para determinar su cambio de volumen:

Elemento	F (volumen)	F (densidad)	F adoptado
1 – Placa contrapiso (concreto)	1,3008	1,3002	1,30
2 – Muros (bloque)	1,3008	1,3001	1,30
3 – Placa contrapiso (concreto)	1,3008	1,3032	1,30
FACTOR DE ABUNDAMIENTO ADOPTADO – DEMOLICIÓN	**1,30**	**1,30**	**1,30**

ING. LINA GÓMEZ
DIRECTORA TÉCNICA
INCONTECH SAS
OT 1290-26

1. OBJETO

Determinar y verificar el factor de abundamiento (esponjamiento) de los residuos de demolición generados en la obra —concreto reforzado y muro en bloque de arcilla—, mediante dos métodos independientes que se contrastan entre sí, como herramienta de verificación de la interventoría para el reconocimiento del volumen real de material transportado a disposición final y su liquidación en el ítem de transporte.

2. FUNDAMENTO TÉCNICO

El abundamiento es el aumento de volumen que experimenta un material por su distinto acomodamiento al pasar de su estado en banco (elemento macizo o compacto en su posición original) a su estado suelto (fragmentado y cargado para transporte). En los residuos de demolición, la fragmentación de los elementos sólidos genera vacíos entre fragmentos, por lo que el volumen suelto a transportar supera el volumen geométrico del elemento original. Esta circunstancia debe considerarse en los cálculos de producción de transporte, y se cuantifica mediante el factor de abundamiento, definido como la relación entre el volumen suelto y el volumen en banco (equivalente a la relación entre la densidad en banco y la densidad suelta):

$$F = \frac{V_{suelto}}{V_{banco}} = \frac{\rho_{banco}}{\rho_{suelta}}$$

El ensayo se apoya en el principio de la norma INV E-217 (peso unitario / masa unitaria) y en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVÍAS 2022. Los rangos de referencia del abundamiento reportados en la literatura técnica de movimiento de tierras y demolición son de 1,10 a 1,40 para suelos y de 1,30 a 1,50 para concreto demolido; los factores adoptados en obra (1,30 para demolición) se ubican en el extremo conservador de dichos rangos.

3. ORIGEN DE LOS DATOS

Los datos empleados en el ensayo provienen de las siguientes fuentes verificables:

• **Volumen en banco:** calculado geométricamente a partir de las dimensiones reales de los elementos demolidos (placa de contrapiso y muros), consistente con las memorias de cálculo de cantidades aprobadas por la interventoría.



Ilustración 1. Toma de medidas de elementos a demoler

• **Volumen de la caja de la volqueta:** 12,00 m³, correspondiente al volumen útil de la volqueta doble troque empleada en el transporte.



Ilustración 2. Enrase de volqueta

• **Peso de la volqueta vacía (tara):** 12.000 kg, tomado de las especificaciones técnicas (ficha técnica) del vehículo.

• **Peso de la volqueta cargada:** medido en báscula sobre el material efectivamente transportado. La masa del material resulta de restar la tara al peso cargado.

• **Densidad en banco de referencia:** 2.400 kg/m³ para concreto reforzado y 2.000 kg/m³ para muro en bloque, según valores de referencia técnica para estos materiales.

4. METODOLOGÍA (DOBLE MÉTODO POR MUESTRA)

Para cada muestra se determina el factor por dos vías independientes que se contrastan:

Método 1 – Relación de volumen: F = Volumen suelto (caja de volqueta) / Volumen en banco del elemento demolido.

Método 2 – Relación de densidad: F = Densidad en banco de referencia / Densidad suelta medida (masa por báscula ÷ volumen de la caja).

Validación cruzada de la masa: en cada prueba se compara el peso teórico del material (volumen en banco × densidad de referencia) con el peso real obtenido en báscula (peso cargado − tara). La coincidencia entre ambos pesos confirma que la densidad de banco adoptada es correcta y, por tanto, que el factor determinado es confiable.

5. PRUEBAS Y RESULTADOS

Prueba 1 - Placa de contrapiso (concreto reforzado)

Parámetro	Valor	Unidad
Volumen en campo (banco) = 61,5 × 0,15	9,225	m^3
Volumen caja volqueta doble troque	12,00	m^3
Número de viajes	1	viaje
MÉTODO 1 – Relación de volumen = 12,00 / 9,225	**1,3008**	—
Densidad teórica concreto reforzado (banco)	2.400	kg/m^3
Peso material TEÓRICO = 9,225 × 2.400	22.140	kg
Peso volqueta cargada (báscula)	34.150	kg
Peso volqueta vacía / tara (ficha técnica)	12.000	kg
Peso material REAL (báscula) = 34.150 − 12.000	22.150	kg
Verificación: peso teórico ≈ peso báscula (dif. 10 kg → 0,05 %) → confirma la densidad de banco adoptada	✔	
Densidad del material suelto = 22.150 / 12,00	1.845,83	kg/m^3
MÉTODO 2 – Relación de densidad = 2.400 / 1.845,83	**1,3002**	—

INCONTECH SAS	INCONTECH SAS	CÓDIGO: SIG-OPS-F087	
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA	05/01/2023
	ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS	VERSIÓN:	001
NIT 901376424-1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1739 DE 2026: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"		

OT 1290-26 **INC 3431-26**

Prueba 2 - Muros (bloque de arcilla)

Parámetro	Valor	Unidad
Volumen en campo (banco) = 76,875 × 0,12	9,225	m³
Volumen caja volqueta doble troque	12,00	m³
Número de viajes	1	viaje
MÉTODO 1 – Relación de volumen = 12,00 / 9,225	**1,3008**	—
Densidad teórica muro en bloque (banco)	2.000	kg/m³
Peso material TEÓRICO = 9,225 × 2.000	18.450	kg
Peso volqueta cargada (báscula)	30.460	kg
Peso volqueta vacía / tara (ficha técnica)	12.000	kg
Peso material REAL (báscula) = 30.460 − 12.000	18.460	kg
Verificación: peso teórico ≈ peso báscula (dif. 10 kg → 0,05 %) → confirma la densidad de banco adoptada	✓	
Densidad del material suelto = 18.460 / 12,00	1.538,33	kg/m³
MÉTODO 2 – Relación de densidad = 2.000 / 1.538,33	**1,3001**	—

Prueba 3 - Placa de contrapiso (concreto reforzado)

Parámetro	Valor	Unidad
Volumen en campo (banco) = 61,5 × 0,15	9,225	m³
Volumen caja volqueta doble troque	12,00	m³
Número de viajes	1	viaje
MÉTODO 1 – Relación de volumen = 12,00 / 9,225	**1,3008**	—
Densidad teórica concreto reforzado (banco)	2.400	kg/m³
Peso material TEÓRICO = 9,225 × 2.400	22.140	kg
Peso volqueta cargada (báscula)	34.100	kg
Peso volqueta vacía / tara (ficha técnica)	12.000	kg
Peso material REAL (báscula) = 34.100 − 12.000	22.100	kg
Verificación: peso teórico ≈ peso báscula (dif. 40 kg → 0,18 %) → confirma la densidad de banco adoptada	✓	

OT 1290-26 **INC 3431-26**

Densidad del material suelto = 22.100 / 12,00	1.841,66	kg/m³
MÉTODO 2 – Relación de densidad = 2.400 / 1.841,66	**1,3032**	—

Resumen de resultados

Prueba	F (volumen)	F (densidad)	F adoptado
1 – Placa contrapiso (concreto)	1,3008	1,3002	1,30
2 – Muros (bloque)	1,3008	1,3001	1,30
3 – Placa contrapiso (concreto)	1,3008	1,3032	1,30
FACTOR DE ABUNDAMIENTO ADOPTADO – DEMOLICIÓN	**1,30**	**1,30**	**1,30**

6. CONCLUSIÓN Y CARÁCTER VINCULANTE

En las tres pruebas ejecutadas, los dos métodos independientes convergen en un factor de abundamiento de 1,30: la relación de volumen (volumen suelto de la caja de volqueta frente al volumen en banco del elemento demolido) arroja 1,3008, y la relación de densidad (densidad en banco de referencia frente a densidad suelta medida en báscula) arroja entre 1,3001 y 1,3032. La coincidencia de ambos métodos, sobre datos de fuentes independientes (geometría de los elementos, ficha técnica del vehículo y pesaje en báscula), corrobora de manera sólida el factor de 1,30 adoptado en el análisis de precio unitario del transporte de demolición.

En consecuencia, el factor de abundamiento de 1,30 constituye el valor oficial de conversión volumétrica para la liquidación y reconocimiento de las cantidades del ítem de transporte de demolición del Contrato de Obra N.° 1700 de 2025. El volumen suelto establecido se calcula multiplicando el volumen geométrico en banco aprobado por la interventoría por el factor aquí establecido.

ING. LINA GÓMEZ
DIRECTORA TÉCNICA
INCONTECH SAS
OT 1290-26

6513

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
	Infraestructura										
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN											
ACTA MODIFICATORIA N°	1		FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25			NIT	902017391-1			CONTRATO No.	1739 de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25			NIT	902013442-0			CONTRATO No.	1700 de 2025		
CAPITULO	15.00	ITEM	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE MATERIAL DE EXCAVACION		I.C. 15.04	UNIDAD	M3/KM	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN		



DESCRIPCIÓN / LOCALIZACIÓN	ITEM	AREA M2	ALTO (m)	VOLUMEN M3	DISTANCIA	TOTAL
Descapote manual H= 0.15 m con trasiego de material sobrante	1.02	573.24	0.15	85.99	172.00	14,789.59
Excavacion manual en conglomerado H= 2.01 - 4.00 m incluye cargue	I.C. 2,07			270.51	172.00	46,527.72

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
	Infraestructura									
	Codigo:INF-FR-20			Versión: 04			Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN										
ACTA MODIFICATORIA N°	1	FECHA	DD	18	MM	9	AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25		NIT	902017391-1		CONTRATO No.	1739 de 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25		NIT	902013442-0		CONTRATO No.	1700 de 2025			
CAPITULO	15.00	ITEM	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE MATERIAL DE EXCAVACION	I.C. 15.04	UNIDAD	M3/KM	UBICACIÓN	CASCO URBANO PUERTO GAITAN		





ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Director de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ
Residente de obra
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
CONTRATISTA DE OBRA

RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
Director de Interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

NIVALDO OJEDA PINTO
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
INTERVENTORIA

6515

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	**INCONTECH SAS**	CÓDIGO: SIG-OPS-F087	
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA	05/01/2023
	ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS	VERSIÓN:	001
NIT 901376424-1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1739 DE 2026: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"		

OT 1290-26 INC 3432-26

Villavicencio, Julio 04 del 2026.

Señor(es):
CONSORCIO INTERFISCA GAITÁN 25
Puerto Gaitan, Meta.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1739 DE 2026: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"

A continuación, presentamos los factores de esponjamiento por cambio volumétrico del material natural presente en el terreo del proyecto correspondiente a un suelo compuesto por "**CONGLOMERADO COMPUESTO POR ARENAS Y GRAVAS COLOR CAFÉ CLARO**"

- Se tomo una muestra inalterada en campo, posteriormente se lleva la muestra en laboratorio donde se procede a disgregar el material para determinar su cambio de volumen:

Volumen en campo suelo natural muestra inalterada	3275	cm3
Volumen material suelto	3928.6	cm3
% de esponjamiento	20 %	

ING. LINA GÓMEZ
DIRECTORA TÉCNICA
INCONTECH SAS
OT 1290-26

INCONTECH SAS LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS	INCONTECH SAS	CÓDIGO: SIG-OPS-F087	
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS	FECHA DE VIGENCIA	05/01/2023
	ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS	VERSIÓN:	001
NIT 901376424-1	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1739 DE 2026: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"		

OT 1290-26 INC 3432-26

1. OBJETO

Determinar el porcentaje de incremento volumétrico (Factor de Esponjamiento) que experimenta el material producto de excavación, mediante la comparación entre el volumen del suelo en estado natural y el volumen del mismo material después de su extracción y disgregación en laboratorio.

El resultado obtenido constituye un parámetro técnico para cuantificar el incremento volumétrico generado por la pérdida de confinamiento del suelo durante las actividades de excavación.

2. ANTECEDENTES

Durante la ejecución de las excavaciones correspondientes al proyecto, el contratista evidenció que el volumen del material excavado fue superior al volumen teórico calculado en estado natural.

Con el propósito de establecer técnicamente el incremento volumétrico presentado por el suelo excavado, se solicitó al laboratorio la determinación del porcentaje de esponjamiento mediante mediciones volumétricas controladas.

3. OBJETIVO

Determinar experimentalmente el porcentaje de expansión volumétrica del material excavado, producto de la pérdida de confinamiento y de la disgregación natural del suelo.

4. ALCANCE

El presente informe corresponde exclusivamente a la determinación del cambio volumétrico del material analizado.

Los resultados únicamente representan las condiciones del material ensayado y no constituyen un estudio geotécnico del sitio.

5. FUNDAMENTO TECNICO

Cuando un suelo se encuentra en estado natural, las partículas permanecen confinadas bajo esfuerzos efectivos generados por el peso propio del terreno.

Durante la excavación se produce:

- Perdida de confinamiento
- Separación de partículas
- Incremento del índice de vacíos

- Aumento del volumen aparente

Este fenómeno se conoce como:

- **Esponjamiento (Swell o bulking)**

El porcentaje de esponjamiento se determina mediante

$$\%E = \frac{V_s - V_n}{V_n} x100$$

Vn = Volumen del suelo natural

Vs = Volumen del material suelto

6. REFERENCIAS TÉCNICAS

La metodología aplicada se fundamenta en los criterios técnicos establecidos en:

- Braja M. Das – Fundamentos de ingeniería geotécnica
- Bowles – Foundation Analysis and Design
- US Army Corps Of Engineers
- Principles of Geotechnical Engineering

7. METODOLOGÍA

7.1. Obtención de muestra

Se obtuvo una muestra inalterada representativa del estrato objeto de excavación procurando conservar su volumen original.

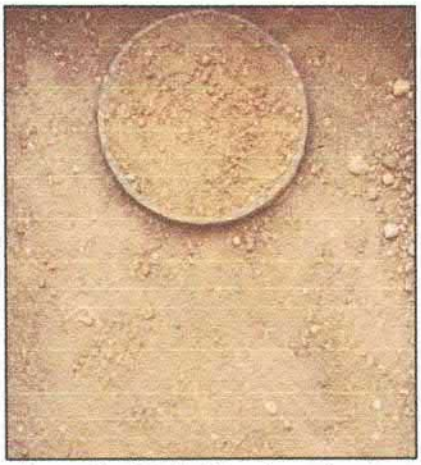


Ilustración 1. Molde hincado en el suelo
