Yopal, 16 de septiembre de 2026

Señores
INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEV
Atn.: TATIANA VEGA MOGOLLÓN
Supervisora del contrato
Yopal-Casanare

REFERENCIA: Informe de actividades Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. **MC-INDEV-007-2026.**

INFORME DE ACTIVIDADES	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. DEL CONTRATO	141-2026
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE **($10.068.277,49)**
CONTRATANTE	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 – INDEV
CONTRATISTA	VIBO PUBLICIDAD + DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.S. (VIBO S.A.S.
No. DE IDENTIFICACION	901.804.434-2
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES
SUPERVISOR	TATIANA VEGA MOGOLLÓN
FECHA DE INICIO	21/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20/08/2026
PERIODO DEL INFORME	21/07/2026 Al 20/08/2026
OBJETO DEL CONTRATO	“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA MANZANA O CASA 11 DE LA URBANIZACIÓN VILLA DAVID, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 470-115332, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.0 PRELIMINARES

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
1.1	Desmonte aparatos sanitarios	UND	2,00	$15.097,00	$30.194,00	100%
1.2	Desmonte lavaderos prefabricados, con retiro	UND	0,48	$91.450,00	$43.896,00	100%
1.3	Desmonte marcos y puertas con transporte	M²	2,03	$17.143,00	$34.800,29	100%
1.4	Desmonte de ventanas, con transporte	M²	2,13	$10.695,00	$22.780,35	100%
1.5	Demolición enchape muro con retiro	M²	9,06	$9.417,00	$85.318,02	100%
				TOTAL PRELIMINARES	**$216.988,66**	**100%**

2.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
2.1	Excavación a mano en material común	M³	0,54	$48.174,00	$26.013,96	100%
2.2	Relleno de excavación (con material local)	M³	0,45	$21.824,00	$9.820,80	100%
2.3	Encamado tubería con arena apisonado (arena sucia de río)	M³	0,09	$72.245,00	$6.502,05	100%
				TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS	**$42.336,81**	**100%**

3.0 INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
3.1	Bajante de A.LL. con tubería sanitaria PVC 4"	ML	9,00	$51.685,00	$465.165,00	100%
				TOTAL INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS	**$465.165,00**	**100%**

4.0 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
4.1	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e instalación	UND	2,00	$40.799,00	$81.598,00	100%
4.2	Ducha o regadera con brazo	UND	1,00	$69.565,00	$69.565,00	100%

	cromada. Suministro e instalación					
4.3	Tapa registro plástica 20 x 20	UND	1,00	$19.111,00	$19.111,00	100%
TOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS					**$170.274,00**	**100%**

5.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
5.1	Interruptor sencillo, línea decorativa, suministro e instalación	UND	2,00	$35.748,00	$71.496,00	100%
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					**$71.496,00**	**100%**

6.0 CUBIERTA

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
6.1	Impermeabilización placas/viga canal con Sikatecho E (4 capas) + Sikafelt (2 capas) + 1 capa de Alumol	M²	7,59	$67.332,00	$511.049,88	100%
TOTAL CUBIERTA					**$511.049,88**	**100%**

7.0 PINTURA

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
7.1	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	M²	11,94	$15.825,00	$188.950,50	100%
7.2	Graniplast esgrafiado fachada	M²	7,39	$29.372,00	$217.059,08	100%
TOTAL PINTURA					**$406.009,58**	**100%**

8.0 CARPINTERÍA METÁLICA

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
8.1	Ventana en lámina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instalación	M²	2,13	$332.293,00	$707.784,09	100%
8.2	Reja en tubo cuadrado 1" Cal. 18 y tubo cuadrado 1 1/2" Cal. 18, anticorrosivo,	M²	2,13	$182.504,00	$388.733,52	100%

	pintura e instalada.					
8.3	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo + cerrojo para entrada principal. Suministro e instalación	UND	1,00	$246.463,00	$246.463,00	100%
8.4	Esmalte sobre ventanas en lámina (incluye anticorrosivo)	M²	5,40	$13.894,00	$75.027,60	100%
8.5	Pintura esmalte sobre marco metálico de puertas	M²	5,00	$11.262,00	$56.310,00	100%
8.6	Pintura esmalte sobre lámina llena (incluye anticorrosivo)	M²	0,90	$25.643,00	$23.078,70	100%
8.7	Pintura en esmalte para estructura metálica existente	M²	43,00	$16.414,00	$705.802,00	100%
8.8	Vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instalación	M²	0,54	$66.721,00	$36.029,34	100%
8.9	Puerta en lámina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instalación	UND	2,03	$720.763,00	$1.463.148,89	100%
TOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					**$3.702.377,14**	**100%**

9.0 ENCHAPES Y ACCESORIOS

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
9.1	Enchape piso-pared cerámica lisa 20 x 20 blanca	M²	9,46	$69.465,00	$657.138,90	100%
9.2	Remate bocel win en aluminio	ML	2,43	$13.064,00	$31.745,52	100%
TOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS					**$688.884,42**	**100%**

10.0 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado

10.1	Lavamanos con pedestal Avanti con grifería sencilla Nogal de Corona o similar	UND	1,00	$359.474,00	$359.474,00	100%
10.2	Sanitario blanco dos piezas. Incluye grifería, asiento, válvula reguladora y acople metálico	UND	1,00	$371.900,00	$371.900,00	100%
10.3	Juego de incrustaciones para baño tipo económico (3 piezas). Suministro e instalación	JGO	1,00	$95.133,00	$95.133,00	100%
TOTAL APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA					**$826.507,00**	**100%**

11.0 TANQUE LAVADERO

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor ejecutado	% ejecutado
11.1	Tanque lavadero prefabricado de 60 x 80 de 360 litros. Suministro e instalación	UND	1,00	$412.551,00	$412.551,00	100%
TOTAL TANQUE LAVADERO					**$412.551,00**	**100%**

2. RESUMEN ECONÓMICO

Concepto	Valor
Costo directo	$7.513.639,49
Administración 27%	$2.028.683,00
Imprevistos 2%	$150.273,00
Utilidad 5%	$375.682,00
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	**$10.068.277,49**

3. REGISTRO FOTOGRAFICO Y DESCRIPCION

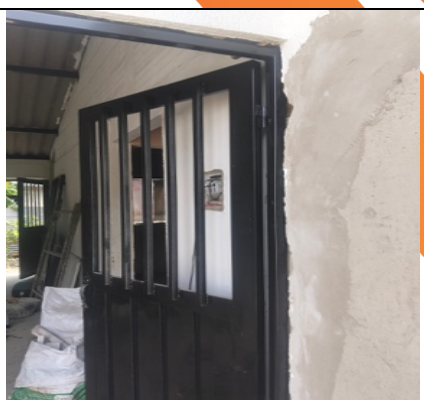
ACTIVIDADES EJECUTADAS			
ITEM	**DESCRIPCION ESPECIFICACION**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**
1.1.	Desmonte aparatos sanitarios	Unidad (Und)	2,00
ANTES		**DESPUES**	
			
DESCRIPCIÓN: Este ítem comprende el retiro cuidadoso de sanitarios, lavamanos y accesorios existentes, incluyendo desconexión de redes hidráulicas y sanitarias. Se deberá evitar daños en muros, pisos y redes existentes. Incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado.		**Cumplimiento:** Se realizó el retiro de los sanitarios, lavamanos y accesorios existentes, efectuando la correspondiente desconexión de las redes hidráulicas y sanitarias, procurando evitar afectaciones en muros, pisos y redes existentes. Asimismo, se realizó el cargue, retiro y disposición final de los escombros y materiales resultantes, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.	

1.2.	Desmonte lavaderos prefabricados, con retiro	Unidad (Und)	0,48

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem incluye demolición o desinstalación de lavaderos prefabricados, desconexión de redes hidráulicas y sanitarias, retiro de residuos y transporte a botadero autorizado.	**Cumplimiento:** Se realizó la demolición y desinstalación del lavadero prefabricado, incluyendo la desconexión de las redes hidráulicas y sanitarias. De igual manera, se efectuó el retiro de los residuos generados y su correspondiente transporte y disposición. De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

1.3.	Desmonte marcos y puertas con transporte	Metro Cuadrado (m2)	2,03

ANTES	DESPUES
	

	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el retiro de puertas, marcos y rejas existentes en metal, incluyendo herrajes. Se debe evitar afectación a los vanos. Incluye cargue, transporte y disposición final.	**Cumplimiento:** Se realizó el retiro de las puertas, marcos y rejas de metal existentes, incluyendo sus respectivos herrajes, efectuando las actividades de manera cuidadosa para evitar afectaciones en los Daños. Así mismo, se realizó el cargue, transporte y disposición final de los elementos retirados, de conformidad con las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en el contrato.

1.4.	Desmonte de ventanas, con transporte	Metro Cuadrado (m2)	2,13

ANTES	**DESPUES**
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el desmonte de ventanas y rejas existentes (metálicas), incluyendo marcos, hojas, vidrios, accesorios y elementos de fijación. Incluye retiro y disposición final.	**Cumplimiento:** Se realizó el desmonte de las ventanas y rejas metálicas existentes, incluyendo marcos, hojas, vidrios, accesorios y elementos de fijación. Así mismo, se efectuó el retiro y disposición final de los elementos desmontados,

		de conformidad con las especificaciones técnicas y las obligaciones del contrato.	
1.5.	Demolición enchape muro con retiro	Metro Cuadrado (m2)	9,0
ANTES		**DESPUES**	
			
DESCRIPCIÓN: Esta actividad comprende la demolición y retiro del enchape existente adherido a muros, incluyendo baldosas, cerámica, porcelanato o material similar, mediante procedimientos manuales o mecánicos controlados, evitando afectar la estabilidad y condiciones del muro base.		**Cumplimiento:** Se realizó la demolición y retiro del enchape existente en los muros**,** incluyendo baldosas, cerámica, porcelanato o material similar, mediante procedimientos controlados, procurando no afectar la estabilidad ni las condiciones del muro base. Los residuos generados fueron retirados y dispuestos adecuadamente, de conformidad con las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en el contrato**.**	

2.0. EXCAVACIONES Y RELLENOS			
2.1.	Excavación a mano en material común	Metro Cubico (m3)	0,54

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Esta actividad comprende la ejecución de excavaciones manuales en terreno o material común, necesarias para instalaciones de bajantes de aguas lluvias u otras obras requeridas en el proyecto, realizadas con herramienta manual y conforme a las dimensiones, niveles y alineamientos indicados en las memorias de cantidades o definidos por la supervisión. Incluye el corte, retiro del material sobrante excavado, cargue, transporte interno y disposición temporal del material sobrante dentro del área de obra o en sitio autorizado. Los trabajos deberán ejecutarse garantizando la estabilidad del terreno y la seguridad del personal.	**Cumplimiento:** Se ejecutaron las actividades de excavación manual requeridas para el desarrollo de las obras, realizando el manejo y retiro del material producto de la excavación de acuerdo con las condiciones de la obra. Los trabajos fueron desarrollados de manera controlada, garantizando las condiciones necesarias para la continuidad de las actividades y la seguridad durante su ejecución, en cumplimiento de las obligaciones y especificaciones establecidas en el contrato.

2.2.	Relleno de excavación (con material local)	Metro Cubico (m3)	0,45

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Esta actividad comprende el suministro, extendido, conformación y compactación de material local proveniente de la misma excavación o de áreas cercanas aprobadas por la supervisión, utilizado para el relleno de zanjas, excavaciones, sobre excavaciones o conformación de niveles, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones del proyecto. El material deberá estar libre de elementos orgánicos, basuras, escombros o materiales inadecuados. El relleno se ejecutará por capas sucesivas de espesor adecuado, humedecidas y compactadas manualmente hasta alcanzar el nivel requerido.	**Cumplimiento:** Se realizaron las actividades de relleno y adecuación del área intervenida, utilizando material apto para las condiciones de la obra. El material fue extendido y dispuesto de manera uniforme, efectuando la correspondiente compactación hasta obtener las condiciones y niveles requeridos para la continuidad de los trabajos, de conformidad con las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en el contrato.

2.3.	Encamado tubería con arena apisonado (arena sucia de rio)	Metro Cubico (m3)	0,09

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Esta actividad comprende el suministro, transporte interno, colocación, nivelación y compactación manual de arena sucia de río para la conformación del encamado de tuberías de aguas lluvias, garantizando una base uniforme y estable que proteja la tubería y asegure su correcto apoyo y funcionamiento. El material deberá colocarse en el fondo de la excavación con el espesor indicado en las memorias de cantidades, distribuyéndose uniformemente y compactándose manualmente antes y después de la instalación de la tubería, evitando vacíos o puntos de apoyo inadecuados.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro, transporte interno, colocación, nivelación y compactación manual de arena sucia de río para la conformación del encamado de las tuberías de aguas lluvias, garantizando su adecuado apoyo y estabilidad, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

3.0. INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS			
3.1.	Bajante de A.LL. con tubería Sanitaria PVC 4"	Metro (m)	9,00

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4", para aguas lluvias, cumpliendo norma técnica vigente (NTC). Incluye pruebas de hermeticidad y correcta pendiente.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4" para aguas lluvias, incluyendo las respectivas pruebas de hermeticidad y verificación de la pendiente, conforme a las especificaciones establecidas en el contrato.

4.0. INSTALACIONES HIDRÁULICAS			
4.1.	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	Unidad (Und)	2,00

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de llave metálica tipo pesado de 1/2", resistente a la intemperie. Incluye accesorios, sellos, conexión a red existente y pruebas de funcionamiento.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de llave metálica tipo pesado de 1/2", incluyendo sus accesorios, sellos y conexión a la red existente, verificando su correcto funcionamiento, de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato.

4.2.	Ducha o regadera con brazo cromada. Suministro e inst	Unidad (Und)	1,00

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de ducha metálica cromada con brazo. Incluye accesorios, conexión hidráulica, sellado y prueba de funcionamiento.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de ducha metálica cromada con brazo, incluyendo sus accesorios, conexión hidráulica, sellado y correspondiente prueba de funcionamiento, de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato.

4.3.	Tapa registro plástica 20 x 20	Unidad (Und)	1,00

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de tapa de inspección plástica de 20 x 20 cm. Incluye ajuste, nivelación y fijación adecuada.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de ducha metálica cromada con brazo, incluyendo sus accesorios, conexión hidráulica, sellado y correspondiente prueba de funcionamiento, de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato.

5.0. INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
5.1.	5.1. Interruptor sencillo, línea decorativa suministro e inst.	Unidad (Und)	2,00

ANTES	DESPUES
 	 
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de interruptor sencillo tipo decorativo. Incluye conexión y pruebas de funcionamiento.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de interruptor sencillo de tipo decorativo, incluyendo su respectiva conexión y prueba de funcionamiento, de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato.

6.0. CUBIERTA			
6.1.	Impermeabilización placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol	Metro cuadrado (m2)	7,56

ANTES	DESPUES
	

	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en Impermeabilización de viga canal mediante sistema con Sika compuesto por: • 4 capas de Sikatecho E • 2 capas de Sikafelt • 1 capa final de Alumol Incluye preparación de superficie, limpieza, resanes, aplicación según ficha técnica y pruebas de estanqueidad.	**Cumplimiento:** Se realizó la impermeabilización de la viga canal mediante el sistema Sika, previa preparación, limpieza y resane de la superficie, aplicando cuatro (4) capas de Sikatecho E, dos (2) capas de Sikafill y una (1) capa final de Alumol, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Finalmente, se realizaron las correspondientes pruebas de estanqueidad para verificar la correcta ejecución del trabajo.

7.0. PINTURA			
7.1.	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	Metro cuadrado (m2)	11,94

ANTES	**DESPUES**
 	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en la aplicación de pintura tipo vinilo sobre superficie interior pañetada. Incluye limpieza, resanes, sellador si aplica y tres manos de acabado uniforme.	**Cumplimiento:** Se realizó la aplicación de pintura tipo vinilo sobre superficies interiores pañetadas, incluyendo la limpieza y preparación de las superficies, resanes y aplicación de sellador cuando fue requerido, finalizando con tres (3) manos de pintura para garantizar un acabado uniforme, de conformidad con las especificaciones establecidas en el contrato.

7.2.	Graniplast esgrafiado fachada	Metro cuadrado (m2)	7,39

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en la aplicación de recubrimiento tipo Graniplast para fachada, acabado esgrafiado. Incluye preparación de superficie, base y aplicación según especificaciones del fabricante.	**Cumplimiento:** Se realizó aplicación de recubrimiento tipo Graniplast para fachada, con acabado esgrafiado, efectuando previamente la preparación de la superficie y la aplicación de la base y del recubrimiento, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

8.0. CARPINTERÍA METÁLICA

8.1.	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	Metro cuadrado (m2)	2,13

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en la fabricación e instalación de ventana en lámina cold rolled calibre 18, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte. Incluye vidrio incoloro de 4 mm, instalación, sellado y fijación.	**Cumplimiento:** Se realizó la fabricación e instalación de ventana en lámina Cold Rolled calibre 18, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte, incluyendo la instalación de vidrio incoloro de 4 mm, así como el correspondiente sellado y fijación, de conformidad con las

		especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	
8.2.	Reja en tubo cuadrado 1" Cal. 18 y tubo cuadrado 1 1/2" Cal. 18, anticorrosivo, pintura e instalada.	Metro cuadrado (m2)	2,13
ANTES		**DESPUES**	
			
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en la fabricación e instalación de reja en tubo cuadrado de 1” y 1 1/2” calibre 18. Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura.		**Cumplimiento:** Se realizó la fabricación e instalación de reja en tubo cuadrado de 1” y 1 ½” calibre 18, incluyendo los trabajos de soldadura, aplicación de anticorrosivo y pintura, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	
8.3.	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo + cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	Unidad (Und)	1,00
ANTES		**DESPUES**	
		 	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de cerradura tipo pomo con escudo más cerrojo adicional para puerta principal. Incluye ajustes y pruebas.		**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de cerradura tipo pomo con escudo y cerrojo adicional para puerta principal,	

		efectuando los ajustes requeridos y las respectivas pruebas de funcionamiento, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	
8.4.	Esmalte sobre ventanas en lamina (incluye anticorrosivo)	Metro cuadrado (m2)	5,40
ANTES		**DESPUES**	







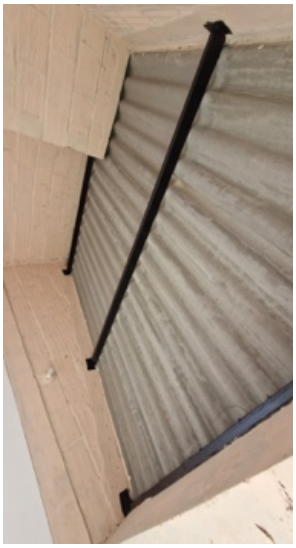
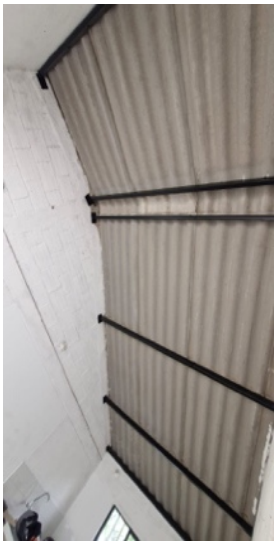


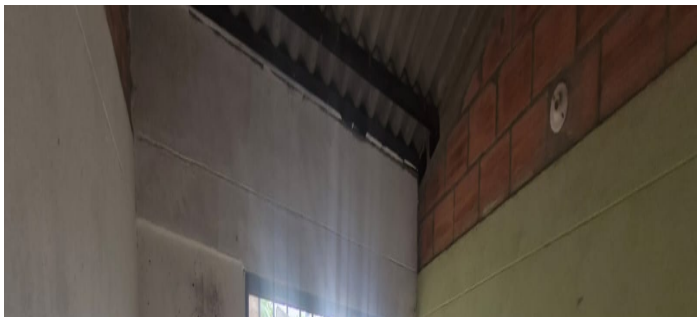
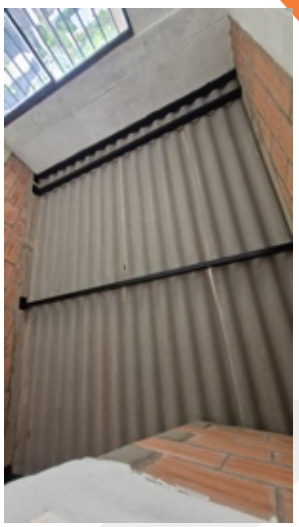
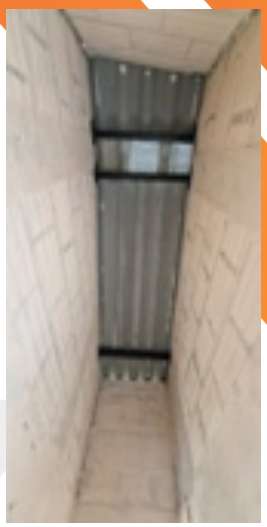


DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en la aplicación de pintura esmalte sobre ventanas metálicas, incluyendo limpieza y base anticorrosiva.	**Cumplimiento:** Se realizó la aplicación de pintura esmalte sobre ventanas metálicas, previa limpieza y preparación de las superficies, incluyendo la aplicación de base anticorrosiva, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

8.5.	Pintura esmalte sobre marco metálico de puertas	Metro lineal (ml)	5,00

ANTES	**DESPUES**
	
DESCRIPCIÓN: Esta actividad comprende el suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre marcos metálicos de puertas, incluyendo la preparación previa de la superficie mediante limpieza, lijado, retiro de óxido, residuos de pintura suelta, grasas o impurezas que afecten la adherencia del acabado. La aplicación deberá realizarse sobre superficies secas y limpias, utilizando anticorrosivo cuando las condiciones del elemento lo requieran y aplicando las manos necesarias de esmalte hasta obtener un acabado uniforme, continuo y de óptima presentación, conforme a los colores y especificaciones definidas en el proyecto.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre marcos metálicos de puertas, efectuando previamente la limpieza, lijado y preparación de las superficies, incluyendo la aplicación de anticorrosivo cuando fue requerido y las manos de esmalte necesarias para obtener un acabado uniforme, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

8.6.	Pintura esmalte sobre lamina llena (Inc. Anticorrosivo)	Metro cuadrado (m2)	0,90
ANTES		**DESPUES**	
			
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en la aplicación de pintura esmalte sobre ventanas metálicas, incluyendo limpieza y base anticorrosiva.		**Cumplimiento:** Se realizó la aplicación de pintura esmalte sobre ventanas metálicas, efectuando previamente la limpieza y preparación de las superficies, así como la aplicación de base anticorrosiva, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	
8.7.	Pintura en esmalte para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, laminas y ángulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos.	Metro (m)	43,00
ANTES		**DESPUES**	
		 	

	 
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en la aplicación de dos manos de esmalte sobre elementos metálicos (correas, cerchas, láminas y ángulos). Incluye limpieza mecánica y anticorrosivo.	**Cumplimiento:** Se realizó la aplicación de dos (2) manos de pintura esmalte sobre elementos metálicos, tales como correas, cerchas, láminas y ángulos, previa limpieza mecánica de las superficies y aplicación de anticorrosivo, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

8.8	Vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	Metro cuadrado (m2)	0,54

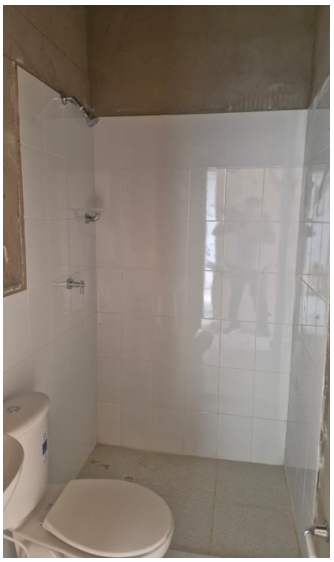
ANTES	**DESPUES**
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de vidrio plano incoloro de 4 mm, incluye corte, transporte, instalación y sellado.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de vidrio plano incoloro de 4 mm, incluyendo corte, transporte, instalación y sellado, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

8.9.	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e insta.	Metro cuadrado (m2)	2,03

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e insta.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de puerta en lámina Cold Rolled calibre 18**, in**cluyendo marco, aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte**,** de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato**.**

9.0. ENCHAPES Y ACCESORIOS

9.1.	Enchape piso-pared cerámica lisa 20 x 20 blanca	Metro cuadrado (m2)	9,46

ANTES	DESPUES
	

DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de cerámica blanca 20x20 cm en pisos o muros. Incluye mortero de pega, nivelación, boquilla y limpieza final.		**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de cerámica blanca de 20 x 20 cm en pisos y muros, incluyendo mortero de pega, nivelación, aplicación de boquilla y limpieza final, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	
9.2.	Remate bocel win en aluminio	Metro (m)	2,43
ANTES		**DESPUES**	
			
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de perfil tipo bocel en aluminio para remates de enchape. Incluye cortes, ajuste y fijación.		**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de perfil tipo bocel en aluminio para remates de enchape, incluyendo los respectivos cortes, ajustes y fijación, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	

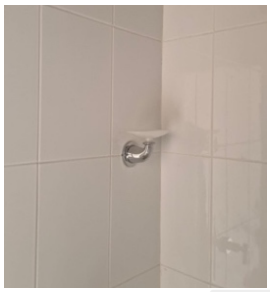
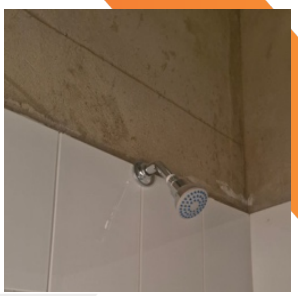
10.0. APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA			
10.1.	Lavamanos avanti pedestal con Grifería sencilla Nogal de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación y griflex)	Unidad (Und)	1,00

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal marca Corona o similar, incluye grifería, sifón, desagüe y conexiones.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de lavamanos tipo pedestal marca Corona o similar, incluyendo grifería, sifón, desagüe y respectivas conexiones, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato

10.2.	Sanitario blanco dos piezas Incluye, grifería, asiento, válvula reguladora y acople metálico. Suministro e Instal	Unidad (Und)	1,00

ANTES	DESPUES
	
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de sanitario de dos piezas. Incluye tanque, taza, asiento, grifería, válvula y conexión.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de sanitario de dos piezas, incluyendo tanque, taza, asiento, grifería, válvula y respectivas conexiones, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

10.3.	Juego de Incrustaciones para baño tipo económico (3 piezas). Suministro e instal.	Unidad (Und)	1,00

ANTES	DESPUES
	   
DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de accesorios básicos de baño (toallero, jabonera, portarrollos). Incluye fijación.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de accesorios básicos de baño (toallero, jabonera y portarrollos), incluyendo su respectiva fijación, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el **contrato**.

11.0. TANQUE LAVADERO

11.1.	Tanque Lavadero prefabricado de 80 x 60 de 360 litros. Suministro e instal.	Unidad (Und)	1,00

ANTES	DESPUES
	

DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en el suministro e instalación de tanque lavadero prefabricado de 60x80x60 cm (360 litros). Incluye base de apoyo, conexiones hidráulicas y desagüe, nivelación y pruebas.	**Cumplimiento:** Se realizó el suministro e instalación de tanque lavadero prefabricado de 60 x 80 x 60 cm (360 litros), incluyendo base de apoyo, conexiones hidráulicas y desagüe, nivelación y respectivas pruebas de funcionamiento, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

De acuerdo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato, se deja constancia de que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales y con las actividades previstas durante el periodo de ejecución, de conformidad con las condiciones, especificaciones y requerimientos establecidos por la entidad.

En consecuencia, la entidad recibe a satisfacción los bienes, servicios y/o actividades ejecutadas, dejando constancia de que fueron desarrollados de manera adecuada y conforme a lo establecido contractualmente.

Para constancia, se firma el presente informe final en la ciudad de Yopal, Casanare, a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre de 2026.

Contratista



DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ PINTO
C.C. 1.118.532.594 de Yopal
R/L VIBO SAS
Nit: 901.804.434-2

VIBO
Publicidad + Diseño + Construcción S.A.S

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

La suscrita, **SINDY JUDITH LOZANO VALLEJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.118.554.457**, expedida en el municipio de Yopal y tarjeta profesional No. **297116-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia y **DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ PINTO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.118.532.594** de Yopal, Representante legal certificamos que la sociedad **VIBO PUBLICIDAD +DISEÑO +CONSTRUCCION SAS**, identificada con **NIT. 901.80.434-2**, en condición de contadora y Representante legal de la referida empresa, debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Casanare**; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4660254192	JULIO	$ 204.400
PENSION	4660254192	JUNIO	$ 816.000
ARL	4660254192	JUNIO	$ 26.900
COMFACASANARE	4660254192	JUNIO	$ 204.400
SALUD	4663754714	AGOSTO	$ 211.600
PENSION	4663754714	JULIO	$ 845.700
ARL	4663754714	JULIO	$ 27.800
CAJA DE COMPENSACION	4663754714	JULIO	$ 211.600
SALUD	5251567129	SEPTIEMBRE	$ 280.400
PENSION	5251567129	AGOSTO	$ 1.120.800
ARL	5251567129	AGOSTO	$ 103.800
COMFACASANARE	5251567129	AGOSTO	$ 280.400

La presente se expide en Yopal, al Nueve (09) día del mes de Septiembre de 2026

DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ PINTO
C.C. No. 1.118.532.594 de Yopal
Representante Legal **VIBO SAS**
Nit. 901.804.434-2

SINDY JUDITH LOZANO VALLEJO
C.C. No. 1.118.554.457 de Yopal
Contador público de **VIBO SAS**
T.P. 297116-T Junta Central de Contadores



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.113.554.457

LOZANO VALLEJO

APELLIDOS

SINDY JUDITH

NOMBRES

Sindy Judith Lozano V.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1993

CHAMEZA
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

20-JUN-2011 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-4600100-01144036-F-1118554457-20200703 0071108114A 1 9912510447

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

297116-T



SINDY JUDITH
LOZANO VALLEJO
C.C. 1118554457
RES. INSCRIPCION 1976 DEL 18/05/2022
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

320431 343062

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5FAB38E0A58F4543

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SINDY JUDITH LOZANO VALLEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118554457 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 297116-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804434
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIBO PUBLICIDADDISENOCONSTRUCCION S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:		CALLE 13 21A 108 TELÉFONO:	6359178
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - GERENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		**4660254192**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997456645

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 816.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 816.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 204.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 204.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	$ 204.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 204.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 26.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 26.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.245.900**
VALOR MORA:	**$ 6.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.252.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804434
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VIBO PUBLICIDADDISENOCONSTRUCCION S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 13 21A 108	TELÉFONO:	8359178
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - GERENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4660254192		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026	
DIAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997456645	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 812.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 0	$ 812.600	$ 4.200	$ 816.800
SUBTOTALES:										**$ 812.600**	**$ 4.200**	**$ 816.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 203.300	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 203.300	$ 1.100	$ 0	$ 204.400
SUBTOTALES:													**$ 203.300**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 204.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.700	$ 26.700	$ 200	$ 0	$ 26.900
SUBTOTALES:									**$ 26.700**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 26.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	$ 203.300	$ 1.100	$ 204.400
SUBTOTALES:			**$ 203.300**	**$ 1.100**	**$ 204.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD								ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1115727388	VILLAMIZAR BASTO DIMAIRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	04																	230301-PORVENIR	27	$ 1.575.815	$ 252.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.200	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 63.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	27	$ 1.575.815		$ 8.300	27	$ 1.575.815	SCCF69-COMFACASANARE	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1118932594	BOHORQUEZ PINTO DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1119539256	ALVARADO PEREZ ALVARO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.252.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804434
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		VIBO PUBLICIDADDISENOCONSTRUCCION S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:		CALLE 13 21A 108 TELÉFONO:	6359178
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - GERENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4663754714**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997787561

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 845.700
		SUBTOTAL:	3	**$ 845.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 211.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 211.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	$ 211.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 211.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 27.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 27.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.288.800**
VALOR MORA:	**$ 7.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.296.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804434
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VIBO PUBLICIDADDISENOCONSTRUCCION S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 13 21A 108	TELÉFONO:	6359178
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - GERENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4663754714	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2026
DIAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997787561

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 0	$ 840.600	$ 5.100	$ 845.700
SUBTOTALES:										**$ 840.600**	**$ 5.100**	**$ 845.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 210.300	$ 1.300	$ 0	$ 211.600
SUBTOTALES:													**$ 210.300**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 211.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.600	$ 27.600	$ 200	$ 0	$ 27.800
SUBTOTALES:									**$ 27.600**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 27.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF-69-COMFACASANARE	3	$ 210.300	$ 1.300	$ 211.600
SUBTOTALES:			**$ 210.300**	**$ 1.300**	**$ 211.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZ.EXTRANJERO	EXT.MISIÓN	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1115727398	VILLAMIZAR BASTO DMAIRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1118532594	BOHORQUEZ PINTO DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1118598296	ALVARADO PEREZ ALVARO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.296.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804434
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIBO PUBLICIDADDISENOCONSTRUCCION S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 13 21A 108	TELÉFONO:	6359178
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - GERENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5251567129**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998014586

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.121.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.121.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 210.500
		SUBTOTAL:	4	**$ 280.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	4	$ 280.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 280.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 103.900
		SUBTOTAL:	4	**$ 103.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.785.400**
VALOR MORA:	**$ 1.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.787.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804434
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIBO PUBLICIDADDISENOCONSTRUCCION S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 13 21A 108	TELÉFONO:	6359178
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	04 - GERENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5251567129			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DIAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998014586

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 1.120.800	$ 900	$ 1.121.700
SUBTOTALES:										$ 1.120.800	$ 900	$ 1.121.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 210.300	$ 200	$ 0	$ 210.500
SUBTOTALES:													$ 280.400	$ 300	$ 0	$ 280.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 103.800	$ 103.800	$ 100	$ 0	$ 103.900	
SUBTOTALES:									$ 103.800	$ 100	$ 0	$ 103.900	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	4	$ 280.400	$ 300	$ 280.700
SUBTOTALES:			$ 280.400	$ 300	$ 280.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																												PENSIÓN							SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1115727338	VILLAMIZAR BAITO OMAIRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1115915859	VARGAS GANZON LUIS SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1118532594	BOHORQUE PINTO DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1118536298	ALVARADO PEREZ ALVARO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.787.000

CONTRATO No. 141 (N. de contrato) 2026 (Año de suscripción)

VIGENCIA UN (01) MES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO
"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA MANZANA O CASA 11 DE LA URBANIZACIÓN VILLA DAVID, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 470-115332, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO INMUEBLE UBICADO EN LA MANZANA O CASA 11 DE LA URBANIZACIÓN VILLA DAVID, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO UN (01) MES
6

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 21 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2026 (Año)

PLAZO DE ADICIÓN DEL CONTRATO N/A
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO UN (01) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2026 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 10.068.277,49
Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)

VALOR ACTUAL $ 10.068.277,49
(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA VIBO PUBLICIDAD + DISEÑO + CONSTRUCCIÓN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

GERENTE NELSON NADYN NIETO RAMIREZ

En Yopal, Casanare; a los Catorce (14) días del mes de septiembre de 2026; se reunieron el señor DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ PINTO como Representante Legal de **VIBO PUBLICIDAD + DISEÑO + CONSTRUCCIÓN S.A.S.**, en calidad de contratista, la arquitecta **TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN** en calidad de Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural - INDEV, como supervisor del Contrato y el Ingeniero **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ** en calidad de Gerente del INDEV, con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día Veinte (20) días del mes de agosto de 2026 según el acta de terminación de Contrato de Obra.

A.OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN / NOMBRE	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				
1.1	Desmonte aparatos sanitarios	UND	2	$ 15.097,00	$ 30.194,00
1.2	Desmonte lavaderos prefabricados, con retiro	M2	0,48	$ 91.450,00	$ 43.896,00
1.3	Desmonte marcos y puertas con transporte	M2	2,03	$ 17.143,00	$ 34.800,29
1.4	Desmonte de ventanas, con transporte	M2	2,13	$ 10.695,00	$ 22.780,35
1.5	Demolicion enchape muro con retiro	M2	9,06	$ 9.417,00	$ 85.318,02
				TOTAL PRELIMINARES	**$ 216.988,66**
2.0	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	Excavacion a mano en material comun	M3	0,54	$ 48.174,00	$ 26.013,96
2.2	Relleno de excavacion (con material local)	M3	0,45	$ 21.824,00	$ 9.820,80
2.3	Encamado tuberia con arena apisonado (arena sucia de rio)	M3	0,09	$ 72.245,00	$ 6.502,05
				TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS	**$ 42.336,81**
3.0	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**				
3.1	Bajante de A.LL. con tubería Sanitaria PVC 4"	ML	9,00	$ 51.685,00	$ 465.165,00
				TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS	**$ 465.165,00**
4.0	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				
4.1	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	2,00	$ 40.799,00	$ 81.598,00
4.2	Ducha o regadera con brazo cromada. Suministro e inst	UND	1,00	$ 69.565,00	$ 69.565,00
4.3	Tapa registro plastica 20 x 20	UND	1,00	$ 19.111,00	$ 19.111,00
				TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICA	**$ 170.274,00**
5.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
5.1	Interruptor sencillo, linea decorativa suministro e inst.	UND	2,00	$ 35.748,00	$ 71.496,00
				TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	**$ 71.496,00**
6.0	**CUBIERTA**				
6.1	Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol.	M2	7,59	$ 67.332,00	$ 511.049,88
				TOTAL CUBIERTA	**$ 511.049,88**
7.0	**PINTURA**				

7.1	Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos	M2	11,94	$	15.825,00	$	188.950,50
7.2	Graniplast esgrafiado fachada	M2	7,39	$	29.372,00	$	217.059,08
					TOTAL PINTURA	**$**	**406.009,58**
8.0	**CARPINTERIA METALICA**						
8.1	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal.	M2	2,13	$	332.293,00	$	707.784,09
8.2	Reja en tubo cuadrado 1" Cal. 18 y tubo cuadrado 1 1/2" Cal. 18, anticorrosivo, pintura e instalada.	M2	2,13	$	182.504,00	$	388.733,52
8.3	Cerradura de doble seguridad de escudo pomo + cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.	UND	1,00	$	246.463,00	$	246.463,00
8.4	Esmalte sobre ventanas en lamina (incluye anticorrosivo)	M2	5,40	$	13.894,00	$	75.027,60
8.5	Pintura esmalte sobre marco metálico de puertas	ML	5,00	$	11.262,00	$	56.310,00
8.6	Pintura esmalte sobre lamina llena (Inc. Anticorrosivo)	M2	0,90	$	25.643,00	$	23.078,70
8.7	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos.	M	43,00	$	16.414,00	$	705.802,00
8.8	Vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	M2	0,54	$	66.721,00	$	36.029,34
8.9	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e insta	M2	2,03	$	720.763,00	$	1.463.148,89
					TOTAL CARPINTERIA METALICA	**$**	**3.702.377,14**
9.0	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**						
9.1	Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca	M2	9,46	$	69.465,00	$	657.138,90
9.2	Remate bocel win en aluminio	M	2,43	$	13.064,00	$	31.745,52
					TOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS	**$**	**688.884,42**
10.0	**APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA**						
10.1	Lavamanos con pedestal avanti con Grifería sencilla Nogal de Corona o similar, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion	UND	1,00	$	359.474,00	$	359.474,00
10.2	Sanitario blanco dos piezas Incluye, griferia, asiento, valvula reguladora y acople metalico. Suministro e Instal	UND	1,00	$	371.900,00	$	371.900,00
10.3	Juego de Incrustaciones para baño tipo economico (3 piezas). Suministro e instal.	UND	1,00	$	95.133,00	$	95.133,00
					TOTAL APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA	**$**	**826.507,00**

11.0	**TANQUE LAVADERO**				
11.1	Tanque Lavadero prefabricado de 60 x 80 de 360 litros. Suministro e instal.	UND	1,00	$ 412.551,00	$ 412.551,00
				TOTAL TANQUE LAVADERO	**$ 412.551,00**
				COSTO DIRECTO	$ 7.513.639,49
				ADMINISTRACIÓN (A) **27%**	$ 2.028.683,00
				IMPREVISTOS (I) **2%**	$ 150.273,00
				UTILIDAD (U) **5%**	$ 375.682,00
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.068.277,49

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A la fecha de la presente acta, el contratista ejecutó todos los ítems de obra conforme a las especificaciones técnicas y constructivas establecidas, garantizando su estabilidad y calidad y dando cumplimiento al objeto del contrato. Estos ítems se ejecutaron en las cantidades y por los valores relacionados en esta acta.

ACTA	FECHA

C. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

Garantías con minuta de contrato No. 141-2026 de fecha 07 de julio de 2026; y Aprobación de póliza 625-47-994000006141 del 10 de julio de 2026; y Aprobación de póliza 625-74-994000002258 del 10 de julio de 2026,

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA N°	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000006141	CUMPLIMIENTO	7/07/2026	10/12/2026	$ 1.006.827,00
	625-47-994000006141	PRESTACIONES SOCIALES	7/07/2026	10/08/2029	$ 503.413,00
	625-47-994000006141	ESTABILIDAD DE LA OBRA	A parir del acta de recibo y entrega final de la obra.		$ 2.013.655,60

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA N°	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-74-994000002258	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	7/07/2026	10/08/2026	$ 350.181.000,00

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.
La Supervisión suscribe la presente acta de recibo final de obra, en virtud del principio de buena fe contractual; teniendo en cuenta que el proceso de revisión y medición de cantidades de obra ejecutadas fue realizado de forma directa por la misma, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Catorce (14) días del mes de septiembre de 2026.

Firma

Nombre **VIBO PUBLICIDAD + DISEÑO + CONSTRUCCIÓN S.A.S.**
RL. DIEGO FERNANDO BOHÓRQUEZ PINTO
Contratista

Firma

Nombre **OSCAR BELTRAN PEREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica - INDEV
Entidad Contratante

Firma

Nombre **TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLÓN**
SUGERENTE DE INFRAESTRUCTURA INDEV
Supervisor
Entidad Contratante

Firma

Nombre **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ**
GERENTE INDEV
Entidad Contratante

Original Oficina Juridica
1era copia : Supervisor
2da copia contratista

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	170996629	663668750	17/09/2026

Número de Identificación
901804434

Primer Nombre ó Razón Social
VIBO PUBLICIDAD + DISEÑO +

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
2

Naturaleza Jurídica
01

Departamento
CASANARE

Ciudad Capital
YOPAL (CASANARE)

Dirección de Domicilio
CL 13 21A 108

Ciudad de Domicilio
YOPAL

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3134126657

Correo electrónico
fycauditorias@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Casanare

Regional Centros SIIF
36-02-00-085-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
141-2026

Nombre Obra
adecuacion y mantenimiento de

Fecha Inicio Obra
21/07/2026

Fecha Terminación Obra
20/08/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
yopal

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
0.00

Costo Total Mano de Obra
2517069.00

Número de Trabajadores en el Periodo
4

Valor Intereses Moratorios
1000.00

Aporte FIC
25171.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
25171.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**170996629**	**663668750**	**17/09/2026**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901804434**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.145.192.226**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 26,171.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 26,171.00	COP$ 26,171.00
