FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1

Aprobado: 04/06/2026

CONTRATO:	Contrato de Mínica Cuentía No.004 de 2026 FRR suscrito entre EL Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA
CONTRATISTA	**BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA**
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	**BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Contratar la puesta en sitio, instalación, adecuación técnica, conexión eléctrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado en la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento de HUILA y en las sedes que la Entidad determine, conforme a las especificaciones técnicas definidas y a la normatividad vigente.**
CIUDAD:	**NEIVA - HUILA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**29/07/2026**
FECHA DE INICIO:	**10/08/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**22/09/2026**
INFORME NRO.	**1 (ÚNICO PAGO)**
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**El término de ejecución será de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.**
FECHA PRESENTE INFORME:	**22/09/2026**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100%**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA
Condiciones generales de instalación	Las instalaciones las ejecutaron personal técnico calificado, con experiencia, conforme a las necesidades de cada una de las oficinas, garantizando la seguridad y eficiencia operativa, buenos anclajes y fijación de las unidades externas, desmonte y reubicación de equipos, tuberías y acometidas existentes, se dios cumplimiento a la ficha técnica establecida.	Inform, registro fotográfico
Instalación eléctrica	Se efectuaron las conexiones electricas conforme la normatividad vigente, las acometidas electricas se instalaron de manera individualizada, se verificó la capacidad y estado de las acometidas eléctricas existentes, garantizando la compatibilidad con los equipos instalados.	Informe, constancias y registro fotográficos
Instalación mecánica y de refrigeración	Se llevó a cabo la instalación de tuberías de refrigerante, drenajes y demás componentes, así como la manipulación de gases refrigerantes.	Informe contratista
Pruebas y puesta en funcionamiento	El contratista realizó las pruebas de funcionamiento de los equipos instalados.	Constancias, registro fotográfico
Condiciones ambientales y de seguridad	Dentro de la ejecución el contratista cumplio con las normas de seguridad y salud en el trabajo y adoptó medidas preventivas para evitar daños en las infraestructuras.	Informe contratista

RECOMENDACIONES: NINGUNA

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026.

SUPERVISOR

MARGARITA MARIA TOVAR POLANCO

Profesional Universitario - Responsable GAF

CERTIFICACION

Neiva, 22 de septiembre de 2026

Yo, ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ, en mi calidad de registrador auxiliar No 1 de Neiva (E), certifico que se instaló le Aire Acondicionado con placa 019-03782 con capacidad de 24.000 BTU en las instalaciones de la Registraduria Auxiliar Uno ubicado en la dirección cra 1 D No. 51-28 Barrio Cándido en la ciudad de Neiva Huila, el Aire Acondicionado funciona normal.

Atentamente,

ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ
Registrador Auxiliar No 1 de neiva



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

La suscrita, en su calidad de REGISTRADORA AUXILIAR II NEIVA,


CERTIFICA:

Que la instalación del aire condicionado destinado para la Registraduría Auxiliar 2 de Neiva se llevó a cabo de manera satisfactoria quedando en perfecto estado y de manera funcional.

Se expide la presente certificación a los DOS (02) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2026 para los fines pertinentes.

YINA PAOLA PINEDA TORO
REGISTRADORA AUXILIAR II DE NEIVA


DAIKIN

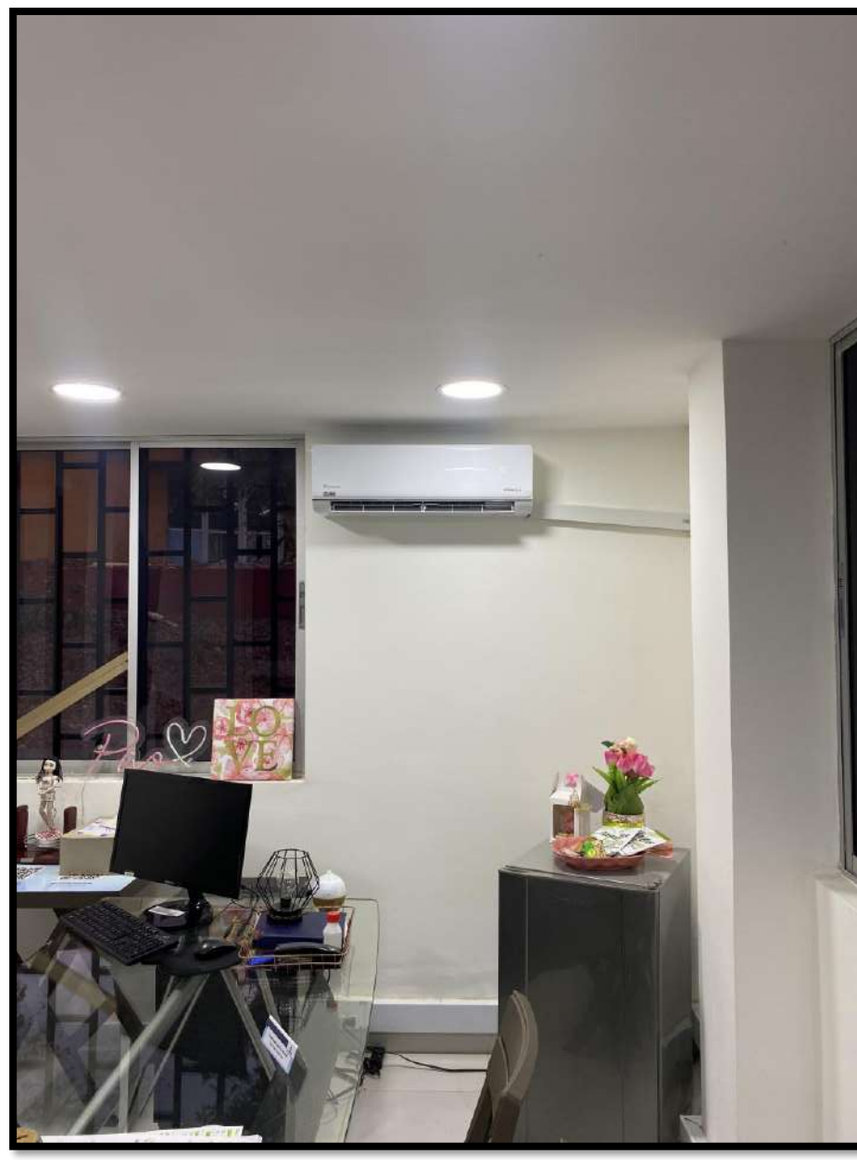


REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL SUSCRITO REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE BARAYA HUILA

C E R T I F I C A

Que, atendiendo la directriz de la Delegación Departamental del Huila, certifico que a la fecha fue instalado el Aire Acondicionado en este despacho, se recibe a satisfacción y el cual queda debidamente funcionando.

Dada en Baraya Huila a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026).



IVÁN RODRIGO CHÁVARRO MEDINA
Registrador Municipal del Estado Civil





REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL SUSCRITO REGISTRADOR DEL ESTADO CIVIL DE COLOMBIA HUILA

C E R T I F I C A:

Que, el equipo de aire acondicionado fue instalado en el inmueble ubicado en la Registraduría de Colombia, el día 20 de septiembre 2026. Durante el proceso de instalación se verificaron todas las conexiones eléctricas, de refrigeración y de montaje, asegurando que todos los componentes funcionen correctamente y cumplan con las normativas de seguridad.

Después de la instalación, el equipo fue probado y se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento, garantizando un rendimiento óptimo y eficiente.

Este certificado se expide para constancia y valoración del trabajo realizado. A los Veintidós (22) de septiembre de 2026

JOSE BASILIO RODRIGUEZ CALDERON
Registrador Municipal del Estado Civil Colombia - Huila

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL
DE GARZON HUILA

CERTIFICA:

Que, el día 25 de agosto de 2026, se instalaron dos aires acondicionados en el auditorio de esta oficina, los cuales se encuentran funcionando perfectamente.





Se expide esta certificación en Garzón– Huila, a veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026.

HERSAYN GONZALEZ CERQUERA
Registrador Municipal del estado Civil

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL SUSCRITO REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE GIGANTE HUILA

C E R T I F I C A:

Que, el miércoles 26 de agosto de 2029, fueron instalados y recibidos a satisfacción dos (02) aires acondicionados en las instalaciones de la Registraduria Municipal de Gigante y adicionalmente fue reubicado el condensador del aire instalado en el marco de la remodelación de que fue objeto el inmueble a finales del año 2025. Se adjunta registro fotográfico.


Un aire fue instalado en el área de atención al publico y el otro en el área de archivo de registro civil.

El condensador fue reubicado del área de lavamanos del público a la plancha del área de los baños.

La presente certificación se expide en Gigante, Huila, a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026) con destino a la Delegación del Estado Civil Huila.

EDGAR LENIN PALOMINO PALOMINO
Registrador Municipal del Estado Civil

AIRE INSTALADO EN AREA DE ATENCION AL PUBLICO

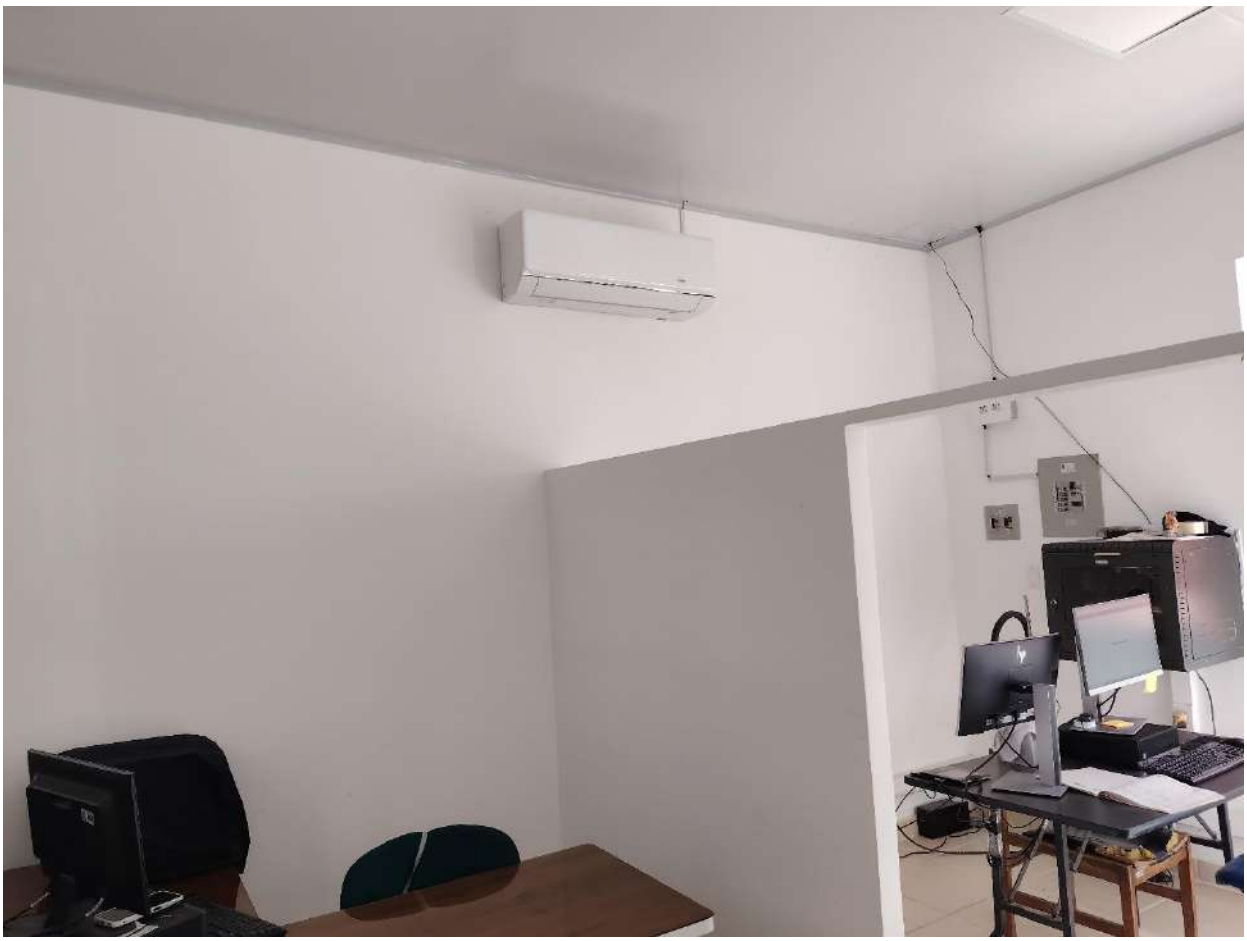


AIRE INSTALADO EN AREA DE ARCHIVO DE RC



NUEVA UBICACIÓN CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO



ANTIGUA UBICACIÓN CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO

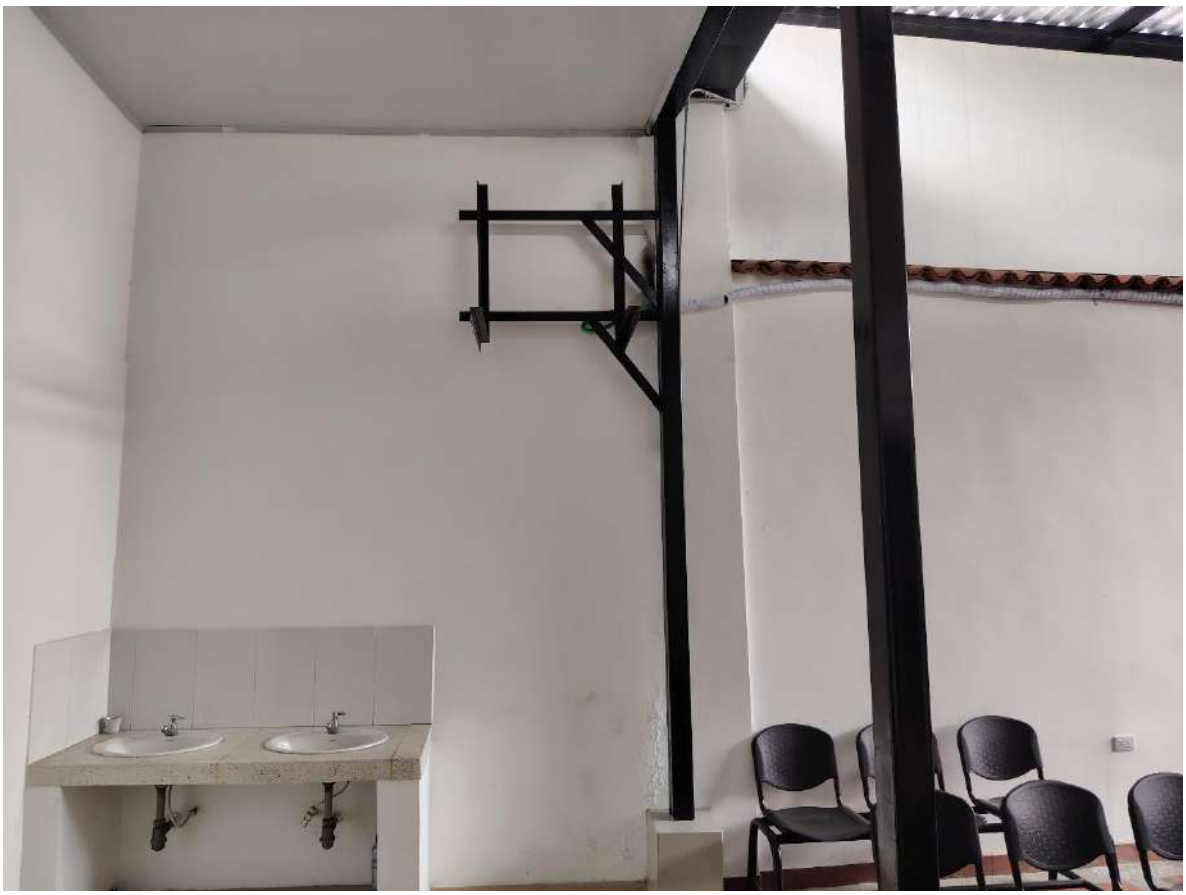

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

LA REGISTRADORA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE LA PLATA – HUILA

CERTIFICA QUE:

El día veinticuatro (24) de agosto de 2026, el contratista BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA de la empresa IMPOCAMARAS BOGOTÁ, identificado con NIT. NIT.: 1.030.598.851-8 realizó la instalación de un equipo de aire acondicionado en la oficina de la Registradora Municipal, ubicada en las instalaciones de la Registraduría Municipal del Estado Civil de La Plata – Huila, en la Calle 4 No. 6-35 de este municipio.

La presente certificación se expide a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026), a solicitud de la parte interesada y con destino a la Delegación Departamental del Huila.

Para constancia, se firma en La Plata, Huila, en la fecha anteriormente indicada.

OSMARY LORENA BARAJAS LONDOÑO
Registradora Municipal del Estado Civil de La Plata Huila

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


REGISTRO FOTOGRAFICO UBICACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO LA PLATA – HUILA

Oficina de la Registradora Municipal **Dra. OSMARY LORENA BARAJAS LONDOÑO**





REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

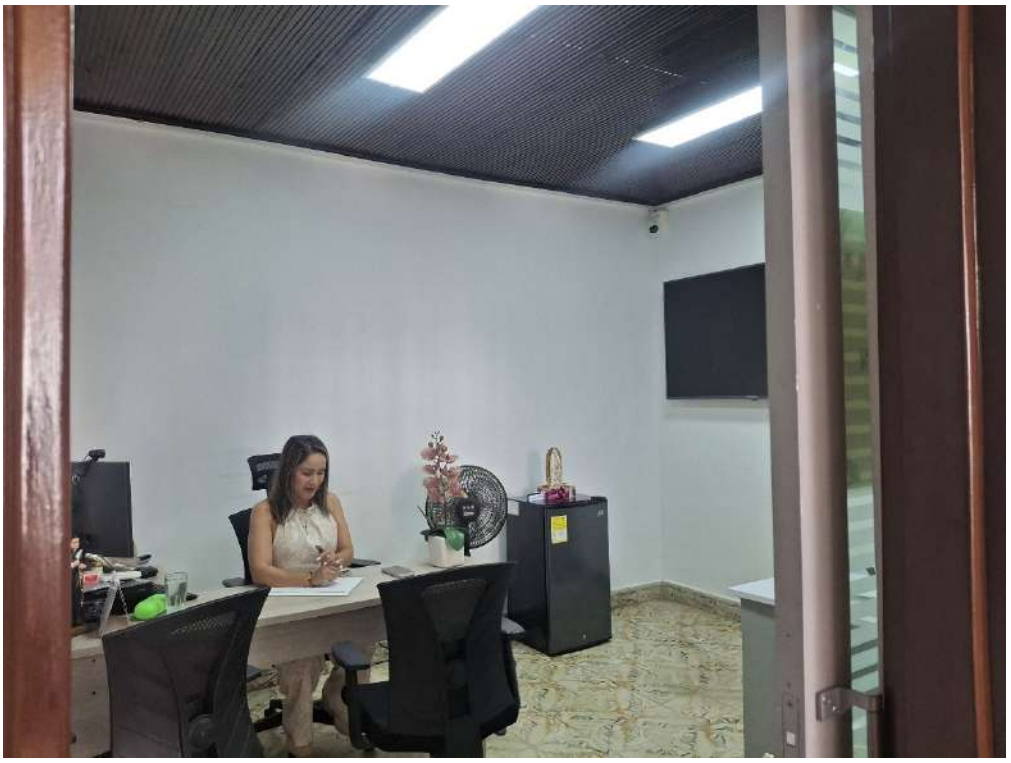





Registraduria Municipal de La Plata Huila
Calle 4 No. 6 - 35 - teléfonos (608) 8371072 - código postal (415060213) – La Plata Huila
laplatahuila@registraduria.gov.co


REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


LOS REGISTRADORES ESPECIALES DE NEIVA - HUILA

C E R T I F I C A N:

Que, de conformidad con el proceso contractual de la Delegación Departamental del Huila, esta Registraduría recibió la instalación de cinco (5) aires acondicionados por parte del contratista **BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA** Identificado con cedula de ciudadanía 1.030.598.851 expedida en Bogotá, Representante legal de la empresa **IMPOCAMARAS BOGOTA** con NIT.: 1.030.598.851-8, distribuidos por distintas áreas de la edificación, de la siguiente manera:

EQUIPO	EVAPORADOR	CONDENSADORA	PLACA
AA 24000 BTU INVERTER	AUDITORIO PRINCIPAL	PLANCHA DESPACHO	**019-03779**
AA 24000 BTU INVERTER	OFICINA DE IDENTIFICACION	EXTERIOR DE LA OFICINA	**019-03781**
AA 24000 BTU INVERTER	SALA DE ESPERA	PLANCHA DE OFICINA EIS	**019-03780**
AA 18000 BTU INVERTER	OFICINA EIS	TECHO SOBRE EL CANAL	**019-03766**
AA 12000 BTU INVERTER	OFICINA DE SANCION JURADOS	CON SOPORTE EN EL EXTERIOR DEL AUDITORIO	**019-03764**

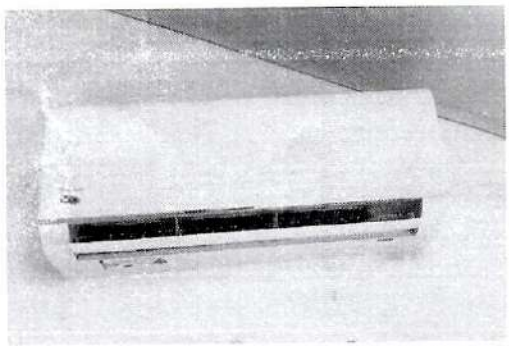


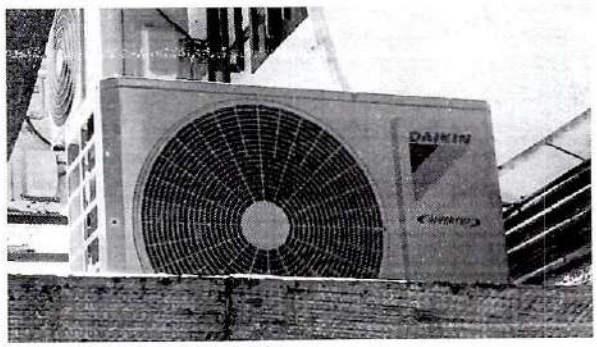


EQUIPO INSTALADO EN EL AUDITORIO


R/ Neiva 31-05-26.


REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

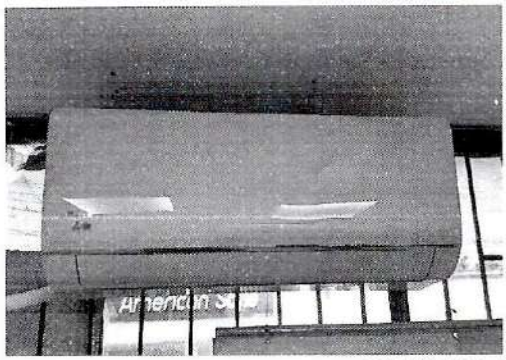

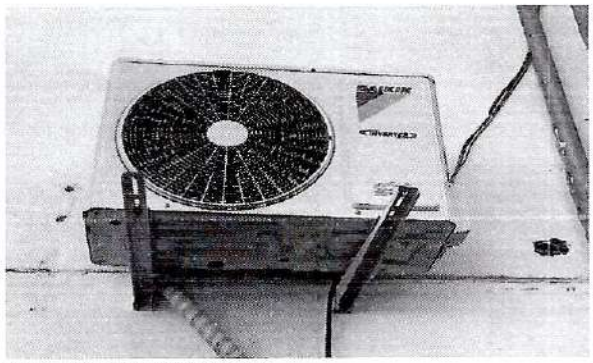



OFICINA DE IDENTIFICACION

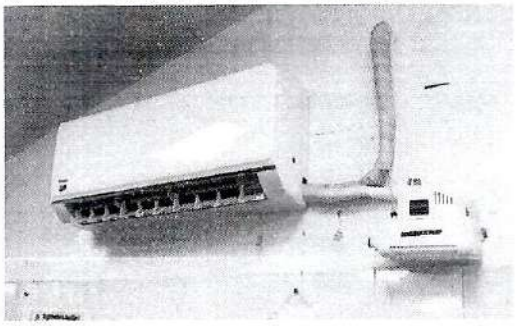

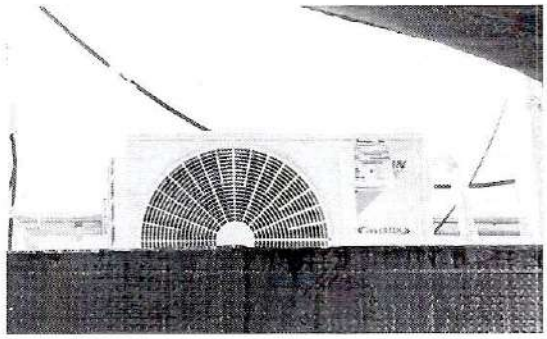


SALA DE ESPERA

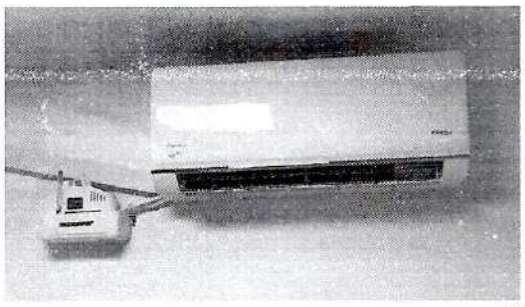




OFICINA EIS

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



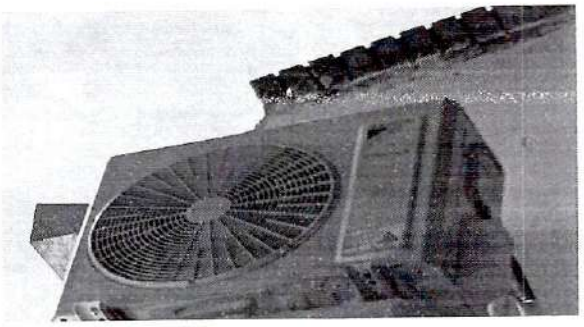

OFICINA SANCION JURADOS

La presente se expide a los treinta y un días (31) del mes de agosto del dos mil veintiséis (2026).

CLAUDIA CRISTINA NARVAEZ ROJAS JUAN MANUEL LOZANO DELGADO
Registradores Especiales del Estado Civil de Neiva

Elaboro: JCGAONA

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

FORMATO ECONOMICO INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS
FORMATO N° 4

019-0779

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER - AUDITORIO REG ESPECIAL NEIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VALORES DE REFERENCIA			VALORTES OFERTADOS	
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	VALOR PROPUESTA	VALOR TOTAL
1	EQUIPOS						
1.1	BASE DE UNIDAD CONDENSADORA	un	1.00	$ 100.000	$ 100.000		$ -
2	RED DE REFRIGERACIÓN						
2.1	TUBERIA RIGIDA 3/8" (liq)	ML	6.37	$ 41.000	$ 261.275		$ -
2.2	TUBERIA RIGIDA 5/8" (gas)	ML	6.37	$ 71.000	$ 452.451		$ -
2.3	REFRIGERANTE R32/R-410A	LB	0.39	$ 111.000	$ 43.529		$ -
2.4	MAP GAS,BOQUILLA Y SOLDADURA HARRIS	GLB	1.00	$ 150.000	$ 150.000		$ -
2.5	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION RED DE REFRIGERACION:SOPORTERIA DE LA TUBERIA, UNIONES,CODOS,TUERCAS FLARE,CINTA FOAM,VALVULA DE GUSANILLO Y BOXER	GLB	1.00	$ 350.000	$ 350.000		$ -
3	RED ELECTRICA Y CONTROL						
3.1	CABLE 12 AWG ENCAUCHETADO	ML	6.37	$ 16.150	$ 102.917		$ -
3.2	CABLE AWG No 2X18 APANTALLADO-MANEJADORA	ML	6.37	$ 13.600	$ 86.667		$ -
3.3	KIT DE INSTALACION RED ELECTRICA Y CONTROL, INCLUYE: PRENSA ESTOPA,CORAZA AMERICANA, CONECTORES Y TERMINALES DE CORAZA,TERMINALES EMT Y CONSUMIBLES	GLB	1.00	$ 140.000	$ 140.000		$ -
4	MANO DE OBRA						
4.1	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	GLB	1.00	$ 145.000	$ 145.000		$ -
4.2	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER NUEVOS, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO .	GLB	1.00	$ 450.000	$ 450.000		$ -
5.0	COSTOS INDIRECTOS						
5.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	UN	1.00	$ 51.483	$ 51.483		$ -
COSTO DIRECTO					$ 2.333.322		$ -
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 466.664		$ -
	IMPREVISTOS	2%			$ 46.666		$ -
	UTILIDAD	6%			$ 139.999		$ -
	IVA	19%			$ 26.600		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 3.013.251		$ -
VALOR INSTALACIÓN ANTES DE IVA Y AIU					$ 2.333.322		$ -
VALOR INSTALACIÓN INCLUYENDO IVA Y AIU					$ 3.013.251		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 3.013.251		$ -
OBSERVACIONES							

Representante legal
N° CEDULA:

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

FORMATO ECONOMICO INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS
FORMATO N° 4

019-0378

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER - IDENTIFICACIÓN REG ESPECIAL NEIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VALORES DE REFERENCIA			VALORTES OFERTADOS	
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	VALOR PROPUESTA	VALOR TOTAL
1	**EQUIPOS**						
1.1	BASE DE UNIDAD CONDENSADORA	un	1.00	$ 100.000	$ 100.000		$ -
2	**RED DE REFRIGERACIÓN**						
2.1	TUBERIA RIGIDA 3/8" (liq)	ML	6.37	$ 41.000	$ 261.275		$ -
2.2	TUBERIA RIGIDA 5/8" (gas)	ML	6.37	$ 71.000	$ 452.451		$ -
2.3	REFRIGERANTE R32/R-410A	LB	0.39	$ 111.000	$ 43.529		$ -
2.4	MAP GAS,BOQUILLA Y SOLDADURA HARRIS	GLB	1.00	$ 150.000	$ 150.000		$ -
2.5	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION RED DE REFRIGERACION.SOPORTERIA DE LA TUBERIA, UNIONES,CODOS,TUERCAS FLARE,CINTA FOAM,VALVULA DE GUSANILLO Y BOXER	GLB	1.00	$ 350.000	$ 350.000		$ -
3	**RED ELECTRICA Y CONTROL**						
3.1	CABLE 12 AWG ENCAUCHETADO	ML	6.37	$ 16.150	$ 102.917		$ -
3.2	CABLE AWG No 2X18 APANTALLADO-MANEJADORA	ML	6.37	$ 13.600	$ 86.667		$ -
3.3	KIT DE INSTALACION RED ELECTRICA Y CONTROL, INCLUYE: PRENSA ESTOPA,CORAZA AMERICANA, CONECTORES Y TERMINALES DE CORAZA,TERMINALES EMT Y CONSUMIBLES	GLB	1.00	$ 140.000	$ 140.000		$ -
4	**MANO DE OBRA**						
4.1	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	GLB	1.00	$ 145.000	$ 145.000		$ -
4.2	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER NUEVOS, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO .	GLB	1.00	$ 450.000	$ 450.000		$ -
5.0	**COSTOS INDIRECTOS**						
5.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	UN	1.00	$ 51.483	$ 51.483		$ -
COSTO DIRECTO					$ 2.333.322		$ -
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 466.664		$ -
	IMPREVISTOS	2%			$ 46.666		$ -
	UTILIDAD	6%			$ 139.999		$ -
	IVA	19%			$ 26.600		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 3.013.251		$ -
VALOR INSTALACIÓN ANTES DE IVA Y AIU					$ 2.333.322		$ -
VALOR INSTALACIÓN INCLUYENDO IVA Y AIU					$ 3.013.251		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 3.013.251		$ -
OBSERVACIONES							

_____

Representante legal
N° CEDULA:

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

FORMATO ECONOMICO INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS
FORMATO N° 4

019-0378

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU INVERTER - ÁREA DE ATENCIÓN - REG ESPECIAL NEIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VALORES DE REFERENCIA			VALORTES OFERTADOS	
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	VALOR PROPUESTA	VALOR TOTAL
1	**EQUIPOS**						
1.1	BASE DE UNIDAD CONDENSADORA	un	1.00	$ 100.000	$ 100.000		$ -
2	**RED DE REFRIGERACIÓN**						
2.1	TUBERIA RIGIDA 3/8" (liq)	ML	6.37	$ 41.000	$ 261.275		$ -
2.2	TUBERIA RIGIDA 5/8" (gas)	ML	6.37	$ 71.000	$ 452.451		$ -
2.3	REFRIGERANTE R32/R-410A	LB	0.39	$ 111.000	$ 43.529		$ -
2.4	MAP GAS,BOQUILLA Y SOLDADURA HARRIS	GLB	1.00	$ 150.000	$ 150.000		$ -
2.5	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION RED DE REFRIGERACION,SOPORTERIA DE LA TUBERIA, UNIONES,CODOS,TUERCAS FLARE,CINTA FOAM,VALVULA DE GUSANILLO Y BOXER	GLB	1.00	$ 350.000	$ 350.000		$ -
3	**RED ELECTRICA Y CONTROL**						
3.1	CABLE 12 AWG ENCAUCHETADO	ML	6.37	$ 16.150	$ 102.917		$ -
3.2	CABLE AWG No 2X18 APANTALLADO-MANEJADORA	ML	6.37	$ 13.600	$ 86.667		$ -
3.3	KIT DE INSTALACION RED ELECTRICA Y CONTROL, INCLUYE: PRENSA ESTOPA,CORAZA AMERICANA, CONECTORES Y TERMINALES DE CORAZA,TERMINALES EMT Y CONSUMIBLES	GLB	1.00	$ 140.000	$ 140.000		$ -
4	**MANO DE OBRA**						
4.1	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	GLB	1.00	$ 145.000	$ 145.000		$ -
4.2	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER NUEVOS, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO	GLB	1.00	$ 450.000	$ 450.000		$ -
5.0	**COSTOS INDIRECTOS**						
5.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	UN	1.00	$ 51.483	$ 51.483		$ -
COSTO DIRECTO					$ 2.333.322		$ -
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 466.664		$ -
	IMPREVISTOS	2%			$ 46.666		$ -
	UTILIDAD	6%			$ 139.999		$ -
	IVA	19%			$ 26.600		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 3.013.251		$ -
VALOR INSTALACIÓN ANTES DE IVA Y AIU					$ 2.333.322		$ -
VALOR INSTALACIÓN INCLUYENDO IVA Y AIU					$ 3.013.251		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 3.013.251		$ -
OBSERVACIONES							

_____

Representante legal
N° CEDULA:

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

FORMATO ECONOMICO INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS
FORMATO N° 4

019-0376

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU INVERTER - REGISTRADAURIA ESPECIAL SECRETARIA NEIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VALORES DE REFERENCIA			VALORTES OFERTADOS	
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	VALOR PROPUESTA	VALOR TOTAL
1	**EQUIPOS**						
1.1	BASE DE UNIDAD CONDENSADORA	un	1.00	$ 100.000	$ 100.000		$ -
2	**RED DE REFRIGERACIÓN**						
2.1	TUBERIA RIGIDA 1/4" (liq)	ML	6.00	$ 26.000	$ 156.000		$ -
2.2	TUBERIA RIGIDA 1/2" (gas)	ML	6.00	$ 56.000	$ 336.000		$ -
2.3	REFRIGERANTE R32/R-410A	LB	0.39	$ 111.000	$ 43.167		$ -
2.4	MAP GAS,BOQUILLA Y SOLDADURA HARRIS	GLB	1.00	$ 150.000	$ 150.000		$ -
2.5	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION RED DE REFRIGERACION:SOPORTERIA DE LA TUBERIA, UNIONES,CODOS,TUERCAS FLARE,CINTA FOAM,VALVULA DE GUSANILLO Y BOXER	GLB	1.00	$ 350.000	$ 350.000		$ -
3	**RED ELECTRICA Y CONTROL**						
3.1	CABLE 12 AWG ENCAUCHETADO	ML	6.00	$ 16.150	$ 96.900		$ -
3.2	CABLE AWG No 2X18 APANTALLADO-MANEJADORA	ML	6.00	$ 13.600	$ 81.600		$ -
3.3	KIT DE INSTALACION RED ELECTRICA Y CONTROL, INCLUYE: PRENSA ESTOPA,CORAZA AMERICANA, CONECTORES Y TERMINALES DE CORAZA,TERMINALES EMT Y CONSUMIBLES	GLB	1.00	$ 140.000	$ 140.000		$ -
4	**MANO DE OBRA**						
4.1	DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE .	GLB	1.00	$ 150.000	$ 150.000		$ -
4.2	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INVERTER NUEVOS, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO .	GLB	1.00	$ 350.000	$ 350.000		$ -
5.0	**COSTOS INDIRECTOS**						
5.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	UN	1.00	$ 51.483	$ 51.483		$ -
COSTO DIRECTO					$ 2.005.150		$ -
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 401.030		$ -
	IMPREVISTOS	2%			$ 40.103		$ -
	UTILIDAD	6%			$ 120.309		$ -
	IVA	19%			$ 22.859		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 2.589.451		$ -
VALOR INSTALACIÓN ANTES DE IVA Y AIU					$ 2.005.150		$ -
VALOR INSTALACIÓN INCLUYENDO IVA Y AIU					$ 2.589.451		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 2.589.451		$ -
OBSERVACIONES							

Representante legal
N° CEDULA:

FRR
Fondo Rotatorio
Registraduría Nacional del Estado Civil

FORMATO ECONOMICO INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS
FORMATO N° 4

019-03764

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU INVERTER - REGISTRADAURIA ESPECIAL (EIS 1) NEIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VALORES DE REFERENCIA			VALORTES OFERTADOS	
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	VALOR PROPUESTA	VALOR TOTAL
1	EQUIPOS						
1.1	BASE DE UNIDAD CONDENSADORA	un	1.00	$ 100.000	$ 100.000		$ -
2	RED DE REFRIGERACIÓN						
2.1	TUBERIA RIGIDA 1/4" (liq)	ML	5.97	$ 26.000	$ 155.224		$ -
2.2	TUBERIA RIGIDA 1/2" (gas)	ML	5.97	$ 56.000	$ 334.328		$ -
2.3	REFRIGERANTE R32/R-410A	LB	0.51	$ 111.000	$ 56.328		$ -
2.4	MAP GAS,BOQUILLA Y SOLDADURA HARRIS	GLB	1.00	$ 145.000	$ 145.000		$ -
2.5	KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION RED DE REFRIGERACION:SOPORTERIA DE LA TUBERIA, UNIONES,CODOS,TUERCAS FLARE,CINTA FOAM,VALVULA DE GUSANILLO Y BOXER	GLB	1.00	$ 350.000	$ 350.000		$ -
3	RED ELECTRICA Y CONTROL						
3.1	CABLE 12 AWG ENCAUCHETADO	ML	5.97	$ 16.150	$ 96.418		$ -
3.2	CABLE AWG No 2X18 APANTALLADO-MANEJADORA	ML	5.97	$ 13.600	$ 81.194		$ -
3.3	KIT DE INSTALACION RED ELECTRICA Y CONTROL, INCLUYE: PRENSA ESTOPA,CORAZA AMERICANA, CONECTORES Y TERMINALES DE CORAZA,TERMINALES EMT Y CONSUMIBLES	GLB	1.00	$ 140.000	$ 140.000		$ -
4	MANO DE OBRA						
4.1	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9000 Y/O 12000 BTU INVERTER NUEVOS, PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO	GLB	1.00	$ 350.000	$ 350.000		$ -
5.0	COSTOS INDIRECTOS						
5.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES.	UN	1.00	$ 51.483	$ 51.483		$ -
COSTO DIRECTO					$ 1.859.975		$ -
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 371.995		$ -
	IMPREVISTOS	2%			$ 37.200		$ -
	UTILIDAD	6%			$ 111.599		$ -
	IVA	19%			$ 21.204		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 2.401.973		$ -
VALOR INSTALACIÓN ANTES DE IVA Y AIU					$ 1.859.975		$ -
VALOR INSTALACIÓN INCLUYENDO IVA Y AIU					$ 2.401.973		$ -
VALOR TOTAL INSTALACIÓN					$ 2.401.973		$ -
OBSERVACIONES							

Representante legal
N° CEDULA:

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL


REGISTRADURÍA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL
PITALITO HUILA

LA SUSCRITA REGISTRADORA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL
DE PITALITO HUILA

CERTIFICA QUE:

Una vez recibido el Aire acondicionado, con las siguientes características;

- Mini Split de 18000 BTU
- Color Beige
- Marca York
- Modelo YHEA18FSADK
- Serial 213501160091200428.

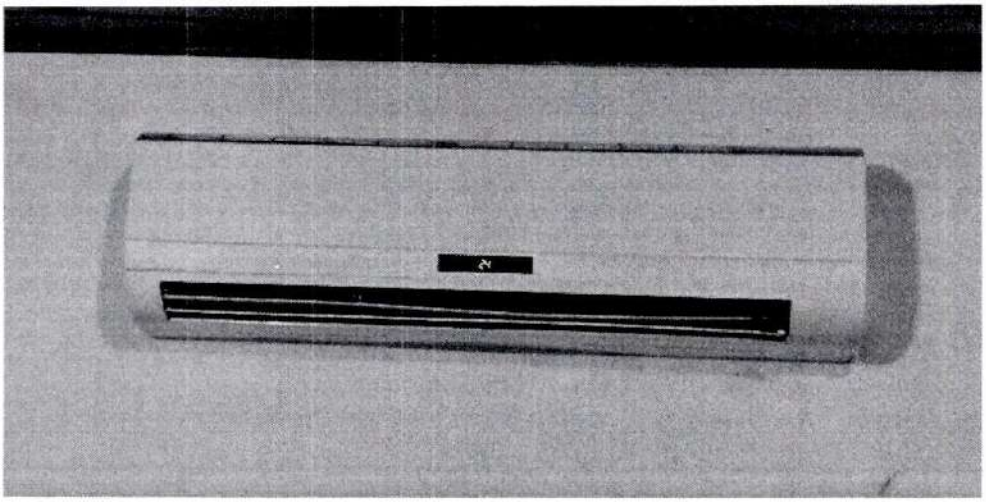

Se procedió a realizar la instalación de este, por parte del respectivo técnico.

La presente se expide a los 22 días del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente,

LEYDY KARYNE CALDERON LEIVA
Registradora Especial del Estado Civil

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Tello, Huila agosto 31 de 2026

CERTIFICA QUE:

El viernes 28 de agosto del presente año quedo instalado en las instalaciones de la Registraduría Municipal de Tello - Huila el aire acondicionado de marca DAIKIN con palca de inventario 019-03772. Así mismo me permito informar que este quedo ubicado en el salón general para que desde allí se refresque la oficina en general y podamos todos los funcionarios beneficiarnos de trabajar en un mejor clima.

La instalación fue realizada por el Sr. BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA de la empresa IMPOCAMARAS BOGOTA.

Se expide con destino a la Delegación Departamental del Huila, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2.026).

NATALIA MOTTA BAUTISTA
Registradora Municipal del Estado Civil (EF)
Tello – Huila



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

EL SUSCRITO REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE YAGUARÁ - HUILA

CERTIFICA:

Qué, recibió a satisfacción el servicio de instalación y el correcto funcionamiento del **AIRE ACONDICIONADO**, en las instalaciones de la Registraduría Municipal, ubicada en la Carrera 6 No. 3-21 Barrio La Milagrosa.

La presente certificación se expide por instrucciones de los señores delegados Departamentales

Dada en Yaguará Huila, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2026.

WILLIAM TOVAR
Registrador del Estado Civil


¡ATENCIÓN!
Claves y Accesos
Datos Importantes


20
CONDENSATE PUMP

