OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

INFORME DE SUPERVISION No. 01

LINO RODRIGUEZ OCHOA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA 2026

FECHA: (02/10/2026)

INFORME DE SUPERVISION No. 01

CONTRATO No.	429 del 11 de agosto de 2026
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
R/LEGAL	
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO SUPERVISIÓN	
VALOR CONTRATO	$49,022,756
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$49,022,756
FECHA INICIACIÓN	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	89%
% AVANCE FISICO	100%
FECHA PRESENTE INFORME	02 DE FEBRERO DE 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Sexta del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m con retiro	m2	2.12
Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para tuberias diametros menores a 1"	m	6.26
Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m2	5.00
Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0.12 m (33x12x23)	m2	12.56
Viga aerea de confinamiento (dindel) 12x15m en concreto de resistencia 3000 Psi reforzada	m	3.94
Pañete liso muros 1:4	m2	19.29
Enchape piso-pared ceramica lisa 20x20 blanca	m2	2.15
Tablon de gres vitrificado 30x30 cm+ gravilla lavada. Suministro e instal.	m2	0.00
Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	m2	72.13
Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	8.76

Teja tipo master 1000 cal 26 pintada	m2	72.27
Caballete metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	m	8.22
Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.20 m incluye regata con pulidora y	m	2.63
Punto desague sanitario pvc 3"	und	2.00
Tuberia presión PVC RDE 9 1/2". Suministero e instal.	m	21.89
Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	und	7.00
Asiento sanitario institucional forte	und	9.00
Sanitario de dos piezas para personas con movilidad reducida. Suministro e	und	1.00
Lavamanos de colgar institucional aquajet para movilidad reducida con griferia	und	1.00
Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PMR. Suministro e Instal	und	2.00
Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	m2	15.97
Limpieza mamposteria común con agua	m2	62.85
Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m2	0.00
Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m2	0.00
Salida para interruptor conmutable sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y	und	2.00
Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de	und	2.00
Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	und	10.00
Concreto estriado rampas de 3000 psi	m3	0.00

VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	6

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			25 agosto 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	x			25 agosto 2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	x			25 agosto 2026
Responsablilidad Civil extracontractual	x			25 agosto 2026

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
625-47-994000006320	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento	$ 4,902,275.60	11 de agosto de 2026	11 de enero de 2027	N/A
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2,451,137.80	11 de agosto de 2026	11 de enero de 2027	N/A
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 2,451,137.80	11 de agosto de 2026	11 de septiembre de 2029	N/A
625 47 994000002325		Responsabilidad Civil extracontractual	$ 350,181,000.00	19 de agosto de 2026	11 de septiembre de 2029	N/A

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 49,022,756.00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado		$ 24,511,378.00		$ 24,511,378.00
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta No.xxx				
Valor presente Acta		$ 19,130,781.00	$ 38,261,562.00	$ 19,130,781.00
Saldo por ejecutar			$ 10,761,194.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 49,022,756.00**		**$ 49,022,756.00**	**$ 43,642,159.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

No fue necesario

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	07 de septiembre de 2026
Parcial 01	06 de octubre de 2026

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe parcial 01 con sus respectivos soportes como:sabana, los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	N/A	PUNTAJE:	N/A	

6. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe de contratista

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1 *ADECUACIONES*

Se llevaron a cabo las adecuaciones en las unidades sanitarias de la zona de primaria de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano, orientadas a mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Las actividades ejecutadas comprendieron la demolición de un tramo de muro para la ampliación del área, el levantamiento de un nuevo muro en bloque, la ejecución de pañete en las superficies intervenidas y la instalación de nuevos enchapes. Asimismo, se realizó el levantamiento de las tabletas de piso existentes para su posterior reemplazo.

2 *CUBIERTA*

Se realizó la adecuación de la cubierta correspondiente a la unidad sanitaria objeto de intervención en la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano. Para ello, se efectuó el desmonte de la cubierta existente en asbesto y su posterior reemplazo por cubierta tipo Master 1000.

Asimismo, para la nueva unidad sanitaria destinada a personas con movilidad reducida, se realizó la instalación de correas metálicas como elementos de soporte de la estructura de cubierta. Como parte de la intervención, se instaló cubierta tipo Master 1000, incluyendo los respectivos caballetes y elementos complementarios requeridos para garantizar su adecuada conformación y funcionamiento

3 *UNIDADES SANITARIAS*

Se realizaron actividades para la inclusión de una nueva unidad sanitaria, en la cual se contempla accesorios para personas con movilidad reducida, sanitario, lavamanos y barras en acero inoxidables, las adecuaciones en los puntos de desaguie y tuberia a presión.

4 *MUROS*

Se han adelantado actividades de limpieza de la mampostería común mediante lavado con agua. Se encuentra pendiente la culminación de las actividades de raspado y resane de las superficies, así como la aplicación de la nueva pintura.

4 *REDES ELECTRICAS*

Se realizó la adecuación de las instalaciones eléctricas de las unidades sanitarias, contemplando el reemplazo de los módulos LED, interruptores sencillos y dobles, así como del cableado que presentaba condiciones deficientes. Adicionalmente, se solicitó la inclusión de un ítem no previsto correspondiente al suministro e instalación de un tablero eléctrico, con el fin de reemplazar el tablero existente y mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad de la instalación.

5 *OTRAS ACTIVIDADES*

Se espera adelantar actividades para instalar las rampas de concreto de 3000psi en puntos estrategicos para mejorar la movilidad en la I.E del Llano

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR






ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 1 Antes y despues

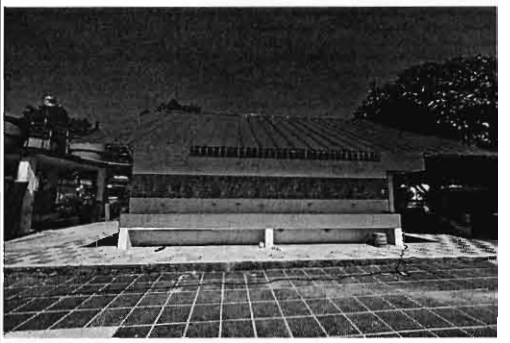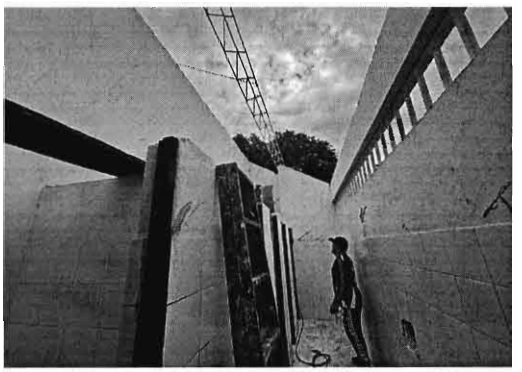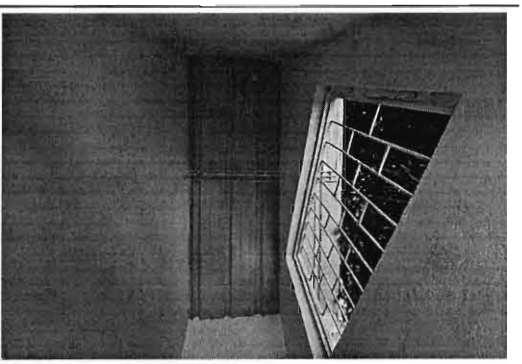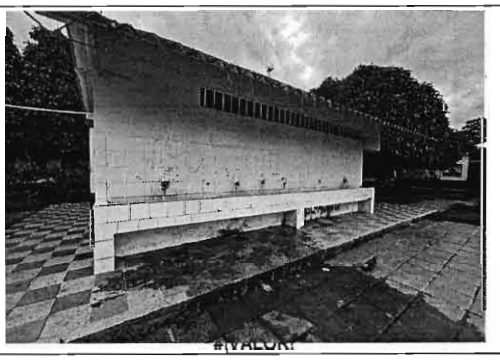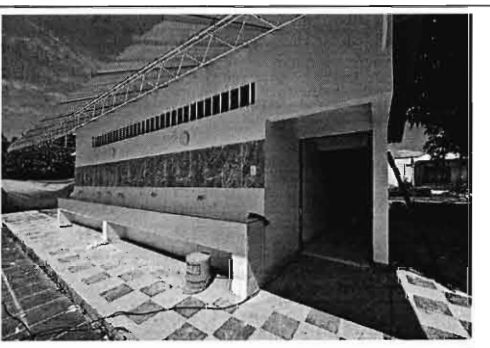
ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 3:Unidad sanitaria nueva para personas con movilidad reducida

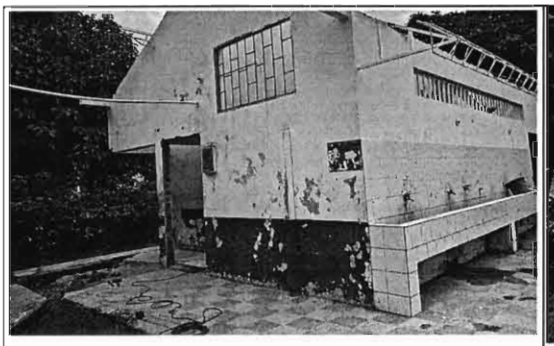







ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO


INFORME DE SUPERVISION No. 01


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA


INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 5
Mejoras en la unidad sanitaria

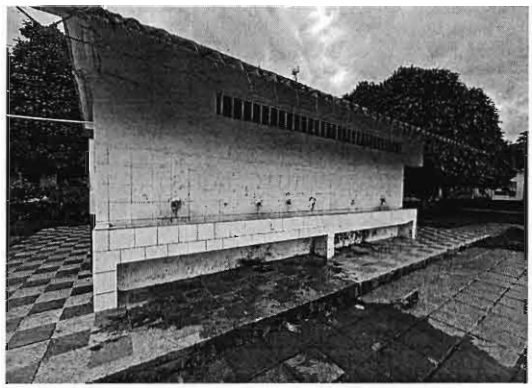

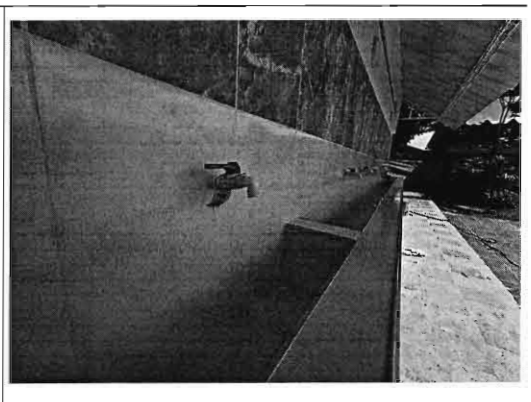

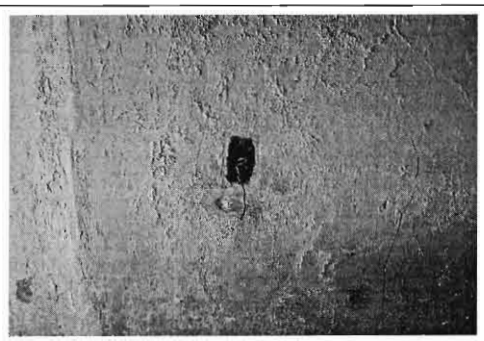



LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD TOTAL CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% CONTRATADO TOTAL	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1.00	**ADECUACIONES**												
1.10	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m c	m2	2.12	2.12	2.12	0.05%	0.05%	0.06%	0.0	$ 11,101.00	$ 23,534.12	$ 23,534.12	$ 23,534.12
1.20	Regata en muro, mamposteria tipo ladrillo o bloque para	m	12.26	12.26	6.26	0.40%	0.40%	0.26%	6.0	$ 15,916.00	$ 195,130.16	$ 195,130.16	$ 99,634.16
1.30	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con r	m2	5.00	5.00	5.00	0.30%	0.30%	0.39%	0.0	$ 29,840.00	$ 149,200.00	$ 149,200.00	$ 149,200.00
1.40	Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0.12 m (33x1	m2	8.36	8.36	12.56	1.78%	1.78%	3.42%	-4.2	$ 104,109.00	$ 870,351.24	$ 870,351.24	$ 1,307,609.04
1.50	Viga aerea de confinamiento (dindel) 12x15m en concret	m	4.29	4.29	3.94	0.84%	0.84%	0.99%	0.4	$ 96,118.00	$ 412,346.22	$ 412,346.22	$ 378,704.92
1.60	Pañete liso muros 1:4	m2	8.36	8.36	19.29	0.56%	0.56%	1.67%	-10.9	$ 33,088.00	$ 276,615.68	$ 276,615.68	$ 638,267.52
1.70	Enchape piso-pared ceramica lisa 20x20 blanca	m2	30.46	30.46	2.15	6.60%	6.60%	0.60%	28.3	$ 106,299.00	$ 3,237,867.54	$ 3,237,867.54	$ 228,011.36
1.80	Tablon de gres vitrificado 30x30 cm+ gravilla lavada. Sum	m2	1.86	1.86	0.00	0.53%	0.53%	0.00%	1.9	$ 138,759.00	$ 258,091.74	$ 258,091.74	$ -
2.00	**CUBIERTA**												
2.10	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	m2	72.13	72.13	72.13	3.45%	3.45%	4.42%	0.0	$ 23,458.00	$ 1,692,025.54	$ 1,692,025.54	$ 1,692,025.54
2.20	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 50	m	41.00	41.00	8.76	9.90%	9.90%	2.71%	32.2	$ 118,396.00	$ 4,854,236.00	$ 4,854,236.00	$ 1,037,148.96
2.30	Teja tipo master 1000 cal 26 pintada	m2	72.13	72.13	72.27	12.56%	12.56%	16.12%	-0.1	$ 85,364.00	$ 6,157,305.32	$ 6,157,305.32	$ 6,169,256.28
2.40	Caballete metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	m	8.22	8.22	8.22	0.94%	0.94%	1.20%	0.0	$ 55,890.00	$ 459,415.80	$ 459,415.80	$ 459,415.80
2.50	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.20 m incluye rega	m	2.75	2.75	2.63	0.30%	0.30%	0.36%	0.1	$ 52,875.00	$ 145,406.25	$ 145,406.25	$ 139,061.25
3.00	**UNIDADES SANITARIAS**												
3.10	Punto desague sanitario pvc 3"	und	2.00	2.00	2.00	0.65%	0.65%	0.84%	0.0	$ 159,969.00	$ 319,938.00	$ 319,938.00	$ 319,938.00
3.20	Tuberia presión PVC RDE 9 1/2". Suministero e instal.	m	21.89	21.89	21.89	0.52%	0.52%	0.66%	0.0	$ 11,616.00	$ 254,274.24	$ 254,274.24	$ 254,274.24

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD TOTAL CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% CONTRATADO TOTAL	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
3.30	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	und	14.00	14.00	7.00	1.72%	1.72%	1.10%	7.0	$ 60,281.00	$ 843,934.00	$ 843,934.00	$ 421,967.00
3.40	Asiento sanitario institucional forte	und	10.00	10.00	9.00	5.65%	5.65%	6.52%	1.0	$ 277,069.00	$ 2,770,690.00	$ 2,770,690.00	$ 2,493,621.00
3.50	Sanitario de dos piezas para personas con movilidad redu	und	1.00	1.00	1.00	2.42%	2.42%	3.10%	0.0	$ 1,184,951.00	$ 1,184,951.00	$ 1,184,951.00	$ 1,184,951.00
3.60	Lavamanos de colgar institucional aquajet para movilidad	und	1.00	1.00	1.00	3.72%	3.72%	4.77%	0.0	$ 1,824,165.00	$ 1,824,165.00	$ 1,824,165.00	$ 1,824,165.00
3.70	Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PN	und	2.00	2.00	2.00	4.51%	4.51%	5.77%	0.0	$ 1,104,440.00	$ 2,208,880.00	$ 2,208,880.00	$ 2,208,880.00
3.80	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con antico	m2	2.12	2.12	15.97	4.13%	4.13%	39.90%	-13.9	$ 956,053.00	$ 2,026,832.36	$ 2,026,832.36	$ 15,268,166.41
4.00	**MUROS**												
4.10	Limpieza mamposteria común con agua	m2	62.85	62.85	62.85	1.35%	1.35%	1.73%	0.0	$ 10,525.00	$ 661,496.25	$ 661,496.25	$ 661,496.25
4.20	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m2	62.85	62.85	0.00	3.22%	3.22%	0.00%	62.9	$ 25,096.00	$ 1,577,283.60	$ 1,577,283.60	$ -
4.30	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m2	84.63	84.63	0.00	2.67%	2.67%	0.00%	84.6	$ 15,473.00	$ 1,309,479.99	$ 1,309,479.99	$ -
5.00	**REDES ELECTRICAS**												
5.10	Salida para interruptor conmutable sencillo, linea decorat	und	1.00	1.00	2.00	0.34%	0.34%	0.88%	-1.0	$ 167,823.00	$ 167,823.00	$ 167,823.00	$ 335,646.00
5.20	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tu	und	2.00	2.00	2.00	0.65%	0.65%	0.84%	0.0	$ 160,189.00	$ 320,378.00	$ 320,378.00	$ 320,378.00
5.30	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobre	und	8.00	8.00	10.00	1.05%	1.05%	1.69%	-2.0	$ 64,621.00	$ 516,968.00	$ 516,968.00	$ 646,210.00
6.00	**OTRAS ACTIVIDADES**												
6.10	Concreto estriado rampas de 3000 psi	m3	13.02	13.02	0.00	29.18%	29.18%	0.00%	13.0	$ 1,098,628.00	$ 14,304,136.56	$ 14,304,136.56	$ -
										COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 49,022,756**	**$ 49,022,756**	**$ 38,261,562**
										SALDO POR EJECUTAR			$ -10,761,194




LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

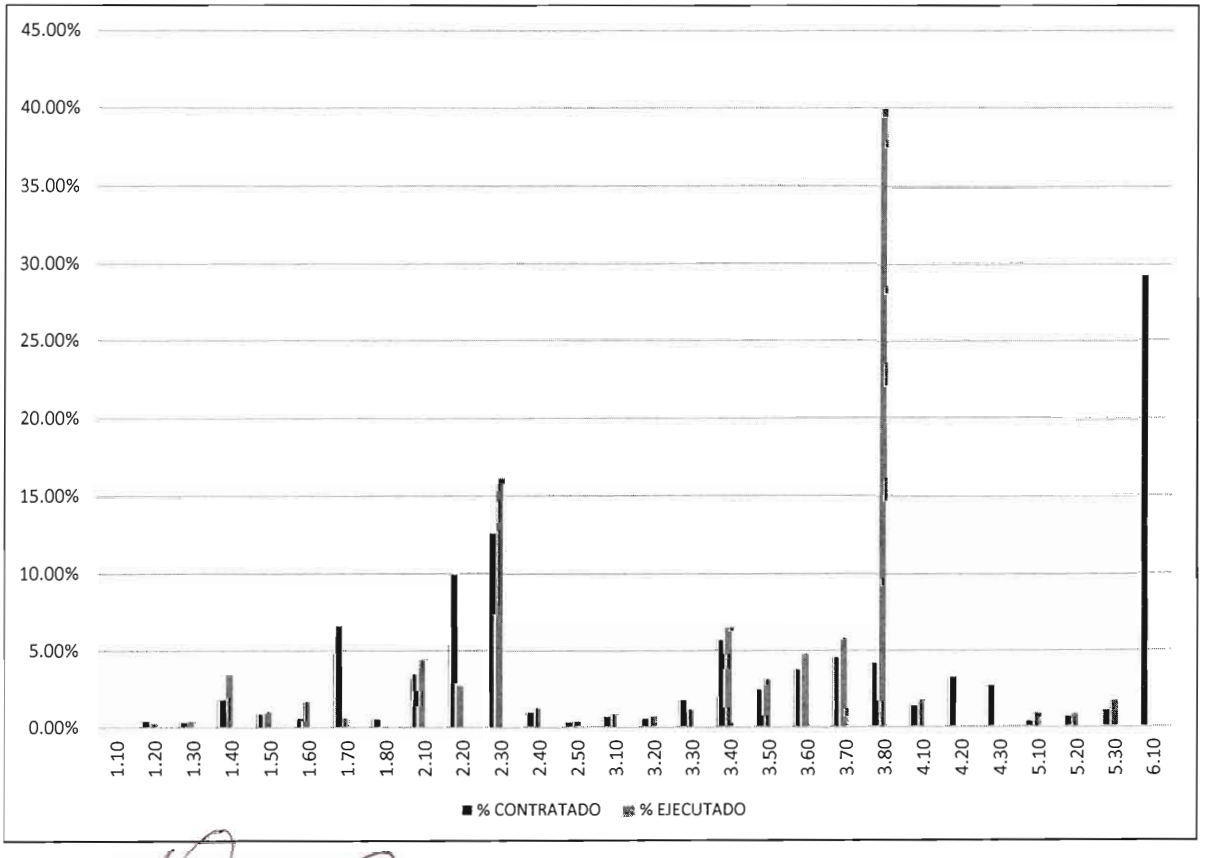

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION No. 01

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
JUNIO	1					
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos				
JULIO	1					
	2					
	3					
	4					
AGOSTO	1					
	2					
	3					
	4					
SEPTIEMBRE	1			Acta de Inicio	Seguimiento	
	2			Acta de terminación		
	3			Comunicación interna inclusión de items no	Comité items no previsto	
	4			Parcial 01	Seguimiento	
OCTUBRE	1					
	2					
	3					
	4					

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR
