Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

Secretaría de Infraestructura

INFORME DE LIQUIDACIÓN	1	**PERIODO:**	Del veinticuatro (24) de julio de 2026 al veinticuatro (24) de agosto de 2026	**FECHA :**	29/09/2026

CONTRATO DE OBRA No.: 301.17.5-006 DEL 16 DE JULIO DE 2026

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA BOCATOMA DE LA FUENTE ABASTECEDORA LA MOTUZ Y MARGEN DERECHA PASO ELEVADO QUEBRADA LA COCHINITA DEL ACUEDUCTO URBANO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PRESENTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

CONTRATISTA: **ROMA INTEGRAL GROUP S.A.S**
NIT. 900.540.285-3
R/L: LUZ ELENA PEREZ CURCHO
C.C. 33.366.869 DE TUNJA.

INTERVENTORÍA **N/A**
REP. LEGAL :
CONTRATO No.:

SUPERVISOR DESIGNADO: **ING. PEDRO SAUL SILVA CAMARGO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**ROMA INTEGRAL GROUP S.A.S** NIT. 900.540.285-3 R/L: LUZ ELENA PEREZ CURCHO C.C. 33.366.869 DE TUNJA.	
Contrato No.	301.17.5-006 DEL 16 DE JULIO DE 2026	
Objeto :	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA BOCATOMA DE LA FUENTE ABASTECEDORA LA MOTUZ Y MARGEN DERECHA PASO ELEVADO QUEBRADA LA COCHINITA DEL ACUEDUCTO URBANO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PRESENTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	
Valor Inicial:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	$ 198.626.420,00
	$ 198.626.420,00	
Valor Adicional No.1:	$ 0,00	
Valor Adicional No.2:	$ 0,00	
Valor total Final del contrato:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	$ 198.626.420,00
Plazo Inicial:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
Fecha de Iniciación:	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2026	
Fecha de terminación Inicial :	VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE DE 2026	
Fecha de terminación anticipada:	VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2026	
Fecha de Supensión No. 1:	N/A	
Fecha de Reinicio No. 1:	N/A	
Prorroga No. 01	N/A	
Estado actual del contrato:	**ETAPA DE LIQUIDACIÓN**	

2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE OBRA

ACTAS SUSCRITAS		FECHA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
No.	DESCRIPCIÓN			
1	ACTA DE INICIO	24/07/2026	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, con fecha de terminación el VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2026
2	ACTA DE TERMIINACIÓN ANTICIPADA	24/08/2026	N/A	Se suscribe un acta de terminación anticipada por cumplimiento del objeto contractual y actividades contratadas
3	ACTA DE RECIBO DE OBRA	26/08/2026	N/A	Se suscribe acta de recibo de obra de obra

3. ADICIONALES AL CONTRATO DE OBRA

NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A N/A	N/A

4. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

Secretaría de Infraestructura

INFORME DE LIQUIDACIÓN 1 **PERIODO:** Del veinticuatro (24) de julio de 2026 al veinticuatro (24) de agosto de 2026 **FECHA :** 29/09/2026

CODIGO INTERNO	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						OBRA EJECUTADA ACTA DE LIQUIDACIÓN		ACUMULADO ACTAS		
	ITEM	ACTIVIDADES	UNO	CANT.	Valor UNIT	Valor TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	Valor TOTAL	% EJEC
	100	**SECTOR BOCATOMA DE LA MOTUZ**									
6191	101	Replanteo y localizacion para obras de protección (Planimetria y Altimetria)	m2	785,00	$ 9.860,00	$ 7.740.100,00	785,00	$ 7.740.100,00	**785,00**	**$ 7.740.100,00**	**100,0%**
6243	102	Excavacion mecanica en conglomerado 0 - 2 m,incluye acarreo	m3	940,00	$ 23.028,00	$ 21.646.320,00	940,00	$ 21.646.320,00	**940,00**	**$ 21.646.320,00**	**100,0%**
4611	103	Relleno con material crudo de rio sin clasificar, compactado y transportado	m3	428,00	$ 93.777,00	$ 40.136.556,00	428,00	$ 40.136.556,00	**428,00**	**$ 40.136.556,00**	**100,0%**
4734	104	Geotextil No Tejido 1600	m2	172,00	$ 11.428,00	$ 1.965.616,00	172,00	$ 1.965.616,00	**172,00**	**$ 1.965.616,00**	**100,0%**
6824	105	Cavion en malla triple torsion en alambre galvanizado calibre 12 recubierto en PVC hueco 7.5x 7.5 cm	m3	120,00	$ 480.765,00	$ 57.691.800,00	120,00	$ 57.691.800,00	**120,00**	**$ 57.691.800,00**	**100,0%**
5559	106	Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	55,8971	$ 58.171,00	$ 3.251.590,20	55,8971	$ 3.251.590,20	**55,90**	**$ 3.251.590,20**	**100,0%**
127	107,0	Jarillon, con material granular de rio con acarreo max. 100 m	M3	1050,00	$ 34.909,00	$ 36.654.450,00	1050,00	$ 36.654.450,00	**1050,00**	**$ 36.654.450,00**	**100,0%**
	200	**SECTOR LA COCHINITA**									
6243	201	Excavacion mecanica en conglomerado 0 - 2 m,incluye acarreo	m3	350,00	$ 23.028,00	$ 8.059.800,00	350,00	$ 8.059.800,00	**350,00**	**$ 8.059.800,00**	**100,0%**
5559	202	Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	45,1999828	$ 58.171,00	$ 2.629.328,20	45,1999828	$ 2.629.328,20	**45,20**	**$ 2.629.328,20**	**100,0%**
127	203	Jarillon, con material granular de rio con acarreo max. 100 m	M3	540,00	$ 34.909,00	$ 18.850.860,00	540,00	$ 18.850.860,00	**540,00**	**$ 18.850.860,00**	**100,0%**
					SUBTOTAL	**$ 198.626.420,00**		**$ 198.626.420,00**		**$ 198.626.420,00**	
					SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ -**		**$ -**		**-$ 198.626.420,00**	**100,00%**
					VALOR TOTAL DE OBRA	**$ 198.626.420,00**		**$ 198.626.420,00**		**$ -**	


ADMINISTRACIÓN	27,50%
IMPREVISTOS	2,00%
UTILIDADES	5,00%
TOTAL AIU	34,50%

5. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA

% Obra Programada General	**100,00%**	**% Ejecución Obra Acumulado**	**100,00%**	**(%)Obra ejecutada Acta** **Presente**	**100,00%**
Valor Obra Programada General:	**$ 0,00**	**Valor Ejecución Obra Acumulado**	**$ 198.626.420,00**	**Valor Obra Ejecutada Acta** **Presente**	**$ 198.626.420,00**

6. GRAFICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

Porcentaje Programado	$ 198.626.420,00	100,00%
Porcentaje Ejecutado	$ 198.626.420,00	100,00%
Diferencia	**$ 0,00**	**0,00%**

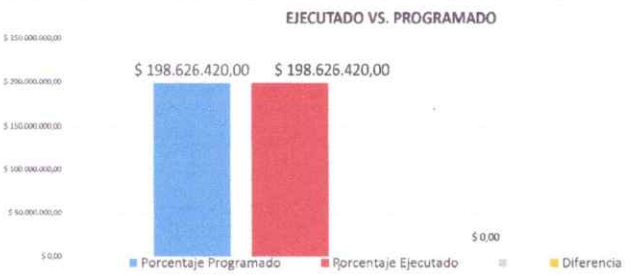

Alcaldía de PAZ DE ARIPORO	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO **INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN**	Secretaría de Infraestructura

INFORME DE LIQUIDACIÓN 1 **PERIODO:** Del veinticuatro (24) de julio de 2026 al veinticuatro (24) de agosto de 2026 **FECHA :** 29/09/2026

7. CONTROL DE POLIZAS VIGENTES SEGÚN ACTA DE RECIBO

ASEGURADORA	**INICIALES® El contratista de obra constituyó las pólizas con la compañía SEGUROS DEL ESTADO. NIT. 860009578-6, dando cumplimiento a la obligación de las garantías estipuladas en la CLÁUSULA. GARANTÍAS de la minuta del contrato de Obra No. 301.17.5-006 del 16 de julio de 2026 . Durante el presente informe se tienen las siguientes pólizas aprobadas por la Oficina Jurídica de la alcaldía:**

NUMERO DE POLIZA	GARANTIA	ANEXO	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Poliza No. 39-44-101184335 ANEXO: 4	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4	24/07/2026	28/03/2027	$ 19.862.642,00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		24/07/2026	28/01/2027	$ 79.450.568,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES		24/07/2026	24/09/2029	$ 19.862.643,00
	CALIDAD DEL SERVICIO		24/07/2026	28/01/2027	$ 19.862.644,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		26/08/2026	26/08/2028	$ 19.862.645,00

8. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	N/A
Rep. Legal:	
Contrato No.	
Objeto :	
Valor Inicial:	
Valor aporte ministerio:	
Valor otros Adicion:	
Valor total Final del contrato:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación Inicial:	
Estado actual del contrato:	

9. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTAS SUSCRITAS		FECHA	DURACION	OBSERVACIONES
No.	DESCRIPCIÓN			
	N/A		N/A	N/A

10. ADICIONALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	

11. CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORÍA

ASEGURADORA	N/A

NUMERO DE POLIZA	GARANTIA	ANEXO	VIGENCIA		VR. ASEGURADO	APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A				
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES					
	CALIDAD DEL SERVICIO					

OBSERVACIONES:

1 *El contratista lleva un 100,00 % de ejecución.*

2 *El contratista realizó los pagos de seguridad social del personal reportado para el periodo supervisado.*

3 *No se presentarón inconvenientes en el periodo de supervisión.*

ING. PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
SUPERVISOR

Anexos:
1. Registro fotografico de obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA N°301.17.5-006 DEL 16 DE JULIO DE 2026

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA BOCATOMA DE LA FUENTE ABASTECEDORA LA MOTUZ Y MARGEN DERECHA PASO ELEVADO QUEBRADA LA COCHINITA DEL ACUEDUCTO URBANO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PRESENTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO".







