NIT 891180077-0

INFORME DE SUPERVISION FINAL

SUPERVISOR DEL CONVENIO	MILTON STEVEN HOYOS HERMIDA
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISION	ROLANDO ÁVILA PATIÑO
CARGO	APOYO PROFESIONAL
No. PROCESO SECOP	No. MP-SI-CD-CI627-2025
CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 023 de 2025
TIPO DE CONVENIO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA Y LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PITALITO S.A.S. E.S.P., PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA).
VALOR	EL VALOR DEL CONVENIO CORRESPONDE A LA SUMA DE CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO ($413.423.577,91) M/CTE, Y SE DISCRIMINA DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR APORTADO POR EL MUNICIPIO: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($180.000.000) AMPARADOS POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 2025001108 DEL 24 DE JUNIO DE 2025. Y EL VALOR APORTADO POR LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO ($233.423.577,91), SERÁN ASIGNADOS AL GASTO DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADO ANUALMENTE DENTRO DEL FLUJO ECONÓMICO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADMINISTRADO POR LA SEMAPP.
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P., R/L JHON SEBASTIAN GRAJALES PENAGOS, IDENTIFICADO CON C.C No.1.030.587.759 DE BOGOTÁ
NIT/ C.C.	NIT 901253688-0,
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE PITALITO
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONVENIO CORRESPONDE A LA SUMA DE CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($413.423.577,91)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONVENIO CORRESPONDE A LA SUMA DE CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($413.423.577,91)
PRORROGA No.1	DOS (2) MESES DESDE EL DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARÍA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ADICIÓN No. (Si aplica. Crear una línea por cada adición)	NO APLICA
SUSPENSION No. 1	SESENTA (60) DÍAS DESDE EL 13 DE FEBRERO 2026
PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	SESENTA (60) DÍAS DESDE EL 13 DE ABRIL DE 2026
REINICIO	DOCE (12) DE JUNIO DE 2026
FORMA DE PAGO:	El valor del aporte del municipio, se desembolsará de la siguiente manera: El municipio de Pitalito – Huila, girará a la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P. EN UN ÚNICO DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DE LOS RECURSOS, UNA VEZ SE HAYA FIRMADO EL ACTA DE INICIO, PREVIA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. (Describir el Rubro)	Fecha	Valor
CDP2025001108	2025/06/24	$ 180.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
2025001718	2025/09/17	$ 180.000.000

INFORME FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 023 DE 2025

El siguiente informe de supervisión presenta la primera etapa de inicio, desarrollo del convenio interadministrativo No. 023 de 2025, celebrado entre el Municipio de Pitalito y SEMAPP S.A.S. SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S. En este se relaciona la información contractual, así como la ejecución del convenio, en la cual, se menciona cada escenario con sus respectivas cantidades y unidades instalados en cada punto.

Alcance del contrato del convenio No. 023 de 2025.

El alcance del convenio comprende la expansión del alumbrado público en la zona rural del municipio de Pitalito Huila: Alumbrado público en la portada Chillurco, Vereda Higuerón y Parque principal del corregimiento de Bruselas, de acuerdo a los estudios y diseños realizados por la SEMAPP S.A.S. de la cual presentan los UCAPS que hacen parte del presupuesto del convenio y que son presentados a continuación:

ESTUDIO, DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO DE EXPANSIÓN SALP PORTADA DE LA VEREDA CHILLURCO

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE OBRA MUNICIPIO

MUNICIPIO PITALITO
PROYECTO Proyectos de expansiones Pitalito 2025 — **ELABORACIÓN** 24/01/2025
DURACIÓN 3 mes — **MES DE REF** nov-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VEREDA PORTADA CHILLURCO	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO DE LUMINARIAS**				
1,2	Luminaria LED 37w	Und	25	25	
2	**SUMINISTRO DE CABLEADO**				
2,1	2x4 + 4 acsr tren. 500 MTS	mts	1,58	1,58	
2,5	Cable encauchetado 3 x 14AWG x 500 MT	mts	0,05	0,05	$ 185.056.116,91
3	**SUMINISTRO DE POSTES**				
3,1	Poste fibra de vidrio de 8 mts 510 KGF	Und	21	21,00	
3,2	Poste fibra de vidrio de 8 mts 750 KGF	Und	4	4,00	
4	**SUMINISTRO DE SPT**				
4,1	Sistema de puesta a tierra SPT	Und	2	2,00	

ESTUDIO, DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO DE EXPANSIÓN SALP VEREDA HIGUERON

PRESUPUESTO DE OBRA MUNICIPIO

MUNICIPIO PITALITO
PROYECTO Proyectos de expansiones Pitalito 2025 — **ELABORACIÓN** 24/01/2025
DURACIÓN 3 mes — **MES DE REF** nov-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	HIGUERON	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO DE LUMINARIAS**				
1,3	Luminaria LED 60.2w	Und	19	19	
2	**SUMINISTRO DE CABLEADO**				
2,1	2x4 + 4 acsr tren. 500 MTS	mts	1,02	1	
3	**SUMINISTRO DE POSTES**				$ 124.553.640,82
3,1	Poste fibra de vidrio de 8 mts 510 KGF	Und	11	11	
3,2	Poste fibra de vidrio de 8 mts 750 KGF	Und	4	4	
4	**SUMINISTRO DE SPT**				
4,1	Sistema de puesta a tierra SPT	Und	1	1	

ESTUDIO, DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO DE EXPANSIÓN SALP PARQUE PRINCIPAL CORREGIMIENTO BRUSELAS

PRESUPUESTO DE OBRA MUNICIPIO

MUNICIPIO PITALITO
PROYECTO Proyectos de expansiones Pitalito 2025 — **ELABORACIÓN**
DURACIÓN 3 mes — **MES DE REF**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO DE LUMINARIAS**			
1,3	Luminaria LED 60.2w	Und	48	
2	**SUMINISTRO DE CABLEADO**			$ 103.813.820,18
2,1	Cable encauchetado 3 x 14AWG x 500 MT	mts	0,068	
2,2	Certificacion RETILAP	Und	1	

EJECUCIÓN DEL CONVENIO

LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PITALITO S.A.S. E.S.P presentó a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Pitalito Huila una propuesta con cantidades y presupuestos proyectada para la instalación de los tres (3) alumbrados públicos rurales en Pitalito Huila, los cuales fueron aprobados en la etapa precontractual en la vigencia 2025.

PRESUPUESTO INICIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 023 DE 2025

El presupuesto del Convenio Interadministrativo No. 023 de 2025 correspondió al valor total de CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO ($413.423.577,91) M/CTE, los cuales se discriminaron en aportes de cada una de las partes del convenio, de la siguiente manera:

VALOR APORTADO POR EL MUNICIPIO: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($180.000.000) amparados por el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2025001108 del 24 de junio de 2025.

VALOR APORTADO POR LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO ($233.423.577,91), que fueron asignados al gasto de proyectos de expansión de Alumbrado Público programado anualmente dentro del flujo económico del impuesto de alumbrado público administrado por la SEMAPP.

Trazabilidad de la ejecución:

1. El día dieciocho (18) de septiembre se suscribió el acta de inicio del convenio No. 023 de 2025.

2. El día veinticinco (25) de septiembre de 2025 se inició con el mejoramiento del alumbrado público del parque principal del centro poblado de Bruselas y se finalizó el día veinticinco (25) de octubre de 2025.

3. El día treinta (30) de octubre de 2025, se realizaron las socializaciones de los alumbrados públicos de la portada Chillurco y de la vereda El Higuerón.

4. El día treinta (30) de octubre de 2025, se inauguró el mejoramiento del alumbrado público del parque principal del centro poblado de Bruselas.

5. El día cuatro (4) de diciembre de 2025 se dio inicio al alumbrado público de la vereda El Higuerón y se finalizó el día nueve (9) de diciembre del mismo año.

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

6. El día dieciséis (16) de diciembre de 2025, se suscribió prórroga No. 1 al convenio, por el término de dos meses, quedando un plazo de ejecución de cinco (5) meses.

7. El día diecisiete (17) de diciembre de 2025 se inauguró el alumbrado público de la vereda El Higuerón.

8. El día ocho (8) de diciembre de 2025 se dio inicio al alumbrado público de la portada Chillurco y se finalizó el dieciséis (16) de diciembre del mismo año.

9. El día diecisiete (17) de diciembre de 2025 se inauguró el alumbrado público de la portada Chillurco.

10. El trece (13) de febrero de 2026, se suspendió el convenio por un término de sesenta (60) días, por solicitud de la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P, tiempo estimado para obtener la certificación RETILAP.

11. El día trece (13) de abril de 2026, se suscribió acta de prórroga No. 1 a la suspensión No. 1, por un término de sesenta (60) días, teniendo en cuenta que no habían sido superadas las causas que dieron origen a la suspensión del convenio.

12. El día once (11) de junio de 2026, la SEMAPP hizo entrega del documento faltante (RETILAP), para dar inicio a la liquidación del convenio.

13. El día doce (12) de junio de 2026, superadas las circunstancias que fundamentaron la suspensión y la prórroga a la misma, se reinició el convenio y se suscribió el acta de terminación.

A continuación, se presenta el presupuesto total del convenio No. 023 de 2025 y la relación de las cantidades de obra ejecutadas.

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON ESTIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NIT 891180077-0

ALCALDIA DE PITALITO HUILA

PRESUPUESTO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 023 DE 2025

NOMBRE DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA Y LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PITALITO S.A.S. E.S.P. PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)
UBICACIÓN	PORTADA CHILLURCO VDA CHILLURCO MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

					EJECUCION A CORTE 16 DE DICIEMBRE DE 2025		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.TOTAL	UND	CANTIDAD INSTALADA	V.TOTAL
1	LUMINARIA LED 37W	UND	25,00	$ 185.056.116,91	UND	25,00	$ 185.056.116,91
2	CABLE ALUMINIO TRENZADO 2X4+4 x500 MTS	M	1,58		M	1,58	
3	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG X500 MTS	M	0,05		M	0,05	
4	POSTE FIBRA DE VIDRIO DE 8X510 KG-F	UND	21,00		UND	21,00	
5	POSTE FIBRA DE VIDRIO DE 8X750 KG-F	UND	4,00		UND	4,00	
6	SISTEMA DEPUESTA A TIERRA SPT	UND	2,00		UND	2,00	

UBICACIÓN	VDA HIGUERON CORREGIMIENTO CHARGUAYACO MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

					EJECUCION A CORTE 16 DE DICIEMBRE DE 2025		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.TOTAL	UND	CANTIDAD INSTALADA	V.TOTAL
1	LUMINARIA LED 60,2W	UND	19,00	$ 124.553.640,82	UND	19,00	$ 124.553.640,82
2	CABLE ALUMINIO TRENZADO 2X4+4 x500 MTS	M	1,02		M	1,02	
4	POSTE FIBRA DE VIDRIO DE 8X510 KG-F	UND	11,00		UND	11,00	
5	POSTE FIBRA DE VIDRIO DE 8X750 KG-F	UND	4,00		UND	4,00	
6	SISTEMA DEPUESTA A TIERRA SPT	UND	1,00		UND	1,00	

UBICACIÓN	PARQUE PRINCIPAL CENTRO POBLADO BRUSELAS CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

					EJECUCION A CORTE 16 DE DICIEMBRE DE 2025		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.TOTAL	UND	CANTIDAD INSTALADA	V.TOTAL
1	LUMINARIA LED 60,2W	UND	48,00	$ 103.813.820,18	UND	48,00	$ 103.813.820,18
3	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG X500 MTS	M	0,068		M	0,068	
7	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	1,00		UND	1,00	

VALOR TOTAL CONVENIO	$ 413.423.577,91	$ 413.423.577,91

ROLANDO AVILA PATIÑO
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Se anexa el registro fotográfico.

Para constancia se firma el doce (12) de julio de 2026

MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Supervisor Convenio 023 de 2025

ROLANDO ÁVILA PATIÑO
Apoyo profesional eléctrico

Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 023 DE 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO PARQUE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS




Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.	
Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

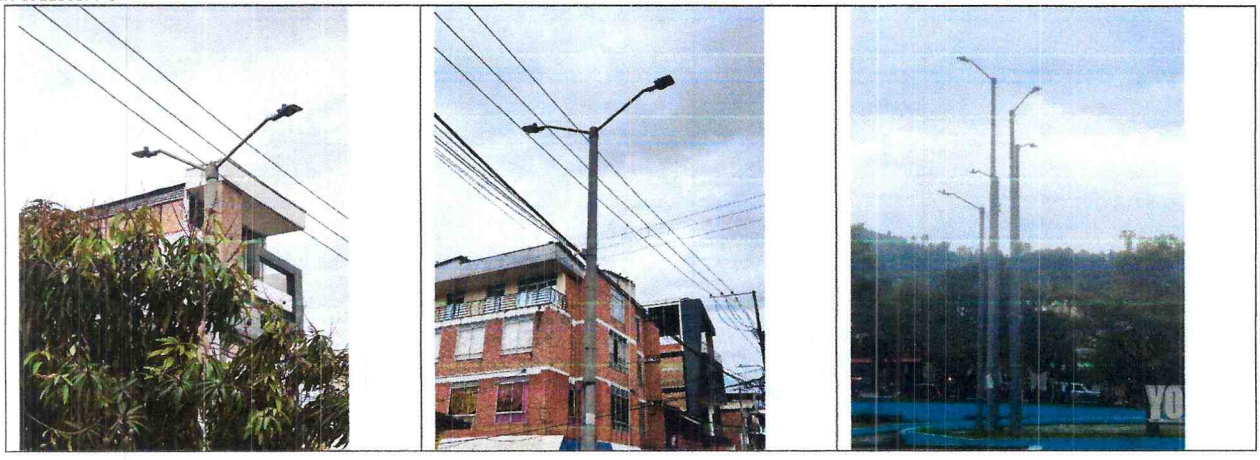

REGISTRO FOTOGRAFICO ALUMBRADO PÚBLICO VEREDA HIGUERON



Proyectó: ROLANDO AVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



REGISTRO FOTOGRAFICO ALUMBRADO PÚBLICO PORTADA CHILLURCO



Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA















Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.	
Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

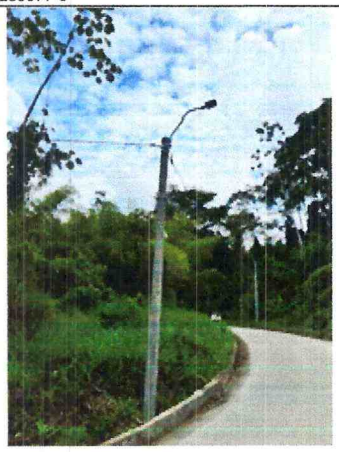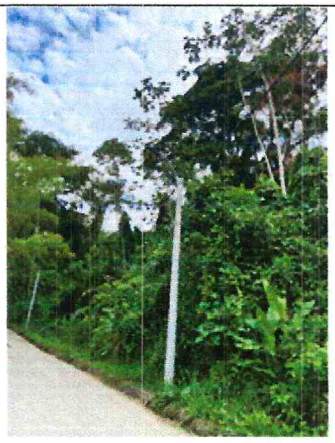

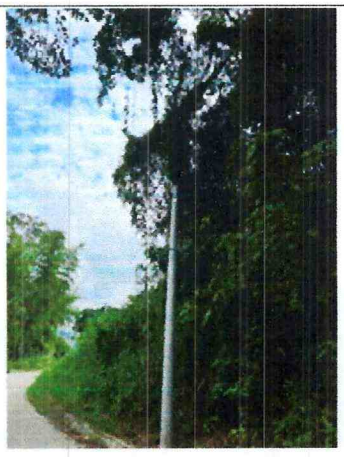

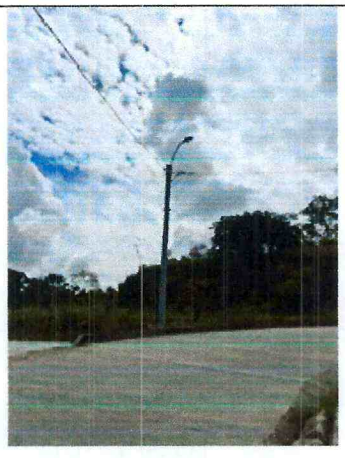


Proyectó: ROLANDO ÁVILA PATIÑO – APOYO PROFESIONAL S.I.

Revisado por: MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA	Aprobado por: MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Firma:	Firma:
Cargo: ASESOR JURIDICO S.I.	Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
