INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 220 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 139 DE 2025

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No. 13

01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
N.I.T. 901.915.452-1

BOGOTÁ D.C. 28 de mayo de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción modificación	Folios
0	28/mayo/26	Versión inicial del contrato	126

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicial con el siguiente índice o contenido que las veces de lista de chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:

Contrato de Obra No.	**139**	**Contratista:**	**CONSORCIO YVY**
Contrato de Interventoría No.	**220**	**Interventoría:**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**

Objeto Contrato de Obra: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No.	**13**	**MES O PERIODO:**	ABRIL 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Interventoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Diana Raquel Gaviria Diaz Residente 2 Interventoría Introducción		
2	Descripción del proyecto		
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		
2.3	Estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	Información Contrato de Obra		

3.1	Información general contrato de obra		
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Gestión Ambiental		
3.4	Gestión Social		
3.5	Salud y Seguridad para el trabajo SST		
3.6	Gestión Predial		
3.7	Gestión Sostenibilidad		
3.8	Sectorización del proyecto y modificaciones		
3.9	Socialización del proyecto		
3.10	Seguimiento a Ítems no previstos		
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra		
4.1	Informes semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	
4.2	Maquinaria y equipo contrato de obra		
4.3	Personal, control Aporte Legales y seguridad social contrato de obra	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	
4.4	Control de aportes legales y seguridad social		
4.5	Informe financiero y presupuestal contrato de obra		
4.6	Estado General del tiempo		
4.7	Aclaración y Evidencias para la protección del instituto		
4.8	Resumen Ensayos de Laboratorio		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	
4.10	Seguimiento al plan de calidad contrato de obra		
4.11	Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)		
4.12	Otros documentos seguimiento mensual		

4.12.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		
4.12.2	Seguimiento Programa de Inversión		
4.12.3	Seguimiento Programa de Obra		
4.13	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		
5	Información contrato de interventoría		
5.1	Información general del contrato de interventoría		
5.2	Descripción por las actividades realizadas por el interventor		
5.3	Informes especialistas		
5.4	Informe a la inversión del anticipo interventoría		
5.5	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.6	Información de otros programas de Obra e Interventoría		
6	Reportes ejecución mensual contrato de interventoría		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	
6.3	Informe financiero y Presupuestal		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		
6.5.1	Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría		
6.6	Otros Documentos seguimiento mensual		
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		
6.6.2	**PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO APROBADO** DESCRIPCION | VR ANTICIPO | SUBTOTAL		

	INSUMOS O MATERIALES	4.740.331.861,00	4.740.331.861	48,30%	1.810.065.868,59	2.930.265.992,41
	EQUIPOS y/O HERRAMIENTAS	1.609.553.675,00	1.609.553.675	16,40%	21.823.430,00	1.587.730.245,00
	TRANSPORTE	912.734.706,00	912.734.706	9,30%	696.265.893,80	216.468.812,20
	MANO DE OBRA	2.551.731.436,00	2.551.731.436	26,00%	564.289.927,00	1.987.441.509,00
	TOTAL	9.814.351.678,00	9.814.351.678,00	100,00 %	3.092.445.119,39	6.721.906.558,61
	A la fecha del presente informe se ha recibido 30 solicitudes de ordenes de operación de parte del contratista, de las cuales, 20 han sido aprobadas y tramitadas, y las otras 10, han sido observadas, o el contratista a desistido de la solicitud. Seguimiento Programa de Inversión					
6.6.3	Actas de Comité de Obra				ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	
6.6.4	Actas reunión				ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	
7	Conclusiones y recomendaciones					
7.1	Correspondencia					
7.2	Registro fotográfico de las actividades de obras					
7.3	Registro fotográfico de las actividades sociales					
7.4	Bitácora del mes correspondiente					
7.5	Acta de costos de interventoría				MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:


Nombre: Ing. Edgar Mauricio Beltrán Cárdenas
DIRECTOR 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Tarjeta Profesional: 25202-44755 CND



Firma: _____
Nombre: Ing. Carlos Arturo Reina
DIRECTOR 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Tarjeta Profesional: 25202-10227 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

Elaboró:	Revisado por:	Aprobado por:
COMPONENTE SOCIAL		
Yulieth Camelo Fiquitiva Profesional Social Provincia de Ubaté		
Diana Chavarrio Profesional Social Provincia de Almeidas		
Tania Escobar Profesional Social Provincia de Rionegro		
COMPONENTE AMBIENTAL		
Carlos Arturo Chaparro Sánchez Profesional Ambiental		
COMPONENTE SST		
Yessica Paola Mora Torres Profesional SST		
COMPONENTE PAVIMENTOS		
Carlos Ivan Gutierrez		

Especialista en Pavimentos		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		
 Carolina Peña Residente 1 Interventoria		
 Diana Raquel Gaviria Diaz Residente 2 Interventoría		

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo informar las actividades realizadas durante el presente mes de abril de 2026, en el marco del proyecto correspondiente al contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS DEL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, "CAMINOS PARA QUEDARSE", EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍO NEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**. Este proyecto, que cuenta con el contrato número 139 de 2025 suscrito Por el ICCU con el Consorcio YVY, y la interventoría asignada bajo el contrato número 220 de 2025, dio inicio con la firma del acta de inicio del proyecto el pasado 1 de abril de 2025. En el contrato se están evaluando diversas alternativas para la intervención de las vías en las mencionadas provincias, con el fin de definir las mejores estrategias para su intervención, y poder garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

Este proyecto se llevá a cabo en corredores viales distribuidos a lo largo del departamento de Cundinamarca, que para el caso del Lote 2, comprende las siguientes vías:

Tabla 1. Localización de obra

LOTE	PROVINCIA	MUNICIPIO	PROYECTO	KM
2	ALMEIDAS	CHOCONTA	CHOCONTA - HATO FIERO - LENGUAZAQUE	8.64
2	ALMEIDAS	SESQUILE	VIA SESQUILE GUATAVIA - EL HATO - RANCHERIA - EL UVAL - EL HATO	17.44
2	ALMEIDAS	MANTA	MANTA (LAS PUERTAS) - SAN JERÓNIMO - Y DE CUBIA - CAPADOCIA - SALGADO - MINAS - GUAYATA	8.98
2	RIO NEGRO	LA PALMA	LA PALMA - ÚTICA (LA CAÑADA - ZUMBE)	20.5
2	RIO NEGRO	VILLAGOMEZ	VARIANTE BUENAVISTA: CRUCE ESCUELA VIEJA - PUENTE TABLA (LÍMITE CON PACHO)	2.51
2	RIO NEGRO	TOPAIPI	PUENTE IBAMA - SURAZ - SAN ANTONIO	23.2
2	RIO NEGRO	YACOPI	GALÁPAGOS - THERAN - LLANO MATEO - YACOPI - NARANJAL	20.15
2	UBATÉ	SIMIJACA	VÍA NACIONAL - VEREDA EL PANTANO	5.72
2	UBATÉ	SUSA	VÍA SUSA – CARMEN DE CAUPA – LAS VUELTAS **(*)**	6.71
2	UBATÉ	TAUSA	FLORIDA - PALOGRUESO - SANABRIA - PIEDRA MOLINO	6.71
2	UBATÉ	UBATÉ	LAS FAVORITAS - SANTA HELENITA - ALTA MIRA Y TAUSAVITA	7.8

(*) Vía con cambio por solicitud de la Alcaldía y aprobación del ICCU.

Ver Anexo 1. FORMATO MS-GP-FR-010 ACTA DE LOCALIZACIÓN

2.0 Conectividad, área de influencia y beneficios

Las vías que conectan los municipios de Cundinamarca son esenciales para garantizar la movilidad, el desarrollo económico y social de la región. Estas rutas no solo facilitan la comunicación entre áreas ricas en recursos naturales y claves para la producción agrícola y forestal, sino que también integran las zonas rurales a los mercados regionales. La mejora de la infraestructura vial impulsa el crecimiento de los municipios, fortalece la interconexión regional, facilita el acceso a servicios y promueve el desarrollo turístico.

La ejecución de estos proyectos trae consigo múltiples beneficios: fomenta el desarrollo económico, mejora la accesibilidad, potencia el turismo, incrementa la seguridad vial, genera empleo y consolida la conectividad nacional. Además, no solo son vitales para el

crecimiento económico de Cundinamarca, sino también para la integración social y la sostenibilidad de la región. Una conectividad eficiente permitirá el flujo adecuado de bienes, servicios y personas, fortaleciendo el tejido social y económico de los municipios involucrados.

2.1 Estado inicial de la vía

Las principales vías de las provincias de Río Negro, Ubaté y Almeidas, que conectan varios municipios de Cundinamarca, presentan un estado de infraestructura deficiente. Las rutas se caracterizan por afirmado deteriorado, infraestructura precaria y un drenaje vial insuficiente en muchas áreas. A pesar de algunas intervenciones previas, es evidente la necesidad de una mejora sustancial para asegurar una conectividad vial adecuada y segura en la región.

-Provincia de Rionegro (Vías Municipios de La Palma, Villagómez, Topaipí y Yacopí)
Las vías en la provincia de Rionegro, para nuestro caso los municipios de La Palma, Villagómez, Topaipí y Yacopí, se encuentran en condiciones de deterioro. La mayor parte de la carretera está conformada por un afirmado en malas condiciones, con una infraestructura precaria que dificulta el tránsito seguro y fluido. Los tramos que cuentan con placas huellas, fueron ubicados en el archivo KMZ (Anexo N° 13) delimitando las zonas que no serán intervenidas, con el objetivo de priorizar otros tramos de mayor deterioro.

-**Provincia de Ubaté (Vías Municipios de Simijaca, Susa, Tausa y Ubaté)**
Al igual que en la provincia de Rionegro, las vías en los Municipios de Ubaté, Simijaca, Susa y Tausa presentan un estado similar. La mayoría de los tramos cuentan con afirmado en malas condiciones y una infraestructura vial deficiente. En algunos sectores, el drenaje vial es insuficiente, y en caso de Simijaca, la vía se desarrolla en zonas donde el drenaje es difícil, como consecuencia de las cotas de rasante comparadas con zonas inundables adyacentes, lo que contribuye al deterioro acelerado de la vía.

-**Provincia de Almeidas (Vías Municipios de Chocontá, Sesquilé y Manta)**
Las vías de la provincia de Almeidas, específicamente en los municipios de Chocontá, Sesquilé y Manta, presentan condiciones similares a las de otras provincias, hay sectores con placa huellas, los cuales están plenamente identificados En algunos tramos se observan canales de drenaje, mientras que en otros el drenaje vial es insuficiente. La infraestructura es precaria, con secciones de afirmado en mal estado y una necesidad urgente de intervención. Es preciso mencionar que la vía en manta presenta

movimientos de ladera, que se salen del alcance del presente contrato. Aunque ocasionalmente se evidencian trabajos de mantenimiento realizados por los municipios, la carretera requiere de mejoras significativas para garantizar una circulación segura y fluida.

2345 TYUIOP

Figura 1. Provincia de Ubaté



Ubate, Villa de San Diego 5.2951N 73.8023W
Susa, Capellania 5.311500N – 73.481300W
Ubaté, Coordenadas 5.300400N – 73.809600W

Figura 2. Provincia de Rionegro



La Palma, 5.294000N – 74.440929W

Figura 3. Provincia de Almeidas



Manta, Coordenadas 4.983300N – 73.546500W Choconta, Coordenadas 5.166900N – 73.684400W

2.2 Características técnicas del proyecto

Las vías en intervención corresponden a caminos vecinales cuya conservación está a cargo de cada uno de los municipios. Estas vías conectan los cascos urbanos con otros centros poblados o veredas, siendo de vital importancia para el desarrollo regional.

Se trata de vías veredales con un ancho promedio de entre 5 y 6 metros, construidas en material afirmado, con cunetas en tierra y obras de drenaje como alcantarillas.

Algunas de estas vías ya han sido intervenidas previamente mediante la construcción de placas huella en sectores críticos, así como la implementación de obras de drenaje y contención. Su mantenimiento continúa siendo responsabilidad de cada alcaldía municipal.

2.3 Parámetros técnicos, Geométricos, sección típica, estructura de pavimento, descripción de suelos.

Durante el mes de abril de 2026, el componente de pavimentos continuó con el acompañamiento técnico a los informes entregados por el contratista, así como a cada una de las campañas y resultados de laboratorio obtenidos insumo fundamental para la formulación de los diseños de estabilización de los corredores viales priorizados en las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro. Sin embargo, pese a que la etapa de caracterización concluyó el 30 de junio de 2025, conforme al plazo contractual establecido en el contrato a la fecha no se han finalizado las actividades correspondientes a la Fase II, particularmente la presentación de la fórmula de trabajo

y de los diseños de estabilización definitivos, los cuales cuentan con observaciones. A la fecha, el contratista no ha subsanado las observaciones hechas a los informes de los diseños de estabilización, los cuales solo aportaban unas proporciones de estabilizantes, sin ningún análisis que soporte dicha decisión, adicionalmente persisten observaciones relacionadas con la sectorización por tramos homogéneos.

Así mismo en el periodo el contratista informó que continua con los ensayos de los estabilizantes IONICSOIL, Cenizas, Estansoil, con algunas combinaciones con otros químicos y cemento, en las reuniones de seguimiento en el periodo se tocó el tema de la posibilidad de ir presentado por parte del contratista los estudios completos y propuestas contractuales de diseño por tramo para ir cerrando el informe Fase 2.

La interventoría se encuentra a la espera de entrega de resultados por parte del contratista de las nuevas pruebas que se encuentra adelantando con productos de estabilización adicionales.

Ver Anexo 4. Pavimentos.

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general contrato de obra

El contrato de obra No. **ICCU-139 de 2025**, identificado en el SECOP con el ID **CO1.PCCNTR.7191450** y proceso de selección **(No. ICCU-LP-031 DE 2024).**, fue suscrito para la **intervención de vías del programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse (ICCU)**, en las provincias de **Ubaté, Almeidas y Rionegro**, en el departamento de **Cundinamarca**. Su **fecha de inicio** fue el **1 de abril de 2025**, con un **plazo inicial de 274 días**, hasta el **31 de diciembre de 2025**. A la fecha, se aprobó una prórroga por CINCO (5) meses a los contratos de obra e interventoría tendientes a la terminación de las obras y por otra parte no se han registrado suspensiones, aclaraciones ni cesiones contractuales.

El **valor inicial del contrato de obra** es de **$34.436.321.680**, sin adiciones presupuestales a la fecha. Actualmente el ICCU realizó el desembolso del anticipo, por un valor de **$10.330.896.504,** se vienen tramitando varios usos de anticipo por el contratista propios de las actividades de ejecución.

A la fecha se ha dado aprobación a las siguientes ordenes 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22. Durante el trámite ante la fiducia del desembolso No. 6 se presentaron inconvenientes derivados de la radicación de formatos distintos a los previamente autorizados por la Interventoría, situación que se encuentra pendiente de aclaración por parte del contratista y adicional se efectuó pago correspondiente al primer y segundo 25% de la etapa de caracterización.

El contratista es el Consorcio YVY, integrado por las siguientes empresas:

- Vigavi Zomac S.A.S. – NIT 901.677.384-7 (70%)
- Jaime Amadeo Sánchez Giraldo – CC 72.125.268 (10%)
- Grupo Grava S.A.S. – NIT 900782855-1 (10%)
- Obras Interventoría y Suministros S.A.S.- NIT 900.974.081-0 (10%)

Domicilio: Riohacha, La Guajira

Contrato de Interventoría No. ICCU-220 de 2025

El contrato de interventoría No. **ICCU-220 de 2025**, identificado en el SECOP con el ID **CO1.PCCNTR.7439044**, Y Razón Social del Consorcio:

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050–NIT (901.915.452-1)

Representante Legal del Consorcio: Claudia Liliana Ramírez Gaitán. Dirección: Calle 98 # 21 – 50, Piso 3, Bogotá D.C., Colombia.

- **Fecha de inicio:** 1 de abril de 2025
- **Plazo Inicial:** 274 días (hasta el 31 de diciembre de 2025)
- **Valor inicial:** $3.865.474.025
- **Anticipo:** $773.094.805 (Girado)
- **Valor pagado:** Al respecto, se han remitido a la supervisión dos actas de interventoría durante los meses de **octubre y noviembre**; no obstante, a la fecha estas continúan pendientes de aprobación. Se han **radicado siete (7) actas de costos de interventoría** de las cuales se han recibido pagos por un valor total de **$1.329.763.203**, correspondientes al periodo comprendido entre **abril a octubre** de 2025. De dicho pago queda pendiente el cobro de honorarios generados por contratos de prestación de servicios profesionales, relacionado con el reconocimiento del factor multiplicador por parte del ICCU, el cual objetó el pago emitiendo oficio ICCU-I-2026-0004254. Actualmente se espera la aprobación de los informes de noviembre, y diciembre de 2025, así como los informes de enero y febrero de 2026, . Respecto al anticipo se han solicitado seis (6) usos de anticipo por un valor total de $757.902.745.
- **Valor por pagar del contrato:** $2.535.710.822

Uso de Anticipos - datos actualizados								
Item	**impuesto timbre**	**Anticipo 1**	**Anticipo 2**	**Anticipo 3**	**Anticipo 4**	**Anticipo 5**	**Anticipo 6**	**Total**
Pago salarios	$ -	$169.037.336	$ 38.031.000	$105.008.694	$133.962.547	$118.215.300	$ 4.997.653	$569.252.530
Otros costos	$ -	$ 50.720.000	$ -	$105.447.240	$ -	$ -	$ -	$156.167.240
Impuestos	$ 32.482.975	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.482.975
Total	$ 32.482.975	$219.757.336	$38.031.000	$210.455.934	$133.962.547	$118.215.300	$ 4.997.653	$757.902.745
Saldo	$ 740.611.830	$520.854.494	$482.823.494	$272.367.560	$138.405.013	$ 20.189.713	$ 15.192.060	

Integrantes del Consorcio:

TPF Getinsa Euroestudios Colombia S.A.S. NIT 900797235-9 – (90%)

Composición Accionaria:

- 98.19% – TPF S.A. (NIT: 435170803)
- 0.75% – Gregorio López Vallejo (C.C. 13121078-S)
- 0.76% – Jonathan Morgan (ID: Y3822504-X)
- 0.07% – Ahmed El Khadri (ID: 5424268-V)
- 0.23% – José Manuel Ballesteros (C.C. 50832957-J)

Euroestudios Ingenieros de Consulta S.A.S. NIT 900753174-9 (10%)

Composición Accionaria:

- **100% propiedad de: TPF Getinsa Euroestudios S.L.**

La ingeniera LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ, es la directora de caminos. Y para la supervisión del contrato funge como asesor de la subdirección de caminos el Ing. Gabriel Felipe Lozano Ponguta.

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo reportado, se continúa con la etapa de ejecución del proyecto. No obstante, es importante tener en cuenta que, si bien el 30 de junio 2025 finalizó la etapa de caracterización, aún se encuentran pendientes algunas actividades correspondientes al componente "Diseño de estabilización y tramos de prueba", las cuales hacen parte de dicha etapa.

Estas actividades pendientes serán descritas a lo largo del presente informe, con el fin de dejar constancia de su estado y de los avances o compromisos asociados por parte del contratista.

La etapa de caracterización, según el cronograma mencionado, incluye las siguientes actividades:

- Actividades preliminares
- Caracterización
- Diseño de estabilización

Contractualmente, de acuerdo con el Anexo técnico la Fase de caracterización contempla las Fases 1 y 2 las cuales incluyen la caracterización del área a intervenir, caracterización de los suelos y las propuestas de diseño

3.2.1 CARACTERIZACIÓN

Actividades pendientes por ejecutar en esta etapa a la fecha:

- Apiques

Las actividades de ejecución de apiques se encuentran terminadas, sin embargo, la interventoría solicitó al contratista verificar los sectores en los que se observa la presencia de materia Orgánica y adicionalmente, aumentar la profundidad de estos, situación que no fue tenida en cuenta por el contratista.

Al respecto de la solicitud reiterada de la profundización de apiques, el Contratista ha manifestado en las diferentes mesas de trabajo y mediante comunicado YVY-104-2025 que considera que la estabilización se realizará a la capa de rasante de acuerdo con el alcance contractual y por tanto la caracterización principal se ha realizado a esta capa, indica que como método para garantizar la efectividad del mejoramiento con el estabilizante realizará tramos piloto.

Frente a la observación reiterada de la Interventoría, en cuanto a que los resultados de caracterización que se han recibido corresponden a ensayos de profundidad entre 30 y 35 cm, lo cual no cumple con la normativa, y la solicitud de profundizar los apiques, el contratista dio alcance, con apiques con profundidades 1.20 en los tramos correspondientes a Tausa (19 apiques) y Ubaté (17 apiques). De esta información el contratista debia remitir los ensayos de caracterización y la actualización de planos de estratigrafías.

Resumen apiques realizados por el contratista de los cuales el contratista ha remitido soportes a la fecha:

Tabla 2. Apiques realizados

LOTE 2		
PROVINCIA	MEJORAMIENTO VIAL	APIQUES REALIZADOS
RIO NEGRO	Topaipí	64

LOTE 2		
PROVINCIA	MEJORAMIENTO VIAL	APIQUES REALIZADOS
	Villagómez	8
	La Palma	59
	Yacopí	65
ALMEIDAS	Chocontá	36
	Sesquilé	45
	Manta	25
UBATE	Ubaté	17
	Simijaca	13
	Susa	23
	Tausa	19
		374

A la fecha de cierre del presente informe no se ha recibido la subsanación de las observaciones remitidas mediante comunicado ICCU-S-365-25. En los comités semanales, se continúa haciendo el seguimiento a este punto.

3.2.2 DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN Y TRAMOS PILOTO

A la fecha el contratista ha presentado información acerca del presupuesto con diferentes agentes estabilizantes, para algunos tramos que comprenden el alcance del presente proyecto, pero en lo que respecta a los informes de caracterización, estos no han sido remitidos, por lo cual no se cuenta con resultados que permitan soportar la viabilidad de los diferentes agentes, sin embargo, la interventoría en aras a que el proyecto no se paralice ha permitido que el contratista, a su costo y riesgo adelante tramos de prueba, para los cuales se compromete a realizar la verificación del cumplimiento de especificaciones mediante el empleo del LWD, para comprobar la efectividad del proceso de estabilización.

Así mismo en el periodo el contratista informó que continua con los ensayos del estabilizantes ONICSOIL, Cenisas, Estansoil, con algunas combinaciones con otros quimicos y cemento, en las reuniones de seguimiento en el periodo se tocó el tema de la posibilidad de ir presentado por parte del contratista los estudios completos y propuestas contractuales de diseño por tramo para ir cerrando el informe Fase 2.

3.2.3 SEGUIMIENTOS A ÍTEMS NO PREVISTOS

En el periodo se realizó seguimiento a los Ítems no previstos ya que respecto al cambio de tubería de concreto a tubería tipo Novafort de 36” se acordó que el contratista tramitaría Ítem no previsto, así se debiera mantener el costo de la tubería acorde a la tubería en Concreto presentada por el contratista en la propuesta, así como para el ítem

de Grava para cama de tubería PVC, este compromiso había sido pactado para el 16 de diciembre 2025 y el contratista ha estado indicando en reuniones que lo entregaría posteriormente por lo que en la reunión del 8 de enero 2026 (acta 66) el contratista solicitó plazo para entrega el 13 de enero 2026.

Finalmente se recibió el comunicado YVY-006-26 del 16 de enero 2026 en respuesta ICCU-S-343-2025 referente a APU NP, el cual fue observado mediante comunicado ICCU-S-048-2026, del 3 de febrero de 2026.

No.	Descripción	Comunicaciones	Estado
NP 01	GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (UBATÉ)	ICCU-S-048-2026	Aprobado
NP 02	GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (RIONEGRO)	ICCU-S-048-2026	Aprobado
NP 03	GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (ALMEIDAS)	ICCU-S-048-2026	Aprobado
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (UBATÉ)	ICCU-S-048-2026	Observado
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (RIONEGRO)	ICCU-S-048-2026	Observado
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (ALMEIDAS)	ICCU-S-048-2026	Observado

3.2.4 ETAPA DE EJECUCIÓN

En el periodo se realizaron bajos avances en la ejecución por parte del contratista por lo que se ha instado al contratista a la ejecución de actividades y al cumplimiento de los compromisos con la comunidad.

Consecutivo	Asunto	Fecha envío
ICCU-S-146-2026	Solicitud planeación de trabajos en campo	1/4/2026
ICCU-S-147-2026	Respuesta comunicado con radicado YVY-102-2026 – Observaciones a los presupuestos radicados para el tramo del municipio de La Palma – Provincia de Rionegro	6/4/2026
ICCU-S-148-2026	Respuesta a oficio YVY-096-26 – Remisión orden de operación 21. Anticipo - Materiales	6/4/2026
ICCU-S-150-2026	SEGUNDO APREMIO por pendientes ambientales por Provincia – nuestros comunicados ICCU-S-270-2025, ICCU-S-275-2025, ICCU-S-316-2025 ICCU-S-389-2025, ICCU-S-025-2026, ICCU-S-110-2026 – ICCU-S-131-2026.	7/4/2026
ICCU-S-151-2026	Respuesta a oficio YVY-097-26 – Remisión orden de operación 22. Suministro de Cemento	8/4/2026
ICCU-S-154-2026	Respuesta a comunicados YVY-115-2026 y YVY-116-2026 de 6 de abril de 2026	9/4/2026
ICCU-S-155-2026	Observaciones al informe mensual correspondiente al mes de febrero del contrato de obra.	9/4/2026
ICCU-S-156-2026	Observaciones al informe mensual correspondiente al mes de enero del contrato de obra.	9/4/2026
ICCU-S-157-2026	Respuesta a su comunicado YVY-108-2026 Informe visita de campo especialista de Hidráulica tramo Chocontá.	9/4/2026
ICCU-S-158-2026	Atención solicitud ICCU – Registro fotográfico	10/4/2026

ICCU-S-159-2026	Revisión, VoBo PMT Topaipi y Yacopí, Sujeto a aval Alcaldía y comunidad	10/4/2026
ICCU-S-160-2026	Respuesta a su comunicado YVY-220-2026 disposición de acero de refuerzo cajas de encole Sesquilé. Observaciones generales construcción de alcantarillas Almeidas.	13/04/2026
ICCU-S-161-2026	Respuesta a su comunicación YVY-095-2026 - Concepto ambiental de la ubicación de la alcantarilla No 5, en el tramo del Municipio de Chocontá. Su comunicado YVY-095-2026	13/04/2026
ICCU-S-162-2026	Observaciones a la ejecución de alcantarillas – Tramo Susa (Provincia de Ubaté) – Reiteración solicitud Plan de Calidad ajustado	13/04/2026
ICCU-S-163-2026	Respuesta al oficio YVY-112-2026 – Versión preliminar Acta No. 1 parcial de obra y memoria de cantidades	13/04/2026
ICCU-S-164-2026	PAGA de la provincia de Ubaté Versión 6, su comunicado YVY-117-2026	16/04/2026
ICCU-S-166-2026	Requerimiento por suspensión de actividades en campo, bajo rendimiento y limitaciones constructivas en obra.	16/04/2026
ICCU-S-167-2026	Reiteración solicitud programa de obra detallado - actualizado	16/04/2026
ICCU-S-168-2026	Alcance a comunicado ICCU-S-163-2026, observaciones a YVY-112-2026 Versión preliminar Acta No. 1 parcial de obra y memoria de cantidades	17/04/2026
ICCU-S-169-2026	Respuesta a YVY-089-26 - Aprobación Informe Fase I.	17/04/2026
ICCU-S-171-2026	Alcance a comunicación ICCU-S-167-2026 - Requerimiento incremento de recursos y turnos de trabajo	20/04/2026
ICCU-S-172-2026	Reiteración comunicación ICCU-S-158-2026 - solicitud de registro fotográfico	21/04/2026
ICCU-S-176-2026	Su comunicado YVY-224-2026 Remisión informe mensual de marzo 2026.	22/04/2026
ICCU-S-178-2026	Respuesta comunicado YVY-231-26 O. OP 23 - OPTIMASOIL	23/04/2026
ICCU-S-179-2026	Respuesta a oficio YVY-240-26 – Remisión orden de operación 29.	23/04/2026
ICCU-S-180-2026	SEGUNDO apremio por la No corrección de observaciones Topografía Provincia Almeidas, Observaciones actividades de Topografía y reiteración solicitud de personal en campo	24/04/2026
ICCU-S-181-2026	APREMIO - Incumplimiento en la ejecución del componente social y requerimiento de acciones inmediatas en la Provincia de Ubaté.	24/04/2026
ICCU-S-182-2026	Requerimiento URGENTE en materia SST en los diferentes frentes de obra Municipio de La Palma	24/04/2026
ICCU-S-184-2026	Respuesta a oficio YVY-233-26 – Remisión orden de operación 24, 25, 26, y 28 de Anticipo	24/04/2026
ICCU-S-185-2026	Solicitud de emisión de respuestas oficiales – Instalación de reductores de velocidad – Municipio de Ubaté	27/04/2026
ICCU-S-186-2026	Apremio por no entrega de Registro fotográfico - Comunicaciones ICCU-S-158-2026 e ICCU-S-176-2026 - Solicitud de registro fotográfico	27/04/2026
ICCU-S-187-2026	Solicitud de programación y socialización PMT – Inicio de actividades de Mantenimiento de la rasante en el municipio de Ubaté.	28/04/2026
ICCU-S-188-2026	Su comunicado YVY-239-2026: informe de visita ambiental tramo de construcción de alcantarillas, municipio de Yacopí	28/04/2026
ICCU-S-189-2026	Respuesta a su comunicación YVY-242-26 - respuesta al comunicado ICCU-S-179-2026 - Orden de operación 29.	28/04/2026
ICCU-S-190-2026	Respuesta a su comunicación YVY-286-25 – Remisión PMT Villa Gómez	28/04/2026
ICCU-S-191-2026	Respuesta a oficio YVY-231-26 – Remisión orden de operación 23	29/04/2026
ICCU-S-192-2026	Respuesta a oficio YVY-231-26 – Remisión orden de operación 23 V2	29/04/2026
ICCU-S-193-2026	Reiteración a nuestras comunicaciones ICCU-S-261-2025 y ICCU-S-032-2026 - Rendimientos financieros anticipo CONTRATO DE OBRA ICCU-139-2025	29/04/2026
ICCU-S-197-2026	Reiteración de incumplimientos en el componente social en la provincia de Ubaté. Reiteración de Silencio Administrativo: El contratista ha hecho caso omiso e incurre en silencio frente a los llamados de atención de la interventoría, destacando el Apremio por Incumplimiento Social del 24 de abril (ICCU-S-181-2026) y la reiteración del 30 de abril (ICCU-S-197-2026)	30/04/2026

Entre los compromisos del contratista se encuentran entre otros:

Compromisos	Estado

Cronograma - Remisión de cronograma de actividades por tramo Disponibilidad de químicos - en el cronograma a presentar el contratista debe tener en cuenta esto.	El contratista se compromete a entregarlo ajustado el 4 de mayo, teniendo en cuenta los tiempos de entrega de los productos químicos por parte de los proveedores
Presupuesto - discriminado por tramo	El contratista entregó presupuestos relacionados con Yacopí, Manta y Ubaté, los cuales están en revisión por parte de interventoría. Está pendiente la entrega del correspondiente a Chocontá por parte del contratista.
Doble riego - propuesta recubrimientos a ejecutar en tramos con mejoramiento	El compromiso ha pasado del viernes 27 marzo 2026, al 21 abril, y a la fecha, el contratista se compromete para el 5 de mayo
Entrega de priorización obras de estabilización: El contratista informa que se reunirá con sus especialistas para indicar fecha	Se coordina visita a campo entre especialistas del contratista y sus pares de la interventoría para el tramo de Yacopi (13 de mayo de 2026)
No previstos	El contratista ha hecho entrega de la subsanación de las observaciones al APU de tubería PVC de 36", y los APU relacionados con la construcción de placa huellas, los cuales están en revisión de interventoría (rta 5 de mayo)
Remisión certificados fuentes	El contratista se compromete a hacer entrega de estos para el 7 de mayo de 2026
Vallas	Ríonegro: 8 de mayo – Chocontá: Se instaló estructura provisional Sesquilé: 3 - 4 de mayo Manta: 4 de mayo Ubaté: 5 – 6 de mayo
Ensayos de laboratorio	Chocontá: entrega de resultados 4 de mayo En revisión por parte de la interventoría ensayos remitidos por el contratista

3.2.4.1 Provincia Almeidas

- MUNICIPIO DE MANTA:

En las dos primeras semanas del periodo del presente informe no se registraron avances en el proceso de estabilización del tramo, debido a la no disponibilidad de maquinaria y de personal por parte del contratista, lo cual impidió la ejecución de las actividades constructivas programadas. Específicamente, la recicladora y la motoniveladora continuaron fuera de operación por fallas mecánicas o por falta de pagos a proveedores, situación que ha limitado la continuidad de las actividades de estabilización en el tramo.

En el transcurso de la tercera semana se reanudarón las labores de conformación de rasante y cunetas, retiro manual de material vegetal en algunos sectores y disposición de cemento en el tramo previsto para futuras actividades de estabilización. Posteriormente se ejecutó la estabilización del subtramo 9, comprendido entre las abscisas K1+193 y K1+393, mediante la aplicación de químico estabilizante, realizándose ensayos de humedad y toma de briquetas para control de laboratorio, así como ensayos de densidad y humedad en subtramos previamente estabilizados.

Durante las actividades de seguimiento, se evidenció que la recicladora continúa presentando fallas mecánicas, lo cual ha limitado la continuidad de las labores de estabilización. Adicionalmente, se observó que parte del proceso constructivo se ejecutó sin control topográfico ni verificación de niveles mediante la utilización de puntos de control topografico. También se ha venido evidenció que algunos trabajadores no contaban con la dotación completa de Elementos de Protección Personal (EPP), ante lo cual el contratista carece de profesional SST en la obra y no ha dado solución a los requerimientos hechos por la interevntoría. Finalmente, durante recorridos de verificación en alcantarillas previamente construidas se identificó que en algunas estructuras los rellenos presentan asentamientos debido a una compactación insuficiente, por lo cual se indicó al contratista realizar los rellenos y compactaciones correspondientes para su corrección.

- MUNICIPIO DE CHOCONTA

En el periodo del presente informe, se evidenció el inicio de las labores de escarificación y adecuación del terreno, así como la ejecución del proceso de estabilización del material mediante la aplicación de cemento + ionicsoil en el tramo piloto proyectado, con una longitud aproximada de 200 metros lineales. Las actividades incluyeron el extendido de cemento a lo largo del tramo, la escarificación y mezclado del material con recicladora y la posterior adición de la mezcla de agua con estabilizante mediante la irrigación con carrotanque, así como la toma de humedades del material antes y durante el proceso para garantizar la humedad de compactación. Durante la jornada también se registraron lluvias y algunas situaciones operativas asociadas a daños temporales en equipos utilizados en la intervención, así como la presencia de sobre - tamaños en algunos sectores del tramo. Las actividades mencionadas se suspendieron debido a que el vibrocompactador continúa fuera de operación por fallas mecánicas.

Así mismo, se realizaron tomas de muestras para la ejecución de briquetas del material del tramo donde se realizó el tramo piloto.

En el periodo no se registraron actividades de avance en el tramo. El día miércoles 22 de abril se realizó un recorrido de seguimiento en el municipio de Chocontá, en compañía de la residente de obra, con el fin de verificar en campo las cantidades de obra ejecutadas correspondientes a las alcantarillas construidas dentro del tramo intervenido. Durante el recorrido se efectuó la revisión de las estructuras construidas, reiterando que algunas alcantarillas presentan observaciones previamente registradas. Particularmente, en las alcantarillas No. 2, 3 y 4, donde se realizaron empalmes de tubería, se identificó que dichos empalmes no cuentan aún con el sellado correspondiente, por lo cual se deja como observación que el contratista deberá realizar el sellado adecuado, garantizando

la correcta unión de las tuberías y evitando posibles filtraciones o ingreso de material. Adicionalmente, en la alcantarilla No. 2, específicamente en la zona de descole, se evidenció que las aletas construidas presentan una longitud mayor que la placa base, quedando el extremo final de estas sin soporte estructural. En consecuencia, se deja como observación que el contratista deberá evaluar y proponer la alternativa técnica correspondiente para corregir esta condición y garantizar el adecuado soporte y estabilidad de la estructura. La jornada contó con la participación del residente de obra y el inspector de interventoría, bajo condiciones climáticas soleadas.

- MUNICIPIO DE SESQUILE

Durante la semana se realizaron actividades de supervisión y seguimiento a las obras de alcantarillas que se construyen en el tramo. Se evidenció la ejecución de labores correspondientes a la alcantarilla No. 6, en la cual se realizaron actividades de excavación, instalación de tubería, relleno y compactación. No se adelantaron más actividades constructivas en el tramo debido a inconvenientes presentados por el contratista con el suministro de agregados requeridos para la ejecución de las demás estructuras. Como observación general, se evidenció nuevamente la ausencia de personal de topografía durante la ejecución de las actividades, lo cual impidió realizar en campo la verificación de aspectos técnicos como niveles, pendientes y profundidades de excavación requeridos para la correcta instalación de la tubería; por lo tanto, la aceptación de estas actividades quedará sujeta a la posterior verificación y aprobación de niveles y pendientes por parte del equipo de topografía. Se evidenció la ejecución del solado del encole de la alcantarilla No. 1, así como la fundida de la placa base de esta misma estructura. De igual manera, se adelantó la excavación para la construcción de la alcantarilla No. 4. Inicialmente no fue posible realizar la instalación de la tubería debido a la falta del material requerido para el atraque; sin embargo, posteriormente se realizó la instalación de la tubería junto con actividades de relleno y compactación, al respecto es importante mencionar que el día del inicio no se evidenció presencia de ingeniero encargado por parte del contratista por lo que se hizo el llamado de atención al contratista para que cuente con la planeación necesaria para cada actividad y con el acompañamiento del personal a cargo de la actividad; así mismo se evidenció que la vía quedó cerrada para el tránsito vehicular el día viernes 10 de abril 2026, actividad no prevista, no Informada a la comunidad y usuarios de la vía. Finalmente se fundió la estructura de las alcantarillas 1 y 4 completando el encole y descole de las mismas

Se efectuó la revisión técnica relacionada con la reubicación de la alcantarilla No. 3 y la verificación de pendientes de las tuberías instaladas en otras estructuras del tramo. Como observaciones generales, se evidenciaron algunas inconsistencias en procesos

constructivos por lo cual fueron reportados en campo para su ajuste por parte del contratista, por lo que el contratista presentó propuesta de ajuste, al respecto se respondió por parte de Interventoría informando que los ajustes y propuestas deben venir avalados por el especialista estructural.

Se evidenció en el descole de la alcantarilla No. 1 la exposición parcial del acero de refuerzo y la presencia de vacíos en el concreto tras el retiro de la formaleta, situación que sugiere deficiencias en el proceso de vibrado del concreto y que deberá ser revisada por el contratista para definir las acciones correctivas correspondientes. Adicionalmente, se observó que durante algunas jornadas no se contó con la presencia del residente de obra y que parte del personal no disponía de la dotación completa de Elementos de Protección Personal.

3.2.4.2 Provincia Ubaté

- MUNICIPIO DE SUSA

Durante el presente periodo se realizaron actividades de supervisión y seguimiento a las obras de construcción de alcantarillas en el tramo. Se dio continuidad a las labores de corte, figuración y armado de las parrillas de acero del descole de la alcantarilla No. 5, para posteriormente realizar la fundición del muro y aletas de dicha estructura. Así mismo, se ejecutaron actividades de relleno y compactación en las alcantarillas No. 9, No. 10 y No. 5. Con estas actividades se dieron por finalizadas las labores de construcción de las diez (10) alcantarillas proyectadas en el tramo, quedando pendiente las labores de limpieza, conformación, corrección del alineamiento del guardarruedas de la alcantarilla No 6.

Se identificaron algunas situaciones asociadas al estado de las estructuras hidráulicas, entre ellas la presencia de material sobrante de excavación en las diferentes alcantarillas, falta de conformación de las cunetas para conectar el drenaje a las cajas de encole, lo cual está generando aposamientos sobre la vía, y ausencia de limpieza en los descoles de las alcantarillas No. 6, No. 7 y No. 8. Así mismo, se evidenciaron observaciones en el método constructivo del encole de la alcantarilla No. 2 y diferencias de nivel entre la vía y la entrada del encole de la alcantarilla No. 3. Se trató el tema de la alcantarilla 6 en el comité de seguimiento del 10 de abril, toda vez que el guardarruedas esta desalineado con el eje y borde de vía y uno de los extremos se encuentra salido, constituyendo un peligro latente para los diferentes usuarios de la vía. Por lo anterior se acordó con el contratista el ajuste del guardarruedas

- MUNICIPIO DE TAUSA

No se registraron actividades en el municipio.

- MUNICIPIO DE UBATE

Durante el presente periodo se realizaron actividades de supervisión y seguimiento a las obras de construcción de alcantarillas en el tramo. Se evidenciaron avances en la alcantarilla No. 2, donde inicialmente se finalizaron las labores de corte, figuración y armado del acero de refuerzo para las estructuras de encole y descole. Posteriormente, se realizó la fundición de la placa, muro y aletas del encole de la alcantarilla, así como la fundición de la placa, muro y aletas correspondientes al descole de la misma estructura, quedando faltante solo actividades de relleno a los laterales de la estructura. Se dio continuidad a las labores de corte, figuración y armado de las parrillas de acero del descole de la alcantarilla No. 5, para posteriormente realizar la fundición del muro y aletas de dicha estructura. Así mismo, se ejecutaron actividades de relleno y compactación en las alcantarillas No. 9, No. 10 y No. 5. Con estas actividades se dieron por finalizadas las labores de construcción de las diez (10) alcantarillas proyectadas en el tramo. Se evidenciaron avances en la alcantarilla No. 2, donde inicialmente se finalizaron las labores de corte, figuración y armado del acero de refuerzo para las estructuras de encole y descole. Posteriormente, se realizó la fundición de la placa, muro y aletas del encole de la alcantarilla, así como la fundición de la placa, muro y aletas correspondientes al descole de la misma estructura, quedando faltante solo actividades de relleno a los laterales de la estructura. Se iniciaron actividades de figuración y amarre de acero para dentellones y parrillas, excavaciones manuales para la construcción de las placas de encole y descole de la alcantarilla No. 1, adecuación del suelo en el área de la placa y acopio de materiales para la construcción de las aletas. De igual manera, se realizaron actividades de limpieza y adecuación del área de trabajo, armado y fundición de las placas de encole y descole de la alcantarilla No. 1, así como el armado, encofrado y fundición de las aletas del encole y descole de esta misma estructura. Durante el desarrollo de las actividades para la construcción de las estructuras de encole y descole se presentaron incrementos en el flujo del caudal, por lo tanto, en el nivel del agua que circula por el canal que alimenta la alcantarilla No. 1, lo cual ocasionó inundaciones temporales en el área de trabajo e impidió la continuidad de algunas labores constructivas. Sin embargo, esto se superó y se culminaron actividades.

- MUNICIPIO DE SIMIJACA

No se registraron actividades en el periodo.

3.2.4.3 Provincia Rionegro

- MUNICIPIO DE LA PALMA

Se dio inicio a las actividades en la alcantarilla ubicada en el cruce No. 4, realizando la instalación de parrillas de acero, el encofrado y la fundida de concreto de la estructura de encole de dicha alcantarilla; sin embargo, se evidenció que el contratista no realizó la toma de muestras de concreto ni el ensayo de asentamiento (slump), pese a haber sido solicitado por la interventoría. En cuanto al desencofrado, la Interventoría recomendó realizar esta actividad a partir del tercer día, posterior a la fundida para garantizar el adecuado fraguado del concreto. Posteriormente se iniciaron labores de perfilamiento para la construcción de la alcantarilla en el cruce No. 5; sin embargo, la presencia de material rocoso dificultó el desarrollo de las actividades, por lo cual la cuadrilla se trasladó al cruce No. 6 para iniciar trabajos de perfilamiento. En este sentido, la interventoría recomendó al contratista disponer de equipos adecuados, para continuar con las actividades en sectores con presencia de roca. Finalmente, durante los últimos días de la semana no se registraron actividades en obra por parte del contratista, solo se registraron actividades hasta el miércoles 8 abril 2026.

En la semana del 20 al 24 de abril, se dió continuidad a las actividades de ejecución de obra en las alcantarillas referenciadas como cruce 5 y cruce 6. El día 21 de abril de 2026 se realizó instalación de señalización (cinta de peligro) en puntos de construcción de alcantarillas, sin evidencia de avance de ejecución de obra. El día 22 de abril de 2026 se evidenció continuación de actividades de ejecución de obra en los cruces 3, 5 y 6, realizando perfilamiento y adecuación en puntos de estructuras de encoles y descoles para posterior fundida de solado e instalación de canastas de acero. El día 23 de abril de 2026, en el cruce 5 se finalizó la adecuación del descole y se realizó la instalación de la canasta de acero correspondiente a la estructura de salida (descole) de la alcantarilla; de manera paralela, en el cruce 6 se continuó con la adecuación y perfilamiento de las zonas de encole y descole, evidenciándose la prolongación del tubo en el sector de encole con el fin de garantizar el ancho adecuado de la vía y mejorar las condiciones de seguridad vial, considerando que la estructura se localiza en un tramo en curva. Durante la última semana del mes de abril se presentó saturación en subtramos de la vía debido a lluvias intensas en la tarde y noche del día anterior en el tramo La Cañada – Zumbe y limitó el ingreso de vehículos y el desarrollo normal de algunas actividades de obra al inicio del periodo. No obstante, durante la semana se realizó recorrido conjunto entre el

contratista y la interventoría para la verificación de cantidades de obra correspondientes a la construcción de alcantarillas. Posteriormente se dio continuidad a las actividades constructivas en las alcantarillas identificadas como cruces 3, 6 y ALC-11, ejecutándose labores de limpieza, armado de acero, encofrado y fundida de concreto en diferentes elementos de las estructuras.

En el periodo del presente informe, se evidenciaron algunas deficiencias en el proceso constructivo, particularmente en la ejecución de la base de la estructura de descole en el cruce 3, donde no se realizó el control adecuado del flujo de agua previo a la fundida del concreto, lo que generó una terminación deficiente del material. Así mismo, se registró un valor de asentamiento (slump) de 14 cm, superior al rango establecido en el diseño de mezcla. Adicionalmente, se evidenció en algunos momentos la ausencia de personal técnico responsable en el frente de obra, situación frente a la cual la interventoría realizó el respectivo llamado de atención en campo. Finalmente, hacia el cierre del mes no se evidenció continuidad de actividades constructivas, persistiendo además la presencia de subtramos en mal estado en la vía y la ausencia de labores recientes de mantenimiento vial por parte de la maquinaria del ICCU.

- YACOPÍ, VILLAGOMEZ Y TOPAIPI

No se registraron actividades en el periodo, pese a que el contratista se comprometió a dar inicio a la actividad de construcción de alcantarillas el pasado 6 de abril de 2026

Durante la semana se realizó la socialización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con la comunidad de la vereda Puray, con participación de personal del contratista y de la interventoría. Adicionalmente, se llevó a cabo el levantamiento de acta de entorno del predio donde se proyecta la instalación de la valla informativa correspondiente al tramo.

3.2.5 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE ALCANTARILLAS

En el periodo, no se realizaron mantenimiento ni limpieza de alcantarillas por parte del contratista.

Tabla 3. Ejecución de alcantarillas

Provincia	Mejoramiento vial	Mantenimiento de alcantarillas
Rio Negro	Topaipí	
	Villagómez	7
	La Palma	16
	Yacopí	
Almeidas	Chocontá	19

	Sesquilé	32
	Manta	43
Ubaté	Ubaté	10
	Simijaca	
	Susa	31
	Tausa	4
*Fuente: Interventoría		162

A la fecha del presente informe, el contratista no ha reanudado las labores de limpieza de alcantarillas, ni ha subsanado las observaciones, incumpliendo los compromisos pactados en los diferentes comités de obra.

Para el proceso de priorización además de la necesidad técnica se ha solicitado tener en cuenta la socialización con alcaldías y comunidad de las obras a intervenir.

Antes del inicio de ejecución de mantenimiento y construcción de alcantarillas, se ha solicitado al contratista socializar el PMT ante la Alcaldía Municipal y la comunidad por posibles cierres de carril o desvíos que puedan presentarse.

Priorización de alcantarillas presentadas por el contratista:

Tabla 4. Cantidades de alcantarillas priorizadas por el contratista

Provincia	**Municipio**	**Proyectadas**	**Obra Mant. Limpieza**
Almeidas	Chocontá	5	15
	Manta	4	47
	Sesquilé	7	82
Rio Negro	La Palma	13	105
	Topaipí	11	38
	Villagómez	2	9
	Yacopí	19	86
Ubaté	Simijaca	0	0
	Susa	10	35
	Tausa	0	23
	Ubaté	2	10
*Fuente: Interventoría		73	450

Cantidades contractuales:

Tabla 5. Resumen – cantidades contractuales de alcantarillas

	COMPARATIVO POR PROVINCIA					
	UBATÉ		ALMEIDAS		RIONEGRO	
TIPO DE INTERVENCIÓN	CONTRACT.	INVENT.	CONTRACT.	INVENT.	CONTRACT.	INVENT.
Construir alcantarilla	12,00	7,00	16,00	28,00	45,00	78,00
Construir encole		5,00		2,00		10,00
Construir descole		1,00		6,00		33,00
Construir encole y descole		13,00		32,00		18,00
Construir Box culvert		1,00		1,00		0,00
Mantenimiento y limpieza	12,00	54,00	13,00	98,00	46,00	303,00
Total general	**24,00**	**81,00**	**29,00**	**167,00**	**91,00**	**442,00**

Tabla 6. Resumen – Ejecución de alcantarillas

PROVINCIA	Mejoramiento vial	Ejecución alcantarilla tubos	ESTADO ACTUAL
RIO NEGRO	Topaipí		
	Villagómez		
	La Palma	11	Alcantarilla 11 Fundido Descole Alcantarilla 14 Fundido el encole y descole Alcantarilla 54a Fundido el encole y descole Alcantarilla 54b Fundido el encole y descole Alcantarilla 78 Fundido el encole y descole Alcantarilla Cruce 4 Fundido el encole y descole Alc Cruce 5: Instalación de canasta de acero de estructura de descole y perfilamiento y adecuación de punto donde se construirá la estructura Alc Cruce 6: Fundida de descole. Alc Cruce 3: Fundida de placa de fondo y aletas de descole (deficiencias en la mezcla de concreto e instalación del mismo), placa de fondo y encofrado de encole. Alc cruce 91: Inicio de adecuación y perfilamiento para construcción de estructuras de encole y descole, fundida de solado y armado de acero de estructura de descole.
	Yacopí		Alcantarilla 143: Instalación de tubería Alcantarilla 120.1: Instalación de tubería (pendiente prolongación)
ALMEIDAS	Chocontá	5	Alcantarilla 1 Fundido el encole y descole. Alcantarilla 2 Fundido el encole y descole

			Alcantarilla 3 Fundido el encole y descole Alcantarilla 4 Fundido el encole y descole
	Sesquilé	7	Alcantarilla 1 Fundido encole y descole Alcantarilla 2 Instalada la tubería Alcantarilla 4 Fundido el encole y avances en armadura de acero del descole Alcantarilla 5 Instalada la tubería, fundido el solado del descole y avances en armadura de acero. Alcantarilla 6 Fundido encole y descole Alcantarilla 7 Instalada la tubería Alcantarilla 3 Instalada la tubería
	Manta	4	Se reporta que ya se completó la fundida de encoles y descoles de las 4 alcantarillas.
UBATE	Ubaté	2	Alcantarilla 1 Fundido el encole y el descole Alcantarilla 2 Fundido el encole y el descole
	Simijaca		
	Susa	10	Se reporta que ya se completó la fundida de todos los encoles y descoles de las 10 alcantarillas.
	Tausa		
		39	

*Fuente: Interventoría

3.2.6 TOPOGRAFÍA

En la primera semana del mes de abril, se instaló la tubería en la alcantarilla No. 6 de Sesquilé, para lo cual se verificaron niveles para que se garantice un desnivel en el drenaje adecuado, y se dio inicio a la estabilización en el tramo de Chocontá, en una longitud de 200 metros, con el acompañamiento de la topografía de la Interventoría, al control de niveles realizado por parte del Contratista con puntos de control cada 10 metros. El 9 de abril, en el tramo de Chocontá, la Interventoría hace la nivelación entre las abscisas K1+1320 y K1+1520 y hace levantamiento topográfico sobre esta misma zona con metodología RTK, y, en el tramo de Sesquilé la Interventoría hace nivelación con nivel de precisión para tomar niveles de tubos instalados en las alcantarillas N°2, N°5 y N° 6; teniendo como resultados, pendientes de 5.4% y 6% respectivamente, pendientes que se consideran altas para tubería de PVC, situación sobre la cual la interventoría solicito al contratista pronunciamiento del especialista hidraulico. El Contratista, hizo la instalación de tubo de 36” de Novafort en la Alcantarilla N° 4, colocando su cama de triturado, atraque y posterior relleno con granulares, con el acompañamiento de cadenero de la Interventoría

El 13 de abril la Interventoría remite al contratista observaciones reiterativas frente al incumplimiento respecto a la corrección de las observaciones en los planos topograficos de Chocontá, Manta y frente a la ausencia del profesional de topografía del Contratista en los diferentes frentes de obra. El 15 de abril se reinicia actividades de céreo en Chocontá, con el control topográfico para el tramo entre las abscisas K1+500 y K1+790, y el 16 de abril el Contratista hace entrega de planos de topografía a la Interventoría del sector de Chocontá, para el inicio de las verificaciones a los mismos

El 24 de abril, mediante comunicado ICCU-S-180-2026, la Interventoría emite al Contratista segundo apremio por no subsanar las observaciones en el componente topografía en la Provincia de Almeidas,relacionado con el reiterado incumplimiento con el ajuste . El 28 de abril, el Contratista hizo estabilización y céreo sin presencia de su profesional de topografía para el respectivo control de niveles, en tramo de Manta entre las abscisas K1+193 y K1+393.

3.3 Gestión ambiental

En el periodo en evaluación (abril de 2026), dentro de los frentes de obra correspondientes a la provincia de Almeidas, Rionegro y Ubaté, se informa que se encuentran en Etapa de ejecución, que incluyen intervención física de las vías priorizadas. A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas que pueden incidir con el componente ambiental.

3.3.1 PROVINCIA DE ALMEIDAS

Dentro de los frentes de obra correspondientes a la provincia de Almeidas, cuyos municipios a intervenir son Chocontá, Manta y Sesquilé, y los cuales se encuentran en la Fase III, que incluyen Intervención física de las vías seleccionadas, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas que pueden incidir con el componente ambiental.

En el municipio de Manta se ejecutaron actividades de estabilización química sobre 200 metros lineales de vía entre las abscisas K1+193 y K1+393, alcanzando un acumulado de 1001 metros lineales intervenidos y estabilizados. Asimismo, se realizaron rellenos laterales en las estructuras hidráulicas previamente construidas, garantizando la estabilidad de las obras y el adecuado manejo de escorrentías.

En Sesquilé se adelantaron labores de fundición de solados, encoles y descoles con concreto preparado in situ, correspondientes a dos alcantarillas y media, contando con acompañamiento de profesionales técnicos y especialistas, apoyo topográfico para el

replanteo y verificación de las estructuras. Paralelamente, se efectuaron inspecciones ambientales para verificar las condiciones del entorno y prevenir posibles afectaciones derivadas de la intervención.

Por su parte, en Chocontá se dio continuidad a las actividades de estabilización de vía en el tramo piloto.

De manera general, las actividades ejecutadas durante el periodo se desarrollaron implementando medidas de manejo ambiental asociadas al control de residuos sólidos, manejo de materiales de construcción, control de emisiones atmosfericas y protección de las obras hidráulicas, dando cumplimiento parcial a los lineamientos ambientales y técnicos aplicables al proyecto vial.

Finalmente, y con respecto al documento PAGA de la Provincia de Almeidas, se informa que ya se encuentra completamente aprobado por parte de la interventoría. El PAGA correspondiente a la Provincia de Almeidas lo aprobó la interventoría por medio del comunicado ICCU-S-410-2025, con fecha 29 de diciembre de 2025.

3.3.1.1 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA

Durante el periodo en evaluación (abril de 2026), dentro de los frentes de obra correspondientes a la provincia de Almeidas, cuyos municipios a intervenir son Chocontá, Manta y Sesquilé, y los cuales se encuentran en la Fase 3, que incluyen Intervención física de las vías seleccionadas, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas que pueden incidir con el componente ambiental.

En el municipio de Manta se ejecutaron actividades de estabilización química sobre 200 metros lineales de vía entre las abscisas K1+193 y K1+393, alcanzando un acumulado de 1001 metros lineales intervenidos y estabilizados. Asimismo, se realizaron rellenos laterales en las estructuras hidráulicas previamente construidas, garantizando la estabilidad de las obras y el adecuado manejo de escorrentías.

En Sesquilé se adelantaron labores de fundición de solados, encoles y descoles correspondientes a dos alcantarillas y media, contando con acompañamiento de profesionales técnicos y especialistas, apoyo topográfico para el replanteo y verificación de las estructuras. Paralelamente, se efectuaron inspecciones ambientales para verificar las condiciones del entorno y prevenir posibles afectaciones derivadas de la intervención.

Por su parte, en Chocontá se dio continuidad a las actividades de estabilización de vía en el tramo piloto.

De manera general, las actividades ejecutadas durante el periodo se desarrollaron implementando medidas de manejo ambiental asociadas al control de residuos sólidos, manejo de materiales de construcción, control de emisiones de polvo y protección de las obras hidráulicas, dando cumplimiento parcial a los lineamientos ambientales y técnicos aplicables al proyecto vial.

Finalmente, y con respecto al documento PAGA de la Provincia de Almeidas, se informa que ya se encuentra completamente aprobado por parte de la interventoría. El PAGA correspondiente a la Provincia de Almeidas lo aprobó la interventoría por medio del comunicado ICCU-S-410-2025, con fecha 29 de diciembre de 2025.

Tabla 7. Cronograma de actividades ambientales Provincia de Almeidas

Actividad Ambiental	Ene 26	Feb 26	Mar 26	Abr 26
Elaboración PAGA (agosto 2025)	SI	SI	SI	SI
SM-DAGA-1.1-01 Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social	SI	SI	SI	SI
SM-DAGA-1.2-02 Capacitación y concientización para el personal de obra.	SI	SI	SI	SI
SM-DAGA-1.3-03 Cumplimiento requerimientos legales.	SI	SI	SI	SI
SM-PAC-2.1-04 Manejo integral de materiales de construcción.	SI	SI	SI	SI
SM-PAC-2.3-06 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	SI	SI	SI	SI
SM-PAC-2.4-07 Seguimiento y control al manejo integral de materiales de construcción	SI	SI	SI	SI
SM-PAC-2.5-08 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	SI	SI	SI	SI
SM-PGH-3.1-10 Manejo de aguas superficiales	SI	SI	SI	SI
SM-PGH-3.2-11 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	SI	SI	SI	SI
SM-PBSE-4.5-16 Protección de la fauna en vías	SI	SI	SI	SI
SM-PMIT-5.1-18 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	SI	SI	SI	SI
SM-PMIT-5.3- 20 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	SI	SI	SI

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los avances y desviaciones frente al cronograma ambiental, se presenta la aprobación del documento PAGA versión 7 por parte de la Interventoría desde el mes de diciembre de 2025.

Es de resaltar que conforme al cronograma ambiental presentado en la Tabla No 1, se presenta incumplimiento conforme a la planificación de entrega del PAGA Almeidas, el cual debía contar con la respectiva aprobación con fecha máxima de 31 de agosto de 2025. Sin embargo, se resalta que la interventoría por medio de oficio ICCU-S-410-2025 radicado desde el mes de diciembre de 2025, aprobó el Plan de Adaptación de la Guia Ambiental de la Provincia de Almeidas.

- M-DAGA-1.1-01 Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social:

Durante el mes de abril de 2026 se contó con personal ambiental por parte del Contratista e Interventoría. Se da cumplimiento al cronograma y compromisos contractuales.

Tabla 8. Personal del Contratista Provincia de Almeidas

Cargo	Nombre	Correo
Residente Ambiental	María Fernanda Armesto	ing.mariafarmesto@gmail.com
Residente Social	Nancy Riascos	Nancy.riascosocial1@gmail.com

Fuente Autor.

Tabla 9. Personal de la interventoría

Cargo	Nombre	Correo
Residentes Ambientales	Carlos Arturo Chaparro S Modesto Mauricio Joya Veloza	carlos.chaparro@tpfingenieria.com mauricio.joya@tpfingenieria.com
Residente Social	Diana Chavarrio	Social1almeidas@gmail.com

Fuente Autor.

3.3.1.2 Conclusiones Ambientales

En términos generales, las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado se llevaron a cabo bajo los lineamientos técnicos y ambientales establecidos para el proyecto, garantizando el seguimiento a las medidas de manejo ambiental y el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aplicables. Sin embargo, se resalta la falta de entrega de documentos certificaciones de consumo de recursos naturales por parte del contratista.

En cumplimiento al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), se verifica aprobación del documento por parte de la interventoría.

Durante el presente periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se evidenció avance en la ejecución de las actividades constructivas del proyecto de mejoramiento vial, en concordancia con la programación establecida para la fase de intervención física de las vías.

Teniendo en cuenta que el Contratista NO ha cumplido varios compromisos dentro de los cuales se resalta, entrega de certificaciones de material suministrado por las diferentes canteras, permisos ambientales para nivelaciones topográficas por parte de alcaldías, compra de agua en bloque, certificaciones de disposición final de material peligroso, la Interventoría elabora comunicado de informe técnico que sustenta el presunto incumplimiento ambiental por parte del Contratista Consorcio YVY.

3.3.2 PROVINCIA DE RIONEGRO

Durante el periodo en evaluación (abril de 2026), dentro de los frentes de obra correspondientes a la provincia de Rionegro cuyos municipios a intervenir son La Palma, Villa Gómez, Yacopi y Topaipi, y los cuales se encuentran en la Fase 3, que incluyen Intervención física de las vías seleccionadas, a continuación se relacionan las actividades desarrolladas que incidieron con el componente ambiental.

Durante el mes de abril del año en curso, se desarrollaron actividades asociadas al suministro, transporte y acopio de materiales requeridos para la ejecución de obras hidráulicas, incluyendo tubería, acero de refuerzo, dispositivos de señalización y agregados pétreos, garantizando la disponibilidad de insumos necesarios para el avance de las actividades constructivas programadas.

Así mismo, se realizó el traslado y disposición en obra de equipos menores, entre ellos mezcladora para concreto y compactador tipo canguro, además de herramienta menor utilizada para las labores de excavación, instalación de tubería y adecuación de estructuras hidráulicas. En este contexto, se ejecutaron actividades de excavación e instalación de tubería en la alcantarilla No. 14, localizada en la abscisa final del tramo objeto de intervención.

En el municipio de La Palma se avanzó en la intervención de la alcantarilla correspondiente al cruce No. 4 y se efectuó el traslado y acopio de materiales destinados a la construcción de las demás alcantarillas proyectadas dentro del corredor vial.

Desde el componente ambiental, las actividades desarrolladas se ejecutaron en algunas ocasiones implementando medidas de manejo orientadas al adecuado de almacenamiento y organización de materiales de construcción, control de residuos sólidos, manejo de áreas de acopio y orden y aseo en los frentes de trabajo, con el fin de prevenir afectaciones al suelo y a las áreas aledañas. Igualmente, se realizó seguimiento al manejo de materiales pétreos y al control de los procesos constructivos, en cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y los lineamientos ambientales aplicables a proyectos de infraestructura vial.

Con respecto al documento PAGA de la provincia de Rionegro, La interventoría lo aprobó con el comunicado ICCU-S-093-2026 del 23 de febrero de 2026. La correspondencia asociada al PAGA de la provincia de Rionegro ya no se adjunta en los informes, toda vez que desde el mes de febrero se aprobó dicho documento, sin embargo, para mejor entendimiento de los lectores se continúan dejando las tablas de trazabilidad del tema.

3.3.2.1 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA

Con respecto al documento PAGA de la provincia de Rionegro, La interventoría revisó durante el mes de febrero de 2026 el documento radicado con el comunicado YVY-033-2026 del 10 de febrero de 2026. Teniendo en cuenta que el Contratista resolvió todas las observaciones presentadas por la Interventoría, por medio del comunicado ICCU-S-093-2025 con fecha 23 de febrero de 2026 se aprueba por parte de la interventoría el documento PAGA de la provincia de Rionegro.

Tabla 10. Cronograma de actividades ambientales Provincia de Rionegro

Actividad Ambiental	Ene 26	Feb 26	Mar 26	Abr 26	May 26	Jun 26
Elaboración PAGA	X	X	X	X		
SM-DAGA-1.1-01 Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social	X	X	X	X		
SM-DAGA-1.2-02 Capacitación y concientización para el personal de obra.	X	X	X	X		
SM-DAGA-1.3-03 Cumplimiento requerimientos legales.	X	X	X	X		
SM-PAC-2.1-04 Manejo integral de materiales de construcción.	X	X	X	X		
SM-PAC-2.3-06 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	X	X	X	X		

SM-PAC-2.4-07 Seguimiento y control al manejo integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición.	X	X	X	X		
SM-PAC-2.5-08 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	X	X	X	X		
SM-PGH-3.1-10 Manejo de aguas superficiales	X	X	X	X		
SM-PGH-3.2-11 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	X	X	X	X		
SM-PBSE-4.5-16 Protección de la fauna en vías	X	X	X	X		
SM-PMIT-5.1-18 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	X	X	X	X		
SM-PMIT-5.3- 20 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	X	X	X	X		

Fuente: propia

En cuanto a los avances y desviaciones frente al cronograma ambiental, se evidencia que el Contratista realizo la entrega del documento PAGA durante el mes de febrero de 2026 y así mismo, teniendo en cuenta que cumplió con las observaciones realizadas por la interventoría, fue aprobado el documento por medio del comunicado ICCU-S-093-2025 con fecha 23 de febrero de 2026

Es de resaltar que conforme al cronograma ambiental presentado en la Tabla No 12, el PAGA debía contar con la respectiva aprobación con fecha máxima de 31 de agosto de 2025.

- M-DAGA-1.1-01 Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social:

Durante el mes de abril de 2026 el contratista presenta registro de charla de 5 minutos ambiental al personal en obra. No se verifica avance en el cronograma, relacionado con capacitación. La charla de 5 minutos dictada corresponde al tema "importancia del orden y limpieza en obra" (ver anexo 2). El Contratista no realiza evaluación de charla por lo cual no se pueden calcular los indicadores.

Tabla 11. Personal del contratista

Cargo	Nombre	Correo
Residente Ambiental	NO	No aplica
Residente Social	Carolina Escobar Coral	Social3rionegro@gmail.com

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Personal de la interventoría

Cargo	Nombre	Correo
Residentes Ambientales	Carlos Arturo Chaparro S Modesto Mauricio Joya Veloza	carlos.chaparro@tpfingenieria.com mauricio.joya@tpfingenieria.com
Residente Social	Tania Melissa Escobar Virguez	tania.escobar@tpfingenieria.com

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.2 Conclusiones Ambientales

Teniendo en cuenta que el contratista presenta informes de baja calidad en cuanto a información de actividades ambientales ejecutadas y respectivos soportes de cumplimiento, la interventoría solicita mediante comunicado la necesidad de reenviar los informes mensuales desde noviembre de 2025 en adelante, con el respectivo complemento.

Con corte al 30 de abril de 2026 el contratista cuenta con la aprobación del documento PAGA.

Para el control del manejo ambiental en obra, se está verificando la guía Ambiental modo carretero Invias 2022 y el PAGA aprobado por la Interventoría.

El porcentaje de cumplimento ambiental por parte del contratista es bajo, por esta razón la Interventoría radicó ante el ICCU el comunicado ICCU-S-195-2026 con fecha 29 de abril de 2026 y con asunto remisión informe técnico que sustenta el presunto incumplimiento ambiental.

3.3.3 PROVINCIA DE UBATÉ

Durante el mes de abril de 2026, el proyecto avanzó en la Fase 3: Intervención física de las vías seleccionadas, ejecutando actividades técnicas, constructivas, sociales y ambientales en los frentes de obra de Susa, Simijaca, Tausa y Ubaté, en la Provincia de Ubaté. El Contratista desarrollo las actividades que se relacionan a continuación durante el mes de abril de 2026.

Principales Actividades desarrolladas en la provincia de Ubaté en el mes de abril de 2026:

Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron labores de limpieza, relleno, nivelación y adecuación en la alcantarilla No. 1, así como actividades de figuración y armado de acero, fundición de placas, muros, aletas y cabezales de la estructura hidráulica. En Ubaté, durante el proceso constructivo fue necesario suspender

temporalmente algunas actividades debido al incremento del caudal del canal ocasionado por apertura de compuertas del acueducto, implementándose posteriormente medidas de control hidráulico mediante la instalación de tubería de 6" para canalización y manejo del flujo de agua.

Igualmente, se adelantaron actividades de retiro de formaleta, limpieza de canales, control de caudales, traslado de equipos y materiales entre municipios, así como verificación de medidas reales de las alcantarillas construidas con acompañamiento de la interventoría, permitiendo ajustar los diseños y despieces requeridos para las estructuras hidráulicas ejecutadas.

En el componente ambiental se desarrollaron actividades de limpieza de áreas de trabajo y manejo de residuos, incluyendo el retiro de residuos químicos y residuos peligrosos en el acopio del municipio de Simijaca, garantizando su adecuado manejo y disposición conforme a los lineamientos ambientales establecidos para el proyecto.

De manera paralela, se adelantaron gestiones administrativas y técnicas relacionadas con la verificación y certificación de las fuentes de materiales, especialmente de la cantera proveedora de agregados, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales, mineros y legales aplicables al suministro de materiales de construcción utilizados en obra.

Desde el componente ambiental, adicionalmente se implementaron medidas de manejo de residuos, control de materiales, orden y aseo, limpieza de drenajes, señalización preventiva y protección de las áreas intervenidas, orientadas a prevenir impactos negativos sobre el entorno.

3.3.3.1 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA

Con respecto al documento PAGA, durante el mes de abril de 2026 se adelantaron actividades relacionadas con la actualización del documento en su Versión número 6. El Contratista radicó el PAGA con las observaciones solicitadas por la Interventoría con el comunicado YVY-253-2026 con fecha 30 de abril de 2026, en dicho documento se atienden las observaciones solicitadas por la Interventoría con el comunicado ICCU-S-164-2026 y con asunto PAGA provincia de Ubaté.

Teniendo en cuenta que la fecha de radicación del PAGA de Ubaté por parte del Contratista fue el 30 de abril del 2026, la Interventoría durante el mes de abril de 2026 se encontró realizando la respectiva revisión. La Interventoría manifiesta que con el comunicado ICCU-S-164-2026 del 16 de abril de 2026 ya se había notificado que desde

el componente ambiental el documento NO presentaba más observaciones, sin embargo, desde el componente social aún se están realizando correcciones y actualizaciones.

Tabla 13. Cronograma de actividades ambientales

Actividad Ambiental	Ene 26	Feb 26	Mar 26	Abr 26	May 26
Elaboración PAGA	X	X	X	X	
SM-DAGA-1.1-01 Conformación del grupo de Gestión Ambiental y Social	X	X	X	X	
SM-DAGA-1.2-02 Capacitación y concientización para el personal de obra.	X	X	X	X	
SM-DAGA-1.3-03 Cumplimiento requerimientos legales.	X	X	X	X	
SM-PAC-2.1-04 Manejo integral de materiales de construcción.	X	X	X	X	
SM-PAC-2.3-06 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	X	X	X	X	
SM-PAC-2.4-07 Seguimiento y control al manejo integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición.	X	X	X	X	
SM-PAC-2.5-08 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales	X	X	X	X	
SM-PGH-3.1-10 Manejo de aguas superficiales	X	X	X	X	
SM-PGH-3.2-11 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	X	X	X	X	
SM-PBSE-4.5-16 Protección de la fauna en vías	X	X	X	X	
SM-PMIT-5.1-18 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio	X	X	X	X	
SM-PMIT-5.3- 20 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	X	X	X	X	

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los avances y desviaciones frente al cronograma ambiental, se evidencia que el Contratista realizó la entrega del documento PAGA V6 de la Provincia de Ubaté mediante comunicado YVY-253-26 con fecha 30 de abril de 2026, la interventoría componente social durante el mes de abril de 2026 se encontró realizando la respectiva revisión. Es de resaltar que el componente ambiental del PAGA de la Provincia de Ubaté se encuentra aprobado, sin embargo, el documento aún se encuentra en actualizaciones del componente social.

Conforme al cronograma ambiental presentado en la Tabla No 1, se presenta incumplimiento conforme a la planificación de entrega del PAGA Ubaté, el cual debía contar con la respectiva aprobación con fecha máxima de 31 de agosto de 2025.

- M-DAGA-1.1-01 Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social:

Durante el mes de abril de 2026 NO se contó con personal ambiental por parte del Contratista. NO se da cumplimiento al cronograma y compromisos contractuales.

Tabla 14. Personal del Contratista

Cargo	Nombre	Correo
Residente Ambiental	NO	NO
Residente Social	Rosalba Alba Moreno	socialubate@gmail.com

Fuente. Autor

Tabla 15. Personal de la interventoría

Cargo	Nombre	Correo
Residente Ambiental	Carlos Arturo Chaparro S Modesto Mauricio Joya Veloza	carlos.chaparro@tpfingenieria.com mauricio.joya@tpfingenieria.com
Residente Social	Yulieth Camelo Fiquitiva	yulieth.camelo@tpfingenieria.com

Fuente. Autor

3.3.3.2 Conclusiones Ambientales

Durante el mes de abril de 2026 se evidencia que en la provincia de Ubaté El porcentaje de cumplimento ambiental por parte del contratista es bajo, se envía comunicado de Informe Técnico que sustenta el Presunto Incumplimiento Ambiental por parte del Contratista al ICCU. Lo anterior toda vez que el contratista aun NO ha presentado documentación ambiental que sustenta su gestión en el proyecto.

Con corte al 30 de abril de 2026 el contratista NO cuenta con el documento PAGA Ubaté aprobado.

Para el control del manejo ambiental en obra, se está verificando la guía Ambiental modo carretero Invias 2022.

Teniendo en cuenta que el contratista presenta informes de baja calidad en cuanto a información de actividades ambientales ejecutadas y respectivos soportes de cumplimiento, la interventoría solicita mediante comunicado la necesidad de reenviar los

informes mensuales desde noviembre de 2025 en adelante, con el respectivo complemento.

3.4 Gestión social

El presente informe del mes de abril detalla las actividades, avances y resultados del Programa de Gestión Social del Proyecto INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Este documento es una herramienta clave para el seguimiento y control que garantiza la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades. En los siguientes programas, se presenta un resumen detallado de las acciones realizadas con la comunidad, el manejo de las PQRSD, y el avance en el Plan de Gestión social que contribuyen a mitigar los impactos generados durante la ejecución de las obras y que garanticen el bienestar y la calidad de vida de la comunidad que se encuentra en las áreas de influencia.

3.4.1 ALCANCE DEL INFORME

Para el presente informe se reportan las actividades del Programa de Gestión social, realizadas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2026, y se dan a conocer las acciones adelantadas por cada uno de los subprogramas establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

1. Atención a la Comunidad
2. Información y Divulgación
3. Cultura Vial y Participación Comunitaria
4. Contratación de Mano de Obra

3.4.2 GESTIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

El Consorcio Intervial ICCU-050 remite informes semanales al ICCU que dan cuenta de la gestión y trazabilidad realizada al contratista en el periodo de abril del presente año.

Tabla 16. Trámite de Informes Semanales de Interventoría

No. De Informe	Descripción	Soporte
53	09-04-26 Interventoría remite informe	ICCU-S-153-2026
54	21-04-26 Interventoría remite informe	ICCU-S-173-2026
55	24-04-26 Interventoría remite informe	ICCU-S-183-2026

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo 6. Informe social.

3.4.3 COMITÉS SOCIALES

La interventoría lideró los Comités Sociales de seguimiento, programados para realizar un adecuado seguimiento al contrato de obra. En el presente periodo se realizaron dos (2) Comités Sociales y tres (3) mesas de trabajo internas para interventoría.

Tabla 17. Comités Sociales

N.º	Comités Sociales y Técnico	Participantes	Registro Fotográfico
24	Comité Social 07-04-2026	Consorcio Intervial ICCU-050, Profesionales sociales, director y Profesionales Sociales y directores de Obra del Contratista, Provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro.	
25	Comité Social 21-04-2026	Consorcio Intervial ICCU-050, Profesionales sociales, director y Profesionales Sociales y directores de Obra del Contratista, Provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro.	

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

3.4.4 RESUMEN EJECUTIVO POR PROVINCIA

3.4.4.1 Provincia de Rionegro

- **Subprograma de Atención a la Comunidad**

El Contratista durante el mes de abril, contó con el canal de atención a la comunidad, como el correo electrónico y línea telefónica; adicional los días 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de abril de 2026, se realizó atención en el Punto del sistema de atención al usuario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., dando cumplimiento efectivo al Programa de Gestión Social en la Provincia de Rionegro.

Por otro lado, se continúa con el grupo de WhatsApp con los lideres comunitarios y presidentes de Junta de Acción Comunal del Municipio de La Palma del Tramo Zumbe a la Cañada, con el fin de brindar atención efectiva y atender inquietudes de manera inmediata. Lo cual ha sido satisfactorio para la comunidad. Es importante mencionar que en los Municipios de Yacopí y Villagómez se envía información a los presidentes de Junta de Acción comunal del área de influencia para ser compartida en los grupos de WhatsApp creados en cada vereda en aras de fortalecer los vínculos con la comunidad en general.

Tabla 18. Punto de atención a la comunidad

Provincia	Municipio	Dirección	Horario de atención	Canales de Comunicación
Rionegro	La Palma	Calle 3 # 3-75 Barrio Galerías	Martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.	socialconsorcioyvyrionegro@gmail.com Tel. 3219832560

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Anexo 1. Contrato oficina Atención a la comunidad Rionegro

- **Número de PQRS recibidas, estado y trámite:**

Para el mes de abril el Contratista YVY reporta que recibió una (1) PQRS para la Provincia de Rionegro.

El día 16 de abril de 2026 la señora Mariela Obando, manifiesta que el contratista YVY le debe el arriendo de 5 meses del depósito del cemento el cual fue tomado en arriendo el día 24 de noviembre en la vereda Minipi de Quijano por un valor de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000) mensuales. Se recibe mediante correo electrónico en el formato PQRS establecido.

Anexo 08. PQRS Señora Mariela Obando

Durante el mes de abril se adelantó seguimiento a las PQRs radicadas ante el contratista:Dar respuesta oficial a la PQRS, de la señora Nidia León de la Vereda Minipi de Quijano del Municipio de La Palma. Sin embargo, se realiza visita de seguimiento el día 22 de abril de 2026, para lo cual el contratista manifiesta a la señora Nidia León, que no se ha dado inicio a las acciones constructivas en el predio teniendo en cuenta que se encuentran a la espera de la maquina demoledora para mayor efectividad durante el proceso, de igual manera se comprometen a dar inicio el día 28 de abril de 2026. El día 28 de abril, se realiza desde el área social de interventoría, seguimiento al inicio de la intervención de acuerdo con el compromiso pactado con la señora Nidia León para el día 28 de abril, evidenciando incumplimiento en el compromiso establecido por

medio de acta de reunión No2 durante el acercamiento realizado el día 22 de abril de 2026, no se dio inició a la intervención programada.

- Dar respuesta a la PQRS de la señora Mariela Obando de la Vereda Minipi de Quijano del Municipio de La Palma.
- Realizar pago por los servicios prestados de rocería al señor Nestor Moreno del Municipio de La Palma, se realiza seguimiento evidenciando que se encuentra en proceso de verificación de documentos por parte de interventoría.

➢ **Subprograma de información y divulgación**

- **Reunión de Inicio**

No se tuvo contemplado para el presente informe, sin embargo, se realizará una vez se termine la etapa de caracterización, para socializar el inicio de obras a realizar.

- **Reunión de Avance**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que dicha reunión se realiza al cumplir el 50% de ejecución de la obra.

- **Reunión de Finalización**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que dicha reunión se realiza al cumplir el 100% de ejecución de la obra.

Volantes Informativos

En el mes de abril se recibió seis (6) volantes de parte del Consorcio YVY en la Provincia de Rionegro para revisión por parte de Interventoría, los cuales fueron revisados, ajustados y aprobados de acuerdo con los lineamientos establecidos

Tabla 19. Trazabilidad de volantes

Tipo de pieza	Asunto	Fecha de recibido	Fecha de Envió de Observaciones	Fecha de Envió de subsanado	Fecha de Aprobación
Volante	Se informa a la comunidad sobre la reactivación de actividades de obra con la construcción de alcantarillas en el Tramo del Municipio de La Palma.	07/04/2026	08/04/2026	09/04/2026	09/04/2026

Volante	Se informa a la comunidad sobre el inicio de actividades de obra por medio de la construcción de alcantarillas en el Tramo 3 del Municipio de Yacopí	10/04/2026	11/04/2026	12/04/2026	12/04/2026
Volante	Se invita a la comunidad a hacerse participe de reunión de socialización de cumplimiento de compromisos y avance de obra del Municipio de La Palma	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	17/04/2026
Volante	Se informa a la comunidad sobre inicio a las actividades de la intervención de obras, de construcción de alcantarillas en el Tramo del Municipio de Yacopí.	22/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026
Volante	Invitación a la comunidad a hacerse participe de la socialización del PMT para la construcción de alcantarillas en el Tramo del Municipio de Yacopí	22/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026
Volante	Se informa a la comunidad los motivos de retraso en el inicio de las obras el cual ha estado relacionado con el (PMT).	22/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026

Fuente: Consorcio Interval ICCU-050

Vallas Informativas

Durante el mes de abril, se realizó visita de seguimiento al punto de ubicación para la instalación de la valla del Municipio de Topaipí el día 08 de abril de 2026, queda aprobado entre presidente de ASOJUNTAS, Interventoría y Consorcio YVY que será instalada en la vía principal entrada vereda Suaráz, como punto estratégico, lo cual permite que la comunidad de la zona de influencia pueda tener acceso a la información del proyecto. De igual manera se hizo contacto con el propietario del predio con el fin de solicitar permiso y a la vez concertar fecha para el levantamiento de acta de entorno y acta de compromiso.

Por otra parte, y teniendo en cuenta el seguimiento realizado por el área social de interventoría se evidencia que el día 20 de abril la valla publicitaria se cayó, por lo tanto, se solicitó información al área social del contratista sobre el arreglo de la valla del Municipio de La Palma, quienes manifiestan que por motivos de invierno en la zona se cayó y requiere de reinstalación. Mencionan que teniendo en cuenta la caída, la valla

publicitaria se rompió y requiere de tiempo para el arreglo dado que se debe imprimir de nuevo.

El día 27 de abril de 2026 se realizó visita al predio el Silencio del Municipio de Yacopí, en la cual se realiza reunión con el propietario para generar acuerdos para el permiso de instalación de la valla, evidenciando que el predio se encuentra ubicado sobre el tramo 1 de intervención y es un lugar visible y estratégico para que la comunidad pueda visualizar de manera efectiva la información de esta.

Según verificación de seguimiento del área social de interventoría del 30 de abril de 2026, se observa que el contratista no ha re-instalado la valla publicitaria de la valla del Municipio de La Palma; el área social del contratista manifiesta que se encuentra en proceso de impresión.

Es importante mencionar que a la fecha no se cuenta con programación para la instalación de las vallas de los Municipios de Yacopí, Villagómez y Topaipí de la Provincia de Rionegro.

Folletos Informativos

En el mes de marzo no se recibierón folletos para revisión por parte del Contratista. Sin embargo, se estará atentos para realizar la revisión y aprobación pertinente en el momento que sean enviados .

Puntos Satélite de Información (PSI)

Durante el mes de abril el contratista realizó actualización de los cuatro (04) Puntos Satélite de Información PSI del Municipio de La Palma por medio de volante informativo con el fin de informar a la comunidad que desde el 16 de marzo de 2026 se dio continuidad a las actividades de construcción de alcantarillas en el tramo de la cañada a Zumbe y volante de invitación a la comunidad a hacerse participes en la reunión de socialización de cumplimiento de compromisos y avance de obra.

De igual manera, se realizó actualización de dos (2) Puntos Satélite de Información PSI, del Municipio Yacopí, contando con el acompañamiento del área social de interventoría. No se actualizo el PSI del Sector La Y, teniendo en cuenta que por motivos de invierno en la zona se presentó un derrumbe y no fue posible el acceso del vehículo.

Es importante mencionar que los PSI de los Municipios de Topaipí y Villagómez, no se actualizaron teniendo en cuenta que el área social no ha recibido información del área técnica frente al inicio de actividades de obra y/o actividades en los Municipios de Topaipí y Villagómez.

Tabla 20. Información Puntos Satélite de Información

No	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Municipio	Contacto	Registro Fotográfico y fecha de actualización
1	Tienda Doña Alcira	Vereda Buenavista	Villagómez	Ana Alcira Rodríguez 3124313454	Durante el mes de abril no se generó actualización teniendo en cuanta que no se ha dado inicio a las actividades de obra.
2	Tienda Casallas	Vereda Buenavista	Villagómez	Anderson Casallas 3229060475	Durante el mes de abril, no se generó actualización teniendo en cuanta que no se ha dado inicio a las actividades de obra.
3	Tienda María	Vereda El Hato	La Palma	Edith Tovar 3144381970	14-04-2026 y 17-04-2026 
4	Tienda Cucharito	Vereda Izama	La Palma	María Dela R ueda 3128903624	14-04-2026 y 17-04-2026 
5	Tienda de Carmenza	Vereda Minipí de Quijano	La Palma	Carmen Espinosa 3228645101	14-04-2026 y 17-04-2026 
6	Tienda - Casa Familiar	Vereda Zumbe	La Palma	Samuel Triana 3159376311	14-04-2026 y 17-04-2026 

No	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Municipio	Contacto	Registro Fotográfico y fecha de actualización
7	Tienda – Cancha de tejo	Vereda Suaráz	Topaipí	Nelcy Daniela Chacón 3225636060	Durante el mes de abril, no se generó actualización teniendo en cuanta que no se ha dado inicio a las actividades de obra.
8	Oficina Agencia de Buses	Inspección San Antonio de Aguilera	Topaipí	Nacianceno Moreno 3125560333	Durante el mes de abril, no se generó actualización teniendo en cuanta que no se ha dado inicio a las actividades de obra.
9	Tienda Doña Barbara	Vereda Mata de Ramo	Topaipí	Barbara Moreno 3146967452	Durante el mes de abril, no se generó actualización teniendo en cuanta que no se ha dado inicio a las actividades de obra.
10	Supermercado Terán	Inspección Terán	Yacopí	Isaac Álvarez 3136359588	Durante el mes de abril, no se generó actualización teniendo en cuanta que no se ha dado inicio a las actividades de obra.
11	Tienda - Gallera	Vereda La Tigra	Yacopí	Hernán Galindo 3152894890	Durante el mes de abril, no se generó actualización teniendo en cuanta que no se ha dado inicio a las actividades de obra.
12	Tienda – Casa Familiar, Sector la Y	Vereda Llano Mateo	Yacopí	Elvira Prieto 3114671165	Durante el mes de abril no se generó actualización teniendo en cuanta que no se ha dado inicio a las actividades de obra.

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo. 6 informe Social – Rionegro

- **Actas de vecindad y entorno**

Actas de vecindad

Durante el mes de abril, en la Provincia de Rionegro el Contratista YVY, no requiero acompañamiento de la interventoría para el levantamiento de actas de vecindad,

actividad que aun cuando no es obligatoria, el contratista de acuerdo con su criterio puede realizarlas y solicitar acompañamiento de la interventoría.

Actas de entorno

El día 30 de marzo de 2026, el consorcio YVY, por iniciativa propia realizo levantamiento de un (1) acta de entorno en el predio donde se realizó la instalación de la valla contando con el acompañamiento de la Propietaria del predio, la señora Mercedes Peña en aras de que el contratista entregue el lugar en las mismas o en mejores condiciones de cómo se encuentra.

- **Cultura vial y Participación Ciudadana**

- **Talleres Pedagógicos**

El día 08 de abril de 2025, el área social de interventoría realizó acompañamiento al taller de cultura vial con el tema de Inteligencia Vial en la Institución Educativa Minipi de Quijano del Municipio de la Palma con los estudiantes de grado 6° el cual tuvo como objetivo fortalecer la inteligencia vial en los estudiantes de grado sexto, promoviendo comportamientos responsables, seguros y respetuosos como peatones, pasajeros y futuros actores viales. Se conto con la participación activa de 20 estudiantes.

Conformación del Comité de Participación

El día 20 de abril de 2026, se conforma el comité de participación Ciudadana en el Municipio de La Palma con doce (12) personas de la comunidad del área de influencia, el cual se realizará cada dos (2) meses de acuerdo con los lineamientos PAGA V.6. de la

Provincia de Rionegro, con el fin de dar a conocer los avances del proyecto en las diferentes áreas. Se expresa a la comunidad que es un proceso de responsabilidad y compromiso por lo que se espera contar con la participación de manera continua para dar efectividad al proceso. El Comité queda conformado de la siguiente manera:

Sin embargo, a la fecha no se ha conformado los comités de Participación Ciudadana en los Municipios de Villagómez y Topaipí, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha dado inicio con las actividades de obra programados.

- **Encuestas para la Comunidad**

Durante el mes de abril, se recibió por parte del contratista el informe cuantitativo y cualitativo de la encuesta del Municipio de La Palma. Por otra parte, el contratista continuo con la aplicación de la encuesta a la comunidad en el Municipio de Yacopí, por medio de los presidentes de Junta de acción comunal, teniendo en cuenta los grupos de WhatsApp conformados en cada vereda de las áreas de influencia.

Por otra parte, se solicita continuar con la aplicación de la encuesta en el Municipio de Villagómez y dar inicio en el Municipio de Topaipí.

- **Contratación Mano de Obra No calificada - Rionegro**

Población Reintegrada.

Durante el mes de abril el contratista informa a interventoría que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, a la fecha no ha dado respuesta a su solicitud. Sin embargo, el contratista realizo la gestión pertinente y para el mes de mayo ya se contará con respuesta efectiva.

Mano de Obra No Calificada.

El Contratista reporto vinculación de once (11) personas durante el mes de abril para la Provincia de Rionegro.

Hojas de vida.

Durante el mes de abril el Contratista reportó que recibió doce (12) hojas de vida por parte de la ciudadanía del Municipio de Yacopí de la Provincia de Rionegro.

- Síntesis de las actividades sociales más relevantes del mes - Rionegro

Durante el mes de abril de 2026 el Consorcio Intervial ICCU-050 cumplió con la gestión de informes de interventoría mediante la remisión semanal de tres documentos técnicos al ICCU los cuales garantizan la trazabilidad de la supervisión al contratista. En cuanto al seguimiento social se lideraron dos comités sociales con participación de profesionales y directores de obra de las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro sumado a la realización de tres mesas de trabajo internas de carácter integral para coordinar las áreas, técnica, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

- **Hallazgos principales**

- Trazabilidad Documental: Se remitieron de manera efectiva tres (3) informes semanales (No. 53 al 55) al ICCU, garantizando el seguimiento técnico y administrativo del contrato.
- Liderazgo en Seguimiento: Se realizaron dos (2) Comités Sociales y tres (3) mesas de trabajo internas con participación de las áreas técnica, social, ambiental y SST, enfocadas en las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro.
- Canales y Puntos de Atención: Se garantizó la atención virtual (correo y teléfono) y presencial en el Punto SAU de La Palma (Calle 3 # 3-75, Barrio Galerías) los martes y jueves de abril, cumpliendo el horario establecido.
- Estrategia de Comunicación Rural: Se mantuvo activo el grupo de WhatsApp con líderes del tramo Zumbe - La Cañada (La Palma) con resultados satisfactorios. En Yacopí y Villagómez se articuló la difusión de información a través de los presidentes de las JAC y los grupos de WhatsApp de cada vereda.
- Trámite de PQRS: Se radicó una nueva PQRS (16 de abril) por parte de la señora Mariela Obando (Vereda Minipí de Quijano, La Palma) reclamando el pago de 5 meses de arriendo de un depósito de cemento por un valor mensual de $200.000.
- Reuniones Extraordinarias: Se ejecutaron tres (3) reuniones en abril: el 20 de abril en La Palma para revisar compromisos y avances de obra del tramo La Cañada - Zumbe; el 27 de abril en Yacopí (Vereda Puray) para socializar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para la construcción de alcantarillas en el Tramo 3; y el 29 de abril con la Alcaldía de La Palma, donde el ente territorial delegó las decisiones de estabilización vial directamente al ICCU y al contratante.

- Medios de Difusión (Volantes): Se revisaron, ajustaron y aprobaron cinco (5) volantes informativos sobre reactivación e inicio de obras de alcantarillas, socialización del PMT y motivos de retrasos en Yacopí y La Palma.
- Vallas Informativas: Se concertó la ubicación estratégica de la valla de Topaipí en la entrada de la Vereda Suaráz. No obstante, la valla de La Palma se cayó el 20 de abril por cuestiones climáticas (invierno) y sufrió daños; al cierre del mes (30 de abril) el contratista no la había reinstalado y reportó que se encuentra en proceso de reimpresión. A la fecha, Yacopí, Villagómez y Topaipí no tienen programación de instalación.
- Puntos Satélite de Información (PSI): Se actualizaron con éxito los cuatro (4) PSI de La Palma y dos (2) de Yacopí. Afectación vial: El PSI del Sector La Y (Yacopí) no se pudo actualizar debido a un derrumbe provocado por el invierno que impidió el acceso vehicular. Los PSI de Topaipí y Villagómez no registran actualización por falta de información del área técnica sobre el inicio de frentes de obra.
- Actas de Entorno y Compromiso: Se levantó una (1) acta de entorno y una (1) de compromiso en el predio "El Silencio" (Tramo 1, Yacopí) para la instalación de una valla informativa, pactando un pago único de arriendo por $500.000.
- Capacitación: El 8 de abril de 2025 se ejecutó un taller pedagógico sobre "Inteligencia Vial" en la I.E.D.R. Minipí de Quijano (La Palma), logrando la participación activa de 20 estudiantes de grado sexto.
- Participación Ciudadana: Se conformó oficialmente el Comité de Participación Ciudadana de La Palma con doce (12) integrantes, bajo los lineamientos PAGA V.6.
- Diagnóstico Social (Encuestas): El contratista entregó el informe consolidado de La Palma y continuó la aplicación de encuestas en Yacopí vía grupos de WhatsApp de las JAC.
- Población Reintegrada: Se encuentra pendiente la respuesta formal de la Agencia Colombiana para la Reintegración, proyectada para el mes de mayo.
- Vinculación Laboral: Se reportó la contratación de once (11) personas para Mano de Obra No Calificada (MONC) en la provincia durante el mes de abril.
- Recepción de Hojas de Vida: Se captaron diez (10) perfiles laborales provenientes de la ciudadanía del Municipio de Yacopí.

Acciones Pendientes por parte del contratista

- Inicio de actividades constructivas en el predio de la señora Nidia León de la Vereda Minipi de Quijano del Municipio de La Palma.
- Dar respuesta a la PQRS de la señora Mariela Obando y realizar el pago.
- Aplicación de la encuesta para la comunidad en el Municipio de Topaipí de la Provincia de Rionegro.

- Notificar a las Alcaldías y JAC, para el acompañamiento al levantamiento de actas de entorno, según cronograma.
- Instalación de las vallas informativas en los Municipios de Topaipí, Villagómez y Yacopí.
- Realizar pago al señor Néstor Moreno por concepto de servicio de rocería del tramo del Municipio de La Palma.
- Envió de cronograma de talleres de participación Comunitaria.
- Conformación de comités de participación ciudadana en los Municipios de La Palma, Villagómez y Topaipí.

3.4.4.2 Provincia De Ubaté

- **Síntesis de las actividades sociales más relevantes del mes:**

En primer lugar, se evidencia la falta de respuesta formal y oportuna a los siguientes oficios radicados: PAGA (ICCU-S-164-2026 del 16 de abril), apremio (ICCU-S-181-2026 del 24 de abril), petición sobre reductores de velocidad en Ubaté (ICCU-S-185-2026 del 27 de abril), solicitud de programación y socialización del PMT (ICCU-S-187-2026 del 28 de abril) y reiteración de incumplimiento social (ICCU-S-197-2026 del 30 de abril), sin que a la fecha exista claridad sobre las acciones adelantadas.

Adicionalmente, se presentan deficiencias en la gestión y trazabilidad frente a actores externos, evidenciadas en la falta de respuesta a solicitudes realizadas por el municipio de Simijaca (ingeniero y alcaldía), así como la ausencia de respuesta oficial a la Alcaldía de Ubaté y la comunidad respecto a la instalación de reductores de velocidad.

En cuanto al componente social, pese a contar con dedicación del 100%, se evidencian dificultades en la disponibilidad y comunicación, reflejadas en la no atención de llamadas, respuestas tardías y limitaciones para el seguimiento de actividades.

Respecto a estas actas, se requiere formalizar la entrega de las actas ya ejecutadas a los propietarios y definir acciones para el cierre documental de las actas de entorno.

Se identifican también debilidades en la planeación y ejecución de actividades, tales como la ausencia de programación semanal formal, incumplimiento en el ajuste de cronogramas, no inicio de comités de participación en Susa y Simijaca, falta de continuidad en Ubaté y no realización de talleres de cultura vial y participación ciudadana.

En relación con la oficina SAU, aunque ha operado en algunas fechas, no hay claridad sobre su modalidad de funcionamiento ni formalización contractual, pese a ser un componente integral del PAGA para la atención a la comunidad.

Asimismo, se evidencian fallas en la comunicación y manejo de información, incluyendo el envío de piezas publicitarias sin aprobación, uso indebido de formatos, difusión de información no validada en WhatsApp y falta de atención a correos electrónicos, lo cual genera confusión y afecta la trazabilidad.

En materia de gestión documental y reportes, persisten múltiples pendientes, como la no entrega de la matriz de PQRS actualizada, resultados de encuestas, base de personal MONC, certificados de residencia, soportes ante entidades y consolidado de piezas comunicativas.

Se presentan actividades en campo sin ejecutar, entre ellas la limpieza y entrega de alcantarillas en Susa, la instalación de vallas (sin programación, concertación ni actas), y el incumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad.

No se recibió semanalmente la matriz de PQRS, ni la base de datos de personal de MONC En este contexto, las actividades sociales continúan sin ejecución y el desarrollo de acciones en territorio.

Finalmente, durante el periodo evaluado, el componente social del proyecto en la provincia de Ubaté ha ejecutado algunas de las actividades del componente social, sin embargo, no se evidencia cumplimiento total. Se evidencio actualización de los Puntos Satélites de Información (PSI) la cual se desarrolló el 15 de abril de 2026, se generó atención a la comunidad en el lugar establecido en el PAGA durante tres días. Cabe mencionar que a pesar de contar con una programación la misma se reduce a temas administrativos y los únicos dos días en campo son los de atención a la comunidad

SUBPROGRAMA 6.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:

Durante el mes de abril, el contratista YVY ejecutó las actividades correspondientes al subprograma no es su totalidad, generando atención durante tres días únicamente. Esta situación no solo evidencia una falta de gestión, sino que constituye un incumplimiento directo de las obligaciones contractuales asociadas al componente social.

Cabe señalar que la oficina de Atención a la Comunidad fue aperturada el 15 de agosto de 2025, contando desde entonces con un número de teléfono dispuesto para la atención a los usuarios, y que venía prestando atención de manera continua semana a

semana. No obstante, en la actualidad este servicio se encuentra suspendido, evidenciándose la interrupción en la atención a la comunidad.

Adicionalmente, la ausencia de atención y la inoperatividad del Servicio de Atención al Usuario (SAU) impiden conocer si existen o no peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) por parte de los usuarios, lo que representa una falla crítica en la implementación del protocolo de atención al usuario.

Cabe resaltar que, conforme a lo establecido, el SAU debe llevar un registro de las PQRS interpuestas por los usuarios, con el fin de garantizar su atención dentro de los términos legales, iguales o menores a quince (15) días hábiles, soportado mediante un registro de seguimiento. Sin embargo, debido a la falta de gestión en este componente, no se cuenta con información verificable ni trazabilidad de dichas solicitudes.

La no ejecución de estas actividades afecta el desarrollo integral del proyecto, limita la atención a la comunidad y vulnera los lineamientos establecidos en el subprograma, generando riesgos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y en la adecuada implementación del componente social en territorio.

En consecuencia, esta omisión refleja una debilidad en la planificación y ejecución por parte del contratista, configura un incumplimiento de carácter reiterado y requiere la adopción inmediata de acciones correctivas que permitan restablecer el servicio, garantizar la atención a la comunidad y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

El Contratista cuenta con el canal de atención a la comunidad vía correo electrónico; el Contratista debe disponer de una línea telefónica dispuesta para el proyecto que no sea la línea personal de la Profesional Social de Ubaté.

Tabla 21. Canal de Atención a la Comunidad

Medio de Atención	Canal	Punto de Atención a la Comunidad
Correo electrónico	socialubateconsorcioyvy@gmail.com	Calle 7#4-120, Centro de Taubaté

SUBPROGRAMA 6.2 DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN:

Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria.

Parálisis de los Comités de Participación Ciudadana: El comité del municipio de Ubaté (conformado en noviembre de 2025) debió sesionar de forma bimestral en enero y marzo de 2026. A la fecha de corte (30 de abril), no se ha realizado ninguna reunión

en lo que va del año. En Susa, Simijaca y Tausa los comités ni siquiera se han formalizado.

En relación con las reuniones del Comité de Participación Comunitaria, durante el mes de abril no se ejecutaron actividades, toda vez que la profesional social refiere que desarrollara actividades con el propósito de dar alcance a la situación sin evidenciar avances. Aspecto que ha impedido la planificación, convocatoria y desarrollo de estos espacios de participación.

Para el municipio de Ubaté, se cuenta con el Comité de Participación Ciudadana conformado desde el mes de noviembre de 2025; sin embargo, conforme a la programación establecida, la primera reunión del año, la cual debía realizarse en el mes de enero de 2026 (con una periodicidad bimestral), no fue ejecutada, generando un atraso en el desarrollo de las actividades del comité y en el cumplimiento de los compromisos asociados a este espacio.

En cuanto al municipio de Susa, se dispone de un posible listado de aspirantes para la conformación del comité; no obstante, a la fecha no se ha llevado a cabo la formalización del mismo mediante acta, ni se han adelantado acciones para su consolidación.

En este sentido, se recalca que durante el mes de abril no se ejecutó ninguna actividad relacionada con los Comités de Participación Comunitaria, evidenciándose una inactividad total en este componente, lo cual representa un incumplimiento de las acciones previstas y afecta directamente los procesos de participación, articulación y relacionamiento con la comunidad.

Reunión de inicio:

A la fecha no se han programado reuniones de inicio de etapa de ejecución en ninguno de los municipios de la provincia de Ubaté; el Contratista continua en atrasos en la ejecución por parte del área técnica y falta de profesionales para la ejecución.

Reunión de avance:

Cuando se haya cumplido al menos el 50% de ejecución del cronograma de obra, se convoquen a los mismos actores sociales de la reunión de inicio y se dé cuenta de los avances en las actividades de obra, los programas de gestión ambiental y social.

Reunión de Finalización:

No aplica para el presente periodo, previo a la finalización de las actividades de obra y del plazo contractual al cumplir el 90% de las actividades de obra propuestas en el cronograma, se realizará una reunión, donde se convocará a todas las personas tenidas en cuenta en las reuniones de inicio y de avance y se informará sobre el estado final de la obra en sus componentes técnico, social, ambiental, además de los impactos y beneficios generados, recomendaciones de conservación y gestión de riesgo, entre otros aspectos relevantes.

Mesas de trabajo.

Durante el mes de abril de 2026, en la provincia de Ubaté, se desarrollaron tres mesas de trabajo con la profesional social, en los días 01, 16 y 30 de abril de 2026. Donde se abordaron varias temáticas frente al componente social. Teniendo en cuenta avances, verificar compromisos, ni coordinar acciones del componente social, generando retrasos en la ejecución de actividades y afectando la atención directa a la comunidad.

Cabe mencionar que, aunque se cuenta con profesional social, no se ha avanzado en dicho componente toda vez que la profesional le ha generado dificultad para acceder y acatar la información suministrada, generando esto un retroceso en las actividades a desarrollar

Instalación y seguimiento de Puntos Satélites de Información (PSI)

Puntos Satélites de Información (PSI) – Provincia de Ubaté

Respecto a los Puntos Satélites de Información (PSI) en la provincia de Ubaté, se reportó la actualización de los PSI el 15 de abril de 2026.

En cuanto a la instalación y seguimiento de los PSI, Yulieth Camelo, gestora social de la Interventoría, realizó acompañamiento a la actualización y mantenimiento, la profesional social debe de remitir en un archivo en PDF las piezas publicitarias instaladas.

Anexo 4: Formato actualización PSI, ubicado en el municipio de Ubaté.

Tabla 22. Puntos Satélites de Información-PSI

Nombre del Establecimiento	Ubicación	Municipio	Contacto
Tienda Pola y Rana	Barrio San Gil-	Municipio de Susa	Expedito Predes 3219721764
Tienda la Caseta Roja	Vereda el Pantano	Municipio de Simijaca	Paula Hernández 3104860108
Tienda donde Angela	Vereda Patera Centro	Municipio de Ubaté	María Inés Franco

			3132893749
Tienda la Y	Vereda Pajarito	Municipio de Tausa	Jackeline Aguirre 3003830839
Tienda Tres Esquinas	Vereda Rasgata	Municipio de Tausa	Mónica Hernández 3212576971

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE ENTORNO.

Actas de Entorno.

Número de predios a visitar acorde a solicitud de contratista: de acuerdo con el inventario predial realizado en la provincia de Ubaté, se levantarán 52 actas de entorno, una cada 500 metros sobre la vía a intervenir por el proyecto; las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 23. Actas de Entorno

ACTAS DE ENTORNO			
MUNICIPIO	**No. DE ACTAS**	**ACTAS REALIZADAS**	**PROCESO**
Ubaté	14	5	Revisadas, pendiente por firmar y radicar ante la Interventoría
Susa.	15	En su totalidad	Revisadas, firmadas, radicadas y aprobadas por Interventoría
Tausa.	11	No se ha iniciado actividad.	El documento PAGA modo carretero aprobada para la provincia de Ubaté exime de esta actividad por la complejidad media baja.
Simijaca.	12	En su totalidad	Revisadas, pendiente por firmar y radicar ante la Interventoría.
TOTAL	52	36	

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

NOTA: Teniendo en cuenta que la provincia de Ubaté, conformada por los municipios de Susa, Simijaca, Tausa y Ubaté, es de complejidad medio-baja, en este sentido y en atención a lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Modo Carretero (INVIAS, versión 2022, ISBN digital), nos permitimos informar que en ella se expone que la obligación de adelantar el levantamiento de actas de vecindad depende directamente del nivel de complejidad socioambiental del proyecto definido en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA.

Tabla 24. Complejidad PAGA.

Provincia	Complejidad	Complejidad aplicación de actas De vecindad.	Sustento normativo
Ubaté	Media-baja	No aplica	Guía Modo Carretero, Vol. 6, pág. 522

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Actas de vecindad.

A la fecha de corte del presente informe, se ha realizado la entrega y socialización de las actas de vecindad en los municipios de Susa, Simijaca y algunas del municipio de Ubaté, en los sitios donde el contratista por iniciativa propia, ha manifestado la necesidad de elaborar las actas.

- Susa y Simijaca: Las actas correspondientes a dichos municipios se encuentran cargadas en el Drive, organizadas por carpetas, y cada una ha sido socializada con los propietarios involucrados. Estas actas han sido aprobadas por la Interventoría.
- Ubaté: Se han desarrollado 20 actas de vecindad, las cuales han sido aprobadas y radicadas a la Interventoría. Además, se encuentran en el Drive con sus respectivos soportes de socialización.
- Tausa: No se ha ejecutado ninguna acta de vecindad hasta la fecha.

SUBPROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Subprograma de Cultura Vial y Participación Ciudadana.

Durante el periodo evaluado, se evidencia que no se ha avanzado en la ejecución de actividades del subprograma de Cultura Vial y Participación Ciudadana teniendo en cuenta que la social se encontraba en empalme, armonización y conocimiento del proyecto, razón por la cual no genero avance en las actividades contempladas.

Conformación de los Comités de Participación Ciudadana: En noviembre de 2025, se conformó el Comité de Participación Ciudadana en el municipio de Ubaté, integrado por 7 miembros de la comunidad del área de influencia, con reuniones programadas cada dos meses según los lineamientos del PAGA V.5. Este comité tiene como objetivo garantizar la participación continua de la comunidad y dar a conocer los avances del proyecto en las diferentes áreas. La conformación fue registrada bajo acta socializada y aprobada por Interventoría.

Sin embargo, no se han realizado reuniones programadas desde enero de 2026, generando un atraso en la ejecución del comité. En los municipios de Susa, Tausa y Simijaca, aún no se han conformado los comités, y en Susa solo existe un listado de posibles aspirantes, sin formalización. La ausencia de profesional social ha limitado el seguimiento, coordinación y ejecución de estas actividades, afectando la participación comunitaria y la efectividad del subprograma.

Talleres Pedagógicos: Para el mes en menciono, no se ha planificado un taller pedagógico en el municipio de Ubaté, el cual no se ejecutó debido a la falta de definición en la línea técnica y social por parte del contratista. Durante marzo de 2026, el consorcio YVY no realizó talleres pedagógicos ni envió programación alguna para estos, evidenciando que no se avanzó en la implementación del subprograma.

El área social de Interventoría se mantiene atenta para garantizar su acompañamiento y supervisión una vez se vincule la profesional social. No obstante, la falta de profesional social asignada ha impedido la ejecución de estas actividades, retrasando la sensibilización y formación de la comunidad en cultura vial y participación ciudadana.

Aplicación de Encuestas a la Comunidad: Durante abril de 2026, el área social del contratista no reportó avances ni remitió información sobre la aplicación de encuestas en la provincia de Ubaté, ni se ha recibido el informe cuantitativo ni cualitativo que permita evaluar la percepción y necesidades de la comunidad. En municipios como Tausa, la encuesta no se ha aplicado, y en general, la información disponible es insuficiente para realizar seguimiento y análisis de la intervención social.

Finalmente, a la fecha, el subprograma de Cultura Vial y Participación Ciudadana en la provincia de Ubaté no ha registrado avances significativos, debido a la falta de profesional social. Esto ha afectado la formalización y seguimiento de los comités, la ejecución de talleres pedagógicos y la aplicación de encuestas a la comunidad, generando un riesgo en el cumplimiento de los compromisos sociales establecidos en el proyecto. Se reitera la necesidad de vincular de manera inmediata a la profesional social,

a fin de retomar las actividades, garantizar la participación ciudadana efectiva y dar cumplimiento a los objetivos del subprograma.

SUBPROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA:

Población Reintegrada.

El Contratista informa; teniendo en cuenta que, tras la indagación realizada, no se encontraron registros de acciones previas relacionadas con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el día 31 de octubre de 2025 se remitió a dicha entidad, por medio de correo electrónico, el Oficio YVY-324-25, con asunto "Solicitud de base de datos de personas inscritas en el programa de reintegración de la provincia de Ubaté".

Mano de obra no calificada.

En el marco del seguimiento a las obligaciones sociolaborales del proyecto y con el fin de garantizar la transparencia en la contratación de personal, se informa que se ha identificado la vinculación de mano de obra no calificada mediante esquema de subcontratación.

Falta de Control Sociolaboral (Mano de Obra No Calificada - MONC): Se identificó que el contratista está vinculando personal local mediante el esquema de subcontratación. No obstante, debido a la falta de su profesional social, no han entregado la Matriz de Control de Vinculación Laboral ni los certificados de residencia emitidos por las Juntas de Acción Comunal (JAC) o alcaldías, impidiendo auditar si realmente se está priorizando el empleo local.

Identificación: Nombre completo y número de documento.

Perfil: Cargo desempeñado.

Residencia: Lugar de domicilio actual, con certificación de residencia en cada municipio donde va a trabajar o donde está siendo contratado, para verificar la prioridad de contratación local.

Seguridad Social: Estado actual y soportes de aportes al sistema.

Dicho reporte deberá ser entregado con periodicidad mensual para garantizar que el personal subcontratado cumpla con todas las garantías legales vigentes.

En la provincia de Ubaté, se desconoce actualmente la relación de personal del contratista y subcontratista, debido a la falta de profesional social, lo que impide verificar el cumplimiento de los compromisos sociolaborales establecidos en el proyecto.

Hojas de vida.

Durante el presente periodo, la profesional social del contratista no reportó la consolidación de nuevas postulaciones en el banco de hojas de vida del Servicio de Atención al Usuario (SAU).

Debido a la ausencia de profesional social en la provincia de Ubaté, no se ha generado atención directa a la comunidad, ni se ha prestado atención a través de canales de WhatsApp u otros medios de comunicación virtuales.

Se recuerda que el contratista debe remitir a la Interventoría la matriz de seguimiento detallada, incluyendo nombres, fechas y resultados del proceso, durante la siguiente semana epidemiológica/calendario, para su respectiva validación

CONCLUSIÓN:

- Se han generado algunas actividades, pero no se presentan avances en la implementación del componente social, manteniéndose un estado de inactividad generalizada por parte del contratista.
- Desde interventoria se ha mencionado que el componente de gestión social ha generado incumplimientos reiterados en las obligaciones contractuales, especialmente en lo relacionado con atención a la comunidad, actualización de PSI, talleres de participación ciudadana y acompañamiento en territorio.
- Se evidencian debilidades en la gestión del contratista frente al cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad, lo que impacta negativamente la confianza y la articulación en territorio.
- La ejecución de actividades técnicas sin acompañamiento social incrementa el riesgo de conflictividad con la comunidad y de incumplimiento contractual.
    - Se requiere la implementación inmediata de acciones correctivas por parte del contratista, orientadas a reactivar el componente social, garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y restablecer la relación con la comunidad..

3.4.4.3 Provincia De Almeidas

El presente documento tiene como objetivo presentar las acciones implementadas desde la Gestión Social de la Provincia de Almeidas durante el periodo comprendido entre el 1

y el 30 de abril de 2026. Estas actividades describen los impactos del Contratista Consorcio YVY bajo los lineamientos del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA V.6).

Durante el presente período mensual, el proyecto registró avances sustanciales en su ejecución física mediante el inicio de la estabilización de rasantes en el tramo piloto de Chocontá y el desarrollo de las obras civiles para la instalación de tuberías correspondientes a siete alcantarillas en el sector de Sesquilé. Estos hitos técnicos fueron socializados formalmente ante las autoridades político-administrativas de la Alcaldía municipal, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), la Interventoría y las organizaciones comunales, obteniendo una validación favorable por parte de los grupos de interés. En el componente de comunicaciones, se garantizó la difusión de información oportuna a través de los Puntos de Información Satelital con actualizaciones semanales adaptadas a las contingencias de la obra, y se ratificó la metodología para los próximos talleres de cultura vial programados para el mes de abril. Respecto a la gestión de capital humano, se realizó la auditoría correspondiente al subcontratista para certificar que el personal operativo pertenece a la provincia, validando los certificados de residencia expedidos por las Juntas de Acción Comunal y corroborando el suministro oportuno de la dotación reglamentaria. Finalmente, si bien el balance del plan de gestión social es plenamente satisfactorio, el comité directivo prioriza la necesidad estratégica de establecer una infraestructura física permanente para la oficina del Servicio de Atención al Usuario (SAU) en Chocontá; esta medida mitigará la intermitencia actual, institucionalizará el canal de comunicación directo con la comunidad y blindará la gobernanza del proyecto durante sus etapas subsiguientes..

Subprograma 6.1 (Atención a la comunidad):

La Interventoría realizó la verificación de la oficina de SAU ubicada en el municipio de Chocontá (Local 102, Edificio Santorini Center). Durante el mes de abril de 2026, se validó la atención brindada por la profesional Nancy Riascos bajo el esquema híbrido definido: de forma presencial los martes y miércoles y de forma virtual de lunes a viernes a través de los canales habituales. En horario de atención (08:00 a.m., 12:00 y 1:00 p. m., 4:00 p.m.) Virtual: de lunes a viernes (canales electrónicos habilitados de forma habitual).

Subprograma 6.2 (Información y divulgación):

Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria

El día 9 de abril de 2026, se llevó a cabo en el municipio de Chocontá la reunión informativa con la asistencia de los directores de obra, profesionales técnicos y sociales

de la Interventoría y Contratista, alcaldía municipal y secretarios de obras públicas y comunidad, presidentes de las juntas de acción comunal y comunidad en general. El objeto de dicha reunión es seleccionar el tramo piloto de estabilización.

Acta #5. Acta de reunión informativa del municipio de Chocontá, control de asistencia.

el 15 de abril de 2026, se desarrolló una reunión con el comité de participación comunitaria y presidentes de las JAC en el municipio de Sesquilé, con el objeto de informar sobre el inicio de instalación de la tubería para la construcción de las siete alcantarillas en el tramo Guatavita-El Hato-Ranchería-El Uval, los convocados fueron, el comité de participación comunitaria, presidentes de las JAC, directores de obra, profesionales técnicos y sociales de la Interventoría y el Contratista.

Anexo #6. PMT municipio de Sesquilé, oficio de aprobación de la alcaldía municipal de Sesquilé..

Reunión de inicio:

A la fecha no se han programado reuniones de inicio de etapa de ejecución en ninguno de los municipios de la provincia de Almeidas; el Contratista alega retrasos en la ejecución por parte del área técnica y falta de profesionales para la ejecución.

Reunión de avance:

Cuando se haya cumplido al menos el 50% de ejecución del cronograma de obra, se convoquen a los mismos actores sociales de la reunión de inicio y se dé cuenta de los avances en las actividades de obra, los programas de gestión ambiental y social.

Reunión de Finalización:

No aplica para el presente periodo, previo a la finalización de las actividades de obra y del plazo contractual al cumplir el 90% de las actividades de obra propuestas en el cronograma, se realizará una reunión, donde se convocará a todas las personas tenidas en cuenta en las reuniones de inicio y de avance y se informará sobre el estado final de la obra en sus componentes técnico, social, ambiental, además de los impactos y beneficios generados, recomendaciones de conservación y gestión de riesgo, entre otros aspectos relevantes.

Reuniones Extraordinarias:

El pasado sábado 18 de abril de 2026, atendiendo la solicitud formal del propietario del predio colindante a la alcantarilla #5, se llevó a cabo una reunión extraordinaria en el tramo correspondiente al municipio de Chocontá.

El encuentro contó con la participación de la gestora social de la Interventoría y del contratista, residentes de obra, el director del Consorcio YVY, el equipo de topografía (cadenero) y el señor Javier De Aza. El objetivo primordial de la sesión fue establecer acuerdos concertados frente a los requerimientos técnicos y sociales remitidos previamente por el propietario a la Interventoría, garantizando la viabilidad de los trabajos en dicho punto.

Anexo #7 Acta de reunión extraordinaria y listado de asistencia y evidencias fotográficas

El 6 de abril de 2026, se desarrolló la reunión extraordinaria solicitada por los presidentes de las JAC del municipio de Chocontá. El encuentro tuvo como propósito principal concertar y definir técnicamente el tramo piloto de estabilización que se intervendrá prioritariamente. Esta decisión se tomó en un marco de colaboración institucional y comunitaria, considerando los diagnósticos técnicos vigentes y el impacto social en el territorio.

Durante la sesión, el equipo técnico presentó las variables de suelo y topografía que sustentan la elección del tramo, mientras que los representantes de las JAC aportaron su conocimiento sobre las necesidades críticas de la comunidad. Tras el análisis de las propuestas, se definieron las coordenadas y el alcance del piloto, asegurando que los métodos de estabilización a emplear cumplan con los estándares de durabilidad exigidos por el ICCU.

Asistentes:

Representantes del Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca (ICCU).

Directores de obra, profesionales técnicos y sociales de la Interventoría y el Contratista.

Ingeniero de apoyo de la Secretaría de Obras Públicas de Chocontá.

Presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y miembros del Comité de Participación Comunitaria del área de influencia

Mesas de trabajo

El día 15 de abril de 2026, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la profesional social del contratista, Nancy Riascos, con el propósito de socializar y revisar las actividades programadas para la semana en la provincia de Almeidas. Durante la sesión, se verificó el estado y cumplimiento de los siguientes puntos:

Documentación: Revisión de actas de reuniones y diseño/distribución de volantes informativos.

Atención al Usuario: Validación del horario de atención en el punto SAU (Servicio de Atención al Usuario).

Seguimiento y Control: Actualización de la matriz de PQR's y la matriz de personal vinculado por el contratista y subcontratista.

Cronograma y Plan de Manejo: Verificación del cumplimiento del cronograma de actividades técnico-sociales y de los subprogramas descritos en el PAGA V.6

- **Instalación y seguimiento de Planes Sociales de Información (PSI)**

Diana Marcela Chavarro Escobar, gestora social de la Interventoría, realizó la revisión y aprobación de las piezas publicitarias destinadas a la socialización del proyecto en el municipio de Sesquilé y Chocontá. El material aprobado incluye la pieza de inicio de obra para la estabilización del tramo piloto, la convocatoria a la reunión extraordinaria para la conformación del Comité de Participación Ciudadana y el volante informativo sobre el inicio y cierre vial. Estos contenidos fueron publicados en los Puntos de Servicio e Información (PSI) y difundidos a través de canales electrónicos a las Juntas de Acción Comunal y a la comunidad en general.

Puntos Satélites de Información:

El 04, 11, 19, 22, 29, 30 de abril de 2026 se realizó la siguiente actividad. Se dio aprobación a las piezas de comunicación que incluyen la pieza de inicio de obra para la estabilización del tramo piloto, la convocatoria a la reunión extraordinaria para la conformación del Comité de Participación Ciudadana y el volante informativo sobre el inicio y cierre vial. Estos contenidos fueron publicados en los Puntos de Servicio e Información (PSI) y difundidos a través de canales electrónicos a las Juntas de Acción Comunal y a la comunidad en general.

Tabla 15 Puntos Satélites de Información

Fecha	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Contacto
04 de abril 2026	Tienda Doña María Díaz	La vereda de tierra negra	Ana María Muñoz 3138080539
11 y 19 de abril de 2026	Institución Educativa Departamental Méndez Rozo	Municipio de Sesquilé Fabio Solano Romero	3212577722
22 de abril de 2026	Tienda La Primavera	La vereda de tierra negra	Ana María Muñoz 3138080539
29 y 30 de abril de 2026.	Tienda Doña Martha	Vereda Agua Caliente	Martha Sánchez 3124217655

Actas de entorno y actas de vecindad

Actas de Entorno de Inicio.

NÚMERO DE PREDIOS A VISITAR: De acuerdo con el inventario predial realizado en la Provincia de Almeidas, el contratista decidio acorde a las necsidades evidenciadas por este levantar 71 actas de entorno, cada 500 metros sobre la vía a intervenir por el proyecto; las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 25. Actas de Entorno

ACTAS DE ENTORNO			
MUNICIPIO	No. DE ACTAS	REALIZADAS	PROCESO
Chocontá	18	En su totalidad	Revisadas, firmadas y listas para radicar ante la Interventoría
Manta	18	En su totalidad	Revisadas, firmadas y listas para radicar ante la Interventoría
Sesquilé	35	No se ha iniciado actividad.	El documento PAGA modo carretero aprobada para la provincia de Almeidas exime de esta actividad por la complejidad media baja.
TOTAL	71	36	TOTAL

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

NOTA: Teniendo en cuenta que la provincia de Almeidas, conformada por los municipios de Chocontá, Manta y Sesquilé, es de complejidad medio-baja, en este sentido y en atención a lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Modo Carretero (INVIAS, versión 2022, ISBN digital), nos permitimos informar que en ella se expone que la obligación de adelantar el levantamiento de actas de vecindad depende directamente del nivel de complejidad socioambiental del proyecto definido en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA. La Interventoría se encuentra en proceso de dar respuesta al oficio radicado por el Contratista el día 05 de noviembre de 2025, YVY-327-25.

El día 14 de nov. de 2025, la Interventoría remitió el comunicado ICCU-S-337-2025, respuesta a YVY-327-25, remisión del plan de adaptación a la guía ambiental con la aprobación del documento.

Tabla 26. Complejidad

Provincia	**Complejidad**	**Complejidad aplicación de actas De vecindad.**	**Sustento normativo**
Almeidas	Media-baja	No aplica	Guía Modo Carretero, Vol. 6, pág. 522

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Actas de vecindad

Se informa que, a la fecha de corte del presente informe, no se ha realizado la entrega ni socialización de las actas de vecindad en ninguno de los municipios que conforman la provincia de Almeidas.

• NÚMERO DE PREDIOS A VISITAR: De acuerdo con el inventario predial realizado en la Provincia de se lograron identificar 85 (ochenta y cinco) predios a los cuales se les levantarán actas de vecindad; las cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 27. Actas de Vecindad

ACTAS DE VECINDAD			
MUNICIPIO	No. DE ACTAS	REALIZADAS	PROCESO
Chocontá	16	13	Revisadas, firmadas y listas para radicar ante la Interventoría
Manta	40	40	Revisadas, firmadas y entregadas a cada propietario
Sesquilé	29	No se ha iniciado actividad.	No aplica.
TOTAL	85	36	TOTAL

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Nota: El 11 de dic.-25. El contratista radicó adjunto el oficio YVY-406-RADICACIÓN DE ACTAS DE ENTORNO Y DE VECINDAD – PROVINCIA DE ALMEIDAS

SUBPROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA:

Población Reintegrada.

El Contratista informa:

Teniendo en cuenta que, tras la indagación realizada, no se encontraron registros de acciones previas relacionadas con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el día 31 de octubre de 2025 se remitió a dicha entidad, por medio de correo electrónico, el Oficio YVY-324-25, con asunto "Solicitud de base de datos de personas inscritas en el programa de reintegración de la provincia de Almeidas".

Mano de obra no calificada.

En el marco del seguimiento a las obligaciones sociolaborales del proyecto y con el fin de garantizar la transparencia en la contratación de personal, se informa que se ha

identificado la vinculación de mano de obra no calificada mediante el esquema de subcontratación.

Por lo anterior, se solicita a la profesional social del Contratista la remisión y actualización periódica de la Matriz de Control de Vinculación Laboral. Este documento es indispensable para adelantar la auditoría del proceso de contratación en la región y debe contener, como mínimo, la siguiente información:

Identificación: Nombre completo y número de documento.

Perfil: Cargo desempeñado.

Residencia: Lugar de domicilio actual (para verificar la prioridad de contratación local).

Seguridad Social: Estado actual y soportes de aportes al sistema.

Dicho reporte deberá ser entregado con una periodicidad [mensual] para asegurar que el personal subcontratado cuente con todas las garantías legales vigentes.

La relación de personal no calificado en la Provincia de Almeidas. Indicamos el personal en los municipios de Manta y de Chocontá; asimismo, relacionamos también el personal subcontratista que se tiene solo en Chocontá.

Hojas de vida.

Durante el presente periodo, la profesional social del Contratista reportó la consolidación de seis (6) nuevas postulaciones en el banco de hojas de vida del Servicio de Atención al Usuario (SAU). Dichos perfiles se encuentran actualmente en proceso de evaluación y aprobación. El Contratista se comprometió a remitir a la Interventoría la matriz de seguimiento detallada (nombres, fechas y resultados del proceso) durante la siguiente semana epidemiológica/calendario para su respectiva validación.

PAGA_LOTE 2-V.6-ACTUAL

DOCUMENTO PAGA-LOTE 2-V.6-ACTUAL-2025 Guía Modo Carretero, Vol. 6, pág. 522

Una vez verificado el documento PAGA de la provincia de Almeidas LOTE 2-V.6-ACTUAL, radicado por el Contratista con el comunicado YVY-327-25, se encuentra que fueron atendidas las observaciones realizadas desde el componente Social; por lo tanto, esta Interventoría emite la correspondiente aprobación.

Respuesta a YVY-327-25 - Remisión del plan de adaptación a la guía ambiental de la provincia de Almeidas PAGA_LOTE 2-V.6-ACTUAL

- CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PROVINCIA DE ALMEIDAS.

Se concluye que el proyecto registra avances significativos en los municipios de la provincia mediante la ejecución de actividades técnicas y sociales alineadas con los subprogramas de gestión social, destacándose el cumplimiento del programa de desarrollo local, en cuyo marco se han formulado acciones efectivas de control y seguimiento para la prevención y mitigación de impactos en el área de influencia. No obstante, se evidencian desviaciones frente al cronograma aprobado debido al incumplimiento del contratista en la instalación de las vallas informativas en la provincia de Almeidas, cuyo plazo perentorio venció el 11 de abril de 2026, situación ante la cual la Interventoría requiere la actualización inmediata de la matriz de PQR para garantizar el estricto cumplimiento de los términos legales y contractuales. Finalmente, con el propósito de normalizar la coordinación operativa del proyecto, el contratista deberá remitir obligatoriamente cada viernes el cronograma detallado de la semana posterior, integrando de forma articulada los componentes técnicos, social, y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

3.5 Salud y Seguridad en el Trabajo (SST)

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se registró el ingreso de personal al proyecto, así como el retiro de personal vinculado a la interventoría.

De igual manera, se desarrollaron las actividades correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dirigidas al personal activo, en cumplimiento del plan de trabajo establecido para el mes.

En cuanto a la ejecución de obra, el contratista en la provincia de Rionegro continúa con las actividades de construcción de alcantarillas y excavaciones.

En la provincia de Ubaté, durante las dos primeras semanas del mes se adelantaron labores de terminación de la fundición de alcantarillas. Asimismo, en el municipio de Susa se ejecutaron actividades de construcción de alcantarillas. Para los municipios de Tausa y Simijaca no se registró actividad de campo ni presencia de personal del contratista durante el periodo reportado.

Finalmente, en la provincia de Almeidas, durante el mes se desarrollaron actividades de retiro de sobretamaños y mejoramiento de tramo en el municipio de Manta. En el

municipio de Sesquilé se llevó a cabo la construcción de alcantarillas, mientras que en el municipio de Chocontá se ejecutaron trabajos de estabilización del tramo.

A continuación, se relaciona punto por punto la ejecución de las actividades de parte de la Interventoría.

3.5.1 LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo se presentaron las hojas de vida de los profesionales para la etapa de ejecución, resaltando que una parte del personal tiene contrato con la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia, firma que hace parte del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 y el resto está contratado directamente por el Consorcio, a continuación, se relaciona el personal incorporado en el desarrollo del mes de marzo de la etapa de ejecución del proyecto con sus respectivas dedicaciones:

Tabla 28. Listado de personal de interventoría

Personal Mínimo Requerido	Nombre Del Trabajador	EMPRESA CONTRATANTE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
Director De Interventoría	Edgar Mauricio Beltran Cardenas	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Residente De Interventoría	Carolina Peña Lopez	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
Profesional Gestor Social	Tania Melisa Escobar Virguez	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Profesional Siso 1	Yessica Paola Mora Torres	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	70%
Secretaria	Helen Sanchez Coronado	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
Inspectora De Interventoría	Angie Lorena Jimenez Obando	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Topógrafo	John Jarby Rozo Sanchez	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Profesional Ingeniero De Apoyo	Juan Sebastian Cruz Acevedo	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Profesional Gestor Social	Diana Marcela Chavarrio Escobar	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Inspectora De Interventoría	Maira Alejandra Matiz Gomez	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Especialista Ambiental	Carlos Arturo Chaparro Sanchez	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%

Profesional Siso 2	Luisa Fernanda Miranda	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
Profesional Siso 3	Johana Aguilar Sanchez	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
Profesional Social	Yulieth Cidgney Camelo Fiquitiva	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Cadenero	Julian Marroquin	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	KAIL FERNANDO RODRIGUEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Especialista En Pavimentos	Carlos Ivan Gutierrez	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 - OPS	50%
Cadenero	Oscar Santiago Sanabria Castro	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
Abogado	Jose Roman Pacheco Gallego	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA - OPS	10%
Especialista Geotecnia	Diana Milena Suarez	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	40%
Residente De Interventoría	Diana Raquel Gaviria Diaz	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%

3.5.2 INDICADORES SST

Durante el mes de abril se realiza la respectiva medición y seguimiento de los indicadores establecidos en el Decreto 1072 de 2015, correspondientes a la estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). De igual manera, se incluyen los indicadores adicionales requeridos por la Resolución 0312 de 2019, en cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST.

Así mismo, se incorporan los indicadores relacionados con el proceso de reincorporación y retorno laboral, conforme a lo establecido en la Resolución 3050 de 2022. (Ver anexo 1).

3.5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Durante el mes de abril el contratista en la provincia de Rionegro continúa con las actividades de construcción de alcantarillas y excavaciones.

En la provincia de Ubaté, durante las dos primeras semanas del mes se adelantaron labores de terminación de la fundición de alcantarillas. Asimismo, en el municipio de Susa se ejecutaron actividades de construcción de alcantarillas. Para los municipios de

Tausa y Simijaca no se registró actividad de campo ni presencia de personal del contratista durante el periodo reportado.

Finalmente, en la provincia de Almeidas, durante el mes se desarrollaron actividades de retiro de sobretamaños y mejoramiento de tramo en el municipio de Manta. En el municipio de Sesquilé se llevó a cabo la construcción de alcantarillas, mientras que en el municipio de Chocontá se ejecutaron trabajos de estabilización del tramo.

3.5.4 PLAN DE TRABAJO SST

Durante el mes de abril se continuo con las actividades que se plantearon en el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) correspondiente al año 2026, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

3.5.5 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el mes de abril se realizó inducción de la nueva directora de interventoría y durante el mes se ejecutaron actividades de la semana de la salud el cual se tocaron temas de hábitos de vida saludable, salud mental y ergonomía.

3.5.6 DOCUMENTOS DE INGRESO Y RETIRO

En el mes de abril se registró un ingreso por parte del Consorcio y otro adicional correspondiente a una de las empresas que lo integran, adicionalmente se registró dos retiros del personal dentro del proyecto. (Ver Anexo 4. Informe SST).

Tabla 29. Listado de ingreso y retiro personal de interventoría

CARGO	TRABAJADOR	EMPRESA	FECHA DE INGRESO
INGRESOS			
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	KAIL FERNANDO RODRIGUEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	095/04/2026
DIRECTORA DE INTERVENTORIA	GABRIELA FORERO DUARTE	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	24/04/2026
RETIROS			
CADENERO	KAIL FERNANDO RODRIGUEZ	OPS	08/04/2026
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS ARTURO REINA	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	17/04/2026

3.5.7 SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE PARAFISCALES

En el presente informe se adjuntan las planillas individuales del personal correspondiente al pago de la seguridad social de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia y la planilla general del Consorcio Intervial ICCU 050.

Así mismo, se anexan las certificaciones del pago de parafiscales de las dos empresas que conforman el Consorcio firmados por el Revisor Fiscal y por parte del Consorcio firmada por el Representante Legal.

3.5.8 CÁLCULO DEL IBC

En el presente informe se anexa el formato de cálculo de IBC con su respectiva firma del profesional SST y Representante Legal. **Ver Anexo 6. Informe SST.**

3.5.9 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Durante en el mes se realizaron dos actividades relacionadas a la semana de la salud.. Ver Anexo 7. Informe SST.

3.5.10 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

En el mes de abril no se presentó ningún accidente de trabajo. **Ver Anexo 8. Informe SST.**

3.5.11 COPASST

Se realizó en el mes de abril se realizó reunión del COPASST el día 13 de abril de 2026 por parte de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia.

3.5.12 ENTREGA DE EPP

Se realizo en el mes de abril la entrega respectiva de los elementos de protección personal EPP para la Directora de interventoría.

3.5.13 INSPECCIONES

En el mes de abril se realizaron inspecciones de los elementos de emergencia de extintor y botiquín. (Ver anexo 10. Informe SST).

3.5.14 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN CAMPO INTERVENTORÍA

Durante el periodo de abril se desarrollaron actividades en campo, incluyendo la implementación de charlas preoperacionales dirigidas al personal actualmente vinculado en sitio. A continuación, se relacionan dichas actividades:

Tabla 30. Seguimiento de actividades

FECHA	TEMA	ASISTENTES
01/04/2026	Chequeo del conductor seguro	5
06/04/2026	Postura y ergonomía al conducir	5
07/04/2026	Señales de tránsito en acción	5
08/04/2026	El peatón también importa	5
09/04/2026	Identificación de riesgos en la vía	5
10/04/2026	Cero Distracciones	5
13/04/2026	Tiempo de reacción	5
14/04/2026	Compromiso vial	5
15/04/2026	Mantenimiento del vehículo	5
16/04/2026	Seguridad en el uso de herramienta manual	5

De igual manera se realizaron actividades de pausas activas en campo que a continuación se relacionan:

Tabla 31. Seguimiento de actividades

FECHA	TEMA	ASISTENTES
17/04/2026	Movilidad de cuello	5
20/04/2026	Rotación de hombros – movimiento circulares hacia adelante y atrás	5
21/04/2026	Estiramiento de brazos-movimientos circulares hacia adelante y atrás	5
22/04/2026	Flexión y extensión de muñeca _ movimientos hacia arriba y abajo	5
23/04/2026	Estiramiento de espalda	5
24/04/2026	Elevación de rodillas	5
27/04/2026	Estiramiento de piernas	5
28/04/2026	Ejercicio de respiración	5
29/04/2026	Relajación ocular	5
30/04/2026	Dinámica de coordinación	5

En el mes de abril se realizó el respectivo seguimiento a las actividades en campo:

Provincia de Rionegro

- Se constata que el personal del contratista y subcontratista porta adecuadamente los EPPs en la ejecución de actividades de apoyo, realizan inspección de EPPs semanal.
- Se remitió al contratista el oficio de VoBo para el PMT de Topaipi y Yacopí sujeto a aprobación hasta soportar socialización a la comunidad y a la alcaldía.
- Se realiza inspección en campo del tramo La Cañada - Zumbe donde se evidencia que no hay presencia del personal del contratista YVY, ni tampoco subcontratista, también se observa el deterioro de la señalización instalada en las alcantarillas generando de esta manera un riesgo para la comunidad que transita por este sector.
- Se realizó visita al tramo de Yacopí para levantamiento y revisión de alcantarillas donde se evidenciaron puntos críticos de intervención que no fueron priorizados en la etapa inicial
- Se realizó reunión de socialización de los compromisos y avances de obra correspondientes al tramo La Cañada – Zumbe, con el objetivo de informar a la comunidad y actores institucionales sobre el estado actual del proyecto. Asistentes: Alcaldía Municipal, ICCU, Interventoría, Contratista, presidentes de las Juntas de Acción Comunal y Comunidad en general
- Se realizó una visita técnica al sector La Cañada con la participación de la interventoría, el contratista y el equipo de Zumbe, con el objetivo de efectuar una inspección detallada de las alcantarillas existentes para fortalecer la seguridad vial y peatonal; durante la jornada se llevó a cabo la revisión técnica de estas estructuras, la identificación de puntos críticos y la instalación de señalización preventiva en los sitios de mayor riesgo, acciones orientadas a mitigar la accidentalidad y mejorar las condiciones de tránsito, mientras la interventoría continuará realizando seguimiento para garantizar la permanencia y adecuada visibilidad de la señalización instalada.
- La interventoría verificó el ingreso de nuevo personal por parte del subcontratista en la provincia de Río Negro – La Palma, encontrándose en proceso de validación las certificaciones de afiliación a seguridad social; asimismo, se constató que el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo de sus labores. El área de SST del contratista realizó una charla de capacitación y acompañamiento general en el frente de obra, reforzando la importancia del uso adecuado y permanente de los EPP. En cuanto a las actividades en campo, en la provincia de Río Negro, frente La Palma, se dio continuidad a los trabajos en las alcantarillas identificadas como cruce 3, cruce 5 y cruce 6, así como al perfilamiento y adecuación de las estructuras de encole y descole, con el propósito de realizar posteriormente la fundida de solado y la instalación de canastas de acero.

- Se supervisó la construcción del sistema de alcantarillado ejecutada por el personal subcontratista, verificando el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP) durante el desarrollo de las labores; adicionalmente, se brindó acompañamiento a la administración municipal de Yacopí en la socialización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con la comunidad local.
- Se evidenció que no se encontraba disponible, ni en físico ni en formato digital, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el frente de obra La Cañada-Zumbe; asimismo, se detectó el uso de una mezcladora manual y herramientas menores sin el diligenciamiento de los formatos preoperacionales obligatorios para la jornada, y se observó personal operativo realizando labores sin el uso de la dotación institucional reglamentaria.
    - Tras realizar una inspección aleatoria al vehículo de placas TLX972, se identificaron condiciones críticas de seguridad, entre ellas que el extintor de incendios se encuentra despresurizado y con la carga vencida (fecha de expiración 2025), lo que anula su efectividad ante una emergencia; adicionalmente, los insumos del botiquín de primeros auxilios presentan fechas de caducidad vencidas, lo que representa un riesgo sanitario y un incumplimiento de los protocolos de respuesta ante emergencias.

Provincia de Almeidas

- En el municipio de Manta se ejecutaron actividades de conformación de rasante y cunetas en subtramos previos a su estabilización; asimismo, se realizó el retiro manual de material vegetal de las cunetas y se dispuso material de cemento antes del inicio del proceso. Se evidenció que el personal en obra no cuenta con la dotación ni con los Elementos de Protección Personal (EPP) establecidos en el contrato; adicionalmente, se llevó a cabo la estabilización de un tramo mediante la aplicación de un químico estabilizante, durante la cual se realizaron tres ensayos de humedad, observándose nuevamente que el personal portaba dotación diferente a la del proyecto y carecía de los EPP adecuados.
- En el municipio de Sesquilé se realizaron actividades de armadura de acero en la alcantarilla #4 se indica a la residente el uso de la motobomba para el desagüe y poder fundir, el personal asignado para el frente se evidencia que no cuenta con EPP y dotación respectiva al contrato.
- En el municipio de Chocontá no se evidencio actividades ni personal en el frente de obra.
- En el municipio de Sesquilé se realizaron actividades de campo en alcantarillas, enfocadas en la terminación de su construcción mediante la ejecución de ajustes finales; en el municipio de Chocontá, las actividades de campo se encuentran suspendidas debido a maquinaria averiada; mientras que en el municipio de Manta

se adelantaron labores de aseo en las alcantarillas.

Provincia de Ubaté

- Se emitió un oficio desde las áreas Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), debido a que se evidenció que la nueva profesional social del contratista no contaba con los Elementos de Protección Personal (EPP) ni con la dotación requerida, situación que generaba inconvenientes con la comunidad; asimismo, se constató la ausencia de los elementos de trabajo necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones

3.6 Gestión Predial

Durante el mes de abril no se presentaron afectaciones prediales.

3.7 Gestión sostenibilidad

A la fecha, la etapa de ejecución del proyecto se encuentra pendiente y en proceso de empalme por parte del Contratista, dado que aún no se ha finalizado la fase de caracterización. Cabe señalar que la gestión de sostenibilidad no fue contemplada contractualmente en la etapa de caracterización ni en el anexo técnico, motivo por el cual no debía adelantarse en dicha fase. En este sentido, la sostenibilidad del proyecto estará a cargo del Contratista y se desarrollará en la tercera fase (ejecución), estando sujeta a la revisión y aprobación de la Interventoría.

3.8 Sectorización del proyecto y modificaciones

Tabla 32. Sectorización de proyecto y modificaciones.

LA PALMA

LONG TRACK INICIAL ICCU	20.5	km
PH TRACK CAMPO	0.923	km
TRAMO CON DESCUENTO	19.577	km
SALDO	0.923	km

YACOPÍ

LONG TRACK INICIAL ICCU	20.15	km
T1	4.14745	km
T2	3.609	km
T3	13.61227	km
TOTAL, TRAMOS	21.36872	km
PH	1.22156	km
TRACK CAMPO 3 TRAMOS INCLUYENDO DESCUENTOS POR PH	20.15	km

TOPAIPÍ

LONG TRACK INICIAL ICCU	23.2	km
PH TRACK CAMPO	2.92366	km
TRAMO CON DESCUENTO	20.27634	km
SALDO	2.92366	km
PH PROYECTADAS	2.05	km
PH EN PROCESO DE PROY	0.2	km
SALDO	5.17366	km

VILLAGOMEZ

LONG TRACK INICIAL ICCU	2.51	km
PH TRACK CAMPO	0.345	km
TRAMO CON DESCUENTO	2.165	km
SALDO	0.345	km

UBATÉ

LONG TRACK INICIAL ICCU	7.8	km
PH TRACK CAMPO	0.18062	km
TRAMO CON DESCUENTO	7.61938	km
SALDO	0.18062	km

TAUSA

LONG TRACK INICIAL ICCU	6.71	km
PH TRACK CAMPO	0.73831	km
TRAMO CON DESCUENTO	5.97169	km
SALDO	0.73831	km

SUSA

LONG TRACK INICIAL ICCU	6.71	km
PH TRACK CAMPO	0.73831	km
TRAMO CON DESCUENTO	5.97169	km
SALDO	0.73831	km

SIMIJACA

LONG TRACK INICIAL ICCU	5.72	km
PH TRACK CAMPO	2.26755	km
TRAMO CON DESCUENTO	3.45245	km
SALDO	2.26755	km

MANTA

LONG	8.98	km
PH	2.0343	km
TRAMO CON DESCUENTO	6.9457	km
TRAMO ADICIONAL	1.883	km

CHOCONTÁ

LONG TRACK INICIAL ICCU	8.64	km
TRACK CAMPO	9	KM
PH TRACK CAMPO	2.3347	km
TRAMO CON DESCUENTO	6.6653	km
SALDO	1.9747	km

SESQUILE

LONG TRACK INICIAL ICCU	17.44	km
TRACK CAMPO	17.35352	KM
PH TRACK CAMPO	3.20548	km
TRAMO CON DESCUENTO	14.14804	km
SALDO	3.29196	km

Nota: esta fue la identificación inicial de tramos realizada para obtener los puntos iniciales y finales, en la etapa de caracterización por parte del contratista se levantará a detalle la información de cada sector.

3.9 Socialización del proyecto

En el presente mes no se registran modificaciones en el proyecto. La prorroga No 1 ya fue socializada con las alcaldías municipales y comunidades en los primeros meses de la vigencia, por lo que se mantiene la misma información en los informes. En caso de generarse alguna novedad o ajuste, se realizará la anotación correspondiente.

La identificación inicial de tramos realizada en marzo y abril de 2025 tuvo como propósito establecer los puntos de inicio y final de cada vía. El levantamiento detallado de la información de cada sector será desarrollado en la etapa de ejecución, bajo responsabilidad del contratista.

En las visitas de campo se elaboraron actas de localización y actas de reunión (ver Anexo 11 – Actas de reunión) con el fin de dejar constancia formal de las actividades. Las actas de reunión cuentan con las firmas respectivas, mientras que las actas de localización permanecen en revisión por parte de las alcaldías municipales y están pendientes de suscripción, motivo por el cual no se anexan en este informe.

Tabla 33. Socialización proyecto

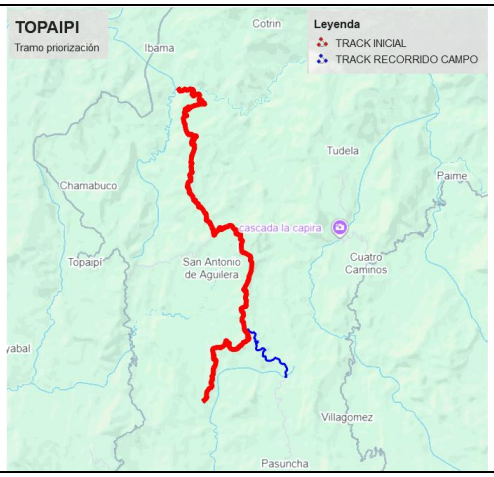
N° DE ACTA	FECHA	ASUNTO
4	19-mar-25	socialización proyecto LA PALMA
5	20-mar-25	socialización proyecto YACOPI
6	19-mar-25	socialización proyecto TOPAIPI
7	21-mar-25	socialización proyecto VILLAGOMEZ
13	31-mar-25	Socialización proyecto SUSA

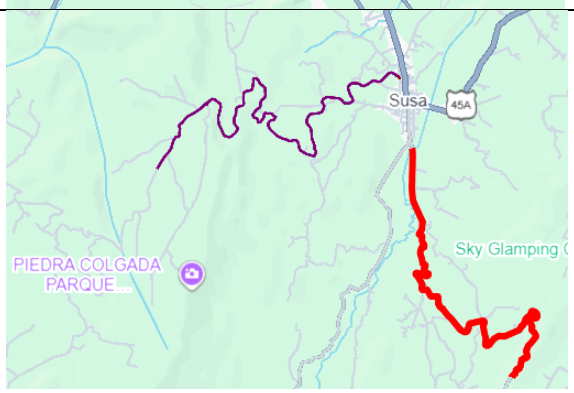
14	7-abr-25	Socialización proyecto MANTA
15	29-mar-25	Socialización proyecto TAUSA
17	7-abr-25	Socialización proyecto CHOCONTA
18	8-abr-25	Socialización proyecto SESQUILE
19	31-mar-25	Socialización proyecto SIMIJACA
21	29-mar-25	Socialización proyecto UBATE

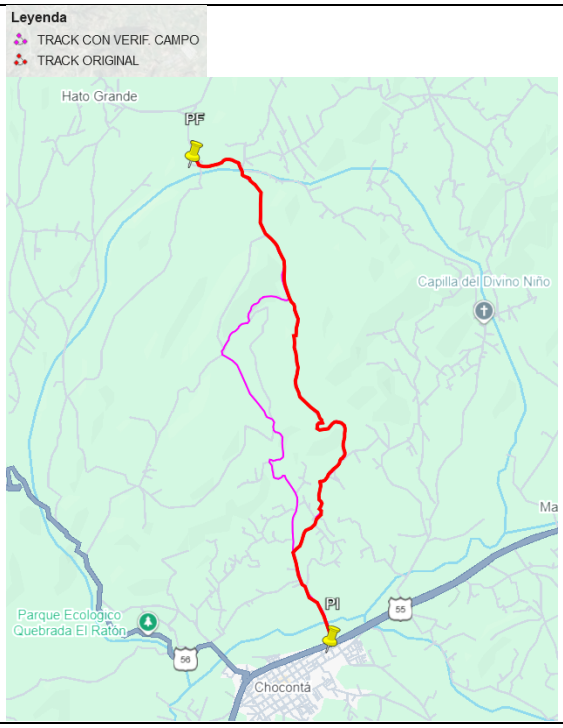
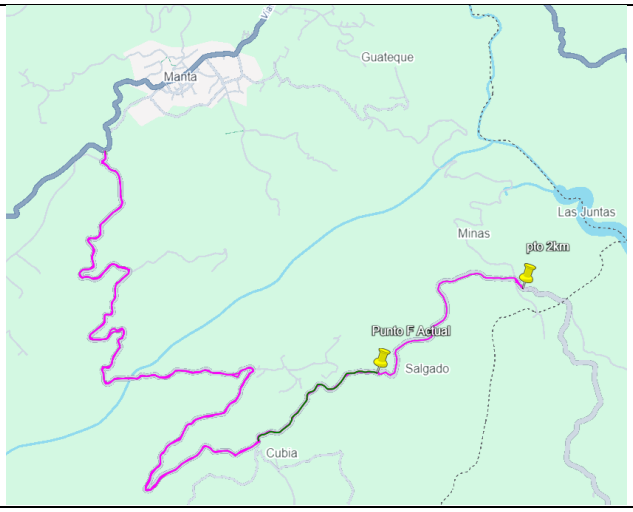
Como resultado de las socializaciones del proyecto, realizadas a las alcaldías municipales, se identificaron novedades en algunos de los tramos inicialmente definidos. Estas observaciones fueron debidamente informadas al ICCU durante la reunión del 10 de abril de 2025, según consta en el Acta de Reunión Nº10.

A la fecha, varias alcaldías aún no han suscrito las respectivas actas. Se les ha reiterado que permanecemos a la espera de sus firmas para poder dar por finalizado este componente y consolidar formalmente la información de los tramos priorizados. **Ver Anexo 11 Actas de reunión.**

Tabla 34. Novedades de acta N°10.

MUNICIPIO	NOVEDAD
TOPAIPI En la parte final del tramo se aclara por el alcalde y por el secretario de planeación que la ruta principal va por la parte señalada en color azul. En la reunión del 10 de abril de 2025 (Acta de reunión Nº10) con ICCU- Interventoría y contratista se informó por parte del ICCU que efectivamente el tramo principal es el señalado en azul.	

UBATÉ El punto señalado como PF2 tendría un cambio de ubicación por lo que está por definición Alcaldía – ICCU.	
SUSA La Alcaldía informa que pasará solicitud ante ICCU para que se priorice la vía que se presenta en color morado, por lo que según lo indicado por la entidad debe presentar una comunicación justificando debidamente la solicitud y la importancia de la vía seleccionada. Vía Susa - (Carmen de Carupa-las vueltas) vía la cual solicito el municipio en comunicado oficial al ICCU finalmente para intervención.	

CHOCONTA Se aclara por el alcalde y por el secretario de planeación que la ruta principal va por la parte señalada en color magenta.	
MANTA Se Informó por la Alcaldía que se solicitará ante el ICCU ampliación del tramo hasta la zona Y (minas). El tramo actual tiene 2km de placa huellas por lo que se evaluaría este caso.	

SIMIJACA Presenta 2 sectores del tramo con pavimentos existente el cual presenta fallas equivalentes a 2.26km por lo que en la reunión del 10 de abril de 2025 (Acta de reunión Nº10) se solicitó al contratista evaluar si dentro del balance del contratista es posible generar un APU de fresado y pasar una propuesta la vía se encuentra en tercer orden.	

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informes semanales mes de abril

Se anexan los informes semanales presentados en el periodo Ver Anexo. 1. Informes semanales abril.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

La maquinaria propuesta por el contratista para la etapa de ejecución fue presentada por el contratista en el comunicado OFICIO YVY-171-25. La respuesta fue remitida con el comunicado ICCU-S-213-2025 del 29 de agosto 2025. No se ha emitido respuesta a las observaciones por parte del contratista.

Tabla 2 Lista de observaciones sobre los documentos de la maquinaria

MAQUINARIA	N° INTERNO	OBSERVACIONES
VIBROCOMPACTADOR	VC838	-
	VC912	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC913	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC923	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC925	-
EXCAVADORA	EX070	-
	EX069	-
	EX067	-
	EX026	La tarjeta de registro de maquinaria no es visible en su totalidad.
	EX002	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
MOTONIVELADORA	MT738	En la certificación de monitoreo y localización no registra número de motor.
	MT988	-
	MT977	-
	MT376	La tarjeta de registro de maquinaria esta borrosa y no se encuentra la declaración de importación.
	MT045	-

En el periodo se registra maquinaria únicamente en el tramo de Manta.

MANTA	Motoniveladora
	Recicladora
	Vibro compactador
	Carrotanque

Mediante comunicado YVY-051-2026, el que el contratista remite documentación de maquinaria para 5 excavadoras, 5 motoniveladoras y 5 vibro compactadoras incluyendo declaración de importación y tarjeta de registro. Se encuentra pendiente por remitir por parte del contratista la documentación de la Recicladora.

4.3 Personal, control Aporte Legales y seguridad social contrato de obra

Este documento se encuentra anexo en el Informe SST, dentro del apartado de documentación del contratista. **Anexo informe 7 SST**.

4.4 Control de aportes legales y seguridad social

En el presente informe se adjuntan las planillas individuales del personal correspondiente al pago de la seguridad social de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia y la planilla general del Consorcio Intervial ICCU 050. **Ver anexo 7 Informe SST**.

Así mismo, se anexan las certificaciones del pago de parafiscales de las dos empresas que conforman el Consorcio Intervial ICCU 050 firmados por el Revisor Fiscal y por el Representante Legal. Ver anexo control de aportes y seguridad social.

4.5 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Por parte del ICCU se ha realizado el pago correspondiente al primero y segundo pago del 25% correspondiente a la etapa de Caracterización . El 3er pago del 25 % el contratista debe remitir la cuenta de cobro con todos los soportes para su verificación y tramite, al respecto el contratista informa que está esperando los últimos ensayos que está realizando los cuales constituyen soporte de la cuenta. Quedando pendiente el ultimo 25% contra aprobación de los informes Fase 1 y Fase 2 resultado de la etapa de caracterización.

Al momento se han tramitado las siguientes cuentas para pago:

Cuenta No.	Concepto	Valor bruto (sin IVA)
FC 2	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRAPUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR MEDIO DELCONSORCIO YVY - ELABORACIÓN DE PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.	$559.419.000
FC 3	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR MEDIO DELCONSORCIO YVY – 50% DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN	$559.419.000

Ver Anexo 2 Informe Administrativo y Financiero.

4.6 Estado general del tiempo

Se adjunta formato de seguimiento del estado del tiempo y estado de la superficie, respecto a los días y tramos donde se presentó actividad por parte del contratista.

Ver en Anexo 5. Informe de Residente de Interventoría – Formatos Estado del tiempo.

4.7 Aclaraciones y Evidencias para Protección del Instituto

Se remiten todos los comunicados correspondientes con el avance y seguimiento de la obra a la supervisión con el fin de reportarles todo ser clara la información.

4.8 Resumen Ensayos de Laboratorio

Mezcla de suelo+ cemento + organosilanos (Terrasil) + emulsión enzimática (Ecoenzyme).

- De los resultados entregados y con referencia a la conclusión del contratista: "se concluye que la dosificación final recomendada es Cemento 3%, Terrasil 1 L/m³ y Ecoenzyme 0.06 L/m³, representando el punto óptimo entre cementación efectiva y protección hidrofóbica, maximizando la estabilización en suelos finos susceptibles al agua y garantizando un comportamiento resistente y durable a largo plazo.", se analizó y encontró:

- La mezcla de suelo+ cemento (3%) + enzima (0.1 l/m3) da valores superiores a 0.5 Mpa, pero inferiores a 1 Mpa.

- La mezcla de suelo+ cemento (3%) + terrasil (1 kg/m3) da valores superiores a 0.7 Mpa, pero inferiores a 1 Mpa

- La mezcla de suelo+ cemento (3%) + terrasil (1 kg/m3) + enzima (0.06 l/m3) da valores superiores a 1 Mpa, en los resultados de 4 probetas y en 2 probetas valores mayores a 0.8 Mpa.

La Interventoría encuentra que se puede respetar la conclusión del Contratista y la recomendación de la dosificación final de diseño, considerando su autonomía técnica, su responsabilidad de estabilidad de los trabajos ejecutados.

- Respecto a Control de Fórmulas de trabajo, métodos constructivos y procesos de ejecución, se efectuó revisión de las proporciones a considerar en campo, se efectuó revisión de los procesos constructivos, considerando las recomendaciones del proveedor de los aditivos, que se recibieron con comunicación YVY- 034- 2026 e indicaciones directas que manifestó del proceso.

- Igualmente, se le remitieron al Contratista recomendaciones para la ejecución del tramo de prueba, con las comunicaciones ICCU-S-062-2026 e ICCU-S-065-2026, con el propósito que se tuvieran todas las previsiones y se adelanten los trabajos con procesos que permitan obtener un buen resultado.

Mezcla de suelo+ cemento + ceniza

Con la comunicación YVY- 037 – 2026 se recibieron resultados de laboratorio sobre lo cual se observa:

- Hay diferentes proporciones de la mezcla, pero todos consideran 4% de cenizas M1 o M2, lo que varía es la proporción de cemento entre 2% y 3%.

- Se observa que, presenta mejor resultado la ceniza M2, pero la diferencia de resultados entre las diferentes combinaciones no es significativa. Refiriéndose a la mezcla con cenizas M1, el comportamiento es mejor con el 3% de cemento.

- Los resultados obtenidos con 3% de cemento son próximos al valor de 1Mpa:

PROBETA No. ***	OBSERVACIONES	FECHA DE MOLDEO ***	EDAD DIAS ***	FECHA ROTURA ***	TIPO DE ESTABILIZACIÓN ***	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	MASA (g)	CARGA (kN)	AREA mm^2	DENSIDAD (kg/m^3)	RELACIÓN L/D	ESFUERZO DE ROTURA (MPa)
1	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M1	49,50	101	368	1,901	1924,50	1890	2,04	0,99
2	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M1	49,50	101	365	1,899	1924,50	1880	2,04	0,99
3	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M1	49,50	101	371	1,904	1924,50	1910	2,04	0,99
4	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M1	49,50	101	367	1,889	1924,50	1890	2,04	0,98
5	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M1	49,50	101	370	1,886	1924,50	1900	2,04	0,98

OBSERVACIONES: CHOCONTA SUELO+3%CEMENTO+4% CENIZA M1

PROBETA No. ***	OBSERVACIONES	FECHA DE MOLDEO ***	EDAD DIAS ***	FECHA ROTURA ***	TIPO DE ESTABILIZACIÓN ***	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	MASA (g)	CARGA (kN)	AREA mm^2	DENSIDAD (kg/m^3)	RELACIÓN L/D	ESFUERZO DE ROTURA (MPa)
1	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M2	49,50	101	372	1,889	1924,50	1920	2,04	0,98
2	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M2	49,50	101	372	1,902	1924,50	1920	2,04	0,99
3	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M2	49,50	101	372	1,895	1924,50	1910	2,04	0,98
4	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M2	49,50	100	369	1,899	1924,50	1920	2,02	0,99
5	WH	2026-01-23	7	2026-01-30	CENIZA M2	49,50	101	374	1,905	1924,50	1920	2,04	0,99

OBSERVACIONES: CHOCONTA SUELO+3 %CEMENTO-4%CENIZA-M2

El Contratista manifiesta al respecto:

- En particular, los resultados obtenidos muestran esfuerzos de rotura del orden de 0,95 a 0,99 MPa, con una dispersión reducida entre probetas, lo cual indica un proceso de estabilización químicamente eficiente y repetible. Si bien estos valores no alcanzan estrictamente el umbral nominal de 1,0 MPa, se observa que el desempeño mecánico se encuentra muy cercano a dicho valor de referencia, dentro de un rango que, desde el punto de vista ingenieril, puede considerarse aceptable para capas tratadas en vías de bajo volumen de tránsito, especialmente cuando se analiza el comportamiento esperado en campo y no únicamente el resultado puntual de laboratorio

- En consecuencia, y considerando el carácter preliminar de los ensayos, se recomienda la ejecución de un tramo de prueba en campo, bajo condiciones controladas de mezcla, extendido y compactación.

- La implementación de este tramo de prueba permitirá reducir incertidumbres técnicas, validar la solución propuesta antes de su aplicación masiva y garantizar que la estabilización seleccionada cumpla con los objetivos estructurales y de durabilidad exigidos por el programa del ICCU, manteniendo un enfoque costo–eficiente y técnicamente responsable

El tema fue tratado en comité del 23 de febrero, en el que la Interventoría manifestó que se podía hacer tramo piloto con la advertencia que el Contratista asume la responsabilidad, dado que entre otros aspectos el Contratista en el diseño considera la mezcla de material de afirmado con subrasante, el Contratista manifestó que su responsabilidad está en las pólizas de estabilidad. Por lo tanto, se acordó en este comité proceder a lo necesario para implementar el tramo en el Municipio de Chocontá

4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A la fecha se tienen las siguientes pólizas vigentes por parte del contratista:

El plazo contractual inicial del contrato de obra ICCU-139-2025 tenía como fecha de terminación 31 de diciembre 2025, posteriormente se adelantó prorroga al contrato, por tanto, se actualizaron las pólizas del contrato, quedando vigentes las siguientes:

Tabla 35. Pólizas

POLIZA	REFERENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10_NB-100367480 Anexo 3 Certificado 72717222	Desde:24 ene 2025 Hasta: 30 May 2029

4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Se informa que el día 28 de marzo 2025 el contratista presentó el plan de calidad para el proyecto con el comunicado YVY-008-25. La Interventoría emitió observaciones al mismo mediante comunicado ICCU-S-016-2025 de fecha 9 de abril 2025. Posteriormente se recibió comunicado YVY-033-25 de fecha 25 de abril 2025 y la Interventoría emitió nuevamente observaciones en cuanto a solicitud de profundizar respecto a controles en campo mediante comunicado ICCU-S-176-2025 del 5 de agosto 2025. Por lo anterior a la fecha se encuentra pendiente por el contratista la remisión del plan subsanando las observaciones, para la aprobación del mismo. En el periodo anterior se remitió reiteración de solicitud del plan de calidad del contratista mediante comunicado ICCU-S-028-2026 del 20 de enero 2026, sin que a la fecha se haya remitido la subsanación de observaciones a la interventoría

El contratista ha remitido las fichas técnicas de los estabilizantes químicos que ha probado en laboratorio de acuerdo con la solicitud realizada por la Interventoría:

Tabla 36. plan de calidad

Comunicado	Objeto
YVY-106-25	Remisión fichas técnicas estabilizantes Con-Aid, Geossil y Pro-Road
YVY-223-25	Ficha técnica y manual de instalación estabilizante D-STB-WAY
YVY-013-25	Documentos y certificados de calibración equipos, laboratorio. Terratest.
YVY-034-26	Remisión procedimiento constructivo mezcla Terrasil y Ecoenzyme.

4.11 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

En el periodo se realizaron observaciones en cuanto a las actividades de ejecución del contratista en campo, bitácora de obra y comunicados. Lo cual se informa a detalle en el numeral 3.4 etapa de Ejecución, título: Observaciones o requerimientos por parte de la Interventoría al contratista en el periodo de ejecución.

Igualmente se realizan seguimientos semanales técnicos al contrato de obra, dejando registro de compromisos y cumplimientos de compromisos.

4.12 Otros documentos seguimiento mensual

4.12.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El contratista presentó el plan de inversión del anticipo con el comunicado YVY-004-25 de fecha 26 de marzo 2025, la Interventoría dio aprobación al plan de inversión con el comunicado ICCU-S-015-2025 de fecha 19 de abril 2025. Se recibió el plan de inversión del anticipo modificado de acuerdo con la solicitud de ajuste de la cuenta de cobro del anticipo comunicados YVY-139-25 y YVY-148-25 respectivamente, del 14 y 17 de julio 2025 respectivamente, el cual fue firmado por Interventoría. El 25 de julio 2025 se remitió al ICCU la solicitud del contratista del 30% de anticipo de la etapa de caracterización de acuerdo con ICCU-S-152-2025.

Tabla 37. Seguimiento a la inversión de anticipo

CONSECUTIVO	CONCEPTO	VALOR 30%	ESTADO
ICCU-S-152-2025 – 25 jul 2025	Remisión solicitud de anticipo etapa de ejecución	$10.330.896.504	En fiducia constituida

A la fecha en cuanto a las Ordenes de operación presentadas se tiene el siguiente estado:

Tabla 38. Plan de inversión de anticipo aprobado

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO APROBADO				TOTAL APROBADO	SALDO ANTICIPO
DESCRIPCION	VR ANTICIPO	SUBTOTAL	%		
INSUMOS O MATERIALES	$ 4.740.331.861,00	$4.740.331.861	48,30%	$ 733.171.548,94	$4.007.160.312,06
EQUIPOS y/O HERRAMIENTAS	$ 1.609.553.675,00	$ 1.609.553.675	16,40%	$ -	$ 216.468.812,20
TRANSPORTE	$ 912.734.706,00	$ 912.734.706	9,30%	$ 696.265.893,80	216.468.812,20
MANO DE OBRA	$ 2.551.731.436,00	$ 2.551.731.436	26,00%	$275.676.435,00	$2.276.055.001,00

TOTAL	$ 9.814.351.678,00	**$ 9.814.351.678,00**	100,00%	**$1.705.113.877,74**	**$8.109.237.800,26**

A la fecha del presente informe se ha recibido 30 solicitudes de ordenes de operación de parte del contratista, de las cuales, 22 han sido aprobadas y tramitadas, y las otras 8, han sido observadas, o el contratista ha desistido de la solicitud.

4.12.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN

Pagos por caracterización

Tabla 39. Seguimiento programa de obra

Cuenta No.	Concepto	Valor bruto (sin IVA)
FC 2	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRAPUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR MEDIO DELCONSORCIO YVY - ELABORACIÓN DE PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.	$559.419.000
FC 3	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR MEDIO DELCONSORCIO YVY – 50% DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN	$559.419.000

Del 3er pago del 25 % el contratista debe remitir la cuenta de cobro con todos los soportes para su verificación y tramite. el contratista informa que está esperando los últimos ensayos que está realizando los cuales constituyen soporte de la cuenta. Quedando pendiente el ultimo 25% contra aprobación de los informes Fase 1 y Fase 2 resultado de la etapa de caracterización.

4.12.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

En cuanto al cronograma presentado por el contratista con el comunicado YVY-035-25 se realizó el seguimiento encontrando lo siguiente:

Etapa de caracterización:

A la fecha, el contrato registra un atraso del 4.64% en la Etapa de Caracterización registrando un avance 95.36%, en cuanto a diseño fase 1 se presentó por el contratista el informe subsanando algunas de las observaciones de la Interventoría. Diseño fase II: en el periodo se presentó por el contratista Balance y APU estabilización con Organosilanos y Emulsiones Enzimáticas por parte del contratista YVY-017-2026, indica que cumple para Manta y Ubaté, no anexa soportes. Así mismo, el contratista remitió presupuestó Manta y Ubaté con estabilización Organosilanos y Emulsión Enzimática YVY-

020-2026. Respecto a las observaciones de diseño Fase 2 no se remitió respuesta por el contratista en este periodo, se informa en las reuniones de seguimiento que el contratista se encuentra haciendo pruebas en laboratorio con el estabilizante Terrasil y Ecoenzime

En cuanto a laboratorios: El contratista se compromete a la entrega de estos en los diferentes comités, sin embargo, a la fecha no ha hecho entrega de ningún informe soportado.:

Etapa de ejecución:

En el presente periodo se registra avance en ejecución de actividades de construcción de alcantarillas y se reporta avance en mejoramiento de rasante.

4.13 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Transcurridos 13 meses del proyecto el contratista tiene pendientes las actividades de caracterización en cuanto a la entrega de la fase 1 y fase 2 de la caracterización. En cuanto a la entrega del informe fase 1 está pendiente observaciones menores del informe y en cuanto a la fase 2 el contratista indica que se encuentra realizando ensayos en laboratorio con una nueva fórmula del estabilizante en búsqueda de disminuir los costos y así poder aumentar el alcance de ejecución. Se ha hablado la posibilidad de que el contratista remita por tramo los informes de los tramos que han dado resultados de cumplimiento del parámetro de resistencia establecido.

Al respecto la Interventoría ha continuado con el seguimiento a las actividades en ejecución por el contratista, ha promovido mesas de trabajo y ha instado al Contratista con el fin de dar cumplimiento y finalización de estas fases. Sin embargo, se deja como antecedente que en los periodos anteriores se remitió un presunto incumplimiento por parte del contratista, por lo cual se inició un proceso. El 30 de octubre 2025 se recibió resolución 1328 de 2025 en la cual se indica que se resuelve el proceso sancionatorio 010 de 2025, se indica que a la fecha se encuentran subsanados los causales por parte del contratista. En el periodo se remitió al contratista comunicado ICCU-S-014-2026 de requerimiento Incumplimiento en el reinicio de actividades en obra y entrega de Cronograma detallado por municipio, así como el comunicado ICCU-S-042-2026 Incumplimientos reiterados en la ejecución de las actividades técnicas y sociales a cargo del Consorcio YVY en las Provincias de Ubaté, Rionegro y Almeidas, se remitió también el comunicado ICCU-S-041 con el informe del estado del contrato de Obra. Igualmente se sostuvo mesas de trabajo en conjunto con la entidad contratante ICCU.

Se relaciona las diferentes reuniones técnicas que se han generado de seguimiento al contratista en el periodo:

Nº DE ACTA	FECHA	ASUNTO	PARTICIPANTES
79	10-Apr-26	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
80	17-Apr-26	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
81	22-Apr-26	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
82	30-Apr-26	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoría

El **Contrato de Interventoría No. ICCU-220 de 2025**, suscrito en el marco del Programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, tiene como finalidad la interventoría integral al contrato de obra No. ICCU-139 de 2025, correspondiente a la intervención de vías rurales en los municipios de las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro, en el departamento de Cundinamarca.

Datos contractuales relevantes:

- **Número del proceso de selección:** ICCU-CM-050 DE 2024
- **Número del contrato:** ICCU-220 de 2025
- **ID SECOP:** CO1.PCCNTR.7439044
- **Fecha de Inicio:** 1 de abril de 2025

Contratista: Consorcio Intervial ICCU 050

- **Representante legal:** Claudia Liliana Ramirez Gaitan
- **Cédula:** 52.263.288
- **Dirección:** Calle 98 # 21 – 50, Piso 3, Bogotá D.C.

Integrantes del consorcio y composición accionaria:

TPF Getinsa Euroestudios Colombia S.A.S.

- NIT: No informado (matriz: TPF S.A. con 98.19%)
- Accionistas minoritarios: Gregorio López Vallejo (0.75%), Jonathan Morgan (0.76%), Ahmed El Khadri (0.07%), José Manuel Ballesteros (0.23%)

Euroestudios Ingenieros de Consulta S.A.S.

- NIT: 84840685
- 100% propiedad de TPF Getinsa Euroestudios S.L.

Valor y condiciones del contrato:

- **Valor inicial y actual:** $3.865.474.025
- **Anticipo otorgado:** $773.094.805 (Girado)
- **Pagos efectuados a la fecha:** Se han solicitado seis (6) usos de anticipo por un valor total de $757.902.745. Este valor incluye el impuesto de timbre, el cual fue descontado directamente por la entidad antes del giro de los recursos a la interventoría, por un valor de **$32.482.975**.
- A la fecha el ICCU ha realizado el pago de siete (7) actas de costos de interventoría que suman un valor de $ 1.329.763.203 y queda **un saldo por pagar de:** $2.535.710.822, en este valor no se incluye la amortización del anticipo.
- **Plazo del contrato:** 274 días calendario
- **Fecha de inicio:** 1 de abril de 2025
- **Fecha de terminación contractual:** 31 de diciembre de 2026
- **Fecha de terminación actual:** 31 de mayo de 2026
- **Prorroga:** Cinco (5) meses
- **Modificaciones contractuales:** Prorroga No. 1

Ordenadora del gasto: Arquitecta Yesenia Herreño Bernal

Directora de caminos: Ingeniera Laura Daniela Nieto Gutiérrez

Supervisor de la Subdirección de Caminos vecinales para el contrato: Ing. Gabriel Felipe Lozano Ponguta

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Se describen en el numeral 3.2

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de abril de 2026, se contó con el acompañamiento y participación de profesionales y especialistas en los componentes de Geotecnia, Pavimentos y de obra. cuyas actividades se describen a continuación:

5.3.1 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Durante el mes de abril de 2026, la especialista en Geotecnia adelantó actividades de seguimiento técnico y revisión documental.

Es importante señalar que el informe mensual del Contratista correspondiente al mes de marzo de 2026 no trató el componente de Geotecnia, por lo que no se contó con información técnica específica de dicho componente para su revisión y análisis. En consecuencia, no fue posible adelantar una evaluación documental de los diseños o actividades geotécnicas del periodo.

No obstante, se mantienen las observaciones previamente formuladas sobre los diseños presentados por el Contratista, los cuales corresponden a detalles tipo extraídos de la cartilla del INVIAS, sin que se adjunte memoria de cálculo ni justificación técnica específica para cada sitio del proyecto. En consecuencia, se requiere que el Contratista complemente la información con:

- Criterios de selección del tipo de muro propuesto.
- Parámetros geotécnicos del suelo de fundación.
- Capacidad portante asumida para el diseño.
- Perfil estratigráfico correspondiente a cada punto de implantación.
- Justificación de estabilidad (deslizamiento, volcamiento y capacidad de soporte).

La Interventoría se encuentra a la espera de la subsanación de observaciones al informe de la Fase 2, toda vez que no es posible emitir concepto de aprobación sin la memoria técnica y los parámetros de diseño correspondientes.

5.3.2 ESPECIALISTA PAVIMENTOS

Durante el mes de abril de 2026, el especialista en pavimentos centró sus actividades en la revisión técnica de los estudios de estabilización química presentados por el Contratista y en la emisión de conceptos sobre resultados de campo y laboratorio.

Actividades desarrolladas:

Revisión Informe Fase II: Se efectuó seguimiento a las observaciones formuladas mediante comunicado ICCU-S-017-2026 (15 de enero de 2026), relacionadas con la falta de sectorización de los tramos. El Contratista remitió la comunicación YVY-035-2026 con resultados de laboratorio para materiales de Simijaca y Manta, los cuales carecían de análisis. La Interventoría remitió el comunicado ICCU-S-069-2026 indicando que la

información entregada no permite concluir si las justificaciones del Contratista corresponden con lo observado en la caracterización.

Recomendaciones: La Interventoría insiste en que el Contratista atienda las observaciones efectuadas desde el mes de enero, presente los diseños por vía cumpliendo con lo exigido en el pliego y sustente la metodología asumida. Asimismo, se requiere la presentación del diseño específico para los materiales a utilizar en el Tratamiento Superficial Doble (TSD) y un informe de seguimiento de los tramos piloto ya construidos.

Conclusiones de Pavimentos:

Durante el mes de abril de 2026, la Interventoría mantuvo seguimiento técnico riguroso sobre los diseños de pavimentos, verificando cumplimiento contractual, coherencia estructural y viabilidad técnica de las soluciones propuestas.

Aunque se presentaron mejoras en la presentación del informe del Contratista, aún no se han recibido informes de diseño definitivo por vías.

Se logró un avance importante al iniciar el tramo piloto en Manta y dejar planteada la iniciación en Ubaté y Chocontá

Ver Anexo 10. Informe de Especialistas - Pavimentos.

5.3.3 ESPECIALISTA HIDRÁULICO

Durante el mes de abril de 2026, el especialista en pavimentos centró sus actividades en la revisión técnica de los estudios de estabilización química presentados por el Contratista y en la emisión de conceptos sobre resultados de campo y laboratorio.

5.3.4 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Las actividades realizadas se describen en el numeral 3.2 **Ver Anexo 5. Informe de Residente.**

Reporte de ejecución mensual contrato de interventoría

Las actividades realizadas se describen en el numeral 3.2

Conclusiones y recomendaciones

- Respecto a la prórroga actual hasta el 31 de mayo 2026 del contrato de obra, la Interventoría ha emitido comunicados de incumplimiento en actividades de ejecución por parte del contratista.
- Finalización etapa de caracterización El 30 de junio 2025 finalizó la etapa de caracterización, esta etapa contempla la entrega de informes Fase I y fase II lo cual incluye la caracterización de los suelos y las propuestas de diseño. A la fecha la Interventoría mediante comunicacion **ICCU-S-169-2026 "Respuesta a YVY-089-26 - Aprobación Informe Fase I."** de fecha 17 de abril aprobó el informe Fase I, sinembargo a la fecha de corte del presente informe no se ha recibido el informe Fase II para poder proceder a dar por terminada la etapa de caracterización, al respecto la Interventoría ha continuado con el seguimiento a las actividades en ejecución por el contratista, ha promovido mesas de trabajo y ha instado al contratista con el fin de dar cumplimiento y finalización de estas fases. En el periodo el contratista informa que continua con el proceso de ensayos de estabilizantes en los tramos para tener una reducción de costos, se solicitó por Interventoría un muestreo conjunto del estabilizante que está estudiando y se propone por el contratista hacer un tramo piloto en el municipio de Chocontá.

- ALCANCE CONTRATO DE OBRA

Respecto al tema de una reducción en meta física, el contratista informa que continúa trabajando en el estudio de estabilizantes más económicos que permitan tener un alcance mayor al registrado inicialmente con el estabilizante de cenizas Stepway. El tema se continúa evaluando en las diferentes mesas de trabajo.

- ETAPA DE EJECUCIÓN

- Limpieza de alcantarillas

A la fecha para la actividad de limpieza y mantenimiento de alcantarillas se tiene un registro de 162 alcantarillas intervenidas con limpieza manual. Los municipios pendientes por inicio de esta actividad son Yacopí y Topaipí, en el periodo no se registró avance respecto a esta actividad.

- Ejecución de alcantarillas

A la fecha se registra un total de 28 tubos instalados, evidenciándose avance en el periodo mediante la ejecución de actividades de excavación, armado de acero y fundida de elementos estructurales en los frentes de Susa, Chocontá y La Palma, evidenciando

una baja planeación y ritmo de ejecución lo cual no ha arrojado ningún resultado positivo respecto al cumplimiento de compromisos.

- Estabilización de tramos

Durante el periodo se dio inicio y avance a la estabilización del tramo en el municipio de Chocontá, de la provincia de Almeidas, mediante la ejecución del tramo piloto con aplicación de estabilizantes químicos, evidenciando problemas en la planeación y estado de la maquinaria empleada.

- Actividades de Topografía

En la primera semana del mes de abril, se instaló la tubería en la alcantarilla No. 6 de Sesquilé, verificando niveles que garanticen un drenaje adecuado, y se dio inicio a la estabilización en el tramo de Chocontá, en una longitud de 200 metros, con el acompañamiento de la Interventoría, haciendo control de niveles por parte del Contratista cada 10 metros. El 9 de abril, En el tramo de Chocontá, la Interventoría hace la nivelación entre las abscisas K1+1320 y K1+1520 y hace levantamiento topográfico sobre esta misma zona con metodología RTK, y, en el tramo de Sesquilé la Interventoría hace nivelación con nivel de precisión para tomar niveles de tubos instalados en las alcantarillas N°2, N°5 y N° 6; teniendo como resultados, pendientes de 5.4% y 6% respectivamente. El Contratista, hizo la instalación de tubo de 36” de Novafort en la Alcantarilla N° 4, colocando su cama de triturado, atraque y posterior relleno con granulares, con el acompañamiento de auxiliar de la Interventoría

El 13 de abril la Interventoría proyecta observaciones reiterativas frente al incumplimiento frente a la corrección de las observaciones en los planos de Chocontá, Manta y frente a la ausencia del profesional de topografía del Contratista. El 15 de abril se reinicia actividades de céreo en Chocontá, con el control topográfico para el tramo entre las abscisas K1+500 y K1+790, y el 16 de abril El Contratista hace envió de planos de topografía a la Interventoría del sector de Chocontá, para el inicio de las verificaciones a los mismos

El 24 de abril, mediante comunicado ICCU-S-180-2026, La Interventoría emite al Contratista segundo apremio de la Provincia de Almeidas por el reiterado incumplimiento con el ajuste y corrección a las observaciones hechas por la Interventoría. El 28 de abril, el Contratista hizo estabilización y céreo sin presencia del profesional de topografía para el respectivo control de niveles, en tramo de Manta entre las abscisas K1+193 y K1+393.

- Seguimiento programa de obra

Para el periodo con corte al semanal Nº57 y respecto al cronograma de caracterización el contrato presenta un avance de 95.36%, y un atraso del 4.64%. En cuanto a la etapa de ejecución se registra un avance de 13.75% semanalmente se registra este avance de acuerdo con las incidencias presentadas por el contratista.

5.4 Seguimiento a la inversión del anticipo interventoría

El contrato de interventoría ICCU-220 de 2025 cuenta con un anticipo otorgado por el ICCU por valor de **$773.094.805**, el cual fue girado en su totalidad y se encuentra en ejecución. A la fecha de corte del presente informe (30 de abril de 2026), se han aprobado y ejecutado seis (6) usos de anticipo por un valor total de **$757.902.745**, lo que equivale al 98,04% del anticipo total, quedando un saldo por legalizar de **$15.192.060**, correspondiente a costos en los que se incurrió durante el mes de febrero de 2026 y que serán solicitados en la próxima solicitud de uso de anticipo.

A continuación, se presenta el detalle de los usos aprobados:

Tabla 40. Estado de anticipo de interventoría

Uso de Anticipos - datos actualizados								
Item	**impuesto timbre**	**Anticipo 1**	**Anticipo 2**	**Anticipo 3**	**Anticipo 4**	**Anticipo 5**	**Anticipo 6**	**Total**
Pago salarios	$ -	$169,037,336	$38,031,000	$105,008,694	$133,962,547	$118,215,300	$4,997,653	$569,252,530
Otros costos	$ -	$50,720,000	$ -	$105,447,240	$ -	$ -	$ -	$156,167,240
Impuestos	$32,482,975	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$32,482,975
Total	$32,482,975	$219,757,336	$38,031,000	$210,455,934	$133,962,547	$118,215,300	$4,997,653	$757,902,745
Saldo	$740,611,830	$520,854,494	$482,823,494	$272,367,560	$138,405,013	$20,189,713	$15,192,060	

Rendimientos financieros

En cumplimiento de la Cláusula 6 del Contrato ICCU-220 de 2025 y la Circular ICCU No. 10-2020, los rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros No. 193-000033-21 han sido reintegrados al ICCU mensualmente a través de PSE. A la fecha del presente periodo se han reintegrado: **$472.977,26**.

5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC valor

A continuación, se muestra el Programa Anual de Caja previsto para el Contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025.



5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Todo el personal vinculado al proyecto ha sido verificado conforme a los perfiles y requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de los contratos de obra e interventoría. La selección del equipo técnico y profesional se realizó en cumplimiento de los criterios definidos en el proceso de contratación, incluyendo los criterios de asignación de puntaje establecidos para la evaluación de propuestas.

Adicionalmente, las hojas de vida y demás soportes documentales del personal propuso han sido revisadas y aprobadas por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), dando cumplimiento a lo exigido en la etapa precontractual. A la fecha, se ha garantizado que todos los profesionales designados en el proyecto cumplen con los compromisos adquiridos durante la fase de selección contractual.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

En cumplimiento al contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y a las obligaciones propias del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, a continuación, se relacionan los equipos designados para el desarrollo y ejecución del proyecto, en el periodo correspondiente al mes de marzo de 2026.

- ✓ **Equipos**

En cumplimiento al contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y en cumplimiento a las obligaciones propias del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, a continuación, se relacionan los equipos designados para el desarrollo y ejecución del proyecto, en el periodo correspondiente al mes de abril de 2026.

- ✓ **Computadores:**

Tabla 41. Computadores interventoría.

MARCA	ALMACENAMIENTO	PROCESADOR	RAM	TARJETA DE VIDEO
HP	256 GB	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz 64 bits x64	8,00 GB	AMD RADEOS Graphics
HP	500 GB	Intel® Core™ i5-4590 CPU @ 3.30 GHz 64 bits x64	12.0 GB	
JANUS	500 GB	Intel® Core™ i7-7700 CPU @3.60GHz 64 bits x64	8,00 GB	
ASUS	1 TB	AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics 2.00GHz 64 bits x64	16.0 GB	
POWER GROUP	1 TB	AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80GHz 64 bits x64	16.0 GB	
COLIGAR	1 TB	AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 3.40GHz 64 bits x64	32.0GB	
HP	256 GB	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz 64 bits x64	12.0 GB	

Tabla 42. Equipo de Topografía.

EQUIPO	REFERENCIA	SERIAL
Nivel Sokkia	B40	S/N: 320450 
Estación Topcon	GTS 332	S/N: XJ0349 

- ✓ **Equipo de laboratorio**

REFERENCIA	IMAGEN ILUSTRATIVA	CANTIDAD	DESCRIPCION
TPFV-005		1	SPEEDY DIGITAL
TPFV-006		1	SPEEDY ANALOGO
TPFV-029		3	CONOS ABRAMS CON BASE PARA SLUMP
TPFV-030		24	MOLDES MUESTRAS CONCRETO 6"X12" METALICOS

TGE-SU-004		1	HUMEDÓMETRO ANÁLOGO
TGE-CO-15		2	VARILLA DE 5/8" APISONAMIENTO

- ✓ **Vehículos**

El Consorcio Intervial ICCU 050 en cumplimiento a lo establecido en el contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y en ejecución del mismo, presentó al ICCU los vehículos requeridos y que cumplen con lo estipulado, los cuales fueron avalados por la entidad, para lo cual, acorde a lo establecido se tiene:

Tabla 43. Vehículos - interventoría

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)	5

Por lo anterior, a continuación, se relacionan los vehículos designados para el desplazamiento de los profesionales a los frentes de obra del proyecto:

Tabla 44. Seguimiento Programa de Obra.

MARCA	LINEA	MODELO	TIPO	CILINDRAJE	PLACAS	COLOR	APROBACIÓN
Suzuki	Grand Vitara	2017	Wagon	2.393	WMP023	Blanco	2025003809
Mahindra	Mahindra Pick Up	2018	Doble cabina	2.179	ESM872	Blanco Ártico	2025004343
Renault	Duster	2019	Wagon	1.998	EJR997	Blanco Glacial	ICCU-S-2025-0003725
Renault	Duster	2022	Wagon	1.333	JUY199	Blanco Glacial	ICCU-I-2025-0008913
Renault	Duster	2022	Wagon	1.333	KOK733	Blanco Glacial	ICCU-I-2025-004343

- ✓ OFICINAS

El Consorcio Intervial ICCU 050 cuenta con las siguientes oficinas para la ejecución del proyecto.

- Oficina sede Bogotá: Calle 98 No. 21 – 50 Piso 3, Oficina 301, Centro Empresarial Calle 98, Chicó Norte, Bogotá D.C.
- Oficina provincia Rionegro: Carrera 3 No. 5 – 81 Torre 3, Piso 4, apartamento 405, Conjunto residencial Altos de Buenavista, casco urbano del municipio de La Palma, Cundinamarca.
- Oficina provincia Ubaté y Almeida: Vereda Timiguita sector bajo, lote Leticia El Recuerdo, municipio de Susa, Cundinamarca.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Es importante resaltar que parte del personal cuenta con contrato laboral con la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia, firma integrante del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, mientras que el resto ha sido contratado directamente por el Consorcio.

Tabla 45. Personal mínimo requerido.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	EMPRESA CONTRATANTE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR MAURICIO BELTRAN CARDENAS	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CAROLINA PEÑA LOPEZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIANA RAQUEL GAVIRIA DIAZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	DIEGO FERNANDO CAMACHO SUAREZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	80%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	TANIA MELISA ESCOBAR VIRGUEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
PROFESIONAL SISO 1	YESSICA PAOLA MORA TORRES	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	70%
SECRETARIA	HELEN SANCHEZ CORONADO	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	ANGIE LORENA JIMENEZ OBANDO	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
TOPOGRAFO	JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO	JUAN SEBASTIAN CRUZ ACEVEDO	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	DIANA MARCELA CHAVARRIO ESCOBAR	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JONATHAN EDUARDO CASTAÑEDA	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA MATIZ GOMEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
ESPECIALISTA AMBIENTAL	CARLOS ARTURO CHAPARRO SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%

PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	EMPRESA CONTRATANTE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
ESPECIALISTA HIDRAULICO	FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ CARDENAS	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	40%
PROFESIONAL SISO 2	LUISA FERNANDA MIRANDA	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
PROFESIONAL SISO 3	JOHANA AGUILAR SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
PROFESIONAL SOCIAL	YULIETH CIDGNEY CAMELO FIQUITIVA	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
CADENERO	JULIAN MARROQUIN	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
CADENERO	KAIL FERNANDO RODRIGUEZ	OPS	50%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CARLOS IVAN GUTIERREZ	OPS	50%
ESPECIALISTA GEOTECNIA	DIANA MILENA SUAREZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	40%
CADENERO	OSCAR SANTIAGO SANABRIA CASTRO	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
ABOGADO	JOSE ROMAN PACHECO GALLEGO	OPS	10%

Ver numeral 7.1 Correspondencia.

Tabla 46. Directorio telefónico de personal

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
N.I.T. 901.915.452-1

DIRECTORIO PROYECTO

ESPECIALIDAD O CARGO	NOMBRE	CORREO	TELEFONO
Supervisor proyecto ICCU	Wilson Santander	wilson.santander@cundinamarca.gov.co	
Profesional ingeniero Apoyo - ICCU	Juan Sebastian Cruz Acevedo	ingeniero.jsca@gmail.com	320 4566052
Especialista ambiental - ICCU	Maria Paula Escobar	maria.escobar@cundinamarca.gov.co	
Director de Interventoría - INTERVIAL 050	Edgar Mauricio Beltran	edgar.beltran@tpfingenieria.com	3118629894
Residente Interventoría - INTERVIAL 050	Carolina Peña López	carolina.pena@tpfingenieria.com	3043071485
Residente Interventoría - INTERVIAL 050	Edwin Vargas	residente1.intervial050@gmail.com	3192048216
Coordinadora Administrativa - INTERVIAL 050	Helen Sanchez	helen.sanchez@tpfingenieria.com	3126053217
Ingeniero de apoyo - INTERVIAL 050	Jonathan castañeda	ingeniero.intervial050@gmail.com	3102501294
Especialista en Pavimentos - INTERVIAL 050	Sandra Benavides	pavimentos1.intervial050@gmail.com	3134053658
Especialista en Pavimentos 2 - INTERVIAL 050	Alvaro Neira Giron	pavimentos2.intervial050@gmail.com	3016212795
Especialista en Pavimentos 3 - INTERVIAL 050	Adriana Johanna medioreal	Pavimentos3.intervial050@gmail.com	310 2575480
Especialista en Geotecnia - INTERVIAL 050	Diego Camacho suarez	diego.camacho@tpfingenieria.com	3006475037
Especialista en Geotecnia2 - INTERVIAL 050	Alejandro borraez	geotecnia.intervial050@gmail.com	3115314005
Especialista Ambiental - INTERVIAL 050	Carlos Chaparro	ambiental1.intervial050@gmail.com	3005608030
Profesional SISO - INTERVIAL 050	Yessica Paola Mora	yessica.mora@tpfingenieria.com	3178552942
Profesional social - INTERVIAL 050	Tania Escobar	social2rionegro.intervial050@gmail.com	3138855032
Profesional social - INTERVIAL 050	Yessica Paola Hernandez	social3ubate.intervial050@gmail.com	3208898982
Profesional social - INTERVIAL 050	Diana Marcela Chavarrio	socialalmeidas.intervial050@gmail.com	3124857057
Inspector interventoria - La Palma	Angie Lorena Jimenez Obando	inspector1.intervial050@gmail.com	322 8924566
Inspector interventoria - Topaipi	Maira alejandra Matiz gomez	inspector2.intervial050@gmail.com	3112903450
Topografo 1 - Ubate	Jhon Roso	Topografia1.intervial050@gmail.com	304 5571360
email oficial de CONSORCIO YVY		ggravasas@gmail.com	
Director contrato de obra - CONSORCIO YVY	Armando Mendoza Martinez	consorcioyvy@gmail.com	3218735267
Especialista Geotecnia - CONSORCIO YVY	Orlando Gomez	gerencia@estudiosgeotecnicos.com.co	3125531484
Profesional social - CONSORCIO YVY	Nini Johanna Baquero Torres	socialconsorcioyvy@gmail.com	
Planeación Yacopi	HelMan Murcia		3123472090
Planeación La Palma	Luisa Velasquez		3138579607
Planeación Villagomez	Oscar		
Planeación Susa	Fredy Castillo		3125811093

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

El informe financiero y presupuestal de la Interventoría fue elaborado con base en la plantilla de personal correspondiente a la etapa de ejecución. **Anexo No. 2 – Informe Financiero y Presupuestal**.

ICCU		***INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA***	

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Longitud Total: *128,79 m*

Duración en meses de interventoria

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA *11,50*

SUPERVISION FASE CARACTERIZACION *3,00*

Provincias: *UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO*

Frentes *5*

COSTOS DE PERSONAL								
CLASIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	REMUNERACIÓN MENSUAL	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	Tiempo en Meses	Factor Multiplicador	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION								
Director de interventoria 1 (principal)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Especialista Pavimentos			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Especialista en Geotecnia			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Profesional Gestor Social			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Profesional SISO 1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ingeniero SIG			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ingeniero Residente de interventoria 1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Profesional Ingeniero Apoyo			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inspector de interventoria			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Topografo			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secretaria			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PERSONAL PROFESIONAL								
Director de interventoria 2 (Edgar Beltrán)	1/04/2025		$ 8.000.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 18.400.000,00
Director de interventoria 1 (principal) (Carlos Reina)	10/11/20525	15/04/2026	$ 8.000.000,00	1,0	60%	0,50	2,30	$ 5.520.000,00
Especialista Pavimentos (Carlos Iván Gutiérrez)	1/09/2025		$ 6.500.000,00	1,0	50%	1,00	2,30	$ 7.475.000,00
Especialista en Geotecnia (Diego Camacho)	3/04/2025	7/04/2026	$ 6.500.000,00	1,0	80%	0,23	2,30	$ 2.790.667,00
(Diana Suárez)	24/03/2026		$ 6.500.000,00	1,0	40%	1,00	2,30	$ 5.980.000,00
Especialista en Estructuras			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Especialista Ambiental (Carlos Chaparro)	23/07/2025		$ 5.000.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 11.500.000,00
(Mauricio Joya)	18/03/2026		$ 5.000.000,00	1,0	60%	1,00	2,30	$ 6.900.000,00
Especialista Hidraulico			$ -	0,0	0%	0,00	0,00	$ -
Abogado (José Pacheco)	1/08/2025		$ 5.000.000,00	1,0	10%	1,00	0,00	$ -
Profesional Gestor Social	14/04/2025		$ 4.800.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 11.040.000,00
(Tania Escobar)	26/05/2025		$ 4.800.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 11.040.000,00
(Diana Chavarrio) (Yulieth Camelo)	18/09/2025		$ 4.800.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 11.040.000,00
Profesional SISO 1 (Yessica Mora)	3/04/2025		$ 4.500.000,00	1,0	70%	1,00	2,30	$ 7.245.000,00
Profesional SISO 2 (Luisa Miranda)	1/09/2025		$ 4.500.000,00	1,0	50%	1,00	2,30	$ 5.175.000,00
(Johana Aguilar)	3/09/2025		$ 4.500.000,00	1,0	50%	1,00	2,30	$ 5.175.000,00
Ingeniero Residente de interventoria 1 (Carolina Peña)	1/04/2025		$ 5.000.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 11.500.000,00
Ingeniero Residente de interventoria 2 (Diana Gaviria)	9/03/2026		$ 5.000.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 11.500.000,00

PERSONAL TECNICO								
Profesional Ingeniero Apoyo (Juan Sebastian Cruz)	23/05/2025		$ 2.800.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 6.440.000,00
Inspector de interventoria	2/05/2025		$ 2.350.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 5.405.000,00
(Angie Jimenez)	3/06/2025		$ 2.350.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 5.405.000,00
(Maira Matiz) (Jhon Harry Dávila)	24/03/2026		$ 2.350.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 5.405.000,00
Topografo (John Rozo)	6/05/2025		$ 2.300.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 5.290.000,00
Cadenero 1 (Kail Rodriguez)	18/11/2025		$ 1.800.000,00	1,0	50%	1,00	2,30	$ 2.070.000,00
(Julian Marroquin)	19/11/2025		$ 1.800.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 4.140.000,00
(Oscar Sanabria)	20/01/2026		$ 1.800.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 4.140.000,00
Secretaria (Helen Sánchez)	16/04/2025		$ 1.700.000,00	1,0	100%	1,00	2,30	$ 3.910.000,00
							TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3)	***$ 174.485.667,00***

2. OTROS COSTOS					
DESCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	1/04/2025 (WMP023)	1	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
	22/04/2025 (ESM872)	1	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
	3/06/2025 (EJR997)	1	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
	17/09/2025 (JUY199)	1	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
	26/02/2026 (KOK733)	1	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	1/04/2025	1	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	6/05/2025	1	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
Oficina (incluye servicios)	1/04/2025	1	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	1/04/2025	1	1,00	$ 780.000,00	$ 780.000,00
Alquiler GPS manual		0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiller PC Alto Rendimiento y Software SIG		0,00	0,00	0,00	0,00
				Subtotal Otros Costos (2)	*$ 40.180.000,00*

Ensayos de Labortario				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	1	0,00	$ 14.885.000,00	$ -
			Subtotal Otros Costo (3)	*$ -*

Presupuesto para Inteventoria	
TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)	*$ 214.665.667,00*
*IVA (4) * 19% = (5)*	*$ 40.786.476,00*
AJUSTE AL PESO	
COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA	*$ 255.452.143,00*

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Se remite el control de garantías del contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 con las pólizas que han sido presentadas a la fecha de corte del presente informe.

Tabla 47. Seguimiento Garantías contrato de Interventoría.

tpf INGENIERÍA CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO				
No. DE PÓLIZA	**No. DE ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**OBJETO ACTUALIZACIÓN**	
NB-100373049	0	3/03/2025	Inicio del contrato	
AMPARO	**No. DE CERTIFICADO**	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	72328646	$ 579.821.103,75	3/03/2025	30/06/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	72328646	$ 773.094.805,00	3/03/2025	30/06/2026
PRESTACIONES SOCIALES	72328646	$ 386.547.402,50	3/03/2025	31/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	72328646	$ 773.094.805,00	31/12/2025	31/12/2028
No. DE PÓLIZA	**No. DE ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**OBJETO ACTUALIZACIÓN**	
NB-100373049	2	8/04/2025	Acta de Inicio	
AMPARO	**No. DE CERTIFICADO**	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	72370914	$ 579.821.103,75	1/04/2025	29/07/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	72370914	$ 773.094.805,00	1/04/2025	29/07/2026
PRESTACIONES SOCIALES	72370914	$ 386.547.402,50	1/04/2025	29/01/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	72370914	$ 773.094.805,00	29/01/2026	29/01/2029
No. DE PÓLIZA	**No. DE ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**OBJETO ACTUALIZACIÓN**	
NB-100373049	3	23/12/2025	Pórroga del contrato de Interventoria	
AMPARO	**No. DE CERTIFICADO**	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	72723248	$ 579.821.103,75	1/04/2025	30/11/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	72723248	$ 773.094.805,00	1/04/2025	30/11/2026
PRESTACIONES SOCIALES	72723248	$ 386.547.402,50	1/04/2025	31/05/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	72723248	$ 773.094.805,00	31/05/2026	31/05/2029

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad establecido para el contrato, mediante los procedimientos definidos por el área de calidad. Este seguimiento incluyó la verificación de actividades, formatos y controles implementados en la gestión documental, técnica y administrativa del contrato. Se revisaron los registros asociados al control de calidad, la trazabilidad de observaciones y el cumplimiento de compromisos derivados de las reuniones técnicas y de seguimiento.

Asimismo, se hizo control a la aplicación de los procedimientos internos de la interventoría relacionados con el aseguramiento de la calidad, garantizando la trazabilidad en la revisión de productos entregables del contratista, la validación de personal asignado y la conformidad de los procesos con los requisitos contractuales establecidos en los pliegos de condiciones.

Cabe señalar que el Plan de Calidad presentado por el contratista continúa en proceso de revisión por parte de la Interventoría, en atención a las observaciones previamente emitidas. Su aprobación quedará sujeta al ajuste y cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos en los términos contractuales.

6.5.1 SEGUIMIENTO AL FACTOR DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó el seguimiento al factor de calidad establecido en el contrato, conforme a los lineamientos definidos en el área de calidad del proyecto. Este seguimiento se ha enfocado en verificar el cumplimiento de los indicadores y compromisos asociados a este factor, tanto en el contrato de interventoría como en el contrato de obra.

Actualmente, la interventoría se encuentra en proceso de verificación y análisis de los soportes relacionados con el cumplimiento del factor de calidad, incluyendo la trazabilidad de actividades, el control de entregables, la calidad documental, y la correcta aplicación de los procedimientos técnicos establecidos. Esta revisión permitirá consolidar los resultados mensuales y generar los ajustes o requerimientos necesarios al contratista y al equipo de interventoría, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los estándares contractuales.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El contratista presentó el plan de inversión del anticipo con el comunicado YVY-004-25 de fecha 26 de marzo 2025, la Interventoría dio aprobación al plan de inversión con el comunicado ICCU-S-015-2025 de fecha 19 de abril 2025. Se recibió el plan de inversión del anticipo modificado de acuerdo a solicitud de ajuste de la cuenta de cobro del anticipo comunicados YVY-139-25 y YVY-148-25 respectivamente, del 14 y 17 de julio 2025 respectivamente, el cual fue firmado por Interventoría. El 25 de julio 2025 se remitió al ICCU la solicitud del contratista del 30% de anticipo de la etapa de caracterización de acuerdo con ICCU-S-152-2025.

CONSECUTIVO	CONCEPTO	VALOR 30%	ESTADO
ICCU-S-152-2025 – 25 jul 2025	Remisión solicitud de anticipo etapa de ejecución	$10.330.896.504	En fiducia constituida

A la fecha en cuanto a las Ordenes de operación presentadas se tiene el siguiente estado:

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO APROBADO				**TOTAL APROBADO**	**SALDO ANTICIPO**
DESCRIPCION	VR ANTICIPO	SUBTOTAL	%		
INSUMOS O MATERIALES	4.740.331.861,00	4.740.331.861	48,30%	1.810.065.868,59	2.930.265.992,41
EQUIPOS y/O HERRAMIENTAS	1.609.553.675,00	1.609.553.675	16,40%	21.823.430,00	1.587.730.245,00
TRANSPORTE	912.734.706,00	912.734.706	9,30%	696.265.893,80	216.468.812,20
MANO DE OBRA	2.551.731.436,00	2.551.731.436	26,00%	564.289.927,00	1.987.441.509,00
TOTAL	9.814.351.678,00	9.814.351.678,00	100,00 %	3.092.445.119,39	6.721.906.558,61

A la fecha del presente informe se ha recibido 30 solicitudes de ordenes de operación de parte del contratista, de las cuales, 20 han sido aprobadas y tramitadas, y las otras 10, han sido observadas, o el contratista a desistido de la solicitud.

6.6.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN

Pagos por caracterización.

Cuenta No.	concepto	Valor bruto (sin IVA)
FC 2	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRAPUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR	$559.419.000

Cuenta No.	concepto	Valor bruto (sin IVA)
	MEDIO DELCONSORCIO YVY - ELABORACIÓN DE PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.	
FC 3	25% DE CARACTERIZACION DEL CONTRATO DE OBRAPUBLICA ICCU-139 de 2025 EJECUTADO POR MEDIO DELCONSORCIO YVY - ELABORACIÓN DE PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.	$559.419.000

Ejecutado: Corresponde a la cuenta del primer 25% de acuerdo a las condiciones de pago descritas en el anexo técnico del contrato. Valor básico (sin IVA).

Del 3er pago del 25 % el contratista debe remitir la cuenta de cobro con todos los soportes para su verificación y tramite. el contratista informa que está esperando los últimos ensayos que está realizando los cuales constituyen soporte de la cuenta. Quedando pendiente el ultimo 25% contra aprobación de los informes Fase 1 y Fase 2 resultado de la etapa de caracterización.

6.6.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Actas de comité de obra del mes de marzo de 2026 formato ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION y registros de asistencia ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia. **Ver Anexo 11 de actas de comité de obra.**

Tabla 48. Actas de Comité de Obra.

Nº DE ACTA	FECHA	ASUNTO	PARTICIPANTES
79	10-Apr-26	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
80	17-Apr-26	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
81	22-Apr-26	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
82	30-Apr-26	Reunión seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Social

- Se llevaron a cabo dos (2) Comités Sociales con la participación de la Entidad Contratante (ICCU), la Interventoría y el Contratista (YVY), enfocados en el seguimiento adecuado al contrato de obra.
- La ejecución de las actividades y la supervisión se marcan correctamente en el Contrato de Interventoría No. 220 de 2025, el Contrato de Obra No. 139 de 2025 y el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), aunque el cumplimiento de actividades en campo es deficiente.
- El Contratista YVY persiste en no proporcionar un número telefónico oficial para la oficina de Atención a la Comunidad, obligando a las Profesionales Sociales a usar su número personal, una deficiencia que ha sido observada y no corregida.

Pavimentos

Durante el mes de abril de 2026 la Interventoría mantuvo seguimiento técnico riguroso sobre los diseños de pavimentos, verificando cumplimiento contractual, coherencia estructural y viabilidad técnica de las soluciones propuestas.

Se evidencian avances en la documentación del contratista; sin embargo, el informe Fase II aún requiere ajustes sustantivos para garantizar:

- Trazabilidad técnica
- sectorización geotécnica
- justificación estructural
- control de calidad en obra
- coherencia de resultados

La Interventoría continuará el acompañamiento técnico hasta lograr una versión técnicamente aprobable del diseño.

Geotecnia

- Hasta tanto no se subsanen las observaciones adelantadas al informe de la fase 2, no es posible emitir concepto de aprobación sin la memoria técnica y parámetros de diseño correspondientes.
-
- Se dejó constancia formal del estado del contrato y del incumplimiento detectado, solicitando la información técnica pendiente.

7.1 Correspondencia

Tabla 49. Correspondencia enviada

Consecutivo	Asunto	Fecha envío
ICCU-S-146-2026	Solicitud planeación de trabajos en campo	1/4/2026
ICCU-S-147-2026	Respuesta comunicado con radicado YVY-102-2026 – Observaciones a los presupuestos radicados para el tramo del municipio de La Palma – Provincia de Rionegro	6/4/2026
ICCU-S-148-2026	Respuesta a oficio YVY-096-26 – Remisión orden de operación 21. Anticipo - Materiales	6/4/2026
ICCU-S-150-2026	SEGUNDO APREMIO por pendientes ambientales por Provincia – nuestros comunicados ICCU-S-270-2025, ICCU-S-275-2025, ICCU-S-316-2025 ICCU-S-389-2025, ICCU-S-025-2026, ICCU-S-110-2026 – ICCU-S-131-2026.	7/4/2026
ICCU-S-151-2026	Respuesta a oficio YVY-097-26 – Remisión orden de operación 22. Suministro de Cemento	8/4/2026
ICCU-S-154-2026	Respuesta a comunicados YVY-115-2026 y YVY-116-2026 de 6 de abril de 2026	9/4/2026
ICCU-S-155-2026	Observaciones al informe mensual correspondiente al mes de febrero del contrato de obra.	9/4/2026
ICCU-S-156-2026	Observaciones al informe mensual correspondiente al mes de enero del contrato de obra.	9/4/2026
ICCU-S-157-2026	Respuesta a su comunicado YVY-108-2026 Informe visita de campo especialista de Hidráulica tramo Chocontá.	9/4/2026
ICCU-S-158-2026	Atención solicitud ICCU – Registro fotográfico	10/4/2026
ICCU-S-159-2026	Revisión, VoBo PMT Topaipi y Yacopí, Sujeto a aval Alcaldía y comunidad	10/4/2026
ICCU-S-160-2026	Respuesta a su comunicado YVY-220-2026 disposición de acero de refuerzo cajas de encole Sesquilé. Observaciones generales construcción de alcantarillas Almeidas.	13/04/2026

ICCU-S-161-2026	Respuesta a su comunicación YVY-095-2026 - Concepto ambiental de la ubicación de la alcantarilla No 5, en el tramo del Municipio de Chocontá. Su comunicado YVY-095-2026	13/04/2026
ICCU-S-162-2026	Observaciones a la ejecución de alcantarillas – Tramo Susa (Provincia de Ubaté) – Reiteración solicitud Plan de Calidad ajustado	13/04/2026
ICCU-S-163-2026	Respuesta al oficio YVY-112-2026 – Versión preliminar Acta No. 1 parcial de obra y memoria de cantidades	13/04/2026
ICCU-S-164-2026	PAGA de la provincia de Ubaté Versión 6, su comunicado YVY-117-2026	16/04/2026
ICCU-S-166-2026	Requerimiento por suspensión de actividades en campo, bajo rendimiento y limitaciones constructivas en obra.	16/04/2026
ICCU-S-167-2026	Reiteración solicitud programa de obra detallado - actualizado	16/04/2026
ICCU-S-168-2026	Alcance a comunicado ICCU-S-163-2026, observaciones a YVY-112-2026 Versión preliminar Acta No. 1 parcial de obra y memoria de cantidades	17/04/2026
ICCU-S-169-2026	Respuesta a YVY-089-26 - Aprobación Informe Fase I.	17/04/2026
ICCU-S-171-2026	Alcance a comunicación ICCU-S-167-2026 - Requerimiento incremento de recursos y turnos de trabajo	20/04/2026
ICCU-S-172-2026	Reiteración comunicación ICCU-S-158-2026 - solicitud de registro fotográfico	21/04/2026
ICCU-S-176-2026	Su comunicado YVY-224-2026 Remisión informe mensual de marzo 2026.	22/04/2026
ICCU-S-178-2026	Respuesta comunicado YVY-231-26 O. OP 23 - OPTIMASOIL	23/04/2026
ICCU-S-179-2026	Respuesta a oficio YVY-240-26 – Remisión orden de operación 29.	23/04/2026
ICCU-S-180-2026	SEGUNDO apremio por la No corrección de observaciones Topografía Provincia Almeidas, Observaciones actividades de Topografía y reiteración solicitud de personal en campo	24/04/2026
ICCU-S-181-2026	APREMIO - Incumplimiento en la ejecución del componente social y requerimiento de acciones inmediatas en la Provincia de Ubaté.	24/04/2026
ICCU-S-182-2026	Requerimiento URGENTE en materia SST en los diferentes frentes de obra Municipio de La Palma	24/04/2026
ICCU-S-184-2026	Respuesta a oficio YVY-233-26 – Remisión orden de operación 24, 25, 26, y 28 de Anticipo	24/04/2026
ICCU-S-185-2026	Solicitud de emisión de respuestas oficiales – Instalación de reductores de velocidad – Municipio de Ubaté	27/04/2026
ICCU-S-186-2026	Apremio por no entrega de Registro fotográfico - Comunicaciones ICCU-S-158-2026 e ICCU-S-176-2026 - Solicitud de registro fotográfico	27/04/2026
ICCU-S-187-2026	Solicitud de programación y socialización PMT – Inicio de actividades de Mantenimiento de la rasante en el municipio de Ubaté.	28/04/2026
ICCU-S-188-2026	Su comunicado YVY-239-2026: informe de visita ambiental tramo de construcción de alcantarillas, municipio de Yacopí	28/04/2026
ICCU-S-189-2026	Respuesta a su comunicación YVY-242-26 - respuesta al comunicado ICCU-S-179-2026 - Orden de operación 29.	28/04/2026

ICCU-S-190-2026	Respuesta a su comunicación YVY-286-25 – Remisión PMT Villa Gómez	28/04/2026
ICCU-S-191-2026	Respuesta a oficio YVY-231-26 – Remisión orden de operación 23	29/04/2026
ICCU-S-192-2026	Respuesta a oficio YVY-231-26 – Remisión orden de operación 23 V2	29/04/2026
ICCU-S-193-2026	Reiteración a nuestras comunicaciones ICCU-S-261-2025 y ICCU-S-032-2026 - Rendimientos financieros anticipo CONTRATO DE OBRA ICCU-139-2025	29/04/2026
ICCU-S-197-2026	Reiteración de incumplimientos en el componente social en la provincia de Ubaté.	30/04/2026

Tabla 50. Correspondencia recibida

Radicado	Remite	Asunto	Fecha de recibo
YVY-115-2026	Consorcio YVY	Presupuesto Municipio de Yacopí – Placa Huella	6/4/2026
YVY-116-2026	Consorcio YVY	Presupuesto Municipio de La Palma – Placa Huella	6/4/2026
YVY-117-2026	Consorcio YVY	Respuesta ICCU-S-077-2026 – PAGA Provincia de Ubaté	6/4/2026
YVY-118-2026	Consorcio YVY	Radicación de presupuesto de intervención – Municipio de Susa	7/4/2026
ICCU-I-2026-0004783	Gabriel Lozano	COPIA: Solicitud de consolidación de registros fotográficos de actividades ejecutadas en campo.	9/4/2026
ICCU-I-2026-0004785	Gabriel Lozano	Solicitud de consolidación de registros fotográficos de actividades ejecutadas en campo	9/4/2026
YVY-119-2026	Consorcio YVY	Radicación factura de cobro del 25% correspondiente al 2do desembolso ajustada	9/4/2026
YVY-220-2026	Consorcio YVY	Propuesta de ajuste en disposición de acero de refuerzo cajas de encole municipio de Sesquilé	9/4/2026
YVY-221-2026	Consorcio YVY	Informe LWD municipio manta	9/4/2026
ICCU-I-2026-0004887	Gabriel Lozano	Aprobación Hoja de Vida Personal de Interventoría. Según ComunicadoICCU-S-152-2026 - Kail Rodriguez	9/4/2026
YVY-222-2026	Consorcio YVY	Remisión programación de alcantarillas Municipio de Yacopí	9/4/2026
ICCU-I-2026-0004451	Gabriel Lozano	Observaciones oficio ICCU-S-142-2026 "Segundo pago - 25% etapa caracterización cto ICCU 139."	6/4/2026
YVY-223-2026	Consorcio YVY	Propuesta de ajuste en disposición de acero de refuerzo cajas de encole municipio de Sesquilé	10/4/2026
YVY-224-2026	Consorcio YVY	Remisión informe mensual de marzo CONTRATISTA	10/4/2026

YVY-225-2026	Consorcio YVY	Remisión fichas técnicas IONICSOIL Y SOLIBINDER	10/4/2026
YVY-227-2026	Consorcio YVY	Respuesta a Oficio ICCU-S-048-2026 Remisión de APU	13/04/2026
YVY-228-2026	Consorcio YVY	Ubicación de vallas informativas del proyecto componente técnico y ambiental	13/04/2026
YVY-229-2026	Consorcio YVY	Respuesta parcial ICCU-S-136-2026 – Presupuestos tramos con estabilización química	13/04/2026
YVY-230-2026	Consorcio YVY	informe de densidades de campo material estabilizado municipio manta	14/04/2026
YVY-231-2026	Consorcio YVY	Remisión de orden de operación No. 23	14/04/2026
ICCU-I-2026-0005394	Gabriel Lozano	Requerimiento urgente por presunto incumplimiento de compromisos, actividades y deficiencias logísticas en los frentes de obra de Chocontá, Manta y Ubaté.	15/04/2026
YVY-086-2026	Consorcio YVY	Cronograma lote 2 con prorroga	12/3/2026
ICCU-I-2026-0005516	Gabriel Lozano	Reiteración a la solicitud de informe de estado de cuenta del anticipo y legalización de pagos	17/04/2026
YVY-234-2026	Consorcio YVY	Respuesta a ICCU-S-141-2025 remisión de información de corrección topográfica Chocontá	17/04/2026
YVY-235-2026	Consorcio YVY	actividades de construcción de alcantarillas municipio de Ubaté	17/04/2026
YVY-233-2026	Consorcio YVY	Remisión de orden de operación No. 24,25,26,27 Y 28.	17/04/2026
YVY-236-2026	Consorcio YVY	Respuesta al comunicado ICCU-S-154-2026 presupuesto placa huellas del municipio de Yacopí	17/04/2026
YVY-237-2026	Consorcio YVY	Remisión hoja de vida cargo profesional pavimentos	20/04/2026
YVY-238-2026	Consorcio YVY	Remisión de tiempos de suministro productos estabilizantes TerraSil y EcoEnzyme	21/04/2026
YVY-239-2026	Consorcio YVY	Remisión de informe de visita ambiental tramo de construcción de alcantarillas municipio de Yacopi	22/04/2026
YVY-240-2026	Consorcio YVY	Remisión de orden de operación No. 29	22/04/2026
YVY-241-2026	Consorcio YVY	Remisión de resultados de campaña de briquetas (La palma), Susa), LWD Manta y concepto de especialista.	24/04/2026
YVY-242-2026	Consorcio YVY	Respuesta comunicado No. ICCU-S-179-2026 orden de operación No. 29	24/04/2026
N/A	Consorcio YVY	Documento: Procedimiento Laboratorio SoilBinder	24/04/2026

ICCU-I-2026-0005984	Gabriel Lozano	Aprobacion Directora de Interventoria Gabriela Forero	24/04/2026
YVY-243-2026	Consorcio YVY	Remisión de resultados de campaña de briquetas (La palma, Susa) y concepto de especialista.	24/04/2026
YVY-244-2026	Consorcio YVY	Remisión de registro fotográfico de avances de obra	24/04/2026
ICCU-I-2026-0006062	Gabriel Lozano	Traslado de solicitud JAC La Patera– Evaluación de reductores de velocidad	27/04/2026
YVY-245-2026	Consorcio YVY	Respuesta comunicado No. ICCU-S-184-2026 ordenes de operación No. 24,25,26 y 28	27/04/2026
YVY-246-2026	Consorcio YVY	Remisión de orden de operación No. 30	27/04/2026
ICCU-I-2026-0006118	Gabriel Lozano	Solicitud de balance de interventoría y proyección de pagos	27/04/2026
YVY-247-2026	Consorcio YVY	Respuesta iccu-s-185-2026 remisión de registro fotográfico de avances de obra.	27/04/2026
YVY-250-2026	Consorcio YVY	Respuesta comunicado No. ICCU-S-189-2026 Orden de operación No. 29	28/04/2026
ICCU-I-2026-0006237	Gabriel Lozano	Requerimiento por demoras en procesos administrativos y técnicos.	29/04/2026
ICCU-I-2026-0006247	Gabriel Lozano	Solicitud de pronunciamiento sobre costos de interventoría y su imputabilidad al contratista – Contrato de Obra ICCU-139 de 2025	29/04/2026
YVY-252-2026	Consorcio YVY	Respuesta a comunicado ICCU-S-192-2026 – Orden de operación No. 23.	30/04/2026
YVY-253-2026	Consorcio YVY	Respuesta ICCU-S-164-2026 - PAGA V6. Provincia de Ubaté.	30/04/2026
YVY-254-2026	Consorcio YVY	Respuesta ICCU-S-136-2026 – Presupuestos tramos con estabilización química e imprimación reforzada Chocontá.	30/04/2026

7.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

Se anexa registro fotográfico correspondiente al reconocimiento de los tramos, así como a las reuniones técnicas y sociales sostenidas con la interventoría, la comunidad y los especialistas involucrados, lo cual constituye un avance preparatorio clave para la ejecución del contrato. **Ver Anexo 5. Informe Residente Interventoría.**

Ubaté





Almeidas





Rio Negro





Ver Anexo 1. Informes Semanales

7.3 Registro fotográfico de las actividades sociales.

Durante el periodo evaluado, se ejecutaron diferentes actividades desde el equipo social, cuya evidencia fotográfica se relaciona en el informe del área anexo. **Ver Anexo 6. Informe Social.**

7.4 Bitácora del mes correspondiente

Durante el mes correspondiente al presente informe se presenta bitácora de las actividades ejecutadas. **Ver Anexo 5. Informe Residente Interventoría.**

7.5 Acta de costos de interventoría

Se anexa el acta correspondiente formato Ver anexo 08. Acta de Costos Interventoría.
