
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1		**OBRAS DE DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE SAN CRISTOBAL**	**132 días**	**mié 15/07/26**	**mar 15/12/26**		**19%**
2		SOCIALIZACION DEL PROYECTO	15 días	mié 15/07/26	vie 31/07/26		100%
3		PRESENTACION Y APROBACION DE PMT	15 días	mié 15/07/26	vie 31/07/26		100%
4		RESOLUCION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y APROBACION DE APU's MANEJO DE FAUNA	70 días	mié 15/07/26	sáb 3/10/26		83%
5		REUBICACION VENTEROS	41 días	mié 15/07/26	lun 31/08/26		100%
6		ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	70 días	mié 15/07/26	sáb 3/10/26		83%
7		**PRELIMINARES**	**110 días**	**lun 10/08/26**	**mar 15/12/26**		**42%**
8		LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la	110 días	lun 10/08/26	mar 15/12/26	3FC+7 días	33%
9		DESCAPOTE A MANO. Incluye: retiro de grama, tierra negra con altura media de 0.20m, arbustos hasta una	5 días	mié 2/12/26	lun 7/12/26	50CC+2 días	0%
10		DESCAPOTE A MAQUINA. Incluye: retiro de grama, tierra negra con altura media de 0,20 m, arbustos hasta una altura de 1 m, desarraigo si es necesario, cargue,	5 días	mar 8/12/26	sáb 12/12/26	9	0%
11		ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0.50m. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará machete o motobote. Incluye transporte y botada del	1 día	lun 14/12/26	lun 14/12/26	10	0%
12		Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde o naranja polietileno de alta densidad y resistencia	60 días	lun 10/08/26	sáb 17/10/26	3FC+7 días	60%
13		Instalación de PASARELA O PUENTE EN TELERA para ingreso a edificaciones durante obra. Incluye suministro, transporte, instalación, traslado dentro de la obra	60 días	lun 17/08/26	sáb 24/10/26	34CC	50%
14		**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**103 días**	**sáb 15/08/26**	**sáb 12/12/26**		**42%**
15		RETIRO DE MODULO COMERCIAL Existente Incluye desarmada, cargue, transporte y ensamble en el sitio que	16 días	mar 1/09/26	vie 18/09/26	5	100%
16		DESMONTE Y RETIRO DE REJILLAS DE SUMIDEROS con elementos asociados en cualquier material existente.	4 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	12CC+5 días	100%
17		RETIRO DE BASURERAS METÁLICAS O PLÁSTICAS. Incluye: retiro del elemento, demolición de base de	4 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	12CC+5 días	100%
18		Retiro de SEÑALIZACIÓN VERTICAL de tránsito de cualquier tipo. Incluye cargue y transporte al sitio donde lo indique la interventoría	4 días	jue 20/08/26	lun 24/08/26	17	100%
19		RETIRO DE BANCAS INDIVIDUALES PREFABRICADAS EN CONCRETO. Incluye recuperación de los materiales	4 días	mar 25/08/26	vie 28/08/26	18	100%
20		RETIRO DE BOLARDOS metálicos o hierro nodular. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, o su	4 días	sáb 29/08/26	mié 2/09/26	19	100%
21		DEMOLICIÓN y/o retiro de cordones en concreto. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en sitios	50 días	jue 3/09/26	vie 30/10/26	20	30%
22		RETIRO DE TAPAS DE MH existentes de cualquier material con su respectivo herraje de cualquier tamaño	4 días	lun 26/10/26	jue 29/10/26	36CC	0%
23		DESMONTE Y RETIRO DE MATERAS CIRCULARES existentes de concreto. Incluye: cargue, transporte hasta	4 días	vie 30/10/26	mar 3/11/26	22	0%
24		DESMONTE Y RETIRO DE REJILLAS DE ALCORQUE con dimensiones aproximadas de 1.2x1.0m con	4 días	mié 4/11/26	sáb 7/11/26	23	0%
25		RETIRO Y REINSTALACIÓN de ESCULTURA (estatua), dimensiones 1.70m de frente x 1.20m de profundo y	2 días	lun 9/11/26	mar 10/11/26	24	0%
26		RETIRO DE TABLERO TIC PUBLICITARIO en estructura metálica liviana. Dimensiones 1.00m de ancho x 2.00m	3 días	mié 11/11/26	vie 13/11/26	25	0%
27		DESMONTE Y RETIRO DE POSTE de energía, de alumbrado público y de telecomunicaciones existente de	2 días	sáb 14/11/26	lun 16/11/26	26	0%
28		Desmonte y retiro de red interna de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y eléctrica).	2 días	mar 17/11/26	mié 18/11/26	27	0%
29		RETIRO DE ASTA DE BANDERA, estructura en tubería circular metálica con desarrollo en altura de 4.50m.	2 días	jue 19/11/26	vie 20/11/26	28	0%
30		Retiro de pasamanos metálico en cualquier diseño altura variable hasta 1,20 m. Incluye canchada de anclaje de	6 días	sáb 21/11/26	vie 27/11/26	29	0%
31		Retiro de rejilla metálica para cárcamo de ancho 0.30m. Incluye cargue, recuperación de los materiales	4 días	sáb 28/11/26	mié 2/12/26	30	0%
32		DEMOLICIÓN DE FUENTE, forma ovalada, dimensiones 4.90x2.80m. Desarrollo de fuente a nivel de piso. Incluye	5 días	jue 3/12/26	mar 8/12/26	31	0%
33		Retiro de palomeras existentes. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio	4 días	mié 9/12/26	sáb 12/12/26	32	0%
34		DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS de espesor superior a 0,15 hasta 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de	60 días	lun 17/08/26	sáb 24/10/26	12CC+6 días	50%
35		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier	60 días	lun 17/08/26	sáb 24/10/26	34CC	50%
36		DEMOLICIÓN DE CUELLO DE MH SIN IMPORTAR SU UBICACIÓN. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: cargue,	10 días	lun 26/10/26	jue 5/11/26	35	0%
37		Demolición y retiro de sumideros de cualquier tipo. La disposición de la rejilla será autorizada por la Interventoría	8 días	vie 6/11/26	sáb 14/11/26	36	0%
38		DEMOLICIÓN CÁRCAMOS en concreto, desarrollo máximo de 1.0m. Incluye compresor neumático con	8 días	lun 16/11/26	mar 24/11/26	37	0%
39		DEMOLICIÓN CUNETAS en concreto, desarrollo máximo de 0.70m con espesor hasta 0.15m. Incluye martillo	8 días	mié 25/11/26	jue 3/12/26	38	0%
40		Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaño máximo de 40x40 cm, acopio, cargue,	9 días	lun 26/10/26	mié 4/11/26	34	0%
41		DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO ALIGERADO, espesor 10-12 cm (del ladrillo), Incluye demolición de	20 días	sáb 15/08/26	lun 7/09/26	12CC+5 días	100%
42		DEMOLICIÓN MURO JARDINERA Y MURO EN BLOQUE, espesor 20 - 35cm, Incluye demolición de	20 días	mar 8/09/26	mié 30/09/26	41	55%
43		Demolición sillar en concreto. Incluye acabados, cargue y botada de escombros.	11 días	lun 26/10/26	vie 6/11/26	35	0%
44		**EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**100 días**	**lun 17/08/26**	**jue 10/12/26**		**18%**
45		EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca	40 días	vie 2/10/26	mar 17/11/26	34CC+40 días	0%
46		EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 2-4 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca	10 días	mié 14/10/26	sáb 24/10/26	45CC+10 días	0%
47		EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca	20 días	lun 26/10/26	mar 17/11/26	46	0%
48		EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 2-4 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca	10 días	mié 18/11/26	sáb 28/11/26	47	0%
49		EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN MECÁNICA del terreno, bajo cualquier grado de humedad, con altura variable	10 días	mié 18/11/26	sáb 28/11/26	45	0%

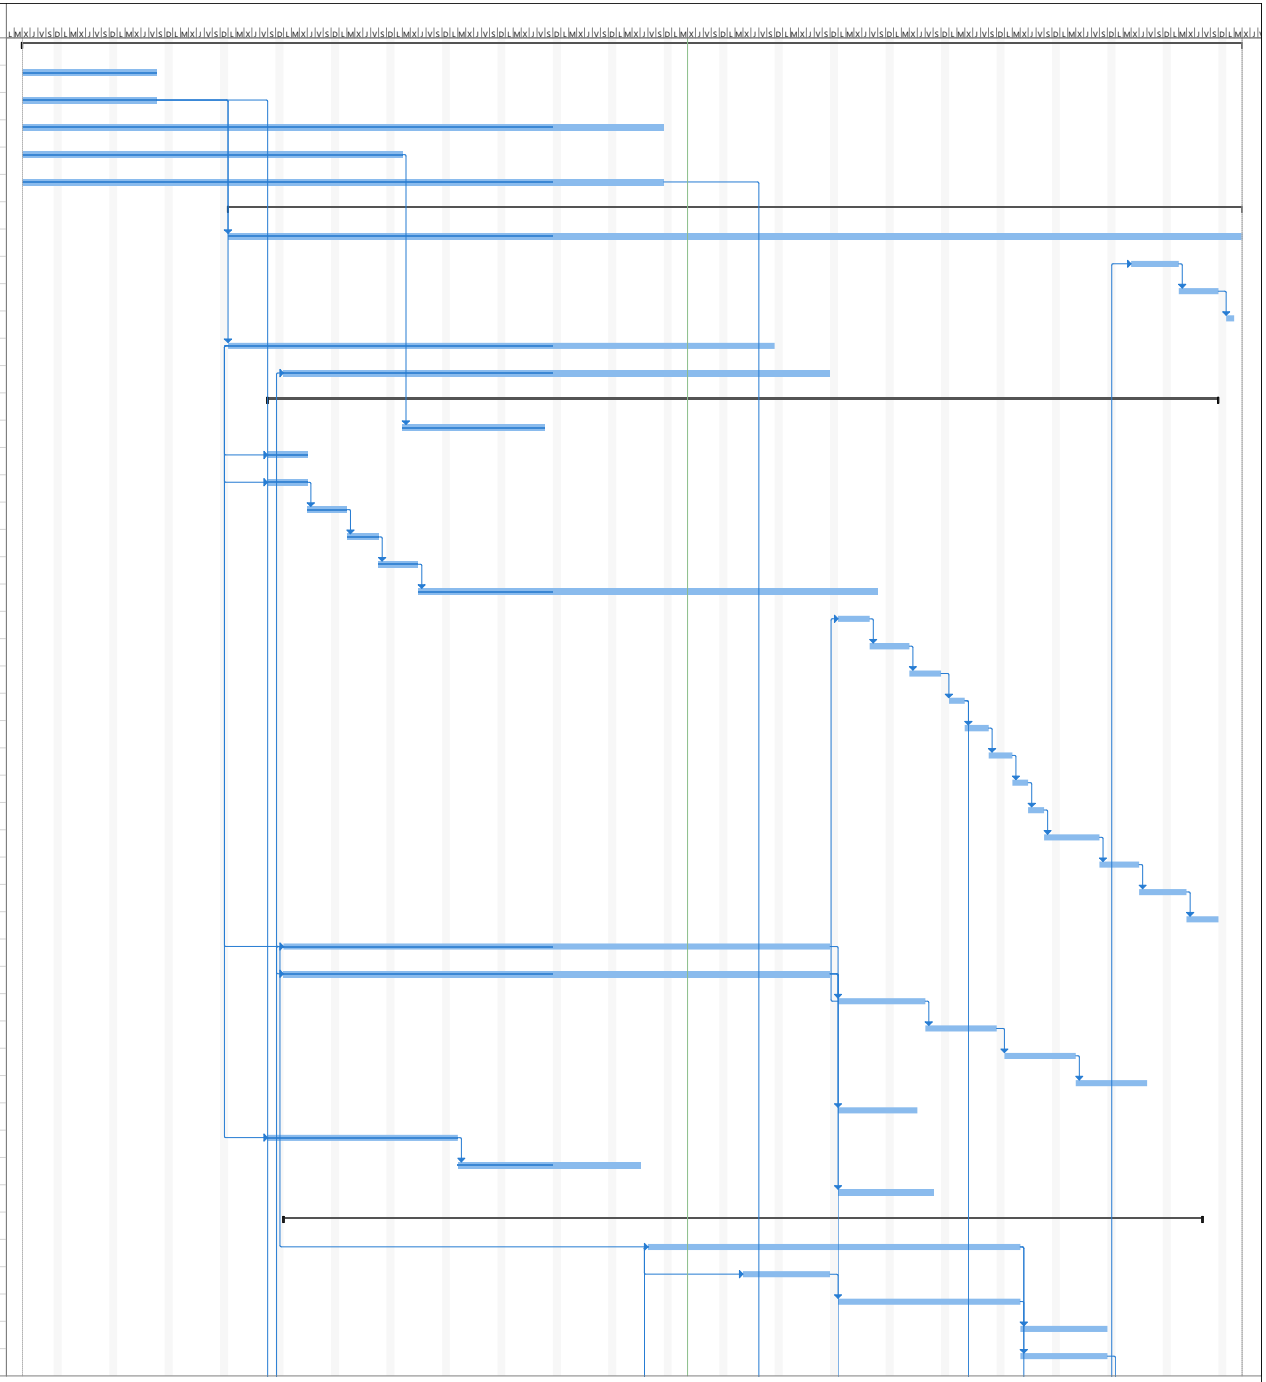


Proyecto: PDT SEGUIMIENTO P

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
50		EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN MANUAL del terreno, bajo cualquier grado de humedad, con altura variable hasta 0.50 m, incluye cortes de arbustos y pequeños	10 días	lun 30/11/26	jue 10/12/26	49	0%
51		EXCAVACIÓN MANUAL PARA PILOTES Ø= 0.50m en material heterogéneo (hasta 2.0 m). Incluye la extracción del material de las paletas y/o cucharas, interno de materiales	10 días	vie 16/10/26	mar 27/10/26	6FC+10 días	0%
52		EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m DIAMETRO INTERIOR DE 1,0 m, en material	10 días	mié 28/10/26	sáb 7/11/26	51	0%
53		EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m DIAMETRO INTERIOR DE 1,0 m, en material	10 días	lun 9/11/26	jue 19/11/26	52	0%
54		EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4,0 a 6,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m DIAMETRO INTERIOR DE 1,0 m, en material	10 días	vie 20/11/26	mar 1/12/26	53	0%
55		Suministro, transporte y colocación de ARENILLA compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínimo del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del	40 días	mar 20/10/26	vie 4/12/26	45CC+15 días	0%
56		LLENOS EN LIMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye el suministro,	40 días	mié 21/10/26	sáb 5/12/26	55CC+1 día	0%
57		Llenos en material seleccionado proveniente de la excavación, reacomodado y compactado con equipo liviano hasta obtener una densidad mínimo del 98% de la	40 días	jue 22/10/26	lun 7/12/26	56CC+1 día	0%
58		DEMOLICIÓN DE ROCA A CIELO ABIERTO CON CUÑA HIDRÁULICA, diámetro de perforación aproximado de 30 mm, para volúmenes de roca menores a 0,25 m3 (con el	5 días	mié 18/11/26	lun 23/11/26	45	0%
59		Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su manejo será de acuerdo a	90 días	lun 17/08/26	sáb 28/11/26	34CC	33%
60		Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	90 días	lun 17/08/26	sáb 28/11/26	59CC	33%
61		Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales.	63 días	lun 17/08/26	mié 28/10/26	60CC	48%
62		**CONCRETOS**	**59 días**	**jue 8/10/26**	**mar 15/12/26**		**0%**
63		Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de mínimo 0.05 m. Incluye transporte interno y todos los demás elementos	12 días	lun 26/10/26	sáb 7/11/26	57CC+3 días	0%
64		Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para pilotes. Incluye excavación, cargue, transporte y botada. Según diseño	10 días	mar 20/10/26	vie 30/10/26	51CC+3 días	0%
65		Suministro, transporte y construcción de PILAS en concreto de 21 Mpa, dimensiones según diseño. Incluye: transporte interno, armado, vaciado, vibrado y todos los	10 días	sáb 31/10/26	mié 11/11/26	52CC+3 días	0%
66		Suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra de 21 Mpa para ZAPATAS, dimensiones según diseño. Incluye: armado, vaciado,	30 días	jue 29/10/26	mié 2/12/26	63CC+3 días	0%
67		Construcción de VIGA CABEZAL en concreto de 21 Mpa. Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro y transporte del	15 días	jue 12/11/26	sáb 28/11/26	64;65	0%
68		Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con anclajes, pines	20 días	mar 3/11/26	mié 25/11/26	57CC+10 días	0%
69		Suministro, transporte y construcción de VIGAS, PEDESTALES Y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 24 Mpa reforzado en obra, dimensiones según diseño	20 días	sáb 7/11/26	lun 30/11/26	66CC+8 días	0%
70		Construcción de Columnas en concreto a la vista de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en vigas ITE de	20 días	vie 13/11/26	sáb 5/12/26	69CC+5 días	0%
71		Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.60 m de concreto de 21 Mpa, tres pares, juntas separadas, pendiente Bordillo	40 días	mar 20/10/26	vie 4/12/26	55CC	0%
72		Suministro, transporte y colocación de bordillo prefabricado de 15 x 45 x 80 cm (BOBAR) en concreto de 21 MPa, tres pares, juntas separadas, pendiente Bordillo	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	71CC+5 días	0%
73		Construcción de GRADERÍAS SOBRE TERRENO, en concreto de 21 Mpa. a la vista, con huella de 0.60m y contrahuella máximo de 0.27m, y 0.15m de base	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	35	0%
74		Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 24 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en	20 días	vie 6/11/26	sáb 28/11/26	73CC+10 días	0%
75		Construcción de ESCALERAS ELEVADAS en concreto de 24 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en vigas ITE de 10	20 días	vie 6/11/26	sáb 28/11/26	73CC+10 días	0%
76		Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 21 Mpa, preparado en obra, a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto,	29 días	jue 12/11/26	mar 15/12/26	65	0%
77		Suministro, transporte y construcción de MURO DE CONTENCIÓN Y VASTAGOS en concreto de 24,5Mpa. con exterior a la vista, alturas variable hasta 4,00 m	29 días	jue 12/11/26	mar 15/12/26	76CC	0%
78		Construcción muro tipo pantalla en bloque de concreto 20x20x40 cm, resistencia 13 Mpa, relleno con concreto de 17,5 Mpa, con mortero de pega 1:5. Incluye columnas	29 días	jue 12/11/26	mar 15/12/26	77CC	0%
79		Construcción de MURO JARDINERA CON ACABADO EN GRANITO PULIDO (DENTRO Y EN EL PERIMETRO DEL PARQUE) en concreto de 21 Mpa, con una ALTURA	40 días	jue 8/10/26	lun 23/11/26	45CC+5 días	0%
80		Suministro, transporte y Construccion de cordon-cuneta en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en concreto donde sea necesario y bilbardo de fondo. Según detalle	30 días	mar 3/11/26	lun 7/12/26	71CC+12 días	0%
81		Construcción de MURO BANCA TIPO C en concreto de 24,5 Mpa, dimensiones 0,60m ancho variable x 0,45m de altura variable. Incluido viga enterrada como fundación	40 días	jue 8/10/26	lun 23/11/26	79CC	0%
82		Construcción de BANCA CORRIDA en concreto de 21 Mpa. con un ANCHO DE 0.50 m. y una ALTURA DE 0.45m. Incluye suministro, transporte y colocación del	40 días	jue 8/10/26	lun 23/11/26	79CC	0%
83		Suministro, transporte y vaciado de CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA LOSA DE FONDO (piso) de tanques enterrados con resistencia de 28MPa. Incluye	8 días	mié 28/10/26	jue 5/11/26	63CC+2 días	0%
84		Suministro, transporte y vaciado de CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA MUROS Y TABIQUES de tanques enterrados con resistencia de 28MPa. Incluye	10 días	vie 6/11/26	mar 17/11/26	83	0%
85		Suministro, transporte y vaciado de CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA LOSA SUPERIOR de tanques enterrados con resistencia de 28MPa. Incluye	10 días	mié 18/11/26	sáb 28/11/26	84	0%
86		Suministro, transporte e instalación de TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye suministro, transporte y colocación	3 días	lun 30/11/26	mié 2/12/26	85	0%
87		Suministro, transporte e instalación de ESCALERA DE GATO para tanques enterrados. Cada peldaño será en varilla corrugada de 5/8" con ancho libre mínimo de 0.45m	3 días	mié 18/11/26	vie 20/11/26	84	0%
88		Colocación de CINTA PVC TIPO O-222 o equivalente, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para	2 días	lun 16/11/26	mar 17/11/26	84CC+8 días	0%
89		Suministro, transporte y vaciado de concreto para muro de TRINCHERA O GARITA de 28 MPa on espesor promedio de 0.40m al nivel del piso en Estación de	10 días	mar 1/12/26	vie 11/12/26	77FC-13 días	0%
90		**ACERO DE REFUERZO**	**42 días**	**mar 27/10/26**	**lun 14/12/26**		**0%**
91		Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, suministro. Incluye transporte con descargue, transporte	40 días	mar 27/10/26	vie 11/12/26	63CC+1 día	0%
92		Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios	40 días	mar 27/10/26	vie 11/12/26	91CC	0%
93		Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D221. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios	40 días	mar 27/10/26	vie 11/12/26	91CC	0%
94		Suministro, transporte y fabricación de componentes en tuberías estructurales PTE (Perfiles con material base A36) como vigas, columnas y viguetas, mediante corte	40 días	jue 29/10/26	lun 14/12/26	66CC	0%
95		**PISOS**	**48 días**	**mié 21/10/26**	**mar 15/12/26**		**0%**
96		Construcción de RAMPAS TALUD EN CONCRETO DE 28 Mpa. ESPESOR DE 0.08 m., con vaciado alternado. Incluye suministro y transporte de los materiales	4 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26	50	0%
97		Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno para construcción de pavimentos con 0.10 m. Incluye aditivo	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	131CC+2 días	0%
98		Construcción de ANDEN CON ACCESO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS y tránsito de mayor frecuencia en concreto vaciado en sitio Mr = 4.0 MPa reforzado con	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	97CC	0%

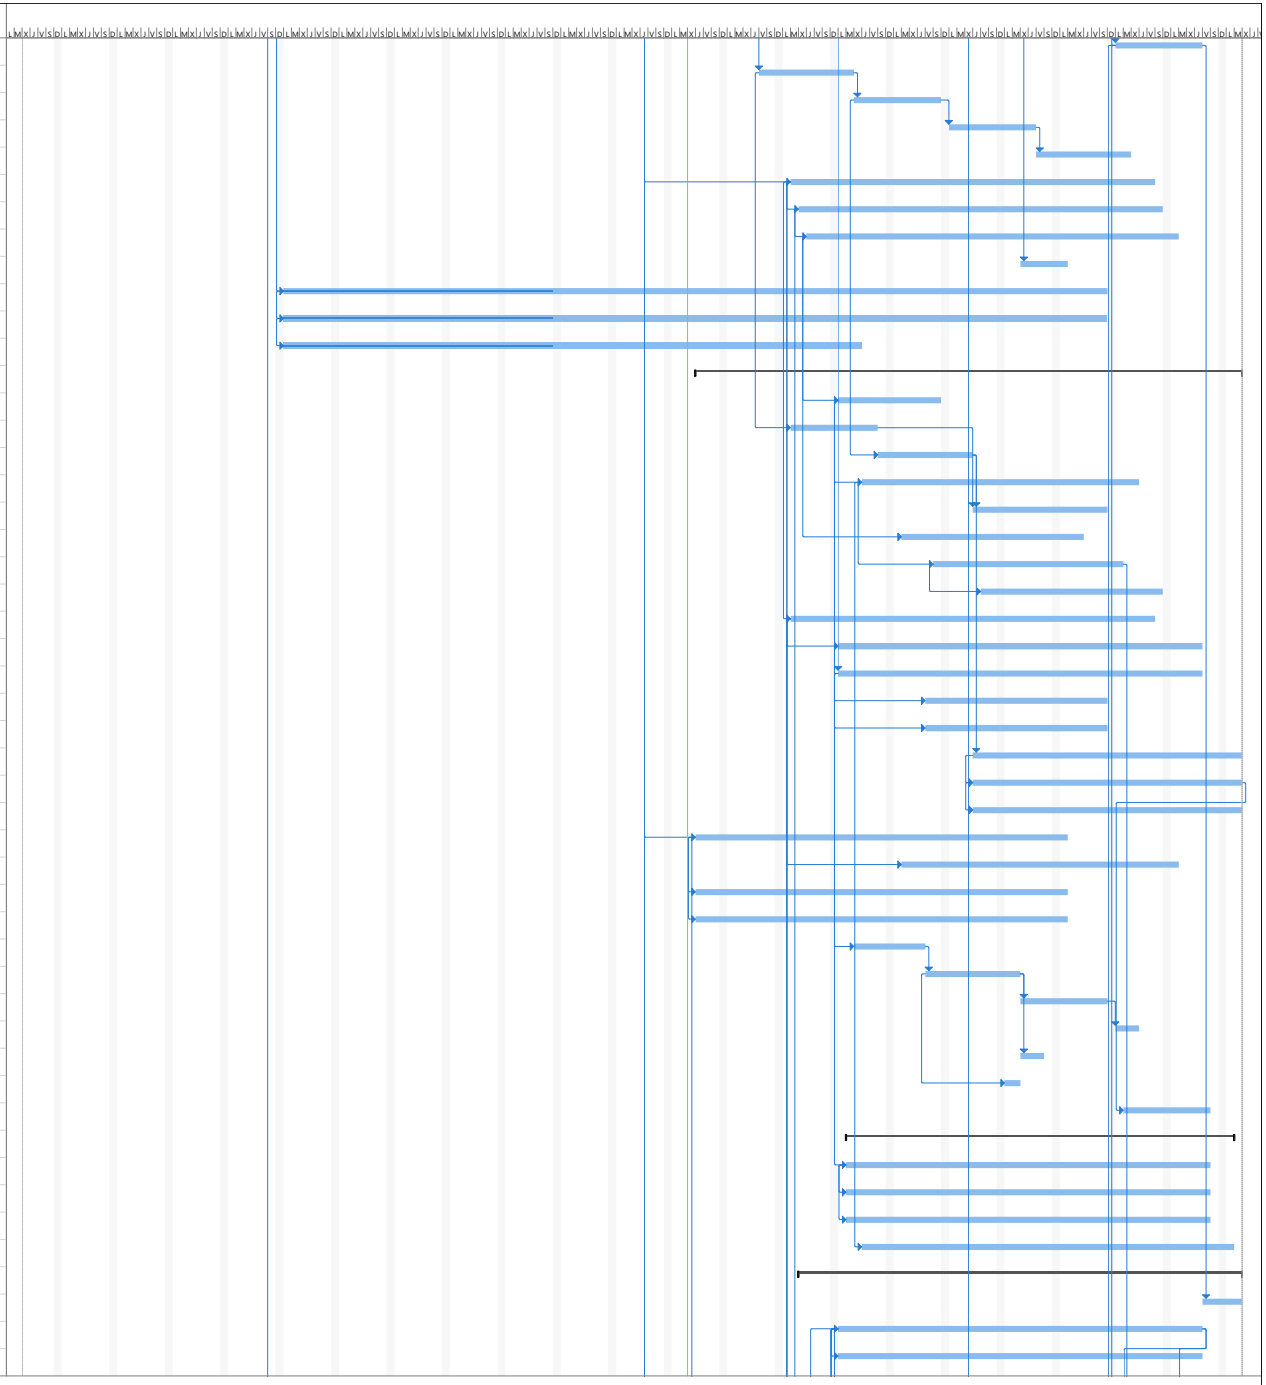

Proyecto: PDT SEGUIMIENTO P

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Progreso manual

División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
99		JUNTA de dilatacion inducida. Incluye sellador elástico de poliuretano tipo sikaflex 1A o equivalente hasta una	29 días	jue 12/11/26	mar 15/12/26	97CC+15 días	0%
100		REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE EN GRANITO, vaciado y pulido en sitio, material granito lavado calibre	40 días	mié 21/10/26	sáb 5/12/26	79CC+11 días	0%
101		Suministro, transporte e instalación de LOSETA de concreto ARQUITECTONICA BLANCO ARENA en	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	55CC+5 días	0%
102		Suministro, transporte e instalación de LOSETA de concreto ARQUITECTONICA ROYAL GOLD en	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	55CC+5 días	0%
103		Colocación de ADOQUÍN TACTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color según diseño. Incluye el suministro y	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	97CC	0%
104		Colocación de ADOQUÍN TACTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color según diseño. Para un ancho de 0.20m.	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	97CC	0%
105		Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados visuales en adoquin ADOP-A	40 días	lun 26/10/26	jue 10/12/26	97CC	0%
106		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**34 días**	**vie 6/11/26**	**mar 15/12/26**		**0%**
107		Suministro, transporte y colocación MODULOS DE VENTEROS TIPO 2, según manual de espacio público,	14 días	lun 30/11/26	mar 15/12/26	102CC+30 días	0%
108		Suministro transporte e Instalación de cicloparqueadero tipo U invertida, en tubo de acero inoxidable de 2",	20 días	mié 18/11/26	jue 10/12/26	102CC+20 días	0%
109		Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de 1,00 m, en tubería	30 días	vie 6/11/26	jue 10/12/26	102CC+10 días	0%
110		Suministro e instalación de basureras metálicas lámina calibre 3/16", según detalle. Incluye anclaje en concreto	10 días	lun 30/11/26	jue 10/12/26	102CC+30 días	0%
111		Suministro, transporte e instalación de letrero "YO AMO A SAN CRISTOBAL" desarrollado en su estructura en	10 días	mar 1/12/26	vie 11/12/26	69	0%
112		**OBRAS VARIAS**	**54 días**	**mié 14/10/26**	**mar 15/12/26**		**0%**
113		Construcción de contenedor de raices + alcorque con una altura de 1,00 m. Incluye viga de fundación en concreto	20 días	mié 14/10/26	jue 5/11/26	45CC+10 días	0%
114		Suministro, transporte e instalación de mesa de ajedrez y parqués prefabricadas en concreto visto de grano gris	4 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26	101	0%
115		Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA Tipo G INDIVIDUAL de 60x60x45 cm,	4 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26	101	0%
116		Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA Tipo G COLECTIVA de 1.80x60x45 cm	4 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26	101	0%
117		Suministro, transporte e instalación de BANCA PREFABRICADA INCLUSIVA COLECTIVA de	4 días	vie 11/12/26	mar 15/12/26	101	0%
118		Construcción de TIC INFORMATIVO, vaciado en sitio en concreto de 21MPa, incluye construcción de muro interior	7 días	vie 4/12/26	vie 11/12/26	101FC-6 días	0%
119		Suministro, transporte e instalación de paradero tipo cubierta según MEP. Incluye canoa de lámina de acero	9 días	mié 2/12/26	vie 11/12/26	97FC-8 días	0%
120		Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para LAVADA de	10 días	mié 11/11/26	sáb 21/11/26	25	0%
121		Suministro, transporte e instalación de PALOMERA EN MADERA, estructura compuesta por poste en madera	3 días	mié 9/12/26	vie 11/12/26	97FC-2 días	0%
122		Suministro, transporte y colocación de mortero 1:3 espesor 0.08 m de espesor para recubrimiento de talud.	12 días	vie 6/11/26	jue 19/11/26	113	0%
123		Revoque impermeabilizado 1:3 para muros con impermeabilizante integral para hormigon y	18 días	vie 20/11/26	jue 10/12/26	122	0%
124		RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera	9 días	mar 1/12/26	jue 10/12/26	123CC+9 días	0%
125		**VIAS**	**46 días**	**vie 23/10/26**	**mar 15/12/26**		**0%**
126		Construcción de LOSA en concreto premezclado de 28mpa, MR de 4.2 Mpa para TRAFICO VEHICULAR	40 días	vie 23/10/26	mar 8/12/26	131CC	0%
127		JUNTA de construcción. Incluye sellador elástico de poliuretano tipo sikaflex 1A o equivalente hasta una	30 días	vie 6/11/26	jue 10/12/26	126CC+12 días	0%
128		Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-25, que cumpla con el capitulo	8 días	lun 16/11/26	mar 24/11/26	130	0%
129		Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina	8 días	mié 25/11/26	jue 3/12/26	128	0%
130		Perfilación y compactación de subrasante. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	12 días	lun 2/11/26	sáb 14/11/26	56CC+10 días	0%
131		Suministro, transporte, colocación y compactación de Subbase granular Clase A, reacomodada con MEDIOS	11 días	vie 23/10/26	mié 4/11/26	71CC+3 días	0%
132		Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS	11 días	jue 5/11/26	mar 17/11/26	131	0%
133		Suministro y aplicación de pintura plástico en frío para marcas viales con resistencia al deslizamiento (flechas	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26	129FC+8 días	0%
134		Suministro y aplicación de pintura plástico en frío doble componente, para demarcación vial horizontal de LINEA	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26	133CC	0%
135		Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frío para LINEA de 0.12 m con resistencia al	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26	134CC	0%
136		Suministro y aplicación de recubrimiento y demarcación vial, para RESALTOS, COLOR AMARILLO de 2.20m de	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26	135CC	0%
137		Suministro y aplicación de pintura plástico en frío doble componente, para demarcación vial horizontal de LINEA	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26	136CC	0%
138		Suministro e instalación de señalización vertical tipo SR - Reglamentaria de 0.75 x 0.75 m, según normas y	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26	137CC	0%
139		Demarcación guía táctil en la via con plástico en frío, aplicado a llana o rodillo (conjunto de cuatro líneas de 30	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26	138CC	0%
140		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**99 días**	**sáb 15/08/26**	**mar 8/12/26**		**13%**
141		Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12m 750kgF, incluye pintura con franjas amarillas y	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
142		Suministro, trasporte e instalación de vestida secundaria RA4-003, incluye todo lo necesario para su correcta	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
143		Suministro, transporte e instalación de viento primario RA6-001, incluye todo lo necesario para su correcta	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
144		Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra acorde a norma RA6-010.	7 días	sáb 31/10/26	sáb 7/11/26	145	0%
145		Canalización de energía según norma RS1-002 en tubería PVC Ø2" tipo DB, para andénes y/o zonas verdes, no	10 días	mar 20/10/26	vie 30/10/26	45CC+15 días	0%
146		Suministro, transporte y colocación de tubería de PVC de 2Ø2" según norma RS1-002 de EPM, incluye accesorios,	10 días	mar 20/10/26	vie 30/10/26	145CC	0%
147		Canalización de energía según norma RS1-002 en tubería PVC 2Ø3" tipo DB, para andénes y/o zonas verdes, no	10 días	mar 20/10/26	vie 30/10/26	145CC	0%

Proyecto: PDT SEGUIMIENTO P

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
148		Canalización de energía según norma RS1-002 en tubería PVC Ø1", para andenes y/o zonas verdes, no incluye	10 días	mar 20/10/26	vie 30/10/26	145CC	0%
149		Construcción de caja según norma RS3-001 antifraude con tapa RS4-001, incluye suministro de materiales,	17 días	sáb 31/10/26	jue 19/11/26	148	0%
150		Anclaje para poste metálico de alumbrado público (ver detalle), incluye concreto 210 kgf, acero de refuerzo,	6 días	sáb 24/10/26	vie 30/10/26	141CC	0%
151		Diseño y certificación del anclaje para instalación de los postes de alumbrado público, por parte del ingeniero civil	40 días	sáb 15/08/26	mié 30/09/26	3FC+12 días	78%
152		Suministro transporte y construcción caja RS3-003. Incluye tapa 60x80 RS4 - Suministro, transporte y	7 días	sáb 31/10/26	sáb 7/11/26	150	0%
153		Realce o profundización de cajas, en diferentes tamaños, por variación de niveles, incluye demolición de concreto,	4 días	lun 9/11/26	jue 12/11/26	152	0%
154		Suministro, transporte e instalación de cable triplex N°4.	8 días	vie 20/11/26	sáb 28/11/26	149	0%
155		Suministro, transporte e instalación de tubería IMC Galvanizada 3".	8 días	lun 30/11/26	mar 8/12/26	154	0%
156		Traslado de línea trifásica en cable cubierto compacto 3N°266.8KCMIL +1N°1/0 AWAC, incluye reintegro	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
157		Traslado de cableado de telecomunicaciones para redes de fibra óptica, HFC y otras, para las operadores Claro,	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
158		Traslado de cable triplex calibre N°4-N°1/0.	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
159		Traslado de vestida monofásica	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
160		Traslado de vestida trifasica	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
161		Traslado de transformador monofásico	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
162		Traslado de vestida RA3-026	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
163		Traslado de integrador	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
164		Traslado de acometida en cable concentrico 2X6+6 o 2X8+8 antifraude	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
165		Traslado de portaborneras norma Epm RA7-200-8	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
166		Traslado de vestida secundaria	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
167		Traslado de línea aerea monofásica.	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
168		Retiro de poste de concreto longitud entre 8 - 12 m. Disposición final donde defina la interventoría de la obra.	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
169		Retiro de vestida o adecuación secundaria. Incluye reintegro donde defina la intenteventoría.	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
170		Retiro redes secundarias. Incluye reintegro donde defina la interventoría de la obra	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
171		Retiro viento primario o secundario.	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
172		Retiro y reintegro donde defina la interventoría de línea primaria monofásica.	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
173		Carro y cuadrilla línea viva días normales	5 días	sáb 24/10/26	jue 29/10/26	151FC+20 días	0%
174		**INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS**	**45 días**	**mié 7/10/26**	**vie 27/11/26**		**0%**
175		Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los	10 días	lun 19/10/26	jue 29/10/26	45CC+14 días	0%
176		Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los	10 días	lun 19/10/26	jue 29/10/26	175CC	0%
177		Suministro, transporte e instalación de medidor en 1/2" con acometida de 1/2" (el item no incluye la tubería de	10 días	lun 19/10/26	jue 29/10/26	176CC	0%
178		Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas	10 días	lun 19/10/26	jue 29/10/26	176CC	0%
179		Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 6", para aguas	10 días	lun 19/10/26	jue 29/10/26	176CC	0%
180		Suministro, transporte e instalación Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y	10 días	mié 7/10/26	sáb 17/10/26	45CC+4 días	0%
181		Suministro, transporte e instalación Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y	15 días	mié 7/10/26	vie 23/10/26	180CC	0%
182		Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN y/o empalme de 40x40cm, profundidad variable. medidas internas, en	15 días	vie 30/10/26	lun 16/11/26	179	0%
183		Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN y/o empalme de 60x60x60 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa,	15 días	vie 30/10/26	lun 16/11/26	179	0%
184		Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y	10 días	sáb 24/10/26	mié 4/11/26	181	0%
185		Realce de sumidero h=10 a 20 cm. Incluye concreto de 28 mpa, reja para sumidero Tipo B, formaletas y todo lo	8 días	jue 5/11/26	vie 13/11/26	184	0%
186		Limpieza de caja de inspección 80*80*150 cm	2 días	sáb 24/10/26	lun 26/10/26	181	0%
187		Desobstrucción y limpieza de tuberías y sumideros, incluye limpieza de tuberías y retiro y botada de material	4 días	mar 27/10/26	vie 30/10/26	186	0%
188		Suministro, transporte e instalación de rejilla metálica para cárcamo, incluye todo lo necesario para su correcta	8 días	sáb 31/10/26	lun 9/11/26	187	0%
189		Suministro, transporte e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE	8 días	mar 13/10/26	mié 21/10/26	181CC+5 días	0%
190		Suministro, transporte e instalación de CONO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE	4 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26	189CC+2 días	0%
191		Construcción de mesa con diámetro de 1,60m y 0,20m de espesor y cañuela con un diámetro de 1,20m y 0,20m de	8 días	jue 15/10/26	vie 23/10/26	189CC+2 días	0%
192		Suministro, transporte y colocación de PELDAÑO en acero galvanizado Ø 5/8", para cámara de inspección de	8 días	vie 16/10/26	sáb 24/10/26	191CC+1 día	0%
193		Suministro, transporte e instalación de CUELLO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE	5 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	190CC+1 día	0%
194		Suministro, transporte e instalación de TAPA POLIMÉRICA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye	5 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	193CC	0%
195		Construcción de cárcamo en concreto de 17.5 Mpa, Incluye Tapa prefabricada de 40x40x8 cm. dimensiones	18 días	jue 22/10/26	mié 11/11/26	194	0%
196		Construcción de CUNETA AUXILIAR EN "V" en concreto de 21 Mpa. 0,30 m x 0,15 m según MEP. Incluye	14 días	jue 12/11/26	vie 27/11/26	195	0%

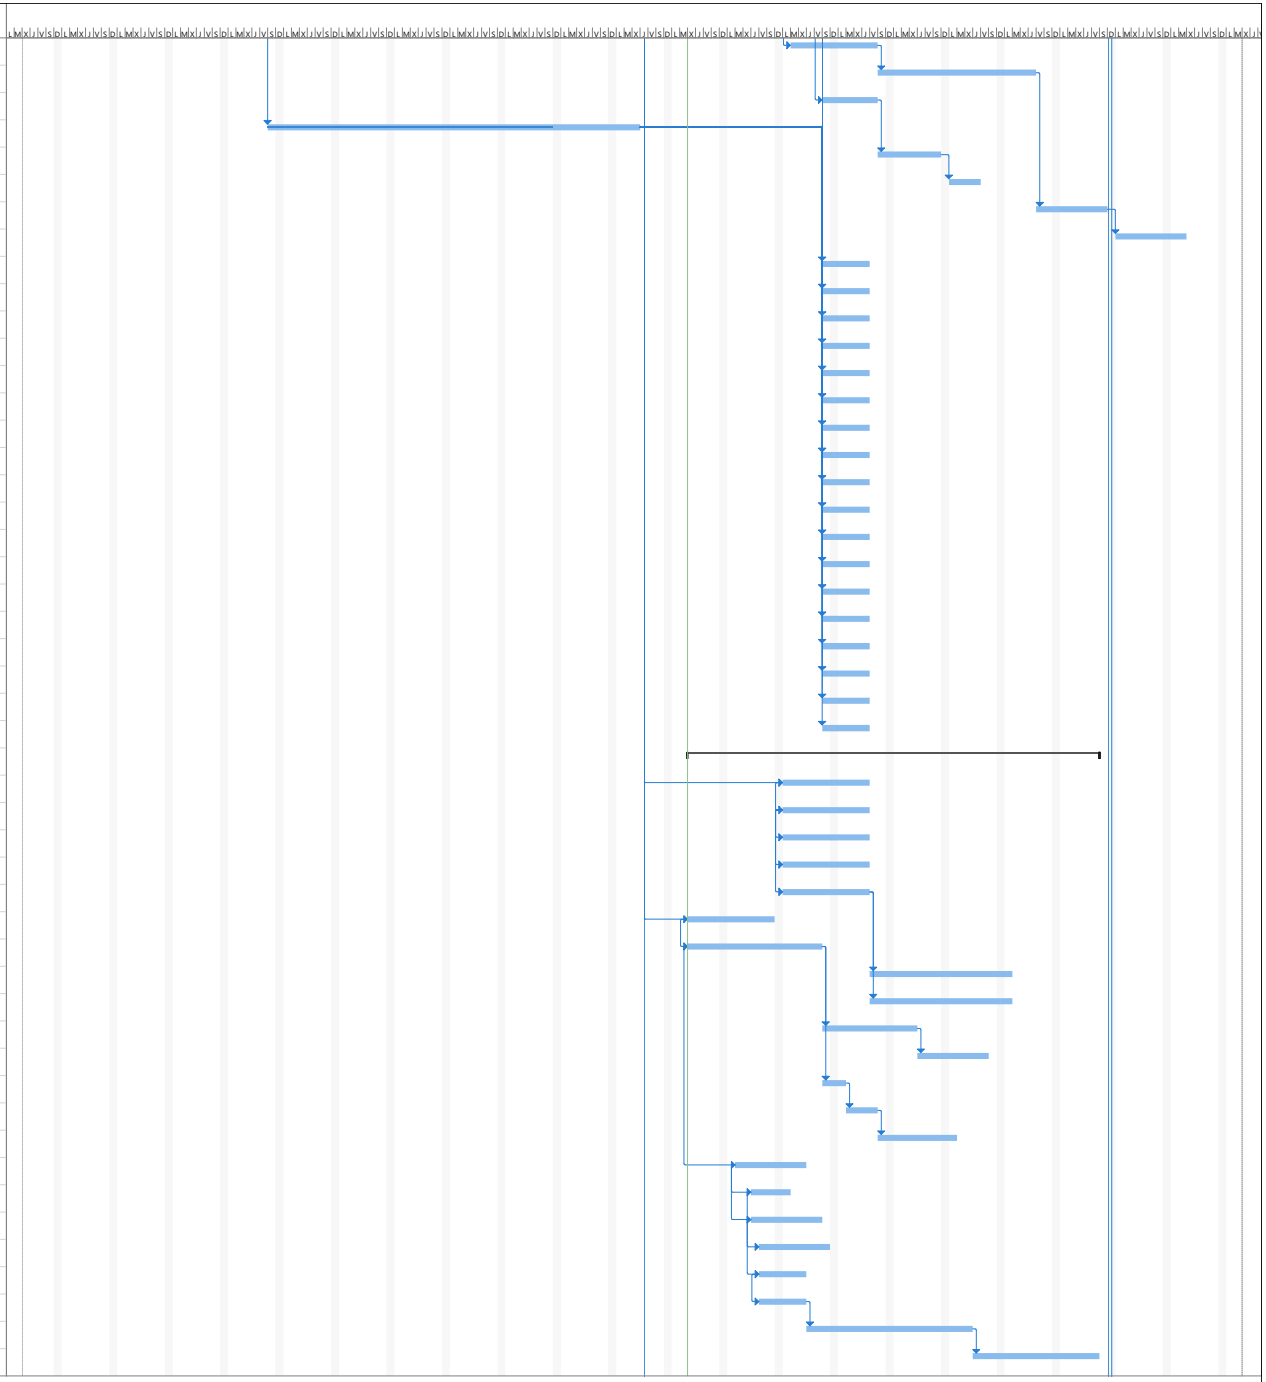


Proyecto: PDT SEGUIMIENTO P

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
197		Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la	16 días	mié 7/10/26	sáb 24/10/26	45CC+4 días	0%
198		Suministro, transporte e Instalación de GEOTEXTIL NT 1600 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye	8 días	lun 26/10/26	mar 3/11/26	197	0%
199		Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2000 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye	8 días	mié 4/11/26	jue 12/11/26	198	0%
200		Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye suministro, transporte y	8 días	vie 13/11/26	sáb 21/11/26	199	0%
201		**PAISAJISMO/SILVICULTURA**	**14 días**	**lun 30/11/26**	**mar 15/12/26**		**0%**
202		Mantenimiento de árboles, arbustos y palmas, juveniles y adultos DE PORTE BAJO en zonas verdes públicas del	14 días	lun 30/11/26	mar 15/12/26	50CC	0%
203		Hora cuadrilla de Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes y alcorques, definidos previamente con la	12 días	lun 30/11/26	sáb 12/12/26	202CC	0%
204		Eliminación o mimetismo de tocones desde 40 cm de altura por metro lineal de diametro de raíz. Cada 40 cm de	6 días	mar 8/12/26	lun 14/12/26	202FC-7 días	0%
205		Suministro de árbol o palma mínimo de 2.0 m de altura hasta 4.0 m de altura. Los árboles, arbustos o palmas,	4 días	mié 9/12/26	sáb 12/12/26	204CC+1 día	0%
206		Llenos con material de buena capacidad drenante hasta 1 metro de profundidad. El lleno podrá ser conformado con	4 días	mié 9/12/26	sáb 12/12/26	205CC	0%
207		Ingreso o actualización de información al Sistema del Árbol Urbano (SAU) sobre las actividades de Poda,	3 días	lun 30/11/26	mié 2/12/26	202CC	0%
208		Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO II. Ver detalle en especificación tecnica SIF. Suministro de	4 días	sáb 5/12/26	mié 9/12/26	50CC+5 días	0%
209		Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO III. Ver detalle en especificación tecnica SIF. Suministro de	4 días	sáb 5/12/26	mié 9/12/26	208CC	0%
210		Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO IV. Ver detalle en especificación tecnica SIF. Suministro de	8 días	sáb 5/12/26	lun 14/12/26	209CC	0%
211		Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO V. Ver detalle en especificación tecnica SIF. Suministro de	5 días	sáb 5/12/26	jue 10/12/26	210CC	0%
212		Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VI. Ver detalle en especificación tecnica SIF. Suministro de	5 días	mar 8/12/26	sáb 12/12/26	211CC+2 días	0%
213		Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VII. Ver detalle en especificación tecnica SIF. Suministro de	5 días	mar 8/12/26	sáb 12/12/26	212CC	0%
214		Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO VIII. Ver detalle en especificación tecnica SIF. Suministro de	5 días	mar 8/12/26	sáb 12/12/26	213CC	0%
215		Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Cesped San Agustín, grama Bermuda,	6 días	mar 8/12/26	lun 14/12/26	214CC	0%
216		Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados	132 días	mié 15/07/26	mar 15/12/26		44%
217		Inversión Social - Ambiental - Implementación PMT - Gasto Reembolsable -	132 días	mié 15/07/26	mar 15/12/26		44%
218	✓	Pólizas - Gasto Reembolsable -	30 días	mié 15/07/26	mar 18/08/26		100%

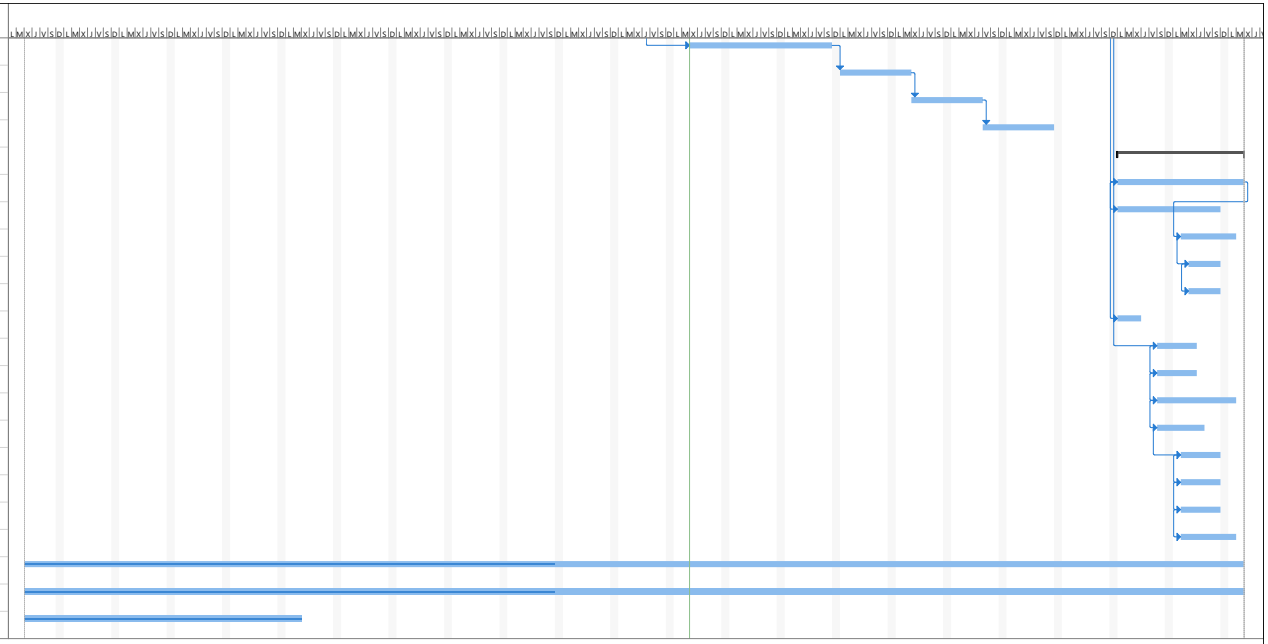

Proyecto: PDT SEGUIMIENTO P

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
