5796

Villavicencio, 29 de septiembre de 2026

Ingeniero
Héctor Armando Gómez Jaimes
Representante Legal
CONSORCIO INTERPARQUES AC
Villavicencio - Meta

CCM-037-2026

Recibido
8.00 am
30/09/26

REF: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META"

ASUNTO: Entrega parcial No 3

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente se hace entrega de la Parcial No. 3 correspondiente a la Fase II – Obra, la cual comprende los productos, informes y documentos técnicos desarrollados durante el período comprendido entre el 28 de julio y el 25 de septiembre de 2026, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cronograma de ejecución aprobado y el alcance establecido para esta etapa del proyecto.

La presente entrega consolida el avance de las actividades ejecutadas durante el período reportado, incluyendo la documentación técnica, administrativa y de seguimiento que soporta el desarrollo de la obra, así como los registros, informes y demás anexos que evidencian el cumplimiento de las actividades programadas para la Fase II.

Los documentos que conforman esta entrega se presentan para su revisión y aprobación por parte de la interventoría y de la entidad contratante, con el fin de dar continuidad al proceso de ejecución contractual y dejar constancia del avance alcanzado durante el período informado.

Cordialmente,

DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ
C.C. 86.071.812 DE VILLAVICENCIO
R/L CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026

5797

Villavicencio, 1 de octubre de 2026

Señores
ALCALDIA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
San Martín – Meta
alcaldia@sanmartin-meta.gov.co

REF: CONTRATO DE OBRA No 107 de 2026 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: Remisión Parcial de Obra No.3.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta Interventoría, nos permitimos remitir a la Entidad la Parcial de Obra No.3, correspondiente al período comprendido entre el 28 de julio y el 25 de septiembre de 2026, relacionada con la ejecución de la Fase II – Construcción del proyecto Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo I, ubicado en el municipio de San Martín de los Llanos, Meta.

La documentación remitida comprende los soportes y documentos correspondientes al período objeto de la Parcial No.3, de conformidad con las obligaciones establecidas para el Contratista de Obra, así como el Informe de Interventoría a la Obra, en el cual se consolida el seguimiento, verificación y análisis efectuado por la Interventoría durante el período correspondiente.

Por lo anterior, se remite la Parcial de Obra No.3 y sus respectivos soportes, para conocimiento, revisión y fines pertinentes por parte de la Entidad.

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
FECHA 1-OCT-2026 HORA 5:30 p.m.
RECIBIDO

HÉCTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
Representante Legal
CONSORCIO INTERPARQUES AC
NIT: 902.051.541-3.

5798

INFORME ACTA PARCIAL No 3

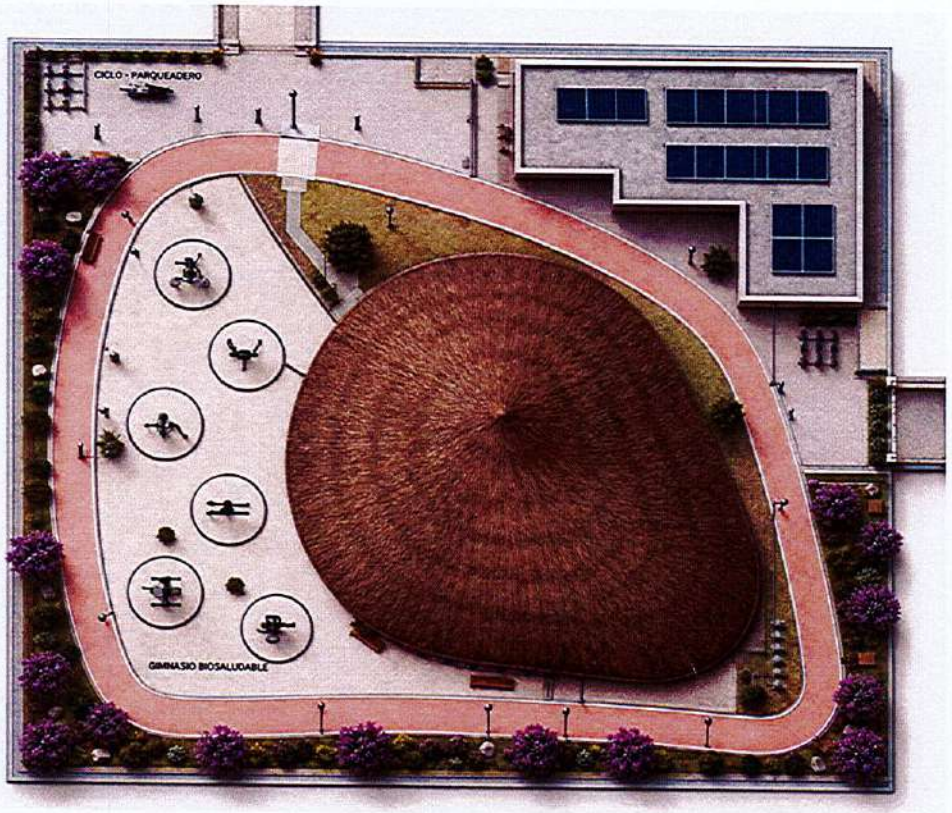
5799

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CONTRATO DE OBRA No. 107 DE 2026

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META"



CONTRATISTA:

CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026

INFORME PARCIAL No 3

(28 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2026)

S200

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

CONTENIDO 2

INTRODUCCIÓN 3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
2. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 9
3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 13
5. PERSONAL DE OBRA 15
6. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES 17
7. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 20
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 21
9. PROGRAMADO VS EJECUTADO 38
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 45
11. CONCLUSIÓN 78

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en el marco del Contrato de Obra No. 107 de 2026, suscrito entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META y el CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026, cuyo objeto corresponde a los **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEPARTAMENTO DEL META".**

El proyecto se desarrolla en el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2299 de 2025, suscrito con el Ministerio del Interior, y tiene como propósito la construcción de un espacio destinado al fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la integración comunitaria y el desarrollo social del municipio.

Una vez culminada y aprobada la etapa de estudios y diseños, cuyos productos fueron presentados mediante la Parcial No. 1 y recibidos conforme a los procedimientos establecidos contractualmente, el proyecto dio inicio a la fase de ejecución de obra, desarrollando las actividades constructivas previstas en el cronograma aprobado.

En ese contexto, el presente informe corresponde a la Parcial No. 3 y tiene como finalidad presentar el avance físico de las obras ejecutadas durante el período reportado, así como las actividades técnicas, constructivas, administrativas, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo desarrolladas para la correcta ejecución del contrato. Igualmente, se expone el estado de avance del proyecto, el cumplimiento de la programación establecida y las principales gestiones realizadas para garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas y contractuales aplicables.

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

5802

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO	06 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
CONTRATO DE OBRA No	107 DE 2026
OBJETO CONTRATO DE OBRA	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META"
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPARQUES AC
MUNICIPIO	SAN MARTIN
DEPARTAMENTO	META
VALOR DEL CONTRATO	$1.897.970.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE PRORROGA 1	05 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE PRORROGA 1	UN (1) MES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS
NUEVO FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA 1	29 DE JULIO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	29 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN 1	7 DÍAS
FECHA DE REINICIO	05 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE PRORROGA 2	05 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE PRORROGA 2	DOS (2) MESES Y UN (01) DIA
FECHA DE PRORROGA 3	01 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO DE PRORROGA 3	VEINTICINCO (25) DIAS
NUEVO FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA 3	30 DE OCTUBRE DE 2026

1.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA, REGIÓN, ZONA URBANA, GEORREFERENCIACIÓN.

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 107 de 2026 suscrito el 06 de abril de 2026, cuyo objeto es la **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META"**, se ejecutaran en el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 236-59993 localizado en el Municipio de San Martin, Latitud. 3° 42' 16.16" N Long 73° 41" 48.77 W, en el departamento del Meta.



Ilustración 1 Localización proyecto.

1.3 GEORREFERENCIACIÓN

Se realizó el levantamiento topográfico del predio destinado al Centro de Convivencia del municipio de San Martín de los Llanos, Meta, mediante equipos satelitales GNSS y método estático, obteniendo la georreferenciación de dos (02) puntos GPS debidamente materializados y amarrados al sistema geodésico nacional MAGNA SIRGAS del IGAC.

MOJON	NORTE	ESTE	ELEVACIÓN
GPS 1	3°42´17.38120"	73°41´47.76467"	446.457
GPS 2	3°42´18.27260"	73°41´52.23239"	446.897

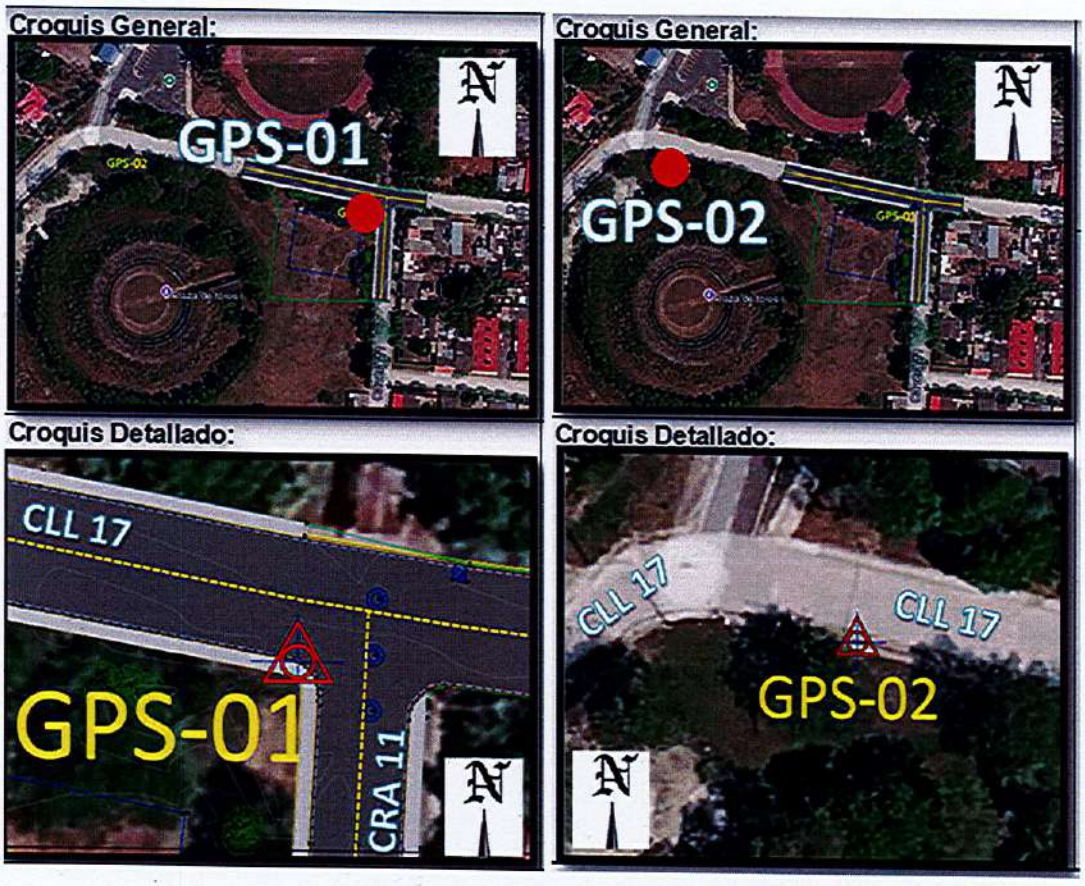


Ilustración 2 Localización GPS

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance del Contrato de Obra No. 107 de 2026 comprende la ejecución integral de los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo I, en el municipio de San Martín de los Llanos, departamento del Meta, en un área aproximada de 1.116 m², conforme a las condiciones técnicas, administrativas, financieras y legales establecidas en el contrato y sus documentos anexos.

El contrato es ejecutado por el Consorcio Centro de Convivencia Meta 2026, bajo la contratación de la Alcaldía Municipal de Villavicencio, y cuenta con la interventoría del Consorcio Interparques AC. El valor contractual asciende a $1.897.970.000, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato de Obra No. 107 de 2026.

El desarrollo del contrato se estructura en dos fases. La Fase 1 – Estudios y Diseños incluye la elaboración, revisión, ajuste y aprobación de los estudios y diseños técnicos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, abarcando los componentes arquitectónicos, estructurales y de redes técnicas, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos definidos por la entidad contratante y la interventoría.

La Fase 2 – Construcción comprende la ejecución de las actividades constructivas necesarias para la materialización del proyecto, incluyendo, entre otras, la construcción de área polivalente cubierta, zonas de integración comunitaria, gimnasio biosaludable, zona infantil, edificio de servicios, así como las obras de urbanismo asociadas, tales como senderos peatonales y pista de trote, de conformidad con los diseños aprobados, especificaciones técnicas y programación de obra vigente.

En cuanto al desarrollo contractual, mediante la Prórroga No. 1, suscrita el 05 de junio de 2026, se amplió el plazo contractual en un (1) mes y veinticuatro (24) días, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 29 de julio de 2026. En desarrollo de esta ampliación se dio continuidad a las actividades previstas, permitiendo avanzar en la culminación de la etapa correspondiente a estudios y diseños y en las actuaciones requeridas para la continuidad de la fase constructiva.

Posteriormente, mediante Acta de Suspensión No. 1, de fecha 29 de julio de 2026, se determinó la suspensión temporal de la ejecución contractual por un período de siete (7) días, con efectos a partir de la fecha señalada. Durante este período se suspendieron temporalmente las actividades contractuales, de conformidad con las condiciones y circunstancias consignadas en los documentos contractuales correspondientes.

Una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, se suscribió el Acta de Reinicio con fecha 05 de agosto de 2026, mediante la cual se reanudó la ejecución del contrato y se dio continuidad a las obligaciones y actividades previstas en el alcance contractual.

Así mismo, con fecha 05 de agosto de 2026, se formalizó la Prórroga No. 2, mediante la cual se amplió nuevamente el plazo de ejecución contractual por dos (2) meses y un (1) día, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 05 de octubre de 2026. Esta ampliación permite garantizar la continuidad de las actividades pendientes y la adecuada culminación de las obligaciones previstas en el contrato, de acuerdo con la programación de obra, los diseños aprobados, las especificaciones técnicas y las condiciones contractuales vigentes.

En consecuencia, para el período objeto del presente seguimiento, el contrato se encuentra sujeto a la nueva programación derivada de la Prórroga No. 2, manteniéndose como fecha prevista de terminación el 05 de octubre de 2026. La ejecución deberá continuar de manera articulada entre el contratista, la interventoría y la entidad contratante, realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico correspondiente, con el propósito de garantizar el cumplimiento del alcance, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas, la calidad de los trabajos y los tiempos establecidos contractualmente.

De esta manera, las actuaciones surtidas durante el desarrollo contractual —Prórroga No. 1, Suspensión No. 1, Reinicio y Prórroga No. 2— han modificado el plazo inicialmente previsto, sin alterar el objeto fundamental del contrato, orientado a la ejecución integral de los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo I, en beneficio de la comunidad del municipio de San Martín de los Llanos, Meta.

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES ESTUDIOS Y DISEÑOS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$	4.500.000,00
2	ESTUDIOS DE SUELOS	$	9.000.000,00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$	16.000.000,00
4	DISEÑO URBANO ESPACIO PUBLICO	$	8.000.000,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$	15.000.000,00
6	DISEÑO HIDROSANITARIO	$	7.500.000,00
7	DISEÑO RED DE GAS	$	5.000.000,00
8	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	$	17.000.000,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS	$	5.000.000,00
10	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$	5.500.000,00
11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$	4.500.000,00
12	OTROS	$	5.000.000,00
	VALOR TOTAL	**$**	**102.000.000,00**

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCIÓN ÁREA CUBIERTA - ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO - EDIFICIO DE SERVICIOS	M²	312,5	$ 2.670.000.000,00	$ 834.375.000,00
2	VALOR CONSTRUCCIÓN ÁREA DESCUBIERTA	M²	803,5	$ 1.170.000,00	$ 940.095.000,00
3	CERTIFICACIONES				$ 12.000.000,00
4	IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO				$ 9.500.000,00
	VALOR TOTAL				**$ 1.795.970.000,00**

2. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

2.1 CONTROL DE PÓLIZAS APROBADAS DEL CONTRATO

La póliza expedida por la compañía aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.AS, que se describen a continuación con sus fechas de vigencia, fueron expedidas por el CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026 cumpliendo con los requisitos de valor amparado y Vigencia exigidos en el contrato de obra No. 107 de 2026.

2.01.1. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Suscripción del contrato (06-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/04/2026	05/12/2026	379.594.000,00
Suscripción del contrato (06-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	06/04/2026	05/06/2029	379.594.000,00
Suscripción del contrato (06-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS	05/06/2026	05/06/2031	379.594.000,00
Suscripción del contrato (06-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2026	06/05/2029	189.797.000

2.01.2. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Suscripción del contrato (06-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	06/04/2026	05/06/2026	350.181.000
Suscripción del contrato (06-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PATRONAL	06/04/2026	05/06/2026	350.181.000
Suscripción del contrato (06-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	06/04/2026	05/06/2026	350.181.000
Suscripción del contrato (06-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	06/04/2026	05/06/2026	350.181.000

2.01.3. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE INICIO

Pólizas de obras actualizadas al Acta de Inicio el 10 de abril de 2026, a ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de Inicio (10-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	05/12/2026	379.594.000,00
Acta de Inicio (10-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORALES	10/04/2026	05/06/2029	379.594.000,00
Acta de Inicio (10-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS	05/06/2026	05/06/2031	379.594.000,00
Acta de Inicio (10-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CALIDAD DEL SERVICIO	10/05/2026	10/05/2029	189.797.000

2.01.4. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN ACTA DE INICIO

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de Inicio (10-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/04/2026	05/06/2026	350.181.000
Acta de Inicio (10-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PATRONAL	10/04/2026	05/06/2026	350.181.000
Acta de Inicio (10-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	10/04/2026	05/06/2026	350.181.000
Acta de Inicio (10-04-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2026	05/06/2026	350.181.000

2.01.5. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PRORROGA N0. 1

Pólizas de obras actualizadas al Acta de prorroga el 05 de junio de 2026, a ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Prorroga de Vigencia (05-06-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	29/01/2027	379.594.000,00
Prorroga de Vigencia (05-06-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORALES	10/04/2026	29/07/2029	379.594.000,00
Prorroga de Vigencia (05-06-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS	29/07/2026	29/07/2031	379.594.000,00
Prorroga de Vigencia (05-06-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CALIDAD DEL SERVICIO	15/06/2026	15/06/2029	189.797.000

2.01.6. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN PRORROGA N0. 1

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Prorroga de Vigencia (05-06-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	05/06/2026	29/07/2026	350.181.000
Prorroga de Vigencia (05-06-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PATRONAL	05/06/2026	29/07/2026	350.181.000
Prorroga de Vigencia (05-06-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	05/06/2026	29/07/2026	350.181.000
Prorroga de Vigencia (05-06-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	05/06/2026	29/07/2026	350.181.000

2.01.7. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE REINICIO 1

Pólizas de obras actualizadas al Acta de reinicio el 05 de agosto de 2026, a ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de Reinicio (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	05/02/2027	379.594.000,00
Acta de Reinicio (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORALES	10/04/2026	05/08/2029	379.594.000,00

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de Reinicio (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS	05/08/2026	05/08/2031	379.594.000,00
Acta de Reinicio (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CALIDAD DEL SERVICIO	15/06/2026	22/06/2029	189.797.000

2.01.8. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN ACTA DE REINICIO 1

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de Reinicio (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/07/2026	05/08/2026	350.181.000
Acta de Reinicio (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PATRONAL	29/07/2026	05/08/2026	350.181.000
Acta de Reinicio (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	29/07/2026	05/08/2026	350.181.000
Acta de Reinicio (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/07/2026	05/08/2026	350.181.000

2.01.9. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE PRORROGA 2

Pólizas de obras actualizadas al Acta de prorroga 2 el 05 de agosto de 2026, a ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	05/04/2027	379.594.000,00
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORALES	10/04/2026	05/10/2029	379.594.000,00
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS	05/10/2026	05/10/2031	379.594.000,00
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CALIDAD DEL SERVICIO	15/06/2026	22/06/2029	189.797.000

2.01.10. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN ACTA DE PRORROGA 2

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	05/08/2026	05/10/2026	350.181.000
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PATRONAL	05/08/2026	05/10/2026	350.181.000
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	05/08/2026	05/10/2026	350.181.000
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	05/08/2026	05/10/2026	350.181.000

2.01.11. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE PRORROGA 3

Pólizas de obras actualizadas al Acta de prorroga 3 el 01 de octubre de 2026, a ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de prorroga 3 (01-10-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	30/04/2027	379.594.000,00
Acta de prorroga 3 (01-10-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORALES	10/04/2026	30/10/2029	379.594.000,00
Acta de prorroga 3 (01-10-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAS	30/10/2026	30/10/2031	379.594.000,00
Acta de prorroga 3 (01-10-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	104332	CALIDAD DEL SERVICIO	15/06/2026	22/06/2029	189.797.000

2.01.12. PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN ACTA DE PRORROGA 3

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/04/2026	30/10/2026	350.181.000
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	PATRONAL	10/04/2026	30/10/2026	350.181.000
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	10/04/2026	30/10/2026	350.181.000

5812

DAV	DAV INGENIERÍA
Daniel Vanegas Ingeniería	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL No. 2	$ 601.973.941,00
VALOR PRESENTE PARCIAL N° 3	$ 585.259.870,16
VALOR POR EJECUTAR	$ 618.736.188,84

De acuerdo con la información financiera reportada, el Contrato de Obra No. 107 de 2026 presenta un valor total de $1.897.970.000,00, de los cuales en la parcial N° 1 se facturo un valor de $92.000.000,00, en la Parcial N° 2 se facturo un valor de $ 601.973.941,00.

En consecuencia, el avance financiero a la fecha del presente informe, tomando como referencia el valor efectivamente facturado, corresponde al **67.40%** del valor total contratado.

En la presente Acta Parcial N° 3 se tiene un porcentaje físico ejecutado del 30,84% y se realiza el cobro por un valor de $ 585.259.870,16 lo cual equivaldría a un avance financiero acumulado de 67,40%.

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Acta de prorroga 2 (05-08-2026)	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.S Nit. 900.814.916-1	30279	RC VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2026	30/10/2026	350.181.000

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

3.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El Contrato de Obra **No. 107 de 2026** no contempló la entrega de recursos por concepto de anticipo. En consecuencia, no existen actividades, movimientos financieros ni procesos de amortización asociados a este componente contractual. Por tal motivo, la información correspondiente al capítulo de anticipo no aplica para el presente informe.

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

El registro presupuestal que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados es el siguiente:

TIPO DE RECURSO	RP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VIGENCIA
FONSECON	2026000342	1.3.3.11.07 Rb Transferencias De Capital De Otras Entidades Del Gobierno General	1.897.970.000	31/12/2026

3.3 INFORMACIÓN AVANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.897.970.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 1.287.223.223,99
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL No. 1	$92.000.000

4. ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO FASE 2



5. PERSONAL DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

MES DE AGOSTO DE 2026

No.	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO
1	Ing. Daniel Arturo Vanegas Velásquez	Director De Obra
2	Ing. María Fernanda Quevedo Gutiérrez	Ingeniero Residente De Obra
3	María Fernanda Rodríguez Ramírez	Profesional En Salud Ocupacional
4	Ing. Paula Andrea Pardo Redondo	Profesional Ambiental

DAV	DAV INGENIERÍA
Daniel Vanegas Ingeniería	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

No.	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO
1	Ing. Daniel Arturo Vanegas Velásquez	Director De Obra
2	Ing. María Fernanda Quevedo Gutiérrez	Ingeniero Residente De Obra
3	María Fernanda Rodríguez Ramírez	Profesional En Salud Ocupacional
4	Ing. Paula Andrea Pardo Redondo	Profesional Ambiental

PERSONAL TÉCNICO

MES DE AGOSTO DE 2026

No.	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO
1	William Rey Arias	Ayudante De Obra
2	Yimmy Alexander Torres	Ayudante De Obra
3	Alejandro Frisnea Arias	Ayudante De Obra
4	Cristhian Gallo Guapacha	Oficial De Obra
5	Javier Alejandro Mora González	Oficial De Obra
6	Juan Sebastian Almeida Cuevas	Ayudante De Obra
7	Jairo Andrés Paloma Giraldo	Ayudante De Obra
8	Yubely Andrea Rodríguez Amaya	Ayudante De Obra
9	Robinson Roberto González Castillo	Ayudante De Obra
10	Hugo Alexander Quintero Rojas	Ayudante De Obra
11	Breiner Estibenbedoya Martinez	Ayudante De Obra

MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

No.	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO
1	William Rey Arias	Ayudante De Obra
2	Yimmy Alexander Torres	Ayudante De Obra
3	Alejandro Frisnea Arias	Ayudante De Obra
4	Javier Alejandro Mora González	Oficial De Obra
5	Jairo Andrés Paloma Giraldo	Ayudante De Obra
6	Yubely Andrea Rodríguez Amaya	Ayudante De Obra
7	Robinson Roberto González Castillo	Ayudante De Obra
8	Hugo Alexander Quintero Rojas	Ayudante De Obra
9	Breiner Estiben bedoya Martinez	Ayudante De Obra
10	Juan Martín Ruíz García	Ayudante De Obra

6. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES

Se adjunta la planilla de pago de la seguridad social y parafiscal de los trabajadores en el periodo comprendido del mes de agosto de 2026.

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

PERSONAL PROFESIONAL

Daniel Arturo Vanegas Velásquez

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86071812		VANEGAS VELASQUEZ DANIEL ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	OF.404.CL.15.No.41-101.	VILLAVICENCIO-META	6741131	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	865474244	9511202685	I	2026/09/02	2026/09/18	BANCOLOMBIA	15	$4,922,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln vge vac vct vst vlr	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86071812	VANEGAS VELASQUEZ DANIEL ARTURO	X	230301	30	$16,500,000	$2,805,000	EPS005	30	$16,500,000	$2,062,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$4,867,500
Total	Afiliados(1)						$16,500,000	$2,805,000			$16,500,000	$2,062,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$4,867,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,805,000	$31,500	$0	$2,836,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$2,805,000	$31,500	$0	$2,836,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,062,500	$23,100	$0	$2,085,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,062,500	$23,100	$0	$2,085,600
TOTAL				1	$4,867,500	$54,600	$0	$4,922,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902050044	1	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN MARTIN COMZa	Calle 15 # 40 - 01	SAN MARTIN-META	3103069962	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	678858336	9510296488	Y	2026/09/10	2026/09/23	BANCOLOMBIA		$123,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	vrg ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln vge vma vac avp vct srl vdp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86071812	VANEGAS VELASQUEZ DANIEL ARTURO			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0		$121,900

Paula Andrea Pardo Redondo

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121889444		PARDO REDONDO PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 6 sur 39-100	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	622080748	9510013467	I	2026/09/10	2026/09/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1121889444	PARDO PAULA	230201	30		$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

María Fernanda Quevedo Gutiérrez

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902050044	1	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN MARTIN CCN26	Calle 15 # 40 - 01	SAN MARTIN-META	3103069962	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	678847226	95116421646	E	2026/09/10	2026/09/23	BANCOLOMBIA		$6,476,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion		Nombre	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdc	tac	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006697793	FRISNEDA ARIAS ALEJANDRO																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1121886209	GALLO GUAPACHA CRISTHIAN CAMILO	X																23022I	18	$1,200,000	$192,000	CP5002	18	$1,200,000	$48,000	CCF34	18	$1,200,000	$48,000	94-11	18	$1,200,000	$83,600	18	$0	$0	SI	$371,600
3	CC	1006698240	GONZALEZ CASTILLO ROBINSON ROBERTO																	23100I	30	$1,750,905	$280,200	CP5C34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1006697203	MORA GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO																	23030I	30	$2,000,000	$320,000	CP5017	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	94-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5	CC	1120502124	PALOMA GIRALDO JAIRO ANDRES																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5C34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1121862487	QUEVEDO GUTIERREZ MARIA FERNANDA																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	97357694	QUINTERO ROJAS HUGO ALEXANDER																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CP5017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	97354820	REY ARIAS WILLIAM																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5C34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1120502491	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA FERNANDA																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
10	CC	1006697685	RODRIGUEZ AMAYA YURELY ANDREA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CP5C34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	1120498840	TORO GONZALEZ JUAN DAVID																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
12	CC	1120559014	TORRES GRANADOS TIMMY ALEXANDER																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CP5041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	Afiliados(12)																					$20,709,050	$3,344,000			$20,709,050	$829,000			$20,709,050	$829,000			$20,709,050	$1,441,800		$0	$0		$6,413,800

PERSONAL TÉCNICO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902050044	1	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN MARTIN CCN26	Calle 15 # 40 - 01	SAN MARTIN-META	3103069962	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	678847226	95116421646	E	2026/09/10	2026/09/23	BANCOLOMBIA		$6,476,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion		Nombre	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				ing	ret	tde	tae	tdc	tac	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006697793	FRISNEDA ARIAS ALEJANDRO																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1121886209	GALLO GUAPACHA CRISTHIAN CAMILO	X																23022I	18	$1,200,000	$192,000	CP5002	18	$1,200,000	$48,000	CCF34	18	$1,200,000	$48,000	94-11	18	$1,200,000	$83,600	18	$0	$0	SI	$371,600
3	CC	1006698240	GONZALEZ CASTILLO ROBINSON ROBERTO																	23100I	30	$1,750,905	$280,200	CP5C34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1006697203	MORA GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO																	23030I	30	$2,000,000	$320,000	CP5017	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	94-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5	CC	1120502124	PALOMA GIRALDO JAIRO ANDRES																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5C34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1121862487	QUEVEDO GUTIERREZ MARIA FERNANDA																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	97357694	QUINTERO ROJAS HUGO ALEXANDER																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CP5017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	97354820	REY ARIAS WILLIAM																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5C34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1120502491	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA FERNANDA																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
10	CC	1006697685	RODRIGUEZ AMAYA YURELY ANDREA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CP5C34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	1120498840	TORO GONZALEZ JUAN DAVID																	23030I	30	$1,750,905	$280,200	CP5017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
12	CC	1120559014	TORRES GRANADOS TIMMY ALEXANDER																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CP5041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	94-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	Afiliados(12)																					$20,709,050	$3,344,000			$20,709,050	$829,000			$20,709,050	$829,000			$20,709,050	$1,441,800		$0	$0		$6,413,800

Respecto del personal adicional reportado en la presente cuenta, no se anexan soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, toda vez que su vinculación e ingreso a la ejecución del contrato se efectuó durante el mes de septiembre de 2026. En consecuencia, los aportes

correspondientes a dicho período serán liquidados y cancelados dentro de los plazos legalmente establecidos durante el mes de septiembre de 2026, conforme a la normatividad vigente en materia de seguridad social y parafiscales.

7. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

7.1 AVANCE EJECUTADO

AVANCE FÍSICO	CONTRATO DE OBRA No. 107 DE 2026
Valor Inicial Proyecto	$ 1.897.970.000,00
Valor fase I	$ 92.000.000,00
Valor fase II	$ 1.795.970.000,00
Valor Actualizado Proyecto	$ 1.897.970.000,00
Valor ejecutado en el periodo Parcial N° 3	$ 585.259.870,16
Porcentaje ejecutado en el periodo	30,84%
Valor Ejecutado acumulado	$ 1.279.233.811,16
Porcentaje Ejecutado acumulado	67,40 %

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1
MINICARGADOR	1
VIBROCOMPACTADOR	1
HERRAMIENTA MENOR	GL
VIBRADOR DE CONCRETO	1

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para el presente informe se han ejecutado las siguientes cantidades de obra:

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
[redacted]	PRELIMINARES				$ 78.068.976,48		$ 0,00		$78.068.976,48	4,35%
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	1116,00	$4.689,00	$ 5.232.924,00		$ 0,00	1116,00	$ 5.232.924,00	100,00%
1.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	390,60	$ 108.094,00	$ 42.221.516,40		$ 0,00	390,60	$ 42.221.516,40	100,00%
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	7499,52	$ 2.309,00	$ 17.316.391,68		$ 0,00	7499,52	$ 17.316.391,68	100,00%
1.4	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	223,20	$ 44.571,00	$ 9.948.247,20		$ 0,00	223,20	$ 9.948.247,20	100,00%
1.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3-KM	1450,80	$ 2.309,00	$ 3.349.897,20		$ 0,00	1450,80	$ 3.349.897,20	100,00%
2	AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO				$ 701.595.704,88		$193.265.139,08		$573.569.835,56	81,95%
2,1	**PRELIMINARES**				**$ 1.208.715,30**		**$ 0,00**		**$ 1.208.715,30**	**100,00%**
[redacted]1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	241,02	$ 5.015,00	$ 1.208.715,30		$ 0,00	241,02	$ 1.208.715,30	100,00%
2.2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA**				**$ 458.634.163,76**		**$193.265.139,08**		**$ 458.634.163,76**	**100,00%**
2.2.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	56,67	$ 108.094,00	$ 6.125.686,98		$ 0,00	56,67	$ 6.125.686,98	100,00%
2.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	15,72	$ 98.183,00	$ 1.543.436,76		$ 0,00	15,72	$ 1.543.436,76	100,00%
2.2.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)		1,80	$ 923.201,00	$ 1.661.761,80		$ 0,00	1,80	$ 1.661.761,80	100,00%
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	3,00	$ 1.312.643,00	$ 3.937.929,00		$ 0,00	3,00	$ 3.937.929,00	100,00%

DAV INGENIERÍA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2.2.5	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	2,27	$ 937.759,00	$ 2.128.712,93		$ 0,00	2,27	$ 2.128.712,93	100,00%
2.2.6	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y ONSTRUCCION	M3	4,71	$ 1.516.379,00	$ 7.142.145,09		$ 0,00	4,71	$ 7.142.145,09	100,00%
2.2.7	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	122,47	$ 80.137,00	$ 9.814.378,39	122,470	$ 9.814.378,39	122,47	$ 9.814.378,39	100,00%
2.2.8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y	M2	200,62	$ 53.330,00	$ 10.699.064,60	200,620	$ 10.699.064,60	200,62	$ 10.699.064,60	100,00%
2.2.9	COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,63	$ 1.878.753,00	$ 1.183.614,39	0,630	$ 1.183.614,39	0,63	$ 1.183.614,39	100,00%
2.2.10	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,14	$ 1.972.331,00	$ 2.248.457,34	1,140	$ 2.248.457,34	1,14	$ 2.248.457,34	100,00%
2.2.11	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	2,84	$ 1.643.907,00	$ 4.668.695,88		$ 0,00	2,84	$ 4.668.695,88	100,00%
2.2.12	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	3,36	$ 3.321.579,00	$ 11.160.505,44		$ 0,00	3,36	$ 11.160.505,44	100,00%
2.2.13	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36,15	$ 1.213.779,00	$ 43.878.110,85	36,150	$ 43.878.110,85	36,15	$ 43.878.110,85	100,00%
2.2.14	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	9,36	$ 1.567.341,00	$ 14.670.311,76	9,360	$ 14.670.311,76	9,36	$ 14.670.311,76	100,00%
2.2.15	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 20 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	85,82	$ 60.801,00	$ 5.217.941,82	85,820	$ 5.217.941,82	85,82	$ 5.217.941,82	100,00%
2.2.16	AFINADO Y BRILLADO DE PISO ENDURECIDO CON QUARZO	M2	170,48	$ 49.898,00	$ 8.506.611,04	170,480	$ 8.506.611,04	170,48	$ 8.506.611,04	100,00%

5822

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2.2.17	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	1002,64	$ 12.488,00	$ 12.520.968,32		$ 0,00	1002,64	$ 12.520.968,32	100,00%
2.2.18	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3150,90	$ 11.611,00	$ 36.585.099,90		$ 0,00	3150,90	$ 36.585.099,90	100,00%
2.2.19	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	1086,22	$ 2.309,00	$ 2.508.081,98		$ 0,00	1086,22	$ 2.508.081,98	100,00%
2.2.20	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3-KM	102,17	$ 2.309,00	$ 235.910,53	102,170	$ 235.910,53	102,17	$ 235.910,53	100,00%
2.2.21	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	6157,74	$ 44.204,00	$ 272.196.738,96	2190,090	$ 96.810.738,36	6157,74	$ 272.196.738,96	100,00%
2.3	**ACABADOS Y CUBIERTA**				**$ 241.752.825,82**		**$0,00**		**$114.026.956,50**	**47,17 %**
2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN MORICHE SINTETICO	M2	300,75	$ 758.284,00	$ 228.053.913,00		$ 0,00	150,38	$114.026.956,50	50,00 %
2.3.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	102,42	$ 25.812,00	$ 2.643.665,04		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.3.3	CONSTRUCCION ESCALERAS DE CONCRETO	M3	1,30	$ 2.226.310,00	$ 2.894.203,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.3.4	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	200,62	$ 20.433,00	$ 4.099.268,46		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	M	5,04	$ 805.908,00	$ 4.061.776,32		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3	**EDIFICIO DE SERVICIOS**				**$ 312.533.660,39**		**$130.171.905,11**		**$ 237.814.761,32**	**13,24 %**
3.1	**PRELIMINARES**				**$ 374.720,80**		**$ 0,00**		**$ 374.720,80**	**100,00%**
3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	74,72	$ 5.015,00	$ 374.720,80		$ 0,00	74,72	$ 374.720,80	100,00%
3.2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA**				**$ 116.335.064,54**		**$ 9.066.929,13**		**$ 116.335.064,54**	**100,00%**

DAV INGENIERÍA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3.2.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	24,15	$ 108.094,00	$ 2.610.470,10		$ 0,00	24,15	$ 2.610.470,10	100,00%
3.2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	13,75	$ 98.183,00	$ 1.350.016,25		$ 0,00	13,75	$ 1.350.016,25	100,00%
3.2.3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	4,87	$ 923.201,00	$ 4.495.988,87		$ 0,00	4,87	$ 4.495.988,87	100,00%
3.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	3,30	$ 1.312.643,00	$ 4.331.721,90		$ 0,00	3,30	$ 4.331.721,90	100,00%
3.2.5	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y ONSTRUCCION	M3	2,88	$ 1.521.671,00	$ 4.382.412,48		$ 0,00	2,88	$ 4.382.412,48	100,00%
3.2.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,47	$ 1.213.779,00	$ 9.066.929,13	7,47	$ 9.066.929,13	7,47	$ 9.066.929,13	100,00%
3.2.7	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	3,66	$ 2.032.652,00	$ 7.439.506,32		$ 0,00	3,66	$ 7.439.506,32	100,00%
3.2.8	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,33	$ 2.081.406,00	$ 13.175.299,98		$ 0,00	6,33	$ 13.175.299,98	100,00%
3.2.9	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13,68	$ 1.993.885,00	$ 27.276.346,80		$ 0,00	13,68	$ 27.276.346,80	100,00%
3.2.10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	191,92	$ 12.488,00	$ 2.396.696,96		$ 0,00	191,92	$ 2.396.696,96	100,00%
3.2.11	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3310,95	$ 11.611,00	$ 38.443.440,45		$ 0,00	3310,95	$ 38.443.440,45	100,00%
3.2.12	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	502,32	$ 2.309,00	$ 1.159.856,88		$ 0,00	502,32	$ 1.159.856,88	100,00%

5824

DAV INGENIERÍA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,2,13	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3-KM	89,38	$ 2.309,00	$ 206.378,42		$ 0,00	89,38	$ 206.378,42	100,00%
3.3	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**				**$ 57.114.223,30**		**$ 57.114.223,30**		**$ 57.114.223,30**	**100,00%**
[redacted]1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	160,91	$ 80.137,00	$ 12.894.844,67	160,91	$ 12.894.844,67	160,91	$ 12.894.844,67	100,00%
3.3.2	COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,70	$ 1.878.753,00	$ 3.193.880,10	1,70	$ 3.193.880,10	1,70	$ 3.193.880,10	100,00%
3.3.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	212,91	$ 38.088,00	$ 8.109.316,08	212,91	$ 8.109.316,08	212,91	$ 8.109.316,08	100,00%
3.3.4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y	M2	109,54	$ 53.330,00	$ 5.841.768,20	109,54	$ 5.841.768,20	109,54	$ 5.841.768,20	100,00%
3.3.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,19	$ 2.518.325,00	$ 478.481,75	0,19	$ 478.481,75	0,19	$ 478.481,75	100,00%
[redacted]6	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1981,15	$ 11.611,00	$ 23.003.132,65	1981,15	$ 23.003.132,65	1981,15	$ 23.003.132,65	100,00%
3.3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	68,15	$ 52.719,00	$ 3.592.799,85	68,15	$ 3.592.799,85	68,15	$ 3.592.799,85	100,00%
3.4	**ACABADOS Y REMATES**				**$ 108.727.168,70**		$ 0,00		$ -	0,00%
3.4.1	PORCELANATO BEIGE	M2	151,16	$ 194.167,00	$ 29.350.283,72		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.2	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	M	44,97	$ 30.178,00	$ 1.357.104,66		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.3	ESTUCO PLASTICO	M2	134,05	$ 24.625,00	$ 3.300.981,25		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.4	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	134,05	$ 17.005,00	$ 2.279.520,25		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE 304	U	5,00	$ 6.688.740,00	$ 33.443.700,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.6	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	U	2,00	$ 1.239.736,00	$ 2.479.472,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%

5825

Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3.4.7	SANITARIO T QUANTUM O SIMILAR INCLUYE FLEXOMETRO SLOAN	U	6,00	$ 1.687.406,00	$ 10.124.436,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.8	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,27	$ 2.782.114,00	$ 759.517,12		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.9	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	7,00	$ 761.030,00	$ 5.327.210,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.10	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	U	3,00	$ 29.604,00	$ 88.812,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	3,18	$ 415.691,00	$ 1.321.897,38		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.12	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	7,79	$ 223.193,00	$ 1.738.673,47		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.13	MESON CON LAVAPLATOS EN ACERO IOXIDABLE 210X52 Y ESTUFA A GAS	U	1,00	$ 2.772.790,00	$ 2.772.790,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.14	GRIFERIA LAVAPLATOS PISCIS 8" GRIVAL O SIMILAR	U	1,00	$ 143.715,00	$ 143.715,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.15	LLAVE MANGUERA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 49.958,00	$ 49.958,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
[illegible]4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA ENTAMBORADA TIPO PRESTIGE 0.90X2 m INCLUYE MARCO Y CHAPA	U	1,00	$ 867.292,00	$ 867.292,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA ACERO INOXIDABLE; 2 X 0.90 M	U	5,00	$ 873.527,00	$ 4.367.635,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.18	LAVATRAPEROS 40X35 CM PLASTICO	U	1,00	$ 530.451,00	$ 530.451,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.19	MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN MDP L=1,20 m	U	1,00	$ 861.173,00	$ 861.173,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC	U	1,00	$ 426.928,00	$ 426.928,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	4,72	$ 444.640,00	$ 2.098.700,80		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.22	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	4,72	$ 317.268,00	$ 1.497.504,96		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%

5826

	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3.4.23	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	98,73	$ 20.433,00	$ 2.017.350,09		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.4.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE SEGURIDAD EN BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	U	1,00	$ 1.522.063,00	$ 1.522.063,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.5	CUBIERTA				$ 29.982.383,05		$ 27.353.273,89		$ 27.353.273,89	91,23 %
3.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	33,04	$ 80.137,00	$ 2.647.726,48	33,04	$ 2.647.726,48	33,04	$ 2.647.726,48	100,00%
3.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y	M2	75,52	$ 53.330,00	$ 4.027.481,60	75,52	$ 4.027.481,60	75,52	$ 4.027.481,60	100,00%
3.5.3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	86,42	$ 71.556,00	$ 6.183.869,52	86,42	$ 6.183.869,52	86,42	$ 6.183.869,52	100,00%
3.5.4	MEDIACAÑA PISO MORTERO 1:4 H=100 MM	ML	47,99	$ 54.724,00	$ 2.626.204,76	47,99	$ 2.626.204,76	47,99	$ 2.626.204,76	100,00%
3.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	91,22	$ 100.437,00	$ 9.161.863,14	91,22	$ 9.161.863,14	91,22	$ 9.161.863,14	100,00%
3.5.6	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,49	$ 1.405.223,00	$ 688.559,27	0,49	$ 688.559,27	0,49	$ 688.559,27	100,00%
3.5.7	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75,52	$ 20.433,00	$ 1.543.100,16		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.5.8	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,72	$ 2.596.596,00	$ 1.869.549,12	0,72	$ 1.869.549,12	0,72	$ 1.869.549,12	100,00%
3.5.9	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	U	5,00	$ 29.604,00	$ 148.020,00	5,00	$ 148.020,00	5,00	$ 148.020,00	100,00%
3.5.10	PUERTA ESCOTILLA LAMINA DE ALFAJOR Y ANGULO (INC. MARCO, CONTRAMARCO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	U	1,00	$ 601.246,00	$ 601.246,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
3.5.11	ESCALERA TIPO GATO EN ACERO GALVANIZADO	U	1,00	$ 484.763,00	$ 484.763,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4	GIMNASIO BIOSALUDABLE				$ 98.655.065,10		$ 0,00		$ 33.376.699,89	1,86%
4.1	OBRA CIVIL				$ 57.223.196,10		$ 0,00		$ 33.376.699,89	58,33 %

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	210,57	$ 5.015,00	$ 1.056.008,55		$ 0,00	210,57	$ 1.056.008,55	100,00%
4.1.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	21,06	$ 1.213.779,00	$ 25.562.185,74		$ 0,00	21,06	$ 25.562.185,74	100,00%
4.1.3	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	541,20	$ 12.488,00	$ 6.758.505,60		$ 0,00	541,20	$ 6.758.505,60	100,00%
4.1.4	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	210,57	$ 102.373,00	$ 21.556.682,61		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4.1.5	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA ESMALTE	ML	62,80	$ 36.462,00	$ 2.289.813,60		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4.2	**EQUIPAMIENTO**				**$ 41.431.869,00**		$ 0,00		$ -	
4.2.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 5.812.855,00	$ 5.812.855,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4.2.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO TWISTER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 6.810.969,00	$ 6.810.969,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4.2.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO VOLANTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 6.304.155,00	$ 6.304.155,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4.2.4	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 7.845.285,00	$ 7.845.285,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4.2.5	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 6.810.969,00	$ 6.810.969,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4.2.6	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 5.458.601,00	$ 5.458.601,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
4.2.7	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	U	3,00	$ 796.345,00	$ 2.389.035,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%

5828

Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5	PISTA DE TROTE				$ 37.403.224,65		$ 409.976,25		$ 409.976,25	0,02%
5.1	OBRA CIVIL				$ 37.403.224,65		$ 409.976,25	0,00	$ 409.976,25	1,10%
5.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	M2	163,50	$ 5.015,00	$ 819.952,50	81,75	$ 409.976,25	81,75	$ 409.976,25	50,00 %
5.1.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16,35	$ 1.213.779,00	$ 19.845.286,65		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
5.1.3	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	163,50	$ 102.373,00	$ 16.737.985,50		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
6	URBANISMO				$ 257.745.378,04		$ 218.420.709,63		$ 218.420.709,63	12,16 %
6.1	BORDILLO PERIMETRAL				$ 21.809.251,85		$ 21.809.251,85		$ 21.809.251,85	100,00%
6.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	10,05	$ 98.183,00	$ 986.739,15	10,05	$ 986.739,15	10,05	$ 986.739,15	100,00%
6.1.2	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	10,05	$ 993.414,00	$ 9.983.810,70	10,05	$ 9.983.810,70	10,05	$ 9.983.810,70	100,00%
6.1.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	74,48	$ 145.525,00	$ 10.838.702,00	74,48	$ 10.838.702,00	74,48	$ 10.838.702,00	100,00%
6.2	ZONAS DURAS				$ 208.272.627,16		$ 196.611.457,78		$ 196.611.457,78	94,40 %
6.2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	64,34	$ 44.571,00	$ 2.867.698,14	20,50	$ 913.705,50	20,50	$ 913.705,50	31,86 %
6.2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3-KM	418,22	$ 2.309,00	$ 965.669,98		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
6.2.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	133,01	$ 108.094,00	$ 14.377.582,94	133,01	$ 14.377.582,94	133,01	$ 14.377.582,94	100,00%
6.2.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO	M3	42,12	$ 1.213.779,00	$ 51.124.371,48	42,12	$ 51.124.371,48	42,12	$ 51.124.371,48	100,00%

Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN									
6.2.5	PLACA DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO 20.7 Mpa (3000 PSI) PREMEZCLADO E INSTALADO	M3	74,29	$ 1.467.339,00	$ 109.008.614,31	74,29	$ 109.008.614,31	74,29	$ 109.008.614,31	100,00%
6.2.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	798,64	$ 12.488,00	$ 9.973.416,32	798,64	$ 9.973.416,32	798,64	$ 9.973.416,32	100,00%
6.2.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2468,01	$ 2.309,00	$ 5.698.635,09	2468,01	$ 5.698.635,09	2468,01	$ 5.698.635,09	100,00%
6.2.8	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	U	2,00	$ 1.614.208,00	$ 3.228.416,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
6.2.9	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	M2	24,05	$ 204.138,00	$ 4.909.518,90	12,03	$ 2.455.780,14	12,03	$ 2.455.780,14	50,02%
6.2.10	BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	18,00	$ 339.928,00	$ 6.118.704,00	9,00	$ 3.059.352,00	9,00	$ 3.059.352,00	50,00%
6.3	**ZONAS BLANDAS**				**$ 27.663.499,03**		$ 0,00		$ -	0,00%
6.3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5,93	$ 98.183,00	$ 582.225,19		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
6.3.2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	148,35	$ 145.525,00	$ 21.588.633,75		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
6.3.3	SUMINISTRO E INTALACION CAMA DE TIERRA NEGRA E=12 cm	M3	23,21	$ 32.729,00	$ 759.640,09		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
6.3.4	SIEMBRA DE ESPECIMEN CODIAEUM VARIEGATUM DE INTERIOR (CROTO COLORAMA)	M3	100,00	$ 47.330,00	$ 4.733.000,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
7	**SEÑALETICA**				**$ 6.498.659,00**		$ 0,00		$ 0,00	0,00%
7,0	**SEÑALITICA**				**$ 6.498.659,00**		$ 0,00		$ -	0,00%
7,1,1	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI)RECTANGULO DE 50X60CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	3	$ 439.137,00	$ 1.317.411,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%

DAV INGENIERÍA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
7,1,2	SEÑAL INFORMATIVA (SI) DE SEGURIDAD RECTANGULO DE 30X15CM EN ACRILICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	37	$ 53.186,00	$ 1.967.882,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
[redacted]3	SEÑAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 80X120CM EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1	$ 3.213.366,00	$ 3.213.366,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
									$ -	
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS				$ 55.151.646,77		$ 22.946.192,88		$ 25.226.904,60	1,40%
8.1	RED DE SUMINISTRO				$ 14.528.851,92		$ 7.805.251,57		$ 9.636.117,79	66,32 %
8.1.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	78,56	$ 16.419,00	$ 1.289.876,64		$ 0,00	78,56	$ 1.289.876,64	100,00%
8.1.2	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	24,74	$ 21.867,00	$ 540.989,58		$ 0,00	24,74	$ 540.989,58	100,00%
8.1.3	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	28,70	$ 24.128,00	$ 692.473,60	28,70	$ 692.449,47	28,70	$ 692.449,47	100,00%
8.1.4	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDI O1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	16,00	$ 74.589,00	$ 1.193.424,00	16,00	$ 1.193.424,00	16,00	$ 1.193.424,00	100,00%
8.1.5	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 106.903,00	$ 213.806,00	2,00	$ 213.806,00	2,00	$ 213.806,00	100,00%
8.1.6	CODO 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 4.078,00	$ 40.780,00	10,00	$ 40.780,00	10,00	$ 40.780,00	100,00%
8.1.7	TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 4.998,00	$ 49.980,00	10,00	$ 49.980,00	10,00	$ 49.980,00	100,00%
8.1.8	TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	9,00	$ 8.114,00	$ 73.026,00	9,00	$ 73.026,00	9,00	$ 73.026,00	100,00%
8.1.9	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	3,00	$ 179.392,00	$ 538.176,00	3,00	$ 538.176,00	3,00	$ 538.176,00	100,00%
8.1.10	VALVULA DE CORTE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 56.422,00	$ 56.422,00	1,00	$ 56.422,00	1,00	$ 56.422,00	100,00%
8.1.11	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 3X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS, REGISTRO CORTE Y CAJILLA EN POLIPROPILENO)	U	1,00	$ 413.927,00	$ 413.927,00	1,00	$ 413.927,00	1,00	$ 413.927,00	100,00%

DAV INGENIERÍA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8.1.12	SUMINISTRO E INSTAL. MICROMEDIDOR DE VELOCIDAD TRANSM. MECÁNICA, CUERPO METÁLICO - CHORRO ÚNICO CLASE C 1/2" R160 (INC. CERTIFICADO CALIBRACIÓN Y ACOPLES)	U	1,00	$ 655.033,00	$ 655.033,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.1.13	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	22,90	$ 109.092,00	$ 2.498.206,80	22,90	$ 2.498.206,80	22,90	$ 2.498.206,80	100,00%
8.1.14	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	22,90	$ 88.867,00	$ 2.035.054,30	22,90	$ 2.035.054,30	22,90	$ 2.035.054,30	100,00%
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA PRESURIZADORA DE 600 WATTS AUTOMÁTICA. ENTRADA Y SALIDA 1". IP44 110V	U	1,00	$ 994.839,00	$ 994.839,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.1.16	LLAVE MANGUERA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 49.958,00	$ 99.916,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.1.17	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO	U	1,00	$ 3.142.922,00	$ 3.142.922,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.2	**RED SANITARIA**				**$ 11.538.333,61**		$ 11.088.488,11		$ 11.538.333,61	100,00%
8.2.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	11,05	$ 40.710,00	$ 449.845,50		$ 0,00	11,05	$ 449.845,50	100,00%
8.2.2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	2,90	$ 60.005,00	$ 174.014,50	2,90	$ 174.014,50	2,90	$ 174.014,50	100,00%
8.2.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	20,69	$ 96.482,00	$ 1.996.212,58	20,69	$ 1.996.212,58	20,69	$ 1.996.212,58	100,00%
8.2.4	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	6,05	$ 155.882,00	$ 943.086,10	6,05	$ 943.086,10	6,05	$ 943.086,10	100,00%
8.2.5	YEE PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	7,00	$ 18.659,00	$ 130.613,00	7,00	$ 130.613,00	7,00	$ 130.613,00	100,00%
8.2.6	CODO 45° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 12.460,00	$ 124.600,00	10,00	$ 124.600,00	10,00	$ 124.600,00	100,00%

DAV INGENIERÍA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8.2.7	YEE PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	3,00	$ 35.946,00	$ 107.838,00	3,00	$ 107.838,00	3,00	$ 107.838,00	100,00%
8.2.8	CODO 90° PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 22.611,00	$ 22.611,00	1,00	$ 22.611,00	1,00	$ 22.611,00	100,00%
8.2.9	TEE PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 24.161,00	$ 241.610,00	10,00	$ 241.610,00	10,00	$ 241.610,00	100,00%
8.2.10	YEE PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 60.611,00	$ 606.110,00	10,00	$ 606.110,00	10,00	$ 606.110,00	100,00%
8.2.11	CODO 45° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	6,00	$ 39.712,00	$ 238.272,00	6,00	$ 238.272,00	6,00	$ 238.272,00	100,00%
8.2.12	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	U	8,00	$ 107.694,00	$ 861.552,00	8,00	$ 861.552,00	8,00	$ 861.552,00	100,00%
8.2.13	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	U	2,00	$ 122.725,00	$ 245.450,00	2,00	$ 245.450,00	2,00	$ 245.450,00	100,00%
8.2.14	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	6,00	$ 116.659,00	$ 699.954,00	6,00	$ 699.954,00	6,00	$ 699.954,00	100,00%
8.2.15	TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	5,92	$ 32.448,00	$ 192.092,16	5,92	$ 192.092,16	5,92	$ 192.092,16	100,00%
8.2.16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	U	1,00	$ 832.306,00	$ 832.306,00	1,00	$ 832.306,00	1,00	$ 832.306,00	100,00%
8.2.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	U	1,00	$ 1.080.592,00	$ 1.080.592,00	1,00	$ 1.080.592,00	1,00	$ 1.080.592,00	100,00%
8.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	U	1,00	$ 387.516,00	$ 387.516,00	1,00	$ 387.516,00	1,00	$ 387.516,00	100,00%
8.2.19	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	7,78	$ 109.092,00	$ 848.735,76	7,78	$ 848.735,76	7,78	$ 848.735,76	100,00%
8.2.20	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	7,78	$ 88.867,00	$ 691.385,26	7,78	$ 691.385,26	7,78	$ 691.385,26	100,00%

DAV INGENIERÍA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO									
8.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	M	5,81	$ 114.275,00	$ 663.937,75	5,81	$ 663.937,75	5,81	$ 663.937,75	100,00%
8.3	**RED LLUVIAS**				**$ 29.084.461,24**		**$ 4.052.453,20**		**$ 4.052.453,20**	**13,93 %**
8.3.1	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100 MM (4")	M	18,80	$ 69.825,00	$ 1.312.710,00	18,80	$ 1.312.710,00	18,80	$ 1.312.710,00	100,00%
8.3.2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	16,14	$ 60.005,00	$ 968.480,70	16,14	$ 968.480,70	16,14	$ 968.480,70	100,00%
8.3.3	YEE PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 35.946,00	$ 287.568,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.3.4	CODO 45° PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 23.691,00	$ 189.528,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.3.5	TEE PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 24.161,00	$ 193.288,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	M	15,50	$ 114.275,00	$ 1.771.262,50	15,50	$ 1.771.262,50	15,50	$ 1.771.262,50	100,00%
8.3.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	U	12,00	$ 1.080.592,00	$ 12.967.104,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.3.8	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	57,56	$ 109.092,00	$ 6.279.335,52		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
8.3.9	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	57,56	$ 88.867,00	$ 5.115.184,52		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
9	INSTALACIONES ELECTRICAS Y FOTOVOLTAICO				$ 233.973.451,00		$ 56.683.426,00		$ 56.683.426,00	24,23%
9.1	RED ELECTRICA				$ 233.973.451,00		$ 56.683.426,00		$ 56.683.426,00	24,23 %
[illegible].1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJNATES RED ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES EN TUBO IMC 2"	U	1,00	$ 955.802,00	$ 955.802,00	1,00	$ 955.802,00	1,00	$ 955.802,00	100,00%
9.1.2	POSTE 9 METROS METÁLICO TRONCOCONICO PARA SOPORTAR PANEL SOLAR BRAZO SENCILLO	U	8,00	$ 5.054.271,00	$ 40.434.168,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.3	SUMINSITRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 100W HIGH BAY	U	10,00	$ 1.323.773,00	$ 13.237.730,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.4	LUMINARIA LED PARA SENDEROS Y ESPACIOS DE RECREACION, CUMPLIMEINTO RETILAP Y RETIE	U	8,00	$ 4.233.520,00	$ 33.868.160,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO CS274	U	10,00	$ 2.124.405,00	$ 21.244.050,00	10,00	$ 21.244.050,00	10,00	$ 21.244.050,00	100,00%
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 30X30 CONCRETO	U	2,00	$ 860.983,00	$ 1.721.966,00	2,00	$ 1.721.966,00	2,00	$ 1.721.966,00	100,00%
[illegible].7	CANALIZACION ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE	ML	125,00	$ 50.654,00	$ 6.331.750,00	125,00	$ 6.331.750,00	125,00	$ 6.331.750,00	100,00%
9.1.8	CANALIZACION ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 1" ZONA VERDE	ML	6,00	$ 28.092,00	$ 168.552,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.9	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN LAMINA CR 0.8X0,6X0.3M BREAKER INDUSTRIAL UNO GENERAL DE 3X100A, TRES DE 3X50A CON BARRAJE TRIPOLAR 600V-300AY ACCESORIOS DE INSTALACIÓ	U	1,00	$ 2.380.325,00	$ 2.380.325,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.10	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO INCLUYE 3 VARILLAS CU 2.40MTS 15 MTS CABLE DESNUDO #4, SOLDADURA CADWELT 115° Y CAJA DE INSPECCION.	GLB	1,00	$ 3.250.597,00	$ 3.250.597,00	1,00	$ 3.250.597,00	1,00	$ 3.250.597,00	100,00%

5835

DAV INGENIERÍA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA

INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CABLE 2X8F +1X8L+ 1X10 CU TIERRA (TABLERO DE CONTROL ILUMINACION Y TOMAS PLAZA CENTRAL)	ML	130,00	$ 100.754,00	$ 13.098.020,00	130,00	$ 13.098.020,00	130,00	$ 13.098.020,00	100,00%
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CABLE 3X4F +1X4L+ 1X4 CU TIERRA (TABLERO DE CONTROL ILUMINACION Y TOMAS OFICINA ADMINISTRATIVA	ML	15,00	$ 177.361,00	$ 2.660.415,00	15,00	$ 2.660.415,00	15,00	$ 2.660.415,00	100,00%
9.1.13	TABLERO DE CONTROL SIN ESPACIO TOTALIZADOR, CON PROTECCIONES 1X20 DE ACUERDO A DIAGRAMA UNUFILAR	U	1,00	$ 1.995.282,00	$ 1.995.282,00	1,00	$ 1.995.282,00	1,00	$ 1.995.282,00	100,00%
9.1.14	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS BIFASICO. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	1,00	$ 1.151.569,00	$ 1.151.569,00	1,00	$ 1.151.569,00	1,00	$ 1.151.569,00	100,00%
9.1.15	SALIDA PARA PUNTO ELECTRICO EMBEBIDO EN MURO TOMA 110V EN CAJA Y ACCESORISO PARA SU INSTALACIÓN	U	23,00	$ 185.825,00	$ 4.273.975,00	23,00	$ 4.273.975,00	23,00	$ 4.273.975,00	100,00%
9.1.16	SALIDA PARA PUNTO ELECTRICO CON TOMA DE SERVICIO A 220V, CAJA EMBEBIDO EN MURO, RESANES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	U	4,00	$ 296.664,00	$ 1.186.656,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.17	SALIDA PARA PUNTO ELECTRICO 110V EN TOMA GFCI EMBEBIDO EN MURO, CAJAS Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO	U	4,00	$ 291.898,00	$ 1.167.592,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.18	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	23,00	$ 172.693,00	$ 3.971.939,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA REFLECTOR LED TECHO A LA VISTA. INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE NO 12 X 3ML FNT, CAJA 5800, TUBERIA DE 3/4 EMT, ADAPTADORES 3/4 EMT Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO, CERCHA O COLUMNA. (NO INCLUYE LUMINARIA)	U	10,00	$ 275.949,00	$ 2.759.490,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%

5836

Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

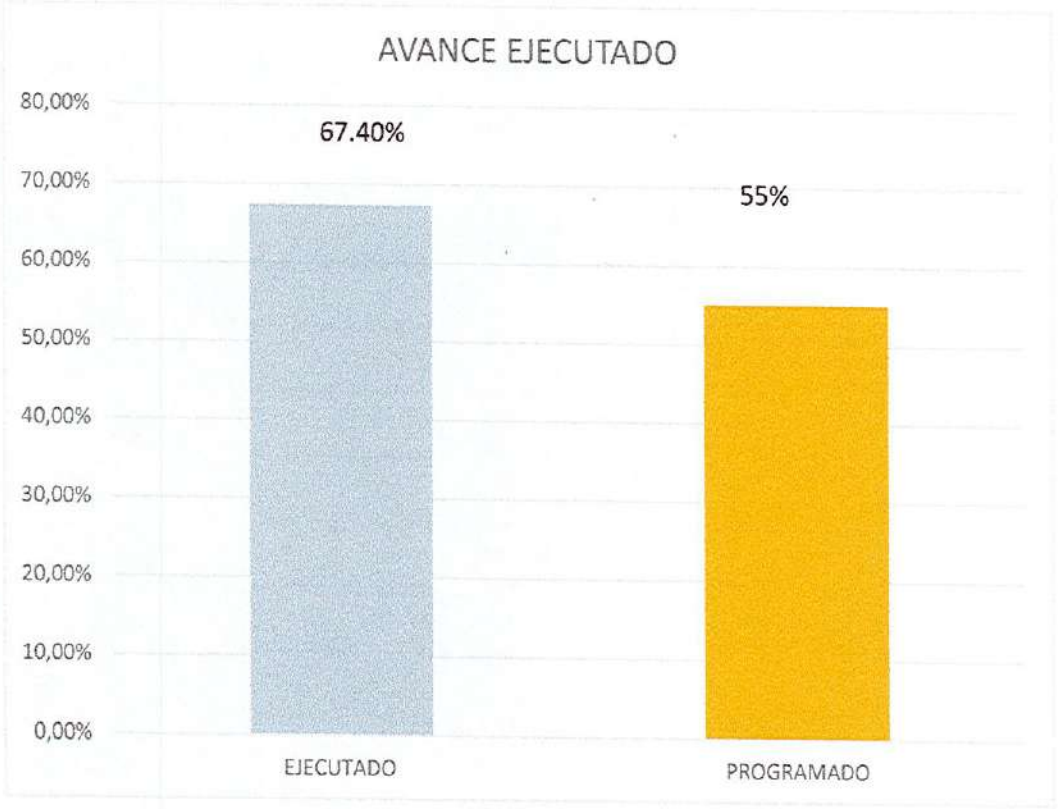
CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
9.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA SENSRO DE MOVIMIENTO TECHO A LA VISTA. INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE NO 12 X 3ML FNT, CAJA 5800, TUBERIA DE 3/4 EMT, ADAPTADORES 3/4 EMT Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO, CERCHA O COLUMNA. (NO INCLUYE LUMINARIA)	U	4,00	$ 285.958,00	$ 1.143.832,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.21	SUMINSITRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 18 W 9" CAJAS Y ACCCESORISO PARA CUMPLIR NORMA RETIE	U	22,00	$ 85.320,00	$ 1.877.040,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.22	SUMINSITRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 1,6W	U	10,00	$ 311.396,00	$ 3.113.960,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL SOLAR 300 WATTS 18.70 VMP POLICRISTALINO. Y/O SIMILAR	U	14,00	$ 1.753.486,00	$ 24.548.804,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.24	INVERSOR POTENCIA 15.000 W 48 V	U	1,00	$ 21.172.965,00	$ 21.172.965,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
9.1.25	ESTRUCTURA PARA PORTA PANEL RIEL 2.5 ALUMINIO ANODIZADO	U	1,00	$ 9.212.720,00	$ 9.212.720,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
[redacted]26	BATERIA DE LITIO 314 AH 51.2V	U	1,00	$ 17.046.092,00	$ 17.046.092,00		$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
	SUB TOTAL COSTOS INCLUIDO AIU				**$ 1.781.625.666,31**		$585.259.870,16		**$1.187.233.810,94**	**62,55 %**
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.329.571.393,00**		$436.761.097,14		**$885.995.381,30**	
	ADMINISTRACION			**$ 0,28**	$ 372.279.990,00		$122.293.107,20		**$248.078.706,77**	
	IMPREVISTOS			**$ 0,01**	$ 13.295.714,00		$ 4.367.610,97		**$ 8.859.953,81**	
	UTILIDAD			**$ 0,05**	$ 66.478.570,00		$21.838.054,85		**$44.299.769,06**	
	TOTAL AJUSTADO AL PESO				**$ 1.781.625.667,00**		$585.259.870,16		**$1.187.233.810,94**	**62,55 %**
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL	u	1,00	$ 7.040.000,00	$ 7.040.000,00		$ 0,00		$ 0,00	

5837

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	u	1,00	$ 2.304.333,00	$ 2.304.333,00		$ 0,00		$ 0,00	
	CERTIFICACIONES	U	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00	
					$ 14.344.333,00		$ 0,00		$ 0,00	
	TOTAL PROYECTO FASE 2				$ 1.795.970.000,00		$585.259.870,16		$1.187.233.810,94	
	TOTAL PROYECTO FASE 1				$ 102.000.000,00		$ 0,00		$92.000.000,00	
	TOTAL PROYECTO FASE 1 + FASE 2				$ 1.897.970.000,00		$585.259.870,16		$1.279.233.810,94	67,40 %

9. PROGRAMADO VS EJECUTADO



De acuerdo con la programación contractual vigente, ajustada mediante la reprogramación de obra asociada a la Prórroga No. 3, a la fecha el proyecto presenta un avance físico acumulado programado del 55,00 %, frente a un avance físico ejecutado del 67,40 %, evidenciándose un cumplimiento superior al previsto en la programación vigente, con una diferencia favorable de 12,40 puntos porcentuales.

Durante el periodo objeto de seguimiento, la ejecución de las actividades ha permitido mantener un comportamiento favorable frente a las metas establecidas en el cronograma contractual reprogramado, alcanzando a la fecha un avance acumulado superior al programado. Este resultado evidencia la continuidad de los recursos técnicos, humanos y operativos dispuestos para el desarrollo del proyecto, así como el avance progresivo de las actividades contempladas para la Fase II – Construcción.

En consecuencia, con corte a la fecha de seguimiento, el proyecto presenta un avance ejecutado del 67,40 % frente al 55,00 % programado, manteniendo un comportamiento superior al establecido en la programación contractual vigente derivada de la Prórroga No. 3.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante el periodo correspondiente al presente informe se dio continuidad a la ejecución de las actividades contempladas en la Etapa 2 – Ejecución de Obra del proyecto "Estudios, Diseños y Construcción del Centro de Convivencia Ciudadana 'Paz a lo Bien' Tipo I del municipio de San Martín de los Llanos, departamento del Meta", desarrollándose simultáneamente trabajos en el Área Polivalente Multipropósito, Edificio de Servicios, pista de trote, urbanismo y redes hidrosanitarias y eléctricas.

Las actividades ejecutadas durante el periodo se desarrollaron de acuerdo con los diseños, especificaciones técnicas, cantidades contractuales y condiciones particulares encontradas en obra. A continuación, se describen los principales trabajos objeto de cobro dentro del presente parcial:

Área Polivalente Multipropósito – Cimentación y estructura

En el Área Polivalente Multipropósito se continuó con la conformación de los elementos estructurales y arquitectónicos requeridos para la consolidación de la edificación. Se ejecutaron 122,47 m² de mampostería en bloque Flexa No. 4, incluyendo su correspondiente mortero de pega, garantizando alineación, nivelación y adecuada trabazón de las unidades de mampostería.

Sobre los elementos construidos se adelantó la ejecución de 200,62 m² de pañete exterior impermeabilizado en mortero 1:4, actividad desarrollada como preparación y protección de las superficies expuestas a condiciones ambientales.

De manera complementaria, se ejecutaron elementos estructurales en concreto, correspondientes a 0,63 m³ de columnas en concreto de 20,7 MPa y 1,14 m³ de vigas aéreas en concreto de 27,6 MPa, de acuerdo con la geometría, niveles y especificaciones establecidas en los diseños estructurales.

Dentro de la conformación de pisos se ejecutaron 36,15 m³ de placa de contrapiso en concreto de 20,7 MPa, incluyendo las labores previas de adecuación, nivelación, vaciado, extendido y acabado del concreto. Igualmente, se ejecutaron 9,36 m³ de placa maciza de entrepiso en concreto de 20,7 MPa.

Como parte de las actividades de acabado y control de juntas se realizó el sellado de 85,82 metros lineales de juntas de dilatación, mediante sistema de poliuretano y cordón de polietileno como fondo de junta. Adicionalmente, se adelantó el afinado y brillado de 170,48 m² de piso endurecido con cuarzo, obteniendo una superficie terminada con mejores condiciones de resistencia al desgaste y acabado superficial.

En relación con la estructura metálica del área polivalente, durante el periodo se adelantaron actividades de fabricación, suministro, montaje y aplicación de protección mediante pintura sobre 2.190,09 kg de estructura en acero ASTM A500, correspondiente a elementos que conforman el sistema resistente y de soporte de la cubierta.

Como actividad complementaria derivada de los procesos constructivos anteriormente descritos, se realizó el cargue, transporte y disposición final de 102,17 m³-km de escombros y materiales sobrantes, manteniendo las zonas de intervención libres de residuos producto de la ejecución.

Edificio de Servicios – Cimentación, estructura, mampostería y acabados

En el Edificio de Servicios se avanzó en la conformación de pisos mediante la construcción de 7,47 m³ de placa de contrapiso en concreto premezclado de 20,7 MPa, ejecutando previamente las labores de preparación y verificación de niveles requeridos.

Posteriormente se desarrollaron trabajos de mampostería y elementos de confinamiento, ejecutándose 160,91 m² de muro en bloque Flexa No. 4, así como 1,70 m³ de columnas en concreto de 20,7 MPa.

Para el acabado de los cerramientos se ejecutaron 212,91 m² de pañete interior en mortero 1:4, incluyendo filos y dilataciones, y 109,54 m² de pañete exterior impermeabilizado, dejando las superficies preparadas para las posteriores actividades de acabado arquitectónico.

Como parte de los elementos complementarios de mampostería se ejecutaron 0,19 m³ de dinteles en concreto de 17,2 MPa. De igual manera, se adelantó el suministro, figurado, armado, colocación y amarre de 1.981,15 kg de acero de refuerzo con Fy = 420 MPa, correspondiente a los diferentes elementos estructurales intervenidos durante el periodo.

En las áreas interiores del edificio se ejecutaron igualmente 68,15 m² de afinado de piso en mortero 1:4 con espesor de 50 mm, como preparación de superficie para la posterior instalación de los acabados definitivos.

Cubierta del Edificio de Servicios

En la cubierta del edificio se continuaron las actividades de conformación de los elementos de cerramiento y preparación del sistema de impermeabilización. Se ejecutaron 33,04 m² de muro en bloque Flexa No. 4, acompañados de 75,52 m² de pañete exterior impermeabilizado.

Sobre la placa de cubierta se ejecutaron 86,42 m² de afinado de piso en mortero 1:4 con espesor de 70 mm, configurando las pendientes necesarias para el adecuado manejo de las aguas lluvias. Complementariamente, se construyeron 47,99 metros lineales de mediacaña en mortero 1:4, especialmente en los encuentros entre elementos horizontales y verticales, con el fin de mejorar la continuidad del sistema impermeable.

Una vez preparada la superficie, se ejecutó la impermeabilización de 91,22 m² de cubierta mediante manto asfáltico, proporcionando protección frente a infiltraciones y garantizando la estanqueidad de la placa.

También se construyeron 0,49 m³ de poyos en concreto de 20,7 MPa y 0,72 m³ de alfajías en concreto de 20,7 MPa, correspondientes a elementos complementarios requeridos para el adecuado funcionamiento y terminación de la cubierta. Asimismo, se instalaron cinco (5) rejillas tipo SOSCO de 3" x 2" en aluminio con sistema anticucarachas, asociadas al manejo de drenajes de la edificación.

Pista de trote

En el sector correspondiente a la pista de trote se adelantaron actividades de localización y replanteo convencional sobre un área de 81,75 m², estableciendo los ejes, niveles y geometría requerida para la ejecución de las actividades posteriores.

Urbanismo – Bordillo perimetral y zonas duras

En las obras de urbanismo se avanzó en la delimitación y conformación de las áreas exteriores. Para el bordillo perimetral se ejecutaron 10,05 m³ de excavación manual en material común, seguida de la construcción de 10,05 m³ de concreto ciclópeo de 20,7 MPa, utilizado como elemento de apoyo y cimentación.

Sobre la estructura preparada se instalaron 74,48 metros lineales de bordillo prefabricado de concreto tipo A-80, incluyendo la conformación y preparación de la superficie de apoyo.

En las zonas duras se ejecutaron 20,50 m³ de excavación mecánica en material común, incluyendo el cargue del material producto de la excavación, complementándose con el transporte y disposición final correspondiente.

Posteriormente se realizó la conformación de las capas de soporte mediante la colocación y compactación manual de 133,01 m³ de recebo, incluyendo las labores de extendido, nivelación, humectación y compactación requeridas para alcanzar una superficie estable.

Sobre la estructura conformada se ejecutaron 42,12 m³ de placa de contrapiso en concreto de 20,7 MPa y 74,29 m³ de placa de piso en concreto estampado de 20,7 MPa, correspondiente a las plazoletas y zonas exteriores de circulación previstas dentro del proyecto.

Como refuerzo de estas estructuras se instalaron 798,64 kg de malla electrosoldada Fy = 500 MPa. Asimismo, se efectuó el transporte de 2.468,01 m³-km de material granular utilizado para las actividades de conformación de las zonas exteriores.

Se complementaron los trabajos de urbanismo mediante la instalación de 12,025 m² de loseta prefabricada tipo A-50 de 0,40 x 0,40 x 0,06 m y la instalación de nueve (9) bancas modulares en concreto tipo M40, avanzando de esta manera en la configuración de los espacios destinados al uso comunitario.

Instalaciones hidrosanitarias – Red de suministro

Durante el periodo se avanzó en la instalación de la red hidráulica del Edificio de Servicios y zonas complementarias. Se instalaron 28,70 metros lineales de tubería PVC presión RDE 13,5 de 1", así como los diferentes puntos hidráulicos requeridos para los aparatos y servicios proyectados.

Se ejecutaron 16 puntos hidráulicos de 1/2" y 2 puntos hidráulicos de 3/4", complementados mediante la instalación de accesorios correspondientes a codos y tees en diferentes diámetros.

Dentro de los elementos de control de la red se instalaron tres (3) válvulas de corte de 1" y una (1) válvula de corte de 1/2", permitiendo la sectorización y mantenimiento posterior de las instalaciones.

Adicionalmente, se ejecutó una (1) acometida domiciliaria de acueducto, incluyendo los accesorios, registro de corte y cajilla correspondientes.

Para alojar y proteger las redes se adelantaron 22,90 m³ de excavación manual en conglomerado, posteriormente restituidos mediante 22,90 m³ de relleno con material mixto de río, colocado, extendido, nivelado, humedecido y compactado manualmente.

Instalaciones hidrosanitarias – Red sanitaria

En la red sanitaria se realizó el tendido e instalación de tuberías PVC sanitaria de diferentes diámetros, incluyendo 2,90 m de tubería de 3", 20,69 m de tubería de 4" y 6,05 m de tubería de 6".

Se instalaron igualmente accesorios sanitarios tipo Yee, codos y tees en diámetros de 2", 3" y 4", permitiendo conformar las derivaciones, cambios de dirección y empalmes requeridos por el diseño.

Como parte de las conexiones internas se ejecutaron ocho (8) salidas sanitarias para lavamanos de 2", dos (2) salidas para orinal de 2" y seis (6) salidas sanitarias de 4" para sanitarios.

Para la inspección y mantenimiento futuro del sistema se construyó una caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m y una caja de inspección de 0,80 x 0,80 x 0,80 m, elaboradas en mampostería de ladrillo tolete y dotadas de tapa en concreto reforzado y marco metálico.

Asimismo, se instaló un kit silla Yee de PVC de 200 mm x 160 mm (8" x 6"), requerido para la conexión de la red, y 5,81 metros lineales de tubería corrugada PVC para alcantarillado de 160 mm (6") tipo Novafort o equivalente.

Las actividades de instalación implicaron la ejecución de 7,78 m³ de excavación manual y su posterior restitución mediante 7,78 m³ de relleno compactado con material mixto de río.

Red de aguas lluvias

En el sistema de evacuación de aguas lluvias se instalaron 18,80 metros lineales de tubería filtro perforada de 100 mm (4"), 16,14 metros lineales de tubería PVC sanitaria de 3" y 15,50 metros lineales de tubería corrugada PVC para alcantarillado de 200 mm (8") tipo Novafort o equivalente.

Estas actividades permiten avanzar en la captación, conducción y evacuación controlada de las aguas provenientes de cubiertas y superficies exteriores, disminuyendo la posibilidad de acumulaciones superficiales y afectaciones sobre las zonas construidas.

Instalaciones eléctricas

Durante el presente periodo también se avanzó significativamente en la conformación de la infraestructura eléctrica del proyecto.

Se realizó el suministro e instalación de un bajante para las redes eléctricas y de telecomunicaciones en tubería IMC de 2", acompañado por la construcción e instalación de diez (10) cajas de paso tipo CS274 y dos (2) cajas de paso de concreto de 30 x 30 cm.

Se ejecutaron 125 metros lineales de canalización mediante zanja y relleno para ductos PVC de 2" en zona verde, permitiendo establecer los recorridos enterrados para las redes proyectadas.

Como parte del sistema de protección eléctrica se construyó un sistema de puesta a tierra para tablero, compuesto por tres varillas de cobre de 2,40 m, conductor de cobre desnudo, conexiones mediante soldadura exotérmica y caja de inspección.

Se adelantó igualmente el tendido de alimentadores eléctricos, instalándose 130 metros lineales del alimentador destinado al tablero de control de iluminación y tomas de la plaza central, así como 15 metros lineales del alimentador destinado al tablero de control de iluminación y tomas de la oficina administrativa.

Finalmente, se instalaron un tablero de control con sus respectivas protecciones, un tablero parcial bifásico de doce circuitos y se ejecutaron 23 salidas para puntos eléctricos de 110 V embebidas en muro, incluyendo cajas y accesorios necesarios para su posterior puesta en servicio.

Consideraciones generales del periodo

La ejecución simultánea de actividades estructurales, arquitectónicas, de urbanismo y de instalaciones permitió consolidar diferentes frentes de trabajo y avanzar hacia la integración de los distintos componentes que conforman el proyecto.

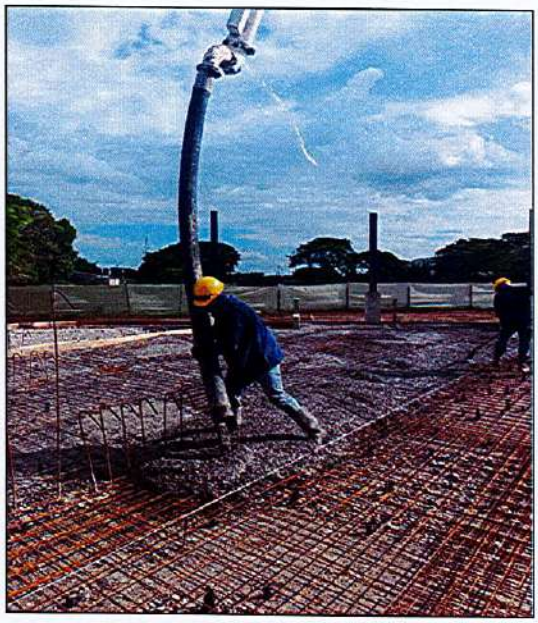
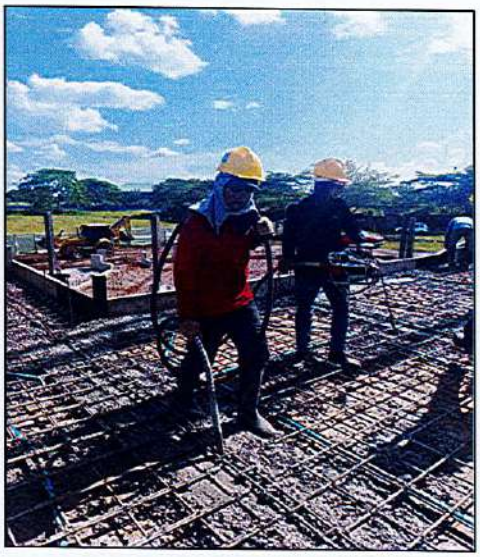
Las cantidades relacionadas corresponden a actividades físicamente ejecutadas durante el periodo y consideradas para cobro dentro del presente parcial, sujetas a la correspondiente verificación, medición y recibo por parte de la Interventoría. El desarrollo de los trabajos se efectuó procurando mantener la secuencia constructiva requerida, la compatibilidad entre especialidades y el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
2	ÁREA POLIVALENTE MULTIPROPÓSITO	
2.2.7		
	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3).	
2.2.8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO.	

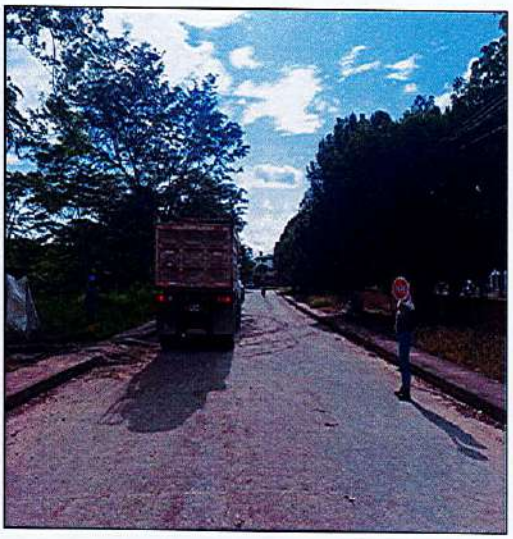
2.2.9	COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	
2.2.10	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	

2.2.13	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	
2.2.14	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

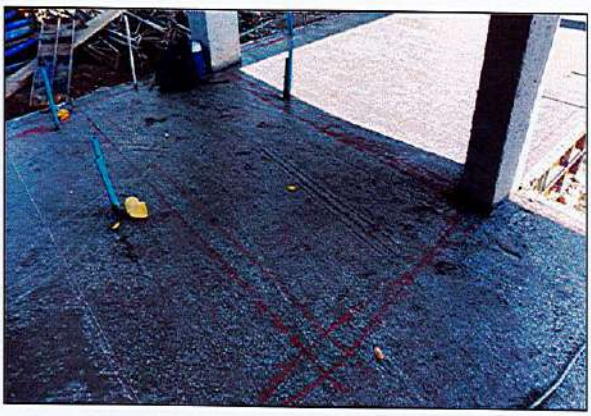
Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

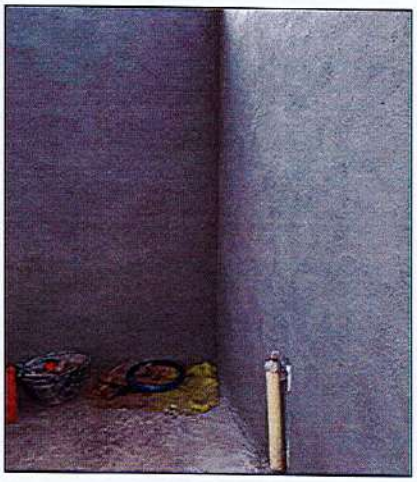
2.2.15	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 20 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
2.2.16	AFINADO Y BRILLADO DE PISO ENDURECIDO CON QUARZO	

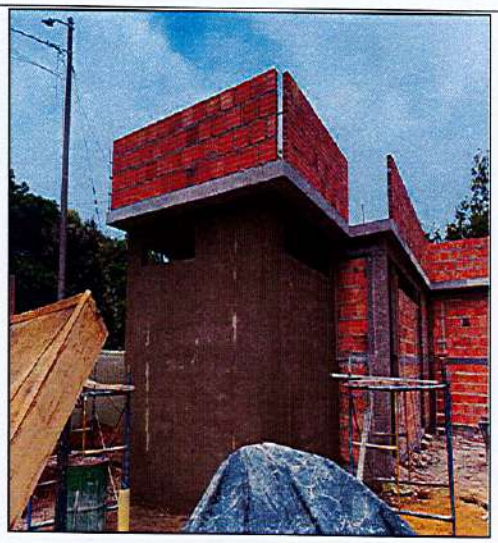
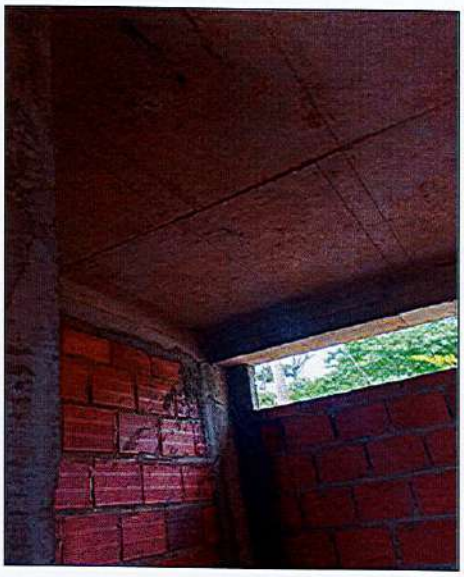
Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

2.2.20	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	
2.2.21	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	

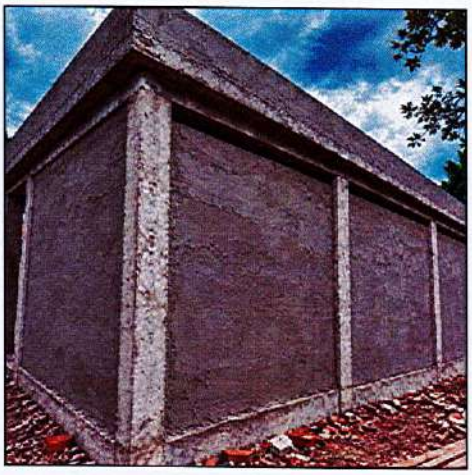
DAV Daniel Vanegas Ingenieria	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

3	EDIFICIO DE SERVICIOS	
3.1	PRELIMINARES	
3.2.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	
3.3	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES	
3.3.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	

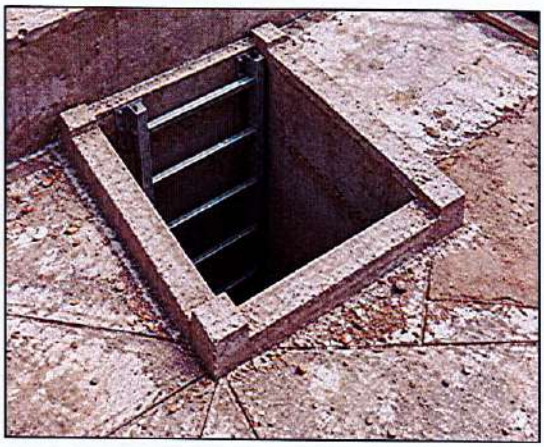
3.3.2	COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	
3.3.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	

3.3.4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y	
3.3.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	

3.3.6	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	
3.3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	
3.5	CUBIERTA	
3.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	

3.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y	
3.5.3	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	

3.5.4	MEDIACAÑA PISO MORTERO 1:4 H=100 MM	
3.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	

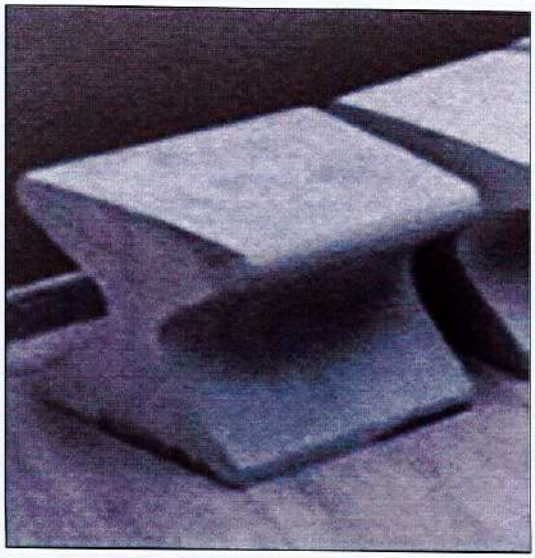
3.5.6	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	
3.5.8	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	

3.5.9	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	
5	PISTA DE TROTE	
5.1	OBRA CIVIL	
5.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA	

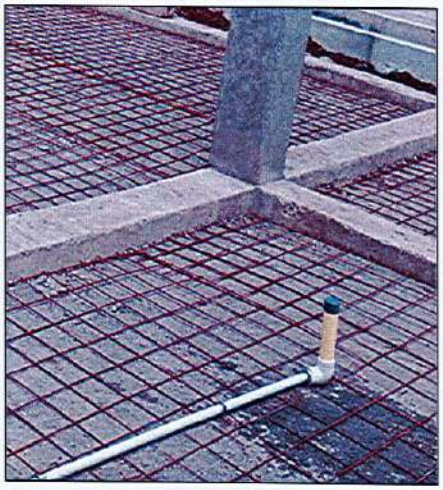
6	URBANISMO	
6.1	BORDILLO PERIMETRAL	
6.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	
6.1.2	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	

6.1.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	
6.2	ZONAS DURAS	
6.2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	

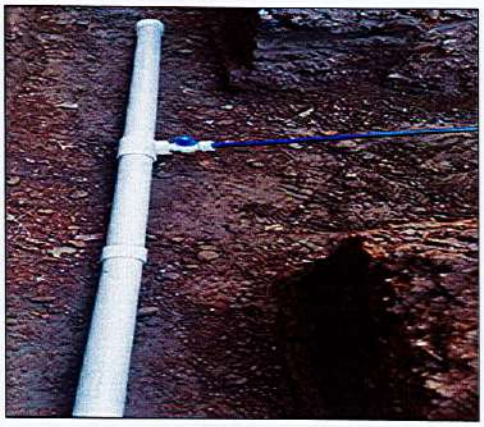
6.2.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	
6.2.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	
6.2.5	PLACA DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO 20.7 Mpa (3000 PSI) PREMEZCLADO E INSTALADO	

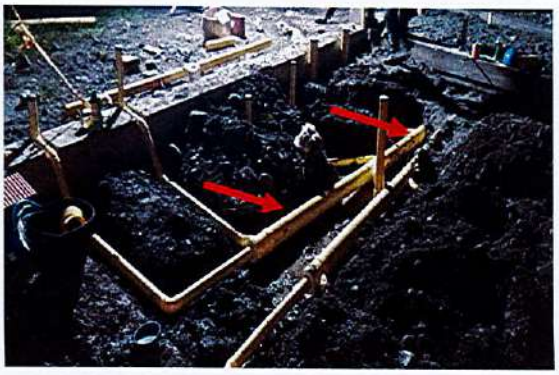
6.2.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
6.2.9	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU	
6.2.10	BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

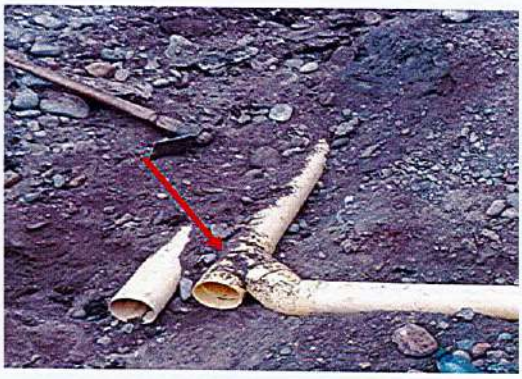
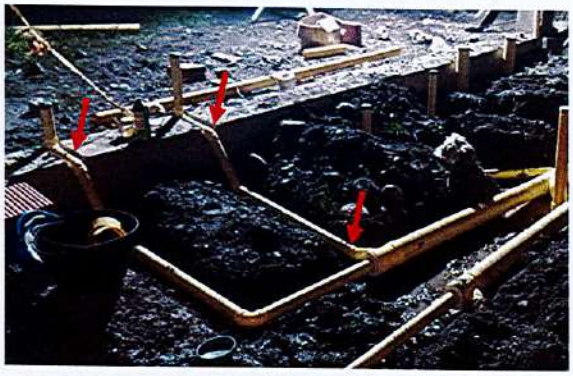
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS	
8.1	RED DE SUMINISTRO	
8.1.3	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.1.4	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDI O1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

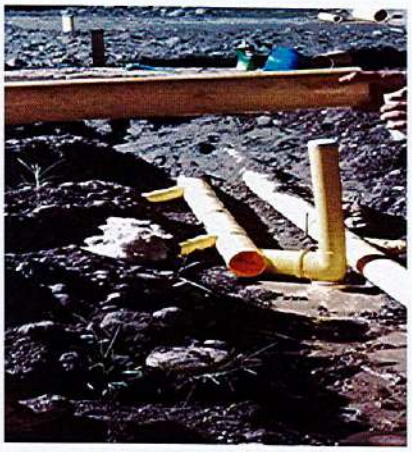
8.1.5	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.1.6	CODO 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.1.7	TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

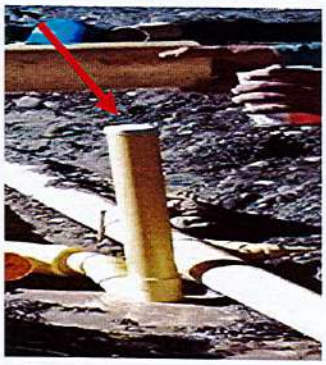
8.1.8	TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.1.9	VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.1.10	VALVULA DE CORTE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

8.1.11	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 3X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS, REGISTRO CORTE Y CAJILLA EN POLIPROPILENO)	
8.1.13	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	

8.1.14	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	
8.2.2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.2.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

8.2.4	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.2.5	YEE PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.2.6	CODO 45° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

8.2.7	YEE PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.2.8	CODO 90° PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.2.9	TEE PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

8.2.10	YEE PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.2.11	CODO 45° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.2.12	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	

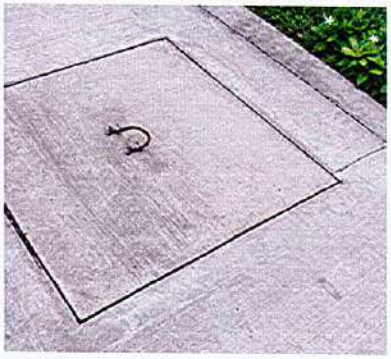
8.2.13	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	
8.2.14	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.2.15	TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

8.2.16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	
8.2.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	
8.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	

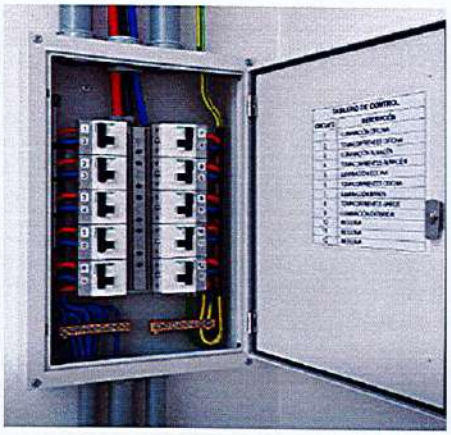
Daniel Vanegas Ingeniería	DAV INGENIERÍA
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

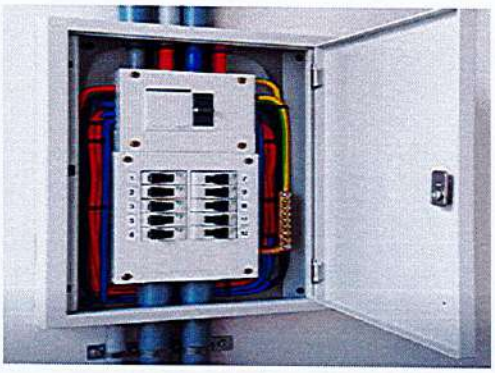
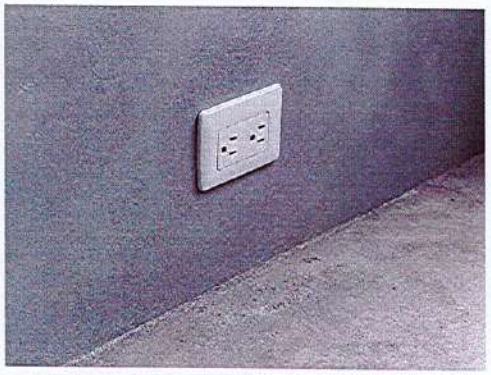
8.2.19	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	
8.2.20	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	
8.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	

8.3	RED LLUVIAS	
8.3.1	TUBERÍA FILTRO PERFORADA 100 MM (4")	
8.3.2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
8.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	

9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICO	
9.1	RED ELÉCTRICA	
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJNATES RED ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES EN TUBO IMC 2"	
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO CS274	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 30X30 CONCRETO	

9.1.7	CANALIZACION ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE	
9.1.10	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO INCLUYE 3 VARILLAS CU 2.40MTS 15 MTS CABLE DESNUDO #4, SOLDADURA CADWELT 115° Y CAJA DE INSPECCION.	
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CABLE 2X8F +1X8L+ 1X10 CU TIERRA (TABLERO DE CONTROL ILUMINACION Y TOMAS PLAZA CENTRAL)	

9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CABLE 3X4F +1X4L+ 1X4 CU TIERRA (TABLERO DE CONTROL ILUMINACION Y TOMAS OFICINA ADMINISTRATIVA	
9.1.13	TABLERO DE CONTROL SIN ESPACIO TOTALIZADOR, CON PROTECCIONES 1X20 DE ACUERDO A DIAGRAMA UNUFILAR	

9.1.14	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS BIFASICO. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
9.1.15	SALIDA PARA PUNTO ELÉCTRICO EMBEBIDO EN MURO TOMA 110V EN CAJA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	

11. CONCLUSIÓN

Durante el periodo correspondiente a la Parcial N° 3, comprendido entre el 28 de julio y el 25 de septiembre de 2026, se presentó un avance significativo en la ejecución de la Fase II – Construcción del proyecto Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo I del municipio de San Martín de los Llanos, desarrollándose actividades en varios de los principales componentes que conforman el alcance contractual.

De acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas y consignadas en la presente acta parcial, durante el periodo se reconoce un valor de obra de $ 585.259.870,16, correspondiente a la Fase II. Con esta ejecución, el valor acumulado de la etapa de construcción asciende a $ 1.187.233.810,94, equivalente al 62,55 % de la Fase II. Al incorporar los $92.000.000 ejecutados y aprobados en la Fase I – Estudios y Diseños, el proyecto alcanza un avance físico acumulado del 67,40 % correspondiente a $ 1.279.233.810.94.

La ejecución registrada en la presente parcial se concentró principalmente en actividades correspondientes al Área Polivalente Multipropósito, Edificio de Servicios, Gimnasio Biosaludable, Pista de Trote, Urbanismo, Instalaciones Hidrosanitarias e Instalaciones Eléctricas y Fotovoltaicas, evidenciándose un avance generalizado de los diferentes frentes de obra. Particularmente, se observa un importante desarrollo de las actividades estructurales, mamposterías, placas de contrapiso y entrepiso, acabados, redes y obras exteriores, permitiendo llevar varios componentes a etapas avanzadas de terminación.

De acuerdo con la programación contractual vigente, ajustada mediante la reprogramación de obra correspondiente a la Prórroga No. 3, a la fecha el proyecto presenta un avance físico acumulado programado del 55,00 %, frente a un avance físico ejecutado del 67,40 %, evidenciándose una diferencia favorable de 12,40 puntos porcentuales respecto de la programación vigente. Este comportamiento refleja un avance superior al previsto para la fecha de corte y evidencia el desarrollo progresivo de las actividades contempladas en el cronograma reprogramado.

El avance físico acumulado ejecutado del 67,40 % se encuentra representado en un 4,85 % correspondiente a la Fase I – Estudios y Diseños, ejecutada y aprobada en su totalidad, y un 62,55 % correspondiente a la Fase II – Construcción, en la cual se concentra el desarrollo de las actividades de obra. Durante el periodo objeto de seguimiento se ha mantenido la ejecución de diferentes frentes de trabajo, permitiendo dar continuidad a las actividades previstas y avanzar en la consolidación de los principales componentes del proyecto.

En este sentido, la ejecución registrada a la fecha evidencia un comportamiento favorable frente a la programación contractual vigente, teniendo en cuenta que el avance ejecutado supera en 12,40 puntos porcentuales la meta establecida en la reprogramación asociada a la Prórroga No. 3. Lo anterior refleja la continuidad de las actividades constructivas y la disposición de los recursos técnicos, humanos y operativos requeridos para el desarrollo de los diferentes frentes de obra.

DAV Daniel Vanegas Ingeniería	**DAV INGENIERÍA**
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
	INFORME PARCIAL DE OBRA N° 3

De manera complementaria, el avance alcanzado durante la Parcial N.° 3 evidencia una concentración importante de producción de obra, toda vez que se ha mantenido la ejecución simultánea de diferentes actividades y frentes de trabajo, permitiendo avanzar en la construcción de los componentes principales del proyecto. Este comportamiento contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en la programación contractual vigente y permite mantener una tendencia de ejecución superior a la prevista para la fecha de corte.

Con un avance físico acumulado del 67,40 %, permanece pendiente por ejecutar el 32,60 % del alcance físico total del proyecto. Por lo tanto, la etapa restante deberá concentrarse prioritariamente en la culminación de los componentes y actividades que aún presentan saldos por ejecutar, especialmente aquellas relacionadas con acabados finales, aparatos y elementos complementarios, instalaciones, urbanismo, señalización, terminaciones eléctricas y fotovoltaicas y demás actividades necesarias para garantizar la funcionalidad integral del Centro de Convivencia.

DANIEL ARTURO VANEGAS VELÁSQUEZ
C.C. 86.071.812 DE VILLAVICENCIO
R/L CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026

5879

BITACORA

5880

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	10	7	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	Finaliza excavacion de material comun contaminado hasta encontrar material firme. Se retiran de obra 3 viajes de 7m3	SI	SI
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Inicia acopio de material granular de la mina MH (Humadea) - Se extienden los viajes de material de acopio y se recibe en obra 5 vijaes de recebo, se realiza extension con maquinaria amarilla	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se recibe en obra euipo de compactacion sobre las 11:00am Caterpillar CS100GC, el cual inicia labores de compactación del material de recebo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5881

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	11	7	2026	7:30	12:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Continuan actividades de extension y compactacion de material granular tipo recebo e=0,20m	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	Inicia amarre de acero de refuerzo de zapatas, columnas y vigas en campamento de obra de las estructuras de edificio de servicio y polivalente.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se reciben en obra 4 viajes de 14m3 y 9 viajes de 7m3 de recebo. Se recibe en obra acero de refuerzo correspondiente a la cimentacion de los edificios de servicio y polivalente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5882

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	14	7	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Finaliza actividades de extension y compactacion de material granular tipo recebo e=0.20m en la zona de edificio de servicios.	SI	SI
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Inicia actividades de excavacion de zapatas en el edificio de servicio.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se reciben en obra 7 viajes de 14m3 y 10 viajes de 7m3 de recebo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5883

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	7	2026	7:30	5:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Continua extension de material en la zona del edificio multiproposito. Se extiende jornada del compactador hasta las 5:00pm a fin de finalizar actividades de nivelacionn.	SI	SI
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Continuan excavaciones de zapatas en el edificio de servicios.	SI	SI
SO[redacted] LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	Se realiza vaciado de concreto de limpieza en zapatas del eje D1, D2, D3, D4, D5, C1.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se reciben en obra 2 viajes de 14m3.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5384

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	16	7	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Continuan excavaciones de zapatas en el edificio de servicios y edifico multiproposito. Finaliza la excavacion manual de zapatas A4 y A5 del edificio de servicios y se excavan las zapatas C2, F1, G3, I5, J7 del edificio multiproposito. Finaliza excavacion manual de zapatas del edificio multiproposito H10, E9, D8, B6, A4	SI	SI
SOLADO LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	Se realiza vaciado de concreto de limpieza en zapatas del edificio de servicios B2, B3, B4, B5, A4, A5 y en el edificio multiproposito C2, F1, B3, I5, J7.	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	Se realiza instalacion de parrillas de las zapatas y columnas en el edificio de servicios	SI	SI
ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Vaciado de concreto 11 zapatas en el edificio de servicios.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las zapatas del edificio de servicios

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5885

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	17	7	2026	7:30	7:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	Se realiza vaciado de concreto de limpieza en zapatas del edificio multiproposito H10, E9, D8, B6, A4. Se realiza vaciado de concreto de limpieza en zona de viagas de cimentacion de los dos edificios	SI	SI
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Exacavacion para vigas de cimentacion en el edificio de servicio y multiproposito	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	Se realiza instalacion de acero de refuerzo de vigas de cimentacion en edificio de servicios	SI	SI
ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Vaciado de concreto 7 zapatas en el edificio de multiproposito	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las zapatas del edificio de multipropositos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5886

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	7	2026	7:30	15:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza vaciado de concreto de las vigas de cimentacion del edificio de servicios	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las zapatas del edificio multiproposito y las vigas del edificio de servicios.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5887

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	21	7	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se testerea y se realiza vaciado de concreto de las columnas del edifico de servicio.	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	Se realiza instalacion de acero de refuerzo de vigas del edificio multiproposito	SI	SI
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se realiza excavacion de las 14 vigas de los muros de soporte de las graderias del edificio multiproposito	SI	SI
CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	Vaciado de concreto ciclopeo en el edificio multiproposito	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las columnas del edificio de servicio.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5888

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	22	7	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	**Contratista**	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	**Contrato Interventoria N°**	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	**Objeto Interventoria**	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	**Tiempo de Ejecución**	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se testerea y se realiza vaciado de concreto de las columnas del edifico de servicio. Se testerean columnas en el edifiicio multiproposito.	SI	SI
VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza vaciado de concreto de las vigas de cimentacion del edificio multiproposito desde la 100 a la 110	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	Amarre acero de refuerzo muros soporte de graderias. Inicia amarre de acero de refuerzo de muros soporte de graderias	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las columnas del edificio de servicio y vigas de cimentacion edificio multiproposito

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5889

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	23	7	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Vaciado de concreto columnas edificio multiproposito	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las columnas del edificio multiproposito.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5890

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	24	7	2026	7:30	5:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Vaciado de concreto muros de soporte de graderias	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion concreto muros de soporte de graderias

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5891

NTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	7	2026	7:30	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
ntratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
ntrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
jeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
mpo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
A AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. MINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Vaciado de concreto vigas aereas edificio de servicio	SI	SI
A DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) CLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Vaciado de concreto placa de entrepiso cubierta edificio de servicios	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de vigas y placa de entrepiso del edificio de servicios.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

ndo se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

bre: N° Mat. Profesional:

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5892

ONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	27	7	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
ntratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
ntrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
jeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
mpo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

TADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. MINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Desencofrado de viga aerea	SI	SI
	M3			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

e realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de vigas y placa de entrepiso del edificio de servicios.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
HATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

nbre:		N° Mat. Profesional:	
nbre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5813

ONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	28	2026	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
ntratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2025	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
ntrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
jeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
mpo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
GA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. MINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza desencofrado parcial de las vigas aéreas del edificio de servicios, efectuando el retiro progresivo de la formaleta y verificando la correcta conformación de los elementos.	SI	SI
E ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) EMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se realiza desencofrado parcial de la placa de entrepiso del edificio de servicios, mediante retiro progresivo de elementos de formaleta, verificando las condiciones superficiales del concreto.		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

e continúa con el retiro progresivo de formaleta de los elementos estructurales previamente fundidos, verificando su estado general y correcta conformación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
HATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

ando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

mbre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

3814

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	29	2026	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se continúa con el desencofrado parcial de las vigas aéreas del edificio de servicios, efectuando el retiro progresivo de formaleta y la inspección visual de los elementos.	SI	SI
LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se realiza retiro parcial de formaleta de la placa de entrepiso del edificio de servicios, manteniendo los elementos de soporte requeridos de acuerdo con el proceso constructivo.		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se realizan actividades de desencofrado parcial de los elementos estructurales previamente fundidos. A partir de esta fecha se da inicio a la suspensión temporal de las actividades contractuales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5895

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	6	2026	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Con posterioridad al reinicio de las actividades contractuales, se retoma el desencofrado parcial de las vigas aéreas del edificio de servicios, verificando visualmente su conformación.	SI	SI
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se continúa con el retiro progresivo de formaleta de la placa de entrepiso del edificio de servicios, verificando las condiciones superficiales del concreto y conservando los apoyos requeridos.		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Reiniciadas las actividades contractuales, se da continuidad al proceso de desencofrado parcial de los elementos estructurales previamente fundidos, conforme al procedimiento constructivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5896

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	8	2026	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se continúa con el desencofrado de las vigas aéreas del edificio de servicios, realizando el retiro progresivo de formaleta y revisión visual de los elementos.	SI	SI
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PARCIALMENTE ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se continúa con el retiro progresivo de formaleta de la placa de entrepiso del edificio de servicios, verificando la superficie y conformación del concreto.		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se da continuidad a las actividades de desencofrado de los elementos estructurales previamente fundidos, verificando sus condiciones generales después del retiro progresivo de la formaleta.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5817

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	10	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se adelanta la ejecución de columnas en concreto, realizando verificación de formaleta, aplome y condiciones previas al vaciado. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5898

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	11	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se continúa con la fundida de columnas en concreto, controlando alineación, verticalidad y acabado superficial. Se realiza toma de muestras para ensayos de resistencia a la compresión del concreto colocado.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

58991

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X	X	
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se efectúan labores de curado, revisión y control de las columnas ejecutadas, verificando el estado del concreto y la conservación de la geometría de los elementos.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5900

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se da continuidad a la ejecución de columnas en concreto. Durante la jornada de vaciado se realiza toma de muestras para ensayos de resistencia a la compresión y control de calidad del concreto.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5901

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	14	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realizan actividades de revisión, curado y acabado de los elementos verticales en concreto ejecutados durante la semana.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA
5902

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	8	2026	7:30	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se verifican las columnas en concreto ejecutadas, revisando aplome, dimensiones, acabado y condiciones de curado conforme a las especificaciones del proyecto.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA
5903

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	16	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5904

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	17	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	M	Se recibe y verifica en bodega principal el suministro correspondiente a barandas en acero inoxidable, comprobando estado general, dimensiones y elementos principales antes de su almacenamiento temporal.	SI	SI
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	Se adelanta el suministro, en el frente de zonas duras, verificando traslapos, recubrimientos y disposición previa a las siguientes actividades.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5905

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA ENTAMBORADA TIPO PRESTIGE 0.90X2 m INCLUYE MARCO Y CHAPA	U	Se recibe en bodega principal el suministro parcial de puerta de madera entamborada tipo Prestige, incluyendo marco y chapa, verificando su estado y condiciones de almacenamiento.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA ACERO INOXIDABLE; 2 X 0.90 M	U	Se recibe el suministro parcial de puertas de tablero corrido con marco y cerradura en acero inoxidable, efectuando inspección visual y almacenamiento temporal protegido.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5906

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	19	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE EN PVC	U	Se recibe en bpdega principal la puerta plegable en PVC correspondiente al suministro parcial, verificando paneles, guias y accesorios antes de su almacenamiento.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	Se realiza el suministro parcial de rejillas persiana en aluminio, verificando acabado, integridad y dimensiones generales.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACION MARCO REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	Se realiza el suministro parcial los marcos en aluminio destinados a las rejillas persiana, realizando inspección y disposición temporal en zona de almacenamiento.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5907

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	20	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE SEGURIDAD EN BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	U	Se recibe en bodega el suministro parcial de barras de seguridad para baño, verificando acabado, accesorios de fijación y condiciones para posterior instalación.	SI	SI
[redacted]IZACION ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE	ML	Se ejecutan actividades de apertura y conformación de zanja en zona verde, instalación de ductos PVC de 2 pulgadas y relleno progresivo, verificando alineación y continuidad de la canalización.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5908

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	21	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO PONY. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se realiza la compra de la máquina biosaludable tipo Pony correspondiente al suministro parcial del equipamiento, verificando estructura, acabado y accesorios.	SI	SI
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO TWISTER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se realiza la compra de la máquina biosaludable tipo Twister, realizando inspección visual del equipo y almacenamiento temporal previo a su instalación.	SI	SI
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO VOLANTES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se realiza la compra de la la máquina biosaludable tipo Volantes, verificando estructura, componentes móviles y acabado superficial.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5109

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	22	8	2026	7:30	12:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUI DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se realiza la compra de la la máquina biosaludable tipo Eliptica, verificando estructura metálica, apoyos, mecanismos y acabado antes de su almacenamiento temporal.	SI	SI
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se realiza la compra de la la máquina biosaludable tipo Surf, efectuando revisión general del suministro y de sus elementos de anclaje.	SI	SI
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se realiza la compra de la la máquina biosaludable tipo Barras Paralelas, verificando estructura, apoyos y acabado superficial.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5910

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	23	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X	X	
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
CANALIZACION ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE	ML	Se da continuidad a la canalización en zona verde para ductos PVC de 2 pulgadas, efectuando conformación de zanja, disposición del ducto y relleno del tramo intervenido.	SI	SI
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, [illegible]CIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	Se continúa con la disposición y amarre de malla electrosoldada en zonas duras, verificando su correcta ubicación y estabilidad.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5911

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	24	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE 304	U	Se realiza la compra de divisiones sanitarias en acero inoxidable 304, con sus elementos principales protegidos para almacenamiento temporal.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM	M2	Se realiza la compra de ventanas sistema 744 con vidrio de 4 mm, verificando marcos, perfiles, vidrio y estado general antes de su instalación.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5912

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
ESCALERA TIPO GATO EN ACERO GALVANIZADO	U	Se realiza el suministro parcial de escalera tipo gato en acero galvanizado, verificando estructura, peldaños, puntos de anclaje y acabado galvanizado.	SI	SI
TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	Se adelanta instalación de tubería PVCP RDE 13.5 de 1 pulgada para la red de suministro, verificando trazado, uniones y continuidad de la red.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5913

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	26	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X		X	
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	Se ejecuta instalación de tubería sanitaria PVCS de 3 pulgadas, verificando alineación, pendiente y correcta unión de los tramos.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	M	Se instala tubería corrugada PVC para alcantarillado de 160 mm, controlando alineación, pendiente y ensamble de las uniones.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5914

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	27	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
TUBERIA FILTRO PERFORADA 100 MM (4")	M	Se instala tubería filtro perforada de 100 mm para el sistema de manejo de aguas lluvias, verificando ubicación y continuidad del drenaje.	SI	SI
TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	Se adelanta instalación de tubería PVCS de 3 pulgadas correspondiente a la red de aguas lluvias, controlando trazado, pendiente y uniones.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5915

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	28	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	M	Se instala tubería corrugada PVC de 200 mm para la red de aguas lluvias, verificando alineación, pendiente y acople entre tramos.	SI	SI
POSTE 9 METROS METÁLICO TRONCOCONICO PARA SOPORTAR PANEL S[illegible]BRAZO SENCILLO	U	Se realiza la compra de postes metálicos troncocónicos de 9 m para soporte de panel solar, verificando acabado, geometría y elementos asociados.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA
5916

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	29	8	2026	7:30	3:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
CANALIZACION ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 1" ZONA VERDE	ML	Se ejecuta canalización mediante apertura de zanja, disposición de ducto PVC de 1 pulgada y posterior relleno en zona verde, verificando continuidad del recorrido.	SI	SI
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN LAMINA CR 0.8X0.6X0.3M BREAKER INDUSTRIAL UNO GENERAL DE 3X100A, TRES DE 3X50A CON BARRAJE TRIPOLAR 600V-300AY ACCESORIOS DE INSTALACIÓ	U	Se recibe en obra el suministro parcial del tablero general de distribución, verificando gabinete, breakers, barraje y accesorios antes de su almacenamiento e instalación.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5917

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	30	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

[redacted]ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
[redacted]				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5918

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	31	8	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X	X	
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RECEBO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Se adelantan actividades de extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual de recebo en zonas duras de urbanismo.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5919.

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	1	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	Se realiza transporte y suministro logistico de material granular requerido para los trabajos de relleno y conformación en zonas duras.	SI	SI
PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDI O1/2" SUMINISTRO E [illegible]LACIÓN	U	Se ejecuta instalación de puntos hidráulicos en PVCP de 1/2 pulgada desde piso, verificando trazado, conexiones y ubicación de las salidas.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5920

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	2	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X	X	
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se ejecuta instalación de puntos hidráulicos en PVCP de 3/4 de pulgada, verificando ubicación, alineación y conexiones.	SI	SI
CODO 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan accesorios codo de 90 grados en PVCP de 1/2 pulgada como parte de la conformación de la red hidráulica.	SI	SI
TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan accesorios tee en PVCP de 3/4 de pulgada, verificando limpieza, unión y continuidad de la red.	SI	SI
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se ejecuta vaciado de placa de contrapiso en concreto premezclado del área polivalente, realizando nivelación, extendido y acabado. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5921

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	3	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se ejecuta excavación manual en conglomerado para conformación de zanjas de la red de suministro, incluyendo retiro y cargue del material producto de excavación.	SI	SI
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	Se realiza relleno de zanjas con material mixto de rio, mediante extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5922

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	4	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	Se instala tubería sanitaria PVCS de 4 pulgadas, controlando alineación, pendiente, apoyo y correcta unión de los tramos.	SI	SI
YEE PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan accesorios YEE PVCS de 2 pulgadas en la red sanitaria, verificando orientación y hermeticidad de las uniones.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5923

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	5	9	2026	7:30	3:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO CS274	U	Se ejecuta instalación de cajas de paso tipo CS274 para la red eléctrica, verificando localización, nivel y condiciones de conexión con las canalizaciones.	SI	SI
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Se continúa con relleno y compactación manual de recebo en zonas duras, controlando niveles y homogeneidad de la superficie.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5924

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	6	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

DOMINGO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5925

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	7	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
M[illegible]EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	Se inicia y continúa levantamiento de muros en bloque Flexa No. 4 en el edificio de servicios, verificando alineación, plomo, nivel y juntas de mortero.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5926

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	8	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		x		
SOLEADO	x			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Se ejecuta extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual de recebo en zonas duras de urbanismo, controlando cotas y uniformidad.	SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	Se realiza transporte de material granular requerido para continuar las actividades de relleno y conformación de las zonas duras.	SI	SI
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se ejecuta vaciado de placa de contrapiso en concreto premezclado en el edificio de servicios, realizando nivelación, extendido y acabado. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5927

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	9	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		x		
SOLEADO	x			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDI O1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se continúa con la instalación de puntos hidráulicos en PVCP de 1/2 pulgada desde piso, verificando conexiones, ubicación y continuidad de la red.	SI	SI
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	Se da continuidad al levantamiento de muros en bloque Flexa No. 4, verificando alineación, plomo y correcta ejecución de juntas de mortero.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance semanal reportado para el periodo, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5928

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	10	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	Se adelanta el levantamiento de muros en bloque Flexa No. 4 en el área polivalente, verificando alineación, plomo, nivel y juntas de mortero.	SI	SI
COLUMNA EN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza armado, formaleteado y vaciado de columnas en concreto del área polivalente. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza formaleteado, revisión del acero y vaciado de vigas aéreas en concreto. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	Se continúa con fabricación, montaje y ajustes de la estructura en acero ASTM A500, verificando alineación, uniones y condiciones de acabado.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5929

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	11	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se ejecuta placa de entrepiso maciza en concreto, con revisión previa de formaleta y refuerzo. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y	M2	Se ejecuta pañete exterior impermeabilizado en muros y culatas del área polivalente, controlando espesor, planeidad y acabado superficial.	SI	SI
ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	Se continúa con fabricación, montaje y ajustes de la estructura en acero ASTM A500, verificando alineación, uniones y condiciones de acabado.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5930

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	12	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 20 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	Se realiza sellado de juntas de dilatación mediante cordón de fondo y poliuretano, verificando limpieza, continuidad y correcta adherencia.	SI	SI
AFINADO Y BRILLADO DE PISO ENDURECIDO CON QUARZO	M2	Se ejecuta afinado y brillado del piso endurecido con cuarzo, controlando nivel, uniformidad y acabado superficial.	SI	SI
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	Se continúa con el levantamiento de muros en bloque Flexa No. 4 del edificio de servicios, verificando alineación, plomo y juntas de mortero.	SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	Se realiza figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo para elementos del edificio de servicios, verificando ubicación y recubrimientos.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5931

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	13	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	Se continúa con el levantamiento de muros en bloque Flexa No. 4 del edificio de servicios, verificando alineación, plomo y juntas de mortero.	SI	SI
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	Se ejecuta pañete de muros interiores, incluyendo formación de filos y dilataciones, verificando planeidad y acabado.	SI	SI
PA[redacted]MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y	M2	Se ejecuta pañete exterior impermeabilizado en muros y culatas, verificando espesor, adherencia y acabado superficial.	SI	SI
DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza armado, formaleteado y vaciado de dinteles en concreto. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5932

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	14	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	Se ejecuta afinado de pisos en mortero, controlando niveles, pendientes y acabado de la superficie.	SI	SI
PORCELANATO BEIGE	M2	Se adelanta la instalación de porcelanato beige, verificando modulación, nivelación, alineación de juntas y adherencia.	SI	SI
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	M	Se instala guardaescoba en porcelanato, verificando alineación, continuidad y calidad de los remates.	SI	SI
ESTUCO PLASTICO	M2	Se aplica estuco plástico en superficies interiores previamente preparadas, verificando uniformidad y acabado.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5933

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	15	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	Se levantan muros en bloque Flexa No. 4 correspondientes a la cubierta, verificando nivel, plomo y correcta ejecución de juntas.	SI	SI
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y	M2	Se ejecuta pañete exterior impermeabilizado en los muros de cubierta, controlando planeidad y acabado.	SI	SI
AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	Se realiza afinado de piso en mortero sobre la cubierta, garantizando niveles y pendientes requeridas.	SI	SI
MEDIACAÑA PISO MORTERO 1:4 H=100 MM	ML	Se conforma mediacaña en mortero en encuentros de piso y muro de cubierta, verificando continuidad y acabado.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5934

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	16	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	Se instala impermeabilización en manto asfáltico sobre la placa de cubierta, verificando traslapos, adherencia y continuidad del sistema.	SI	SI
POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se realiza formaleteado y vaciado de poyos en concreto. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI
ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza formaleteado y vaciado de alfajías en concreto. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	Se aplica pintura vinilo tipo Coraza en superficies exteriores de cubierta, con preparación previa y control de uniformidad.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5935

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	17	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	U	Se instalan rejillas Sosco en aluminio, verificando ubicación, fijación y correcto ajuste.	SI	SI
PUERTA ESCOTILLA LAMINA DE ALFAJOR Y ANGULO (INC. MARCO, CONTRAMARCO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	U	Se instala puerta escotilla en lámina de alfajor con marco y contramarco, verificando aplome, fijaciones y funcionamiento.	SI	SI
ESCALERA TIPO GATO EN ACERO GALVANIZADO	U	Se realiza instalación y fijación de escalera tipo gato en acero galvanizado, verificando alineación, anclajes y estabilidad.	SI	SI
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Se continúa con extendido, nivelación y compactación manual de recebo en zonas duras, verificando la conformación de la superficie.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5936

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	Se instala malla electrosoldada en zonas duras, verificando traslapos, separación, amarre y recubrimiento previo al vaciado.	SI	SI
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	Se realiza colocación y vaciado de placa de contrapiso en concreto en zonas duras. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI
PLACA DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO 20.7 Mpa (3000 PSI) PREMEZCLADO E INSTALADO	M3	Se ejecuta placa de piso en concreto estampado, verificando niveles, acabado y patrón superficial. Durante el vaciado se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión.	SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	Se realiza transporte de material granular requerido para la conformación de las zonas duras y frentes de urbanismo.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5937

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	19	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se realiza excavación manual en conglomerado para la instalación de la red de suministro, controlando sección y profundidad de zanja.	SI	SI
PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDI O1/2" SUMINISTRO E [redacted]ALACIÓN	U	Se continúa con la instalación de puntos hidráulicos en PVCP de 1/2 pulgada desde piso, verificando conexiones, ubicación y continuidad de la red.	SI	SI
TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan accesorios tee en PVCP de 1 pulgada, verificando limpieza, unión y alineación de la red hidráulica.	SI	SI
VALVULA DE CORTE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan válvulas de corte de 1 pulgada en la red de suministro, verificando sentido, accesibilidad y estanqueidad.	SI	SI
VALVULA DE CORTE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instala válvula de corte de 1/2 pulgada, verificando ubicación, conexión y funcionamiento.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5938

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	20	9	2026	7:30	3:00PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 3X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS, REGISTRO CORTE Y CAJILLA EN POLIPROPILENO)	U	Se ejecuta acometida domiciliaria de acueducto con sus accesorios, registro de corte y cajilla, verificando conexiones y estanqueidad.	SI	SI
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	Se ejecuta relleno con material mixto de río, incluyendo extendido, humedecimiento, nivelación y compactación manual con equipo liviano.	SI	SI
TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	Se instala tubería sanitaria PVCS de 6 pulgadas, verificando alineación, pendiente, uniones y soporte de la red.	SI	SI
YEE PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan accesorios YEE PVCS de 2 pulgadas en la red sanitaria, verificando orientación y hermeticidad de las conexiones.	SI	SI
CODO 45° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan codos de 45° PVCS de 2 pulgadas, verificando orientación y correcta unión de los accesorios.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5939

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	21	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO		X		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
YEE PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan accesorios YEE PVCS de 3 pulgadas, verificando ubicación, orientación y sello de las conexiones.	SI	SI
CODO 90° PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instala codo de 90° PVCS de 3 pulgadas, verificando ajuste, orientación y continuidad de la red.	SI	SI
[illegible]CS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan accesorios tee PVCS de 3 pulgadas, verificando unión, alineación y continuidad de la red sanitaria.	SI	SI
YEE PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan accesorios YEE PVCS de 4 pulgadas, verificando orientación, unión y correcta conexión a la red.	SI	SI
CODO 45° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instalan codos de 45° PVCS de 4 pulgadas, verificando ajuste y hermeticidad de las conexiones.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA
5940

CONTRATO N° 107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	22	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se completan salidas sanitarias para sanitario en tubería de 4 pulgadas, verificando ubicación y conexión con la red.	SI	SI
TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	Se instala tubería PVCL de 3 pulgadas, verificando trazado, pendientes, uniones y soportes requeridos.	SI	SI
[redacted]E INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO T[redacted]E COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	U	Se construye caja de inspección en mampostería con tapa de concreto reforzado y marco metálico, verificando dimensiones, niveles y conexiones.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	U	Se instala kit silla YEE para conexión de tubería sanitaria al colector, verificando corte, ajuste y sellado de la unión.	SI	SI
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Se realiza excavación manual en conglomerado para el tramo de red sanitaria, controlando ancho, profundidad y estabilidad de la zanja.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5141

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	23	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	Se realiza relleno de zanja con material mixto de rio, con extendido, humedecimiento, nivelación y compactación manual.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	M	Se instala tubería corrugada PVC de alcantarillado de 160 mm, verificando pendiente, alineación, cama de apoyo y uniones.	SI	SI
TUBERIA FILTRO PERFORADA 100 MM (4")	M	Se instala tubería filtro perforada de 100 mm para manejo de aguas lluvias, verificando trazado, pendiente y disposición.	SI	SI
TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	Se instala tubería PVCS de 3 pulgadas correspondiente a la red de lluvias, verificando pendiente y uniones.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	M	Se instala tubería corrugada PVC de alcantarillado de 200 mm para la red de lluvias, verificando pendiente, apoyo y uniones.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5942

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	24	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJNATES RED ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES EN TUBO IMC 2"	U	Se ejecutan bajantes de la red eléctrica y de telecomunicaciones en tubo IMC de 2 pulgadas, verificando fijación, trazado y continuidad.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO CS274	U	Se instalan cajas de paso tipo CS274 para la red eléctrica, verificando ubicación, nivel y conexiones de ductería.	SI	SI
[redacted]STRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 30X30 CONCRETO	U	Se instala caja de paso en concreto de 30 x 30, verificando nivelación, ubicación y continuidad de las canalizaciones.	SI	SI
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO INCLUYE 3 VARILLAS CU 2.40MTS 15 MTS CABLE DESNUDO #4, SOLDADURA CADWELT 115° Y CAJA DE	GLB	Se ejecuta sistema de puesta a tierra para tablero, incluyendo instalación de varillas, conductor de cobre, soldaduras y caja de inspección.	SI	SI
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CABLE 2X8F +1X8L+ 1X10 CU TIERRA (TABLERO DE CONTROL ILUMINACION Y TOMAS PLAZA CENTRAL)	ML	Se instala alimentador eléctrico para tablero de control de iluminación y tomas de la plaza central, verificando tendido, identificación y continuidad.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:			

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

5943

CONTRATO N°	107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	25	9	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X		
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPÓGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CABLE 3X4F +1X4L+ 1X4 CU TIERRA (TABLERO DE CONTROL ILUMINACION Y TOMAS OFICINA ADMINISTRATIVA	ML	Se instala alimentador eléctrico para tablero de la oficina administrativa, verificando tendido, identificación y continuidad de conductores.	SI	SI
TABLERO DE CONTROL SIN ESPACIO TOTALIZADOR, CON PROTECCIONES [redacted] DE ACUERDO A DIAGRAMA UNUFILAR	U	Se instala tablero de control con sus protecciones de acuerdo con el diagrama unifilar, verificando fijación, conexionado e identificación.	SI	SI
TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS BIFASICO. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	Se instala tablero parcial bifásico de 12 circuitos con sus breakers, verificando nivelación, conexionado y distribución de circuitos.	SI	SI
SALIDA PARA PUNTO ELECTRICO EMBEBIDO EN MURO TOMA 110V EN CAJA Y ACCESORISO PARA SU INSTALACIÓN	U	Se ejecutan salidas para puntos eléctricos de 110 V embebidas en muro, incluyendo cajas, canalización y accesorios de instalación.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se ejecutaron y/o verificaron las actividades correspondientes al avance del Acta de Recibo Parcial No. 3, con control de calidad, revisión de condiciones de ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	

5944

ENSAYOS DE LABORATORIO

5945

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 08 de agosto de 2026

OFICIO: 13025

SEÑORES:
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META
CAMILO CALDERON
CEL. 3212006388
centrodeconvivenciameta@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: 063/08/2026.
PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- DIECIOCHO (18) Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

5946

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META

CLIENTE:

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 4000 PSI. CONCRETO

FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2026

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (dias)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
ZAPATA DE SERVICIOS ELABORADO EN OBRA	5454	16-JUL-26	23-JUL-26	7	10,2	81,71	122,59	12496	2.185	72,8					X		4000
	5455		23-JUL-26	7	10,2	81,71	125,94	12838	2.244	74,8					X		
	5456		30-JUL-26	14	10,2	81,71	238,78	24340	4.255	106,4					X		
ZAPATA DE E. MULTIPROPOSITO ELABORADO EN OBRA	5458	17-JUL-26	24-JUL-26	7	10,0	78,54	165,68	16889	3.072	87,8					X		4000
	5459		24-JUL-26	7	10,1	80,12	183,10	18665	3.328	95,1					X		
	5460		31-JUL-26	14	10,1	80,12	219,43	22368	3.988	99,7				X			
VIGAS DE CIMENTACION E. SERVICIOS. ELABORADO EN OBRA	5462	18-JUL-26	25-JUL-26	7	10,2	81,71	127,93	13041	2.280	76,0					X		4000
	5463		25-JUL-26	7	10,0	78,54	125,77	12821	2.332	77,7					X		
	5464		01-AGO-26	14	10,1	80,12	190,31	19400	3.459	98,99				X			
COLUMNAS E. SERVICIOS. ELABORADO EN OBRA	5466	21-JUL-26	28-JUL-26	7	10,1	80,12	183,47	18702	3.335	83,4					X		4000
	5467		28-JUL-26	7	10,3	83,32	180,22	18371	3.150	78,7			X				
	5468		04-AGO-26	14	10,1	80,12	219,43	22368	3.988	99					X		
VIGA DE IMENTACION DE E. MULTIPROPOSITO ELABORADO EN OBRA	5470	22-JUL-26	29-JUL-26	7	10,1	80,12	161,39	16452	2.992	74,8					X		4000
	5471		29-JUL-26	7	10,1	80,12	190,35	19404	3.460	86,5				X			
	5472		05-AGO-26	14	10,1	80,12	268,31	27351	4.975	124,4					X		
COLUMNAS E. MULTIPROPOSITO. ELABORADO EN OBRA	5474	24-JUL-26	31-AGO-26	7	10,2	81,71	154,06	15704	2.746	68,6				X			4000
	5475		31-AGO-26	7	10,1	80,12	186,93	19055	3.398	84,9				X			
	5476		7-AGO-26	14	10,2	81,71	235,64	24020	4.199	105,0				X			

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE CASTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5947

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

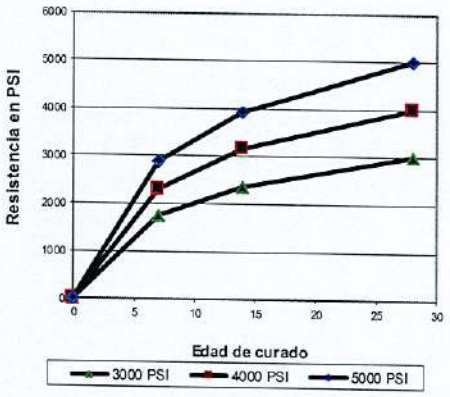
INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5948

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 09 de agosto de 2026

OFICIO: 13026

SEÑORES:
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META
CAMILO CALDERON
CEL. 3212006388
centrodeconvivenciameta@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: 064/08/2026.
PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- OCHO (08) Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

5941

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.: C-064/08/2026

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META

CLIENTE: CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 4000 PSI. CONCRETO

FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2026

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (dias)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
MUROS MULTIPROPOSITO. ELABORADO EN OBRA	5478	24-julio-26	31-JUL-26	7	10,0	78,54	190,68	19437	3.535	88,4				X			4000
	5479		31-JUL-26	7	10,0	78,54	189,79	19347	3.519	88,0					X		
	5480		07-AGO-26	14	10,0	78,54	240,16	24481	4.453	111,3					X		
VIGA AEREA Y PLACA SERVICIOS. ELABORADO EN OBRA	5482	25-julio-26	01-AGO-26	7	10,0	78,54	161,39	16452	2.992	74,8				X			4000
	5483		01-AGO-26	7	10,1	80,12	190,35	19404	3.460	86,5				X			
	5484		08-AGO-26	14	10,0	78,54	268,31	27351	4.975	124,4					X		
VIAGA AEREA Y PLACA SERVICIOS. ELABORADO EN OBRA	5486	27-julio-26	03-AGO-26	7	10,0	78,54	144,01	14680	2.670	76,3			X				4000
	5487		03-AGO-26	7	10,0	78,54	172,33	17567	3.195	91,3				X			

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5950

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO

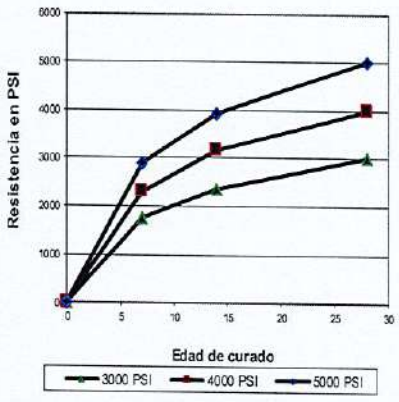
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE COSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5951

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 25 de Septiembre 2026

OFICIO: 10929

SEÑORES:
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META
NATHALI ANDREA GUZMÁN MOYA
CEL. 3123189258
consorciocentrodeconvivenciameta@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: 090/09/2026.
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- OCHO (08) Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5952

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.:

PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META

090/09/2026

CLIENTE: CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 3000-3500 PSI. CONCRETO PREMEZCLADO

FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE DE 2026

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (dias)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
	5204		9-sep-26	7	10,1	80,12	104,56	10659	1.900	63,3			X				
	5205		16-sep-26	7	10,1	80,12	99,64	10157	1.811	60,4			X				
PLACA CONTRAPISO POLIVALENTE	5206	02-sep-26	16-sep-26	14	10,0	78,54	134,21	13681	2.488	82,9				X			3000
	5207																
	5208		15-sep-26	7	10,1	80,12	134,25	13685	2.440	69,7			X				
	5209		15-sep-26	7	10,1	80,12	140,02	14273	2.545	72,7				X			
PLACA CONTRAPISO E. SERVICIO	5210	8-Sep-26	22-sep-26	14	10,1	80,12	159,34	16243	2.896	82,7					X		3000
	5211																

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE CASTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 N° 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5953

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

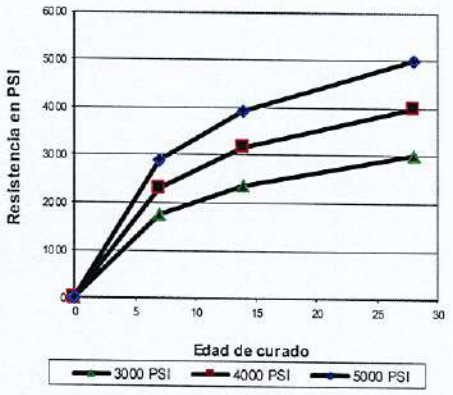
CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO		
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5954

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 10 de septiembre de 2026

OFICIO: 10900

SEÑORES:
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META
NATHALI ANDREA GUZMÁN MOYA
CEL. 3123189258
consorciocentrodeconvivenciameta@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: 008/08/2026.
PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- CUATRO (04) Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5955

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	IG - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.: 008/08/2026

PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

CLIENTE: CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 3000 PSI. CONCRETO ELABORADO EN OBRA

FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE DE 2026

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (dias)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
COLUMNAS EDIFICO DE SERVICIO	5622	10-ago-26	17-ago-26	7	10,1	80,12	148,11	15098	2.692	59,8					X		4500
	5623		17-ago-26	7	10,1	80,12	150,35	15326	2.733	60,7				X			
	5624		24-ago-26	14	10,1	80,12	199,02	20287	3.617	80,4					X		
	5625		07-sep-26	28	10,2	81,71	259,30	26432	4.621	102,7					X		

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE COSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5956

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

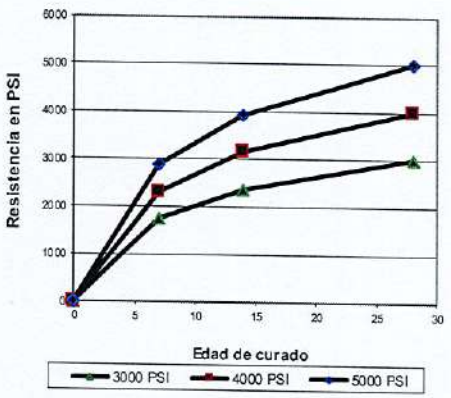
CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO		
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5957

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 25 de septiembre de 2026

OFICIO: 10595

SEÑORES

CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META
NATHALI ANDREA GUZMÁN MOYA
CEL. 3123189258
consorciocentrodeconvivenciameta@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: 012/09/2026
OBJETO: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN DEL MUNICIPIO DE SAN MATIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados señores:

Cumpliendo el compromiso adquirido con ustedes, en el plan de calidad de la obra en referencia, les adjunto los resultados de:

- DOS (02) Ensayos de densidades por el método del cono y arena.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de ustedes,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

5958

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA

Versión: 008	I G - F - 009	Enero de 2020

NORMA INV E-161 -13

Solicitud No.: 012/09/2026

CLIENTE : CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META

E-MAIL: consorciocentrodeconvivenciameta@gmail.com **CONTACTO:** 3123189258

PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

LUGAR SAN MARTIN -META **FECHA:** 25/09/2025

ENSAYO		1	2	3	4	5
LOCALIZACION		PISTA DE TROTE	PISTA DE TROTE			
FUENTE		HUMADEA	HUMADEA			
MATERIAL		TAMAÑO MAX 2"	TAMAÑO MAX 2"			
Peso frasco + arena inicial	gr	6.990	6.925			
Peso frasco + arena restante	gr	2.180	2.145			
Peso arena total usada	gr	4.810	4.780			
Constante del cono	gr	1.675	1.675			
Peso de arena en el hueco	gr	3.135	3.105			
Densidad de la arena	gr/cm3	1,39	1,39			
Volumen del hueco	cm3	2.255	2.234			
Peso suelo hum + recipiente	gr	5.470	5.330			
Peso del recipiente	gr	190	190			
Peso suelo humedo	gr	5.280	5.140			
Densidad max de laboratorio	gr/cm3	2,185	2,185			
Gravedad especifica agregado grueso	gr/cm3	2,527	2,527			
Peso material retenido 3/4	gr	1.665	1.543			
% Material retenido 3/4	gr	31,53	30,02			
% Material que pasa 3/4	gr	68,47	69,98			
Humedad Speddy	%	2,4	2,6			
Peso suelo extraido seco	gr	5156	5010			
Densidad maxima en el terreno	gr/cm3	2,286	2,243			
Densidad maxima corregida CyD	gr/cm3	2,282	2,278			
Humedad optima	%	6,00	6,00			
Compactacion especifica	%	95	95			
Grado de compactacion	%	100,17	98,47			

OBSERVACIONES: NP

CARGO RESPONSABLE: AUXILIAR DE LABORATORIO [ ] ANALISTA DE LABORATORIO I [X]

FIRMA

FIRMA

Carrera 32 Nº 5B - 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 098 660 1564 Celular 321 238 74 13 – 315 894 61 63
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com – www.ingegaringenieria.com.co

5959

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 25 de septiembre de 2026

OFICIO: 10562

SEÑORES:
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META
NATHALI ANDREA GUZMÁN MOYA
CEL. 3123189258
consorciocentrodeconvivenciameta@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: 098/09/2026.
PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- Tres (03)Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5960

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.:

PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SANMARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

CLIENTE: 098/09/2026 CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 3000/4000 PSI. CONCRETO ELAB EN OBRA

FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE DE 2026 NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (dias)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
VIGA AEREA POLIVALENTE		10-sep-26	17-sep-26	7	10,2	81,71	165,64	16885	2.952	73,8					X		4000
			17-sep-26	7	10,1	80,12	155,24	15825	2.822	70,5					X		
			24-sep-26	14	10,2	81,71	238,78	24340	4.255	106,4					X		

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE COSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

5961

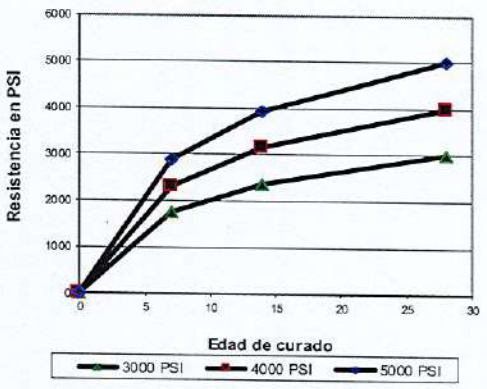
CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO		
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE COSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5962

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 25 de septiembre de 2026

OFICIO: C-5840

Señores
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA
NATHALI ANDREA GUZMÁN MOYA
Cel. 3123189258
consorciocentrodeconvivenciameta@gmail.com
Ciudad

SOLICITUD: C-020/09/2026
PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con ustedes, en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- TRES (3) Ensayos de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de ustedes,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5963

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.: C-020/04/2026

PROYECTO: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

CLIENTE: CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 3000 PSI. CONCRETO ELAB OBRA

FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE DE 2026 NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (días)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
COL POLIVALENTE	C3658	10-sep-26	17-sep-26	7	10,1	80,12	120,54	12287	2.191	73,0					X		3000
	C3659														X		
	C3660														X		
PLACA ENTREPISO AREA POLIVALENTE	C3661	11-sep-26	18-sep-26	7	10,1	80,12	130,46	13299	2.371	79,0				X			3000
	C3662														X		
PLACA ESTAMPADO	C3664	18-sep-26	25-sep-26	7	10,1	80,12	141.24	14398	2.567	85.6				X			3000
	C3665																
	C3666																

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

5964

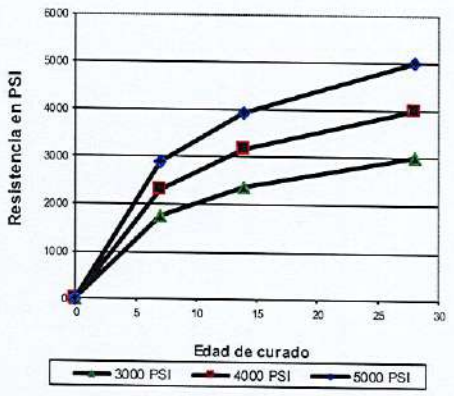
CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO		
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia



OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. **El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.**

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

5965

INFORME AMBIENTAL PARCIAL N°3

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)

PERIODO DEL INFORME
(28 de julio al 25 de septiembre)

OBJETO:
"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEPARTAMENTO DEL META".

CONTRATO DE OBRA No. 107 DE 2026

2026

TABLA DE CONTENIDO.

1. GENERALIDADES 3
2. ALCANCE. 4
3. OBJETIVOS. 5
4.1 Objetivo General. 5
4.2 Objetivos Específicos. 5
4. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO. 6
7. ASPECTOS AMBIENTALES. 9
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERMISOS. 10
9. SEGUIMIENTO AL CUMPIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 10
10. Desarrollo de fichas de manejo ambiental. 11
Ficha N 1: Información y Comunicación a la Comunidad. 11
Ficha N2. Licencias, Permisos y Trámites Ambientales. 12
- Ficha N 3. Manejo y Disposición de Material Sobrante. 14
- Ficha N 4. Capacitación ambiental. 14
- Ficha N 5. Manejo Maquinaria equipos y vehículos. 14
- Ficha N 6. Manejo integral de materiales de construcción. 15
- Ficha N 7. Manejo y disposición de residuos sólidos. 15
- Ficha N8. Señalización Frentes de obra y Sitios Temporales. 16
- Ficha N9. Control de emisión de ruido. 16
- Ficha N 10. Manejo de descapote y cobertura vegetal. 16
- Ficha N 11.Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de campamentos y sitios temporales. 17
- Ficha N 12. Protección de fauna. 17
- Ficha N 13 Atención a la comunidad. 18
- Ficha N 14 Contratación mano de obra. 18
- Ficha N 15 Conformación grupo ambiental. 18
- Ficha N 16 Manejo de aguas superficiales 18
- Ficha N 17 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales 18
- Ficha N 18 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos. 19

11. CONCLUSIÓN. 20
12. ANEXOS. 20

1. GENERALIDADES

El programa de implementación de medidas ambientales es un componente básico del proyecto, que comprende las medidas de manejo ambiental necesarias respecto a las actividades constructivas con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. Es la principal herramienta de gestión ambiental y social de obligatorio cumplimiento por los responsables del proyecto en la cual interviene un profesional ambiental encargado de dar cumplimiento a estas actividades durante toda la ejecución del proyecto. **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEPARTAMENTO DEL META".**

2. ALCANCE.

Mediante la presentación del Plan de Adaptación a la guía Ambiental - PAGA, se espera la ejecución de las actividades del proyecto **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEPARTAMENTO DEL META"** así mismo dar a conocer las características del área de trabajo (factores físicos y bióticos) las generalidades del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica su ejecución, así como las posibilidades de adelantar acciones o actividades de prevención, control, mitigación o compensación; todo ello amparado en las normas ambientales legales vigentes que propenden por un desarrollo sostenible de los proyectos de infraestructura.

El presente informe, integra los conceptos de la ingeniería con los lineamientos de la Gestión Ambiental. Igualmente, pretende identificar y valorar los impactos y las acciones a desarrollar con el fin de contribuir a la conservación del medio natural donde se desarrollan las obras, alterando al mínimo las condiciones ambientales y socioeconómicas preexistentes.

Este tendrá una repercusión directa y mejora continua en el desarrollo de la parte operativa del proyecto, garantizando un flujo de recursos por parte del contratista y la participación activa de la comunidad asociada al proyecto; de ello dependerá el buen desarrollo de las obras de manera ambientalmente segura respetando los principios de protección y conservación de un ambiente sano y la elevación de la calidad de vida de los habitantes del municipio de puerto concordia y vecinos beneficiarios del proyecto.

3. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

Implementación y puesta en marcha del plan de medidas ambientales PAGA para el proyecto **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEPARTAMENTO DEL META".**

4.2 Objetivos Específicos.

- Ejecución y puesta en marcha de las fichas ambientales del Programa.
- Prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos a cada uno de los componentes ambientales.
- Cumplimiento con lo establecido en la legislación ambiental vigente que aplique en cada una de las etapas de construcción.
- Implementar y mantener medidas preventivas y de control que minimicen el riesgo de ocurrencia de derrames y contingencias ambientales, asegurando la correcta gestión de los materiales peligrosos y el cumplimiento de los procedimientos de respuesta ante emergencias.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra N° 107 de 2026 suscrito el 06 de abril de 2026, cuyo objeto es la **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META"**, se ejecutarán en el inmueble de matrícula inmobiliaria No. 236-59993 localizado en el Municipio de San Martín, Latitud. 3° 42' 16.16" N Long 73° 41" 48.77 W, en el departamento del Meta.

Imagen 1. Localización proyecto.

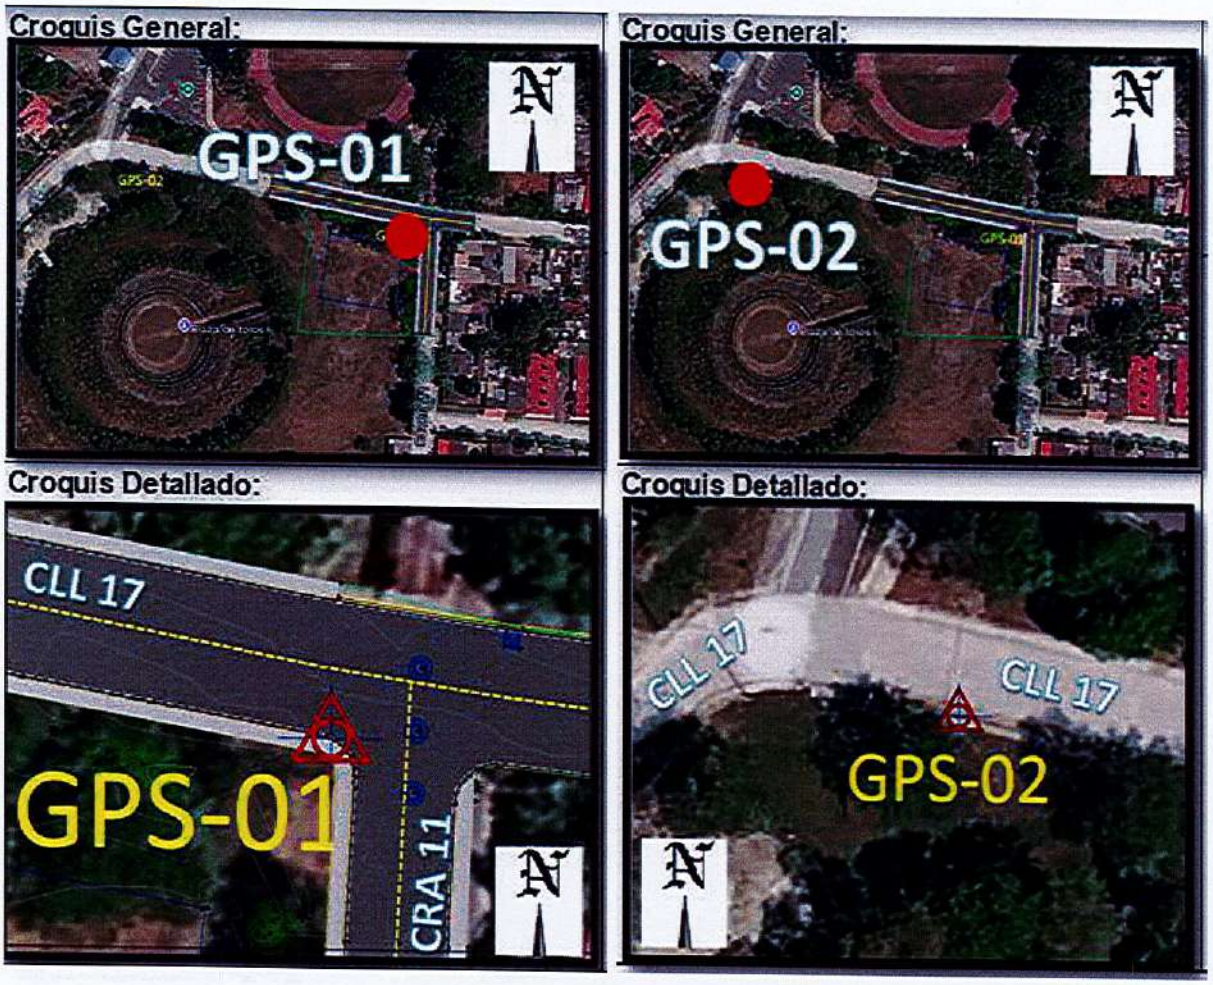


- **GEOREFERENCIACIÓN.**

Se realizó el levantamiento topográfico del predio destinado al Centro de Convivencia del municipio de San Martín de los Llanos, Meta, mediante equipos satelitales GNSS y método estático, obteniendo la georreferenciación de dos (02) puntos GPS debidamente materializados y amarrados al sistema geodésico nacional MAGNA SIRGAS del IGAC.

MOJÓN	NORTE	ESTE	ELEVACIÓN
GPS 1	3°42´17.38120"	73°41´47.76467"	446.457
GPS 2	3°42´18.27260"	73°41´52.23239"	446.897


Localización GPS.

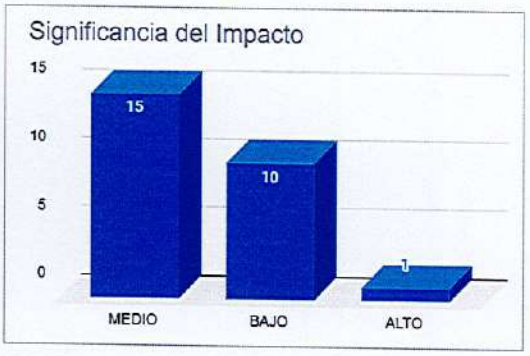


5. ASPECTOS AMBIENTALES.

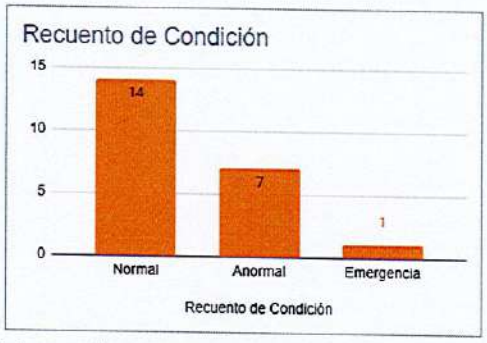
Se describen los aspectos ambientales del proyecto que aplican al presente periodo evaluado a fin de conocer los posibles impactos asociados a la ejecución normal de las actividades en obra, La evaluación de los impactos ambientales identificados muestra que los más significativos y de mayor importancia, afectarán principalmente el Recurso suelo .

Contamos con 26 impactos identificados en un total de 15 corresponde a carácter medio, 10 a carácter bajo, y uno (1) de carácter alto, el impacto significativo que se presenta corresponde a al uso del suelo y emisiones atmosféricas.





Frente a los impactos positivos observamos mejoras en la calidad de vida de los habitantes del sector y mejoras en la estructura principal de la vía , en cuanto a los impactos derivados por emergencias se encuentran 1 por movimientos de tierras o sismos en el área urbana, 14 situaciones anormales relacionadas con (desastres naturales) y 7 situaciones consideradas como normales.



Este análisis sugiere que, si bien existen eventos imprevistos y condiciones inusuales, la mayor parte del tiempo el entorno se mantiene en condiciones aceptables, lo cual favorece la percepción positiva del proyecto por parte de la comunidad.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Como herramienta básica para la aplicación de medidas y acciones para la prevención y mitigación de impactos ambientales negativos se da cumplimiento a las actividades propuestas en las Fichas de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyecto durante el respectivo periodo a continuación se relaciona el avance de las fichas evaluadas.

Tabla 1. Descripción de las fichas ambientales.

Programa	Proyecto	Código
1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	Conformación del grupo de gestión ambiental.	DAGA-1.1-01
	Capacitación ambiental al personal de obra.	DAGA-1.2-02
2. Programa Actividades Constructivas	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.	PAC-2.1-04
	Proyecto de señalización de frentes de obras y sitios temporales.	PAC-2.3-06
	Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.	PAC-2.4-07
	Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	PAC-2.5-08
3. Programa Gestión Hídrica	Proyecto de manejo de aguas superficiales.	PGH-3.1-09
	Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	PGH-3.2-10
4. Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipo	Proyecto Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y acopio temporal.	PMIT -5.1-15
	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	PMIT- 5.3-17
5. Programas de Gestión Social.	Proyecto de Atención a la Comunidad.	PGS-6.1-18
	Proyecto de Contratación Mano de Obra	PGS-6.6-23

6. DESARROLLO DE FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL.

A continuación, se describen las actividades realizadas frente a lo dispuesto en cada una de las fichas relacionadas en pro de la mitigación de impactos ambientales negativos.

1. Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental

DAGA-1.1-01 Conformación del grupo de gestión ambiental.

Durante el periodo evaluado se encuentra en funcionamiento el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto, responsable de liderar y apoyar la implementación de las medidas ambientales establecidas para la obra.

Nombre	Cargo
Paula andrea pardo redondo	Profesional ambiental
Nataly Guzman	Residente de obra

Imagen 1. *inspecciones ambientales equipo de obra.*



DAGA-1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante el período evaluado se llevó a cabo una capacitación ambiental sobre el manejo y control de sustancias peligrosas, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas de almacenamiento, manipulación, respuesta ante derrames y cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

2. Programa Actividades Constructivas

PAC-2.1-04 Proyecto de manejo integral de materiales de construcción.

Durante el periodo reportado se realizaron actividades orientadas al manejo adecuado de los materiales de construcción utilizados en la obra, garantizando su almacenamiento, organización y conservación en condiciones apropiadas.Se efectuó el ordenamiento de materiales en las áreas destinadas para su acopio, facilitando el control de inventarios, la optimización de los espacios de trabajo y la prevención de pérdidas o deterioro de los insumos.

Imagen 2. *Manejo de materiales en obra.*



PAC-2.3-06 Proyecto de señalización de frentes de obras y sitios temporales.

Durante el periodo reportado se realizó la instalación de la señalización en los diferentes frentes de trabajo y áreas temporales del proyecto, garantizando la identificación de zonas de riesgo, áreas de trabajo, puntos de acopio y vías de circulación. Asimismo, se verificó periódicamente su estado y visibilidad, contribuyendo a la seguridad del personal y al adecuado desarrollo de las actividades de obra.

Imagen 3. *Señalización en obra*

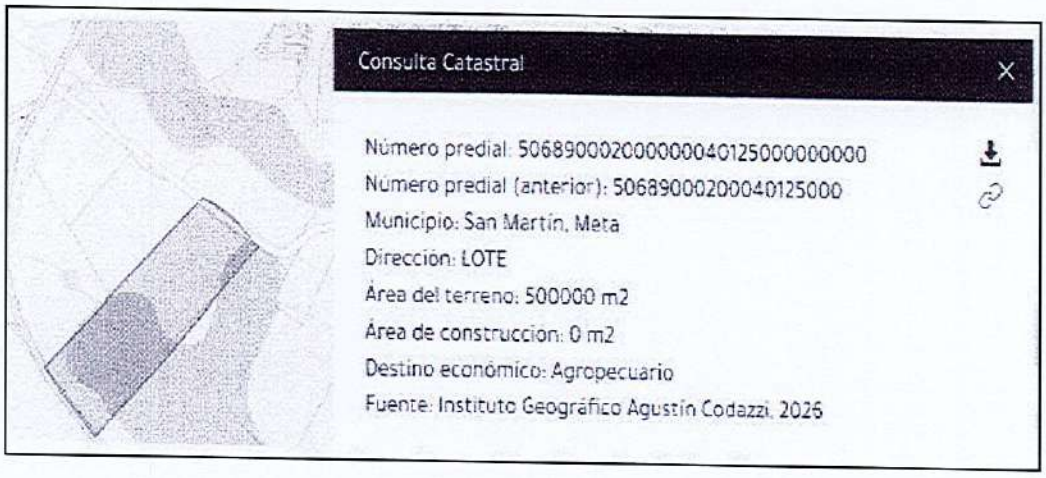


PAC-2.4-07 Proyecto de manejo y disposición final de escombros y lodos.

Se garantizó que el material sobrante de excavación, fueran movilizados en vehículos debidamente acondicionados y cubiertos con lonas, con el fin de prevenir la dispersión de partículas, la generación de material particulado, los derrames durante el transporte y posibles afectaciones a las vías y al entorno. Asimismo, se verificó que la disposición final de estos materiales se realizará en sitios autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Por parte de la Alcaldía Municipal se otorgó viabilidad para el uso del lote destinado al acopio temporal y disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), de acuerdo con las condiciones y lineamientos establecidos por la administración municipal.

Imagen 5. *Predio RCD para disposición final.*



PAC-2.5-08 Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.

Durante el periodo reportado se realizó la adecuada gestión de los residuos sólidos convencionales y especiales generados en la obra, mediante la separación en la fuente y el uso de puntos ecológicos debidamente identificados. Se verificó la correcta disposición temporal de los residuos y su entrega a gestores autorizados empresa de servicios públicos **CAFUCHES**, promoviendo el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la minimización de impactos al entorno.

Imagen 6. *Manejo de residuos en obra.*



3. Programa Gestión Hídrica

PGH-3.1-09 Proyecto de Manejo de Aguas Superficiales

Durante el periodo reportado se implementaron medidas orientadas al uso eficiente y controlado del recurso hídrico en la obra. Para el consumo del personal se suministró agua potable mediante la adquisición de agua envasada por la empresa AGUA DEL META, garantizando condiciones adecuadas de calidad e higiene para los trabajadores y evitando afectaciones a las fuentes hídricas del área de influencia.

Imagen 7. *Agua potable en obra.*



PGH-3.2-10 Proyecto de Manejo de Residuos Líquidos Domésticos e Industriales

Durante el periodo reportado se adecuaron unidades sanitarias para hombres y mujeres destinadas al personal de obra en las instalaciones de la oficina del proyecto. Debido a que el predio cuenta con disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, las aguas residuales domésticas generadas son conducidas y dispuestas a través de la red de alcantarillado existente por la empresa de servicios públicos **CAFUCHES**, garantizando condiciones sanitarias adecuadas y previniendo impactos ambientales

Imagen 8. *Baños en obra.*



5. **Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipo**

PMIT-5.1-15 Instalación, funcionamiento desmantelamiento de campamentos y acopio temporal.

Durante el periodo reportado se realizó la adecuación y puesta en funcionamiento de la oficina del proyecto, la bodega para almacenamiento de herramientas, equipos e insumos, así De igual forma, se habilitaron las áreas destinadas al acopio temporal de materiales granulares, garantizando condiciones adecuadas de orden, organización y protección de los materiales, con el fin de prevenir afectaciones al entorno y facilitar el desarrollo de las actividades constructivas.

Imagen 9. *Acopio de materiales en obra.*



PMIT-5.3-17 Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Durante el periodo reportado se realizaron inspecciones periódicas a la maquinaria, equipos y vehículos vinculados al proyecto, con el fin de verificar sus condiciones operativas y ambientales. Como resultado de las inspecciones efectuadas, no se evidenciaron fugas de combustibles, aceites u otros fluidos, contribuyendo a la prevención de la contaminación del suelo y al cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para la obra.

6. Programas de Gestión Social.

PGS-6.1-18 Proyecto de Atención a la Comunidad.

Durante el periodo evaluado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad, sin embargo se mantienen los canales de comunicación abiertos al público y con el personal para la atención oportuna de las necesidades de la comunidad aledaña al área del proyecto.

Canales de comunicación:
oficina de atención a la comunidad ubicada al interior de la obra.
Formato de atención a PQRS.
Correo electrónico: **centrodeconvivencia@gmail.com**

- **Seguimiento a indicadores.**

Indicador	Resultado	Observaciones
N de PQRS resueltas / N de PQRS recibidas.	0 / 0 = 0 %	No se presentaron PQRS durante el periodo evaluado.

PGS-6.6-23 Proyecto de Contratación Mano de Obra

Durante el presente periodo se cuenta con el personal mínimo para la ejecución de las actividades y con el personal operativo.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO
1	DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ	DIRECTOR DE OBRA
2	MARIA FERNANDA QUEVEDO GUTIERREZ	RESIDENTE DE OBRA
5	PAULA ANDREA PARDO REDONDO	ESPECIALISTA AMBIENTAL
6	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RAMIREZ	PROFESIONAL EN SST

- **PERSONAL OPERATIVO**

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO
1	William Rey Arias	AYUDANTE
2	Yimmy Alexander Torres	AYUDANTE
3	Alejandro Frisnea Arias	AYUDANTE
4	Cristhian Gallo Guapacha	OFICIAL
5	Javier Alejandro Mora Gonzalez	OFICIAL
6	Juan David Toro Gonzalez	AYUDANTE
7	Jairo Andres Paloma Giraldo	AYUDANTE
8	Yubely Andrea Rodriguez Amaya	AYUDANTE
9	Robinson Roberto Gonzalez Castillo	AYUDANTE
10	Hugo Alexander Quintero Rojas	AYUDANTE

Registro Fotografico.



inspecciones ambientales



orden y aseo en la obra



Manejo Adecuado de residuos



señalización ambiental





7. CONCLUSIÓN.

Durante el periodo comprendido entre el **28 de julio** al **25 de septiembre del 2026** , en el marco del proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEPARTAMENTO DEL META" no se presentaron afectaciones al medio ambiente derivadas de los procesos constructivos, ni se materializaron incidentes ambientales relacionados con derrames o contingencias sobre la fuente hídrica.

Se dio cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana vigente, particularmente al Decreto 1076 de 2015, en lo referente a los lineamientos del Plan de adaptación a la guía Ambiental (PAGA), y a la Resolución 2184 de 2019, que establece el nuevo código de colores para la clasificación y disposición final de los residuos sólidos.

En línea con el compromiso institucional frente al cambio climático y en cumplimiento de la **Enmienda de 2015 de la Norma ISO 14001**, se continuó con la identificación y gestión de riesgos y oportunidades asociados a condiciones climáticas extremas, buscando fortalecer la resiliencia del proyecto frente a los efectos del cambio climático.

8. ANEXOS.

Anexo 1. Inspección Puntos ecológicos

Anexo 2. Inspección de kit de emergencias ambientales

Paula Andrea Pardo Redondo
Profesional Ambiental
Consorcio Carrera 5ta. EG

Anexo 1.
Inspección Puntos ecológicos

	CENTRO DE CONVIVENCIA	CÓDIGO:	SIG-FO-137
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:	1
	Inspección Acopios y puntos ecologicos	FECHA:	17/1/2025

CHA	13/8/2026 5985
OBRA	Centro de Convivencia san martín
LUGAR	san martin

Ítem	Criterio de Verificación	si	no	Descripción.
Ubicación	El punto ecológico está en el sitio designado, de fácil acceso y seguro.	x		n.a
	los acopios de residuos se encuentran en sitios adecuados y seguros?	x		n.a
Señalización	Colores y rótulos según código de colores de la Resolución 2184 de 2019 (verde, blanco, negro, etc.).	x		n.a
Estado físico	Recipientes en buen estado, sin roturas, con tapas y limpios.	x		n.a
	Recipiente con bolsa	X		n.a
Separación correcta	Residuos dispuestos de acuerdo con su categoría (aprovechables, no aprovechables, orgánicos, peligrosos).	x		n.a
Limpieza del área	Zona libre de residuos fuera de los contenedores, sin olores ni lixiviados.	x		n.a
Frecuencia de recolección	Retiro de residuos según plan establecido, evitando sobreacumulación.	x		se realiza semanal y de forma quincenal por parte del la empresa de aseo
Contención de lixiviados	El punto cuenta con bandejas o medidas para evitar derrames.		x	N.a
Protección contra plagas	se evidencian insectos, roedores u otros vectores.		x	N.a
Capacitación del personal	Usuarios conocen y aplican el código de colores y la correcta disposición.	x		N.a
Manejo de residuos peligrosos	En caso de existir, están almacenados y rotulados según normatividad.	x		N.a

Conclusiones y Recomendaciones:

Estado general de punto ecologicos : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Estado general de Acopios : x Bueno ☐ Regular ☐ Malo

Recomendaciones específicas:
Continuar con el buen uso de los acopios y de los puntos ecológicos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Inspeccionado Por:	Paula Andrea Pardo Redondo	Firma:	

Anexo 2.

Inspección de kit de emergencias ambientales

	CENTRO DE CONVIVENCIA	CÓDIGO: SIG-FO-67
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN KIT ANTIDERRAME AMBIENTAL	FECHA: 18/07/2022
	NTC 4532 De 2010 Sección 7	

5987

PROYECTO:	centro de convivencia san martin	**FECHA:**	13-ago-26
ICACIÓN DEL KIT:	Area de bodega	**INSPECTOR:**	Paula pardo

DATOS BÁSICOS

ENTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN/PROYECTO:	kit n1 area de bodega
A INSPECCIÓN:	13/8/2026

			KIT ANTIDERRAME / KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS															
COMPONENTES	**Unidad**	**Cantidad Mínima**	**B**	**M**	**F**	**B**	**M**	**F**	**B**	**M**	**F**	**B**	**M**	**F**	**B**	**M**	**F**
bicación (Protegido de condiciones ambientales)	N/A	1	x														
eñalización y visibilidad	N/A	1	x														
cceso (facilidad de uso - no candados; no stáculos en el área para acceso)	N/A	1	x														
tado de empaque (maletín o barril...)	N/A	1	X														
aletín / Contenedor (N.A. para Kit en Vehículos)	Und	1	X														
lsas Rojas	Und	1	x														
ño Absorbente tela Oleofilica (N.A. para Kit en hículos)	Und	10	x														
la plástica (debe ser pequeña para Kit en hículos)	Und	1	x														
rrera Absorbente Pequeña tipo Gusano (N.A. ra Kit en Vehículos)	Und	2	x														
nta de Señalización	mt	50	x														
quetas de residuos peligrosos	Und	1	x														
leta Pare - Siga (aplica solo para Kit en hículos)	Und	n.a															
erol Tyvek	Und	n.a															
fas de seguridad	Und	1	x														
antes de Nitrilo	Par	1	x														
scarilla protección vapores orgánicos	Und	1	x														
os	N/A	N/A															

iciones: B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante.
so de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

DE INSPECTOR: Paula Pardo

RVACIONES: Se realizo la instalacion del kit en el area visible de la boega

e la inspeccion se observa que el estado geneal del kit se encuentra optimo.

Anexo 3.
Capacitación Ambiental

DAV / PRISMA DAV INGENIERIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	SIG-CAL-FO-39
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN	2
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA	1/10/2025

S184

Fecha:	12/08/2026	Hora Inicio	7:30	Hora Final	8:00

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción [ ] Reinducción [ ] Reunión de SIG [ ] Capacitación [ ] Charla [x]
Socializacion [ ] Otro

TEMA

Control de sustancias peligrosas

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

Si estas sustancias no se controlan pueden tener graves consecuencias para la salud.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	WILLIAM REY ARIAS	17.354.820	consorcio centro de convivencia	AYUDANTE DE OBRA	William Rey
2	YIMMY ALEXANDER TORRES GRANADOS	1.120.559.014	consorcio centro de convivencia	AYUDANTE DE OBRA	Yimmy
3	ALEJANDRO FRISNEA ARIAS	1.006.697.793	consorcio centro de convivencia	AYUDANTE DE OBRA	
4	CRISTHIAN GALLO GUAPACHA	1.121.866.209	consorcio centro de convivencia	OFICIAL DE OBRA	Gallo
5	JAVIER ALEJANDRO MORA GONZALEZ	1.006.697.203	consorcio centro de convivencia	OFICIAL DE OBRA	
6	JUAN DAVID TORO GONZALEZ	1.120.498.840	consorcio centro de convivencia	AYUDANTE DE OBRA	Juan David
7	JAIRO ANDRES PALOMA GIRALDO	1.120.500.134	consorcio centro de convivencia	AYUDANTE DE OBRA	Jairo Paloma
8	YUBELY ANDREA RODRIGUEZ AMAYA	1.006.697.685	consorcio centro de convivencia	AYUDANTE DE OBRA	Yubely Rodriguez
9	ROBINSO ROBERTO GONZALEZ CASTILLO	1.006.698.240	consorcio centro de convivencia	AYUDANTE DE OBRA	Robinson Gonzalez
10	HUGO ALEXANDER QUINTERO ROJAS	17.357.694	consorcio centro de convivencia	AYUDANTE DE OBRA	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ Paola Pardo	PROFESIONAL SST profesional ambiental	María Fernanda R.
