

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**TRABAJOS TRAMO YEE -PT/**	**106 días?**	**vie 5/06/26**	**vie 30/10/26**	
2		**K3+880 - K4+240**	**83 días**	**vie 5/06/26**	**mar 29/09/2**	
3		Reconformación de subbase granular	6 días	vie 5/06/26	vie 12/06/26	
4		Suministro de acero de refuerzo	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	
5		Construcción de pavimento en concreto MR-42	9 días	lun 6/07/26	jue 16/07/26	8CC+15 días
6		Construcción de bermas-cunetas	6 días	mié 15/07/26	mié 22/07/26	7CC
7		Corte y sellado de junt	5 días	mié 15/07/2(	mar 21/07/2(	5CC+7 días
8		Construccion obras hidraulicas	6 días	lun 15/06/26	lun 22/06/26	4
9		Obras Complementarias y	4 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26	101
10		**K4+240 - K4-600**	**83 días**	**vie 5/06/26**	**mar 29/09/2**	
11		Reconformación de subbase granular	4 días	lun 15/06/26	jue 18/06/26	3
12		Suministro de acero de refuerzo	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	4CC
13		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	vie 10/07/26	mar 21/07/26	5CC+4 días
14		Construcción de bermas-cunetas	6 días	jue 23/07/26	jue 30/07/26	6
15		Corte y sellado de junt	5 días	mié 22/07/2(	mar 28/07/2(	7
16		Construccion obras hidraulicas	2 días	mar 23/06/26	mié 24/06/26	8
17		Obras Complementarias y	4 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26	9CC
18		**K4+600 - K4+960**	**83 días**	**vie 5/06/26**	**mar 29/09/2**	
19		Reconformación de subbase granular	5 días	vie 19/06/26	jue 25/06/26	11
20		Suministro de acero de refuerzo	4 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	12CC
21		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	vie 17/07/26	mar 28/07/26	5
22		Construcción de bermas-cunetas	6 días	vie 31/07/26	vie 7/08/26	14
23		Corte y sellado de junt	5 días	mié 29/07/2(	mar 4/08/26	15
24		Construccion obras hidraulicas	3 días	jue 25/06/26	lun 29/06/26	16

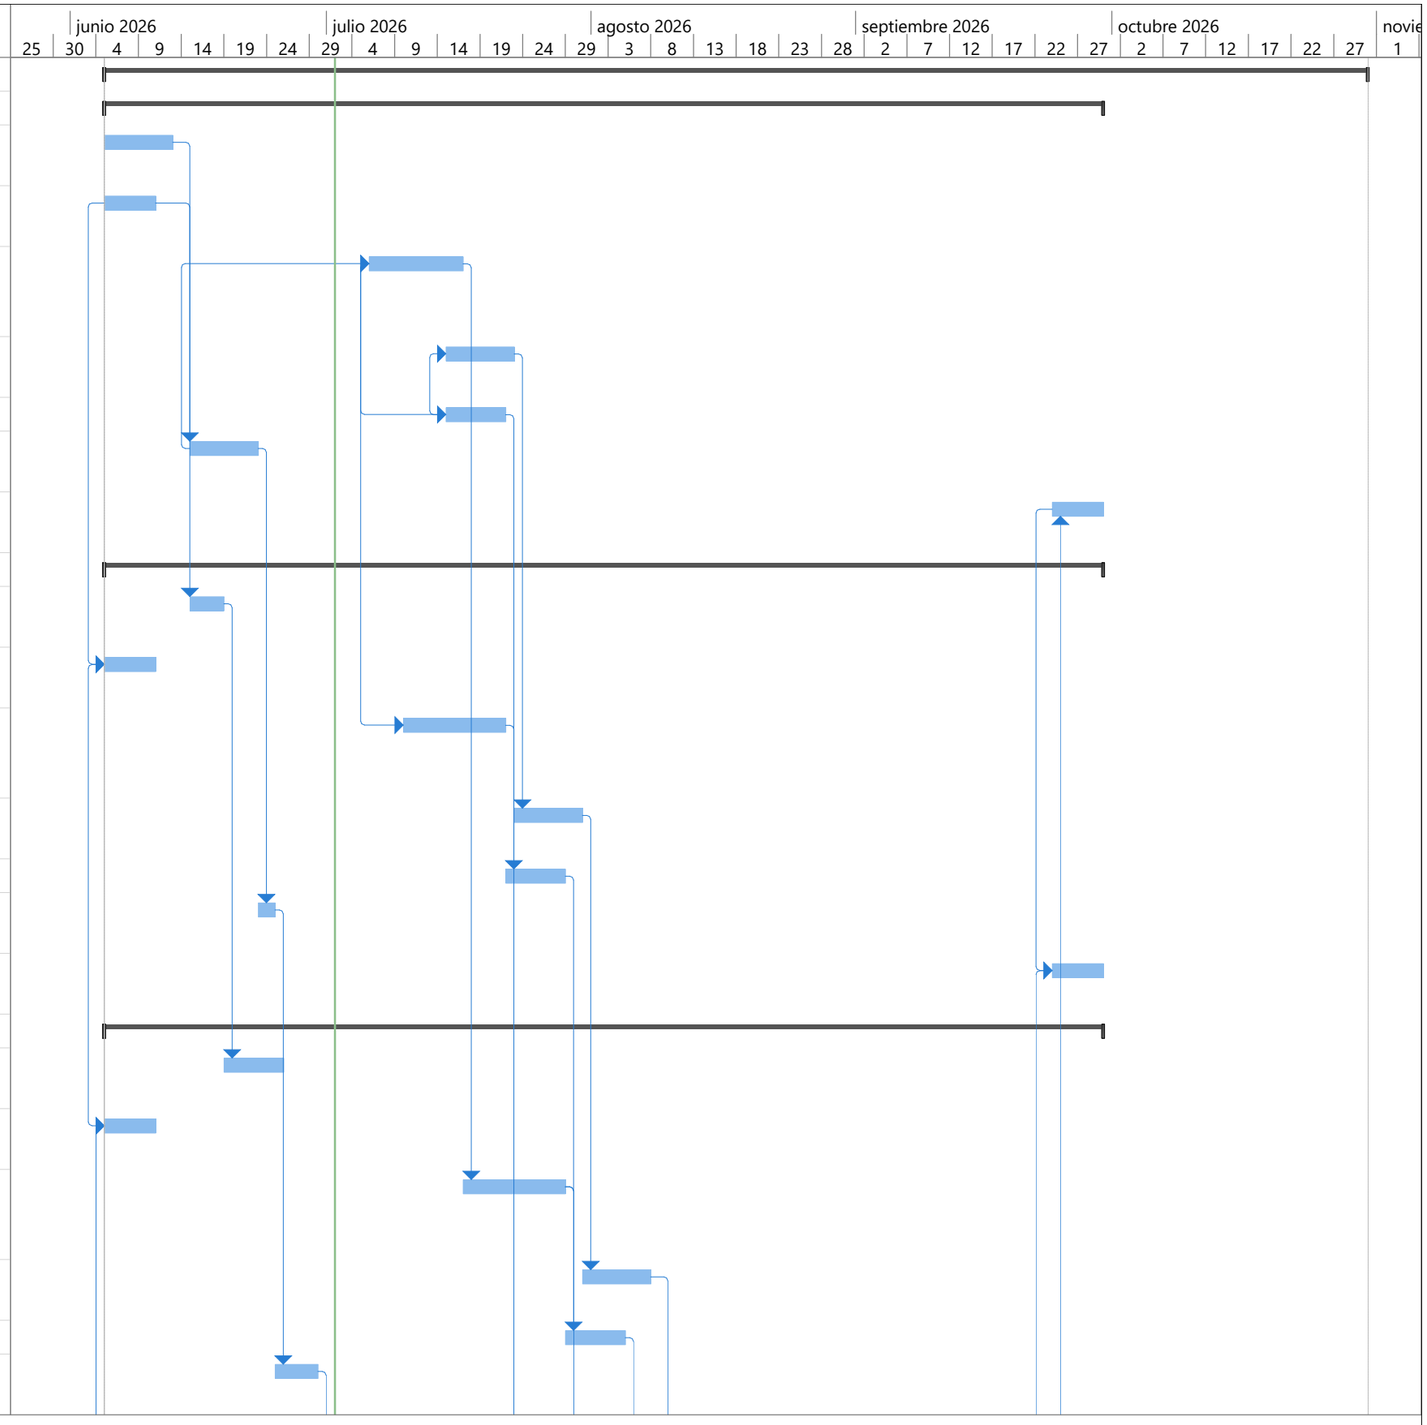

Proyecto: ReProgramacion_plan
Fecha: jue 2/07/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
25		Obras Complementarias y	4 días	jue 24/09/26	mar 29/09/26	17CC
26		**K4+960 - K5+320**	**83 días**	**jue 11/06/26**	**lun 5/10/26**	
27		Reconformación de subbase granular	6 días	mié 29/07/26	mié 5/08/26	21
28		Suministro de acero de refuerzo	4 días	jue 11/06/26	mar 16/06/26	20CC+4 días
29		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	mié 22/07/26	vie 31/07/26	13
30		Construcción de bermas-cunetas	5 días	lun 10/08/26	vie 14/08/26	22
31		Corte y sellado de junta	5 días	mié 5/08/26	mar 11/08/26	23
32		Construccion obras hidraulicas	4 días	mar 30/06/26	vie 3/07/26	24
33		Obras Complementarias y	4 días	mié 30/09/26	lun 5/10/26	25
34		**K5+320 - K5+680**	**83 días**	**jue 11/06/26**	**lun 5/10/26**	
35		Reconformación de subbase granular	5 días	jue 6/08/26	mié 12/08/26	27
36		Suministro de acero de refuerzo	4 días	jue 11/06/26	mar 16/06/26	28CC
37		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	mié 29/07/26	vie 7/08/26	21
38		Construcción de bermas-cunetas	6 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	30
39		Corte y sellado de junta	5 días	mié 12/08/26	mar 18/08/26	31
40		Construccion obras hidraulicas	1 día	lun 6/07/26	lun 6/07/26	32
41		Obras Complementarias y	4 días	mié 30/09/26	lun 5/10/26	33CC
42		**K5+680 - K6+040**	**87 días**	**jue 11/06/26**	**vie 9/10/26**	
43		Reconformación de subbase granular	5 días	jue 13/08/26	mié 19/08/26	35
44		Suministro de acero de refuerzo	4 días	jue 11/06/26	mar 16/06/26	36CC
45		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	lun 3/08/26	mié 12/08/26	29
46		Construcción de bermas-cunetas	6 días	mar 25/08/26	mar 1/09/26	38
47		Corte y sellado de junta	5 días	mié 19/08/26	mar 25/08/26	39
48		Construccion obras hidraulicas	11 días	mar 7/07/26	mar 21/07/26	40

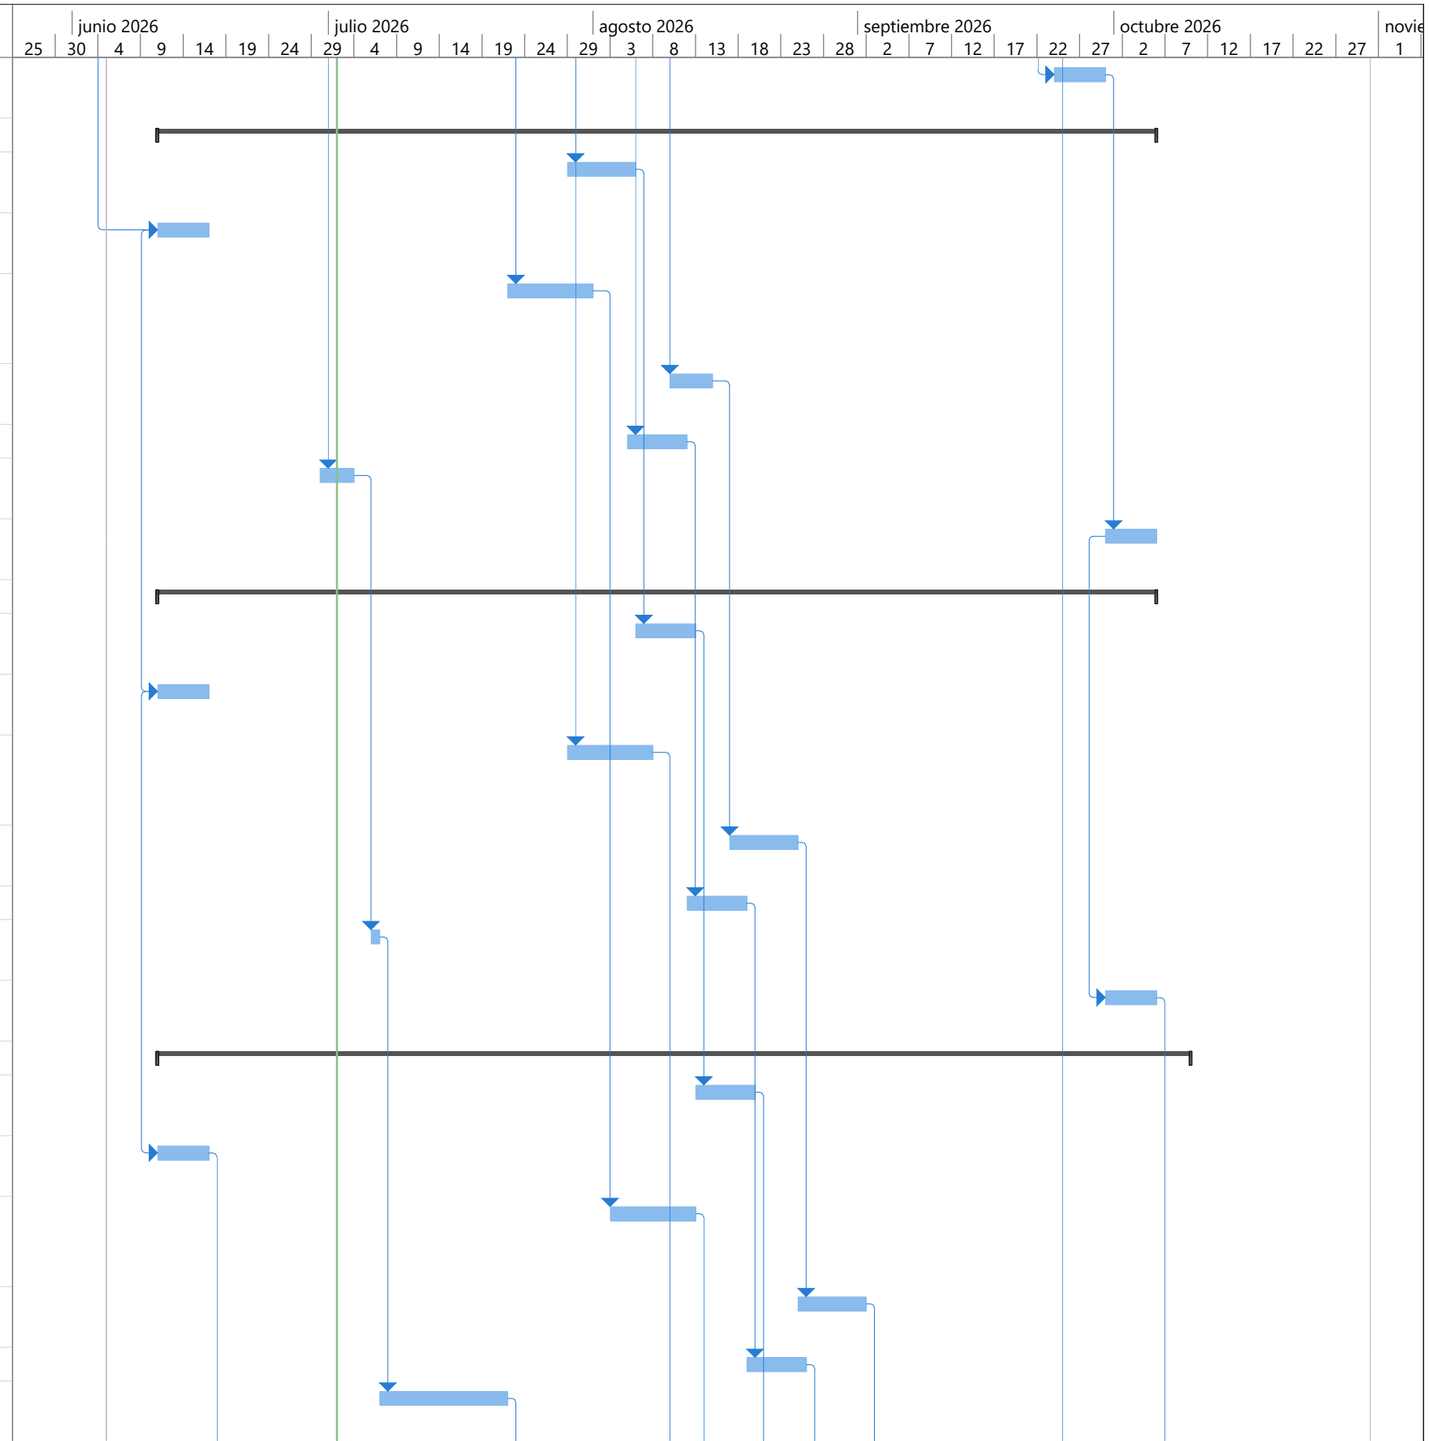

Proyecto: ReProgramacion_plan
Fecha: jue 2/07/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
49		Obras Complementarias y	4 días	mar 6/10/26	vie 9/10/26	41
50		**K6+040 - K6+640**	**87 días?**	**mié 17/06/2**	**jue 15/10/26**	
51		Reconformación de subbase granular	1 día?	jue 20/08/26	jue 20/08/26	43
52		Suministro de acero de refuerzo	4 días	mié 17/06/26	lun 22/06/26	44
53		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	lun 10/08/26	mié 19/08/26	37
54		Construcción de bermas-cunetas	6 días	mié 2/09/26	mié 9/09/26	46
55		Corte y sellado de junt	5 días	mié 26/08/2	mar 1/09/26	47
56		Construccion obras hidraulicas	5 días	mié 22/07/26	mar 28/07/26	48
57		Obras Complementarias y	4 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26	49
58		**K6+640 - K6+760**	**87 días**	**mié 17/06/2**	**jue 15/10/26**	
59		Reconformación de subbase granular	5 días	vie 21/08/26	jue 27/08/26	51
60		Suministro de acero de refuerzo	4 días	mié 17/06/26	lun 22/06/26	52CC
61		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	jue 13/08/26	lun 24/08/26	45
62		Construcción de bermas-cunetas	5 días	jue 10/09/26	mié 16/09/26	54
63		Corte y sellado de junt	5 días	mié 2/09/26	mar 8/09/26	55
64		Construccion obras hidraulicas	1 día	mié 29/07/26	mié 29/07/26	56
65		Obras Complementarias y	4 días	lun 12/10/26	jue 15/10/26	57CC
66		**K6+760 - K7+120**	**88 días**	**lun 22/06/26**	**mié 21/10/2**	
67		Reconformación de subbase granular	5 días	vie 28/08/26	jue 3/09/26	59
68		Suministro de acero de refuerzo	4 días	lun 22/06/26	jue 25/06/26	60CC+3 días
69		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	jue 20/08/26	lun 31/08/26	53
70		Construcción de bermas-cunetas	6 días	jue 17/09/26	jue 24/09/26	62
71		Corte y sellado de junt	5 días	mié 9/09/26	mar 15/09/2	63
72		Construccion obras hidraulicas	9 días	jue 30/07/26	mar 11/08/26	64

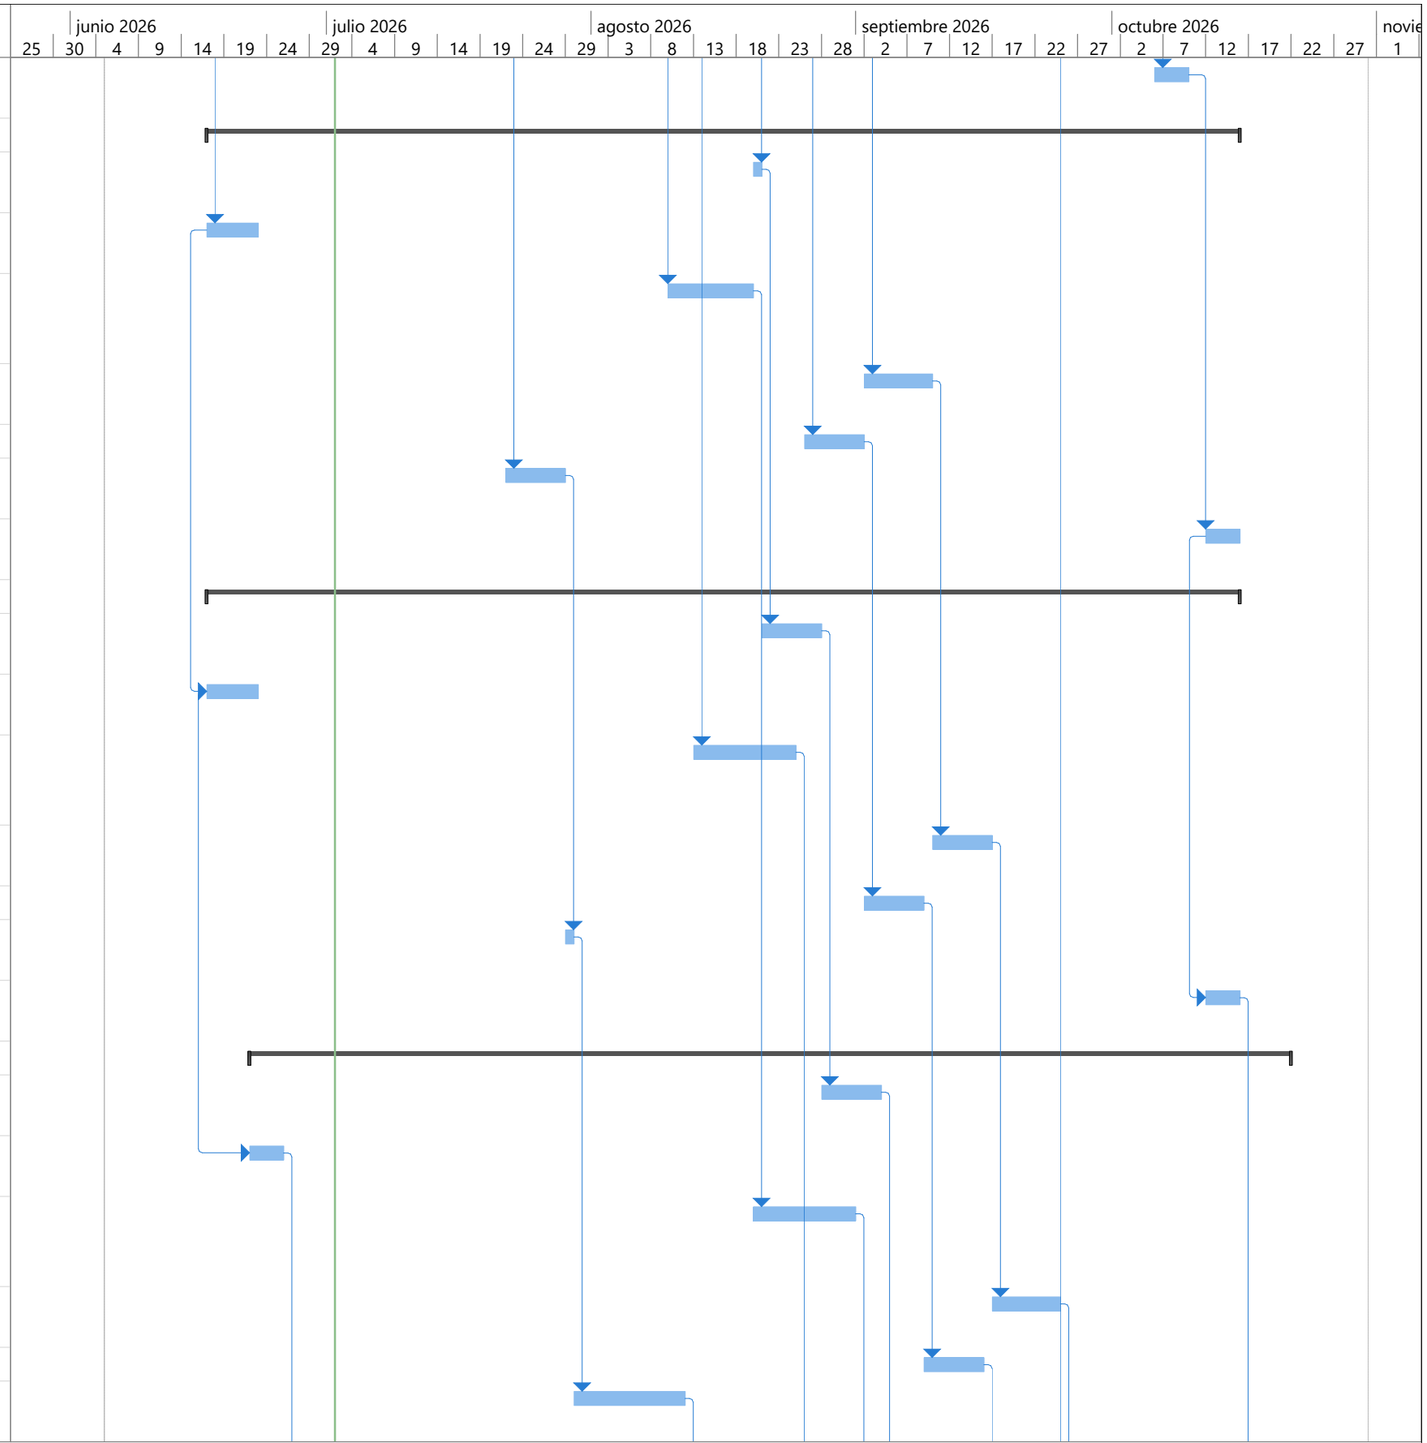

Proyecto: ReProgramacion_plan
Fecha: jue 2/07/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
73		Obras Complementarias y	4 días	vie 16/10/26	mié 21/10/26	65
74		**K7+120 - K7+480**	**88 días**	**vie 26/06/26**	**mar 27/10/2**	
75		Reconformación de subbase granular	5 días	vie 4/09/26	jue 10/09/26	67
76		Suministro de acero de refuerzo	4 días	vie 26/06/26	mié 1/07/26	68
77		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	mar 25/08/26	jue 3/09/26	61
78		Construcción de bermas-cunetas	6 días	vie 25/09/26	vie 2/10/26	70
79		Corte y sellado de junt	5 días	mié 16/09/26	mar 22/09/2	71
80		Construccion obras hidraulicas	6 días	mié 12/08/26	mié 19/08/26	72
81		Obras Complementarias y	4 días	jue 22/10/26	mar 27/10/26	73
82		**K7+480 - K7+840**	**84 días**	**jue 2/07/26**	**mar 27/10/2**	
83		Reconformación de subbase granular	5 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26	75
84		Suministro de acero de refuerzo	4 días	jue 2/07/26	mar 7/07/26	76
85		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	mar 1/09/26	jue 10/09/26	69
86		Construcción de bermas-cunetas	4 días	lun 5/10/26	jue 8/10/26	78
87		Corte y sellado de junt	5 días	mié 23/09/26	mar 29/09/2	79
88		Construccion obras hidraulicas	3 días	jue 20/08/26	lun 24/08/26	80
89		Obras Complementarias y	4 días	jue 22/10/26	mar 27/10/26	81CC
90		**K7+840 - K8+200**	**80 días**	**mié 8/07/26**	**mar 27/10/2**	
91		Reconformación de subbase granular	5 días	vie 18/09/26	jue 24/09/26	83
92		Suministro de acero de refuerzo	3 días	mié 8/07/26	vie 10/07/26	84
93		Construcción de pavimento en concreto MR-42	8 días	vie 4/09/26	mar 15/09/26	77
94		Construcción de bermas-cunetas	3 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26	86
95		Corte y sellado de junt	5 días	mié 30/09/26	mar 6/10/26	87
96		Construccion obras hidraulicas	3 días	mar 25/08/26	jue 27/08/26	88

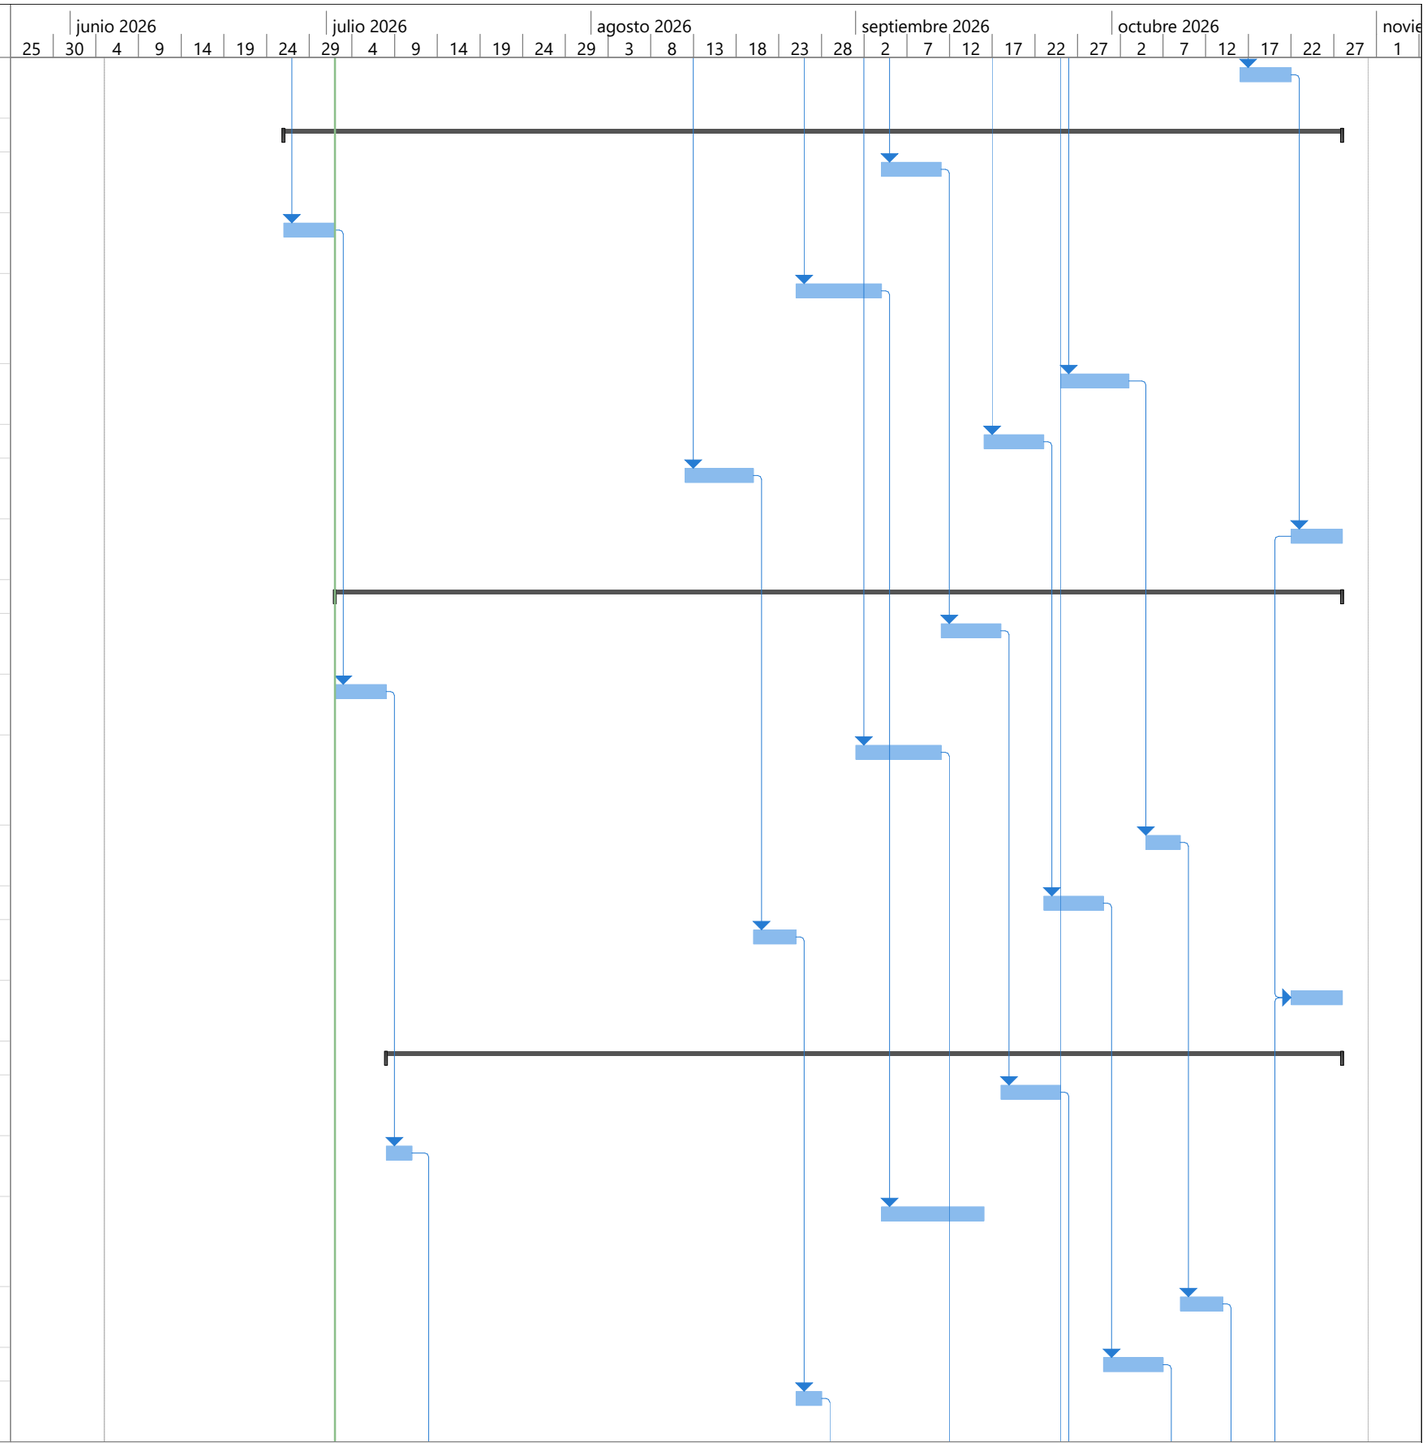

Proyecto: ReProgramacion_plan
Fecha: jue 2/07/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
97		Obras Complementarias y	4 días	jue 22/10/26	mar 27/10/26	89CC
98		**K8+200 - K8+421**	**80 días**	**lun 13/07/26**	**vie 30/10/26**	
99		Reconformación de subbase granular	5 días	vie 25/09/26	jue 1/10/26	91
100		Suministro de acero de refuerzo	4 días	lun 13/07/26	jue 16/07/26	92
101		Construcción de pavimento en concreto MR-42	9 días	vie 11/09/26	mié 23/09/26	85
102		Construcción de bermas-cunetas	2 días	mié 14/10/26	jue 15/10/26	94
103		Corte y sellado de junta	3 días	mié 7/10/26	vie 9/10/26	95
104		Construccion obras hidraulicas	3 días	vie 28/08/26	mar 1/09/26	96
105		Obras Complementarias y	3 días	mié 28/10/26	vie 30/10/26	97

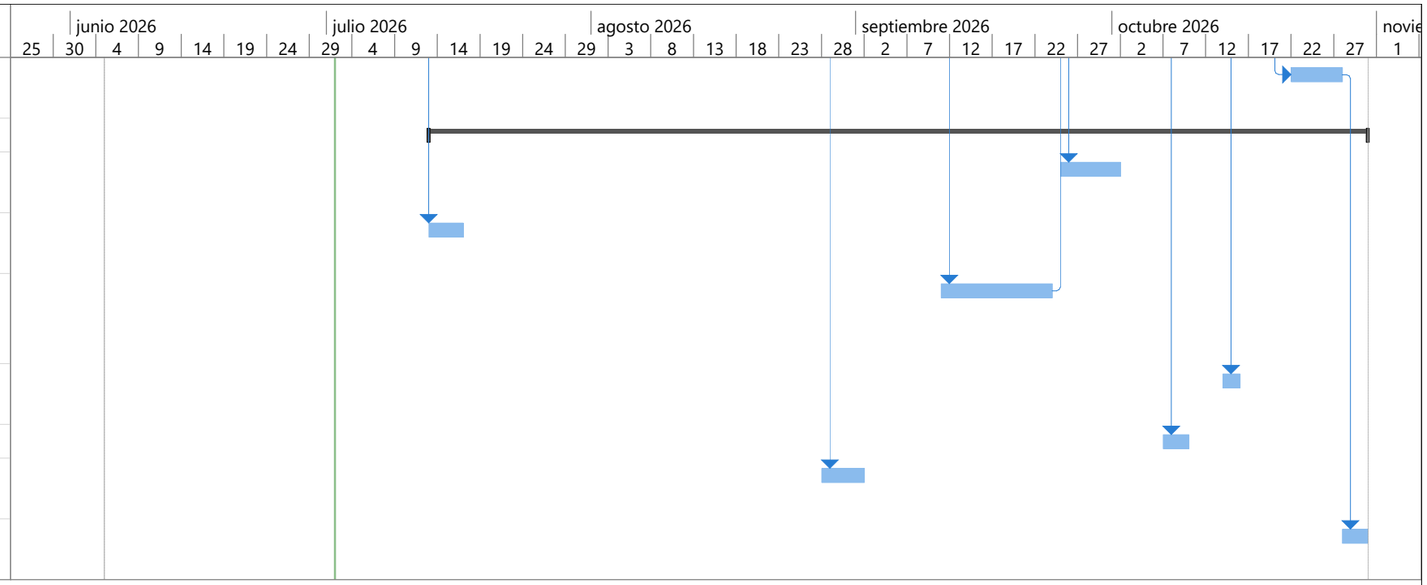

Proyecto: ReProgramacion_plan
Fecha: jue 2/07/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
