Fecha: 27-05-23
Clima: lluvia 7:00 am - 1:30 pm
Herramientas: Bichiroque, Palaspico, Barra, Plomada
P. Obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 maestro, 3 operadores
P. Administrativo: Coordinador CS, Directora CS, Residente Obra CS, Inspector Obra CS, SST CS, Social CS, Residente ETA, Inspector ETA, Topografo ETA, Topografo CS, Social ETA, SST ETA.

Inician Fuertes lluvias siendo las 7:00am Inicia Fundida de Zapata para muro de Contención costado norte cancha multiple, Inicia Fundida de Zapata para muro de Contención costado norte Zona de juegos, Continuan ensayos de estadio de suelo. Se realiza comite de Veedores en compañia de personal Social y tecnico del proyecto Cocaramayas. Continua armado de canasto en acero refuerzo para Caisson totem. Inicia excavacion para 4to anillo totem caisson #2. Se instala formaleta para Fundida de 3er anillo totem Caisson #1.

RESIDENTE C.C.S.

Fecha: 28-05-23
P. Obra: 12 Trabajadores
Herramientas: Barra, Bichiroque, martillo, Pico Pala plomada.
Se desmonta campamento de obra, teniendo en cuenta que esta Zona empezará a ser intervenida Se realiza desencofrado de Zapatas de muro de Contención costado norte cancha multiple y costado norte Zona de juegos. Se realiza Fundida de 3er anillo caisson totem #1

RESIDENTE C.C.S.

Fecha: 28-05-23
Clima: Soleado
Herramientas: Bichinque, barra, pico, pala, cantilla, vibrador, pulidora, martillo plomada, cinta metrica,
Obra: 8 oficiales, 9 ayudantes, 1 vigilante, 3 operarios
Maquinaria: Retroexcavadora Jcb 3xc, mincargador Jhon deere, Volqueta Cyz chevrolet

RESIDENTE C.C.S.

Fecha 29-05-23.

Se evidencia en visita de supervision 17 personas de personal mano de obra no calificada; se realizan actividades de armado de acero para viga de cerramiento perimetral. viga de graderias, encofrado de muros de contención, Se continua en excavación de Caisson para totems, tambien el armado de acero para caisson, la supervision recomienda continuar con los trabajos necesarios para mitigar el atraso. Se realiza desmonte de compamento.

Sebastian Arbelaez.
Ap. SOHT.

RESIDENTE C.C.S.

AP SOHT

Se instala formaleta para fundida de vastago correspondiente a muro de contencion costado norte zona de juegos, se instala formaletas para fundida de viga graderia costado norte Cancha multiple. Se realiza entibado en excavacion de tanque de almacenamiento teniendo en cuenta el desprendimiento de material por las fuertes lluvias.

RESIDENTE. C.C.S.

Powered by CamScanner

Fecha: 30-05-23
Clima: Soleado
Herramientas: Bichiroque, martillo, pala, pico, plomada, bama, cinta metrica
Maquinaria: Volqueta, minicargador, Jhon deere, Retrocargador. Jcb 3xc.
P. Obra: 9 ayudantes, 3 oficiales, 1 Maestro, 3 operadores, 1 vigilante
P. Administrativo: coordinador cs, Director cs, Residentes cs, Inspector cs, SST Residente cs, Social cs, Residente ETA, social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Aux Topografia ETA.

Inicia Excavación para graderia costado norte cancha multiple. Se instala Formaleta para muro contención Vástago costado norte cancha multiple. Se instala Formaletas para Fundida de vástago muro contención costado norte Zona de juegos. Excavación para 3er anillo caisson tolem #1, Excavación 4to anillo caisson tolem #2.

RESIDENTE CCS

Fecha: ~~30~~ 05-23
Clima: soleado
HERRAMIENTAS BICHIROQUE, MARTILLO, PALA, PICA, PLOMADA, CINTA METRICA, MAQUINARIA VOLQUETA, MINICARGADOR, JHON DEERE, RETROEXCAVADORA JCB, PERSONAL DE OBRA: 9 AYUDANTES, 8 OFICIALES, 1 MAESTRO 3 OPERADORES 1 VIGILANTE.
P ADMINISTRATIVO: COORDINADOR, DIRECTOR RESIDENTE, INSPECTOR, SST RESIDENTE SOCIAL, RESIDENTE ETA, SOCIAL ETA, SST ETA, INSPECTOR, AUX TOPOGRAFIA ETA

Powered by CamScanner

SE REALIZA LA FUNDIDA DEL MURO DE CONTENCION SOBRE EL COSTADO NORTE DE LA ZONA DE JUEGOS, SE REALIZA LA FUNDIDA DE LA VIGA INFERIOR DE AMARRE DE LAS GRADERIAS. SE REALIZA LA FUNDIDA DEL 4TO ANILLO DE TOTEM Y EXCAVACION DEL CAISSON 1. ANILLO 4, SE CONTINUA CON LA DEMOLICION PARCIAL DEL CAMPAMENTO.

Fecha: 1-06-23
clima: Nublado
Herramientas: Bichroque, martillo, pico, pala, carretilla, Hoja sierra, paladraga, bana, cinta metrica, plomada, Nivelador, manguera nivel
Maquinaria: Volqueta cyz chevrolet, Minicargador Shandeer, Retrocargador Jcb 3xe
P. Obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 Maestro, 8 operadores, 1 vigilante.
P. Administracion: coordinador cc, Director de Residente cc, Ing Hidraulico cc, Ing apoyo cc, Inspector cc, SST cc, Social cc, Ing Vias, Ing Luis Fernando Romero, Topografia cc, Directora ETA, Residente ETA, Coordinador ETA, Inspector ETA, Aux Topografia ETA, Social ETA, SST ETA, Ing Mario Alarcon SDHT, Ing Mauricio SDHT, Ing Wilson SDHT, Ing Fernando Bautista, Ing Juan Sebastian Archila

Se realiza desencofrado de vaciado muro contencion costado norte Cancha multiple Fundido ayer. Desencofrado muro contencion costado norte zona de juego Fundido el dia de ayer. Se realiza demarcacion

BITACORA – MIRADOR ALTAMIRA

02-05-2023.
Componente. SST.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Se realiza recorrido de obra, se verifica condiciones de ingreso y salida del personal de la excavación, se verifica el punto de hidratación del personal. se entrega documentos soportes para informe mensual. R.SST. Leidy Lopez.

OBSERVACIÓN INTERVENTORÍA
.De acuerdo al manual técnico en requisitos del personal del contratista la dedicación del profesional SST, debe ser 100%, esta interventoria le solicita al contratista de obra que se cumpla lo dicho en el anexo tecnico ya que se evidencia la hora de llegada tarde la profesional SST.

Jenker Pada
Res. SSTMA Interventoria

• esta interventoría le solicita al contratista hacer un plan de contigencia para mitigar los atrasos presentado en obra.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

se realizo excavacion, muro de contencion, nivelacion y perfilado de terreno, retiro de materal de excavacion muro de contencion. en obra se encuentra personal de Interventor el Residente, Personal contratista Residente, Insp Obra T social, SST personal operario: 3 oficiales 6 Ayudantes 1 Maquinista

Fecha: 3-05-2023
H Inicio: 7:00 am
H final: 3:00 pm
Tiempo: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora, Trompo
P contratista: Residente, Ins Obra, T social,
P Operario: 3 oficiales, 6 Ayudantes, 1 Maquinista
P Interventoria: Residente

Componente SST.
Se realiza recorrido de obra, se instala Cinta peligro en la zona de ingreso y Salida del personal de la excavacion, Se verifica Uso de EPP durante el Uso de maquinaria menor, Leidy Lopez R. SST,

En este dia se realizo actividades de relleno, nivelacion y compactacion de subbase granular, se continuo con con el retiro RCD de la excavacion muro de contencion.

RESIDENTE INTERVENTORÍA

Fecha: 4 - 05 - 2023
H Inicio: 7:00 am
H find: 5:00 pm
Tiempo: seco
Haquinaria Retroexcavadora, Trompo.
Contratista: Residente, sst, Ins obra, social
Operativo: 3 oficiales 6 Ayudantes 1 Haquinista
Interventoria: Residente. SST.

24-05-2023 COMPONENTE SSTMA-
-Se solicita al contratista de obra cumplir con los horarios laborales, ya que al inicio de la jornada laboral la residente SSTMA del contratista no llega y las actividades inician sin el responsable para la ejecucion de las actividades
-Se evidencia en obra retiro de RCD acopiados producto de la excavación realizada el día anterior; adicionalmente no se evidencian en obra los pre-operacionales ni las inspecciones al día.

Jenny Paola Orejuela Gonzalez
Residente SSTMA interventoria.

Componente SST.
Se realizan preoperacionales de equipos menores, se verifica personal en obra. y el uso de EPP, se realiza charla. Kit de emergencia, y uso de extintores. Leidy Lopez R.SST. Contratista.

-SE TOMAN MUESTRAS DE DENSIDAD, DONDE SE ANEXAN POR PARTE DE INTERVENTORIA, Y PROCEDIMOS A RELLENAR LAS PILAS SOBRE O CONCRETO DE LIMPIEZA, CONTINUAMOS CON RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, Y SE RETIRA EXCAVADORA DEL COSTADO DE LA VIA.
OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA: esta interventoria le solicita al contratista aumentar el rendimiento para poder cumplir con los tiempo de contrato

Residente interventoria

- 05-05-2023: * Topografia: Se realiza visita a la obra el dia 04-05-203 y se verifica los niveles de alistamiento de piso en lleno para el concreto de limpieza, con resultado Ok.
Hoy 05-05-2023 se verifica los niveles del concreto de limpieza fundido con resultado Ok
Se hace replanteo de la cara externa del muro entre el 0+000 al 0+020.03 para el alistado de hierro.
Se Colocó niveles para continuar con la excavacion faltante para el concreto de limpieza faltante.

Edward Pedroza
topografo ECA.

Elton Gallego
Topografo
Collesion Social

Jonathan M.
Residente de interventoria

En este dia se realizo el inicio de armado de hacer. (Zarpa), se continua con la excavacion del costado de la via, para proceder con la nivelacion y compactacion del terreno.

06-05/2023.
H. INICIO: 7:00 A.M.
H. FINAL: 4:30 P.M.
TIEMPO: SECO - SOLEADO
MAQUINARIA: RETRO EXCAVADORA - TRACTO - VOLQ. CONCRETO
P. CONTRATISTA: 3 OFICIALES 5 AYUDANTES - OPERARIO - RESIDENTE SST. - INSPECTOR - T. SOCIAL
P. INTERVENTORIA:
SE CONTINUA CON LA EXCAVACION EN COSTADO DE LA VIA. PARA UBICAR NIVELES, CONTINUA ARMADO DE ACEROS PARA ZARPA, EL DIA DE HOY SE PRESENTO DUCHAS DE TODO DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LA RESIDENTE, SOLICITANDO IMPOSE POR PARTE DEL ACUEDUCTO EN 3 HORAS TOTAL. SE PROCEDE A EJECUCION AGUA CON MOTOBOMBAS Y CONTINUA ACTUA

Jonathan M.
Residente interventoria

* 8 Mayo 2023

En visita de la supervisión se evidencia trabajos de armado de acero de refuerzo para la zarpa y muro de contención, igualmente nivelación manual para posterior mejoramiento de terreno igual de la zarpa.

Trabajando se encuentra 8 personas de mano de obra y un operario de maquinaria

La supervisión manifiesta su preocupación por el abaso que se presenta en obra por lo cual solicita tomar las medidas necesarias para mitigarlo mediante un plan de contingencia detallado.

Mario. APOYO SUPERVISION SDHT

Jonathan M. Residente interventoría

HORARIO: 7:00 AM.

H FINAL: 5:00 PM

TIEMPO: OPACO Y CON BARRO.

ACTIVIDADES: DESTAPONAMIENTO - TRAPEO - RONDA - CARGUE.

P. CONTRATISTA: RESIDENTE. SST. T. SOCIAL. INSPECTORA. 30 OFICIALES 5 AYUDANTES OPERARIO DESTAPONAMIENTO.

P. INTERVENTORIA: RESIDENTE, AUXILIAR TOPOGRAFIA.

FINALIZA EXCAVACION MECANICA MURO DE CONTENCION.
- SE CONTINUA RETIRANDO RCD DE OBRA, COMO TAMBIEN ALISTAMIENTO ACEROS ZARPA.

OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.

- La interventoría hace verificación de acero instalado en obra, y se hacen algunas observaciones donde el contratista subsana de inmediato.

Jonathan M. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

09-05/23.
Se observa la obra organizada, limpio y señalizada, los acopios estan protegidos y los puntos ecologicos al igual que el kit de derrames ubicados de manera estrategica, se implementan las medidas de acuerdo al MAO y a las actividades constructivas ejecutadas.

Res Ambiental

09-05-2023.
Se realiza Verificación de personal en obra, entrega de guantes, ajuste de FOAC03 informe A, recorrido de obra y registro fotografico. P.R.SST Leidy Lopez

SE CONTINUAN ADELANTANDO ACEROS, Y NIVELACION Y COMPACTACION DE LA 2da PARTE DE LA ZONA 10. Y POSEN FORMIN EL DIA DE MAÑANA 10 DE MAYO, SE RECIBE VISITA DEL DELEGADO PARA INSTALACION VS PROVISIONAL.

Residente interventoría

10-05/2023.
SE CONTINUA CON NIVELACION Y COMPACTACION RAMPAS ZONA, FORMALETAS A EXTENDIDA Y COMPACTADA SE DEJA ORDENADA PARA TOMA DE NIVELES DENSIDADES, SE POSPONE FUNDICION DE ZONA EN CONCRETO DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS ANTES LA MIXIA SE EXTENDIO Y SE VARIO POR EL CAMINO SE PROGRAMA PARA MAÑANA 9:00 AM.

Residente interventoría

11-05/2023.
H. INICIO: 7:00 AM
H. FINAL: 9:30 AM.
TIEMPO SECO - SOLEADO
P. CONTRATISTA - 3 OFICIALES - 6 AYUDANTES - RESIDENTE - SST. INSPECTORA.

COMPACTACION, PARA TOMA DE DENSIDADES, SE FUNDE PARTE DE LA ZAPATA TOMANDO ASENTAMIENTOS DEL CONCRETO DE 4000 PSI X 7 DIAS, COMO TAMBIEN ACCESO DEL MISMO CON LAS CAMIONES, SE PROCEDE A HACER LA INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL.

Jonathan R.
Residente interventoría

12-05-2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 4:30 PM
CLIMA: SECO SOLEADO.
2. CONTRATISTA. RESIDENTE, SST, T. SOCIAL. INSPECTOR DE OBRA.
3. OFICIALES. 5 AYUDANTES 1. ENCARGADO

12-05-2023: *Topografía: En la fecha se hace la verificación topográfica de niveles de la zarpa fundida y la excavación y lleno para la zarpa faltante del muro de contención, viendo los niveles acorde con lo estipulado en diseño, por tanto se avala la actividad con el fin de continuar con ésta y completar el muro.

Edward Pedroza
Topógrafo ETA
Interventoría

SE TERMINA DE COMPACTAR EL ULTIMO TRAMO DE LA ZAPATA, Y SE PROCEDEN A TOMAR ENSAYOS DE DENSIDAD, PRUEBAS QUE NO SON APROBADAS POR INTERVENTORIA, POR LO QUE SE PROCEDE A CONTINUAR COMPACTANDO Y SE REPROGRAMAN PRUEBAS PARA EL DIA SABADO 13,

Jonathan R.
residente interventoría

13-05-2023

(FECHA) HORA INICIO: 7:00 AM.

HORA TERMINACION: 1:00 P.M.

TIEMPO SECO -

SE CONTINUO CONCRETANDO PARA TOMA DE MUESTRAS HASTA LLEGAR AL 70% SOLICITADO Y ESPECIFICADO, SE TOMARON MUESTRAS Y CURILE YA, SE PROGRAMO TODO EL DIA LUNES 15 EMPIEZA SOLADO.

JONATHAN M.
Residente Interventoría

15 MAYO 2023.

En visita de supervisión se evidencia 10 trabajadores de mano no calificados. Se realizan trabajos de amarre de acero del muro de contención y alistamiento de zona para fundición de solado de limpieza. La supervisión manifiesta su preocupación debido al atraso que se presenta en obra por lo cual reitera la solicitud de tomar medidas necesarias para lograr mitigarlo.

Apoyo SST.

JONATHAN M. Residente Interventoría

Sebastian Arcila B.
APOYO S. SST.

15-05-2023.

H. INICIO: 7:00 AM.

H. FINAL: 5:00 PM

TIEMPO: LLUVIOSO

P. CONTRATISTA: RESIDENTE - SST - T. SOCIAL - INSPECTOR DE OBRA.

P. OBRA. 3 OFICIALES + AYUDANTES

En este dia se realizo la fundido del concreto de limpieza (solado) del segundo tramo de la zarpa del muro de contencion.

Se realizo recorrido inspeccion y acompañamiento de actividades realizadas en obra, charlas de seguridad [illegible]

Fecha: 16-05-2023
H Inicio: 7:00 AM
H final: 5:00 pm.
Tiempo: seco

En este dia se realiza armado de acero de muro de contencion, modulos 6 y 7, se continua con el armado de acero de la zarpa muro de contencion + segundo tramo.

* POR ESPECIFICACIONES DEL INGENIERO ESTRUCTURAS SE PIDEN REALIZAN LOS JUNTAS DE DILATACION FUNDIENTO EL MURO EN SU TOTALIDAD Y POSTERIORMENTE REALIZARLAS CON RELLENO Y DISCO DE CORTE,

Fecha. 17-05-2023
H Inicio: 7:00 AM
H final: 5:00 PM
Tiempo: H: seco

Jonathan xl.
Residente interventoría

19 mayo 2023

En Compañia de topografia de Interventoria se replanteo la cara Externa de la Curva y Parte Final del muro + Se Verifico los niveles del concreto de limpieza estando de acuerdo con las Cotas de diseño.

Elkin Gallego
Topografo

Edward Pedroza
Topógrafo ETA Interventoria

COMPONENTE SSTMA

-Por parte de la interventoria se realiza recorrido de obra junto con el contratista donde se evidencia que no hay acopios de RCD en la parte exterior del cerramiento, no se evidencia derrame de liquidos a la rondo del rio, Se evidencia en obra materiales granulares y RCD protegidos con

plastico, Se cuenta con punto ecologico para Deposicion en la Fuente los aceros se encuentran dentro del almacen aislados del suelo y cuenta con cubierta, el trompo se usa cuando hay Entrada de Concreto pobre y el lavado se realiza en terreno y los vertimento son derramados dentro de la obra, los acopios de Sacos de cemento se encuentran en un cerramento dentro de la obra y protegidos con tela y acero, los acopios que estan Cerca o Fuera del cerramento de obra son residuos Domesticos que generan los habitantes del Sector (muebles viejos, botellas, madera, Plasticos RCD viejo, chatarra, Lapiz) los materiales de RCD se estan llevando a Maquinas amarillas y a la Fecha se encuentran los soportes hasta el Informe 3. -Se evidencia Señalización en obra, se evidencia armado y uso de andamio multidireccional para armado de aceros, se evidencia personal con uso de dotación Sin embargo se solicita que el Señor Cesar Agredo y Carlos Mendez usen su dotacion Completa para dar cumplimiento al Manual de Indumentaria de la SOMT.

Jenyra Paola Quiroz
Residente SSTMA Interventoria

En este dia se continua con el armado de la zarpa del muro de contencion, se continuo con el armado del acero del muro de contencion en los modulos 5 y 4, se inicia armado de formaleta de los modulos 6 y 7.

18-05-2023 Se implementan todas las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA, se mantiene el frente de obra organizado limpio, señalizado, se toman las medidas de precaución a la quebrada adyacente, respetando el corredor vehicular y garantizando la no afectación del recurso hidrico.
Se presenta ruptura de agua (tubería) evacuando el recurso al pozo de alcantarillado, inmediatamente fallido, cabe aclarar que el agua entregada es agua potable // S.S.T.
Residente obra
Realizando la excavacion manual para la zarpa del muro de contencion se rompio el tubo de agua potable siendo las 9:00 am y se llamo al acueducto para mitigar la emergencia

19-05-23

Se Replantea Nuevamente el Inicio de muro de Contencion en la Cara Externa, ya que la Replanteada de esos mismos puntos Se perdieron a raiz de la Inundacion que tubo esepedazo por el tubo del Acueducto que Se Rampio.
Se deja al dia Actividades de Topografia.

Ether Gallego
Topografo

Se realizo inspeccion de areas de trabajo, acompañamiento en las actividades area de trabajo en area de trabajo desarrollo y demarcacion de area de trabajo area preparacion.

En este dia se realizo limpieza al acero de la zarpa y la excavacion donde se encuentra el solado, tambien se inicio con la demolicion de los sumideros que se encuentra en la parte lateral de la via, se continuo con el armado del acero de la zarpa.

Jonathan M.
residente de interventoria

20-05-2023

En este dia se realizo armado de acero en zarpa de muro de Contencion.

Componente SST se realiza recorrido en obra inspeccion de areas de trabajo diligenciamiento de Permisos de trabajo Capacitacion dirigida de orden y aseo

Jonathan M.
residente de interventoria

23 DE MAYO 2023

En visita de la supervisión se observan 10 trabajadores de mano de obra, quienes realizan trabajos de mitigación de posible caída de talud en costado norte. Es importante tomar todas las medidas previo y durante la ejecución para evitar cualquier tipo de afectación por lo cual en caso de caída el responsable será el contratista. Se solicita tomar las medidas necesarias de manera inmediata.

Se observa armado de acero para muro y armado e instalación de formaleta para primer modulo.

23-05/2023

H. INICIO: 7:00 AM.

H. FINAL.

OBSERVACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA

- Esta interventoría le solicita al contratista de obra tomar las medidas necesaria de la posible caída del talud del costado derecho norte, por lo cual en caso de cualquier eventualidad el único responsable es del contratista de obra.
- Se le sugiere al contratista desmanorar el acero instalado en obra y subsanar el inconveniente presentado, arreglar tubería sanitaria.

JONATHAN M.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

* PARA EL DIA DE HOY 23-05/23 NOS ENCONTRAMOS CON LA SITUACION OCS DEBIDO A LOS FUERTE LLUVIAS DEL DIA DE AYER Y TODA LA NOCHE, SE DERRUMBO EL TALUD DEL COSTADO NORTE, AFECTANDO TODA LA SUSMASION QUE SE HABIA EJECUTADO PARA PROTECCION LA TUBERIA DE 8" DE AGUAS NEGRAS, ESTE PERCANCE AFECTO LA PROGRAMACION PARA EL DIA DE HOY, POR LO QUE SE VA A FLUIR

LA ZANJA SEGUNDO FRENTE, DEBIDO A ESTO NOS TOCO DESENTUBAR LOS ACEROS DE LA ZANJA PARA PODER SACAR LA TUBERIA DE EMERGENCIA, TAMBIEN PORQUE LA TUBERIA DE 8", EN DOS PARTES DE LAS CUALES HOY QUE VOLVER A INSTALAR, NOS DISPONEMOS A RETIRAR TODO EL MATERIAL SUELTO PARA SEGUIR DE NUEVO EL TALUD, COMO TAMBIEN PROTEGER CON PLASTICO NEGRO PARA EVITAR MAS DESBARRANCOS, ESTA ACTIVIDAD NOS DEMORA UN TIEMPO TENIENDO EN CUENTA NUESTRA PROGRAMACION.

RESIDENTE C. SOCIAL

24-05-2023
Inicio: 7:00 am
Final: 5:00 pm.
TIEMPO: LLUVIOSO POR MOMENTO SOBRE TODO EN LAS TARDES Y NOCHE se realiza diligenciamiento de PREOPERACIONES Y PERMISOS que se requieren en obra, mantenimiento o señalización y demarcación de áreas de trabajo, charlas de seguridad diligenciamiento de conos por actividades faltantes de orden y aseo.

- SE CONTINUA CON EL RETIRO DEL DERRUMBE PRODUCIDO POR LA LLUVIAS UTILIZANDO RETRO EXCAVADORA, Y SE PROCEDE A REALIZAR CORTE Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO SOBRE EL SOCAVO PARA PROCEDER A ARMAR ACEROS DE LA ZANJA, SE INSTALAN SOLDANTES EN MADERA PARA INSTALAR TUBOS DE 8" HOUSFORM DEL CUAL SE INSTALARON QUEDANDO SUS SOPORTES SE REFORZARSE, SE CONTINUA ARMANDO FORMALETAS PARA FUNDIR MURO CONTENCION MODULOS 7 Y 6 RESPECTIVAMENTE. SE HACE RETIRO DE RCD DE LA OBRA AL DESECHADO BOTADERO.

Jonathan R.
Residente de interventoría

COMPONENTE SSTMA

- Se evidencian Acopios de material RCD sin demarcación y sin protección por la parte superior para evitar propagación de MP, Por lo que se solicita ajuste esta observación.
- Se Solicita al Contratista señalización de acopios de material granular y accesos de retiro
- Se evidencia en campo Señalización de obra y cerramiento en buenas condiciones hasta el sitio donde ya estuvo intervenido anteriormente
- Se evidencia afectación en zonas verdes por la comunidad que vive en la zona con muebles, tejas, Plastico, Ropa, chatarra el pero no son producto de la obra

Se atienden las observaciones de manera inmediata

Jeffa Orozco
Residente SSTMA Interventoría

SFL
Ambitel

25-05/2023
H. INICIO: 7:00 A.M.
H. FINAL: 5:00 P.M.
TIEMPO: NUBOSO POR MOMENTOS EN LA TARDE. Y NO LLUVIA.

- SE PROCEDE CON EL RETIRO DEL ACERO PARA SEGUNDA PUNTE, SE CONTRASTA CON LA TOPOGRAFIA PARA EVITAR ERRORES, SE CONTINUA CON INSTALACION DE FORMALETA MODULO 7 y 6, SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

26-05-2023 Se toman las acciones correctivas de manera inmediata de las observaciones dadas por la interventoría, abriendo los acopios de RCD, cabe mencionar que no se puede retirar porque tiene potencial de aprovechamiento Se implementan los medidas de manejo ambiental aplicables a la etapa constructiva, es así que la obra esta organizada, limpia y señalizada, en cuanto a la zona aferente a la quebrada chiguaza se informa que se respetan las zonas verdes y no se realiza

ninguna actividad inherente al cto // SFC Residente Ambiental CTA

26-05/2023.
H. INICIAL 7:00 AM
H. FINAL 5:00 PM.
TIEMPO: LLUVIOSO TODO EL DIA.

-SE CONTINUA ARMADO FORMALETA MURO CONTENCION EJES 6 y 7, TAMBIEN ARMADO DE ACEROS CASO PARA FUNDIR, MAÑANA SABADO, LAS FUERTES LLUVIAS HAN GENERADO FUGAS TEMPORALES por lo QUE RETRASA PROCESO DE CONSTRUCCION.

Jonathan M.
residente de interventoria

27-05/2023
H Inicio: 7:00 AM
H final: 5:00 PM
Tiempo: seco; lluvia suave.

En este dia se fundio el 2do tramo de la zorpa del muro de contencion.

Se realiza recorrido inspeccion y acompañamiento en areas de trabajo sin de puntos de trabajo obras a aseo en areas de trabajo. Quema SST

Como Plan de contingencia se programa el Personal para realizar actividades de aplicar mortero en el talud conformado para evitar futuros deslizamiento, tambien al finalizar la Jornada se cubre los taludes con plastico. con el fin de repelar las lluvias

Jonathan M.
residente interventoria

29 MAYO 2023.

En visita de la supervisión se observo que se realizo trabajos de instalación de formaleta metalica para fundición de muro de contención y armada de acero de refuerzo. Se tiene 10 trabajadores de mano de obra no calificada Se solicita retirar el acopio de material en la zona central de la obra costado occidental.

J. Sebastián Arbeláez
Ap. Supervisión.

Ap SISTIT

Fecha: 29/05/2023
H Inicio: 7:00 AM
H Final: 5:00 PM
Tiempo: Lluvia suave, seco

*OBSERVACION DE INTERVENTORÍA
✓ Se le sugiere al contratista de obra aumentar rendimiento en la actividad de encofrado de formaleta metálica ya que se evidencia bajo rendimiento, tambien se le sugiere Fundir el vaciado del muro de contención acelerado a 3 o 4 horas para mitigar atrasos en el contrato.

Residente de interventoría

29 Mayo de 2023. COMPONENTE SSTMA
-En obra se evidencia limpieza de sumidero aledaño a la obra
-Se solicita nuevamente retiro de acopio de material granular en sacos de lona lo cual el contratista atendio en horas de la tarde
-Se solicita especialmente realizar lavado de unidades sanitarias ya que no se evidencia que el vehiculo ingrese a la obra a realizar la actividad
-Se evidencia Señalizacion de area de trabajo, Cumpliendo señalizado y demarcado con Polisombra sin tener afectacion en las partes externas de los Cerramientos

-Se evidencia personal con la dotacion completa y en buenas condiciones
-No se evidencian apoyos de Acero fuera del almacen
-el material RCD se encuentra cubierto con plastico para mitigacion de MP.
-Se sigue evidenciando que los habitantes del sector siguen botando material como Plastico, muebles, Carton, chatarra en la zona sur del cerramiento pero no es producto de las actividades de obra

Jonatan Quintero
Residente SST/MA Interventoria

-SE RESTOPA TERRENO UBICADO EN PARTE OCCIDENTAL PERO SE EVIDENCIA QUE HUBO MUCHO TIERRO INFORMADO Y NO ES POR CAUSA DE NUESTRA OBRA, SE PROTEGE CON MALLA, SE CONTINUA CON ARMADO DE FORMALETA MURO CONTRA TAMBIEN EL ARMADO DE ACEROS HORIZONTALES,

Fecha: 30-05/2023
Inicio: 7:00 am.
final: 5:00 pm,
Tiempo: seco.

En este dia se realizo amarre de acero del muro de contencion en el modulo 5 y se continua con el armado de formaleta

Jonathan M.
residente de interventoria

31-05-/2023
H. INICIO: 7:00 A.M.
H. FINAL: 5:00 P.M.
DIA: SOLEADO.
SE CONTINUA ARMANDO ACEROS HORIZONTALES Y AL 1, SE TERMINA DE INSTALAR FORMALETA PARA FUNDIR MAÑANA EL DIA DE MAÑANA.

Jonathan M.
residente de interventoria

Fecha: 31 - 05 / 2023
H Inicio: 9:00 am
H final: 5:00 Pm
Tiempo: seco

* OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Esta interventoría ve con preocupación el rendimiento poco que se evidencia en obra en actividad de la fundida del modulo 7 y parte del modulo 6. ya que se tenia programado la colocación de la plantina de acero el día 30-05-2023 y no fue posible, esta actividad trae atrasos a la fundida del muro de contención. Se le sugiere al contratista mas celeridad a las programaciones de esta actividades.

Se le sugiere al contratista re evaluar el cambio de formaleta ya que se evidencia que la esta en sitio es demorada la instalación, esta interventoría recomienda utilizar una formaleta formaleta que es facil de instalar y tener un mayor de rendimiento en la fundida del muro de contención.

En este dia se continua con la actividad de amarre de acero en el muro de contencion modulo 7 y se continua con el armado de formaleta y se colocan.

ANEXO 01 – BITACORA DE OBRA
JUNIO 2023

BITACORA PARQUE BELLO HORIZONTE

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Nota 135 JUNIO 1 DE 2023 (JUEVES)
Personal de Interventoria Directora, 1 SST, 1 residente y tecnóloga de topografía; se requiere que el contratista de obra instale protección de individuos arboreos en el sector 3 y señalización y demarcación de áreas en la cra 1ra; adicionalmente para visita de secretaria de ambiente, que se realizará el día de mañana viernes 2 de junio a las 9 a.m. se requiere la asistencia de los especialistas ambiental y forestal de Consorcio Tingua 2023
Gabriela Mejia Vallejo Residente de Interventoría

PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023, 1 SST, 1 SOCIAL, 2 [illegible], 1 ING. TOPOGRAFICA, 1 [illegible], 1 INSPECTOR, 9 OPERATIVOS 1 OPERARIO DE RETRO, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 ING. AMBIENTAL), 1 RESIDENTE DE OBRA, SE CONTINUAN TRABAJOS DE GRADERIA Y CANCHA SE ATIENDE SOLICITUD DE INTERVENTORIA QUEDAN ARBOLES LISTOS
ANDRES PINZON CONTRERAS CONSORCIO TINGUA 2023.

Nota 135 Junio 2 de 2023 (Viernes)
Personal de Interventoria: 1 SST, 1 residente y 1 especialista ambiental se realiza visita por parte de secretaria de ambiente, se determina que (3) individuos arboreos cambian de traslado a tala y para ejecutar la tala se requiere que se presente nuevamente ante la SA, las fichas #1 y 2 con la actualización. la entidad determina si el consultor 863 de 2021 realiza esta actualización de fichas, o si lo puede realizar el contratista de obra.
Gabuela Mejia V. Residente de Interventoria

Nota 136 Se requiere que el contratista de obra calcule en autocad y determine el area m2 de los diseños de la consultoria 863 de 2021 de las zonas verdes; el contratista de obra debe garantizar que los porcentajes de diseño y los mts 2 que se diseñó

continue → 226

se conserve y se entregue en la misma proporción. se requiere que las áreas de zona verde existentes se remitan a esta interventoria para aprobación de cambio de localización en la cancha, en ejecución. Se recuerda al contratista determinar la profundidad necesaria para sembrar las especies menores y mayores con el especialista forestal del contratista de obra y dejar este espacio en cancha. Se recomienda al contratista de obra que revise el tema del filtro de los gaviones existentes. Determinando la necesidad de arreglar el filtro existente en cancha antes de acometer otras actividades tales como construcción de Pilotes para la malla contra impacto.

Gabriela Mejia V. Residente de Interventoria

SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA Y POR LA RAZÓN NOS PERMITIMOS LO SIGUIENTE:

1. SE ENTREGARÁ EL ÁREA SEGÚN DISEÑO INICIAL Y LA COMPARACIÓN CON LA PROPUESTA.
2. SE REVISARÁ EL TEMA DEL FILTRO DE LA CANCHA YA QUE SE DEBE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA MISMA.

PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST, 1 SOCIAL, 2 BIM, 1 INSPECTOR, 8 OPERATIVOS 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO, 1 ING. AMBIENTAL, 1 ING. FORESTAL, 1 DIRECTOR, 1 COORD. DE OBRA, 1 RESIDENTE, SE CONTINÚAN LABORES PARA LA GRADERÍA SECTOR 2 (ACEROS, PERFILADO DE TERRENO, SOLADO) SE TERMINA EL FILTRO DEL MURO DE LA CANCHA Y SE CONTINÚAN CON LOS LLENOS

Andrés Quintero.
Consorcio Tingua 2023.

NOTA 137 | JUNIO 3 DE 2023 (SABADO)
SE CONTINÚA CON LOS LLENOS EN LA CANCHA
SE CONTINÚA CON EL ARMADO DE LAS GRADERÍAS PARA PODER REALIZAR UNA SOLA FUNDIDA.
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST, 1 SOCIAL, 2 BOA), OPERATIVOS, 1 INSPECTOR
1 DIRECTOR, 1 CADENERO,
~~SUPERV.~~ | AIRO QUINTERO
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 138 | JUNIO 5 DE 2023 (LUNES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST, 1 SOCIAL, 2 BOA), 1 INSPECTOR DE OBRA
7 OPERATIVOS, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO,
1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, SE PRESENTÓ LLUVIA DESDE LAS 6:00 am HASTA LAS 9:30 am Y LUEGO EN LA TARDE DE 1:00 A 4:00 PM LLOVIZNA. SE CONTINUÓ CON EL AMARRE DE ACERO DE LAS GRADERÍAS, SE ENCONTRÓ UNA ROCA MEDIANA EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA GRADERÍA, SE DEMOLIÓ PARA DAR PASO A LA MISMA GRADERÍA, SE CONTINÚA LLENOS EN LA CANCHA.
~~ANG~~. | AIRO QUINTERO
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 139 | JUNIO 6 DE 2023 (MARTES)
Personal de Interventoría: 1 residente, 1 SST y técnologa en topografía. Se requiere que el contratista de obra realice actualización de las fichas 1 y ficha 2 del inventario de individuos arbóreos, según las directrices que el ingeniero de la secretaria de ambiente entregó al especialista ambiental del contratista el día jueves 01 de junio del presente año; y se entregué bajo el mismo radicado anterior o el mismo proceso

a secretaria de ambiente, para no generar un nuevo proceso porque esto podría demorar mucho más tiempo. Se recuerda hacer llegar el radicado de las fichas actualizadas en SA a la interventoria para dar trazabilidad.

Gabriela Mejia Vallejo Residente de Interventoria.

Obs 140. Ante la aparición de una roca de 3mt x 3 mt. aproximadamente en el sector 3, area de Caisson, se requiere evaluar utilizar la misma como estructura para el muro de escalada a acometer en este sector.

Gabriela Mejia V. Residente de Interventoria

Obs 141. De manera cordial se solicita al contratista de obra presentar la propuesta económica de la reparación del tubo hidraulico del sector 2, se requiere acometer el reemplazo de esta tubería para continuar con las actividades de obra a acometer, tales como construcción de escaleras costado oriental; el atraso en la reparación de esta tubería podría generar atraso general de la obra, que serán atribuibles al contratista de obra. El contratista de obra sabe manifestado que del reemplazo de tubería, desde el día 22 de abril, según notas 88 y 89 de la bitacora; si esta actividad no puede incluirse como un imprevisto de obra, se requiere que evalue presentar el APU analisis de precios unitarios de la actividad tubería hidraulica 4" + accesorios, para el respectuo analisis de la interventoría y de la entidad.

Gabriela Mejia V. Residente de Interventoria

Obs 142 En el sector 1, área de cancha, se evidenció la necesidad de realizar un relleno y un solado sobre una parte de la zarpa del muro de contención, para permitir que la pendiente del

andén de la calle 30 C sur, esto para evacuar el agua lluvia del muro y andén por escorrentia hacia la vía; por lo tanto se requiere que la comisión topografica del contratista de obra en compañia con la topografia de la interventoria, determinen la altura de relleno en al menos 4 puntos del muro de contención tipo DET-CT-001 de la cancha.

Gabriela Mejia V. Residente de Interventoria

PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST, 1 social, 2 BOAL, 1 INGA. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO
1 INSPECTOR, 7 OPERATIVOS, 1 OPERADOR DE RETRO,
1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE GRADERÍA EN EL SECTOR 2, RELLENOS EN LA CANCHA Y EXCAVACIONES DEL SECTOR 3

DE ACUERDO A LAS NOTAS DE LA INTERVENTORIA NOS PERMITIMOS LO SIGUIENTE:

- NOTA 139 SE INFORMARÁ A LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y ESPECIALISTA DEL CONSORCIO PARA ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD.
- NOTA 140: LA ROCA EN MENCIÓN ES DE UNAS DIMENSIONES TAN GRANDES QUE NO PERMITE LA EJECUCIÓN DEL MURO DE ESCALAR NI DEL MURO DE CONTENCION POR TAL RAZON SUGERIMOS EXCAVAR Y QUE DICHA ROCA REPOSE EN ÉSA EXCAVACION DE TAL MANERA QUE PERMITA EJECUTAR EL DISEÑO PROPUESTO POR EL CONSULTOR PARA EL SECTOR 3
- NOTA 141: CABE ACLARAR QUE AUNQUE LAS NOTAS 88 Y 89 EXISTEN EN LA BITÁCORA LE INVITO A QUE TENGA EN CUENTA LA NOTA 123 DEL 17 DE MAYO YA QUE SE DEBÍA ESPERAR LA VISITA DEL DELEGADO DE LA EAAB QUIEN EVALUARÍA LA OBRA HIDRÁULICA

RECOMENDANDO QUE HABÍA PARA EJECUTAR, COMO Y ADICIONALMENTE LAS CANTIDADES DE INSUMOS, MATERIALES Y DEMÁS, PARA QUE EL CONTRATISTA DE LA EAAB PUDIERA COTIZAR. ENTONCES TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR LA FECHA QUE USTED COMO INTERVENTORÍA SEÑALA DEL 22 DE ABRIL, QUE CUANDO SE EMPEZÓ EL PROCESO Y EL TIEMPO QUE SE HA TARDADO NO PUEDE IMPUTARSE AL CONSORCIO TINGUA, POR QUE 1°) ES UNA ACTIVIDAD NO PREVISTA, ES DECIR NO ESTÁ CONTEMPLADA EN EL TIEMPO CONTRACTUAL, 2°) LAS CANTIDADES Y ACTIVIDADES LAS DEFINE LA EAAB NO PUEDE HACERLO NADIE MÁS PORQUE ES LA ENTIDAD QUE VA A RECIBIR. NOTA 142 SE ATIENDE LA SOLICITUD COORDINANDO ENTRE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA PARA ACOMETER DICHA SOLICITUD

Arq. Isidro Quintero
Consorcio Tingua 2023

143 JUNIO 7 DE 2023 (MIÉRCOLES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST, 1 SOCIAL, 2 BOM, 1 ING. TOPOGRÁFICO
1 CADENERO, 1 INSPECTOR, 6 OPERATIVOS, 1 OPERADOR
DE RETRO, 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE.
SE CONTINÚA CON GRADERÍA SECTOR 2
SE CONTINÚA LLENADO EN LA CANCHA,
SE CONTINÚA EXCAVACIÓN SECTOR 3, SE
DEJA TALUD EN LA ZONA DEL MOJADERO, SE
DEJA LA TERRAZA ENTRE MOJADERO Y MURO
DE ESCALAR, SE HACE RETIRO DE ECO.
SE ENTRE LA COTIZACIÓN DE LA OBRA HIDRÁULICA
EN EL SECTOR 2, A CONSIDERACIÓN DE LA

INTERVENTORÍA, SE VERIFICAN NIVELES DE LOS MUROS DET-CT-002 DEL SECTOR 3
Ing. AINO QUINTERO.
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 144 JUNIO 8 DE 2023 (JUEVES)
1SST, 1SOCIAL, 2BOAL, 1 INSPECTOR, 6 OPERATIVOS 1 OPERADOR DE RETRO, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO, 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTES, SE CONTINUA CON GRADERÍA EN EL SECTOR 2, SE CONTINUÁ CON LLENOS EN LA CANCHA, SE CONTINUA EXCAVACIONES PARA NIVEL DE RASANTE DE LOS DOS MUROS DET-CT-002 DEL SECTOR 3, SE HACE RETIRO DE RCD

Nota 145 Se requiere que el contratista de obra presente otra cotización de la reparación y cambio de tubería hidraulica en 4" del sector 2 para evaluación de interventoria y para agregar en reembolsables.

Gabriela Mejia V. Residente de Interventoria

NOTA 146 JUNIO 9. DE 2023 (VIERNES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1SST, 1SOCIAL, 1 ING. AMBIENTAL, 1 INSPECTOR DE OBRA 5 OPERATIVOS, 1 OPERADOR DE RETRO, 1 DIRECTOR 1 RESIDENTE, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO, 2 BOAL. SE CONTINÚA CON LLENOS EN LA CANCHA, SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MECÁNICA EN EL SECTOR 3 PARA LOS MUROS DE CONTENCION DET-CT-002, SE TERMINA ENCOFRADO DE GRADERÍA PARA FUNDIR EL SÁBADO 10 DE JUNIO A LAS 9:00 AM
AINO QUINTERO
CONSORCIO TINGUA 2023

147 10 DE JUNIO DE 2023 (SÁBADO)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SOCIAL, 1 SST, 2 BOM, 1 INSPECTOR, 6 OPERATIVOS,
1 OPERADOR DE RETRO, 1 ING. TOPOGRÁFICA,
1 CADENERO, 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE.
SE FUNDE LA GRADERIA SUPERIOR SECTOR 2
CUBRIENDO FINALMENTE LA PARTE HORIZONTAL DE LA
2 graderia, SE CONTINUA EXCAVACIÓN MECÁNICA
EL SECTOR 3, Y SE FUNDE BORDILLO SECTOR 2
ANEXO FOTO 1
CONSORCIO TINGUA 2023

148 13 DE JUNIO DE 2023 (MARTES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023, 1 SOCIAL
1 SST, 2 BOM, 1 INSPECTOR, 6 OPERATIVOS, 1 OPERADOR
DE RETRO, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO, 1 DIRECTOR
1 RESIDENTE. SE ENVÍA COTIZACIONES REPARACIÓN Y
CAMBIO TUBO HIDRÁULICO ACUEDUCTO SECTOR 2.
SE TERMINA LA GRADERÍA Y BORDILLO DEL
SECTOR 2, SE INICIA CONFORMACIÓN DE TERRENO
EN LA ZONA INTERMEDIA DEL SECTOR 2, SE INICIA
FUNDIDA DE MUROS SECTOR 3, SE INICIA EXCAVACIÓN
SECTOR 2 (ZONA ANDÉN).
ANEXO FOTO 2
CONSORCIO TINGUA 2023

149 14 DE JUNIO DE 2023 (MIÉRCOLES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023, 1 SOCIAL
1 SST, 2 BOM, 1 INSPECTOR, 6 OPERATIVOS, 1 OPERADOR
DE RETRO, 1 DIRECTOR, 1 ING. TOPOGRÁFICA,
1 CADENERO, 1 RESIDENTE. SE TERMINA DE
FUNDIR SOLADO DE MUROS DET-CT-002
SUPERIOR E INFERIOR, EN EL MURO ANCLADO
TODO DEL SECTOR 3, SE CONFORMA TERRENO
ENTRE BORDILLO Y MURO DET-CT-001 BUP (SECTOR) 2.
SE CONFORMA TERRENO ENTRE LOS DOS MUROS
DET-CT-001 SECTOR 2 COSTADO ORIENTAL,
SE DEMUELE ANDÉN SECTOR 2 CALLE 206 SUR

CONTINUA

SE INICIA EXCAVACIÓN EN EL SECTOR 2 PARA GRADERÍA INFERIOR Y BADEN, SE INICIA EXCAVACIÓN PARA FILTRO EN LA CANCHA
SE HACE VERTIDO DE RCD
ARQ. LAURA QUINTERO H
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 150 JUNIO 13 DE 2023 (JUEVES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST, 1 SOCIAL, 2 BOM, 1 INSPECTOR, 6 OPERATIVOS, 1 OPERADOR DE RETRO, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO, 1 DIRECTOR, 1 COORD. ADMINISTRATIVA 1 ING. AMBIENTAL, 1 RESIDENTE
SE INICIA TALUD MANUAL SECTOR 2 ENTRE BORDILLO SUPERIOR Y GRADERÍA, SE INICIA AMARRE DE ACERO MURO DET-CT-002 SECTOR 3. INTERIOR, SE CONTINÚA CON EXCAVACIÓN PARA FILTRO EN LA CANCHA.
EL DIA 14 DE JUNIO SE REALIZÓ REUNIÓN DE ESPECIALISTAS ELÉCTRICO DE INTERVENTORÍA Y CONSORCIO TINGUA 2023 PARA ORGANIZAR Y DEFINIR ALCANCES, Y ACTIVIDADES
ARQ. LAURA QUINTERO H.
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 151 JUNIO 16 DE 2023 (VIERNES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST - 1 SOCIAL, 2 BOM, 1 INSPECTOR, 6 OPERATIVOS 1 OPERADOR DE RETRO, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO, 1 DIRECTOR, 1 COOR. ADMINISTRATIVO 1 RESIDENTE.
SE CONTINÚA CON PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE TALUDES EN EL SECTOR 2, SE CONTINÚA CON AMARRE DE ACEROS MURO DET-CT-002 SECTOR 3 (INTERIOR) SE CONTINÚA Y TERMINA EXCAVACIÓN FILTRO PERIMETRAL A GAVIONES EN LA CANCHA
ARQ. LAURA QUINTERO
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 152 | JUNIO 19 DE 2023 (SÁBADO)
PERSONAL CONSORCIO TINGUA 2023 | SST, | SOCIAL, | RESIDENTE. SE CONTINÚA FILMO EN LOS GAVIONES SE CONTINÚA AMARRE DE ACEROS MURO DET-CT-002 | INFERIOR DEL SECTOR 3, SE CONTINÚA CON RETIRO DE MATERIAL DE LA CRA 1 (VÍA CERRADA) SE PRESENTA | LLUVIA DESDE LAS 6:30 AM. HASTA 9:00 AM. Y | LLUVIA DE 9:30 A 11:30 AM.

Arq. | ANGEL QUINTERO H.
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 153 | JUNIO 20 DE 2023 (MARTES)
PERSONAL CONSORCIO TINGUA 2023 | SST, | SOCIAL, 2 BOAL, | INSPECTOR DE OBRA, 5 OPERATIVOS | DIRECTOR DE OBRA, | ING. COORDINADORA, | RESIDENTE SE CONTINÚA CON ARMADO DE ACEROS MURO DET-CT-002 INFERIOR SECTOR 3, SE CONTINÚA CON FILMO PERIMETRAL A LOS GAVIONES DE LA CANCHA (SECTOR 1)

Arq. | ANGEL QUINTERO H.
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 154 | JUNIO 21 DE 2023 (MIÉRCOLES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023, | SST, | SOCIAL, 2 BOAL, | INSPECTOR DE OBRA, 7 OPERATIVOS | ING. TOPOGRÁFICA, | CADENERO, | DIRECTOR DE OBRA, | RESIDENTE DE OBRA, SE CONTINUA ARMADO DE ACEROS MURO DET-CT-002 INFERIOR SECTOR 3, SE INICIA ARMADO DE ACEROS MURO DET-CT-002 SUPERIOR, SE TRASLADA B-600 AL SECTOR 2 (GIMNASIO BIOSALUDABLE)

Arq. | ANGEL QUINTERO H.
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 155 | JUNIO 22 DE 2023 (JUEVES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
| SST, | SOCIAL, 2 BOAL, | ING TOPOGRÁFICO
| CADENERO, | INSPECTOR, 7 OPERATIVOS
| ING. AMBIENTAL, | COORD DE PROYECTO,
| DIRECTOR DE OBRA, | RESIDENTE
- SE CONTINUÓ CON ARMADO DE ACEROS MURO DET-CT-002 INTERIOR SECTOR 3
- SE CONTINUÓ CON ARMADO DE ACEROS MURO DET-CT-002 INTERIOR SECTOR 3
- SE INICIA COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL ZONA GIMNASIO BIOSALUDABLE SECTOR 2 PARA EXTENDER B-600
- SE TERMINA DE DESENCOFRAR LA GRADERIA SUPERIOR
- SE CONTINUÓ CON TALUDES MANUALES SECTOR 2

NOTA 156 | JUNIO 23 DE 2023 (VIERNES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023,
| SST, | SOCIAL, 2 BOAL, | INSPECTOR DE OBRA,
7 OPERATIVOS, | ING. TOPOGRÁFICO, | CADENERO,
| DIRECTOR DE OBRA, | RESIDENTE
SE CONTINUÓ ARMADO DE ACEROS DE LOS DOS MURO DET-CT-002 DEL SECTOR 3
SE CONTINUÓ PERFILADO MANUAL DE TALUDES SECTOR 2
SE CONTINUÓ CON COMPACTACION DEL RELLENO AFIRMADO EN LA CANCHA
PREP | NIVO QUINTERO 3 CONSORCIO TINGUA 2023

SE PRESENTÓ LLUVIA DESDE LAS 6:00 A M HASTA LAS 10:00 AM

NOTA 157. JUNIO 24 DE 2023 (SABADO)
| SST, | SOCIAL, 2 BOAL, | INSPECTOR, 7 OPERATIVOS,
1 | ING. TOPOGRÁFICO, | CADENERO, | DIRECTOR DE OBRA,
| ING. AMBIENTAL, | RESIDENTE DE OBRA.
SE CONTINUÓ CON ARMADO DE ACERO EN EL SECTOR 3 PREP. | NIVO QUINTERO CONSORCIO TINGUA 2023.

NOTA 158 | UNIO 26 DE 2023 (LUNES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023, 1 SST, 1 SOCIAL, 2 BOAL, 1 INSPECTOR, 7 OPERATIVO), 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 CADENERO.
1. SE INICIA NUEVAMENTE EXCAVACIÓN DE CAISSON INICIANDO POR EL Nº 1.
2. SE CONTINUÓ ARMADO DE ACERO MUROS DET-CT-002 SECTOR 3.
3. SE CONTINUÓ EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN NIVEL DE RELLENO AFIRMADO EN EL SECTOR 1 LA CANCHA PARA POSTERIORMENTE COLOCAR EL GEOTEXTIL.
ANGEL MARIO QUINTERO
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 159 | UNIO 27 DE 2023 (MARTES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST, 1 SOCIAL, 2 BOAL, 1 INSPECTOR, 8 OPERATIVO
1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA
SE CONTINUÓ CON EXCAVACIÓN DE LOS CAISSON
SE CONTINUÓ ARMADO DE FORMALETA PARA FUNDIR LA ZAMPA DE LOS DOS MUROS DET-CT-002 DEL SECTOR 3, SE CONTINUÓ CON EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN BASE GRANULAR EN EL SECTOR 1 (CANCHA)
ANGEL MARIO QUINTERO
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 160 | UNIO 28 DE 2023 (MIÉRCOLES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023
1 SST, 1 SOCIAL, 2 BOAL, 1 INSPECTOR, 11 OPERATIVO
SE FUNDE ANILLO Nº 4 DEL CAISSON 1,
SE FUNDE LAS ZAMPAS DE LOS DOS MUROS DET-CT-002 DEL SECTOR 3, SE COLOCA GEOTEXTIL EN LA ZONA DE GIMNASIO BIOSALUDABLE DEL SECTOR 2
SE EXTIENDE BASE GRANULAR SOBRE EL GEOTEXTIL

EN LA ZONA DEL GIMNASIO BIOSALUDABLE EN EL SECTOR 2, SE CONTINUÁ CON PERFILADO DE TALUDES SECTOR 2.
AÑO NUEVO QUINTERO 4.
CONSORCIO TINGUA 2023

Nota 161 JUNIO 29 DE 2023 (JUEVES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 ING. AMBIENTAL, 1 ING. TOPOGRÁFICA 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA, 1 INSPECTOR DE OBRA, 11 OPERATIVOS, SE INICIA EXCAVACIÓN PARA ANILLO Nº 5 DEL CAISSON 1, SE CONTINUA ARMADO DE ACEROS EN EL ESTACADO DE LOS 120 MUROS DET-CT-002 DEL SECTOR 3 SE INICIA FORMALETA PARA MUROS DET-CT-002 SECTOR 3, SE CONTINUÁ CON EXTENDIDO DE GEOTEXTIL, Y DE BASE GRANULAR EN ZONA DEL GIMNASIO BIOSALUDABLE, SE CONTINUÁ CON LA EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EN EL SECTOR 1 (CANCHA)
AÑO NUEVO QUINTERO 4
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 162 JULIO 30 DE 2023 (VIERNES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023, 1 SST, 1 SOCIAL, 1 INSPECTOR, 10 OPERATIVOS, 1 ING. TOPOGRÁFICA, 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA, 2 BOAL, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA. SE CONTINUÁ CON AMARRE DE ACEROS MUROS DET-CT-002 SECTOR 3 SE CONTINUÁ CON EXCAVACIÓN DE CAISSON No1 EN EL SECTOR 3, SE CONTINUÁ PERFILADO DE TALUDES, SE CONTINUÁ CON EXTENDIDO DE GEOTEXTIL DE ZONA BIOSALUDABLE SECTOR 2 SE CONTINUÁ CON COMPACTACIÓN ZONA BIOSALUDABLE SECTOR 2, SE CONTINUÁ CON COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR

Norma

EN EL SECTOR 1 LA CANCHA.
ARQ. LAINO QUINTERO L.
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 163 | JULIO 01 DE 2023 (SÁBADO)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023 | SST, | SOCIAL, 2 BOAL, | INSPECTOR DE OBRA, 11 OPERATIVOS (INCLUYE ING. PLINIO), | ING. TOPOGRÁFICA, | AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA, | DIRECTOR DE OBRA, | RESIDENTE. SE INICIA CAMBIO DE TUBERÍA DE 3" (ASBESTO) A 4" PVC, SE CONTINÚA COMPACTACIÓN DE RECEBO EN EL SECTOR 1 LA CANCHA, SE REPLANTEA ESCALERA COSTADO ORIENTAL EN EL SECTOR 2, SE TERMINA DE EXTENDER GEOTEXTIL EN LA ZONA DEL GIMNASIO BIOSALUDABLE SECTOR 2, SE CONTINÚA LA COMPACTACION DE B-600 EN LA ZONA DEL GIMNASIO BIOSALUDABLE EN EL SECTOR 2 SE CONTINÚA CON ARMADO DE ACERO PARA LOS VÁSTAGOS DE LOS 2 MUROS DET-CT-002 DEL SECTOR 3, SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN PARA ANILLOS DEL CAISSON Nº 1 DEL SECTOR 3.
ARQ. LAINO QUINTERO L.
CONSORCIO TINGUA 2023

NOTA 164 | JULIO 04 DE 2023 (MARTES)
PERSONAL DEL CONSORCIO TINGUA 2023 | SST, | SOCIAL, 2 BOAL, | INSPECTOR DE OBRA, 11 OPERATIVOS (INCLUYE ING. PLINIO), SE CONTINUA CON COMPACTACION DE B-600 EN EL SECTOR 1 (CANCHA), SE INICIA EXCAVACIÓN PARA VIGA DE CERRAMIENTO EN EL COSTADO NORTE Y ORIENTAL Y A SU VEZ SE ESTÁ EXCAVANDO EN EL COSTADO NORTE PARA EL FALDÓN, SE CONTINÚA COMPACTACIÓN CON RECEBO EN LA ZONA DE GIMNASIO BIOSALUDABLE SECTOR 2, SE TERMINA CAMBIO DE TUBERÍA DE 3" ASBESTO A 4" PVC, SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN DE CAISSON Nº1 SECTOR 3

SIGUE

BITACORA DE OBRA PARQUE LA JOYITA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Telefonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

que van junto a la vía existente, por lo menos: 02 se alcanzan a meter al menos 0,13 mts dentro de la calzada en concreto. los demás no se meten pero quedan muy al borde de la calzada. En total se localizaron 09 ejes. Falta recibir la implantación del proyecto en el topográfico de manera digital para su revisión.

Edward Pedroza
Topógrafo ETA Interventoría.

11/FEB/2023 SABADO

De dio inicio al descapote mecánico de la parte superior del predio en donde se ubican la plataforma para el parqueadero, pasarela peatonal, y muros DET-CT001 y DET-CT002 de la parte alta del lote a intervenir del predio; se continuo con la protección de los árboles de la parte baja. Replanteo caissons y/o ejes parqueaderos. Personal de obra: Maestro, oficial, tres ayudantes, auxiliar de tránsito, operados. Maquinaria: Retroexcavadora Caterpillar 320DL. Personal administrativo: Residente SST, Inspectora social; Dra Yolanda. Comisión topográfica.

11/FEB/2023 SABADO

INTERVENTORIA
- PERSONAL = 1 RESIDENTE, 1 SISO, Y 1 TOPOGRAFO
- EN EL CHEQUEO DEL REPLANTEO DE LOS CAISSON DEL PARQ-EADERO DE LA PARTE SUPERIOR DEL PARQUE SE EVIDENCIA QUE UN CAISSON ESTA DESPLAZADO SOBRE LA VIA KR 1 E. APROXIMADAMENTE UNOS 15 CM.

Lunes 13/feb/023

Se realiza la exploración de los caissons del eje A del parqueadero, y se realiza el replanteo de los demarcados B2, B3 y B4 para dar inicio a la excavación. Se continúa con la actividad de descapote mecá-

Norma

Powered by CamScanner

nza, y elaboración de actas de vecindad. Día nublado. Personal de obra: maestro, oficial, dos ayudantes, comisión topográfica, operador. Maquinaria → Retroexcavadora caterpillar 320 DL.
Personal administrativo: Residente, TST, trabajadora social, dos técnicos en elaboración de actas de vecindad.

LUNES 13/02/2023 INTERVENTORÍA

- CONTINUAN CON EL DESCAPOTE MECANICO
- CONTINUAN REALIZANDO EL REPLANTEO DE LOS CAMIONES DEL PARQUEADERO
- EL DESCAPOTE MANUAL SE REALIZA EN LAS PARTES DONDE POR TERRENO + DIFICULTAD LA MAQUINA NO TIENE ACCESO.
- SE TERMINA LA ACTIVIDAD DE PROTEGER LOS INDIVIDUOS ARBOREOS.
- SE CONTINUA CON LAS ACTAS DE VECINDAD
- PERSONAL = 1 SISO, + 7 RESIDENTE.

Martes 14/02/023

Se continúa con el descapote mecánico y manual, replanteo de ingreso del eje A. Se da inicio al retiro de material de descapote. Se termina con la elaboración de las actas de vecindad. - Día nublado - Personal de obra: maestro, oficial, tres ayudantes, operador, dos técnicos elaboración de actas. - Maquinaria: Retroexcavadora caterpillar 320 DL.
Personal administrativo → Residente, TST, Trabajadora Social.

Nota 1: teniendo en cuenta el avance actual de la obra, se solicita de carácter urgente la aclaración respecto a las cuadras del refuerzo longitudinal y transversal de los muros DET-CT001 y DET-CT002 tanto de la tapa como del vaciado, ya que sin esta información es imposible solicitar el acero para estos elementos, al igual que se solicita la instalación de los muros

Norma

Powered by CamScanner

a varilla comercial, ya que las longitudes que aparecen en los cuadros de aceros indican la longitud total de la varilla. Igualmente se solicita la aclaración respecto al acero de refuerzo de los muros de los caissons, ya que no se indica la longitud de los ganchos, ni traslapo de los anillos y/o flejes. Con esta información es imposible cuantificar, teniendo en cuenta que estamos terminando el descapote para proceder con las excavaciones manuales y mecánicas para los caissons y muros respectivamente.

15/02/2023 INTERVENTORIA

- FAVOR REALIZAR ESTAS ESTAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES POR OFICIO A SU ESPECIALISTA, Y COPIA OFICIO A LA INTERVENTORIA PARA A SI MISMO NOSOTROS ELEVAR ESTA CONSULTA A NUESTRO ESPECIALISTA. Y PODER DETERMINAR LA CONDICION MAS CORRECTA Y TEORICA POSIBLE SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD.
- ADICIONALMENTE DE ACUERDO CON LA REUNION ESTRUCTURAL SOSTENIDA EL 14 DE FEBRERO DONDE EL CONSORCIO TINGA 2023 COMUNICA EL AUMENTO DE LA CANTIDAD DE ACERO A UTILIZAR EN LA OBRA SEGUN ESPECIFICACIONES, POR ELLO SE SOLICITA LAS MEMORIA DE CANTIDADES DE LOS ACEROS DE REFUERZOS PARA UN METRO LINEAL DE TODAS LAS ESTRUCTURAS A EJECUTARSE COMO CAISSON, MUROS DE CONTENCION, OAOOS Y OTROS.

De conformidad con el retiro de material del descapote, y descapote manual. Se da inicio a la excavación de los caissons del parqueadero 03 y 04.- Personal: maestro, contramaestro, oficial, cuatro ayudantes, controlador de tránsito.- Maquinaria: Retroexcavadora Caterpillar 320 DL.- Ora nublado.- Se realiza el replanteo del muro DET-001 de la parte alta dada para entregarse, marcando la cara de excavación. Se continuo con la elaboración de las actas de vecindad.- Comisión topográfica, para tomar en elaboración de actas, aparatos.

Norma

Powered by CamScanner

Respecto a la respuesta por parte de la interventoría en el folio #9 del día de hoy hacemos las siguientes aclaraciones:

1. Esa información solicitada debe estar contemplada en los planos entregados por la consultoría, y debe contar con ella ya que debe dejarse al consultor para que la aclare, entregue y que cumpla con la NSR-10.
2. Como se puede hacer una inversión de valor de contratos de cualquier ítem, bancos, tasa, contrato, etc, cuando la información no es clara, precisa, y no cumple con la normatividad urgente.
3. De no aclarar este tema lo más pronto posible no se puede solicitar el acta de retiro para los diferentes estructuras en concreto planteadas en los diseños entregados por la consultoría, la cual llevaría a generar retrasos en la ejecución de la obra.

16/02/23 INTERVENTORIA:

SE DEBE REALIZAR LA EXCAVACION DE LOS ANCLAJES PARA CALZADA EN FORMA CONICA SEGUN LO INDICA EL DISEÑO, PLANO SOH-STM-JOH-V2-002 Y EL SOH-STM-JOH-V2-003.

De continúa con el retiro de material de descapote, descapote manual, y excavación manual de los cajones del pargueadero 03, 04 y 05.
Se continúa con la elaboración de actas de vecindad. Personal: Maestro contramaestro, oficial, cinco ayudantes, controlador de tránsito, operador, dos técnicos en elaboración de actas de vecindad. Dos nublados; se presentan lluvias fuertes de 3:30pm a 4:30pm las cuales suspendan las actividades en ejecución.- Maquinaria: Retroexcavadora Caterpillar 320 DL.
Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social.

Viernes 17 feb/023
Se continúa con: Elaboración de actas de vecindad, descapote manual, excavación manual cajones pargueaderos 02, 03, 04, 05,

Norma

Powered by CamScanner

DG, D7-8, retiro material de descapote - Personal de obra: Dos topógrafos, dos ayudantes, maestro, contramaestro, oficial, cuatro ayudantes, contratistas de transito, operador. Día nublado.
Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social.

Sábado 18/feb/023
Se continúa con el retiro de material del descapote, elaboración de actas de volumen, excavación manual anillo #1 de los pozos D7, D3, D11, D5 y D7-8, y descapote manual. Se presentan lluvias durante la noche anterior y la madrugada y lluvias fuertes de 7:00 am a 3:30 pm las cuales suspenden las actividades en ejecución. Personal de obra: Maestro, contramaestro, oficial, cuatro ayudantes, auxiliar de transito, operador. Maquinaria: Retroexcavadora caterpillar 320 DL. Cuatro tecnicos en actas de volumen.
Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social.

13/02/2023 INTERVENTORIA
- SE PRESENTA UN ATRASO EN LA ACTIVIDAD DE DESCAPOTE MANUAL DE 4 DIAS SEGUN PROGRAMACION APROBADA, SE SOLICITA TERMINARLA LO ANTES POSIBLE.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA INCORPORAR EN SU PERSONAL ADMINISTRATIVO EL INSPECTOR DE OSM, YA QUE A LA FECHA NO ESTA CONTRATADO.

Lunes 20 feb/023
Se cuenta con el retiro de material de descapote, descapote manual, protección de árboles. Se cuenta con la elaboración de actas de volumen, y se da inicio al replanteo de las veredas de la parte alta. Personal de obra: maestro, contramaestro, oficial, cuatro ayudantes, contratista de transito, operador, dos técnicos elaboración de acta de volumen 3, conicion topográfica. Día nublado. Se presentan lluvias fuertes de 3:00 pm a

Norma

Powered by CamScanner

3:30 pm las weas suspenden las actividades en ejecución.
Personal administrativo - Residente, SST, trabajadora social.
Nota 1 → Respecto a la solicitud de la interventoría respecto al atraso en el descapote manual del día sábado 18 feb/23 folio 11, manifestamos que la que hace falta es un porcentaje muy pequeño, y que esto no impide el avance de las demas actividades, en cambio el descapote mecánico ya terminó la cual está programado para entregar o terminar el 12 de marzo de 2023.
Nota 2 → Por otra parte reiteramos la solicitud hecha en el folio #8 del día martes 14 febrero de 2023 respecto a la aclaración de los ejes de las muros, medulación de muros, y refuerzo de las antes de las cerramos con la que tiene que ver con fracturas y grietas, por que sin esta información es imposible solicitar el acero y no es recomendable avanzar o dar inicio a las excavaciones de muros ni avanzar con las excavaciones de cimientos, a no ser que la interventoría lo autorice o lo solicite sin tener claro los refuerzos del concreto, por que las excavaciones abiertas así se protejan y se tomen las medidas necesarias se pueden desestabilizar y generar ~~[illegible]~~ problemas de estabilidad a los predios vecinos y sobre estos, de no construirse lo más pronto posible los estructuras de contención. De no contar con la aclaración de los ejes lo más pronto posible no se puede avanzar con las demas actividades de la programación.

20/02/23 INTERVENTORIA =
DANDO RESPUESTA A LA NOTA 1 DEL CONSORCIO FOLIO # 12 =
SIN DESCRIMINAR NINGUNA ACTIVIDAD. SIMPLEMENTE SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION APROBADA Y SUS RESPECTIVOS TIEMPOS.

DANDO RESPUESTA A LA NOTA 2 DEL CONSORCIO FOLIO #12 =
EN EL COMITE DE OBRA N° 7 DEL DIA 16/02/2023, SE LLEGO A COMUN ACUERDO ENTRE DS DIRECTORES DE OBRA E INTERVENTORIA LO SIGUIENTE = EL CONSORCIO PLASTARA MEDIANTE OFICIO VAP

Norma

Powered by CamScanner

DIFERENTES OBSERVACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DISEÑOS, CON SUS RESPECTIVAS PROPUESTAS PARA UNA PRONTA SOLUCION Y POSTERIORMENTE SEA APROBADA POR LA INTERVENTORIA. A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO NINGUN OFICIO POR PARTE DEL CONSORCIO DONDE NOS MANIFIESTE LO MENCIONADO EN LA NOTA 2 DEL FOLIO # 12 DE DA 20/02/2023.

NOTA 1 = EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONSORCIO TRIGUA NO SE ENCUENTRA COMPLETO, A LA FECHA NO SE EVIDENCIA EL INSPECTOR DE OBRA, EL PROFESIONAL SST NO ESTA EL 100% SEGUN LO INDICA EL ANEXO TECNICO, Y EL DIRECTOR DE OBRA TAMPOCO ESTA EL 70% SEGUN LO INDICA EL ANEXO TECNICO.

NOTA 2= LA ENTIDAD SOLICITA REALIZAR RECORRIDO DE OBRA EN EL TERRITORIO 1, Y SOLICITA QUE EL PERSONAL DE OBRA (CAMPO DE OBRA NO CALIFICADA) SE DESCRIMINE POR PARAJE. Y SEA EXCLUSIVO DE CADA UNO.

NOTA 3= PARA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION, HASTA NO TENER EL MATERIAL EN OBRA (ACEROS) Y EL DISEÑO DE MEZCLA. LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION SE DEBEN REALIZAR CON LA APROBACION DE LA INTERVENTORIA.

Martes 21 feb/023

De acuerdo con el desayuno manual, y elaboración de actas de seguridad. Maestro, contra maestro, oficial, cuatro ayudantes, controlador de tránsito. Dos técnicos elaboración actas de seguridad. Día nublado. Se presentan lluvias intermedias de 9:00 am a 11:00 am.

Personal administrativo → Residente, SST, trabajadora social.

Debido a que aún no se definen los despiece del acero de los diferentes estructuras, y por solicitud de la interventoría se suspenden las excavaciones.

Norma

Powered by CamScanner

FEB 22/23

SE REALIZA RECORRIDO AL PROYECTO IDENTIFICANDO LOS INICIOS DE CAISSONS DE PASARELAS, SE SUGIERE SE HAGA LA REVISION EN CUANTO A SU UBICACION YA QUE SE TRASLAPAN CON EL ESPACIO VIAL. SE SOLICITA REVISAR EL DISEÑO Y/O RECOMENDACION DE PAVIMENTO DADO QUE NO ES CLARO COMO SE GARANTIZA LA ESTABILIDAD DE UN ADOQUIN SOBRE PAVIMENTO RIGIDO. SE SOLICITA REVISAR EL ESTUDIO DE SUELOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD DE TERRENO DADA LA CERCANIA A ESTRUCTURAS Y LA ALTA PENDIENTE DE TERRENO, SE SOLICITA REVISAR EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN YA QUE EN EL MISMO MODELO SE INCLUYE UNA SOLUCION RIGIDA (MURO CONCRETO) Y FLEXIBLE (MURO GAVIÓN).

MIGUEL RAMIREZ GEOTECNIA.

Febrero 22/2023

Se efectuó visita de obra, encontrándose que se deberá verificar la posición de caissons para contención y soporte, de acuerdo con el tema geotécnico.
De igual manera, se recomienda que los caissons de la plataforma, no deberán ubicarse en cuneta o vía. Se deberán reubicar.
Dos muros de contención cuentan con doble sistema: muro de contención en concreto y gavión. Se recomienda escoger 1 sólo sistema, por destreza de economía y peso.
Es importante efectuar 1 mesa de trabajo técnica para aclarar estos temas entre otros con la entidad y el Contratista

Juan C. Tirado
Esp. Estr. Interventoría

FEBRERO 22/2023 INTERVENTORIA

- SE REALIZA RECORRIDO CON LOS ESPECIALISTAS DE GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS, ELLOS SUGIEREN REALIZAR UNA CUNETA PROVISIONAL PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y PROTECCION DE LOS CAISSON QUE YA SE ENCUENTRAN EXCAVADOS, INTERVENTORIA SOLICITA

Norma

Powered by CamScanner

TENER EN CUENTA ESTA OBSERVACION.
- PERSONAL DE INTERVENTORIA = 1 SISO, 1 INSPECTOR DE OBRA 1 RESIDENTE, 1 DIRECTORA, 1 ESP. ESTRUCTURAL, Y 1 ESP. GEOTECNICO.

De conformidad con el descapote manual, y se da inicio a la figuración del acero para los anillos de los caissons del eje A del parqueadero. Se contenda con el explantes de senderos y plazoletas. Dia nublado. Personal de obra: Maestro, contramaestro, oficial, cuatro ayudantes, comisión topográfica
Personal administrativo: Residente SST, trabajadora social.

23 Febrero 2023 COMPONENTE SSTMA.
- Se solicita diligenciar los permisos de trabajo en caliente antes del inicio de las actividades, ya que se evidencio en campo trabajos con pulidora y no se contaba con dicho permiso y sin extintor en el sitio de trabajo
- Se solicita sensibilizacion con SST en obra General
- Se solicita la entrega del Plan de Emergencia atemizado al proyecto

Jenika Paola Quijano G
Residente SSTMA Interventoria

Se avanza con la figuración de acero para los anillos de los caissons del eje A del parqueadero, Se termina el explantes de senderos y plazoletas. Dia nublado. Personal de obra: maestro, oficial, cuatro ayudantes, comisión topográfica.
Personal administrativo: Residente SST, trabajadora social.

24/02/23 INTERVENTORIA
NOTA 3: EL CONSORCIO TINGUA 2023 MANIFIESTA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LOS ANILLOS DE CAISSON CON ACERO 3/8", CUANDO EL DISEÑO NO INDICA EN ACERO DE 1/4", LA INTERVENTORIA DEJA COMO

Powered by CamScanner

PRECEDENTE QUE NO SE LE LA PAGAR MAS CANTIDAD DE ACERO, RIGIENDONOS A LO ESTIPULADO POR LOS DISEÑOS Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL. DE IGUAL MANERA ESTE EXCEDENTE DEBERA SER AVALADO POR EL CONTRATISTA.

NOTA 2: POR SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA ETA Y LA ENTIDAD SOMT EN EL COMITE DE OBRA NT 8 DEL DIA 23/02/2023, EL CONTRATISTA DEBE CREAR UNA NUEVA ACTIVIDAD CON SU RESPECTIVO APU "ANILLO CONTENCION CHIMENEA D=10 2500 PSI.

NOTA 3: SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE EL PROYECTO ES UN PARQUE, EL CUAL SE LE REALIZARA LA ENTREGA AL IDRD UNA VEZ TERMINADO, POR ELLO SE DEBE CUMPLIR, APLICAR Y REGIR LA NORMATIVIDAD QUE IDRD NOS EXIJA. ESTO APLICA PARA (ENSAYOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ETC)

NOTA 4: TODA MEZCLA DE CANTIDADES DEBE CONTENER 3 FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD EN EJECUCION.
EL PLANO DONDE SE INDIQUE EL AREA INTERVENIDA.
SE DEBE ADJUNTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD Y LOS DIFERENTES ENSAYOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A LA ACTIVIDAD SI NO SE ENCUENTRAN CON LO ANTERIORMENTE MENCIONADO NO SE LE DARA APROBACION AL MISMO

NOTA 5: HASTA NO CUMPLIR CON EL ENSAYO DE MEZCLAS AVALADAS POR LA INTERVENTORIA, Y TODA LA LOGISTICA PARA LOS ENSAYOS INTERVENTORIA NO AUTORIZA INICIAR CON LAS FUNDIDAS DE LOS ANILLOS DE LOS CHIMENEA

De continua con el figurado y armado del acero de los anillos de los caissons del eje D del parqueadero. Dia soleado. Personal: Maestro, oficial, cuatro ayudantes. Personal administrativo. Residente SST, Trabajadora social.

Powered by CamScanner

-Sábado 25/feb/23
De conformidad con el armado del acero de las columnas del eje A (6) del parqueaderos. Maestro, oficial, cuatro ayudantes. Día nublado.
Personal administrativo: Residente SST, profesional Jr. d.

Lunes 27/feb/23
- Por parte de la SOHI, se realizo visita de control técnico se solicita impresión del cronograma de obra, y para esta semana, empezar con la localización y replanteo de la línea de cesión para parqueaderos de acuerdo a lo acordado en último comité

LUNES 20 INTERVENTORIA =
-SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA NO TIENEN AUTORIZADO FUNDIR, YA QUE NO CUENTAN CON EL DISEÑO DE MEZCLAS APROBADO NI EL PIEL APROBADO, SI LLEGANSE A EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD ES BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS Y NO SE REALIZARA EL PAGO DE ESTA ACTIVIDAD. YA QUE NO SE GARANTIZA LA CALIDAD NI LA ESPECIFICACION TECNICA DEL ITEM.

LUNES 27 COMPONENTE SST/INTERVENTORIA
EN RECORRIDO EN OBRA SE OBSERVO QUE:
- NO HAY COMPONENTE SST DEL CONSORCIO TENGUA ASIGNADO AL PARQUE LA JOYITA.
- NO HAY SEÑALIZACION SST EN OBRA GENERAL
- AUN NO HAN SEÑALIZADO Y HAN HECHO ENCERRADO, NI IDENTIFICADO EL CENTRO DE ACOPIO
- NO HAY PREOPERACIONALES NI PERMISO DE TRABAJO PARA PULIDORA

Powered by CamScanner

- NI TROMPO
- SE SOLICITA ENTREGAR LA ENTREGA DEL PLAN DE CONTINGENCIA ACTUALIZADO AL PROYECTO

Wendy Cepeda
Residente SST-SIG

Se funde el primer anillo del caisson P17-B del parqueadero. Por solicitud de la comunidad se realiza el traslado de las plantas que tenian en la parte alta del predio sobre la carrera 1 Este al lugar indicado por ellos, segun acta con la trabajadora social. Dia nublado. Personal: maestro, contramaestro, dos oficiales, cuatro ayudantes, controlador de transito. Personal administrativo: Residente, Trabajadora social.
Respecto a la anotacion de la interventoria del dia de hoy lunes 27 feb/23 folio 17 hacemos las siguientes aclaraciones:
- En el comité de obra del jueves 23 de febrero se trabajaria con un diseño de mezclas provisional mientras se presentaban los diseños de los frentes de obra del territorio 1, BELLO Horizonte y la joyita.
- Existen inconsistencias entre los planos y el presupuesto respecto a la resistencia del concreto de los anillos de los caissons.
- Se fundio el anillo con un diseño de mezcla para un concreto de 3000 psi, cuando se indico en el comite de obra del 23 de febrero que se deberian fundir en concreto de 2500 psi.
- Se tomaron muestras de concreto para ser llevadas al laboratorio, y no es recomendable dejar demasiado tiempo expuestas las excavaciones.
- El PIEL esta en proceso de correccion, y para el concreto de los anillos de los caissons se presentará un unitario nuevo ajustado a un concreto de resistencia f'c 2500 psi, y el concreto fundido el dia 30 hoy se facturará por este nuevo item

Nombre
28/02/23 INTERVENTORIA:
- A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA APROBACION DE LOS INFORMES DE OBRA SEMANALES NOS 3, 4, 5, 6, 7 + 8 POR LA INTERVENTORIA, SE SOLICITA AL CONSORCIO TINGUA 2023 REALIZAR + SUSTANTAR LAS OBSERVACIONES MANIFESTADAS POR LA INTERVENTORIA LO ANTES POSIBLE.

Norma

Powered by CamScanner

—ADICIONAL A ELLO SE LES RECUERDA QUE EL CONTRATO DE OBRA N° 1270-2022 EN SU CLAUSULA 10° OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, EN SU NUMERAL 7 MANIFIESTA QUE LAS ACTAS DE OBRAS O CORTES, DEBEN IR JUNTO A LOS PRODUCTOS DE INFORMES SEMANALES Y MENSUALES APROBADOS PARA QUE SE EFECTUE EL RESPECTIVO PAGO.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE LAS ACTAS DE OBRA O CORTES SEAN ENTREGADAS A LA INTERVENTORIA LOS 25 DE CADA MES PARA SU REVISION Y POSTERIOR APROBACION.

De contado con el armado del acero para los anillos de los caissons del eje A y encofrado del primer metro de excavación. Dia nublado.
Personal de obra: Maestro, contra maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes.
Personal administrativo: Residente, trabajadora social.

Martes Miércoles 01 mar/023
De fundir los anillos A2, A3, A4, A5, A6 de los caissons del perforados primer metro. De tomar cilindros. Personal: Maestro, contra maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes. Dia nublado.
Personal administrativo: Residente, SST, Profesional social.

Miercoles 01 MARZO /2023 COMPONENTE SISTEMA INTERVENTORIA

Se hace recorrido en obra con SST MILENA MORALES y las Observaciones de forma verbal para su inmediata corrección temas como:
- Señalizacion de Area de Trabajo, identificacion materiales
- La importancia del orden y aseo en la obra, como Tener limpia y completamente diligenciado los formatos de obra, charla de seguridad y tener una buena comunicacion

20

04/03/2023 INTERVENTORIA:

-EL CONTRATISTA CONTINUO REALIZANDO LAS FUNDIDAS DE LOS ANILLOS DE CONTEC. DE LA CAISSON SIN AUTORIZACION NI LA APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Jueves 02 Mar/023

Se construye un jarillon en la carrera 1 Este, para conducir las aguas lluvias, y evitar que estas inunden las cajsons del objeto de la toma del perforadora, en el momento de ser intervenida. Dia nublado.
Personal: Maestro, contra maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes.
Personal administrativo: Residente, trabajadora social.
Respecto a la fundida de los anillos de los cajsons se estan realizando los ajustes a las dimensiones de mezclas.

Viernes 03 Mar/023

Se realiza el replanteo de los cajsons de la pasarela, y se da inicio a las excavaciones de los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Dia nublado.
Personal: Maestro, contra maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes
Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social.
A la fecha no es posible avanzar en los otros frentes de obra como son estructuras de contención, cerramos, graderias, etc, hasta que no se tengan las aclaraciones a las licencias que se han solicitado en los diferentes comites, mediante oficios, y listarca, y porque aun no se tiene o no se cuenta con la licencia de aprovechamiento forestal para la tala y reubicación de árboles que se cruzan con las estructuras proyectadas en el PIP.

Sábado 04 Mar/023

Se continua con la excavación de los cajsons 1, 2, 3, 4 y 5, y se da inicio a la perforación de los cajsons 1, 2 y 3. Se presentan lluvias intermedias de 7:30 am a 9:00 am las cuales suspenden las actividades en ejecución; Dia nublado. Personal de obra: maestro, contra maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes, comi-

Norma

Powered by CamScanner

ción topográfica. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social.

Vie 06 marzo/2023

Se realiza visita de control técnico por parte de la SDHT, a pesar de estar incluidos en la programación y avance, se debe establecer la ejecución de actividades requeridas según el proceso constructivo.

- Se solicita el incremento de personal para generar un avance significativo a final de mes que nos permita llegar a un 20% de estos 90 días transcurridos del 2023.
- Pendiente - Plan de compras
  - Flujo de caja
  - Plan de cronograma de laboratorios
  - Apús

Se continúa con la excavación para las columnas de la manzana numeradas 2, 3, 4 y 5, y se da inicio al armado del acero para los anillos. Arribo el acero figurado de los anillos de columnas. Día nublado. Personal: Maestro, cuadrilla maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social.

Martes 07 Mar/023

Se funden los anillos 3, 4 y 5 de las columnas de la manzana 1 con la primera mixtura; se toman muestras de concreto. Día nublado. Personal de obra: Maestro, cuadrilla maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes. Comisión topográfica. Personal administrativo: Residente de

obra, TST, trabajadora social, inspector de obra

Miercoles 08/Mar/023

Se continúa con la excavación, armado de, acero y encofrados para el primer anillo de las caissons números 2, 6 y 7 de la pasarela. Se presentan lluvias la noche anterior, y durante la madrugada Personal de obra: maestro, contra maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes. Personal administrativos: Residente, TST, Trabajadora social, inspector de obra.

Jueves 09/Mar/023

Se presentan lluvias intermedias de 7:00 am a 11:00 am, y lluvias fuertes de 11:00 am a 1:00 pm, las cuales suspenden las actividades programadas. Se funden los anillos de los caissons de las pasarela números 2, 6, 7 y 3; toma de muestras. Personal: maestro, contra maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes. Personal administrativos: Residente, TST, trabajadora social, inspector de obra

Viernes 10/Mar/023

Se funde el anillo numero 10 de la pasarela y se da inicio a la excavación del segundo anillo del caisson # 3. Se presentan lluvias fuertes de 2:30 pm a 3:30 pm las cuales suspenden las actividades en ejecución; igualmente lluvias suaves de 3:30 a 4:30 pm. Personal de obra: maestro, contra maestro, dos oficiales, cuatro ayudantes. Personal administrativos: Residente, TST, Trabajadora social, inspector.

Sábado 11/Mar/023

Se presentan lluvias intermedias de 7:00 am a 10:30 am, y lluvias suaves de 10:30 am a 11:00 am las cuales suspenden las actividades de excavación, armado de acero y fundida de concreto para anillos de caissons de la pasarela. Se trabaja en orden y aseo, señalización, protección de sumideros de las vías perimetrales

Norma

Powered by CamScanner

del proyecto. Personal: Maestro, tantero, dos albañiles, cuatro ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, inspector de obra.

LUNES, 13/03/23 INTERVENTORIA

1. SE CONTINUA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE LOS ANILLOS PARA LOS CAISSON, SIN HABER SUBSANADO LAS OBSERVACIONES DEL DISEÑO DE MEZCLA, ENCONTRANDOSE AUN SIN LA APROBACION DE LA INTERVENTORIA SE SOLICITA AL CONTRATISTA SUBSANAR ESTAS OBSERVACIONES LO MAS PRONTO POSIBLE.

2. SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA, LA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE OBRA APROBADA, A LA FECHA SE DEBIERON DAR INICIO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- DEMOLICIONES
- EXCAVACION MANUAL DE TANQUES

ESTO CON EL FIN DE SEGUIR CON LA OBSERVACION A FAVOR O POSITIVA CON RESPECTO AL % PROGRAMADO Y % EJECUTADO Y GARANTIZAR LOS TIEMPOS DE EJECUCION.

Se presentan lluvias intermitentes durante toda la mañana de 7:00am a 1:00pm las cuales suspenden las actividades en ejecución: de excavación, armado de acero, encofrados y fundida de anillos para caissons pasarela. Igualmente durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se presentan lluvias. Se avanza en las actividades de la pasarela números 4, 5 y 6, teniendo en cuenta que se hacen cortes a mano toda vez para poder realizar las excavaciones. Personal: maestro, oficial, tres ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, inspector de obra.

Respecto a las observaciones realizadas por la interventoría el día de

hoy en el folio 23 nos permitimos hacer las siguientes observaciones:

1- Se esta realizando el trámite respectivo del diseño de mezcla de concreto, para ser entregado a la interventoria lo mas pronto posible.

2- Respecto a la programación de obra radicada y aprobada por la interventoria, y las actividades que deberian iniciar como son las demoliciones y excavación manual de taludes informamos lo siguiente:

- Demoliciones: La entrega del parqueadero en el sector comunal esta programada para el próximo 16 de marzo de 2023, y esperamos poder intervenir ciertas áreas mientras se retira lo del muro DET-CT003, las cuales contemplan demoliciones.
- Excavación manual de taludes: Aún no se cuenta con la licencia de aprovechamiento forestal para la tala y reubicación de los árboles que están ubicados en las áreas proyectadas. Sin embargo, se están evaluando las áreas que se pueden excavar en las cuales no hay individuos arboreos para dar inicio a esta actividad.

Martes 14 mar/023

Se presentan lluvias durante la noche anterior y la madrugada. Se terminan las actividades de los pozos 3, 4, 5, 6 y 7, y se da inicio a la excavación para el segundo anillo del pozo #3. Dia nublado. Personal de obra: Maestro, oficial, cuatro ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, inspectos de obra.

Miércoles 15 mar/023

Se funde el anillo del pozo numero 3, y se continúa con la excavación del segundo anillo del pozo número 3 y 4 de la pozera. Se presentan lluvias intermitentes de 2:30 pm a 4:00 pm, y lluvias fuertes de 4:00 pm a 5:00 pm. Personal de obra: maestro, oficial, tres ayudantes. Personal de administración: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra.

Powered by CamScanner

Jueves 16 Mar/023

Se termina la excavación del segunda anillo de los caissons 3 y 4 de la pantalla, y se arma el acero de refuerzo y se vacían, programando para fundir el día de mañana estos dos elementos. Día nublado. Personal: Maestro, oficial, tres ayudantes. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra.

16/03/23 INTERVENTORIA:

- SE REALIZA EL COMITE DE OBRA Nº 11, ASISTENTES CONSORCIO TUNJA 2027, INTERVENTORIA ETAI SOHT.
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 DIRECTOR, 1 COORDINADOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR + 1 RESIDENTE SISO, 1 RESIDENTE SOCIAL.

Viernes 17 Mar/023

Se avanza con la excavación de los anillos número 2 de los caissons 5, 6, y 7, y se funde el anillo número 2 del caisson # 4 de la pantalla. Se presentan lluvias intermedias de 1:30 pm a 3:00 pm las cuales suspenden las actividades de excavaciones, armado de acero y encofrados de anillos de los caissons de la pantalla. Personal de obra: Maestro, oficial, cuatro ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, inspector de obra.

INTERVENTORIA:

- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 RESIDENTE SST
- SE RECUERDA AL CONTRATISTA AUMENTAR PERSONAL EN OBRA,
- A LA FECHA LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE CIMIENTOS + PLACA DE CONTRAPISO DEBERIAN ESTAR CASI AL 100% + A LA FECHA NO SE INICIA CON ESTAS ACTIVIDADES, AFECTANDO + GENERANDO UNA DESVIACION NEGATIVA AL AVANCE DE OBRA, SE DEBE INICIAR CON ESTAS ACTIVIDADES DE INMEDIATO O REALIZAR UN PLAN DE CONTINGENCIA.

Norma

Powered by CamScanner

Sábado 18 Marzo 23

Se fundan los anillos número 2 de los caissons 5 y 6, y se avanza con la excavación para el segundo anillo de los caissons 7 y 8 de la pasarela. Día nublado. Personal de obra: maestro, oficial, cuatro ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, inspector de obra.

Respecto a la notación de la interventoría del día viernes 17 de marzo de 2023 del folio # 25, se está a la espera por parte de la junta de acción comunal del parqueadero que se haga la entrega de este espacio para poder dar inicio a las demoliciones, y así poder actualizar y poner al día esta actividad que se encuentra retrasada respecto a la programación contractual.

21/03/23 Se realiza visita de control técnico, con personal de residentes en obra, se evidencia que se presentaron retrasos en cronograma, puesto que no se han iniciado trabajos o actividades, de acuerdo a cronograma de obra. se le solicita a la interventoría, control sobre estos hitos y aumento de frentes de obra

Se termina la excavación del segundo anillo de los caissons números 7 y 8 de la pasarela, se arma el acero, se cimbran y se funden. Día nublado. Personal de obra: maestro, oficial, cuatro ayudantes. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra.

INTERVENTORIA:

- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE, 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTOR

Norma

Powered by CamScanner

DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SOCIAL.

- SE SOLICITA AL CONSORCIO TENGA 2013 DAR INICIO LO ANTES POSIBLE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

	AVANCE PROGRAMADO =
- DEMOLICION PLACA CONTRAPISO	100 %
- DEMOLICION CIMIENTO EN CONCRETO	100 %
- DEMOLICION MANPAI SARDINEL	28 %
- DESMONTE DE APARATOS	100 %
- DESMONTE DE CARPINTERIA METALICA	42 %
- EXCAVACION MANUAL TANQUES	57 %
- NIVELACION Y PERFILADO TERRENO	5 %

ESTAS ACTIVIDADES SEGUN PROGRAMACION APROBADA DEBIERON TENER INICIO EL DIA 12 DE MARZO DEL 2013, A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO, GENERANDO UNA DESVIACION NEGATIVA -0,19 % CON RESPECTO AL AVANCE EJECUTADO DEL PROYECTO, SE DEBEN TOMAR MEDIDAS E IMPLEMENTAR UN PLAN DE EJECUCION EL CUAL AMORTIGUE Y ESTABILICE ESTE % PORCENTAJE.

21 Mar/2013 Miércoles.

Se terminan las excavaciones de los cimientos 9 y 2 segundo anillo, y se arma el acero de refuerzo y se entortan; se avanza con la excavación del segundo anillo del cimiento número 10. Se presentan lluvias fuertes de 3:30 pm a 5:00 pm las cuales suspenden las actividades de excavación, armada de acero y entramados de anillos para cimientos de la pasarela. Personal de obra: maestro, contramaestro, un oficial, dos ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, inspector de obra.

Respecto a la anotación del día 21 de marzo de 2013 folio 27, realizada por la interventoría comparamos ponerlos al día una vez sea entregado el porcentaje por parte de la junta de acción comunal, con los ítems de demoliciones y desmontes la próxima semana; con respecto a las excavaciones se están tomando las medidas para adelantar estas actividades teniendo en cuenta que no hay licencia de aprovechamiento forestal para la tala y extracción de individuos arbóreos, y que varios de estos se encuentran en las diferentes obras proyectadas en el parque La

Sujeta, y no es posible realizar las diferentes estructuras hasta que no se retiren dichos árboles.

INTERVENTORIA =
- PERSONAL DE OBRA = 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTOR DE OBRA

Jueves 23 Mar/023
Se funde el segundo anillo de los pozos 2, 3 y 9 de la parcela. Se da inicio a la excavación mecánica del pozo número 1, y retiro de material. Día nublado. Personal: maestro, contramaestro, oficial, seis ayudantes, operador. Retroexcavadora Hitachi 135UF. Personal de administración: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra.

INTERVENTORIA:
-PERSONAL DE OBRA= 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTOR DE OBRA
El día de hoy se evidencio que la volqueta de Placas SKK 048 Rosbelto en la via calle 353, choco contra un poste de energia, queda atorada sobre la via de acceso, se solicita al contratista verificar las condiciones de terreno y mejorarlo, Acceso de las volquetas, maniobras de conducion, Preoperacionales de volquetas, tambien se debe mejorar el Area del Giro en la salida y Entrada de las volquetas Tener un Boal de Forma permanente Limpiando llantas y las Vias, Para Garantizar el Orde y Aseo en este sitio, Garantizar que los auxiliares de Trafico en sus puntos de un flujo seguro

Norma

Powered by CamScanner

Para no obstruir el Tráfico

Viernes 24 mar/23

Se cavan, se arma el eje de refuerzo, se cortan y se fijan los anillos números dos de las caissons D7-8 y D-6 de la bahía pergoleados, y caisson número 10 de la pergola. Se continúa con la excavación del tendero número 1, y retiro de material. Día nublado. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, cinco ayudantes, operador. Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi 150 . Personal administrativo: Residente de obra, SST, Trabajadora social, inspector de obra.

INTERVENTORIA = 24/03/23

PERSONAL EN OBRA = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL, + 1 INSPECTOR DE OBRA

Sábado 25 mar/023

Se cuenta con la excavación del segundo anillo de las caissons D5 y D4 de la bahía del pergoleados. Día nublado, se presentan lluvias intermedias de 11:00 am a 12:00 pm las cuales suspenden las actividades de excavación de caissons. Se continúa con las excavaciones manuales del tendero 1 y conformación de bloques entre tendero 1 y gradería. Personal: Maestro, contra maestro, dos oficiales, cinco ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, inspector de obra.

INTERVENTORIA = 25/03/2023

PERSONAL DE INTERVENTORIA = 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 INSPECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

30

27/03/23 Se realiza visita de control, se evidencia actividades de excavación y fundición, esta semana continúa demoliciones en entorno del salón comunal, presenta un atraso de 0.02% se solicita por parte de la SIDHT, el inicio de ejecución de actividades programadas

LUNES 27/03/2023 - INTERVENTORIA:

- EL CONTRATISTA SUGIERE INICIAR LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE LOS ANILLOS DE CONTENCION PARA CALZADA DE LA BAHIA DE PARQUE SOBRE EL EJE B BORDE VIA, LA INTERVENTORIA NO AUTORIZA INICIAR CON ESTA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE EL PMT APROBADO, NO AUTORIZA EL CIERRE DEL CARRIL O PARTE DE LA VIA. POR ELLO SE SUGIERE AL CONTRATISTA PRIMERO REALIZAR LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION AL PMT, PARA QUE NOS AUTORICEN CERRAR MEDIO CARRIL Y ASI PODER INICIAR CON ESTAS ACTIVIDADES

- DE IGUAL MANERA, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES DE MAS DE 2 MT DE PROFUNDIDAD, SE DEBE CONTAR CON EL PROGRAMA DE ESPACIO CONFINADO Y TRABAJO EN ALTURAS, ES DECIR QUE SI A LA FECHA EL CONTRATISTA NO CUENTA CON LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, DEBE SUSPENDERSE ESTAS ACTIVIDADES.

- PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL, Y 1 INSPECTOR DE OBRA.

Determinan las abscisas de los anillos D2, D4, y D5 segunda anillo Bahía parqueadero, se afina el diseño de refue-


Powered by CamScanner

zo, se ensilan y se funden. Se continúa con la excavación y retiro de material del sector de los graderíos de la plataleta central. Día nublado. Personal: Maestro, contramaestro, dos oficiales, cinco ayudantes, un operador, una bodeguera. Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi ZAXIS 135US. Personal administrativo: Residente, SST, Trabajadora social, inspector de obra.

Martes 28 Mar/023

Se cuenta con la excavación del anillo #1 del caisson #11 de la pasarela; se arma el acero y se encofra y se funde el anillo número dos del caisson 03 de la bahía del parqueadero de la carrera 1 Este. Una vez entregado el parqueadero del salón comunal se procede a realizar las caracterizaciones, y se da inicio a los desmontes de barandas y pasamanos, y demoliciones de andenes y cunetas. Se continúa con las excavaciones y retiro de material del sector de los graderíos de la plazoleta central. Se presentan lluvias intermitentes de 11:00 am a 11:30 am las cuales retrasan las actividades de caissons y excavaciones. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, ocho ayudantes, bodeguero, operador. Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi ZAXIS 135US. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, Inspector de obra.

Como es de conocimiento de la interventoría, en donde se encuentra localizado el caisson 1 de la pasarela existe un muro de contención en concreto, el cual no es recomendable demoler para construir el caisson porque se puede ver afectada la estabilidad de la vía sobre la carrera 1 Este. Por lo anterior solicitamos se eleve la consulta al diseñador, ya que se debe desplazar este elemento aproximadamente 1,50 metros sobre el eje hacia la parte interna de la pasarela, y se nos informe que modificaciones tendría la estructura en caso tal de poderse desplazar el caisson.

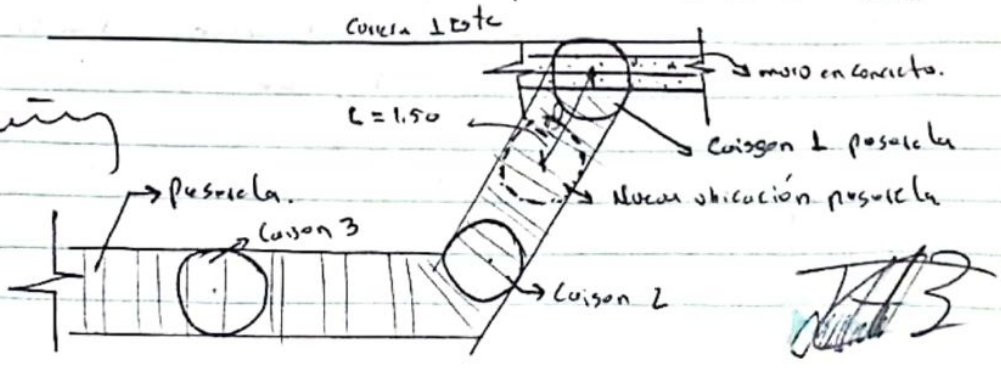

Powered by CamScanner

MARTES 29/03/23 INTERVENTORIA

- PERSONAL EN OBRA = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL, Y 1 INSPECTOR DE OBRA.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL INMUEBLE SALON COMUNAL DE LA SOLITA, YA QUE SE INICIARON ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE LAS ESCALERAS Y PLACA DE CONTRAPISO, CONTINUARAN CON EL DESMONTE DE LOS GAVIONES CERCANOS A ESTA EDIFICACION, ESTO PODRIA AFECTAR LA ESTABILIDAD DEL TERRENO POR ELLO SE RECOMIENDA NO REALIZAR ESTA ACTIVIDAD HASTA NO CONTAR CON TODO EL MATERIAL Y LA LOGISTICA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE ESCALERAS QUE SE CONSTRUIRAN EN SITIO. ESTO EVITANDO QUE SE DESMONTE DEL GAVION Y EL TERRENO PIERDA CONTENCION Y DURE VARIOS DIAS SIN REALIZARSE LAS ACTIVIDADES PROPIAS COMO ES LA CONSTRUCCION DE LAS ESCALERAS.

- RESPECTO A LA ANOTACION DEL DIA 28/03/2023 DEL FOLIO 37, EL DIA 30/03/23 EN EL COMITE Nº 13 SE REALIZARA Y ELEVARA LA CONSULTA A LA SOHT. PARA QUE MEDIANTE ELLOS SE REALICE EL PUENTE CON LA CONSULTORIA. ADICIONAL A ELLO SE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR UNOS APIQUES SOBRE LA VIA SIN DAÑAR LA CARPETA PARA CORROBORAR QUE ~~CUENTA CON~~ EL ESPESOR DEL MURO Y SI NOS OBSTANTE EN LA CONSTRUCCION DE TODO EL EJE O SOLO DEL CAISSON Nº 1

Miercoles 29 Mar/023

Parqueadero: Salon comunal: Descapote manual, demolición placas de contrapiso, - desmonte escombro, demolición escaleras. De orma el grano de retorno y se ontra el anilla número 1 del caisson de la parcela número 11. Dia nublado. Personal: Maestro, contra maestro, dos oficiales, dos ayudantes, un operador, hora. Maquinaria: retroex-

residente Hitachi 7AX13 1750 40. Personal administrativo: Residente de obra, SST, Inspectora Social, inspector de obra, Director de obra.

- En el día de hoy en recorrido de Obra en el parque la Joyita se evidencia al personal de maestro de Obra Iniciando Actividades de Excavacion para el tercer anillo tipo caisson que se encuentra como espacio confinados, sin estar autorizados, haber presentado la parte documental para Inicio. de Actividades, sin previa verificación y aprobación por parte de la Interventoria, se le hace llamado de Atención por Obligar al personal de Obra a Ejecutar actividades de Alto Riesgo sin Dar cumplimiento a la normatividad vigente en Trabajos en Espacios confinados Resolucion 491 de 2020.

30/03/23 INTERVENTORIA: Jueves

- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 INSPECTOR DE OBRA.

- POR ORDEN DEL DIRECTOR DE OBRA SE DESCIENDE Y SE DESMONTA EL CAISON SIN ACATAR LAS RECOMENDACION DE LA INTERVENTORIA DADAS EL DIA 28/03/23, FOLIO 32, POR ELLO SE HACE RESPONSABLE AL CONSORCIO TINGUA 2023 DE CUALQUIER DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL CAISON COMUNAL O PARTE FISICA DEL MISMO.

- SE REALIZA EL RELLENO DE LA ESCALERA PARTE BAJA DEL CAISON COMUNAL CON ACERO DEL MISMO CAISON DESMONTADO, LA INTERVENTORIA AUNQUE DIJO QUE CON LO ACTIVIDAD NO AFECTA LA CALIDAD FINAL DE LA ESTRUCTURA, TODA LA CONTRATISTA MEZCLA LA SUBCONTRATISTA, PERO ESTA ACTIVIDAD NO SE PUEDE COMO RELLENO EN RECIBO EL VOLUMEN DE MEZCLA COLOCADO INSITU SE DISCUTE LA MISMA DE 2021

Norma

Powered by CamScanner

DE DICHA ACTIVIDAD.

Se funde el anillo número 1 del carrizo número once de la pasarela. Se continúa con las demoliciones de plaza de contraplaca, y desmonte de herramienta del sector del salón comunal, y excavaciones para las cepas y zapatas de este sector. Día nublado. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, siete ayudantes, operadores, bodeguero. Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi ZAXIS 135US. Personal administrativo: Director de obra, residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra.

Viernes 31/marzo/023

Se funde el anillo número 2 del carrizo 11 de la pasarela. Se continúa con las demoliciones del carramiento, y excavaciones y retiros, demoliciones de andenes del sector del parqueadero y del salón comunal. Día nublado. Personal de obra: Maestro, contramaestro, oficial, cinco ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi ZAXIS 135US. Personal Administrativo: Director de Obra, residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra.

31/03/23 ~~INTERVENTORIA~~

- PERSONAL DE INTERVENTORIA → 1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL Y 1 INSPECTOR DE OBRA

Sábado 01 Abril/023

Parqueadero: Se continúa con el retiro de material de excavación, y demolición de la placa de contrapiso o andenes del salón comunal. Se retiran los encofrados del anillo número 2 del carrizo 11 de

Powered by CamScanner

la parcela, y se realiza una organización y mejor jerarquía de roles y ordenes. Día nublado. Personal de obra: maestro, contra maestro, dos oficiales, tres ayudantes. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

07/04/23 INTERVENTORIA

PERSONAL EN OBRA = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL Y INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

Lunes 03 Abril/023

Se despeja el terraplen de la carrera 1 Este para la vista existente, hasta el límite del pavimento, en el tramo que comprende la Rotonda - Porgueadero, y se da inicio a la excavación del primer anillo de las columnas B2, B3, B4, B5, B6 de esta estructura. De contrario con las excavaciones del Porgueadero del sobre muro hasta nivel de subrasante según diseño. Día nublado: Personal de obra: Maestro, contramaestro, cuatro oficiales, cinco ayudantes, hool, operador. Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi taxis 135 UD. Personal administrativo: Residente, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

03/04/23 INTERVENTORIA =

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 2 RESIDENTE TECNICO, DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL + INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

Martes 04 Abr/023


Se funde el anillo número 1 de los caissons B2, B3, B4 y B6 de la bahía del parqueadero; se continúa con las excavaciones y retiros de muros o para muros y tenderas. Personal de obra: maestro, contramaestro, cuatro oficiales, siete ayudantes, un operador, bool. Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi Zaxis 135US. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra. Día nublado.

04/04/23 PERSONAL DE INTERVENTORIA = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Miercoles 05 Abr/023

Se excavan, arma el acero, se encofran y se funden los anillos primeros de los caissons B5 y B8, igualmente se excavan, arma el acero de refuerzo se encofran y se funde el segundo anillo de los caissons B2, B3 y B6 de la Bahía-Parqueadero. Día nublado. Personal de obra: maestro, contramaestro, cuatro oficiales, siete ayudantes, Bool. Personal administrativo: Residente, SST, Trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Se solicita a la interventoría definir si los caissons B1 y B9 se deben desplazar, porque estos están a borde de vía, y al momento de excavar para los anillos estos quedan bajo la estructura del pavimento.

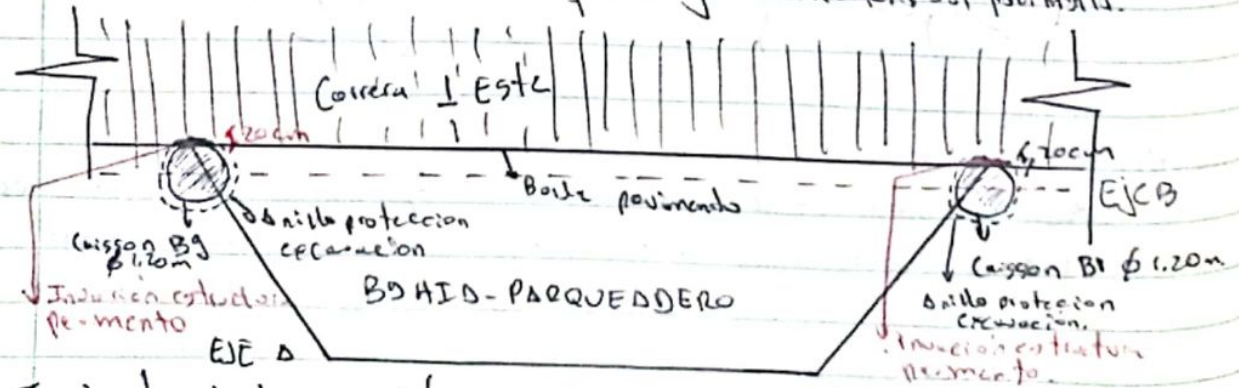

Igualmente solicitamos se defina si el caisson 1 de la pasarela se puede desplazar sobre su eje y que modificaciones implicaría esta

notificación por la presencia de un muro en concreto ciclopeo que está contenido la vía - Grieta Este -, Anotación que se realizó en el folio 31 del libro de obra, de fecha 28 de marzo de 2023, y aún no se tiene respuesta.

05/04/2023 PERSONAL DE INTERVENTORIA = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL, 2 INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

- DANDO RESPUESTA A LA NOTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA EL DIA MIERCOLES 05/04/2023 EN EL FOLIO N° 36, ESTA CONSULTA SE DEBE ELEVAR A SUS ESPECIALISTAS PARA ASI TENER LAS POSIBLES SOLUCIONES Y LA INTERVENTORIA DAR ALGUNA APROBACION. Y ASI PODER DAR EJECUCION A ESTAS ACTIVIDADES.
- COMO SE HA MENCIONADO SE DEBEN DESARROLLAR ESTOS CAISSON. Y LOS ESPECIALISTAS DEBEN VALIDAR SI DICHA PROPUESTA ES LA ADECUADA Y SI ESTRUCTURALMENTE NO SE AFECTA EL ELEMENTO.

Sábado 08/04/023

Se cuenta con los excavaciones del segundo anillo de los caissons B4, B5 y B8. y el primer anillo del caisson B7 de la Bahía - Parqueadero. Día nublado. Personal de obra: Maestro, cuatro maestros, un oficial, seis ayudantes Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de Obra, Director de obra. En las excavaciones realizadas en la zona de los parqueaderos de la plazoleta Principal, al llegar al nivel de subrasante se encontro relleno en basura, el cual es necesario retirar para garantizar la estabilidad de las obras a construir.


08/04/23 PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SST, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Lunes 10 Abril 2023

Se funde el segundo anillo de los caissons B4, B5 y B8, y el primer anillo del caisson B7, una vez excavados, armada acero de refuerzo y encofrados, de la Bahia-Porquecadera. Dia nublado. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, siete ayudantes. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Segun las indicaciones de la interventoria realizadas en el folio 37 del dia miércoles 05 de Abril de 2023, se ha enviado plano de localizacion de los pilotes o caissons de la estructura de la pasarela y bahia-porquecadera, con la localizacion final de los caissons P1 de la pasarela, y caissons B1 y B9 de la bahia, las cuales ya se ha radicado en los folios 31 y 36 de la bitacora se deben desplazar para no afectar las estructuras existentes como muros de contencion y pavimento de las vias, a los asesores de geotecnia y estructuras del consorcio tingua 2023 para que emitan su concepto. La ubicacion final de los caissons P1, B1 y B9 se indica en el plano anexo del folio # 39. No obstante solicitamos nuevamente a la interventoria realizar la gestion ante la consultoria para que ellos se manifiesten al respecto, porque estas modificaciones afectan a condiciones del terreno al momento de realizar la implantacion de los elementos y excavaciones, y las modificaciones a los diseños no son responsabilidad del consorcio tingua por estas leyes y/o razones.

Por orden del director de obra se bordean los caissons P1, B1 y B9 según plano anexo del folio 39, para dar inicio a las excavaciones de estos elementos.

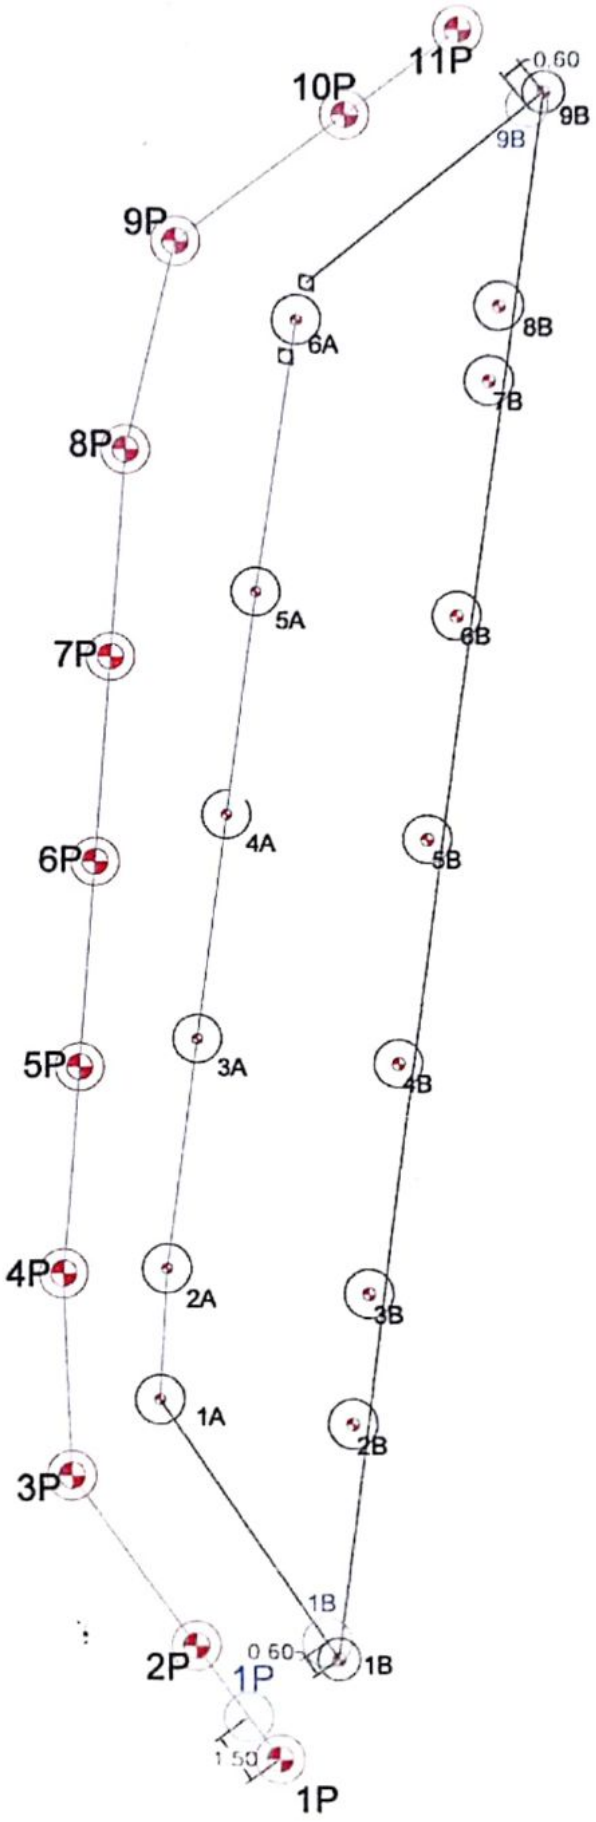

Powered by CamScanner

40

LUNES 10/04/2023 INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA.

DANDO RESPUESTA A LA NOTA DEL CONTRATISTA FOLIO Nº 37 Y 39 DEL DIA LUNES 10/04/23 Y A SOLICITUD DEL CONSORCIO TINGLA 2023 DE DESPLAZAR LOS CAISSON B1 Y B9 DE LA BAHIA DE PARQUEO Y DE DESPLAZAR EL CAISSON Nº 1 DE LA BASARELA ELEVADA, SE AUTORIZA LA PROPUESTA Y SE AUTORIZA DAR INICIO A REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES SIEMPRE Y CUANDO Y CUANDO SE ESTABLEZCA UN COMPROMISO DE AJUSTAR LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y TODOS LOS DIFERENTES ESTUDIOS QUE ESTAN MODIFICACIONES LO REQUIEREN, ES DE ACLARAR QUE ESTA MISMA INFORMACION FUE TRASMITIDA VERBALMENTE POR LA DIRECTORA DE INTERVENTORIA AL DIRECTOR DE OBRA Y ESTE UTIMO ESTUVO DE ACUERDO. YA QUE AL DESPLAZAR LOS ELEMENTOS SE ESTAN MODIFICANDO LAS LUCES ENTRE ELLOS, PUDIENDO AFECTAR LA ESTRUCTURA Y ASI MISMO REQUERIR REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES O LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD DEL MISMO, ES DE ACLARAR QUE ESTE PROCEDIMIENTO ERA NECESARIO PARA NO INTERVENIR LAS ESTRUCTURAS ENCONTRADAS EN LA EXCAVACION, Y NO PUDIERA NEGAR CORRER EL RIESGO DE AFECTAR LA ESTABILIDAD DE LA VIA E.

Martes 11/04/2023

Se excavan el anillo número 1 de los caissons B1 y B9 de la bahía parqueadero, y el anillo 1 de la pantalla, el cual se sirve el otro, se encofra y se funde. Dra nublado. Personal: maestro, varios maestros, dos oficiales, siete ayudantes. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

11/04/23 PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Miercoles 12 Abr/023

De exlavia, arma el otro, se encofra el anillo número 1 de los caissons B1 y B9, y el anillo número 2 del caisson B7 de la bahia-parqueadero, y el segundo anillo del caisson número 1 de la pasarela. Dia soleado. Personal: Contramaestra, dos oficiales, cuatro ayudantes. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, Director de obra.


12/04/23 PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SE REALIZA COMITE DE OBRA VIA TEAMS, PARTICIPANTES, CONSORCIO HUGUA 2023, INTERVENTORIA ETA, Y ENTIDAD SOLIT.

Jueves 13 Abr/023

De excavan los anillos número II de los caissons B9 y B1. Personal de obra: Maestra, oficial, cuatro ayudantes. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectos de obra, Director de obra. Dia soleado.

Teniendo en cuenta que al realizar las excavaciones para las diferentes estructuras del proyecto, el terreno encontrado no es el indicado ni el optimo para la construcción de estas estructuras, como se aprecia en las fotografías del folio # 42 los cuales indican los niveles de subrasante del parqueadero del salón comunal, gaviones de la zona media, y cortinas de la zona alta proponemos el siguiente mejoramiento para el nivel de fundación:

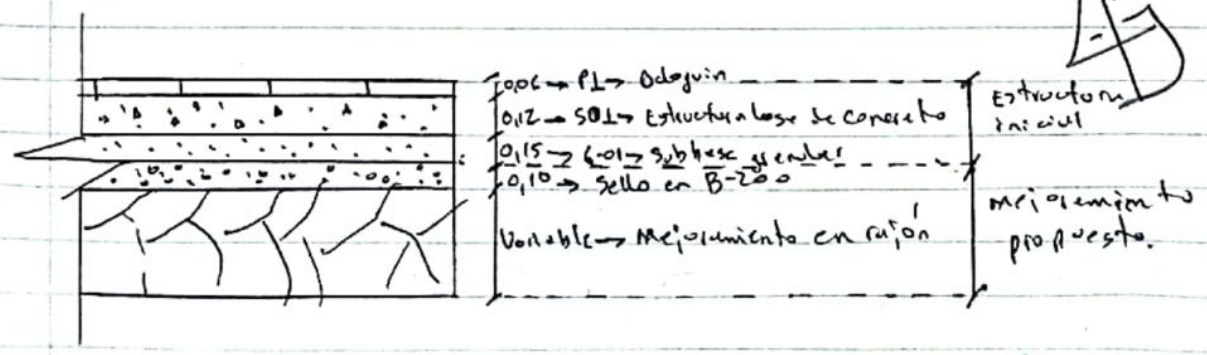

Powered by CamScanner



Foto # 1: nivel de subrasante parqueadero salon comunal



Foto # 2: nivel de subrasante sector graderías zona intermedia



Foto # 3: Nivel de subrasante sector muros y senderos parte alta

Powered by CamScanner

Para la estructura de pavimento del parqueadero propusimos aumentar la estructura de G-01 "sub base granular" en 10 centímetros, la cual esta inicialmente planteada en 35 centímetros, para un total de 45 cm de estructura para el pavimento.

JUEVES 13/04/2023 INTERVENTORIA:

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SOCIAL, 1 RESIDENTE SST, 1 INSPECTOR DE OBRA. 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL CONSORCIO TUNGLA 2023 EL DIA 11/04/2023 FOLIO 41, 42 Y 43, SE AUTORIZA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN LAS ZONAS DONDE LO REQUIERA LA SUBRASANTE, DONDE SE EVIDENCIE EL MAL ESTADO, (RELLENOS, BASURAS, ESCOMBROS MATERIA ORGANICA ETC), ESTA SOLICITUD SE DEBE REALIZAR SIEMPRE PARA ESTUDIO REVISION Y APROBACION DE LA INTERVENTORIA.

CON RESPECTO A LA SOLICITUD Nº 2 DEL FOLIO 43, NO SE AUTORIZA REALIZAR LA EXCAVACION DE LOS 40 CM AL PARQUEADERO. SE EVIDENCIA UN MATERIAL SUELO Y ORGANICO EL CUAL CON EL PASO DE VOLQUETAS Y LAS DIFERENTES MAQUINARIAS NO HA MOSTRADO FALLAS. POR ESTO NO SE AUTORIZA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD.

Viernes 14/04/2023.

Se funde el anillo # 2 del torreon B9 de la Bahia-Parqueadero y se continúa con el retiro de material de excavación. Dia nublado.

Personal: Un oficial, dos ayudantes, operador. Personal administrativo: Residente de obra, SST, Trabajadora social, Director de obra. Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi Zaxis 135US.

44

VIERNES 14/04/2023 INTERVENTORIA

PERSONAL = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL + 1 INSPECTOR.

-SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA INICIAR CON LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE LA CUNETA, YA QUE POR PROGRAMACION ~~ESTABA~~ SE DEBIA HABER EJECUTADO 30/03/2023, TENIENDO 28 DIAS DE RETRAZO.

-DE IGUAL MANERA SE LE SOLICITA REALIZAR EL DESMONTE DE LA RED ELECTRICA, YA QUE A LA FECHA OBTENEMOS ESTAN 100% EJECUTADA Y SEGUN PROGRAMACION SE DEBIA TERMINAR EL 03/04/2023, TENIENDO 74 DIAS DE RETRAZO.

Sábado 15/04/2023

Se continúa con la excavación y retiro de material de excavación del sector de las graderías de la plataleta principal y/o central. Se realiza una jornada de orden y aseo general a las instalaciones de la obra. Personal: Oficial, ayudante, operador local (2). Maquinaria: Retro-excavadora Hitachi Zaxis 135US, volquetas. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectores de obra, Director de obra. Día nublado.

Las actividades de demolición de cuneta y desmonte de red eléctrica no se encuentran en la ruta crítica ni impiden la ejecución de otras actividades programadas y/o que se puedan adelantar; no obstante se tomaran las acciones pertinentes para realizar estas actividades lo más pronto posible.

15/04/23 PERSONAL DE INTERVENTERIA = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SOCIAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SST + 1 INSPECTOR.

Powered by CamScanner

Lunes 17-04-2023: Topografía.
Se realizó el replanteo de los cortes según planos de diseño arquitectónico y urbanístico, corte C-C', K-K', J-J', I-I', B-B', A-A' y posteriormente se les hizo una nivelación geométrica con el objeto de establecer las cotas de excavación de la subrasante, según el terreno natural y compararlos respecto con las cotas de estos planos de cortes arquitectónicos y así poder establecer los volúmenes reales de cortes.

Edward pedroza
Topógrafo ETA.

LUNES 17/04/2023 INTERVENTORIA
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE TECNICO, 1 RESIDENTE SOCIAL, DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SST + 1 INSPECTOR
- EL CONSORCIO TINGUA 2023 SUSPENDE TODA ACTIVIDAD DE MANO DE OBRA, + CONSTRUCCION DE LA ANILLA DE LOS CAISSON POR NO CONTAR CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PROGRAMA DE ESPACIOS CONFINADOS. TODO EL PERSONAL DE MANO DE OBRA FUE TRASLADADO AL PARQUE BELLO HORIZONTE.
- A LA FECHA EL CONSORCIO TINGUA REPORTA EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:
% PROGRAMADO = 10,57 %
% EJECUTADO = 8,48 %
ATRASO = -2,27 %
- ESTE CESE DE ACTIVIDADES AUMENTARA EL % DE ATRASO, POR ENDE SE DEBE REALIZAR UN PLAN DE CONTINGENCIA, PARA NIVELAR EL ATRASO + DE IGUAL MANERA RETOMAR ACTIVIDADES LO MAS PRONTO POSIBLE.
- DE IGUAL MANERA SE LE REQUIERA AL CONSORCIO TINGUA 2023 QUE HAY ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR COMO LAS MENCIONADAS EL DIA 14/04/2023 FOLIO Nº 44 Y NO HAN REGRESADO INICIAR CON ESTAS ACTIVIDADES. SE DEJA COMO OBSERVANTE QUE A ESTE ATRASO AUMENTA BASTANTE ES POR ESTA SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES.

Powered by CamScanner

Si bien es cierto la anotación de la interventoría respecto a la suspensión de actividades en las carreras, porque se ha presentado un inconveniente con la documentación para tramites en carreras confirmadas que se debe presentar por parte del contratista tunga 2023, y que esperamos subsanar lo mas pronto posible, los porcentajes de estas actividades son los siguientes:

	Excavación carreras	Anillo carreras
Programado	18,17%	0,00%
ejecutado	27,36%	26,84%

Estos porcentajes reportados en el informe semanal del día sábado 15 de abril de 2023 # 15.

Por la anterior se demuestra que los atrasos que se presentan son debidos a las aclaraciones que no se han podido ejecutar por la falta de la resolución por parte de la secretaría de ambiente para la tala y traslado de los árboles. No obstante reiteramos que el contratista tunga esta tomando todas las medidas necesarias para subsanar los inconvenientes presentados y avanzar con las obras del contrato

Personal: Residente, SST, trabajadora social, inspector de obra, Inspector de obra: Maquinaria: Retroexcavadora Hitachi ZX135US.

MARTES 18/04/2023 INTERVENTORIA

- PERSONAL = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 SST, 1 RESIDENTE SOCIAL Y 1 INSPECTOR.
- EN CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DEBERES CONTRACTUALES NOS PERMITIMOS SOLICITARLES EL PERSONAL PARA REALIZAR EL TRAMITE EN ESTACIONES OPORTUNO, ESTO CON EL FIN DE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE LOS ANCLAJES PARA LA MISION DE QUE A LA FECHA CONTINUAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL PERSONAL IDONEO AFECTANDO EL AVANCE DE OBRA.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 19/Abr/023

En el anillo A2 del poligono B1 de la Bahia-Parqueadero se encuentra en cimiento o bodega de concreto enterrado el cual se procedio de excavar, se cargo, se transporto, se descargo y se fundio este anillo. Dia nublado. Personal obra: Maestro, oficial, dos ayudantes. Personal administrativo: Residente, SST, Trabajadora social, inspector, Director Subestacionadora Hitachi 2 AKVA 13500.

Miercoles 19 de Abril 2023

Se revisa diseño Sorio 6 (Alumbrado Publico) en terreno y se encuentra que se pueden retirar 2 postes de alumbrado Publico, un tercer poste (Ubicado cerca al nodo A15) se puede retirar pero se debe desconectar un cable de TV. El poste al nodo A24 aparece como retiro, no se puede retirar ya que es un poste de redes y estas no se pueden desconectar el poste siguiente el cual tiene el rotulo 21B72295 tambien aparece como retiro pero tampoco se puede retirar ya que tiene redes de baja tension.
Cerca al nodo A24 existe un poste de telecomunicaciones el cual se debe reubicar.
Se debe construir canalizacion electrica desde el poste ubicado cerca al nodo A24 hasta el salon comunal.

Edgar Henao S
Ing Electricista
Consorcio Tinguo 2023.

MIERCOLES 19/04/2023 PERSONAL DE INTERVENTORIA:
1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SST
1 RESIDENTE SOCIAL Y 1 INSPECTOR DE OBRA.

Jueves 20/Abr/023

Se da inicio a la demolicion de la cuneta solicitada por la interventoria, localizada sobre la carrera 1 Este. Se continua con la excavacion y retiro de material del sector de las gradas

Powered by CamScanner

rías de la plataleta de la zona central y/o principal. Se presentan lluvias intermitentes de 2:00 pm a 3:30 pm, las cuales retrazan las actividades de excavación y demolición. Personal de obra: Maestro, oficial, dos ayudantes, operador, local. Maquinaria: Retroexcavadora H.Tachi Zaxis 135US, volquetas. Personal administrativo: Director de obra, SST, trabajadora social

Jueves 20/04/23 INTERVENTORIA:

1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SST 1 RESIDENTE SOCIAL Y 1 INSPECTOR DE OBRA.

Viernes 21 Abril/023

Se continúa con la demolición de la cuneta sobre la carrera 1 Este y nuevamente se retoman las excavaciones y perfilado de taludes de las cunetas y muros. Día nublado. Personal de obra: Maestro, dos oficiales, cinco ayudantes, operador, local. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, director de obra. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50

VIERNES 21/04/23 INTERVENTORIA

PERSONAL = 1 RESIDENTE TECNICO, 1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE SST, 1 RESIDENTE SOCIAL Y 1 INSPECTOR DE OBRA

Sábado 22 Abril/023

Se da inicio a la excavación del tercer anillo de los caissons 2, 3 y 4 de la pasarela. Se continúa con el retiro y excavación de material del sector de las graderías de la plataleta central y/o principal. Día nublado; se presentan lluvias durante la mañana las cuales complican los accesos y dificultan el desplazamiento del personal para las actividades internas, retrazan-

de los trabajos programados. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, dos ayudantes. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, Director de obra.

14/04/23 Se realizo visita de control técnico se solicita entregar balance junto con la reprogramación de obra, cantidades ejecutadas y proyectadas por parte del contratista del ciclopeo de parqueadero
- Se retira abrir frentes de obra simultaneos en parqueadero, trazado y placa contra con graderia y calzada de acceso
- En el componente SST, presentar certificaciones de altura y confinamiento, operario calificado.

LUNES 24/04/23 INTERVENTORIA

- POR RECOMENDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL SE SUGIERE QUE LOS MUROS DE CONTENCION CT0001, CT0002 Y CT0003 SE IMPERMEABILICEN CON IGOL LOS MUROS DE LOS MUROS.
- TAMBIEN QUE DONDE EL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRE PARALELO A UNA ESCALERA Y UNA RENDIENTE SE DISEÑE ESCALONADO Y NO INCLINADO.
- REVISAR CON LOS ESPECIALISTAS DE GEOTECNIA SI ES NECESARIO QUE EL RELLENO QUE VA AL RESPALDO DE LOS MUROS DEBE IR HASTA LA CORONA DEL MUROS O NO ES NECESARIO.
- EL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL SUGIERE QUE LOS MUROS QUEDEN DILATADOS COMPLETAMENTE TANTO EN LA PLACA COMO EN EL MUROS CONFORMANDO MODULOS DE 6 MT.

Powered by CamScanner

Se realiza la excavación del tercer anillo de los caissons 1, 3, 4 y 5 de la pasarela, y se arma el acero. Se encofran y se funden el 3 y 4; se continúa con las excavaciones para muros y zanjeros. Día nublado. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, seis ayudantes, operador, Dool. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, Trabajadora social, inspector de obra, director de obra.

Martes 25/04/023

Se excava el tercer anillo del caisson 6 y 7 de la pasarela y caissons B1 y B2 de la Bahia-Parqueadero; se funde el tercer anillo del caisson número 5 de la pasarela. Se continua con las excavaciones para muros y zanjeros. Se presentan lluvias durante la madrugada, y lluvias intermedias de 1:30 pm a 3:00 pm, y lluvias suaves de 3:00 pm a 4:00 pm los cuales impiden las actividades de anillos caissons y excavaciones. Es importante tener en cuenta que los afectaciones por las lluvias no se limitan a los periodos en que estas se presentan, ya sean de intensidad fuerte, intermedia o suave, sino que también hay que tener en cuenta los tiempos y personal que se necesita para remediar los daños que estas causan como son las inundaciones a las excavaciones y dificultades del desplazamiento del personal y vehiculos, a pesar de las medidas tomadas por el consorcio. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, ocho ayudantes, operador; Dool. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, director de obra. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50

Miercoles 26/04/023

Se realiza tercer anillo: se funde el caisson 6 y 7, y se avanza con las excavaciones del 8 y 9. Bahia tercer anillo caissons: Se avanza con las excavaciones de los elementos B1, B2, y B3; en estos tres elementos se ha encontrado un cimiento enterrado en concreto, el cual se ha estado demoliendo con equipo

Norma

Powered by CamScanner

mesónica, afectando los rendimientos para la fundida de anillos. Se avanza con las excavaciones para zanjeos y rampa de la parte baja. Se presentan lluvias desde de 3:00 am a 10:00 am las cuales retrasan las actividades de anillos y excavaciones mecánicas. Personal de obra: Maestro, contra maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, operador, boal. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50.

Jueves 27/04/023

Se presentan lluvias durante la noche anterior. Se funde el tercer anillo de la parcela de los carriles 1-8 y 9, y se avanza en la excavación del tercer anillo del carril 10; Bahía porqueadero: Se funde el tercer anillo del carril B3, y se avanza en las excavaciones y demoliciones - B1 y B2 - del tercer anillo de los carriles B1, B2, B4 y A6. Se continúa con las excavaciones para muros y zanjeos de la parte baja. Día nublado. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, ocho ayudantes, operador, boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, Trabajadora social, inspector de obra, director de obra.

Viernes 28/04/023

Se presentan lluvias durante la madrugada. Se funde el tercer anillo del carril 10 de la parcela, y el A6 de la Bahía-Porqueadero; Se avanza con la excavación de los carriles B4 y A7-8 tercer anillo de la Bahía-Porqueadero. Se da inicio a las excavaciones para el muro en concreto ciclópeo sobre la carrera 1 del porqueadero del salón comunal. Día nublada. Personal de obra: Maestro, contramaestro, dos oficiales, ocho ayudantes, operador, boal, Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Powered by CamScanner

Sábado 29 Abril 023

Se continúa con la excavación y retiro de material para el muro en concreto ciclópeo del sector del parqueadero del salón comunal. Se continúa con la excavación del tercer anillo de los caissons 14, 15, 17-3, B1 de la Bahía-parqueadero, y caissons 11 de la Pasarela, se funden el 15 y 17-3 de la Bahía. Día nublado. Personal de obra: Maestro, contra maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, operador, Boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50, Volquetes. Personal administrativo: Residente de obra, SST, Trabajadora social, inspectos de obra, Director de obra.

Martes 02 may/023

Pasarela: Se funde el tercer anillo del caissons número 11. Bahía-Parqueadero: Se funde el tercer anillo de los caissons 14, B1 y B4, y se avanza con la excavación para el tercer anillo de los caissons B3, B2 y B5. Se continúa con el retiro de material proveniente de las excavaciones realizado en la plazoleta central zona de graderías, y con las excavaciones realizadas para el muro en concreto ciclopeo del parqueadero del salón comunal. Día nublado. Personal de obra: maestro, contra maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, operador, boal, Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, Trabajadora social, inspecta de obra, Director.O.

Miércoles 03 may/23

Se avanza con la excavación del tercer anillo de los caissons 12, 13 y B3, y se funde el B2 de la Bahía-Parqueadero, Se continúa con la excavación del tercer anillo del caisson 2 de la pasarela. Se avanza con la excavación y retiro de material para el muro en concreto ciclopeo del Parqueadero del salón comunal. Día nublado. Personal de obra: Maestro, contra maestro, dos oficiales, ocho ayudantes, operador, boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, inspector de obra, trabaja-

Powered by CamScanner
