Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y canguro.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario, 1 vigilante
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografía ETA.
Se realiza toma de densidades en area de cancha. Se continua con alistado de pañete en muro confinado en area de cancha. Se realiza cerramiento y camino para entrar a la iglesia. Se realiza replanteo para viga zona de niños Encofrado para viga de cerramiento.

Residente de obra

18/08/2023
CLIMA: Soleado durante la mañana, llovizna leve en la tarde
Herramientas: Bichiraque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica plomada, boquillera, Paladre y otros
Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y Canguro
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, Coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografía ETA.
Se realiza replanteo y excavación en zona de viga juegos de niños. Demolición de viga preexistente costado Este de la cancha. Se continua con soldadura metalica en área del mirador. Amarre de acero de refuerzo en zona de gradenas. Vaciado de concreto en viga de cerramiento en área de la cancha costado Norte. Desmonte de estructura metalica que hacia parte del campamento. Instalacion de tuberia electrica. Grupo topografico realiza verificacion de puntos electricos y levantamiento de materia y escaleras tambien juegos niños

Residente de obra

19/08/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, palustre y otros
Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Canguro y Rana.
Personal en obra: 11 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Solado en área de viga juegos de niños, Instalacion de tuberia electrica postes área de graderias. Amarre de acero graderias colocado Nate. Tambien se hace replanteo en area de viga

Residente de obra

21/08/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, palustre y otros
Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Canguro y rana.
Personal en obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario, 1 vigilante
Personal Administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se realiza excavacion para cerramiento en toda la parte de la via, para continual con demolicion. Desencofrado de formaleta en área de graderias, Armado de acero de refuerzo zona de graderias. Amarre de acero de refuerzo, en zona de viga juego de niños. Desencofrado de viga ~~juego~~ el area concha.

Residente de obra

22 AGOSTO 2023.
En visita de supervision se observo que se realiza trabajos de instalación tubería electrica, trabajos sector graderias, armare de acero viga sector zona de juego y demolición de placa concreto via vehicular. La supervisión manifiesto su preocupación por el obras que se presenta por lo cual insto al contratista a tomar las medidas necesarios para superarlo S. solicito tener en obra material y mano de obra suficiente previo y durante la ejecución de actividades.

(S) CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiaque, martillo, Pala, Pica, cinta metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactadora, Retroexcavadora, canguro, Rana.
Personal en obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Directa de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspecta ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se inicia demolicion de placas de contrapiso (via). Armare de acero de refuerzo en viga zona de niños, Instalacion de tuberia en area de postes que se instalaran en zona de graderias. Amarre de acero de refuerzo en zona de graderias. Excavacion manual en zona de cajoon #3.

23/08/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiaque, martillo, Pala, Pica, cinta metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y Canguro.
Personal en obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 operador y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se continua con demolición de parca de contra piso desde la esquina de la roca hasta el electy (Asfalto). Excavación de cajas electricas y ductos. Amarre de acero de refuerzo en zona de graderias. Encofrado para vaciado de concreto viga: zona juegos de niños. Excavacion manual de caisson #3. Excavación para instalacion de tubería en area de tanque. se realizo (~~illegible~~) recorrido junto a la interventoria para llevar el seguimiento de las grietas presentadas en la pared de la iglesia y el muro de contencion de la via.

Residente de obra

24/08/2023
CLIMA: Soleado.
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Volqueta, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Canguro, Rana.
Personal en obra: 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 operador y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, Coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Retiro de material RCD para liberación de zonas de trabajo se continua con resterreo para vaciado de concreto en viga zona de niños. se continua con amarre de acero de refuerzo en graderias costado Norte de la concha. Excavacion de cajas y ductos electricos. Excavacion manual para caisson #3. Demolicion de escaleras frente ala misionera.

Residente de obra

25/08/2023
CLIMA: Soleado durante todo el dia
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y canguro
Personal en obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 operador y 1 vigilan
Personal administrativo: Residentes 2, Coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se continuo con tedereo de viga en zona de niños. Se continua tambien con tesereo en área de gradenas costado Norte de la cancha. Se continua con excavacion para instalacion de tanque, tambien se realiza entibado en esta área. Construccion de cajas electricas costado sur de la cancha.

Residente de obra

26/08/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y canguro
Personal en obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspecta ETA, auxiliar de topografia ETA.
Se continuo con tedereo en zona de gradenas costado Norte de la cancha. instalacion de tuberia electrica en costado sur de la cancha. instalacion de estructuras para tanque de aguas lluvias vaciado de concreto en viga zona niños.

Residente de obra

27/08/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana, canguro
Personal en obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA
Instalación de formaleta y malla electrosoldada en area de concha. formaleteado en vaciago área zona de niños. Tambien se realizo amarre de acero de refuerzo en vaciago. Desencofrado de viga zona de niños. Instalacion de formaleta en área de graderias

28/08/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana, Canguro
Personal en obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario, 1 vigilante
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se realiza instalacion de formaleta longitudinal e instalacion de malla electrosoldada con distanciadores de cerdosta plastica en area de la cancha. Amarre de refuerzo en zona de graderia costado norte de la cancha. Encofrado de vaciago zona juegos de niños. Acopio de madera. Construccion de cajas y ductos electricos.

29/08/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica Plomada, boquillera, palustre y otros
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana, Canguro
Personal en obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario, y vigilante
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se realizo vaciado de concreto en tramo 2 de las gradenias y vaciado de concreto en seccion de la cancha. De igual forma se realiza acabado en las dos zonas. Tambien se continua con entibado frente a la iglesia en excavaciones para la instalacion de tuberia. Retiro de raiz en area de caisson numero 3. Excavacion en ductos electricos. Se continua con ~~(cortado)~~ encofrado en area de vaciago del muro de contencion zona juegos de niños.

30/08/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, palustre y otros.
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, canguro, Rana.
Personal en obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Personal de interventoria: Residente, auxiliar de topografia social, Inspector de obra.

De manera atenta se le solicita al contratista de obra tener la maquinaria respectiva para ejecutar demolición de escaleras, demolición de baldosa de piso y retiro de RCD. No tener la maquinaria de la obra o tenerla en mal estado afecta negativamente el avance de obra, aumentando el atraso. Esta semana no se trabajó la demolición de baldosa de piso en escaleras a pesar de estar programado ejecutarse según el plan de contingencia de Agosto. Se solicita dar cumplimiento al plan de contingencia presentado a la interventoría.

El residente de obra y el contratista esta instalando los taches de la formaleta con protección en tubería electrica de 1/2"; esta interventoria no aprueba utilizar la tubería electrica para recubrir las varillas que sostienen la formaleta. La interventoria solicita que la varilla que sostiene la formaleta quede dentro de la fundición y asi se reconocerá el acero, se recomienda utilizar varillo de bajo calibre para soportar la formaleta.

Residente de Interventoria

Se solicita al contratista de obra radicar el PMT sobre la calle 36b sur para trabajar el muro de contención junto a la vía; se requiere que el número de esta radicación sea compartido con la interventoria para el seguimiento respectivo.

Se solicita al contratista el informe semanal Nº 34 para revisión de interventoria

Gabriela Mejia Vallejo Residente de Interventoria

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la interventoria se deja anotación de que el informe N° 34 ya fue enviado junto con el oficio OLF1259 2022-485-23 a las 2:05 pm Se continua con excavación manual para tubería en zona de la cancha. Instalación de formaleta en zona de la cancha para vaciado de concreto. Aislamiento con cinguro el area de graderias zona discapacitados. Excavacion manual de caisson numero #3, e instalacion de acero para el primer anillo del momo. Amarre de acero de refuerzo en zona de graderias. Engrasado de madera para el tesereo. Instalacion de malla electrosoldada en cancha trama Z.

Residente de obra

31/08/2023

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiaque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, palustre y otros.

Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana, cinguro.

Personal en dia: 9 ayudante, 8 oficial, 1 operario y 1 vigilante.

Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.

Vaciado de concreto en tramo Z de placa de la cancha, Vaciado de Concreto en voolago zona de juegos de niños. Aislado de placa de concreto cancha. Excavación manual para tubería en zona de la cancha. Amarre de acero de refuerzo en área de gradería zona discapacitados. Instalacion de tesereo en caisson #3. Vaciado de concreto primer anillo de caisson #3.

Residente de obra

BITACORA – MIRADOR ALTAMIRA

31/07/2023.

Visita de supervisión SOHT.
Se evidencia 15 personal de obra y operativo. realizando actividades de excavación para 3 zapatas de estructura metalica remosión y retiro de escombros y material de excavación. excavación para cajas de inspección. electrica y relleno con rajon para la conformación de la vía.

Juan Sebastian Atehua.
Apoyo supervision SOHT.

Residente de interventoría

01-08-/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL : 5:00 PM.
TIEMPO LLUVIOSO

- CONTINUAMOS CON EXCAVACIONES PARA ZAPATAS Y CANALIZACION Y CAJAS ELECTRICAS, EN ESPERA DE APROBACION PMT, PARA INICIAR CON LA SOCIALIZACION, LA FUERTES LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA NO PERMITEN UN AVANCE DE OBRA EFICAZ, A PESAR QUE SE HA IMPLEMENTADO LA COLOCACION DE PLASTICOS PARA PROTEGERSE DE LAS LLUVIAS.

Residente de interventoría

02-08/2023.
H. INICIAL : 7:00 AM.
H. FINAL :
TIEMPO

- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CANALIZACION PARA TRAMO Y CAJAS ELECTRICAS.
RETIRO VIAJE RCD.

- EL DIA DE HOY EL TERRENO AMANECIO EN MALAS CONDICIONES POR LA LLUVIA POR MAS QUE SE PROTEJA CON PLASTICO Y POR MEDIO DE CARPAS IMPROVISADAS SE TRABAJA AL RITMO QUE DEJAN LAS CONDICIONES CLIMATICAS SE ANEXAN FOTOS DE HOY 2 PUESTO Y DE AYER 1 PUESTO





03-08-2023

H INICIAL: 07:00 AM

H FINAL: 05:00 PM

TIEMPO: LLUVIOSO

- LAS CONDICIONES CLIMATICAS SIGUEN AFECTANDO EL TERRENO EN LA NOCHE LLOVIO Y AMANECIO EMPANTANADO SE ANEXA FOTO "SE CONTINUA TRABAJANDO EN ESAS CONDICIONES



CONTINUAMOS CON EXCAVACIONES PARA ZAPATAS Y CANALIZACIONES ELECTRICAS, RETIRO DE RCD.

04-08/2023.
H. INICIAL: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 PM.
TIEMPO: SECO.

- CONTINUAMOS CON EXCAVACIONES PARA ZAPATAS Y RETIRO DE RCD, TAMBIEN CON LA CANALIZACION PARA TUBERIA ELECTRICA. Y CONSTRUCCION DE CAJAS. LLUVIA EN HORAS DE LA NOCHE,

08/08/2023

En visita de supervisión se observo que se realizo trabajos de excavación manual para zapatas de estructura metalica. Esta actividad si ha realizado desde la semana anterior lo cual es insuficiente para mitigar el atraso que presenta la obra. Se solicita tomar medidas necesaria y trabajar en amarre de acero de refuerzo para zapatas para mitigar el atraso. Igualmente se solicita en terreno equipo de topografia para poder cuanta yo que lo inspeccionaron el solicitud. insistentemente este profesional.

KAMM

08-08/2023.
H. INICIAL: 7:00 AM
H. FINAL: 5:00 PM.
TIEMPO: SECO

- SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CANALIZACION PARA CAJAS E INSTALACIONES ELECTRICAS.
- SE INICIA CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DEFINIR NIVELES.
- LA MAQUINARIA BOBCAT QUE SE ENCUENTRA EN OBRA PARA EXCAVACION SE USARA POR LO QUE FUE IMPOSIBLE RETIRAR LA GRAN CANTIDAD DE RCD, QUE TENEMOS EN OBRA, SE PLANTEA SOLUCION PARA MAÑANA 09-08/23.

09-08/2023.
H. INICIO: 7:00 AM.
H. FINAL: 5:00 PM.
TIEMPO LLUVIOSO MUY FUERTES

- SE CONTINUA CON EXCAVACIONES PARA ZAPATAS, ACTIVIDAD AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS,
- EN ESPERA DE APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA COMENZAR A SOCIALIZAR E IMPRIMIR VOLANTES E INICIAR ACTIVIDADES DE DEMOLICION PARA EL MURO DE CONTENCION PRECIO CONTRATADO SON ESTE DEL PROYECTO.

10-08/2023.
H. INICIO: 7:00 AM. TIEMPO: SECO
H. FINAL: 5:00 PM

EXCAVACION DE ZAPATAS A UNA DE ELLAS SE DERRUMBO UNA BOLSA QUE SE HALLO EL TERRENO, A MAS PROFUNDIDAD CONTINUO HABIDO EL TECHO INFORMA QUE MISMO LO PERFILA, SE SOLICITARON VOLANTES Y SE INICIO DESCAPOTE DEL TERRENO EL LO PERFILADO DE LO EXCAVADO.
SE COORDINO CON TOPOGRAFIA EL DIA DE MAÑANA PERFILAR NIVELES PARA FUTURA SOLADO.

11/08/2023
H. INICIO: 07:00 am
H. FINAL 05:00 pm
TIEMPO: LLUVIOSO

-SE REALIZO INICIO DE CERRAMIENTO EN LA INTERVENCION DE LA QUEBRADA, SE CONTINUA CON DESCAPOTE EN ESA ORILLA Y DIRECCION DEL SENDERO PEATONAL PARA EL INGRESO DE LOS HABITANTES DE LA QUEBRADA
-EL MAQUINADOR YA CUMPLIO SU OPERACION SE VA A HACER RETIROS DE MATERIAL Y SE CONTINUA EXCAVACION DE CIMIENTOS
-TOPOGRAFIA TOMA NIVELES Y NOS DEJADO NIVELES TERMINADOS PARA FUNDIR SOLADOS
- EL DIA DE HOY 11- DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTO RESIDENTE RAFAEL RODRIGUEZ G. POR LO QUE SE ESPERA NUEVO RESIDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA, COMO REEMPLAZO, SE DEJA CONSTANCIA EN BITACORA DE OBRA.

12/08/2023
H. INICIO: 07:00 am
H FINAL: 12:00 pm
TIEMPO: LLUVIOSO

PARA SST: EL DIA DE HOY EN COMITE DE VEREDA REALIZADO CON LA COMUNIDAD SE PRESENTO LA QUEJA SOBRE EL ESTADO DE ALISTAMIENTO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA - INSPECTOR DANIEL FELIPE TOLERO, REALIZANDO EL PROCESO CON EL RESIDENTE SST SE LE CONSULTO SI ESTUVO EN ESTE ESTADO. DONDE EL DIJERON QUE EL DIA ANTERIOR SI CONSUMIO BEBIDAS ALCOHOLICAS POR LO CUAL SE LE HIZO EL LLAMADO DE ATENCION Y PROHIBIO EL INGRESO A LA OBRA. CABE RESALTAR QUE DICHO COMPORTAMIENTO PUEDE GENERAR RIESGOS INTERNOS Y CORRECTIVOS, EL DIA LUNES SE TOMARAN LOS RESPECTIVOS TRAMITES INTERNOS PERTINENTES A ESTA MALA CONDUCTA

Jenku Paola Quijano
JEFE SST INTERVENTORIA

FELIPE TAMARO
INSPECTOR - INTERVENTORIA

MARIO FERNANDO ORDOÑEZ DIAZ
SST OBRA

Jennifer Vegas S.
R. Social Interventoría

Daniel Talero R.
Ing. INT.

POR EL MOMENTO SE REALIZA LLAMADO DE ATENCION VERBAL Y ESCRITO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SOLICITANDO SU RETIRO INMEDIATO DE LA OBRA POR PARTE DE LA RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA JESSIKA QUIJANO

14/06/2023.

En visita de supervisión se evidencia. 12 Personal operativo; no hay presencia de residente de obra ni interventoría.
Se realizan actividades de excavaciones para zapatas de cimentación de est. metalica, adecuación del cerramiento cerca a la quebrada.
Se manifiesta preocupación debido a los atrasos tan altos y se le recomienda al contratista e interventoría tomar las acciones que sean necesarias para mitigar dicho atraso y tomar una actitud proactiva para desarrollar actividades de la formas mas eficiente.

J. Sebastián Arellula B.
Apoyo supervisión SPHT.

14-06-2023 Residente SST.

14/08/23
H INICIO : 07:00 AM
H FINAL : 05:00 PM
TIEMPO : SECO

SE CULMINADO EXCAVACIONES MANUALES DE 2 POZOS SE ADJUNTO CUVIO UN VIDEO COMENTANDO DE LA SITUACION DE CADA POZO TOMADO LA CORL POR DIMENSIONES ES COMPLETO DEMOLERO YA QUE ESTO UBICADO ENCIMA DE UN A DE LOS 2 POZOS, SE LLEVARON TODO EL MATERIAL DE EXCAVACION CON 3 VIAJES, SE FUNDE EL SOLADO DE LOS 2 POZOS Y SE DOTARON LOS INGRESOS DE LOS HABITANTES DE LA PARTE DE LA QUEBRADA.

Nicolas Vargas
INSPECTOR OBRA

15/08/23
H. INICIO : 7:00 AM TIEMPO : SECO
H FINAL : 05:00 PM

EL PROYECTO LLEGO EL LUNES RESIDENTE ING. MARIBEL HERRERA DEL CUAL LA INTERVENTORIA YA TIENE LA DOCUMENTACION Y ESTO A ESPERA DE APROBACION, MIENTRAS SE DA EL OK EL SUPERVISOR LLEVADO LA BITACORA. SE INICIA EL EMPALME AL RESIDENTE. DURANTE EL DIA SE CONTINUA EXCAVACIONES LUEGO A OBRA LA PROPUESTA PARA EMPALME PARA CON LA DEMOLICION DE LA POZA LA CUAL TIENE 1 x 1 x 2 DE PROFUNDO. SE RECIBE PERFIL DE MATERIAL PARA CONTEO Y POR PARTE DE DIRECCION DE OBRA SE DA EL OK PARA FUNDIR ZAPATAS EN SITIO Y NO TRAER PREMEZCLADO AL REALIZAR EL REPLANTEO DEL EJE "F" SE HALLO EN SITIO QUE ESTE EJE ESTA SOBRE EL TUBO SANITARIO EXISTENTE POR LO CUAL SE DEBEN HACER LOS CAMBIOS A LA RED NUEVA PRIMERO PARA ASI CONTINUAR CON LAS EXCAVACIONES DE ESE EJE.

Nicolas Vargas
INSPECTOR OBRA

16/08/23

H. INICIO: 07:00 am

H. FINAL: 05:00 Pm

TIEMPO: 8HRS

EN OBRA SE CONTINUAN LAS EXCAVACIONES DE LOS ZAPATAS CON OTRO COMPLEMENTO SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE FUNDIDO DE SOLADOS Y SE REVISA EL PROCESO DE LA OBRA. POR ESTE PUNTO DE MODO LA ROCA SE SEGUIRA CON EL DEMOLEDOR Y DE FORMA MANUAL YA QUE ES NECESARIO MANTENER EL HUECO DE LA ZAPATA ESTE CORRESPONDE AL EJE C'-2'

Nicolas Vargas
INSPECTOR OBRA

Residente de Interventoría

17/08/23

H. INICIO: 07:00 am

H. FINAL: 05:00 Pm

TIEMPO: 8HRS

SE CONTINUAN DEMOLICIONES Y FUNDIDO DE SOLADO EN LAS BASES DE LAS ZAPATAS, POR IMPREVISTO LLEGO EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO PARA EL MONTACARGAS, EL CUAL SE LE HIZO CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE EN SU TOTALIDAD EL EQUIPO QUEDO PARADO DESDE LAS 10:00 HASTA LA 2:00 PM, POR OTRA PARTE SE INICIO EL DESPIQUE DE PEDRILLOS DE LAS ZAPATAS Y PEDESTALES SE ENTREGARON PLANOS AL MAESTRO Y SE FUE VERIFICANDO MEDIDAS CON EL TOPOGRAFO HIZO EL LEVANTAMIENTO COMPLETO DE PISO Y ENTREGARON DISEÑOS AL TOPOGRAFO PARA QUE AJUSTE LAS MEDIDAS E INCLINACIONES EN OBRA QUEDAMOS A LA ESPERA DE LA ENTREGA Y AJUSTES DE ESTOS POR OTRO SE HIZO LA LIBERACION DEL PASION DE LA VIA CENTRAL Y PERIMETRO DE ZAPATAS LO MISMO QUE EL DIA 7-D QUE FUE EL QUE DESDE LA INTERFACE TOPOGRAFO Y ES CON EL QUE SE VINO TRABAJANDO

Nicolas Vargas
INSPECTOR OBRA

Residente de Interventoría

18/08/23
H. INICIO: 07:00 am
H. FINAL: 05:00 PM
TIEMPO: SECO

SE CONTINUARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION, DEMOLICION DE POZO SOLADO, COMPACTACION DE TERRENO, ARMADO DE ACEROS DE ZAPATAS Y PEDESTALES DE 45 x 45 EN LA ZAPATA 14 - D SE ENCONTRO UNA FILTRACION DE AGUA LA CUAL NO DEJABA AVANZAR ESTA HASTA NO HACER LA EXTRACION DEL FILTRO D LA PEGA DE DOS VIGAS Y SE REALIZO RETIRO DE MATERIAL D CONTEO

Nicolas Vargas
INSPECTOR OBRA

Resid de Intervento.

19/08/23
H. INICIO: 07:00 am
H. FINAL: 12:00 pm

SE SOLICITO PERMISO PARA TRABAJAR EL 21-08-23 (LUNES FESTIVO) EL FIN DE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE CONTINUO CON EL SOLADO ARMADO DE ACEROS Y EXCAVACIONES, SE HIZO LA VERIFICACION DE LOS HIERROS FALTANTES DE ZAPATAS, PEDESTALES, Y VIGAS DE AMARRE DE LOS EJES MENCIONADOS FALTO POR VACIAR 12 HIERROS DE LAS VIGAS EL RESTO SI ESTA EL PERMISO Y POR LO CUAL EL CONTRATISTA SOLICITO NO DESCABE LOS ACEROS AFECTADOS DE LA OBRA SI NO EL COMPROMISO HASTA CUANDO SE VAYA A FUNDIR

Nicolas Vargas
INSPECTOR

Resid de Intervento.

21-08-23
H. INICIO: 07:00
H. FINAL: 12:00
TIEMPO: HUMEDO - LLUVIA SUAVE

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION DE ZAPATAS Y REMOCO DE BORDILLOS JUNTO CON PROFESIONALES, DE IGUAL MODO DE HIDROLLICO SOBRE EL TUBO DE 8" NUEVO PARA LA UBICACION DEL POZO EL CUAL SE SIMBRA MOVIDO Y SE EXCAVO. Y EL PROFESIONAL SEMANAL SE REUNIO CON EL MAESTRO SE GIRA PLANO DE TOPOGRAFIA

Nicolas Ibarra
INSPECTOR

Residente Interventoría

22 AGOSTO 2023
En visita de supervisión se observo que si continúa con la actividad de excavación ~~de~~ manual para la cimentación de la estructura metálica, se evidencia armado de acero para zapatas y se encuentra equipo topografico el cual realiza ubicación de zapatas para la liberacion y posterior fundición. Se solicita tener en obra materiales suficiente para ejecución de actividades sector oriental el cual no a tenido ejecucion de obra durante las ultimas semanas.
Se manifiesto la preocupación por el abuso que se presento en obra y si instó al contratista a tener una actud proactiva y tomar las medidas necesarias para superarlo.

SST

22-08-23
H. INICIO: 07:00
H. FINAL: 05:00
TIEMPO: SECO

CON TOPOGRAFIA SE INICIO LA VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION DE ZAPATAS LOGRANDO IDENTIFICAR LOS NIVELES DE EXCAVACION POR OTRA PARTE SE COORDINA RETIRO DE MATERIAL PARA MAÑANA A PRIMERA HORA SE COORDINA EL PASO DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS.
POR SOLICITUD DE SUPERVISION SE SOCIALIZA CON LA SEGUNDA PARTE EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METALICA, EL CUAL SE LE INFORMA QUE ESTE TEMA YA SE HABIA HABLADO DESDE FEBRERO PUNTO INFORMA QUE NO SE DEBEN PONER LOS ESTRUCTURAS METALICAS DEL EJE 6 DESCUBIERTO QUE ESTO ES UN PROBLEMA YA QUE DESDE UN INGRESO PARA QUE LOS VEHICULOS Y/O TRABAJOS SE LES FACILITE EL INGRESO A SU CASA SE LEVANTO EL ACTA CON LA RESIDENTE SOCIAL.
EN OBRA SE CUENTA CON MATERIAL EL CUAL PARA FUNDIR ZAPATAS CONCRETO, HIERRO, MADERA Y ALAMBRES.

Resid. Obra

Resid Interventoria

23/08/23
H. INICIO: 07:00 am
H. FINAL: 05:00 Pm
TIEMPO: 9:00

NUEVAMENTE SE SIGUEN CORROBORANDO NIVELES YA QUE SE IDENTIFICO QUE NO ESTAMOS LLEGANDO AL CORRECTO EMPALME DE LA VIA EXISTENTE SE ESTAN CORROBORANDO CON LOS DISEÑOS. EL CUAL SEGUIMOS EXCAVACIONES Y SE ESTA SACANDO PUNTOS DE LOS MUROS PARA NO TENER INCONVENIENTES DE SOLADO SE HACE RETIRO DE MATERIAL SE CIERRA EL PASO PARA INICIAR ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PENDIENTE DESPUES DE HABER HECHO LA SOCIALIZACION DEL NUEVO INGRESO CON LA COMUNIDAD DESDE LA PARTE AMBIENTAL SE SOLICITO INFORMACION DE COMO SE VA A MANEJAR LOS PASOS PLUVIALES DEL PROYECTO ES DECIR COMO SE CONTROLAN LOS CORRIENTES HACIA LA CARRERA Y LA VIA.

Resid. Obra

Resid Interventoria

24/08/23
H.INICIO : 7:00 AM
H. FINAL : 5:00 pm
TIEMPO : Seco

Se inicia con vaciado de concreto de 2500 psi para solados de los ejes 10F, 9F, 3F, 3B, 2D, 2C También se inicia con la instalacion de acero de refuerzo para las zapatas y pedestales en los ejes 8E, 6E, 5E. Se continua con la excavación manual para la construccion de zarpa y muro de contención de viga Sector oriental. Se continua con el levantamiento topografico de niveles de andenes y via. Y se continua con la excavacion manual para instalacion de pozo de inspección para el traslado y conexión de la nueva red sanitaria domiciliaria.

Resid de Interventoria

25/08/2023
H. Inicio = 07:00 am
H. Final = 05:00 pm
Tiempo = Seco

Resid. Obra.

Se inicia vaciado de concreto de 3000 PSI para la construccion de 3 zapatas en los ejes 8E, 6E, 5E. Tambien se inicia con la instalación de acero de refuerzo de zapatas y pedestales en los ejes C2, F3, B3, E9, E10. Y se corroboro los niveles de concreto con equipo topografico.

26/08/2023
H. INICIO = 07:00 am - 12:00 pm

Resid de Interv.

H. Fin = 12:00 pm
Tiempo = 5cco

R Obra

28/08/2023.
En visita de supervisión se evidencian 11 trabajadores mano de obra no calificada y 1 maestro de obra; realizando actividades de retiro residuos de construcción, desencofrando zapatas y realizando excavación para nuevas zapatas.
Se muestra preocupación debido a los atrasos y recomienda al contratista tomar las medidas necesarias para mitigar dicho atraso presentado en un plan de contigencia aprobado por interventoria previamente.

J. Sebastián Arellula B.
Apoyo supervision SDHT.

28/08/2023
H. Inicio: 07:00 am
H. Fin : 4:30 pm
Tiempo: 5cco

Se realiza descencofrado de zapatas, tambien se realiza vaciado de concreto de 2500 PSI para solados en los ejes C6, C8, C9, C10. al mismo tiempo se amarra acero de refuerzo para zapatas y pedestales Se realiza excavación manual para conformacion de terreno de zarpa del muro de contención Sector oriental.
El dia de ayer Domingo 27/08/2023 Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para Fundir zapatas

El bobcat y la retroexcavadora no trabajaron por problemas mecanicos

R Obra

Resid Interventoria

29/08/2023

Se realizo vaciado de concreto de 3000psi para la construccion de zapatas en los ejes B4, C4, C6, D4. Se continua con amarre de acero para zapatas y pedestales. Tambien se continua con la excavación manual para la construccion de muro en la via sector oriental.
H. Inicio: 07:00 am
H. Fin = 4:30 pm
Tiempo = Seco

R Obra

Resid Interventoria

30/08/2023

Se instala pozo de inspección para traslado de red sanitaria sector occidental de la obra. Se continua con excavación manual para construcción de Muro de contencion margen oriental de la obra. Se instalan cajones para construccion de pedestales. Se extiende Sub-base reciclada para sello de via Sector Oriental.
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 4:30 pm
Tiempo = Seco

Residente obra

Resid Interventoria

31/08/2023

Se realiza compactacion de sub-base reciclada para sello de vía magen oriental, Se continua la excavacion manual para instalacion de tubo de 8" para remplazo de red sanitaria. Se inicia con la compactacion mecanica de terreno para construccion de muro de contencion Sector oriental, Se inicia vaciado de concreto de 3000 psi para construccion de pedestales en los ejes E10, 9, 8, 6. Tambien vaciado de concreto para construccion de zapatas en los ejes C8, 9. Se instala tubo de 8" para de la red sanitaria.

H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 4:30 pm
Tiempo = Seco

R. obra

R-1
Reid Interventoria

01/09/2023

SE CONTINUO CON LA FUNDIDA DE ZAPATAS Y PEDESTALES CON CONCRETO DE 3000 PSI, SE NIVELO LA VIA ORIENTAL CON SUB BASE RECICLADA PREVIO A LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL ESTO CON EL MINUTIN Y LA MINICARGADORA EN EL COSTADO NORTE DE LA VIA SE SIGUE NIVELANDO EL TERRENO. SE EXCAVARON ZANJAS DE EXCAVACION DEL ZOCALO DE MURO DE TOPOGRAFIA CON EL TUBO DE 8" INSTALADO SE HICIERON EXCAVACIONES PARA EMPOTRADOS DE LOS VIVIENDOS

H. INICIO: 07:00 am
H. FIN: 4:30 Pm
TIEMPO: SECO

R. obra

R-1
Reid Interventoria

ANEXO 01 – BITÁCORA DE OBRA
SEPTIEMBRE 2023

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

BITACORA PARQUE BELLO HORIZONTE

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

... concreto, y compactación; sin embargo, en la parte alta del barrio se presenta una tubería rota lo cual es posible una nueva suspención en el día o la semana.
- Continua demolición de tramo de anden existente y sardinel en costado oeste frente 1.
- Continua extendida, revisión y compactación de andenes y rampa de acceso a cancha en frente 1.
- Continua extracción de roca dinamitada de los caisson no. 4 y 5; y continua excavación y preparación para fundir anillos.
- Se realiza el desmonte y reinstalación de cerramiento en polisombra y madera rolliza sobre el costado este del frente 2; logrando de esta manera habilitar la escalera para la circulación provisional de la comunidad y de este modo dar inicio a las tareas de demolición de escalera. Se completan 8 días desde que se solicito la visita técnica por cuenta del personal del acueducto para el traslado de la red de presión que esta paralela ala escalera existente, sin lograr que estos lleven para su evaluación y reinstalación.

N.206 Septiembre 01/2023 Viernes
- 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 boal, 1 ing. topógrafo, 1 aux. topografía, 14 operativos, 1 profesional social.
- Inicia el retiro de escombros. acopiados en el frente 3 junto a la tierra y roca producto de excavación de pilas.
- Se realiza la habilitación provisional de la escalera del costado este del frente 2 para poder realizar el cierre definitivo de la escalera frente 3.
- Continua la demolición definitiva del sardinel y el tramo del anden oeste de frente 1, perimetro de la cancha.
- Inicia el desencofrado del muro tipo 2 del frente 3; vaciado el día de ayer.

144

- Una vez realizada la inspección del cerramiento contraimpacto esta interventoria no avala su instalación hasta que se realicen todos los ajustes de calidad ~~requeridos~~


N. 207. Septiembre 02/2023 Sábado

- 1 inspector de obra, 1 prof. social, 1 maestro de obra, 1 boal, 2 topografía, 12 operativos, 1 retroexcavadora.
- Continua demolición de sardinel en frente 3.
- Continua lleno pisado para conformar en muro tipo 2 del frente 3 las terrazas de juegos de niños.
- Continua compactación de subbase granular en andenes sur del frente 2 y del perimetro frente 1.
- Continua el retiro de escombros y tierra producto excavación de caissons.
- Continua extracción de roca vota con explosivo de caisón no. 6.
- Se presenta fuerte aguacero al medio dia suspende tareas por el resto del día, el volumen de agua afloja la base compactada, ingresa agua en casa de uno de los vecinos, se tomarán soluciones el lunes con personal de obra.

N. 208 Septiembre 04/2023 Lunes

- 1 inspector de obra, 1 prof. social, 1 maestro de obra, 1 boal, 3 topografía, 12 operativos, 1 retroexcavadora.
- Se realiza el desmonte de la valla de obra a fin de intervenir con excavaciones para andenes sur frente 3.
- Continua el lleno pisado del recebo en la conformación de las terrazas de juegos de niños
- Continuan 2 frentes en los acabados de las cajas hidraulicas y eléctricas.
- Inicia la demolición de la escalera existente en frente 3
- Continua el lleno del filtro francés del tramo de muro tipo 2 en el frente 3, fundido

4/9/23 - Se realiza visita de control tecnico se evidencia cumplimiento del plan de contingencia de acuerdo a compromiso del comite de 31/08/23 falta personal de cuadrilla, se devuelve requerimiento por calidad, se solicita al SST, requerimiento señalizacion en sendero habilitado para circular.

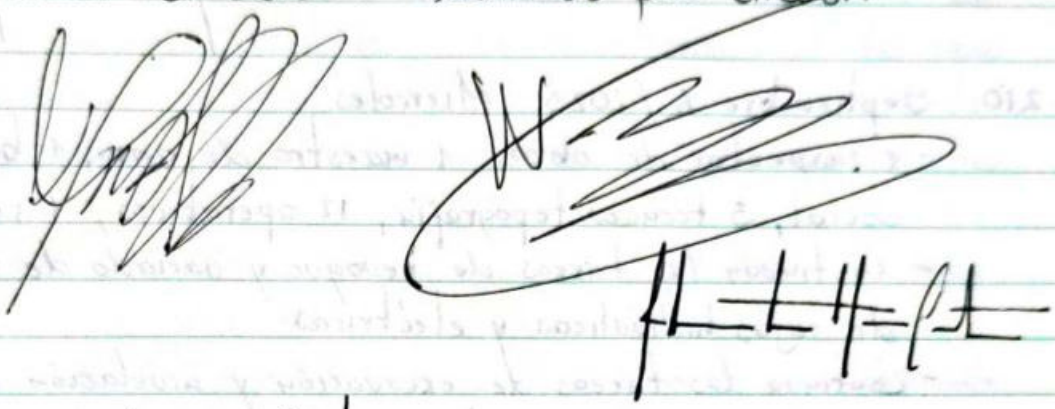

N. 209 Septiembre 05/2023 Martes

- 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 prof. social, 3 de topografia, 1 boal, 12 operativos.
- Se termina la demolición de la escalera del frente 3.
- Se realiza el replanteo del tramo superior de la nueva escalera del frente 3; posterior a esto se trata y da inicio al corte y excavación de estas.
- Se replantea y se da inicio a la excavación de la terraza de juegos infantiles de la parte alta del frente 3. (M)
- Inicia la excavación manual del tramo de sendero en el frente 2 y 3 donde da inicio de la nueva escalera.
- Se realiza el retiro de escombro sobrante tras demolición de escalera en tramo 3er. frente; así mismo, se realiza lleno conformando zona de descanso escalere frente a terraza de juego de niños parte baja.
- Continuan las tareas de revoque en cajas hidráulicas y electricas en frentes 1 y 2.
- las tareas de excavación han sido sumamente engorrosas toda vez que persiste la presencia de la tuberia de 3" de la red de acueducto de la urbanización. Se han hecho 9 llamados al sr. Jorge Barriga ingeniero jefe de zona 4 del acueducto de Bogotá, asignando 4 citas durante las ultimas 3 semanas sin lograr que el o otros

funcionarios asistan para evaluar la necesidad de las obras de desviacion de esta red para poder continuar con la conformacion, nivelación y construcción de escaleras y terraza de frentes 2 y 3.

N. 210 Septiembre 6 / 2023 Miercoles

- 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 boal, 1 profes. social, 3 técnicos topografia, 12 operativos, 1 retroexcavad.
- Continuan las tareas de revoque y vaciado de marco y cinta de cajas hidráulicas y eléctricas
- Continua las tareas de excavación y nivelación mecánica para la conformación de escaleras y terrazas en el frente 3.
- Se realiza lleno, nivelación y perfilado con maquinaria de franja zona verde entre muro tipo 2 y anden sur frente 3.
- Se realiza excavación para lleno y conformación anden sur frente 3.
- Se completa demolición y retiro de andenes y sardineles de los frentes 2 y 3 costado sur.
- Se rectifica con topografía nivel de terraza de gimnasios biosaludables y terraza frente 3 zona juegos infantiles.
- Se presentan lluvias moderadas y frecuentes durante el día, relentizan sin suspender las tareas de obra.

N. 211 Septiembre 7 / 2023 Jueves

- 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 prof. social 1 prof. ambiental, 1 boal, 3 técnicos topografía, 9 operativos, 1 prof. SST
- Continuan las tareas de revoque y fundido de las cintas con marco en cajas hidráulicas y eléctricas.
- Se termina la excavación para tramo de anden sur del frente 3.

- Da inicio al lleno y compactación de la base granular en el tramo del anden sur frente 3.
- Se toman densidades de la base en los andenes perimetrales del frente 1 y la rampa de acceso a la cancha.
- Antes de dar inicio nuevamente a las excavaciones en el caisson no. 6 se hace necesario realizar la extracción de las aguas lluvias y negras filtradas en el terreno; durante toda la tarde se realiza esta tarea a fin de retomar excavaciones el dia de mañana.
- Se trasiega B600 para terminar de conformar las terrazas de juegos infantiles en el frente 3.
- Continua el montaje de las cerchas para la reinstalación de la valla.

N.212 Septiembre 8/2023 Viernes

- 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 boal, 1 prof. social, 3 técnicos en topografía, operativos, 1 prof. SST
- Continua las tareas de revogue y vaciado de cintas con marcos en cajas hidráulicas y electricas faltantes del frente 2.
- Continua la compactación de la base del tramo del anden sur del frente 3.
- Inicia la instalación de la formaleta para los andenes del frente 1.
- Se hace necesario extraer el agua con bomba del caisson no. 6 el terreno alcanza a filtrar nuevamente.
- Se reinician las tareas de excavación y extracción en el caisson no. 6.

N. 213 Septiembre 9/2023 Sábado

- 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 boal, 3 técnicos topografía, 1 prof. SST, 1 prof. social, 1 prof. ambiental, operativas.
- Continua la compactación de subbase para tramo andén sur frente 3.
- Continua excavación para conexión red hidráulica para salida caja ciega en frente 3 hacia vía existe.
- Se funde anillo 11 en pila no. 6.
- Continua llenos y compactación en terraza juego de niños con recebo común.
- Se levanta ultima caja eléctrica faltante en frente 2 junto a escalera.
- Se avanza en el revoque de cajas hidráulicas y eléctricas, se funden cintas incluido marco.

N. 214 Septiembre 11/2023 Lunes.

- 1 profe. SST, 1 prof. Social, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 3 técnicos de topografía, 1 boal, 1 prof. ambiental, 7 operativas.
- Se presentaron fuertes lluvias durante el fin de semana y al caer a lavar parte del material compactado del andén sur frente 3; se procede a reconformar y compactar.
- Continua excavación red aguas lluvias para salida caja hidráulica ciega del frente 3.
- En recorrido con supervisores de SDH se evaluan los posibles acabados en la intervención del andén perimetral de la junta de accion comunal; planteando la alternativa de solo demoler el acabado existente y enchapar con adoquin para continuar con el lenguaje arq. del parque; estan en estudio opciones para la reconfiguración de la rampa de acceso al salón comunal y la escalera. personal de apoyo a la supervisión los señores Wilson Ramirez y Mauricio Illera.

11 Sep Se realiza visita de control tecnico
- Se realiza la solicitud de IUC al plan de contingencia, no se evidencia un incremento significativo en personal y frentes de obra.
- Se solicita inicio de intervencion el sector del pompeyano, terminacion de terrazas y andenes circundantes.
- Solucion al tema de tuberia acueducto, para ejecutar escaleras diagonales

- Continua el trasiego de la piedra para la construcción de los gaviones estructurales que soportan la terraza alta de juegos de niños en el frente 3.
- Se inicia la dispendiosa tarea de excavar y mostrar el tubo de la red de acueducto para evaluar su estado, grado de interferencia en la construcción de terrazas y escaleras del frente 3; toda vez que tras 3 semanas a sido imposible conseguir la visita del personal técnico de la empresa del acueducto para hacer la desviación requerida y asi no atrasar más este frente de obra

N215 Septiembre 12/2023 Martes
- 1. maestro de obra, 1 boal, 1 inspector de obra, 3 técnicos topografia, 1 prof. social, 1 prof. sst, 7 operativos
- Continuan las tareas de acabados de la caja hidráulica del anden sur frente 3.
- Continua la excavación manual lenta y delicada para exponer el tubo de 3" presión del acueducto de Bogotá para estudiar la alternativa de deprimirla al menos 60cm y lograr

...que por su flexibilidad logre pasar por debajo de la estructura de la terraza delos gimnasios biosaludables; esto ante la nula respuesta del Ing. Jorge Barriga jefe sector 4 del acueducto de Bogotá.

- Continua el trasiego de piedra para construcción de gavión estructural de la terraza de juegos infantiles frente B.
- Inicia la instalación de la malla electrosoldad para el vaciado de los anden norte y rampa de acceso a la cancha.
- Se evidencia que es necesario cortar y demoler un pequeño tramo mas del anden existe. junto a la casa adyacente a la rampa de acceso a la cancha.

N.216 Septiembre 13/2023 miercoles

- 1 Boal, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 prof. social, 1 prof. SST, 3 técnicos en topografía, 7 Operativos.
- Continua la excavación manual para construcción de gavión estructural terraza juegos de niños.
- Continuul el trasegar de la roca para gavión estructural.
- Se termina de instalar malla y formaleta para vaciado de concreto en rampa acceso cancha y anden norte frente 1, cancha.
- Se pospone el vertido de concreto puesto que este ya sumo solo es posible que la planta despache despues de las 5:00 pm; por lo cual se reprograma para el día de mañana a las 7:00 am.
- Se realiza excavación e instalacion de tuberia 3" para acometida electrica en frente 2.
- Se trabaja de forma continua en los acabados de cajas electricas e hidraulicas frente 2.
- Se rectifica en planos el diseño de la escalera oblicua del frente 3, ajustando o implementando las condiciones reales de terreno a fin de garantizar las medidas en los rangos de los peldaños; Se realiza el ajuste y su respectivas implantaciones.

- Se realiza visita y recorrido con el ingeniero Edgar Muñoz con quien se presenta lo ejecutado a la fecha en lo correspondiente a todo el capitulo eléctrico - serie 6 de Codensa; las observaciones de él se presentan en Informe de visita.
- Se realiza corte y demolición de un tramo de anden contra la casa adyacente a la rampa de acceso a cancha.
- Se realizará mañana visita taller para ver estado del cerramiento.


N. 217 Septiembre 14/2023 Jueves.

- 3 técnicos en topografía, 1 boal, 1 inspector de obra 1 maestro de obra, 1 prof. social, 1 prof. SST, 1 prof. ambiental, 9 operativos.
- Inicia a primera hora el vaciado de la rampa de acceso a la cancha.
- tras la observaciones realizadas el día de ayer por el ingeniero Edgar Muñoz, se acude a desmontar un tramo de tuberia electrica en el frente 2, por motivo de estar muy superficial en el terreno.
- Inicia el montaje del gavión y su lleno en piedra en la zona de juegos infantiles.
- Inicia la construcción de la muestra del gavión arquitectónico en uno de los muros tipo 1 del sector 2.
- Continuan las excavaciones para la instalación de la tuberia de la red eléctrica en el frente 2.
- En horas de la mañana personal de interventoria y la alcaldía toman imagenes aereas del parque para seguimiento de avance de obra.
- Iniciada la instalación de la muestra del gavión arquitectonico, se suspende tada vez que durante el recorrido con los supervisores de la entidad: Wilson Ramirez y Mauricio Illera, se puera percibir la cantidad de elementos que contiene cada modulo por la sustración de grafil 4mm en la cara frontal, los cuales van cada 3.3cm

... determinaron que es mejor revisar el construir gaviones con malla de alambron con triple torcion y así evitar un rápido deterioro por mal uso de la comunidad.

N.218 Septiembre 15/2023 Viernes.

- 1 prof. Ambiental, 1 prof. social, 1 prof. SST, 1 boal, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 9 operativos.
- Continua la construcción de los gaviones estructurales de la terraza de juegos de niños.
- Inicia excavación manual para la rampa de la escalera. S.3.
- Inicia excavación manual para construcción de muro en piedra para dar estabilidad a escalera sector 3 tramo inferior contra cerden sur.
- Continuan tareas de acabados para caja eléctrica en zona alta sector 3.
- Continua excavación para conformar nivel de descansos escalera sector 3.
- El día de ayer durante recorrido del comité de obra, se evaluó la apariencia de la muestra que se estaba instalando de acuerdo con el diseño y en esta se hizo evidente que el diseño es susceptible de un rapido deterioro por cuenta de la comunidad por lo cual se presenta la siguiente opción o alternativa por cuenta del ingeniero Mauricio Illera a fin de mejorar considerablemente la estabilidad, sin perder las propiedades esteticas del gavión y con evaluación financiera por...

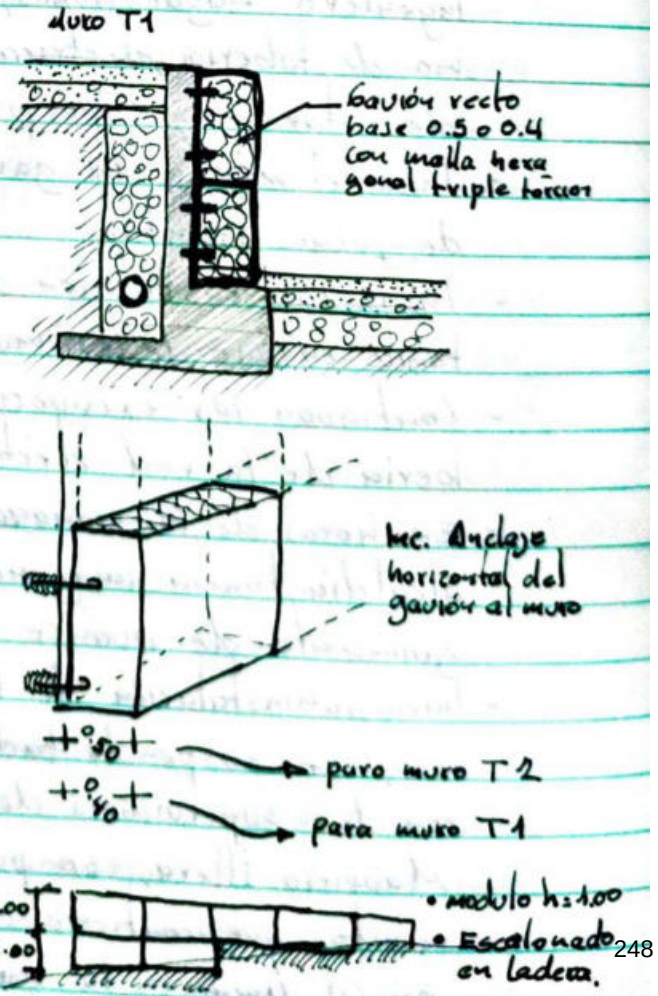

--- cuenta de consorcio Tinguo y de la interventoria.

[redacted]

V. 219 Septiembre 16/2023 Sábado

- 1 prof. social, 1 maestro de obra, 1 inspector de obra, 1 boal, 3 técnicos topografía., 1 prof. SST., 9 operativos.
- Continua construcción de gaviones estructurales en terraza juegos infantiles sector 3.
- Durante la excavación manual para la conformación del terreno en el sector 3 para la escalera, aparecen rocas de gran dimención, se hace necesario realizar su ruptura y trasiego para remover y recomponer la sobre excavación generada por su retiro.
- terminada la excavación manual para conformar el cajón y superficie; se da inicio a la construcción del gavión estructural y muro en piedra que soporta la escalera del sector 3 en la parte baja, junto al ander sur.
- Continuan excavaciones para acometida entre cajas electricas frente 3 tramo alto de escaleras.
- Continua excavación y perfilado de escalera.

[redacted]

N. 220 Septiembre 18/2023 Lunes.

- 1 prof. social, 1 prof. SST, 1 boal, 3 técnicos de topografía, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, operativos.
- Continua el armado de gavión estructural para dar estabilidad a la escalera.
- Iniciar tareas de lleno compactado con base para terraza juegos infantiles frente 3; se chequea pendientado y niveles con topografía.
- Durante las excavaciones para la rampa de la escalera, finalmente se solto una unión de manera imprevista de la tubería de 3" presión del acueducto de Bogotá, generando una

... fuga de agua que deterioro todo el material compactado en el anden sur sector 3. Se hace llamado de emergencia a la empresa del acueducto de Bogotá y se informa via whatapp al jefe de zona.

N.221 Septiembre 19 de 2023 Martes.

- 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 prof. social, 1 prof. SST, 1 boal, 3 técnicos topografía, 6 operativos.
- El día de ayer se presentó una fuga masiva de agua de la red del acueducto en la red que cruza el sector 3, esto por motivo de desprenderse una "unión" de 3" de fijación mecánica; se realiza con personal de obra la unión nuevamente de los tramos de tubería y se arma un burro en acero para fijar la unión PVC y evitar futuros desplazamiento y evitar la ocurrencia de este incidente de nuevo. Se resalta que en el momento en que ocurrió esta situación, se realizarón por diferentes integrantes de la obra, llamadas a la empresa del acueducto ante el posible desabastecimiento de agua en el barrio y tambien se le informó al sr. Jorge Barriga de esta situación sin lograr respuesta o visita para mitigar esta situación. Finalmente con personal de obra se logra el empalme y sello en la red; se corrije a demás la cimentación de esta tubería y se respalda con el gavion estructural del tramo 1 de la escalera; se da constancia de lo anterior a la interventoria. Entre los daños y retrocesos generados estan:
  * Barrido y deterioro total de la base y recebo compacta para el anden sur sector 3.
  * Fue removido todo el material de lleno y conformación al rededor de la caja hidraulica del anden.
  * Al fijar el punto de unión de la tuberia y estructurar la escalera se reajusta el nivel de implantación escalera; este pasa a evaluación y ajuste con topografía.
- Se trabaja en la nivelación de drenes

... superior sector 3.
- Se realiza excavación manual para lograr talud de escalera sector 3 en sus tramos Alto y bajo.
- En el tramo medio de la escalera sector 3, se encuentra una piedra de gran tamaño la cual se esta fracturando para removerla desde el dia de ayer; esta roca esta retrasando el resto de la excavación de este tramo de escalera.
- Se completa construción de gavión estructura para soportar arranque de escalera y tuberia acueducto.
- Inicia construcción de muro en concreto ciclopeo para nivelar talud y perfil de escalera sector 3 junto al ander sur sector 3.
- Se realiza la toma de densidades en terraza juego niños y tramo ander sur sector 3; estos dieron 93% y 90% respectivamente; se acata recomendación de dar mayor humedad y realizar pisado general con lo cual se logra la densidad; y reconstituir el tramo deteriorado por las aguas del tubo desprendido.
- Se realiza excavación para tubería red electrica en el sector 3.


N.222 Septiembre 20/2023 Miercoles.
- 1 maestro de obra, 1 boal, 1 inspector de obra, 3 técnicos topografía, 1 prof. social, 1 prof. SST, 6 operativos.
- Continuan las excavaciones para lograr talud e inclinación para tramos alto y bajo de escalera sector 3.
- Finalmente se logra la ruptura y extracción de la roca hallada en el tramo media de la escalera. (Pendiente llenar cavidad sobreexcavado generado
- Se realiza visita en conjunto con residentes técnicos de la interventoria al taller de producción de los módulos del cerramiento contra impacto de la cancha; donde se evidencian todas las acciones correctivas tanto a los platinos

... barras y acabados en general, se alcanzan a evidenciar algunos leves detalles de soldadura los cuales se acuerda subsanar durante la instalación en campo; dicho lo anterior se optiene visto bueno para traslado e instalación del cerramiento.
- Se realiza replanteo final de anden superior escalera donde se involucra y da solución a las aguas lluvias que conducirán los andenes hasta un carcamo colector y también dar solución al B.D.U. de la casa que limita con el parque que entrega las aguas libremente en el terreno del parque.
- Se corrige % de humedad y compactación en terraza juegos de niños sector 3.
- Se complete excavación manual y se funde concreto de limpieza para bordillo anden superior escalera y caja eléctrica sector 3.

N.223 Septiembre 21/2023 Jueves.
- 1 Bool, 3 técnicos topografía, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 prof. SST, 1 prof. social, 6 operativos.
- Inicia la mamposteria caja electrica sector 3 terraza juego niños alta.
- Continuan excavaciones red electrica que conecta Sector 2 y 3 en zona descanso escalera.
- Continua excavación manual para conformar nivel de tramo alto escalera sector 3.
- Continua instalación y modulación escalera tramo bajo sector 3.
- Se realiza el armado de las canastas de acero y la instalación de formaleta para el vaciado de los bordillos de confinamiento del tramo de sendero superior tramo alto escalera sector 3.

N. 224 Septiembre 22/2023 Viernes.

- 1 prof. ambiental, 1 prof. SST, 1 prof. social, 1 boal, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 3 técnicos topografía, 10 operativos, 1
- Continua el perfilado y excavación manual para la escalera sector 3, tramo alto.
- Continua instalación de formaleta para vaciado de bordillo de confinamiento del anden tramo superior escalera sector 3.
- Se trabaja en los pañetes e instalación del marco para la caja eléctrica sector 3 terraza de juegos infantiles.
- Continuan tareas de mamposteria caja hidráulica sector 2 esquina nororiente que recoge aguas del carcamo.
- Inicia el corte y lleno de juntas de dilatación para las placas de concreto de los andenes y de los muros de contención tipo 1 y tipo 2. (se anexa gráfico avance).
- Continua excavación manual para red eléctrica que conecta sector 2 y 3 a la altura de segundo descanso escalera.
- Inicia la instalación de los módulos del cerramiento de la concha.
- Inicia instalación de formaleta para vaciado de concreto en cara externa de cajas eléctricas con un espesor mínimo de 20cm y de esta manera cumplir con la regulación del serie 6 de codensa

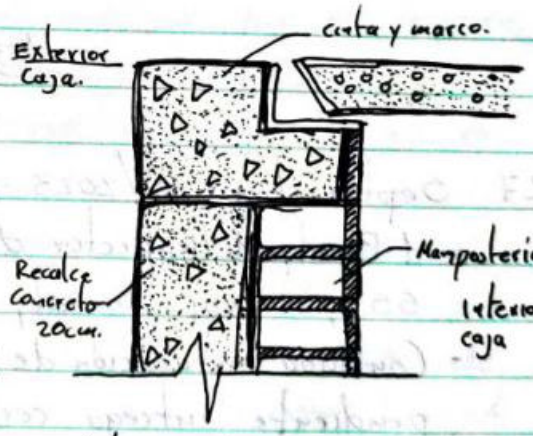

N. 225 Septiembre 23/2023 Sábado

- 1 maestro de obra, 1 inspector de obra, 1 boal, 3 técnicos topografía, 1 prof. social, 1 prof. SST, 14 operativos.
- Continuan las tareas de excavación del caisson no. 4.
- Se realiza el vaciado del bordillo contenedor para el anden

... norte sector 3 tramo alto escalera.
- Se funden los recubrimientos en concreto de las cajas eléctricas del sector 2 expuestas en ladera; espesor 20cm.
- Continua instalación de cerramiento contra impacto en cancha serto 1.
- Se encuentra rocas de gran tamaño que deben de ser fracturadas para continuar con la excavación manual en ladera del trano alto escalera sector 3.
- Continua la lenta excavación para la reubicación del tubo de la red de presión 3" del acueducto.
-

[redacted]

N. 226 Septiembre 24/2023 Domingo
- 1 maestro de obra, 9 operativos, 1 inspector de obra.
- Se desmonta formaleta tras vaciado de recubrimiento de cajas electricas y bordillo anden norte frente 3.
- Continuan las tareas de instalación de los módulos del cerramiento contraimpacto de la cancha.

[redacted]

N. 227 Septiembre 25/2023 Lunes
- 1 Boal, 1 Inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 prof. SST, 1 prof. social, 3 técnicos topografia, 13 operativos
- Continua instalación de cerramiento contra impacto; esta pendiente entrega certificado del RAL de color definitivo.
- Continua excavación manual red eléctrica y la instalación de tuberia entre los frentes 2 y 3.
- termina el desencofrado de la formaleta de las cajas eléctricas sector 3 y de la grada en cancha sector 1; en esta zona durante recorrido de supervisión con el ingeniero (William) Ramirez Wilson, se plantea la necesidad de recalsar y homogenizar la superficie horizontal de la...

25/04/23 Se realiza visita de control técnico
- Se realiza seguimiento exousto al plan de contingencia, para acondicionar frentes de obra donde haya trabajo y personal operativo.
- El replanteo de la escalera, genero demoras
- Comunicarse con el Arq Roa de la SDHT, para seguimiento de tramites con entidades ESP.

...(Continua sep. 25/2023)
grada sur que esta a media altura; para lo cual se usara recursos de item de Vigas y acero según requiera.
- Continua la ruptura de rocas de gran tamaño encontrada en la zona de excavación del talud escalera tramo alto del sector 3.
- En recorrido con especialista hidráulico en horas de la mañana se evaluan los siguientes temas:
  * Conexión de sumidero reubicado por pompellano con la misma red colectora de los sumideros existentes viendo que es un recurso viable y que no hay restricción a este planteamiento.
  * Reubicación de carcamo colector aguas lluvias en escalera; la cual inicialmente eran 2 tramos pero en ajuste de diseño se optimizarón en 3 tramos y 2 descansos permitiendo que su nueva ubicación recoja mas agua dex dos de los 3 tramos evacuando en el mismo trazado del diseño de aguas lluvias. (Sin cajas internas)
  * Drenaje de filtros en muros T1 sector 2; para el caso de estos, basta con los drenajes pasantes que se dejaron a lo largo de todo el muro para evacuar y entregar sobre la siguiente zona verde.

N. 228 Septiembre 26/2023 Martes

- 11 operativos, 1 maestro de obra, 1 inspector de obra, 1 boal, 3 técnicos topografía, 1 prof. sst, 1 prof. social
- Continua excavación de caisson 4 hasta llegar a metro 7. se arma y funde anillo 7.
- Inicia excavación para dados postes de alumbrado en sector 2.
- Continua instalación de cerramiento contra impacto de concha, sector 1.
- Se replantea límite final muros tipo 1 sector 2 contra escolera de sector 3.
- Continua excavación red electrica sector 3.
- Se instala malla electrosoldada para vaciado orden sur sector 2 y costado oeste sector 1.
- Inicia excavación en sector 1 para tunelear y lograr el cruce bajo la vía de la red eléctrica.
- Inicia instalación de formaleta para viga borde en casa contigua a rampa acceso concha.

N. 229 Septiembre 27/2023 Miercoles

- 1 boal, 1 prof. social, 1 prof. SST, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 3 técnicos topografía, 13 operativos.
- Durante el día de hoy se presentan fuertes lluvias durante 3 horas ~~al medio dia~~. Suspendiendo las actividades y relentizando el reinicio.
- Continuan las excavaciones en el caisson no. 4; esta actividad se suspendió por lluvias, en la tarde se hizo necesario extraer el agua y se suspende el vaciado de anillo toda vez que la concretera se atraso a la entrega por lluvias y caos vehicular en la ciudad por manifestaciones.
- Continua la excavación manual para los dados de los postes tanto en los frentes 1 y 2.

- A primera hora da inicio el vaciado del tramo de anden oeste del sector 1 y a media mañana el anden sur del sector 2.
- Se funde el solado de limpieza (concreto pobre) para las vigas llave de la escalera tramo bajo sector 3.
- Se funde la viga bordillo paralera a la rampa de acceso contra el costado de la casa del secto 1.
- Continua las tareas de soldadura y fijación de los módulos de cerramiento contra impacto, sector 1, concha.
- Se instala malla para vaciado de terraza de juegos de niños; Para el día de hoy estaba previsto realizar el vaciado de esta área y se pospone ante los retrasos por lluvias.
- Continua excavación para red eléctrica sector 1 en dirección a acometida en caja de aforamiento.

N. 230 Septiembre 28/2023 Jueves

- 1 boal, 1 prof. social, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 1 inspector de obra, 3 técnicos topografía, 13 operativos.
- Se realiza el vaciado de la terraza de los juegos de niños sector 3.
- Se realiza vaciado de concreto anillo caison no. 4.
- Continuan soldado e instalación de cerramiento contra impacto.
- Continua instalación de formaleta para tramo inferior escalera sector 3; en este mismo espacio se realiza el vaciado del concreto pobre o solado de limpieza.
- Continua excavación manual para acometida eléctrica en tramo que cruza la via sector 1.
- Se realiza la instalación de una muestra del gavión planteado para los muros arquitectónicos; este se realiza en un tramo de muro tipo 1 sector 2. Una vez presentado a interventoría, se evidencian varios aspectos a corregir antes de lograr su visto bueno; motivo por el cual se rea

...lizará una segunda muestra corrigiendo las observaciones señaladas y con la corrección del anterior para presentar nuevamente.

[redacted]

N. 231 Septiembre 29/2023 Viernes

- 1 boal, 1 maestro de obra, 1 inspector de obra, 1 prof. social, 1 prof. SST, 3 técnicos topografía, 18 operativos.
- Continua instalación formaleta escalera S3 tramo inferior.
- Continua excavación caisson 4 a nivel metro 8.
- Se encuentro roca en caisson se procura su ruptura manual.
- Continua excavación para acometida eléctrica sector 1.
- Continua instalación cerramiento contra impacto concha.
- Continua excavación para dados postes sector 2 y 3.
- Se realiza revisión de la parte de los profesionales eléctricos tanto Consorcio Tingua como los de interventoria para revisar y evaluar tanto el avance de las tareas como la correspondencia y coherencia entre los ajustes realizados en campo y el diseño original; tambien se exponen las dificultades y soluciones dados en obra. Asi mismo, se dictan algunos ajustes necesarios en cuanto a ubicación y construcción de los dados de soporte postes.
- Se realiza visita finalmente por cuenta del personal del acueducto de Bogotá, quienes finalmente dan las indicaciones de hacer la solicitud a la entidad y mediante un contratista autorizado, realizar las obras necesarias para la reubicación de la red y del acompañamiento permanente de topografia para la memoria cartográfica de la red ajustada. toda vez que el tramo existente será clausurado, no hay limitación en la realización del vaciado de escalera y descansos tramos bajo y medio de la escalera.

[redacted]

N.232 Septiembre 30/2023 Sabado

1 Inspector de obra, 1 boal, 3 técnicos topografía, 1 maestro de obra, 1 prof. SST, 1 prof. social, operativos.

- Llegan a obra las cuastillas para vaciado de los dados de los postes.
- Continuan tareas de cerramiento contra impacto cancha; el día de ayer se tomarón pruebas parciales de espesor de pintura, mostrando que en efecto solo falta la capa brillante y esmalte de color definitivo que se deja para dar una vez terminen los trabajos calientes (soldadura y pulido) y se hagan pruebas de tintas y particulas.
- Se completan las excavaciones y linearmientos posibles para los dados de los postes en la zona de la cancha.
- Continua instalación de formaleta para vaciado de escaleras en concreto, tramo bajo sector 3.
- Se funden dados y paredes cajas eléctricas en los 3 sectores 5:00pm

N.233 Octubre 01/2023 Domingo

- 1 maestro de obra, 6 operativos.
- El dia de ayer se fundió 2/3 de la escalera tramo bajo sector 3, hoy se retira la formaleta.
- Continua instalación de cerramiento contra impacto cancha

N.234 Octubre 02/2023 Lunes

- 1 maestro de obra, 1 boal, 1 prof. SST, 1 prof. social, 3 técnicos topografía, 1 Inspecto de obra, operativos.
- Continua instalación de cerramiento contra impacto en cancha sector 1.
- Continuan tareas de excavación manual en talúd escalera tramo medio sector 3.
- Continuan excavaciones manuales en descansos y terrazas del

ANEXO 3. –BITACORA DE OBRA PARQUE LA JOYITA

vadora Kubota USD. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Arquitecto de Obra.

Se hace la aclaración de que la terminación del muro concreto ciclopeo en el costado occidental el ingeniero Director de Obra, le manifiesto a esta interventoría que no quedaba con la misma o igual terminación del resto del muro y que se dejaba en terminación de presentación rustica (Relación piedra-concreto a la vista) y encima de este se realizaría el muro gavion arquitectonico, y se evitaba la construcción de placa de concreto.

Viernes 01/sep/023

Bahia Parqueadero: Se funde el anillo número 6 del caisson B9, anillo numero 9 del caisson B3. Totem: Se funde el anillo número 3 del caisson del totem numero 2. Bomba estacionaria: Se avanza con las excavadas de los vastagos de dos modulos del muro tipo 1. Planchita central: Excavacion modulos C2, D, E, F y G del muro tipo 2. Salón comunal: Se continua con el armado del alero de las vigas de la cubierta principal, y el remate del concreto vigas del muro tipo 3. Ora nublado. Personal de obra: maestro, como oficiales, cuatro ayudantes, boal, operador. Maquinaria: Retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de Obra, Director de obra.

Sábado 02 sep/023

Bahía parqueaderos: Se funde el anillo número 4 del caisson 134, y se continúa con la excavación del anillo 7 del caisson 139. Totems: Se realiza la excavación del anillo 4 para el caisson del totem número 2. Plazoleta central: Se realiza la excavación para los muros tipo 2. Salón comunal: Se continúa con la construcción del remate del concreto ciclopeo del muro tipo 3, y remate de acero para las escaleras. Día nublado. Personal de obra: maestro general, cinco oficiales, cuatro ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retro excavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Domingo 03 sep/023

Se trabaja en el concreto de limpieza para las módulos del muro tipo 2 de la Plazoleta central. Personal de obra: Dos oficiales, tres ayudantes. Personal administrativo: Residente de obra, SST.

Lunes 04/09/23 Se realiza visita de control técnico → se evidencia falta de personal en zona de parqueadero, se solicita en los caisson, definir profundidad final para formar ejecución de esta actividad, se evidencia un atraso en la actividad de la placa de la placa superior de parqueadero, en conclusión vamos retrasados en el seguimiento a los planos de contingencia, de acuerdo a los compromisos establecidos en comite de 31/08/23

Norma

Bahia Porgueadero: Se funde el anillo número 5 del caisson B4; Totan número 2: Se funde el anillo número 4 del caisson. Bomba escalera 1: Se da inicio a las excavaciones. Plataforma central: Se continúa con el concreto de limpieza y se da inicio al armado del alero de los módulos E y F del muro tipo 2; se continúa con las excavaciones y conformaciones para los anclajes y retiro de material. Talón comunal: Se continúa con el armado del alero de la escalera principal. Día nublado. Personal de obra: maestro general, cinco oficiales, dos ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directos de obra.

Martes 05 Sep/023

Bahia Porgueadero: Se funde el anillo número 7 del caisson B9, y anillo 6 del caisson B4; se da inicio a la excavación del anillo número 4 del caisson B8. Bomba escalera 1 y 2: Excavaciones, instalación de geotextil, Base granular. Plataforma central: Armado de acero de tres módulos. Talón comunal: Armado de acero escalera principal, y anclajes muro tipo 3. Se presentan lluvias intermedias de 9:00 am a 9:30 pm. Personal de obra: maestro general, dos oficiales, cuatro ayudantes, operador, bodeguero. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directos de obra.

*Se continúa con el traslado de los árboles, a mano con el troshado y reubicación de los árboles, y excavaciones y retiro de material. Maquinaria: Retroexcavadora Caterpillar 320D.

Miercoles 06 Sep/023

Bahia Porgueadero: Se funde el anillo número 4 del caisson B8, y anillo número 7 del caisson B4; se realiza la excavación del caisson B9 anillo 8. Centro comercial: Se funde el concreto de limpieza para el módulo 12 del muro tipo 2. Bomba escalera 1 y 2: instalación de geotextil, extendido y compactación de base granu-

Bar. Plazoleta control. armado de acero de tres módulos de seis metros del muro tipo 2. Parqueadero salón comunal: Encofrados muro tipo 3, y armado de acero escalera principal; Se da inicio al armado o excavación para cuatro cajas eléctricas. Día nublado. Personal de obra: Maestro general seis oficiales, quince ayudantes, operador, bool. Maquinaria Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Jueves 07 sep/023

Bahía Parqueadero: Se funde el anillo 8 del caisson B9, anillo 5 del caisson B8, y anillo 8 del caisson B4. Rampa escalera 1 y 2 → Se funde el vástago de los módulos E, y se continúa con la extendida de Basa para las tres áreas. Tendera separar → Se inicia el armado del acero del módulo 12 del muro tipo 2. Plazoleta control: Se funden las zarpas de los módulos C2 y D del muro tipo 2. Salón comunal: Encofrados muros muro tipo 3, armado de acero escalera principal, construcción cajas eléctricas. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, seis oficiales, quince ayudantes, operador, bool, Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50.

Viernes 08 sep/023

Bahía parqueadero: Se da inicio a la excavación del anillo 6 del caisson B8, y se funde el anillo número 9 del anillo 8 caisson B4 Se funden las zarpas del módulo E de la Plazoleta control, y módulo 12 del tercero superior, del muro tipo 2. Redes eléctricas: construcción de seis cajas eléctricas. Plazoleta control: Encofrados vastago muro tipo 2 módulos C2, y D. Salón comunal: Se continúa con los encofrados de los muros del muro tipo 2, y armado de acero de refuerzo de la escalera principal: Día nublado. Personal de obra: Maestro general,

Seis oficiales, quince ayudantes boal, operador, Ingeniero: Retroexcavadora Kubota U55. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Viernes 09 sep/023
Zona Topografica: Se funde el anillo número 4 del pozo 86, y se avanza en la excavación del anillo 5 del pozo 85. Planta de control: Encofrados modulos C2, D y E vestigios muro Tipo 2. Salon comunal: Se funde la base de la matera del muro Tipo 3, y un sector de la placa de contrapiso para el adoquín del salón comunal. Dia nublado. Personal de obra: Maestro general, seis oficiales, quince ayudantes, operador, boal. Ingeniería: Retroexcavadora Kubota U55. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

11 sep Se realiza visita de control tecnico, se solicita a la interventoria extracto plan de contingencia con personal y frentes de trabajo requeridos se envia correo de precisiones a la interventoria, para seguir recomendaciones.
- Seguimiento cosson - pacarela, para ejecución
- Seguimiento cosson de bahia y estructura concreto
- Oficio solo a 15 dias del plazo inicial del contrato, y aún falta soportar prorroga en cuanto a programacion y cierre de bahia final

Norma

Bahía Pangboaders. Se continúa con la excavación del caisson B9 anillo 9, y se funde el anillo 6 del caisson B8, anillos 5 y 6 del caisson B6, y anillo 5 del caisson B5. Se avanza con los encofrados de los vástagos de los módulos C2, D y E y armado del claro de los módulos F y G del muro tipo 2 de la Plazoleta central. Bahía Pangboaders. Se da inicio a las excavaciones para Ductos eléctricos, y se continúa con los encofrados de los muros de la matera del muro tipo 3, y armado de claro de la escalera principal. Dia nublado. Personal de obra: Maestro general, seis oficiales, cuatro ayudantes, operador, boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U30. Personal administrativa: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Martes 12 Septiembre 2023

Se le notifica al contratista de dora suspendas la ejecución de la actividad "Excavación de caisson" intermedios a los caisson existentes en el eje A.
Esta suspensión se da debido a que el contratista a la fecha no ha presentado ningún estudio geotécnico donde se pueda corroborar ó comprobar si es necesario ó no la ejecución de estos.
Esta actividad es iniciada bajo responsabilidad directa y propia del contratista, sin conocimiento alguno de esta intervención.

Bahía Parqueadero: Se funde el anillo 7 del caisson B6, y anillo 6 del caisson B5; se avanza en la excavación del anillo 9 del caisson B4, y anillo 7 del caisson B8. Se continúa con las excavaciones para ductos eléctricos en el sector de la rampa escalera 1 y 2, y salón comunal. Se continúa con los enrafrados de los módulos C2 y D, y armado de aros de los módulos F y G del muro tipo 2 de la plazoleta central. Rampa escalera 1 - concreto de limpieza módulo 4 muro tipo 2. Salón comunal: Armado de viga escalera principal, enrafrados metera muro tipo 3 parqueadero. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, ocho oficiales, veinte ayudantes, operador, bodega. Maquinaria: Retro excavadora Kubota U55. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directas de obra.

Miércoles 13-12-023

Bahía Parqueadero: Se funde el anillo 9 del caisson B4, anillo 7 del caisson B8, anillo 4 del caisson B7, anillo 8 del caisson B6, anillo 7 del caisson B5. Redes eléctricas: Se continúa con la instalación de ductos eléctricos y construcción de lajas en las rampa escalera 1 y 2. Se funde el vaciado de los módulos C3 y D, y la zarpa del módulo F del muro tipo 2 de la plazoleta central. Rampa escalera 3 - Se funde la zarpa del módulo 5 del muro tipo 1. Salón comunal: Enrafrados escalera principal, y fundida de una viga de la metera del muro tipo 3. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, ocho oficiales, veinte ayudantes, operador, bodega. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directa de obra.

Jueves 14 Sep/023
Bahía-Porgueadora. Se funde el anillo número 8 del caisson B5, y anillas 1 y 2 del caisson adicional; se continúa con las excavaciones del anillo 5 del caisson B7, y anillo 8 del caisson B8. Tatemz → Excavación anillo 4 del caisson para tatem # 2. Redes eléctricas → Instalaciones de ductos y cajas en la zona de la rampa escalera 1 y 2. Se continúa con los encofrados y armado de acero del muro tipo 2 de la plazoleta central. Salón comunal. Encofrados escalera principal. Día nublado. Personal de obra. Maestro general, ocho oficiales, veinte ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retro excavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Viernes 15 Sep/023
Bahía porgueadora. Se continúa con la excavación del anillo 8 del caisson B8, anillo 6 del caisson B7, anillo 3 del caisson C6, y se funde el anillo número 1 del caisson C4. Redes eléctricas: Construcción de cajas de inspección CI274 sector rampa escalera 1 y 2. Plazoleta central: Encofrados y armado de acero muros tipo 2. Porgueadora salón comunal: Se funde un tramo de la escalera principal. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, ocho oficiales, veinte ayudantes, operador, Bodeguero. Maquinaria: Retro excavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Sábado 16 Sep/023
Bahía Porgueadora. Se funden los anillos: Anillo numero 1 y 2 del caisson C7, anillo 3 y 4 del caisson C6, anillo 2 del caisson C4, anillo 8 del caisson B8, y anillo 5 del caisson B7. Redes eléctricas: Construcción de cajas CI274 sector de la rampa escalera 1 y 2. Redes hidráulicas. Excavación para

Norma

Ductos sotas rampa escalera 1 y 2. Plataleta control: Se funde la losa del módulo 6, y se continúa con los anclajes de los castigos de los módulos D y E. Salón comunal: Retiro de encofrados columna principal. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, ocho oficiales, veinte ayudantes, operador, boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, Trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Lunes 18 Sept/023

Bahía Manguecitos: Se funde el anillo numero 3 del pozo C7, los anillos 5 y 6 del pozo C6 el anillo 1 del pozo C5, el anillo 6 del pozo B7, y anillo 5 del pozo del tótem 2. Redes hidráulicas y eléctricas: se continúa con la construcción de lajas CJ274, y excavaciones para tuberías hidráulicas en el sotas de la rampa escalera 1 y 2. Plataleta control: Enformados castigos módulos E y F nivel tipo 2. Salón comunal: Armado de acero columna principal. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, seis oficiales, diez y siete ayudantes, operador, boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspales de obra, Directos de obra.

Martes 19 - Septiembre - 2023

1:>Se solicita al contratista asumir esfuerzos para incrementar el personal operativo en obra, para avanzar en la ejecución de actividades en diversos frentes del porque, tales como: la parolínea del muro DET-CT003, excavaciones para acometidas eléctricas e hidráulicas, conformación para graderías en plataleta principal, rampa escalera en zona baja

Norma

del parque, conformación de anclajes en el salón comunal, armado de acero para los caissons, y demas actividades en las cuales se pueda avanzar.

2⇒ Se le solicita al contratista de obra realizar el enchapado de las escaleras de acceso al salón comunal con formaleta metalica, para brindar un mejor terminado.

3⇒ Se le solicita al contratista de obra que la programación del suministro de concreto "a obra "Mixer" sea en horarios idoneos al laboral 7:00 am - 5:00 pm.

4⇒ Se requiere que el contratista de obra presente en esta interventoria un informe del estado de las compras de mobiliario, suministro y demas insumos.

Bahia parqueadero: se funde el anillo numero uno de los caissons C1 y C2 y C3, anillo 2 del caisson C5, anillos B y 7, y anillos 7 y 8 del caisson B7. Redes hidrosanitarias y electricas. Construcción de cajas de inspección C3274, y excavaciones para ductos hidrosanitarios. Plazoleta central: se funde el vaciado de las módulos E y F del muro tipo 2. Salón comunal: Armado de aleros escalera principal. Dia nublado. Personal de obra: maestro general, tres oficiales, veinte ayudantes, operador, basculeros: Retroexcavadora Kubota U35. Personal administrativo: residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra.

Miércoles 20 sep/23

Bahía parqueadero: Se funde el anillo #2 de los caissons C1, C2, y C3, anillo número 3 del caisson C4, y se avanza en la excavación del anillo 9 del caissons B3 y B2. Redes hidráulicas. Se instala la tubería entre la caja C1 y C2. Redes eléctricas. Construcción de cajas CD274 Rampa escalera 1 y 2. Zona Superior: Se funde el módulo 12 del muro tipo 2. Plazoleta central. Enrafetados Módulo 6 muro tipo 2. Salón comunal: Armado de acero escalera principal. Día nublado. Personal de obra: maestro general, 2 oficiales, veinte ayudantes, operador, bael. maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Jueves 21 sep/023

Bahía parqueadero: Se funde el anillo 3 del caisson C2, anillos 4 y 5 del caisson C4, anillo 3 del caisson C5 y anillo #1 del caisson C8. Redes hidráulicas: Rellenos tubería entre cajas 1 y 2. Plazoleta central. Se funde el módulo 6 del muro tipo 2. Salón comunal: Armado acero escalera principal. Día nublado. Personal de obra: maestro general, 2 oficiales, veinte ayudantes, operador, bael. maquinaria: Retro excavadora Kubota U50. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, director de obra.

Viernes 22 sep/023

Bahía parqueadero: Se funde el anillo 3 del caisson C1 el anillo 6 y 7 del caisson C4, el anillo 3 y 4 del caisson C7, y anillos 2 y 3 del caisson C8, y anillo 9 del caisson B5. Se continúa con los rellenos de las redes hidrosanitarias, y construcción de cajas eléctricas CD274. Se retiran los enrafetes del muro tipo 2 de la plazoleta central. Salón comunal: Armado de acero escalera principal, y enrafetes

materia muro tipo 3 perpendicular. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, 3 ficte oficiales, diez y ocho ayudantes, operador, boal. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, directos de obra.

Sábado 23-09-23

Bahía Perpendicular: Se fundió el anillo 4 del caisson C2, anillo 3 del caisson C3, anillo 3 del caisson C4, y anillo 5 del caisson C7; se da entrega al armado del acero de los caissons. Bahía Comunal: Se fundió otro tramo de la cortina principal, y una cara de la materia del muro tipo 3. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, siete oficiales, dren y ocho ayudantes, operador, boal. Ingeniería: Retroexcavadora Kubota 050. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directos de obra.

25-09-23 Lunes

Se realiza visita de control técnico.
Se evidencia mala calidad en fundiciones en concreto sector escaleras, se refiere a la interventoría seguimiento estricto a los planes de contingencia en cuanto a frentes y personal para cumplimiento avance de obra.
- Dejar por parte de la interventoría la demolición en actividades de vaciado en concreto por mala calidad y deficiente proceso constructivo

Bahía-Parqueaderos: Se fundan los anillos 4 y 5 del caisson C1, anillo 5 del caisson C2, anillo 4 del caisson C3, y anillo 6 del caisson C7; se continúa con el armado de acero de los caissons. Redes Eléctricas: Construcción vigas de inspección C3214 sector rampa escalera 1 y 2. Salon comunal: Armado de acero escalera principal, y encofrados cara externa muros tipo 3. Retiro de escombros. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, 2 oficiales, Dibujante y 2 ayudantes, operador, boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativa: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectas de obra, Directora de Obra.

Martes 26/09/023

Bahía Parqueaderos: Se funde el anillo 6 y 7 del caisson C1, anillo 6 del caisson C2, anillo 5 del caisson C3, y anillos 7 y 8 del caisson C7; se continúa con el armado del acero de refuerzo de los caissons. Se avanza con los rellenos en material seleccionado en el sectos de la plazoleta central. Salón comunal: Armado de acero escalera principal, y encofrados muros tipo 3. Día soleado. Personal de obra: 2 oficiales, dibujante y 2 ayudantes, operador, boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50. Personal administrativa: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectas de Obra, Directos de obra.

Miercoles 27/09/023

Se funden los anillos: Anillo 8 del caisson C1, anillo 6 del caisson C3 y anillo 4 del caisson C8, de la Bahía-Parqueadero; se continúa con el armado del acero de los caissons. Plazoleta central: Se da inicio a la Excavación de la gradería. Salon comunal: Armado de acero escalera y encofrados. Se presentan lluvias intermedias de 1:00pm a 2:30 pm. Personal de obra. Maestro general, 2 oficiales, dibujante y 2 ayudantes, operador, boal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50.

Norma

Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra Director de obra.

Jueves 28 Sep/023

Bahía-Panqueadero: Se funde el anillo 7 del caisson C2, anillos 7 y 8 del caisson C3, y anillos 5 y 6 del caisson C8; Armado de acero caissons. Redes eléctricas: Construcción de lajas CJ-274 sector rampa escalera 1 y 2. Plazoleta central: Excavación gradorias. Salón comunal: Encofrados escalera principal y muro tipo 3. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, Oficiales, Dibujante y ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50, retroexcavadora Caterpillar 320D. Día nublado. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directos de obra.

Viernes 29 Sep/023

Bahía-Panqueadero: Se termina la excavación de los caissons B6, B7, y B8, y se funden los anillos 8 del caisson C2, 9 del caisson C3, y 9 del caisson C8, se avanza con el armado del acero de los caissons. Se da inicio otras excavaciones a mayor se continúa con las excavaciones para la plazoleta central, y muro tipo 2 del sendero superior. Salon comunal: Encofrados escalera principal, instala muro tipo 3, y se da inicio a la construcción del gavión arquitectónico del muro tipo 3. Día nublado, Personal de obra: maestro general, cinco oficiales, dibujante ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retro excavadora Kubota U50, Retroexcavadora Caterpillar 320Dg. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Sábado 30 sep/023

Bahía-Parqueadero: Se funde el anillo 9 del caisson C1, anillo 9 del caisson C2, anillo 10 del caisson C3, y anillo 8 del caisson C8; Se continuiva con el armado del acero de caissons; Se funden los caissons B7, B8 y B5. Jardines Interiores: Excavaciones muro tipo 2. Salón comunal: Enrafrados cubierta principal y mezzanine muro tipo 3. Disposición. Personal de obra: Maestro general, oficiales, ayudantes, operadores, fogonero, maquinaria: Retroexcavadora Kubota U30, Retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

02-Oct Se realiza visita de control técnico.
se evidencia falta de personal, se solicita que los residentes de obra e interventoria, estén en obra, si es necesario trasladar oficina administrativa al salon comunal.
las actividades programadas a ejecutar la semana pasada no se cumplieron porque hubo salida masiva de personal
- Se deben cubrir los frentes de obra abiertos con el personal minimo requerido de 60 personas

Componente técnico de interventoria.
En recorrido de obra se evidencia disminucion de personal operativo, por lo cual se le solicita al contratista de obra aunar esfuerzos para garantizar la presencia de personal operativo en obra para avanzar en la ejecución de las actividades en los diversos frentes de obra, y dar cumplimiento

Norma

BITACORA – PARQUE GUACAMAYAS

01/09/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y canguro
Personal en obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Directa de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Instalacion de estructura para tanque de agua, Dilatacion el placa de contrapiso cancha. Entivado en área de gradería Excavación manual en cajon #3 para anillo 2.
Amarre de acero de refuerzo en area de gradenas.

02/09/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pico, cinta Metrica Plomada, boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, canguro y Rana
Personal en obra: 9 ayudantes, 8 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Directa de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Excavacion mecanica en zona infantil para continuar con muro de contención, se desencofra zarpa de muro de contencion zona infantil, Instalacion de formaleta para vaciado de concreto tramo 3 de la cancha, Tesleleo en area de gradenas, excavacion manual en cajon #3 para anillo 2

Powered by CamScanner

04/09/2023

En visita de supervisión se evidencia trabajos en concho con fundición de placa contrapiso, retiro de RCD de vía vehicular, excavación para zapa muro de contención superior zona de juegos, excavación manual para columnas, armado de formaleta y acero para gradería. No se evidencia aumento de personal por lo cual se presume que el avance será igual o nulo. incumpliendo con los compromisos establecidos en comité.
La supervisión solicita al contratista tomar las medidas necesarias, incluir varias frentes de obra para atacar zonas como escaleras, muro de contención inferior, zona occidente del parque, instalación hidrosanitarias y malla contra impacto todas las obras por falta de material, de equipos y mano de obra son responsabilidad unicamente del contratista

J Sebastián Arbeláez.
SDHT.

Se recomienda dejar las pendiente necesaria y el acabado en la placa de contrapiso de cancha, evitar que queden ondulaciones que podrian generar emposamiento de agua en la cancha.

ETA interventoria define las siguientes pruebas para las estructuras metálicas: Primero, particulas magneticas, que se realizará al 20% de las conexiones de soldadura; Segundo, Liquidos penetrantes, al 20% de las conexiones o soldaduras; tercero, pruebas de espesor de pinturas, que se realizará al 25% de elementos verificados
Se solicita al contratista presentar tres (3) cotizaciones para aprobar el pago y realización de pruebas.

Powered by CamScanner

Se solicita tener el personal suficiente para trabajar en todas las actividades: la excavación de red sanitaria frente a la iglesia se inicio el 23 de agosto y no se termina esta actividad se requiere que el contratista subcontrate el trabajo de construcción de vía (incluida las redes) para dar un mayor avance a la construcción de redes sanitarias y entrega de la vía. Así mismo y de acuerdo con el Plan de Contingencia presentado se debe trabajar la demolición de escaleras y demolición de baldosa de piso en el sector de escaleras. Se recomiendar retiro de escombro en la zona de escaleras evitando mayor acumulación de RCDs.

Se establece en común acuerdo con el contratista de obra que se cambiará el tipo de banca doble, y el contratista evaluará cambio de bolardo, esto en solicitud directa de la entidad y sin variar los costos de los elementos; el bolardo es el AC 405 03 y la banca es larga concreto en forma de trapecio

Se recomienda la entrega de ordon de compra de luminarias, mobiliario y elementos de importación para desembolso de anticipo. Tener presente que los elementos importados requieren mayor tiempo para la puesta en obra, tiempo y contingencia evaluado por el contratista de obra

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, plancha, boquillera, Palustre y otros.

Powered by CamScanner

Maquinaria: Vibrocompactadar, Retroexcavadora, canguro y Rana.
Personal en obra: 10 Ayudantes, 11 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se realizo vaciado de concreto en la tercera seccion de placa de cancha, tambien se realizo aislado de concreto en placa, y se continuo con tesleteo en zona de graderias. Excavacion manual para cargamo zona de cancha costado sur. Excavacion mecanica frente a la iglesia para instalacion de tuberia de PVC 6", De igual forma se continuo con excavación manual segunda anillo en área de Caisson #3. Grupo topografico inicia con replanteo en via y personal electro realiza instalacion de marcos para tapa en cajas electricas.

05/09/2023
CLIMA: Lluvia de 8:00 a 10:15 am, Soleada la tarde
Herramientas: Bichiaque, martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquilleta, Palustre y otras.
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y canguro.
Personal en obra: 11 ayudantes, 12 oficiales, 1 operario y 1 vigilante.
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de Interventoria ETA.
Se realiza replanteo en via por grupo topografico, Instalacion de formaleta y malla electrosoldada con separadores plasticos en área de cancha. Curado en placas anteriormente fundidas. Instalacion de acero de refuerzo y tesleteo en caisson #3 para anillo 2 Instalacion de marco para tapa en cajas electricas Relleno y compactacion en

Powered by CamScanner

zona de lanches, frente a la iglesia. se realizan nivelaciones en las placas de la cancha. se continuo con excavacion manual para cabezal cosiado sur de la cancha. Nivelacion en excavacion para continuo con muro de contencion costado occidental para zona de juegos infantiles.

06/09/2023

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pico, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, paladre y otros.

Maquinaria: Vibrocompactadora, Retroexcavadora, compac, y Rana

Personal en obra: 11 ayudantes, 12 oficiales, 1 operario y 1 vigilante

Personal administrativo: Residentes 2, coordinadora, Directa de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.

Demolición en area de escaleras placa de concreto. Solado en área de muro de contención zona de juegos infantiles. Vaciado de concreto en area de graderias vaciado de concreto en zona de cancha tramo 3. Excavacion manual tercer anillo en Caisson #3.

Se solicita al contratista tener cuidado de realizar la excavación de la vía de acuerdo al nivel de cota indicado para cada abcisado de la vía, el nivel indica 87 cm de excavación según las cintas blancas de topografia. La interventoria no pagará sobre excavación y esta correrá por cuenta del contratista de obra y el relleno no se pagará sino que será asumido por el contratista.

07/09/2023
CLIMA: Soleado durante todo el dia
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Picca, cinta Metrica Plomada, boquillera, palustre y otros.
Maquinaria: Vibrocompactadora, Retroexcavadora, Rana y Canguro.
Personal en obra: 14 ayudantes, 13 oficiales, 1 operario y 1 vigilante.
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Directa de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografía ETA.
Excavación manual de carcamo en costado Sur de la concha. Relleno en zanja en la instalación de tuberías electricas costado sur de la concha. Excavación en area de via, Amarre de acero de refuerzo en zona de gradenas, Nivelación en area de placas de concha. Retiro de material RCD. Armado de acero de refuerzo en zarpa y vastago muro de contención zona de juegos infantiles. Excavación manual anillo numero 3 de caisson #3.

08/09/2023
CLIMA: Nublado durante la mañana, tarde Soleada
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Picca, cinta Metrica, Plomada, boquillera, palustre y otros.
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y Canguro.
Personal en obra: 14 ayudantes, 13 oficiales, 1 operario, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Demolición en placa de concreto en zona de escaleras frente al CAI. Instalación de malla electrosoldada. y vaciado de concreto en área de placa de Cancha. Se continuo con demolición de

Powered by CamScanner

placa en concreto. Instalación de piedra Rajón en área de vía, amarre de acero en anillo numero 3 del Caisson 3. Amarre de acero de refuerzo en zarpa y voladizo muro de contención zona juegos infantiles, toma de niveles grupo topografica.

09/09/2023

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Picca, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana y Canguro.

Personal en obra: 11 ayudantes, 12 oficiales, 1 operario y 1 vigilante.

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.

Compactacion de subbase granular sobre rajon en área de via, Amarre de acero de refuerzo en zarpa de muro de contención zona de juegos infantiles. Excavación manual para instalación de parrilla de Poste. Instalación de geotextil en área de via frente a la iglesia. Tesleleo en zona de graderias para conformación del escalon 3. Excavacion manual en area de corcamo Vaciado de concreto en anillo 3 del Caisson #3. Instalacion de subbase granular sobre pavimento en área de via. Excavación mecanica para muro de contención zona de juegos infantiles.

10/09/2023

CLIMA: Nublado pero no llovio

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Picca, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana y Canguro.

Personal en obra: 11 ayudantes, 12 oficiales, 1 operario y 1 Vigilante

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra

Powered by CamScanner

Se solicita al contratista de obra corregir el proceso constructivo de la vía de acuerdo con los siguientes lineamientos; Primero, excavar e instalar la tubería de drenaje pluvial que drena hacia la vía 37C sur, considerar que la tubería de 12" requiere una zanja de tamaño considerable y chequear la tubería para comprobar que no tenga filtraciones; Al construir la red de drenaje pluvial posterior al mejoramiento de la vía se genera un reproceso y una perdida de los materiales que se utilizaron en el mejoramiento; la toma de densidades de la vía se realizará cuando la vía tenga las tuberías y redes de drenaje pluvial. Se recomienda la instalación a sumideros con geotextil y grava a nivel de tubería y despues relleno con roca muerta, todo muy bien compactado hasta nivel de subrasante; y posteriormente construir la estructura de la vía.

Se comparten las especificaciones técnicas de la construcción del carcamo de 2500 PSI. la pendiente longitudinal minima será del 0,05%. Los carcamos se construiran con concreto de 2500 PSI reforzados con flejes en U de 1/4" cada 30 cm y 4 varillas de 3/8" corridas con traslapos minimos de 50 cm y alternados. Verificar niveles del fondo y de la tubería de entrada y de salida.

Se solicita incrementar el personal de mano de obra no calificada para trabajar en retiro de elementos y materiales del área de juegos y acometer obras de estructuras y excavación, nivelación y compactación de esta área (juegos)

Powered by CamScanner

Se continua con demolición en placa de concreto zona de escaleras frente al CAI. Tesereo en área de gradenas. Nivelación en piso de carcomo costado sur de la cancha. Excavación mecanica en via. Tesereo en zarpa área muro de contención zona juegos infantiles. Excavación manual anillo 9 de cassón #3.
En las horas de la mañana se presento insidente en area de via, ya que la retro se encontraba excavando y se (12/0) encontro con un tubo de gas, la cual se realiza el seguimiento previo, señalizando la zona y teniendo en cuenta los puntos de prevencion. Previo a esto se llama a la empresa de Vanti para la reparación. Se repara tubena de Gas.

12/09/2023
CLIMA: Soleado todo el día.
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta metrica Plomada, boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana y Canguro.
Personal en obra: 11 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Directa de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Demolición de placa en concreto zona de escaleras frente al CAI. Excavación mecanica para instalacion de tanque, sobre la via. Tesereo en zarpa del muro de contención zona de juegos infantiles. Amarre de acero de refuerzo en muro de contencion al lado de las gradenas Vaciado de concreto en zarpa muro de contencion zona de juegos infantiles. Tesereo en zona de gradenas para vaciado de concreto. Retiro de material RCD. Descargue de material de estructura metalica.

13/09/2023
CLIMA: Soleado durante el día
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica Plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Vibrocompactadora, Retroexcavadora, Canguro y Rana
Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario, 1 vigilante
Personal administrativo: Residentes 2, coordinadora, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se realiza excavacion mecanica para instalacion de tuberia en zona de la vía, tambien toma de niveles. Emboquillado de tubos y o tanque para recoleccion de agua lluvia en area de la vía. Demolición de placa de contra piso en zona de escaleras frente al cai Vaciado de concreto en anillo 4 del pozo #3. se desencopra zarpa del muro de contención zona de juegos infantiles.

14/09/2023
CLIMA: Nublado en la mañana, lluvia en la tarde
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta metrica Plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Vibrocompactadora, Retroexcavadora, Canguro y Rana.
Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario y 1 vigilante.
Personal administrativo: Residentes 2, coordinadora, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se realiza vaciado de concreto en area de graderia, replanteo e instalación de material granular en zona de instalación

de tubería sobre la vía, descargado de zorra muro de contención zona de juegos infantiles. Instalación de acero en área del carcamo costado sur de la cancha. Se realizó revisión junto con la interventoría un pozo preexistente que se encuentra sobre las escaleras actuales de la zona de juegos infantiles, y toman la decisión de demolerlo porque no está en funcionamiento.

15/09/2023

CLIMA: Lluvia a las 8:10 am - 10:00 am, tarde soleada

Herramienta: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros

Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Canguro y Rana.

Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operador y 1 vigilante

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.

Tendido en zona de graderías., Instalación de tubería estructura metálica al rededor de la cancha. Se inicia con vaciado de piso de concreto en área del carcamo, instalación de tubería en área de la vía y Relleno.

16/09/2023

CLIMA: soleado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pica, Pala, cinta metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana y Canguro.

Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario y 1 vigilante

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Directo de

Powered by CamScanner

obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspecto ETA, Auxiliar de topografía ETA.
Se continua con soldadura en estructura metalica, cerramiento de concha, tambien se continuo con resane en área del último escalon de graderico. Demolición de pozo no funcional en area zona de juegos infantiles. Resane en voladizo muro de contención zona de juegos infantiles. Se continuo con vaciado de piso en area de carcamo costado sur de la concha Instalación de piedra rajon en área de vía.

18/09/2023
CLIMA: Nublado y con lluvia.
Herramientas: Bichoque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana y cangulo.
Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal Administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector de obra, Auxiliar de topografia ETA.
Se recibe viaje de subbase granular y piedra rajon para la conformacion de la vía, se continua con excavacion y replanteo en área de muro de contención zona de juegos infantiles. Encofrado voladizo muro de contencion zona de juegos infantiles. Acopio de madera en obra. Armado de camillas para resanear área de carcamo. Instalacion de piedra rajon en área de via, tambien se realiza instalacion de subbase granular sobre la piedra rajon, instalacion de geotex. til 0-T-2400. Cargue de RCD, Excavacion manual area de graderias. Encofrado muro de contencion area de graderias. 11

19/09/2023
CLIMA: Nublado durante el dia con leves lloviznas
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica Plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Retroexcavadora, vibrocompactador, Rana y canguro.
Personal en obra: (Residente 2) 12 ayudantes, 14 oficiales 1 operario y 1 vigilante.
Personal Administrativo: Residente 2, coordinador, Directa de obra, Residente SST, Residente social, Residente ETA, social ETA SST ETA, Inspector de obra, Auxiliar de topografia ETA.
El día de hoy se realiza vaciado de concreto con Caisson #3, vaciado de concreto en muro de contención área de juegos infantiles y en muro de contención coslado de graderias, tambien se realizo vaciado de concreto en ultimo escalon de las graderias. se continuo con instalación de subbase granular en área de vía y compactación de la misma. tambien se realiza instalación de acero de refuerzo muro de contención zona de juegos infantiles. se realiza encofrado en área de carcamo.

20/09/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, Plomada, Boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Retroexcavadora, vibrocompactador, Rana y canguro.
Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario y 1 Vigilante
Personal Administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente Social, Residente ETA, Social ETA SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA. se continua con relleno en área de la vía. Perfilación y replanteo de terreno en área de muro de contención zona de juegos

Powered by CamScanner

infantiles. Amarre de acero de refuerzo, zarpa y vastago muro de contención zona de juegos infantiles. Instalación de malla en cerramiento del área de la cancha. Desencofrado en área de graderías. Se realiza seguimiento a la grieta presentada en la iglesia en el muro de contención del área de la vía.

21/09/2023

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana y Canguro.

Personal en obra: Residentes 2, coordinador, Director de obra Residente SST, Social SST, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, RL Inspectora ETA, Auxiliar de topografía ETA.

Se continua con formaleta en área de cárcamo, excavación mecánica para continuación del muro de contención. Famaleteado de vastago muro de contención zona de juegos infantiles. Instalación y armado de acero de refuerzo, zarpa y vastago zona de juegos infantiles. Relleno de material en sitio entre los muros de contención. Instalación de malla electrosoldada con separadores plásticos. Excavación para instalación de tubería en área de vía.

22/09/2023

CLIMA: Soleado en la mañana, nublado en la tarde

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana y Canguro.

Personal en obra: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Social SST, Residente ETA, Social ETA,

Powered by CamScanner

SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografía ETA.
El día de hoy se realizo instalación de tubería PVC 12" en área de vía, se desencofro muro de contención costado de las graderías. Se realizo vaciado de solado en área de muro de contención zona de juegos infantiles. Tambien se realizo amarre e instalación de acero de refuerzo para zapata y viadago de muro de contención. Relleno con material seleccionado in situ entre muro de contención perimetral y muro zona de juegos infantiles, tambien relleno con material seleccionado entre graderías y viga de cancha. Amarre de acero de refuerzo para escalerias de graderías, se realizo excava. para caja de aguas y excavación mecanica para continuación de muro de contención.

23/09/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiaope, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica Plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana y Canguro.
Personal en obra: Residente 2, Director de obra, coordinador, Residente SST, Social SST, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografía ETA.
Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario 1 ayudante.
Se realiza activicad de prebloqueo para el traslado de los arboles autorizados en la obra. Amarre de acero de refuerzo viadago y zapa muro de contencion zona infantil. Vaciado de concreto en ultima placa area de cancha. Relleno y compactación en area de muro de contención perimetral y de zona de niños. Alistado de placa de concreto area de cancha. Excavación mecanica para continuacion de conformacion de via. Retiro de material RCD. Soldadura en area de cancha en estructura metalica. Excavacion de caja para recoleccion de aguas.

Powered by CamScanner

24/09/2023

CLIMA: Soleado.
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pico, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Cangrio y Rana
Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, social SST, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se inicio a fundida de muro de carcamo área de cancha, se realiza fundida de 2 pilotes que fallaban en la cancha. Amarre de acero de refuerzo en muro de contención zona de juegos infantiles, área de zarpa y vaciado.

Ante el translado de los árboles, se solicita al contratista seguir y cumplir los parametros de los especialistas forestales en el translado y cuidado de los árboles. Cohesión será responsable y custodia de los individuos arboreos transladados.

25 Septiembre 2023

En visita de supervisión se evidencio trabajos en fundición concreto para carcamo de concha, solado de limpieza sector occidental, armado de acero de dado cimiento en mirador, demolicion escaleras y rampa, amarre de acero e instalación de formaleta para muro zona de ninos, excavación mecanico via vehicular, excavación manual por sumideros y tubería. Se recomienda mantener en obra materiales, equipos, herramienta y personal durante y previo al inicio de actividades programadas.

SDHT.

CLIMA: Llovizna en la mañana
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica Plomada, boquillera, Palustre y otros.
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Canguro y Rana.
Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario y 1 vigilante
Personal Administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Social SST, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.
Se realiza cargue de RCD, Excavación mecanica en área de vía Vaciado de Solado en area de muro de contención zona perimetral Encofrado en carcamo zona de concha. Excavación manual de sumidero frente a la iglesia. Vaciado de solado en caja de recolección de aguas. Instalación de tubería 6" PVC. Instalación de geotextil e instalación de tubería para filtro frances en área de muro de contención perimetral area de pasarela. Soldadura refuerzo metalicos en reja del cerramiento. Acabado de filos en área de graderias. Instalacion de tubería electrica.

26/09/2023
CLIMA: Soleado
Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pica, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros
Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Canguro y Rana.
Personal en obra: 12 ayudantes, 14 oficiales, 1 operario y 1 vigilante.
Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Social SST, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA. Se realizo excavación mecanica en pozo y en área de vía, para instalación de tubería. Amarre de acero de refuerzo en pedestales área de Dado #3, tambien se realiza armado para fundir dado. Excavación e instalación de tubería electrica. Instalación de estructura de tanque en área de vía. Retiro y replanteo de material cortado sur de la concha. construcción de caja de inspeccion de alcantarillado (CCF2). Soldadura en estructura metalica área del mirador. Instalacion tubería 12" PVC.

Powered by CamScanner

27/09/2023

CLIMA: Soleado en la mañana, lluvia fuerte 11:30 hasta 2:00 pm

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pico, Pala, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Canguro y Rana.

Personal en obra: 12 ayudantes, 12 oficiales, 1 operario y 1 vigilante

Personal administrativo: Residente 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Social SST, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.

El día de hoy se realizo instalación de tubería PVC 12" y instalacion de pozo en area de vía. Se continuo con vaciado de concreto en zarpa muro de contencion perimetral y zarpa zona de juegos infantiles, tambien se realizo vaciado de concreto en vocargo zona de juegos infantiles. Soldadura en estructura de cerramiento de cancha, instalación de geotextil en área de vía. Retiro de material RCD. Tambien se realiza instalación de piedra Rajon. Tambien se realizo instalacion de cuna en tubello PVC 12". encapado para dado de Cajason #3. Nivelación con material seleccionado entre muro de contención perimetral y graderios.

28/09/2023

CLIMA: Soleado durante el día

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pica, Pala, Cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, canguro, Rana y minicargador.

Personal en obra: 12 ayudantes, 12 oficiales, 2 operarios y 1 vigilante.

Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, Residente ETA, social SST, social ETA, SST ETA, inspector ETA, auxiliar de topografia ETA.

El dia de hoy se realizo instalación de piedra rajon en área de

Powered by CamScanner

la via, tambien se continuo con excavación mecanica para instalación de tuberia PVC 12". Encofrado en vastago de muro de contención zona infantil, tambien se desencofro el área fundida el día de ayer. Instalación y soldadura de cerramiento en área de cancha y nivelación de piso entre muro de confinamiento perimetral y graderias. Retiro de materiial RCD en la obra.

29/09/2023

CLIMA: Soleado.

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pica, Pala, cinto Metrica plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Rana, canguro y minicargador.

Personal en obra: 12 ayudantes, 12 oficiales, 2 operarios y 1 vigilante en la obra.

Personal administrativo: Residentes 2, coordinador, Director de obra, Residente SST, social SST, Residente ETA, Social ETA, SST ETA, Inspecta ETA, auxilial de topografía ETA.

Excavación mecanica en zona de vía, para instalación de tubería 12" PVC. instalación de gravilla en cama de tuberia en vía. Nivelación y compactación de terreno en area de muro de contención zona de juegos infantiles. Encofrado de muro de contencion zona de jegos infantiles. Excavacion manual en area de graderias zona de juegos infantiles. Instalacion y relleno en ~~torno~~ ducto de agua que conecta ~~ete~~ a la caja de inspección alcantarillado CCF2. Excavación manual para muro de contencion perimetral enlazado a la pasarela. Excavación manual para caracol en area de graderias. Instalación de geotextil en area de via, soldadura metalica cerramiento cancha. y demolicion de escalera. Por parte de la interventoria se solicita el retiro de escombro en el área de escaleras con el minicargador y con oficiales destinados al trabajo

Powered by CamScanner

de retiros de RCDs; se debe garantizar el transito peatonal en la zona de escaleras y de andén frente a la calle 37B SUR. y la señalización y demarcación con cinta y trabajo en obra.

La demolición de los muros de 3mt de altura se solicita que la demolición se realice por tramos máximo de 5mt de longitud en demolición, conforme el muro; por lo tanto para iniciar la demolición de este muro localizado en la calle 37B SUR se debe tener todo el acero de estos muros y el material de entibado para no dejar el terreno por muchos dias sin intervenir, una vez finalizado el primer tramo, se continua con otros 5 metros de demolición.

30/09/2023

CLIMA: Soleado

Herramientas: Bichiroque, Martillo, Pala, Pico, cinta Metrica, Plomada, boquillera, Palustre y otros.

Maquinaria: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Cargue, Rana y minicargador.

Personal en obra: 12 ayudantes, 12 oficiales, 2 operarios y 1 vigilante

Personal Administrativo: 2 Residentes, coordinador, Director de obra, Residente SST, Social SST, Residente ETA, social ETA, SST ETA, Inspector ETA, Auxiliar de topografia ETA.

Encofrado de vaciado muro de contención zona de juegos infantiles. Armado para fundido de escalera para acceso a (descanso) gradería. Excavación manual para muro de contención perimetral entrada de la parcela. vaciado de concreto en zapata muro de contención perimetral. Instalación de tubería y cama en material granular en area de vía.

BITACORA – MIRADOR ALTAMIRA

31/08/2023

Se realiza compactacion de sub-base reciclada para sello de vía magen oriental. Se continua la excavacion manual para instalacion de tubo de 8" para remplazo de red sanitaria. Se inicia con la compactacion mecanica de terreno para construccion de muro de contención sector oriental, Se inicia vaciado de concreto de 3000 psi para construccion de pedestales en los ejes E10,9,8,6. Tambien vaciado de concreto para construccion de zapatas en los ejes C8,9. Se instala tubo de 8" para de la red sanitaria.

H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 4:30 pm
Tiempo = Seco

R. obra

R-I
Resid Interventoria

01/09/2023

SE CONTINUO CON LA FUNDIDA DE ZAPATAS Y PEDESTALES CON CONCRETO DE 3000 PSI, SE NIVELO LA VIA ORIENTAL CON SUB BASE RECICLADA PREVIO A LA INSTALACION DEL GEOTEXTIL ESTO CON EL MINITIN Y LA MINICARGADORA EN EL COSTADO NORTE DE LA VIA SE SIGUE NIVELANDO EL TERRENO. SE REALIZAN NIVELES DE EXCAVACION DEL ZARPA DE MURO EN TOPOGRAFIA CON EL TUBO DE 8" INSTALADO SE HICIERON EXCAVACIONES PARA REMATIDOS DE LOS VINEADOS

H. INICIO: 07:00 am
H. FIN: 4:30 Pm
TIEMPO: SECO

R. obra

R-I
Resid Interventoria

02/09/2023
H. INICIO: 08:00 am
H. FIN: 11:00 am
TIEMPO: SECO

SE REALIZO EXCAVACION Y COMPACTACION DE PISO DE MURO DE CONTENCION, ANTES DE ESO SE HUMEDO EL PISO PARA EVITAR PERDIDA DE MATERIAL SE HICIERON EXCAVACIONES PARA ACOMETIDAS SANITARIAS RETIRANDO LOS SILLAS Y SE REHICIERON LOS ZAPATAS Y PEDESTALES CON MATERIAL REVOLTURADO DE CONCRETO NIVELANDO LA VIA ORIENTAL Y CON EL PERSONAL SST HICIERON DEMARCACION DE ZONAS DE EXCAVACIONES, SE PEDIRON FORMALETAS DE PEDESTALES PARA PODER FUNDIR CUANDO LLEGUE MATERIAL, SE PEDIRON PORTILLOS DE ZAPATAS Y PEDESTALES SE CUBRIO CON PLASTICO LOS CABEZOS DE PEDESTALES Y SE DEJARON CUBIERTOS LOS EQUIPOS PARA QUE LAS LLUVIAS NO LOS DAÑEN.

Obra

Read Interventor

4/09/2023

En visita de supervisión se observa armado de acero de refuerzo para zapatas y pedestal de estructura metálica, sin embargo, no se cuenta con grava, y arena para vaciado de concreto, se trabaja en excavación para muro de contención sector sur actividad que lleva más de una semana la cual no avanza por lo que se solicita fundir los zapatas de manera urgente para prevenir afectaciones a los viviendas vecinas.
Se trabaja en excavación para conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Se encuentra pendiente liberación por parte de la interventoría de zona vehicular costado oriental, actividad que se puede realizar

en el transcurso del día.
La supervisión solicita tener en obra materiales equipos y personal suficiente previo y durante la ejecución de actividades, el obra que se genere será responsabilidad del contratista Colocación Social.
Es importante incluir frentes de obra adicionales para ejecutar actividades en diferentes zonas.

J. Sebastián Avila
AS. SPHT.

Igualmente se recomienda prevenir ent y realizar la compra oportuna del material requerido en el parque

SPHT

04-07-2023

SE REALIZA VISITA DE LOS SUPERVISORES DEL HABITAD Y SE HACE UNA CORRECCION A LA ACTIVIDAD PREVIA EL LA QUE INFORMAN MAL SOBRE QUE NO SE HACEN ACTIVIDADES EL EL DIA DEL MURO YA QUE DESDE TEMPRANO SE TIENE PERSONAL COMPLETO Y HABIENDO TRATO CON MATERIAL Y EXCAVANDO COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN FOTOGRAFIAS, EL OBRA SE CONTINUARA DEMANDO FORMALETAS CON EL MINIMO PARA COMPLETAR LA SUB BASE DE LA VIA Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA SUB BASE TIPO B SE EXCAVA PARA INICIAR LA REFORMADA DE LA CASA DE INSPECCION E INSTALACION DEL TUBO SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA BASE Y SE TRABAJA TODO EL DIA PERO NO SE INSPECCIONA EL QUE SE TAPO Y DAÑOS

H. INICIO: 7:00 am
H. FIN: 5:00 Pm
TIEMPO: LLUVIOSO SUAVE

Reid Interventoria

Obra

05-09-23

H.INICIO: 08:00 AM
H.FIN: 05:00 PM
TIEMPO: SEGO

SE COMPLETO EL MATERIAL DEL ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN SE TIENEN LISTOS 8 PEDESTALES PARA FUNDIR 1 ZAPATA. NO SE CONTINUO CON DEMOLICION DE LOSA YA QUE SE ESTIMO EL DEMOLEDOR DEL MINI CARGADOR. SE HACE LA CONEXION SANITARIA DE 6" AL TUBO PRINCIPAL Y REPARADO DE LA PRIMERA CAJA DE INSPECCION. SOBRE LA VIA SE TIENDE EL GEOTEXTIL Y SE VERIFICAN NIVELES CON TOPOGRAFIA DE INTERVENTORIA EL MATERIAL PARA FUNDIR Y LA SUB BASE TIPO B LLEGO A DIA DE HOY.

Obra.
Manuel Herrera

Resid Interventoría

06/09/2023

Se realiza vaciado de concreto de 3000 PSI para la Construccion de 4 zapatas en los ejes A11, A12, A14, E4 Tambien se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para la construccion de 9 pedestales en los ejes C2, B3, F3, B4, C4, D4, E5, E6, C10. Se continua con relleno de sub-base y compactacion por medio de rana para la construccion de Muro de contención de via en el sector oriental de la obra. Se continua con excavacion manual para las conexiones domiciliarias a la red sanitaria. Se amara acero de refuerzo para zapatas y pedestales. Se presenta personal de vanti para verificar tuberia expuesta de gas y nos manifiestan que la proxima semana vienen a la obra para hacer el traslado de la tuberia que interfiere con la construccion de muro de contención Sector oriental de la obra

H. INICIO = 07:00 AM
H. FIN = 05:30 PM
Tiempo = Seco

Manuel Herrera
Residente de Obra.

Leonardo Romero
Residente Interventoria

07/09/2023

Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para la construccion de 1 zapata en el eje D1. Se continua con la compactacion de terreno con material sub-base para la construccion de muro de contención sector oriental de la obra. Tambien Se continua con excavacion manual para conexion domiciliarias a la red sanitaria. Se rellena con material seleccionado en obra donde se excavo para la construccion de zapatas y pedestales por medio de Bob-cat.
H. Inicio = 07:00am
H. Fin = 04:30pm
Tiempo = Seco

Manuel Herrera
Residente de obra.

Leonardo Romero
Residente Interventoria

03/09/2023

Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para la construccion de pedestales en los ejes 1D, 4E, 12A, 14A. Tambien se realizo ensayo de densidades para la construccion de muro de contencion donde nos arrojo 2 valores de compactación 99.2% y 100.8%, Seguido a esto se procedio a mezclar un concreto de limpieza.
Se continuo con la excavación manual

para la conexión domiciliaria a la red sanitaria.
Se realiza excavación manual para construcción de vigas de amarre.
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 05:30 pm
Tiempo = Seco

Manuel Herrera
Residente de Obra.

Leonardo Romero
Residente Interventoría.

09/09/2023

Se realiza amarre de acero de refuerzo para la construccion de zarpa para muro de contención Sector oriental de la obra. Se inicia excavación manual para conexion de filtro frances al pozo de aguas lluvias. Se continua con la excavación manual para conexión de domiciliarias a la red sanitaria. Se realiza vaciado de concreto de limpieza para vigas de cimentación. Se inicia con la conformación de terreno en la via sector oriental con sub-base granular.
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 12:00 pm
Tiempo = Seco

Manuel Herrera
Residente de Obra.

Leonardo Romero
Residente Interventoría

10/09/2023

Se continua con amarre de acero de refuerzo para construccion de zarpa del muro de contención Sector oriental de la obra. Se continua con excavación manual para construccion de cajas y

conexión de domiciliarias a la red sanitaria.
Se continua con excavacion manual y conexión para sumidero.
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 12:30 pm
Tiempo = Lluvia en toda la jornada de trabajo

Manuel Herrera
R. de obra

Leonardo Romero
Residente Interventoría

11/sep Se realiza visita de control tecnico, se indica que no se debe sobredimencionar la cimentación en cuanto al eje F

eje F entre ejes 3 al 10

- Esto lo debe definir la interventoria en mesa de trabajo con el contratista.
- Seguir con el extricto seguimiento al plan de contingencia
- Geotextil en bordeo de nivel de cimentacion.

11/09/2023

El contratista expresa desacuerdo con la medida que ha tomado el ING. Mauricio Ilieras en relación a la colocación de las zapatas del eje F del 3 al 10 en la que indica que no deben sobre-dimensionarse la cimentacion en dicho eje. Estos diseños estructurales a los que pertenecen este eje de zapatas ya han sido aprobados por la entidad con su respectivo aval y revisión, donde ya se tenia conocimiento del diseño,

por el cual el contratista se cine y ejecuta lo avalado, ademas el acero ya se encuentra figurado y no se puede reutilizar para otras actividades

Manuel Herrera
R. Obra.

(4-1)
Leonardo Romero
Residente Interventoría

11/09/2023

El especialista estructural del consorcio cohesión social no avala el cambio de diseños propuestos por el ING. Mauricio Illera del eje F del 3 al 10. Ya que estas zapatas cumplen con una funcion especifica en la distribución de cargas de la estructura. Tambien estos diseños fueron verificados al inicio del contrato por ambas especialistas del consorcio e Interventoria

Manuel Herrera
R. Obra.

(4-1)
Leonardo Romero
Resid. Interventoría

11/09/2023

Se continua con la conexión de sumidero a la red de aguas lluvias. Se continua con el amarre de acero de zarpa y muro del muro de contención. Se continua con la nivelacion de terreno con material sub-base de la via sector oriental de la obra. Tambien se continua con la excavación manual para vigas de cimentación

H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 04:30 pm
Tiempo = Seco

(4-1)

Manuel Herrera
R. Obra.

12/09/2023

Se realiza el traslado de tuberia de gas que interferia con la construccion de muro de contención sector oriental. esta maniobra la hizo la empresa contratista de Venti.
Se continua con la excavación manual para construccion de zapatas y vigas.
Inicia el vaciado de concreto de 2500 psi para soldo de vigas de cimentación.
Tambien se sigue compactando con sub-base granular en la vía sector oriental.
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 4:30 pm
Tiempo = Soleado

Manuel Herrera
R. Obra.

Leonardo Romero
Resid Interventoria

13/09/2023

Se continua con la excavación manual para la construcción de zapatas. En la parte electrica se construlle cajas de inspeccion.
Se continua con la nivelacion y compactacion con material sub-base granular. Inicia el amarre de acero para vigas de cimentacion
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 04:30 pm
Tiempo = Soleado

Manuel Herrera
R. Obra.

Leonardo Romero
Resid de Interventoria

14/09/2023
Inicia vaciado de concreto de 4000 psi mezclado

en planta para la construcción de zarpa del muro de contención sector oriental.
Continua el amarre de acero para la construcción de vigas de cimentación. También se continua con la excavación manual de zapatas.
Inicia vaciado de concreto de 2500psi para solado de zapatas. Continua la nivelación y compactación de sub-base granular en la vía sector oriental.
H. Inicio : 08:00 am
H. Fin = 04:30 pm
Tiempo : Seco

Manuel Herrera
R. Obra.

Leonardo Romero
Perito de Interventoría

15/09/2023

Se amarra acero para la construcción de muro de contención sector oriental de la obra. Se continua excavando manualmente para la construcción de cajas electricas. Continua con la nivelacion y compactacion con sub-base para la vía sector oriental. Se realiza vaciado de concreto de 3000psi para la construcción de zapatas por en los ejes F4, F5, F6, F8. Se amarra acero de refuerzo para zapatas y pedestales y se continua con la excavación manual para construccion de zapatas.
H. Inicio: 07:00 am
H Fin : 05:30pm
Tiempo: Mañana lluvia
Tarde soleada

Manuel Herrera
R. Obra.

Leonardo Romero
Perito de Interventoría

16/09/2023

Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para la construcción de pedestales en los ejes F4, F5, F6, F8. También se continua con excavacion manual para construccion de zapatas y cajas electricas. Se amarra acero de refuerzo para vigas de cimentacion, zapatas y pedestales.
H. Inicio: 07:00 am
H. Fin = 02:00 pm
Tiempo = Seco.

Manuel Herrera
R. Obra.

Leonardo Bauer
Resid. Supervision

16/09/2023

Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para la construccion de zapatas en los ejes F9, F10.

Manuel Herrera
R. Obra.

17/09/2023

Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para la construccion de pedestales en los eje F9, F10. También se realiza excavación manual para la construcción de zapatas. Se amarra acero para zapatas, pedestales y viga de cimentación
H. Inicio: 07:00 am
H. Fin = 02:30 pm
Tiempo: Lluvioso

Manuel Herrera
R. Obra.

Resid. Supervision.

18/09/2023

Se continua con excavación manual para construccion de zapatas. Se realiza acceso con rampa y escalera para poder intervenir anden sector oriental. Se inicia formaleteada para construccion de muro de contención sector oriental de la obra. Se instalan platinas en los pedestales para anclaje de estructura metalica. Se continua amarrando e instalando canastas para vigas de cimentación. Tambien se continua con la construcción de cajas electricas.
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 04:30 pm Manuel Herrera
Tiempo = seco R. Obra.

Leonardo Romero
Resid Interventoría

19/09/2023

Se continua con la instalacion de platinas para sapatas metalicas de las pergolas.
Se continua con la excavación manual para instalacion de tubos de 3" electricos
Tambien se continua con excavación manual para zapatas.
Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para construccion de zapatas en los ejes F11, F12, F14. Se instalan formaletas metalicas para construcción de muro de contencion sector oriental de la obra.
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 04:30 pm
Tiempo = seco

Manuel Herrera
R. Obra.

Leonardo Romero
Resid Interventoría

20/09/2023

Se realiza vaciado de concreto de 4000 psi para la construccion de muro de contención sector oriental de la obra. Se continua con el amarre de accro de refuerzo para vigas de cimentacion. Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para la construccion de pedestales en los ejes F11, F12, F14. Se continua con adecuacion para sendero peatonal para intervenir anden sector oriental de la obra. Se continua con excavación manual para instalacion de tuberia electrica de 3".

H. Inicio: 07:00 am
H. Fin : 06:00 pm
Tiempo: seco

Manuel Herrera
R. obra

Leonardo Baez
Residente.

21/09/2023

Se realiza demolicion de anden sector oriental de la obra. Se continua con la instalacion de canastas de vigas de cimentacion y encofrado de las mismas. Tambien se continua con amarre de accro para vigas. Se realiza excavación manual para vigas de cimentación. Se continua con excavacion manual para instalacion de tuberia electrica.

H. Inicio: 07:00am
H. Fin
Tiempo soleado

Manuel Herrera
R. Obra

Leonardo.
Residente.

22/09/2023

Se continua con demolición de roca del eje F3 por medio de bob-cat con martillo. Se continua con excavación manual para

adecuacion de anden sector oriental.
Se continua con excavacion manual para construccion de viga de cimentacion.
Se instala acero de refuerzo para construccion de viga de cimentacion.
Se realiza de vaciado de concreto de 3000 psi para construccion de vigas en los ejes D1, C1, CB3, B3A4,
H. Inicio: 07:00 am Manuel Herrera
H. Fin = 04:30 pm R. Obra
Tiempo: Soleado
Leonardo R. Resid. Interventoria

23/09/2023

Se continua con demolicion de roca en el eje F3 por medio de bob-cat. Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion en los ejes 4. Se continua con la excavacion manual para conformacion de anden en el sector oriental.
H. Inicio: 07:00 am Manuel Herrera
H. Fin = 11:30 am R. Obra
Tiempo: soleado
Leonardo R Resid Interventoria

24/09/2023
No se labora este dia.
25/09/2023
Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion en el eje C del 4 al 7. Se continua excavacion manual para conformacion de anden sector oriental. Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para zapata en el eje F3. Se continua armando acero de refuerzo.
Hs Inicio: 07:00 am
H. Fin = 04:30 pm
Tiempo = seco
Manuel Herrera R Obra
Leonardo L. Resid. Interv.

25 Septiembre 2023.

En visita de supervisión se evidencio trabajos de cimentación para estructura metálica, demolición de anden zona oriental y amarre de acero para vigas. Se sugiere al contratista iniciar con actividades (donde) en los diferentes zonas de la obra y continuar con actividades en zona ranba de quebrada. Se solicita tener en obra materiales, maquinaria, equipos y personal suficiente durante y previo a la ejecución de actividades programadas.

Manuel Herrera
SOHT

Residente Interventoría

En obra se tiene cemento, arena, grava acero de refuerzo para las actividades que estamos desempeñando y maquinaria tenemos un bob-cat que por el tamaño de la obra y material y labores que desempeñamos es adecuado y el personal es el adecuado para los 4 frentes de trabajo 1 fundida de concreto, 2 armado de canastas para vigas, 3 excavacion manual para conformacion de anden Sector oriental, 4 impermeabilizacion y excavacion para relleno del muro de contencion Sector oriental.

Manuel Herrera
R. Obra

Leonardo R.
Resid. Interventoría

26/09/2023

Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para construccion de viga de cimentacion en los ejes C al 10 y E al 10. Se continua amarrando acero de refuerzo para vigas de cimentación.

Se continua con excavación manual para conformación de anden sector oriental. Se continua con excavación manual para construccion de filtro en el sector oriental de la obra.
H. Inicio: 07:00 am
H Fin = 04:30 pm
Tiempo: Seco
Manuel Herrera
R. Obra
Leonardo R.
Resid. Interventoria

27/09/2023

Se continua con excavacion manual para conformacion de anden sector oriental de la obra. Se Continua con excavacion manual para instalacion de tuberia de 3" para conexion a cajas de inspeccion electricas. Se instala acero de refuerzo para construccion de vigas de cimentacion. Se excava manualmente para construccion de filtro en el muro de contencion pequeño del sector oriental de la obra.
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 04:30 pm
Tiempo = Seco
Manuel Herrera
R. obra.
Leonardo R.
Resid. Interv.

28/09/2023

Se continua con excavación manual para conformación de anden sector oriental de la obra. Se continua con excavacion manual para instalación de filtro para el muro de contencion pequeño sector oriental de la obra. Se instala acero de refuerzo para construcción de viga de cimentacion. Se instala tubería electrica de 3" para conexion a cajas electricas
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 04:30 pm
Tiempo = Seco
Manuel Herrera
R. Obra.
Leonardo R.
Resid. Interv.

29/09/2023

Se continua amarrando acero y encofrando para construccion de viga de cimentacion. Se inicia con la construccion de filtro frances en el muro de contencion pequeña del sector oriental de la obra. Se continua con excavacion manual para conformacion de anden sector oriental de la obra.
H. Inicio: 07:00 am
H. Fin : 04:30 pm
Tiempo: Seco.

Leonardo R
Resid Interventoria

30/09/2023

Se continua con el amarre de acero de refuerzo y encofrado para construccion de viga de Cimentacion. Se realiza vaciado de concreto de 3000psi para construccion de viga de cimentacion del eje F entre 4 y 10.
Se continua con excavacion manual para conformacion de anden sector oriental de la obra. Se continua con la construccion de filtro Frances en el muro de contencion sector oriental
H. Inicio = 07:00 am
H. Fin = 02:00 pm Manuel Herrera
Tiempo: Seco R. Obra.

Leonardo R
Resid Interventoria

01/10/2023

Se realiza amarre de acero y encofrado para construccion de vigas de cimentacion. Se continua con excavacion manual para conformacion de anden.
H. Inicio: 07:00 am
H. Fin : 12:00 pm
Tiempo: Seco

Resid Interv.

ANEXO 01 – BITACORA DE OBRA
OCTUBRE 2023

BITACORA PARQUE LA JOYITA

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

Sábado 30 sep/023

Bahía-Parqueadero: Se funde el anillo 9 del caisson C1, anillo 9 del caisson C2, anillo 10 del caisson C3, y anillo 8 del caisson C8; se continuiga con el armado del acero de caissons; se funden los caissons B7, B8 y B5. Jardín Infantil: Excavaciones muro tipo 2. Salón comunal: Enrafrados exterior principal y interior muro tipo 3. Diagonales. Personal de obra: Maestro general, cinco oficiales, dos ayudantes, operador, fogonero. Retroexcavadora Kubota U90, Retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

02-Oct Se realiza visita de control técnico.
Se evidencia falta de personal, se solicita que los residentes de obra e interventoria, esten en obra, si es necesario trasladar oficina administrativa al salon comunal.
las actividades programadas a ejecutar la semana pasada no se cumplieron porque hubo salida masiva de personal
- Se deben cubrir los frentes de obra abiertos con el personal minimo requerido de 60 personas

Componente tecnico de interventoria.
En recorrido de obra se evidencia disminucion de personal operativo, por lo cual se le solicita al contratista de obra aunar esfuerzos para garantizar la presencia de personal operativo en obra para avanzar en la ejecucion de las actividades en los diversos frentes de obra, y dar cumplimiento

Norma

Powered by CamScanner

en los tiempos establecidos.
→ Se requiere al contratista brindar y garantizar un mejor terminado y calidad de las actividades, específicamente del MURO GAVION ARQUITECTONICO; el cual es la vista principal del proyecto.
→ Se le solicita al contratista de obra nuevamente, que se notifique a esta interventoría la programación de actividades que se vayan a ejecutar fuera del horario laboral; para brindar y garantizar el acompañamiento y control de calidad por parte de la interventoría.

Marce

Juan

Determina la excavación del caisson C4, C3 y C11; se funden los anillos 4 del caisson C5, y anillo 6 del caisson C6; se continúa con el armado de acero de los caissons de la estructura de la Bahía-Parqueadero. Plataforma control: Excavaciones muro tipo 2 en el sendero superior. Salón comunal: Excavaciones y entibados para muro tampa; encofrados columna principal y muro muro T3; se da inicio a las excavaciones para los hincas de pilotes del Parqueadero. Día nublado. Personal de obra: Maestro, cinco oficiales, dos ayudantes, operador, local. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U30, Retroexcavadora Catarpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, ingeniero de obra, Director de obra.

Martes 03/01/023
Bahía parqueadero: Se funde el anillo número 6 del caisson C5, y se termina la excavación del caisson B9. Se funden los caissons C4, C3, C11, C6 y C7. Sendero superior: Se funde el concreto de limpieza para los módulos 6, 7, 8, 9 y 10

Norma

Powered by CamScanner

del muro tipo 1. Losa comunal: Encofrados exteriores principal, y muros muro tipo 3 y muro rampa; se continúa con la instalación de hasta de ductos en el parqueadero. Dia Colocado. Personal de obra: Maestro general, ocho oficiales, dos ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, Retroexcavadora Caterpillar 320 D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Miercoles 04 oct/023

Bahia parqueaderos: Se terminan las excavaciones de las caissons B2, B3, B4, y se funde el anillo número 7 del caisson C5, se continua con el armado del acero de los caissons. Tendra superior: Excavaciones y concreto de limpieza para los módulos 8 y 9 del muro tipo 2. Plazoleta central: Excavaciones vigas graderia. Losa comunal: Se funden: trama de la escalera principal, muro enfrentamiento rampa, muro a cara exterior muro tipo 3. Dia soleado. Personal de obra: Maestro general, siete oficiales, once ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, Retroexcavadora Caterpillar 320 D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Jueves 05 oct/023

Bahia-Parqueaderos: Se funde el anillo 8 del caisson C5, y se termina la excavación del caisson B7-B; se continua con el armado de acero de caissons. Tendra superior: Armado de acero módulos 6 y 7 muro tipo 2. Plazoleta central: Excavaciones vigas graderia. Losa comunal: Retiro de encofrados exteriores y muro muro tipo 3; construcción bajos de recepción C2/4. Dia soleado. Personal de obra: Maestro general, siete oficiales, once ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, Retroexcavadora Caterpillar

320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Viernes 06 Oct/23

Se fundió el anillo número 8 y 9 del caisson C5; se fundieron los caissons D2, B6, C8, C1 y D7-B; se continúa con el armado del acero de caissons. Plazoleta central: excavación vigas de amarre. Sendero peatonal: Armado de acero muros 6, 7 y 8 muro tipo 2. Salón comunal: construcción lozas eléctricas CS-274, armado de acero escalera principal. Se presentan lluvias intermedias de 11:00 pm a 12:00 pm, y lluvias fuertes de 12:00 pm a 1:00 pm, los cuales retrasan las actividades en ejecución. Personal de obra: Maestro general, fiel de oficiales, ayudantes, operador, bodeguero. Maquinaria: Retro excavadora Kubota U55, retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Sabado 07 Oct/23

Polideportivo: se continua con la excavación de los caissons D3 y D4, y armado de acero para los caissons. Sendero peatonal: se continue con el armado del acero de los módulos 6, 7 y 8 del muro tipo 2. Plazoleta central: excavaciones para gradas. vigas. Salón comunal: Armado de acero escalera principal y siguientes e instalación de canastillas para juntas para el pavimento del polideportivo: Diseñador. Personal de obra: Maestro general, fiel de oficiales, oficiales ayudantes, operador, bodeguero. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directos de obra. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, Retroexcavadora Caterpillar 320D.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 09 oct/23
Bahía - Parqueadero: Se continúa con el armado del acero de los muros. Tendido superior: Armado de acero y encofrados de los módulos 6, 7 y 8 de los muros tipo 2. Rampa escalera 2: Construcción de pozos hidráulicos y eléctricos (P) 274. Plataforma central: Excavaciones varias. Gradería. Talón lateral: Se funde una franja de 6.00 m del Pavimento del parqueadero. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, Dos ayudantes, Dos y otro ayudantes, operador, Total. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota usa, retroexcavadora Caterpillar 320 D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectos de obra, Directos de obra.

10 oct Martes
- Se realiza visita de control técnico
- Se coordinan actividades de zapa muro tipo II
- Se fundio 2 lineas de concreto estampado parqueadero
- Faltan 8 canaletas para fundida total
- Se solicito cambio de guion por enchape de piedra muñeca
- Se realizan excavaciones plazoleta de salon comunal, actividad terminada el 17 oct.
- En el concreto estampado se evidencia traslapos en el molde, lo que refleja un mal acabado los dilataciones para corregirlas y conseguir cuerpo para acabado final en cuanto de lluvias
- Llamado atencion por calidad en acabados y vaciado concreto

Powered by CamScanner

Bahía-Parqueadero: Se funde el anillo número 7 y 8 del caisson B1; se continúa con el armado de acero de refuerzo de los caissons. Tendero superior: Se funde la zapa de los módulos 6, 7 y 8 del muro tipo 2. Plazoleta central: instalación de bancos de ductos y construcción de cajas CS274; concreto de limpieza y armado de acero vigas Graderia. Salón comunal: Extendida y compactación de base rampa, encofrados muros muro tipo 3, retiro de fallo parqueadero. Día nublado. Personal de obra: maestro general, diez oficiales diez y ocho ayudantes, operador, heal. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50, retroexcavadora Catapillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, inspectas de obra, Trabajadora social, Directas de obra.

Miércoles 11 Oct/23

Bahía parqueadero: Se continúa con el armado del acero de los caissons, y se funde el anillo número 3 del caisson B1. Tendero superior: Armado de acero módulos 6, 7 y 8 muros tipo. Plazoleta central: Instalación de bancos de ductos eléctricos, y construcción de cajas CS274; Armado de acero vigas graderia. Salón comunal: se funde el tramo número 2 del pavimento del parqueadero, se cuenta con los encofrados de la materia del muro tipo 3, instalación de tubería de las redes hidráulicas. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, diez y ocho ayudantes, operador, dos heals. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50, Retroexcavadora Caterpillar 320. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Jueves 12 Oct/23

Bahía-Parqueadero: Se termina la excavación de todos los caissons, y se continua con el armado del acero de refuerzo para caissons. Tendero superior: Encofrados vaciado muro tipo 2 módulos 6, 7 y 8. Plazoleta central: Instalación de re-

Norma

Powered by CamScanner

des hidráulicas y construcción de lozas de inspección; Armado de acero vigas groderia. Salón comunal: nivelación y compactación de base pavimentada, construcción de lozas hidráulicas. Día nublado. Personal de obra: maestro general, Diez oficiales, quince ayudantes, operados, dos bodegueros. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50, Retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectores de obra, Directos de obra.

Viernes 13/Oct/023

Bahía Pesquedero: Se funde el viaje 134, y se continúa con el armado del acero de los viajes faltantes superior. Enrafados vástagos módulos 6, 7 y 8. Plataforma central. Armado de acero groderia, instalación de ductos y construcción de lozas hidrosanitarios. Salón comunal: Se funde una losa de la rampa del muro tipo 3, y se continúa con la construcción de lozas hidráulicas. Día soleado. Personal de obra: Maestro general, Diez oficiales, quince ayudantes, tres bodegueros, un operados. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50, Retroexcavadora Caterpillas 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectores de obra, Directos de obra.

Sábado 14/Oct/23

Bahía Pesquedero: Se da inicio a las excavaciones y demoliciones para la viga de cimentación y dados del eje D, se continúa con el armado de acero para los viajes. Superior. Enrafados vástagos módulos 6 y 7 muro tipo 2. Plataforma central. Construcción de lozas de instalación hidráulicas y eléctricas; Armado de acero groderias. Salón comunal: Construcción lozas hidráulicas, nivelación de base pavimento pavimentada, Día nublado. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, quince ayudantes, operados, tres bodegueros. Pasa-

Norma

Powered by CamScanner

nal administrativo: Residente de obra, trabajadora social, SST, inspector de obra, Director de obra.

Lunes 16 Oct/23

Bahía porgueadero: Se da inicio al armado del acero de las columnas. Sendero superior: Se realiza la excavación y se funde el concreto de limpieza para los módulos 9 y 10 del muro tipo 2. Plataleta central: Se continúa con el armado del acero y se da inicio a las encofradas de la graderia. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, cinco oficiales, dos ayudantes, operadores. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota vieja, Retro excavadora Catapillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST.

17 Oct Martes

Se realizo visita de control tecnico.

- Falta personal y frentes de obra.
- Se evidencia falta de planeación actividades
- Avance ejecutado 51,54% para 57 días faltantes ejecutar el 48% faltante
- falta material para encha de muro contención falta matend estructura metalica pasarela.
- Se evidencia mala calidad en los concretos a la vista en lucido, vibrado y estampado la SDHT sugiere a la interventoria se pronuncie inmediatamente sobre recibo o rechazo de estos items.

Bahía Porgueadero: Se continúa con el armado de acero de las columnas. Sendero superior: Se da inicio a la construcción del muro en gavión arquitectónico en el módulo número 1,

se continúa con el encofrado del vastago de los módulos 6 y 7, y se da inicio al armado del acero de la zapata o zapa de los módulos 9 y 10. Plataforma central: Encofrados graderia, y se da inicio a la excavación de las vigas para la escalera. Salón comunal: Se continúa con la construcción de pozos hidráulicos, cerrado de base para el pavimento, excavación e instalación de ductos; se da inicio a los encofrados para el pavimento en el sector de la matera para la demarcación de las posguaderas. Se presentan lluvias fuertes de 3:00 pm a 4:00 pm las cuales suspenden todas las actividades en ejecución. Personal de obra: Maestro general, ocho oficiales, quince ayudantes, operados, tres fraileros. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directos de obra.

Miercoles 18 oct/23

Salón posguadero: Se continúa con el armado del acero de las columnas, y se realiza la localización y ubicación de las columnas 16 y 15. Jardines externos: muro gavión arquitectónico, en el módulo 1 del muro tipo 2; se funde el vastago de los módulos 6 y 7. Plataforma central: Encofrados graderias. Salon comunal: Encofrados cara interna matera muro tipo 3, construcción ejes hidráulicos, encofrados pavimento posguadero sector matera. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, ocho oficiales, quince ayudantes, operados, tres fraileros. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Directos de obra.

De acuerdo a la solicitud realizada por esta interventoría mediante oficio el día 17/10/23, donde se da a conocer el llamado de atención Ver

Norma

Powered by CamScanner

mala calidad del acabado de la placa concreto 04R47 en el parqueadero, esta contraventoría no aprueba ni adapta esta translación, por lo tanto de no presentarse una nueva propuesta de presentación para mejorar el acabado de la placa, se debe proceder a su demolición de manera inmediata.

⇒ Se le solicita al contratista de obra el no retirar las muestras (cilindros de concreto), de los recipientes con agua donde se depositan hasta que llegue personal de laboratorio, ya que el día de ~~ayer~~ hoy 18/10 se evidencia que fueron retiradas y dejadas expuesta al sol.

⇒ Se retira al contratista de obra que el personal debe ser independiente para cada PIP.

⇒ Se solicita al contratista aumentar el personal operativo de obra para avanzar en la ejecución de actividades en los diversos frentes que se puede ir avanzando. tales como:

Sendero costado occidental del parqueadero.
Rampa escalera.
Conformación de dados para postes de luminarias.
Cunas obras anden sobre comunal.
Obra gavión arquitectónico.
Armado de acero para Bahía parqueaderos.

⇒ Se debe aunar esfuerzos de manera mancomunada ya que el tiempo se prorroga ya es

Norma

Powered by CamScanner

muy alto y el avance desde el 28/09/23 a la fecha no supera el 4%.
*Se le recuerda al contratista que se debe informar a esta interventoría con 2 días de anticipación, si se van a ejecutar actividades en horario no laboral para brindar el acompañamiento, de lo que realizado este aviso, cualquier inconformidad o falla en la ejecución de estas actividades serán únicas y de entera responsabilidad del contratista y deberán atenderse las directrices impartidas por la interventoría sea el caso de no aprobación o conformidad.

Jueves 19/04/23
Bahía porticadero: Se fundan las losas B6, B5 y B4. Tendero superior: Se continúa con el aparejo arquitectónico, enchapados vástago módulo 8 y armado de acero módulos 9 y 10 muro tipo 2. Plataleta central: Enchapados graderías. Salón comunal: Se funde un tramo de la viga interna de la matera del muro tipo 3, se da inicio a las excavaciones para la columna 2 de la parte alta, construcción de cajas hidráulicas. Día nublado. Personal de obra: nueve oficiales, oraz y seis ayudantes, operador, tres hadas. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Viernes 20/04/23
Bahía Porticadero: Armado de acero de refuerzo de columnas. Tendero superior: Armado de acero módulos 9 y 10, y enchapes módulo 8 muro tipo 2. Plazoleta central:

se funde el tramo central de las graderías. Salón comunal: se continúa con el extendido, nivelación y compactación de base para la rampa, y áreas de circulación peatonal; se continua con la construcción de cajas hidráulicas y excavación manual para las escaleras auxiliares o secundarias. Día nublado. Personal de obra: maestro general, nueve oficiales, Diez y seis ayudantes, operador, tres hoyos. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U35. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Lunes 21/oct/023

Bahía parqueadero: se continúa con el armado de acero y la colocación y ubicación de columnas. Tendera superior: Armado de muro gaviones arquitectonico; se funde el módulo 8 del muro tipo 2. plateleta central. Batida de anclados geotecnia. Salón comunal: Extendido, nivelación y compactación de base granular para rampa y senderos, construcción de cajas de aguas lluvias CJ274. Día nublado. Personal de obra: maestro general, nueve oficiales, Diez y seis ayudantes, operador, tres hoyos. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U35, retroexcavadora caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspector de obra, Director de obra.

Lunes 23/oct/2023

Se realiza visita de control tecnico, se solicita a interventoria pronunciamiento sobre placa parqueadero inferior.

- En plan de contingencia, se debe contemplar trabajos nocturnos, incremento de personal y planeacion estrategica de frentes de obra.
- Se solicita inicio de actividades, ya programadas como piedra sobre muro inclinado.

SST-CO

Bahía Pesquedero: Se da inicio a las excavaciones y demoliciones para la cimentación del eje D. Jardín Superior. Se da inicio al armado del acero de los castigos y encofrados de los módulos 9 y 10, se continúa con la construcción del gavión arquitectónico módulo 1 del muro tipo 2. Plazoleta central: Armado de acero estructural, y gavión arquitectónico muro tipo 2. Salón comunal: Se continúa con la extendida y compactación de base granular para zonas duras, y excavaciones para redes eléctricas. Día soleado. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, diez y nueve ayudantes, operador, tres locos. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U35, retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectora de obra, Dirección de obra

Martes 24 oct/23

Bahía pesquedero: Se continúa con el armado de acero de columnas y viga viga y nivelación y nivelación. Rampla: Excavaciones y demoliciones para nivelación de terreno para cimentación. Jardín superior: Se continúa con la construcción del gavión arquitectónico en el módulo 1 del muro tipo 2; se fundan los castigos 9 y 10 del muro tipo 2. Plazoleta central: Se continúa con el armado del acero de la escalera de las graderías, y construcción de gavión arquitectónico en los módulos D y E del muro tipo 2. Salón comunal: Extendida, nivelación y compactación de base granular Jardín, y excavaciones para bancos de ductos eléctricos. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, veinte ayudantes, operador, tres locos. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U35, retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectora de obra, Dirección de obra.

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles 25 oct/23

Bahía Parqueadero: Se funden las columnas D2, G3, B4 y B3. Jardín superior: Retiro de enchapados muro tipo 2 módulos 9 y 10, se continúa con la construcción del muro en gavión arquitectónica. Placa-loza contra: Armado de acero escalera, construcción muro gavión arquitectónico muro tipo 2 módulos D, E, F y G. Salón comunal: Excavaciones para redes eléctricas, compactación de Base granular para senderos, toma de densidades, se da inicio a la instalación del bordillo en la rampa. Día soleado. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, veinte ayudantes, operarios, tres boleros. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectas de obra, directas de obra.

Jueves 26 oct/23

Bahía parqueadero y plazoleta: Se avanza con las excavaciones y demoliciones de anillos para las obras de retoque de las dalas. Jardín superior: Construcción de muro en gavión arquitectónico módulos D, E y F muro tipo 2. Rampa escalera 2 se da inicio a la instalación del bordillo. Placa-loza contra: Armado de acero y enchapados escalera graderías. Salón comunal: Se funde un tramo de la placa de contrapiso entre la escalera y el salón comunal, y la viga para el muro de contramiento de la rampa. Se continúa con la instalación de bordillo, y circuitos e instalación de tubería eléctrica entre ejes D2 y B2. Se presentan lluvias intermitentes de 3:00pm a 4:30pm las cuales retrasan las actividades en ejecución. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, veinte ayudantes, dos operadores, tres boleros. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, retroexcavadora caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectas de obra, director de obra.

Viernes 27/04/23

Bahía Manzanares y parcela: Excavaciones y demoliciones para los elementos de cimentación - Viga y dados -. Jardera superior: Rellenos. muro tipo 2. Rampa escalera 1 y 2 - Instalación de bordilla. Plataforma central: Armado de acero y encofrados escalera, construcción de muro gavión arquitectónico muro tipo 2 módulos D, E y F. Isla comercial: Instalación de bordillo y construcción de muro en mampostería de concreto en la rampa, excavación e instalación de Ductos eléctricos cajas D1 a D2. Se presentan lluvias suaves de 10:00 a 11:32 am. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, veinte ayudantes, dos operadores, tres botas. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectas de obra.

Sábado 28/04/23

Bahía Manzanares y parcela: Se continúa con las demoliciones de anillos y excavaciones para los dados y viga de cimentación, y se da inicio a la instalación de conducto pobre para estos elementos. Jardera superior: Rellenos en material seleccionado. Rampa escalera 1 y 2 - Instalación de bordillo. Plataforma central: Armado de acero y encofrados escalera, construcción de muro en gavión, Isla comercial: Construcción muro en mampostería confinamiento rampa e instalación de bordilla, excavación, instalación y rellenos para redes eléctricos, y construcción de cajas D3 y D4. Día nublado. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, veinte ayudantes, dos operadores, tres botas. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U55, retroexcavadora Caterpillar 320D. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, inspectas de obra.

Lunes 30/04/23

Bahía Parqueadero y Pasarela: Excavaciones y demoliciones para dados y vigas de cimentación, y concreto de limpieza. Rampa escalera 1 y 2: Instalación de bordillo. Plazoleta central: Construcción garzón arquitectónico, armada de acero y enchapados exclara, excavaciones para cárcamo prefabricado. Salón comunal: Instalación de bordillo, construcción de muro de contramonto en hbgue de concreto rampa, construcción de vigas eléctricas CO 274. Se presentan lluvias intermedias de 11:30 a 12:30 pm. Personal de obra: Maestro general, diez oficiales, diez ayudantes, tres operadores, tres bobs. Maquinaria: Retroexcavadora Kubota U50, retroexcavadora Caterpillar 320D, minicargador Case SR200. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, Directos de obra.

Martes 3/04/23

Bahía Parqueadera y pasarela. Excavaciones y demoliciones para dados y viga de cimentación; se da inicio al armado del acero de dados, Rampa escalera 1 y 2: instalación de bordillo. Plazoleta central: Enchapados exclara, excavaciones para cárcamo prefabricado, construcción muro garzón arquitectónico. Rampa escalera 3: construcción muro garzón arquitectónica, Salón comunal: Instalación de bordillo, construcción muro mampostería en concreto instramiento rampa, construcción vigas CO 274. Se presentan lluvias fuertes de 3:30 pm a 4:30 pm, las cuales suspenden las actividades en ejecución. Personal de obra: Maestro, diez oficiales, veinte ayudantes, dos operadores, tres bobs. Maquinaria: Retro excavadora Kubota U50, minicargador Case SR 200. Personal administrativo: Residente de obra, SST, trabajadora social, director de obra.

Norma

Powered by CamScanner

BITACORA PARQUE BELLO HORIZONTE

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana
Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com
Teléfonos: (1) 2562716 – 3134204794
Bogotá - Colombia

- Una vez completada la profundidad requerida en el caisson no. 4, se retoman las tareas de excavación en el caisson no. 5.
- Siendo las 10:00 am se realiza el simulacro de evacuación logrando la población completa de la obra.
- Se realiza el cierre definitivo del cruce vial y se modifica y reajustan los límites de la obra.
- Se termina de fundir el anillo y recobrimiento en concreto de cajas electricas en la cancha.
- Continuó la excavación manual para la terraza alta de zona de niños sector 3.
- Con uso de herramienta manual se realiza parte de la demolición de andenes, sardineles y tramos del pavimento rigido.

N.237 Octubre 05/2023 Jueves

- 3 técnicos topografía, 1 prof. social, 1 prof. SST, 1 Insp. de obra, 1 maestro de obra, operativos.
- Se retoman tareas de excavación en caisson NO. 5.
- Continua instalación de los modulos superiores del cerramiento contra impacto en cancha secto 1.
- Inicia el retiro del escombro producto de la demolicion de pavimento rigido
- Continua excavación manual y perfilado de terreno del para terraza y descansos escalera.
- Inicia excavación manual e instalación tubería para caja eléctrica zona alta sector 3 en dirección de la caja de afloramiento.
- Continua excavación para prolongación de los sumidero en vía zona pompeyano
- Se suspenden tareas desde las 3 de la tarde por fuertes lluvias.

N. 238 Octubre 06/2023 Viernes.

- 3 técnicos en topografía, 1 maestro de obra, 2. boal 1 prof. ambiental, 1 prof. SST, 1 prof. social, 16 Operativos.
- Continua el retiro de escombros y el producto de las excavaciones.
- El materia en vía esta colmatado por las lluvias dadas durante el ~~fin de semana~~ la noche anterior.
- Continuan tareas de excavación en caisson 5.
- Se realiza el vaciado de la viga de confinamiento de terraza superior juego de niños sector 3
- termina la nivelación de la terraza de juego de niños
- Continua el montaje de reflectores, fotocelda y cableado de postes.
- Continua instalación de los modulos del cerramiento en la cancha.

N. 239 octubre 07/2023 Sábado

- 3 técnicos topografía, 2 boal, 1 maestro de obra, 1 inspector de obra, 1 prof. SST, 1 profesional social, 15 operativos.
- Continua instalación de módulos de cerramiento contra impacto en cancha sector 1.
- Se inicia el trazo de los peldaños escalera tramo medio sector 3.
- Se desencofra viga de cimentación terraza alta juegos de niños sector 3.
- Inicia el lleno compactado sobre geotextil en tramo de anden superior sector 3.
- Continua excavación de caisson no 5
- Continua excavación manual para prolongación de red de sumideros en via.
- El material expuesto tras demolición de pavimento se encuentra colmatado por fuertes lluvias de la noche anterior por lo cual no se puede trabajar Con la maquina amarilla.

N 240 octubre 08/2023 Domingo
- 1 maestro de obra, 6 operativos.
- Se completa la excavación manual para la tubería en prolongación de los sumideros fuera del pompeyano; se introduce el tubo y se realiza su cimentación y se cubre.

N.241 octubre 09/2023 Lunes
- 1 Maestro de obra, 1 inspector de obra, 2 boal, 1 prof. SST, 1 prof. social, 3 técnicos topografía, 16 operativos.
- Se aplica concreto pobre (solado) en talud tramo medio de escalera sector 3.
- Continuan tareas de compactación en tramo alto andén norte sector 3.
- Continua el armado de los postes en piso en el montaje de reflectores, cable y celdas.
- Inicia escarificación en la base existente en vía para que pierda la humedad por fuertes lluvias en la tarde del sabado.
- Inicia el lleno compactado en terraco alta de juego de niños sector 3.
- Se realiza maniobra para instalación de postes de alumbrado público en secto 2.
- Continuan tareas de acabados y soldadura en cerramiento contra impacto concha.
- Se presentan fuertes lluvias terminando la jornada y durante la noche.

N. 242 Octubre 10/2023 Martes
- 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 3 técnicos de topografía, 2 boal, 1 prof. sst, 1 prof. social, 14 operativos.
- Inicia la jornada con leves lluvias; Durante varias ho

...ras de la noche de ayer se presentaron lluvias que colmataron el material (Base granular) en la zona del pompeyano razón por la cual no es posible retomar actividades hasta que sese la lluvia y pierda el exceso de humedad el material.

- Continua la instalación del acero de vigas llave y peldaños para tramo medio de escalera sector 3.
- El día de ayer se fundio el anillo no. 8 del caisson 5 hoy se retoman las tareas de excavación.
- Continua el armado y construcción de gavión arquitectónico sector 2.
- Continuan tareas de soldadura y acabados del cerramiento contra impacto concha.
- Continua excavación manual para prolongación de red de sumideros sobre la carrera 1ra; se extrae la basura acomodada en los sumideros existentes.

10 oct Se realiza visita de control tecnico por SDHT

- Se evidencia, mala ubicacion de sumideros ubicados en pompeyano, ajusta.
- Colocar cerramiento de proteccion lateral
- Se evidencia poco personal operativo en obra
- falta personal operarios para gaviones.

- Se realiza reunión entre profesionales forestales donde inicio en la obra de Bello Horizonte.
- Se realiza replante y ajuste a la realidad en campo para definir nivel y bombeo final del pompeyano
- Interventoria requiere al contratista ampliar el tiempo del PMT, puesto que este se comple el 15 de oct. 2023.

N 243 Octubre 11/2023 Miercoles

- 3 boal, 3 técnicos topografía, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 prof. SST, 1 prof. social, operativos.
- Continua la escarificación del material para conformación y lleno compactado a fin de que este pierda el exceso de humedad que con las lluvias colmató y retraso su compactación.
- Se repite y reajusta implantación a niveles de pompeyano dada el brusco cambio de inclinación que da el empalme de las 2 vías (tal y como estaba original)
- Continua el lleno compactado para la terraza alta juego de niños y descanso 2 de escalera sector 3.
- Continua la instalación de formaleta y acero para tramo medio escalera sector 3.
- Continua la soldadura y acabados en el cerramiento contra impacto, cancha - sector 1.
- Se realiza la muestra de algunos patrones viables en la instalación del adoquín y este se presenta a interventoria. Solicitando esta última el presentar dibujo de los patrones con la combinación de los colores en obra y los acordados en comité.
- Continua excavación para anillo 8 caisson 5.
- Continua construcción de gaviones arquitectonicos sector 2.
- Termina instalación de tubería novafort para extención en la red de los sumideros por la cra 1a.


N 244 Octubre 12/2023 Jueves

- 1 Ing. Ambiental, 2 boal, 3 técnicos topografia, 1 inspector de obra, 1 maestro de obra, 1 prof. social, 1 prof. sst, 14 operativos.
- termina la instalación de formaleta y acero para tramo medio de escalera sector 3.
- termina instalación de malla electrosoldada para descanso, terraza alta juego de niños y acceso a gimnasios.

- Se completo la escarificación de la base para la compactación en zona del pompeyano; se hace retiro de un viaje doble de tierra y escombro.
- Continuan las tareas de soldadura y acabados de pintura al cerramiento contra impacto en cancha.
- No es posible compactar la base del pompeyano por averia en el rodillo compactador de 12 Tn.

N. 245 Octubre 13 / 2023 Viernes

- 1 maestro de obra, 1 inspector de obra, 2 boal, 3 técnicos topografia, 1 prof. SST, 15 operativos + 2 operativos adicional (Pidac), 1 prof. social.
- Se continua con la instalación de gaviones arquitectonicos c, muro IP1 sector 2
- Se continua con la excavación y fundida de anillo 9 caisson No 5
- Se inicia amarre de acero para caisson No 2
- Se Nivela y compacta B600 en Pompeyano
- Se continua con soldadura en cerramiento cancha
- Se Inicia con la excavación para traslado tubo de acueducto
- Se recibe en obra 3 sumideros para Pompeyano
- Ante los frecuentes ingresos de la comunidad por la zona sur del PIP en la zona de las graderias existentes del secto 1 (cancha) se hace necesario instalar un tramo extra de Polisombra

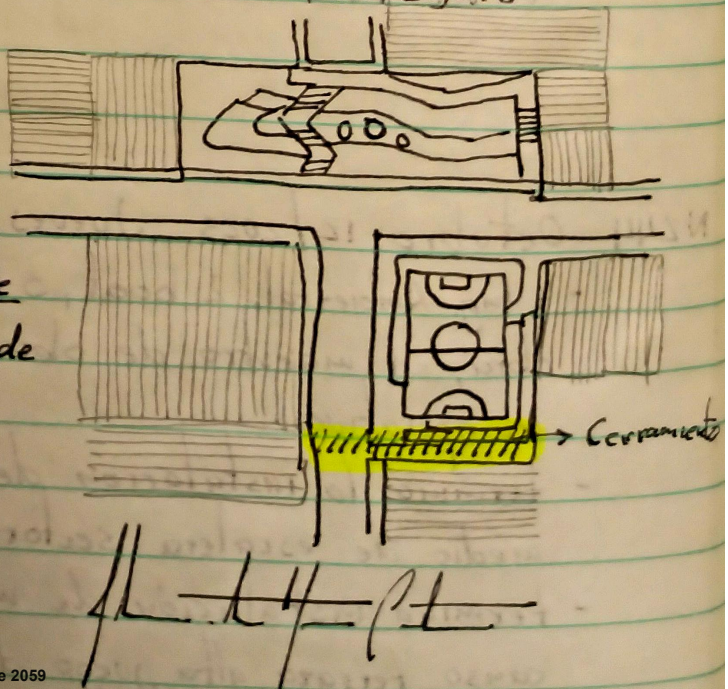

N. 246 Octubre 14/2023 Sabado

- 1 maestro de obra, 1 Inspector de obra, 2 boral, 3 topicos topografia, 1 prof SST, 15 operativos + 2 operativos adicional (Pridac), 1 prof social
- Se inicia la excavación del anillo No 10 caisson No 5
- Se continua con el amarre de acero para caisson No 2
- Se continua con la compactación de B600 en pompeyano
- Se continua con la excavación para traslado tubo de acueducto
- Se continua con soldadura en cerramiento concha
- Se desmontan los plafones de los pozos para realizar el alzado a nivel.
- Se instala señalización perimetral al área de los pozos en zona de pompeyano
- Inicia desencofrado para la formaleta instalada en el vaciado de terraza alta juego de niños.
- Avanza en taller producción cerramiento juegos de niños y baranda M81 - M83

N. 247 Octubre 16/2023 Lunes

- 1 maestro de obra, 6 operativos obra, 2 operativos Pidacala.
- Continuan excavaciones, cimentación, instalación de tubería y accesorios para reubicación de red presión del acueducto de Boyotá.
- Inicia la construcción mediante mamposteria para el realce de los pozos en la zona del pompeyano.
- Continua la compactación del B-600 para lograr altura y nivel definitivo en pompeyano.
- Se instala polisombra de cerramiento de obra en el costado sur del PIP contra sendero acceso a casas para evitar ingreso de la comunidad

N. 248 Octubre 17/2023 Martes

- 1 maestro de obra, 1 inspector de obra, operativos, 2 operativos de Pidacala, 1 prof. SST, 1 prof. social, 3 técnicos de topografía, 2 boal,
- Continuan trabajos de soldadura y acabados del cerramiento contra impacto en cancha.
- Continua el amarrado de las canastas de acero para los caisson.
- Continua excavacion para anillo no. 10 en caisson No 5. una vez completo inicia instalación acero y formaleta.
- Inicia limpieza en área de pompeyano para toma de densidades.

17 oct Se realiza visita de control tecnico.

- Se evidencia organizar frentes de obra con su respectivo personal.
- Se evidencian trabajos de desarrollo de linea de acueducto para actividades escolares
- Se procede para esta semana se funda pompeyano
- Se siguen realizando actividades de gestion arquitectonico
- Se evidencia falta de instalación de mobiliario y juegos infantiles los cuales por programacion deben estar ejecutando.
- En general ajustar la planeación estrategica de actividades a ejecutar con relación a la programación.

- En horas de la tarde un fuerte aguacero se presenta y ante los sumideros colapsados calles arriba de la obra el agua bajo en cantidad y fuerza suficiente para remover el B600 compactado para zona de pompeyano 3:00pm →
