INFORME TÉCNICO CONVENIO 1463 DE 2025

PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROYECTO:	CONVENIO DE USO DE RECURSOS No. 1463 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO- NARINO
VALOR:	**$ 39,221,761,882**
LOCALIZACIÓN	**CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO**

COMPONENTES	PGB VIGENCIAS FUTURAS 2026	PGN VIGENCIAS FUTURAS 2027	TOTAL
OBRAS CIVILES, SUMINISTROS Y PUESTA EN MARCHA	$ 5,459,602,593.00	$ 30,937,748,029.00	$ 36,397,350,622.00
INTERVENTORÍA DE OBRAS, SUMINISTROS Y PUESTA EN MARCHA	$ 308,303,566.00	$ 1,747,053,540.00	$ 2,055,357,106.00
SEGUIMIENTO MVCT (2%)	$ 115,358,123.00	$ 653,696,031.00	$ 769,054,154.00
TOTAL	**$ 5,883,264,282.00**	**$ 33,338,497,600.00**	**$ 39,221,761,882.00**

EROGACIÓN PRESUPUESTAL:	Según la Clásusula Décima Segunda del Convenio: VALOR DEL CONVENIIO: El presente CONVENIO no genera erogación presupuestal entre las PARTES, toda vez que de conformidad con lo establecido en artículo 2.3.3.1.8.7 del Decreto 1425 de 2019 que subrogó el Decreto 1077 de 20156, en concordancia con lo establecido en el inciso 2 del artículo 2.3.3.1.8.6 ibidem, este CONVENIO se celebra con el fin de establecer exigible el pago del apoyo financiero de la nación al MUNICIPIO, para la realización del PROYECTO.
APORTE MINISTERIO DE VIVIENDA:	$ 39,221,761,882.00
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO
FECHA DE CONVENIO:	NOVIEMBRE 7 DE 2025
PLAZO:	VEINTISIETE (27) MESES
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 11 DE 2025
FECHA FINAL:	FEBRERO 10 DE 2028
PÓLIZA No.:	NO APLICA
SUPERVISOR MUNICIPIO:	ALCALDE MUNICIPAL SAN PABLO
SUPERVISOR MINISTERIO:	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS MIN VIVIENDA


OBJETO:	Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de San Pablo del departamento de Nariño, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrative de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: Optimización del alcantarillado del casco urbano y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector urbano del municipio de San Pablo departamento de Nariño" en adelante el "PROYECTO". PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARINO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	El municipio de San Pablo, ubicado en el departamento de Nariño, enfrenta serios problemas relacionados con la recolección y separación de aguas combinadas y el tratamiento de las aguas residuales en su casco urbano. La infraestructura de alcantarillado actual es insuficiente, lo que genera desbordamientos, contaminación del medio ambiente y riesgos para la salud pública. Además, la falta de una planta de tratamiento adecuada contribuye al vertido de aguas residuales sin tratar, afectando tanto los recursos hídricos como la calidad de vida de los habitantes. Este contexto plantea una urgente necesidad de optimizar el sistema de alcantarillado combinado existente y construir una planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la sanidad y sostenibilidad del municipio, garantizando un manejo adecuado de las aguas servidas y un entorno más saludable para la población.

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:	Actualmente el casco urbano del Municipio de San Pablo, Nariño, cuenta con un sistema de alcantarillado combinado, que recoge aguas lluvias provenientes de áreas verdes, tejados y patios, así como aguas negras domésticas e industriales. Esta red cuenta con un 43% de redes en PVC y un 57% de redes en Concreto. La infraestructura existente cuenta con 103 Pozos de inspección, de los cuales la mayoría se encuentran colmatados, producto de la falta de descarga de las redes existentes. Un total de 82 sumideros existentes que no cumplen con las condiciones de recolección de escorrentía para drenar a través de las calles. La red está compuesta por tuberías de PVC y concreto, de acuerdo con el PSMV los componentes más antiguos del sistema tienen más de 30 años. Dado el tiempo de construcción inicial de la infraestructura existente, la falta de empalmes de los colectores con las estructuras de conexión y la falta de mantenimiento conllevo al colapso total de esta fase de alcantarillado construida, encontrándose totalmente sedimentado. Adicionalmente, hay sectores sin cobertura, tramos en contrapendiente y falta de capacidad hidráulica para lo que actualmente se encuentra en la zona. Por otro lado, no se cuenta con un sistema de tratamiento adecuado, lo cual se ha logrado identificar que de acuerdo al PSMV existen 5 vertimientos directos a cuerpos de agua: • Vertimiento No. 1 Cementerio: Este vertimiento se encuentra ubicado al norte del casco urbano municipal, cerca de la entrada del antiguo cementerio, la descarga sanitaria la realiza un emisario final en Concreto con diámetro de 12 pulgadas. • Vertimiento No. 2 Bateros: Este vertimiento se encuentra ubicado al noroeste de la cabecera municipal, debajo de la urbanización Villa Cristina, La descarga sanitaria se genera mediante una tubería de 16 pulgadas de diámetro, en material PVC. • Vertimiento No. 3 La Playa: Este vertimiento se encuentra ubicado al suroeste de la cabecera municipal, por la avenida La Playa, que es la misma Calle 8, salida hacia Florencia Cauca. El vertimiento está en la mitad de la estructura Box Coulvert construida para canalizar la Quebrada Bateros. • Vertimiento No. 4 Puente Río Mayo: Este vertimiento se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal, a aproximadamente 20m aguas abajo del puente vehicular sobre el río Mayo, La descarga sanitaria se genera mediante una tubería de 24 pulgadas de diámetro, en material PVC. • Vertimiento No. 5 Estadio: En el sector del estadio del municipio de San Pablo se evidencia un colector tipo rejilla con tubería la cual atraviesa la cancha del estadio y va hacia la quebrada para descargar. Se requiere la implementación de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para dar cumplimiento al PSMV, mejorar la calidad de vida de los habitantes, contribuir al saneamiento de la quebrada Bateros y el río Mayo, evitando la afectación de pescadores, usuarios del río y de las instalaciones e infraestructura que se encuentra aguas abajo, en cercanía, de los puntos de descarga.

LOCALIZACIÓN:	El Municipio de San Pablo está ubicado en el departamento de Nariño, cuenta con 26 barrios y 4 corregimientos compuestos de 47 veredas, pertenece a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO". Las coordenadas geográficas son 05° 00´ Latitud Norte, 73° 54´ Longitud Oeste, altitud de 1400 a 3350 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 10ºC, hasta los 18ºC. Su localización a nivel Municipal y Departamental se puede ver en la figura 1.1.



1. COMPONENTE TÉCNICO **PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:**	Para la ejecución del proyecto el municipio adelantó los procesos licitatorios para la contratación de Encargo Fiduciario, Obra Civil e Interventoría, cuyos contratos se encuentan en ejecución. Las principales actividades en el proyecto son las siguientes: Sistema total de alcantarillado (acometidas, redes colectoras, estructuras de conexión, sumideros emisarios, Planta de tratamiento de agua residual (PTAR) y descarga final) con el fin de garantizar la recolección y transporte de las aguas residuales domésticas y las aguas lluvias, realizar el tratamiento del afluente y el posterior vertido del efluente en condiciones adecuadas, en cumplimiento de la normatividad ambiental; aportando ostensiblemente al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al cuidado del medio ambiente.

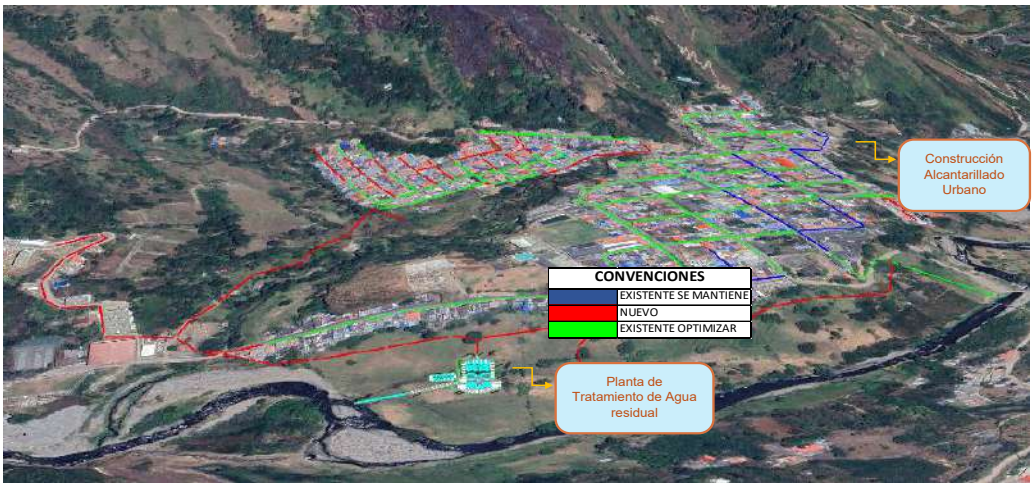

PLANO GENERAL DEL PROYECTO

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	A continuación se relacionan las diferentes comunicaciones entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de San Pablo con los temas tratados, referentes al Convenio 1463 de 2025.

CORREOS RECIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA

#	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Septiembre 15 de 2026	YAN CARLOS BECERRA PINEDA	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 1463_2025 SAN PABLO_NARIÑO	Sin anexos

De: **Yan Carlos Becerra Pineda** <YBecerra@minvivienda.gov.co>
Date: mar, 15 de sept de 2026, 7:24 a.m.
Subject: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 1463_2025 SAN PABLO_NARIÑO
To: planeacion <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, secretariadehacienda <secretariadehacienda@sanpablo-narino.gov.co>, alcaldia <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>, contactenos <contactenos@sanpablo-narino.gov.co>, Cristian Camilo Darwish Salama Montoya <CCDarwish@minvivienda.gov.co>, Luisa Fernanda Caamano Lopez <LCaamario@minvivienda.gov.co>, Victor Alexander Heredia Castaneda <VHeredia@minvivienda.gov.co>

CORREOS ENVIADOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA

FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS

1	Septiembre 7 de 2026	Yan Carlos Becerra Pineda	Re: Remisión del Comunicado No. 2026EE0044537 – Convenio de Uso de Recursos No. 1463 de 2025	* 0. Respuesta a Comunicado 2026EE0044537-CUR 1463-2025 de julio de 2026 - Documentos requeridos para el trámite de cuenta del primer desembolso.pdf * 1. CUENTA DE COBRO.pdf * 2. RUT.pdf * 3. FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.pdf * 3.1 FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.xls * 7. Justificación de la Solicitud de desembolso - Convenio de Uso de Recursos.pdf * 8 INFORME TÉCNICO JULIO CONVENIO 1463 DE 2025 V2 FM.pdf * 8.1. INFORME FINANCIERO CONVENIO 1463 DE 2025 JULIO.pdf * 9. CONTRATO LP 002 - 2025 EF SAN PABLO VF 2.pdf-firmado.pdf * 11. CONTRATO DE OBRA.pdf * 11.1 ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA.pdf * 12. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.pdf * 12.1 ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA.pdf * 13. CONSTANCIA DE REPORTE EN SIGEVAS.pdf * Cedula de Ciudadania Mario Trujillo.pdf



Re: Remisión del Comunicado No. 2026EE0044537 – Convenio de Uso de Recursos No. 1463 de 2025

Recibidos ×

Resumen de IA

Alcaldia Sanpablo Narino
para Yan, CCDarwish, Planeacion, Secretaria, mi

7 sept 2026, 17:40

Cordial saludo,
En atención al comunicado No. 2026EE0044537, nos permitimos remitir los documentos solicitados para adelantar el trámite correspondiente al primer desembolso del Convenio de Uso de Recursos No. 1463 de 2025, suscrito para el municipio de San Pablo, Nariño.
Agradecemos la atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.
Cordialmente,

El sáb, 25 jul 2026 a las 15:56, Yan Carlos Becerra Pineda (<YBecerra@minvivienda.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Por medio del presente, me permito remitir el **Comunicado No. 2026EE0044537,** mediante el cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicita la remisión de los documentos requeridos para adelantar el trámite correspondiente al **primer desembolso** del **Convenio de Uso de Recursos No. 1463 de 2025**, suscrito para el municipio


2	Septiembre 10 de 2026	Yan Carlos Becerra Pineda	Re: Remisión del Comunicado No. 2026EE0044537 – Convenio de Uso de Recursos No. 1463 de 2025	* CERTIFICACION BANCARIA EF SAN PABLO NARIÑO LP 002-2026



3	Septiembre 15 de 2026	Yan Carlos Becerra Pineda Víctor heredia	Re: Remisión del Comunicado No. 2026EE0044537 – Convenio de Uso de Recursos No. 1463 de 2025	* CERTIFICADO CUENTA BANCARIA FIDUCIA.pdf



4	Septiembre 16 de 2026	Yan Carlos Becerra Pineda	Informe de avance financiero del convenio 1463 de 2025 correspondiente al mes de agosto de 2026	* 1. INFORME FINANCIERO CONVENIO 1463 DE 2025 -AGOSTO



5	Septiembre 22 de 2026	Víctor Heredia	Documentos Primer Desembolso Convenio 1463 de 2025 San Pablo	* 0. Respuesta a Comunicado 2026EE0044537-CUR 1463-2025 de julio de 2026 - Documentos requeridos para el trámite de cuenta del primer desembolso.pdf * 1. CUENTA DE COBRO.pdf * 2. RUT.pdf * 3. FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.pdf * 3.1 FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.xls * 4. CERTIFICADO CUENTA BANCARIA FIDUCIA.pdf * 5. CERTIFICACION BANCARIA EF SAN PABLO NARIÑO LP 002-2026.pdf * 5. CERTIFICACION CTA AH 466099058 CONVENIO NO. 1463.pdf * 7. Justificación de la Solicitud de desembolso - Convenio de Uso de Recursos.pdf * 8 INFORME TÉCNICO JULIO CONVENIO 1463 DE 2025 V2 FM.pdf * 8.1 INFORME FINANCIERO CONVENIO

				* 8.1. INFORME FINANCIERO CONVENIO 1463 DE 2025 JULIO.pdf * 9. CONTRATO LP 002 - 2025 EF SAN PABLO VF 2.pdf-firmado.pdf * 11. CONTRATO DE OBRA.pdf * 11.1 ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA.pdf * 12. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.pdf * 12.1 ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA.pdf * 13. CONSTANCIA DE REPORTE EN SIGEVAS.pdf * Cedula de Ciudadania Mario Trujillo.pdf

Documentos Primer Desembolso Convenio 1463 de 2025 San Pablo

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> mar, 22 sept, 3:21 p.m. (hace 7 días)
para VHeredia

Cordial saludo.
Remito para su conocimiento los documentos consolidados que se han radicado vía correo electrónico para efectos de la Solicitud del primer desembolso del Convenio 1463 de 2025 entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de San Pablo.

Pendiente el envío del Acta de inicio del Encargo fiduciario.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Lorena Chaves M.

6	Septiembre 25 de 2026	Yan Carlos Becerra Pineda Víctor Heredia	Documentos Primer desembolso Convenio 1463 Ministerio de vivienda	* 0. Respuesta a Comunicado 2026EE0044537-CUR 1463-2025 de julio de 2026 - Documentos requeridos para el trámite de cuenta del primer desembolso.pdf * 1. CUENTA DE COBRO.pdf * 2. RUT.pdf * 3. FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.pdf * 3.1 FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.xls * 4. CERTIFICADO CUENTA BANCARIA FIDUCIA.pdf * 5. CERTIFICACION BANCARIA EF SAN PABLO NARIÑO LP 002-2026.pdf * 5. CERTIFICACION CTA AH 466099058 CONVENIO NO. 1463.pdf * 7. Justificación de la Solicitud de desembolso - Convenio de Uso de Recursos.pdf * 8 INFORME TÉCNICO JULIO CONVENIO 1463 DE 2025 V2 FM.pdf * 8.1. INFORME FINANCIERO CONVENIO 1463 DE 2025 JULIO.pdf * 9. CONTRATO LP 002 - 2025 EF SAN PABLO VF 2.pdf-firmado.pdf * 10. ACTA DE INICIO ENCARGO FIDUCIARIO.pdf * 11. CONTRATO DE OBRA.pdf * 11.1 ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA.pdf * 12. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.pdf * 12.1 ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA.pdf * 13. CONSTANCIA DE REPORTE EN SIGEVAS.pdf * Cedula de Ciudadania Mario Trujillo.pdf

Documentos Primer desembolso Convenio 1463 Ministerio de vivienda Recibidos ×

Resumen de IA

Alcaldia Sanpablo Narino
para Yan, Darwish, VHeredia, Planeacion, mi

vie, 25 sept. 17:35 (hace 4 días)

Cordial y atento saludo.
En atención al comunicado No. 2026EE0044537, nos permitimos remitir los documentos solicitados para adelantar el trámite correspondiente al primer desembolso del Convenio de Uso de Recursos No. 1463 de 2025, suscrito para el municipio de San Pablo, Nariño.

Agradecemos la atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

7	Septiembre 25 de 2026	Yan Carlos Becerra Pineda	Informe ajustado de avance mes de Junio - Convenio 1463-2025	* 1. INFORME INTERVENTORÍA MES DE JUNIO 2026.rar * 2. CRONOGRAMA INICIAL.zip * 3. PLANES.zip * 4. EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA DE OBRA.zip * 5. EQUIPO DE TRABAJO DE INTERVENTORÍA.zip * 6. MAQUINARIA.zip

Informe ajustado de avance mes de Junio - Convenio 1463-2025 Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para Yan, mi

vie, 25 sept, 3:22 p.m. (hace 4 días)

Arquitecto:
Yan Carlos Becerra Pineda
Apoyo a la Supervisión
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Cordial saludo,

En atención a su solicitud y en el marco del **Convenio 1463 de 2025**, me permito remitir adjunta a este correo la documentación requerida para su conocimiento, revisión y fines pertinentes:

1. Informe de interventoría correspondiente al mes de junio de 2026.

8	Septiembre 29 de 2026	Yan Carlos Becerra Pineda	Informe de avance financiero del convenio 1463 de 2025 correspondiente al mes de agosto de 2026	* Informe tecnico correspondiente al mes de agosto de 2026..pdf * FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.pdf * FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.xls * REGISTRO FOTOGRÁFICO MES DE AGOSTO.

Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para Yan, mi

10:29 a.m. (hace 6 horas)


Arquitecto:
Yan Carlos Becerra Pineda
Apoyo a la Supervisión
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Cordial saludo,

En atención a su solicitud y en el marco del **Convenio 1463 de 2025**, me permito remitir adjunta a este correo la documentación requerida para su conocimiento, revisión y fines pertinentes:

1. Informe tecnico correspondiente al mes de agosto de 2026.
2. FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7.
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO MES DE AGOSTO.

9	Septiembre 30 de 2026	Yan Carlos Becerra Pineda	Informe de avance semanales del Convenio 1463 de 2025	* Informe semanal 1.pdf * Informe semanal 2.pdf * Informe semanal 3.pdf * Informe semanal 4.pdf * Informe semanal 5.pdf * Informe semanal 6.pdf * Informe semanal 7.pdf * Informe semanal 8.pdf * Informe semanal 9.pdf * Informe semanal 10.pdf * Informe semanal 11.pdf * Informe semanal 12.pdf


Informe de avance semanales del Convenio 1463 de 2025 Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para Yan, mi

mié, 30 sept, 3:48 p.m. (hace 3 días)

Cordial saludo, Arquitecto Yan Carlos Becerra Pineda:

En el marco del Convenio 1463 de 2025, me permito remitir adjuntos al presente correo los informes semanales correspondientes a las semanas 1 a 12, del periodo comprendido entre el 25 de junio de 2026 y el 13 de septiembre de 2026, para su conocimiento, revisión y fines pertinentes.

3. COMPONENTE FINANCIERO	• Contratos de obra e interventoría: Se encuentran en ejecución desde el 25 de junio de 2026. • Encargo fiduciario: Fue contratado el 4 de septiembre de 2026 y formalizó el inicio de su ejecución el 11 de septiembre del mismo año. • Desembolsos: Durante el presente período, el Ministerio no realizó giros ni desembolsos de recursos hacia el municipio de San Pablo.

4. COMPONENTE JURÍDICO	A continuación se relaciona la información de cada proceso licitatorio que ha llevado a cabo el municipio de San Pablo:

PUBLICACIONES A LA FECHA: (Se anexa información del cuarto proceso licitatorio con el cual se contrató el Encargo Fiduciario, los anteriores procesos fueron declarados desiertos)

•Proceso licitatorio para Encargo Fiduciario:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-1-245986&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ObiaUqqx7f5WoH-hFoV8vd1gif9JQNRdZUn5pSPs8BE_TX87fTtaYx8EaFRAzpJDQmMuntauz5Wn3IOWXgaBoiCiAG1414aQjQoxVESlWp2RGmCzBvK1ZDGvrSf10bFkHG3opJAvzT9N_z1SgffR3fVMEUHh98JDKuL2qxfpL_2FPWU2AnQgpJL1YytP21JykY09rDImhDpGeZ6AYYd4KqW4PwmprUp2nVL1aj2urLYWnB92iEzJdtrUIiotIf8-2L36ufuQaCzY96fMmOae_d_ZveyyvvHxYb3yarlDVQ5jQokqG8g9Nls6RtMAAdEaRrqDa8SUXFq8b1RxIg4S7iAfPfIp_wXVNPXBjd_tm4-6Rvfnol2QtQCVjI7uqvgpHep-8RqN8j5xAptBNR7ikolOXnq36GjOJPhORMIyykO5B-voqJryvcH8VuKtoHyQhA4bvLU4TMoHwVnOvfh1Kajg1t3DIOJvSdNKOewxEvOCHGYbgPVfwgVgFUI4isfqaUxDxLx-M-LPy5v055cbfvkdt1b57THa3DFA71qeGK6JNVQzK9IpxGrBwu6M5qO9-o9RAXsYkSjPItrHMIlaXAzQN1WXzr6MT95OUNUGMS9_i_ltosQAz7wgQ2GViZ8wdbNg7csk3RwApfRY_GLJcu2j4g_XP9blYZjZcZZq6K7sq4OYP45oYCVe-PZ_fJfFj-7gf8T2VRLi9KpUqEeowbkBOPQ51121t6f7mZoSKCAuEn3BnBQ3fVxuKqD_VFOM14UhE6tsfkIIwf817bIjCkqJp2AMabVVe-4RVzDvQlrZxGo8xamj-hx1CtWUPCT6zc61nGfHlyv2FVF1eUn1WXrvOzWDvbSKgBfGb9oKLDvBZssGB7dXGywUMY-nFTY5pkym58VveV8kbhT9HrJ6RojN2u9pEnCzvam0cLQU6JR79fNhZh10oXVQkNRLqVMs5H063saeo8WipjooPeQ76x1yc9pEVVCB9980BRVmoLTFB33r7BWBOsNJYHzFxF4Pmi3102EbhZZDUT8Rf-HKiT9yqDlRv_7R73iFf31UNRQVhzUd2Wejdm5nohJWFxXdQS2cEMfFiHv1sphgmgVSwQ7SzRg

TRAZABILIDAD DEL PROCESO	
Cuantía a contratar:	$110,379,000
Estado:	Convocado
Tipo de proceso:	Licitación Pública
Proyecto de Pliego de condiciones	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Estudios Previos	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Aviso	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Anexos	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Matriz de riesgos	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Análisis del sector	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Aviso No. 1	Publicación Secop Julio 7 de 2026
Observaciones Respuestas	Publicación Secop Julio 14 de 2026
Resolución de apertura	Publicación Secop Julio 14 de 2026
Pliego de condiciones definitivo	Publicación Secop Julio 14 de 2026
Adenda 1	Publicación Secop Julio 17 de 2026
Adenda 2	Publicación Secop Julio 24 de 2026
Respuesta observaciones	Publicación Secop Julio 24 de 2026
Adenda 3	Publicación Secop Agosto 1 de 2026
Acta de cierre	Publicación Secop Agosto 4 de 2026
Informe preliminar de evaluación	Publicación Secop Agosto 4 de 2026
Informe final de evaluación	Publicación Secop Agosto 12 de 2026
Acta de adjudicación	Publicación Secop Agosto 19 de 2026
Resolución de adjudicación	Publicación Secop Agosto 19 de 2026

Adjudicatario del Contrato para el Encargo Fiduciario: AVAL FIDUCIARIA S.A. con NIT. No. 800.140.887-8, representado legalmente por JORGE EDUARD OROZCO CASTILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 80.417.672 expedida en Bogotá D.C., por valor total de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOCE PESOS M/CTE ($85.635.012)

•Proceso licitatorio para Contratación de Obra Civil:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53092&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7rIgbwnTd3mTu911MXdyFIBJh-HIc3cAofiOlGYbgQuCFj5Lu9Bm9i11-reJHRPU5pNPijaWDVD9fso7d5eyAHkhag9Ms8OnDZZ2depqVOtOqDUPGOTeWnddk3HvCnkoIQR596cZoytscKHX5f-l-xfLJwwIZfKXpyNr6Q3xV65VcAcU7YCMrX9hDufpv7ZcQXbwDqVOTny5hkSTRc3H2bW410_-p9GhN85Capjg1_XYUYYBK1D9k3MC1NIA6OYSvrXsoSN-PZ1fBoTfLS1OMUBcMY30yl3FNgEgZiEMPYzveGm5832b2990pRDdCt4JsxeicgWXbRxgYw2WoluHWkDQCti3cjUdF8uHv7iQ2kJ_nvkeBpJSE8Q7oRuIbB64mnIJxV8rOO8DEOu3zwVIrLXwPodj-9BlIZzEuOuMur-8_HpYXD1kAORXgE1MJRh_9avwupaJKcUXMItbdVVrQDz9RFwpXtyTOfGJJtEVOy-6KKo_yioe389cgqUOR-xFXYweapEv8FNveZYE8IoLDzcgveSHS_gfpONuPgBKGrh5Rx1HOD7Wz5H2KNPwF-hwxkwVHA1l27ruv_e5TCDQi-9cVwv6t1cm1_2YebYOHgloTEzfe140n1l16HRy6hr5y4s91QKIbTxMTRxZ3TkfOU_nK8IuYOHFrBaj5AIIRmIWCjwE_NAN4eSwyBmB_4691MdpyJeOGA_wF3d1pqKdz8v_IfXWiKo9optCb9wv4zkZCoX9sMxPD6gGY0s_CFSptPkEsRrcQ3AakY_D-CO5xmepzOcIxoHsc9GKNy9RJRcVj_Avc91m80hnUkdIJIGBxfR5-aqDxVP8y3mxLbk_kNEjhqTw

TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	$36,397,350,622
Estado:	Celebrado
Tipo de proceso:	Licitación obra pública
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Resolución de Apertura:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Acta de audiencia de asignación de	Publicación Secop Diciembre 26 de 2025
Adenda No. 1 Modificatoria LP 004-	Publicación Secop Diciembre 27 de 2025
Fecha de cierre:	Publicación Secop Enero 14 de 2026
Adenda No. 2	Publicación Secop Enero 14 de 2026
Informe de Evaluación:	Publicación Secop Enero 14 de 2026
Informe final de Evaluación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Acta de 1a Audiencia de Adjudicación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Resolución de Adjudicación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Contrato:	Publicación Secop Abril 22 de 2026
Compromiso:	Publicación Secop Abril 22 de 2026
Designación de supervisor	Publicación Secop Julio 14 de 2026
Acta de Inicio	Publicación Secop Julio 14 de 2026

El contrato se encuentra adjudicado al Consorcio PM ALCANTARILLADO SP 2025, representado legalmente por LUZ AMPARO JOJOA. E. por valor de: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MLC ($36,369,542,560)

•Proceso licitatorio para Contratación de Interventoría:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14610325&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6tXEABoBu5Rk66OhyrcmWiHX9vdtLD7z0ewTqMFzb4B3iIESkPdHTnN6CJQ_hcFj3NbCxDLxbJFIOKC_MIzc70d2KWOKdLMUNywKXS-UweqlkCtBFm8uut4U2NiSdRgS-ns5ywlO--zTfxDcIizSEpX6VzGlcuU-UQOY407FcrQ5kri_ivZ20w5OjHyROizeTpKYOkatetnLQ9cITupNwLkw_wwgivjYqQc6MH4jFhPom4yUmEj8GF51qQb2x9SUIgWQDzW6mdSzaeJWWO9qluMCwO2-h4_1WZ_g5Ajn580ACGDV4qOOMa7aORfFdASGN144ItDOgjk0zuwe3bIm7fMiAj8Gs_w7AiwjpKOwn5y9fu3PVf60j6PPx1sle3vF7OtvIjKzJJSOvxrWMfJxuO_op_LU7z2HSICsdJ39OS17IIiAF3zQLqhXf9n12xtxWe8ah5rcS23MTgCwA76Xtk4LAERUGFZoZsePlDvtMR54YZKAofMit2D3duUl-95_2azH94DqDKph0GFCEQi_VePBFHtz51-tj2AhHUd1EZhg5mMIeUm8u8Rjof8uP1H7rps9jfH9OWsXAdbvvN3rNRXy-7I_Yr6gfTIG3eiaNBuaNqyfGXpRqfaTXSjlX05jqzctH4aFfkbfzTBc5UcbjoNimEU8vmJfCvJgAm7wmLQAOYglouTzVSxRhyE2zR66c4jHpy5DTW1AGaunEhvAnzfK2mwLoziZv4EjXSS_fdVWnC1c8ZGKMU9tfOqHMgIH-o9HDXf3bHfQxvreF92lqGr7jEuWROjirkuszJyRq5Ikqym8PVryB--KZsP4EP1zoGrEPX2hq1i_6FzsXRQEFEc9WJ2lR2R3iYftWGZhSdD8ePTUVAZeuqVM41BFz-aVbpef1h-h7-j_ChBEoOWMXWFEi-aFGS4NyOiLKHBNsBgy9sEWReOmu_h6mAxT-uLy8wIR3d


TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	###############
Estado:	Adjudicado
Tipo de proceso:	Concurso de Méritos Abierto
Estudios Previos:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Aviso de convocatoria pública:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Análisis del sector:	Publicación Secop Enero 26 de 2026
Aviso No. 1:	Publicación Secop Enero 26 de 2026
Resolución de apertura:	Publicación Secop Enero 27 de 2026
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Enero 27 de 2026
Adenda No. 1	Publicación Secop Febrero 6 de 2026
Acta de cierre	Publicación Secop Febrero 10 de 2026
Informe preliminar de evaluación	Publicación Secop Febrero 10 de 2026
Acta de audiencia de adjudicación	Publicación Secop Febrero 20 de 2026
Informe final de evaluación	Publicación Secop Febrero 20 de 2026
Resolución de adjudicación	Publicación Secop Febrero 21 de 2026
Contrato	Publicación Secop Julio 14 de 2026
Designación Supervisor	Publicación Secop Julio 14 de 2026
Acta de inicio	Publicación Secop Julio 14 de 2026
Modificatorio 1 PrÓrroga	Publicación Secop Septiembre 4 de 2026

El contrato se encuentra adjudicado al CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 , representado legalmente por DANIEL FERNANDO ALARCÓN ALARCÓN. El 30 de junio se firmó el Modificatorio No. 1 donde se ajusta el plazo de 14 meses a 15 meses, así como está establecido para el contrato de obra y se encontraba presente en el Anexo Técnico Versión 2.Valor contratado: DOS MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($2.055.357.099,60)

RESÚMEN CONTRATACIÓN DERIVADA

COMPONENTE	CONTRATISTA	VALOR	ESTADO
OBRA CIVIL	CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP-2025	$ 36,369,542,560	EN EJECUCIÓN
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026	$ 2,055,357,106	EN EJECUCIÓN
ENCARGO FIDUCIARIO	AVAL FIDUCIARIA S.A.	$ 85,635,012	EN EJECUCIÓN

5. EJECUCIÓN DE OBRA - AVANCE	FECHA DE INICIO:	JUNIO 25 DE 2026	
	SEMANA DE EJECUCIÓN:	14	
	CONTRATO DE OBRA:	$ 36,369,542,560.00	
	INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 3,347,308,233.00	9.20%
	INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 2,891,949,914.00	7.95%
	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-$ 455,358,319.00	-1.25%

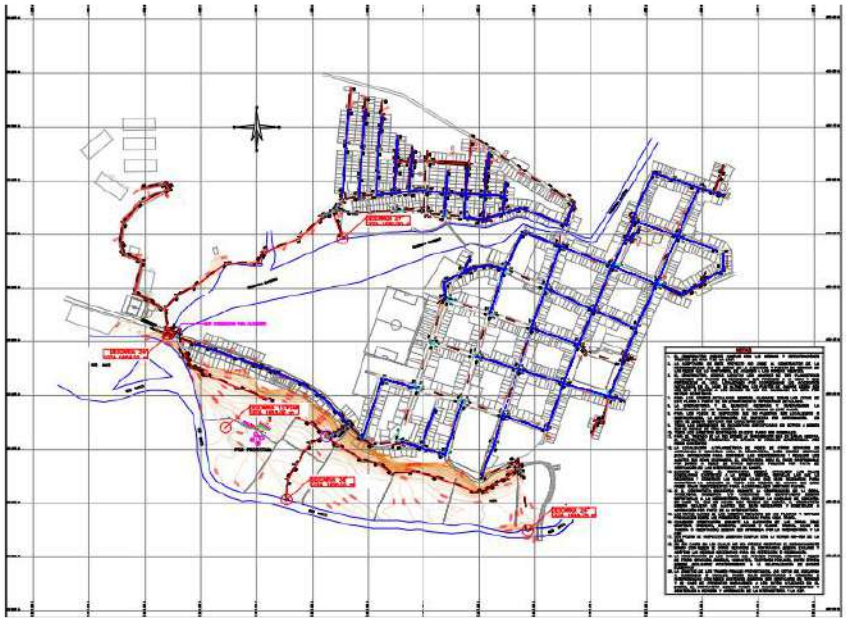

PLANO GENERAL DEL PROYECTO

FRENTES DE OBRA TRABAJADOS EN EL PERIODO





FRENTES DE TRABAJO	LOZALIZACIÓN	BARRIO/SECTOR	METROS LINEALES
1	P23-P36	B/Porvenir, sector San Jose, B/14 de agosto. Sector Galeria	158.6m
2	P57-P86	B/Las Cuadras. Sector Parque La cordialidad, sector I.E Normal Superior	147.49m
3	P140-P141 P120-P121 P117-P119	B/Los Jardines B/Villa Cristina	176.34m



CONVENCIÓN	FRENTE	LOCALIZACIÓN
	3	B/Los Jardines



CONVENCIÓN		LOCALIZACIÓN
	Desvio	B/14 de agosto, sector Plaza de Mercado

CONVENCIÓN	FRENTE	LOCALIZACIÓN	ESTADO	%
	1	B/ Las Porvenir Sector San José	En ejecución	95%
	1	B/14 de agosto-Sector Galeria	En ejecución	5%



CONVENCIÓN		LOCALIZACIÓN
	Desvio	Sagrado corazón de Jesús



CONVENCIÓN	FRENTE	LOCALIZACIÓN
	3	B/Villa Cristina

La obra en su semana 14 de ejecución presenta un atraso acumulado del 1,25% y en su parte financiera un atraso de $455.358.319

Actividades ejecutadas durante el período

Localización y replanteo de frentes de trabajo.

Demolición de pavimentos y andenes.

Excavaciones manuales y con maquinaria

Excavaciones manuales y con maquinaria.

Retiro de tubería existente.

Instalación de tubería estructurada y sillas Yee.

Camas de apoyo, atraques y rellenos compactados.

Construcción de acometidas y cajillas domiciliarias.

Entibados en madera y adecuación de cámaras.

CUADRO DE LLUVIAS DEL PERÍODO

CONTRATO DE OBRA No: LP 004-2025 **CONTRATISTA:** Consorcio PM Alcantarillado SP 2025, representado legalmente por Luz Amparo Jojoa

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/09/2026 AL 30-09-2026 **PROYECTO:** OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CM-001-2026 **INTERVENTOR:** Consorcio Inter San Pablo 2026, representado legalmente por Daniel Fernando Alarcón Ala

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	21		713
Lluvias moderadas																								2	2					3		7
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

PROGRAMADO VS EJECUTADO



ROGRAMADO: 9,20%
JECUTADO: 7,95%
.25

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

*** Condiciones encontradas en contraste con el diseño**

Colector de Conducción a la PTAR:

1. Alcance del Replanteo: Tramo desde pozo MH-197 hasta punto de entrega 0-21 (PTAR).
2. Restricción Geotécnica: Deslizamiento y pérdida de banca entre pozos MH-172 y MH-179.
3. Impacto Contractual: necesidad de modificar el trazado original y pérdida de continuidad del colector.
4. Plan de Mitigación Requerido:
   - Definición de ruta alterna (no subsanable mediante ajuste local de replanteo).
   - Estudios geotécnicos complementarios en la zona de falla.
   - Verificación hidráulica, viabilidad predial y aprobación formal del diseñador/contratante.

Interferencia Predial: Tramo Pozos P139A - P139

- El Problema: Discrepancia topográfica; el trazado original interfiere con una vivienda y un muro existentes.
- El Impacto: Imposibilidad de construir la alineación original sin causar daños estructurales o alterar el concepto hidráulico.
- Solución Concertada: Construcción de un pozo de inspección adicional (Cámara de Quiebre).
- Beneficios Técnicos:
  - Modifica la alineación adaptándose al terreno real.

- Protege la infraestructura privada (cero afectaciones a viviendas).
- Mantiene las cotas batea y la pendiente hidráulica de diseño.

- Estado Actual: Propuesta revisada y autorizada en campo por Interventoría; en proceso de actualización de planos y revisión del impacto en el presupuesto.

Crecimiento de Cobertura: Acometidas Domiciliarias (Tramo 1)

- **Línea Base (Diseño): 29** acometidas domiciliarias proyectadas.
- **Realidad en Campo: Número superior de viviendas** identificadas durante socialización y actas de vecindad.
- **Causa del Desfase:** Nuevas edificaciones construidas con posterioridad a la consultoría técnica original
- **Impacto Directo en Cantidades de Obra:**
  - Incremento en tuberías de acometidas y accesorios de conexión.
  - Mayor volumen de excavación y relleno.
  - Aumento en metros cuadrados de reposición de pavimento.
- **Acción de Interventoría y Supervisión:** Evaluación técnica en proceso para cuantificar el balance de mayores cantidades de obra y asegurar la conexión del 100% de los usuarios.

Con el fin de solicitar una directriz al Ministerio de Vivienda ante las inconsistencias técnicas detectadas en campo respecto a los diseños iniciales, se están adelantando revisiones hidráulicas y topográficas en los puntos previamente enumerados. El informe hidráulico correspondiente se radicará ante el municipio a más tardar el 16 de octubre; posteriormente, se solicitará una reunión técnica para analizar los hallazgos y recibir la orientación pertinente para cada caso.

6. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN	**Estado de Contratación**: Contratos de Obra, Interventoría y Encargo Fiduciario en ejecución. **Planificación y Gestión**: Se programaron mesas de trabajo con los contratistas de Obra e Interventoría como seguimiento del proyecto en ejecución. Revisión de documentación radicada por parte de los contratistas.

REUNIONES PROGRAMADAS CON CONTRATISTAS

REUNIÓN: 16
FECHA: Septiembre 10 de 2026
LUGAR: Presencial San Pablo

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 3. Estado de Avance Físico en los diferentes frentes de Obra y requerimientos de gestión comunitaria y técnica TEMAS VARIOS TRATADOS: Evolución de Frentes de Trabajo y Actividades en la Semana: La Interventoría y el equipo de trabajo del Contratista de Obra informaron acerca de cada frente de obra, así: a. Frente de Obra: Barrio Los Ángeles Estado de actividades y requerimientos: •Compromiso en obra: Ejecutar la colocación de tapas, el fundido de bordillos/brocales y la terminación de las cámaras cuadradas. •Pendientes técnicos: Es necesario terminar las cajas de inspección. Actualmente se registra un retraso por falta de formaleta cónica. •Acciones urgentes: Se requiere habilitar el acceso de manera prioritaria y concentrar esfuerzos para terminar definitivamente este frente de obra. b. Frente de Obra: Barrio Valencia Estado de actividades y requerimientos: •Avance técnico: Se realizó la revisión de las acometidas domiciliarias. •Sector Plaza: Se solicitó terminar de manera urgente el tramo que	

1	actualmente se encuentra en intervención. •Cronograma y apertura: Se estima una semana más de trabajo en este punto antes de proceder con la apertura de la siguiente calle. •Gestión social: El Alcalde solicitó programar una socialización con la comunidad. •Alternativa de diseño: Para la conexión de las casas que presentan conexiones por debajo de la red proyectada, la Interventoría del proyecto informó que se está evaluando técnicamente la alternativa de construir una red paralela, que se conecte al proyecto en la cámara aguas abajo de la calle. c. Frente de Obra: Hogar Infantil Estado de actividades y requerimientos: •Requerimientos técnicos: Se solicitó la terminación de sumideros y cámaras de inspección. Asimismo, se debe proceder con el tapado de las cajas. •Gestión operativa: Se requiere coordinar el desalojo de materiales o elementos que interfieran con la continuidad de los trabajos. d. Frente de Obra: Colegio Estado de actividades y requerimientos: •Avance técnico: La Interventoría del proyecto informó que se terminó el tramo actual y las labores continúan avanzando en dirección hacia el ingreso principal de la institución educativa. La comunidad del sector se negó a dejar efectuar los trabajos como estaban planteados con avance hasta superar el ingreso a la institución para minimizar la afectación. •Proyección: La Interventoría informó que se calcula finalizar completamente este sector durante la próxima semana. d. Tramo Barrio Nuevo •Control técnico: Se está adelantando la revisión y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas. •Estado de obras: Se trabaja en la terminación de las cajillas, quedando pendientes por finalizar los andenes. •Pendientes de modelación: Está pendiente la modelación del tramo con adoquín que comprende desde las cámaras MH 56 a MH138 y el pozo 148 para definir las acciones técnicas a seguir. 4. Documentación pendiente Posteriormente al recorrido de Obra, se revisó en conjunto con la Interventoría la siguiente documentación del Informe del mes de Junio: •Informe Técnico del mes de Junio •Unificación de datos entre los Informes semanales y el Cronograma general de Obra •Soportes de Personal faltantes Se solicitó: •Control de calidad, soportes de ensayos de laboratorio, densidades, diseños de mezclas y caracterización de materiales en los informes. Registro de control de calidad correspondientes a la cama, el atraque, las capas instaladas y rellenos.	Contratista de Obra - InterventoríaTerminación de cámaras pendientes Inmediata InterventoríaSubsanaciones Informe mes de JunioSeptiembre 10 de 2026	

REUNIÓN: 17
FECHA: Septiembre 23 de 2026
LUGAR: Presencial San Pablo

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	

	DESARROLLO DE LA REUNIÓN 3. Estado de Avance Físico en los diferentes frentes de Obra y requerimientos de gestión comunitaria y técnica TEMAS VARIOS TRATADOS: Evolución de Frentes de Trabajo y Actividades en la Semana: La Interventoría informa que no cuenta con el reporte del Informe semanal No. 13 con el porcentaje de avance del proyecto. Se visita cada frente de obra, evidenciando lo siguiente: •Barrio Porvenir (Sector San José - P23): oAvance en Reposición de concretos oCámara actualmente en ejecución. oPendiente la instalación de la tapa de la cámara. •Sector Plaza de Mercado: oSe establece un plazo estimado de quince (15) días para la terminación total de los trabajos en este punto. •Barrio Los Ángeles (Sector Matadero - P34): oLa estructura se encuentra completamente lista. •Sector El Hogar (P35): oSumidero construido parcialmente, se encuentra pendiente la colocación de la tapa y las rejillas. oLa cámara de inspección está sin fundir. •Barrio Nuevo: oPendiente la reposición de la placa de concreto. oFalta la instalación de las tapas de las cajillas. oSe requiere el desalojo de escombros, limpieza integral y restitución del área del Polideportivo. oSe solicita la reubicación del acopio de materiales de construcción y el reforzamiento/mantenimiento de los cerramientos provisionales de obra. Lo anterior, con el fin de mitigar el impacto comunitario y atender de manera inmediata las quejas de los residentes del sector. Como requisito previo para la entrega y recibo a satisfacción de los tramos ejecutados, el contratista deberá: oSubsanar los cortes de pavimento mediante procedimientos técnicos normativos. oEfectuar reparaciones estructurales con resinas epóxicas en las zonas donde se presentaron fisuras y dilataciones por retracción, asociadas a la falta de ejecución del corte oportuno del concreto. •Sector Balcones del Mayo: oProgramada la instalación de tubería para el transcurso de la presente semana. 4. Documentación pendiente Posteriormente al recorrido de Obra, se revisó en conjunto con la Interventoría la siguiente documentación del Informe del mes de Julio: oInforme Técnico del mes de Julio oUnificación de datos entre los Informes semanales y el Cronograma general de Obra 5. Compromisos Compromisos y Conclusiones del recorrido en obra Se solicita a la firma contratista acelerar los trabajos, especialmente: oLa terminación de las cámaras que están pendientes, ya que no se evidencia avance luego de la visita realizada el pasado 10 de septiembre. oLos trabajos en el sector de la Plaza de Mercado para cumplir con el plazo de 15 días. oReubicación de materiales en el sector del Polideportivo. oCorrección de cortes y reparaciones de juntas en Barrio nuevo. oAsegurar la terminación e instalación de las tapas e infraestructura faltante en cajillas, sumideros y cámaras reportados. Documentos pendientes: oControl de calidad, soportes de ensayos de laboratorio, densidades, diseños de mezclas y caracterización de materiales en los informes. Registro de control de calidad correspondientes a la cama, el atraque, las capas instaladas y rellenos. oSubsanación total del Informe del mes de Julio. oRadicación del Informe del mes de Agosto. oInforme semanal No. 13.	
2		Contratista de Obra - InterventoríaTerminación de cámaras, sumideros y cajillas pendientes Inmediata Contratista de Obra - InterventoríaDesalojo de material sobrante Inmediata Contratista de Obra - InterventoríaDesalojo de escombros - Reubicación de materiales zona Polideportivo – Barrio NuevoInmediata InterventoríaSubsanaciones Informe mes de JulioInmediata InterventoríaRadicación Informe mes de AgostoInmediata InterventoríaRadicación Informe semanal No. 13Inmediata

REUNIÓN: 18
FECHA: Septiembre 28 de 2026
LUGAR: Presencial Pasto

	ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
	DESARROLLO DE LA REUNIÓN 3. TEMAS VARIOS TRATADOS: a. Visita de CORPONARIÑO y Manejo de Residuos •Situación: Se informa que, durante la visita realizada el viernes por funcionario de CORPONARIÑO, se evidenció una problemática en la vereda La Vega, sobre la vía al puente Río Mayo, debido a la presencia de escombros que están llegando al río. Aunque se retiró la parte superior con maquinaria pesada, el material restante aún afecta la cuenca. •Acciones para tomar: oSolucionar de manera inmediata la situación del manejo de escombros. oSeguir lineamientos y acciones correctivas que dé la Corporación Autónoma en cuanto al tema, analizar la posibilidad de tramitar un ZODME (Zona de Disposición de Materiales de Excavación). oRecopilar imágenes con dron de la zona afectada para presentarlas ante CORPONARIÑO. b. Estado de la PTAR y Ajustes de Diseño •Situación: El diseño inicial en la llegada a la PTAR, se encuentra un aliviadero, pero en el lote existente hay pérdida de banca, lo que obliga a desplazar el aliviadero, añadir una cámara adicional y construir un viaducto de aproximadamente 100 metros. Frente al cementerio hay una urbanización que actualmente adelanta diseño de la red de alcantarillado, con un reporte de niveles que muestran que la planta estaría más alta, lo cual generaría una excavación adicional de 6 metros de profundidad para cumplir con las pendientes y sugieren girar la planta proyectada por la Consultoría. El municipio tiene pendiente la entrega de la solicitud de directriz de temas técnicos ante el Ministerio de Vivienda con sus respectivos anexos (Chequeos hidráulicos de los diferentes temas técnicos e Informe topográfico), por lo que se necesita priorizar la entrega de una alternativa de solución ante el problema existente, informe técnico y chequeo de cotas. Acciones para tomar: oRealizar un chequeo hidráulico y una verificación técnica en campo con especialistas para obtener una topografía real y analizar los niveles. oVerificar que la cámara chequee correctamente en niveles respecto a la ubicación de la PTAR oEl director de obra manifiesta que el especialista hidráulico asignado para este análisis es el ing. Esteban Riascos. •Compromiso: Programar una reunión virtual con el especialista para revisar la alternativa de solución. El espacio debe agendarse a más tardar el viernes en horas de la mañana. c. Desembolso de Anticipo e Informes •Situación: La Interventoría informa no contar con los informes semanales 13 y 14. El alcalde informa que el viernes 25 de septiembre se radicó para revisión ante el Ministerio de Vivienda toda la documentación requerida para la solicitud de desembolso del anticipo del proyecto. Como subsanaciones se deben alistar: oActualización del Flujo de fondos del proyecto – Responsable: Municipio oComo fecha límite el Ministerio fijó el 6 de cada mes, por lo que se	Contratista de Obra - InterventoríaManejo de escombros de acuerdo con directriz de CORPONARIÑO Inmediata Contratista de Obra - InterventoríaSoportes técnicos como anexos para Solicitud de directriz técnica ante el Ministerio de Vivienda Inmediata Contratista de Obra - InterventoríaProgramación reunión virtual con especialista hidráulicoViernes 2 de octubre de 2026 Contratista de Obra - InterventoríaInformes de Interventoría meses de: Julio, Agosto y Septiembre, Informes semanales 13 y 14Inmediata Municipio Proyección informe técnico mes de Septiembre Inmediata
3		

oComo fecha límite el Ministerio fijó el 6 de cada mes, por lo que se requieren los informes de Interventoría del mes de Julio, Agosto y Septiembre, así como los informes semanales hasta la semana 14 para proyectar el informe técnico del Municipio. Responsables: Contratistas de Obra e Interventoría

•Compromiso: La interventoría y el apoyo a la Supervisión trabajarán de manera presencial en Pasto en la proyección y ajuste de la documentación necesaria para radicar ante el Ministerio.

d. Aguas lluvias zona Parque La Cordialidad
•Situación: Las aguas lluvias del parque se reúnen por el sector del puente, por lo que la comunidad ha manifestado la inquietud a la Supervisión del proyecto, solicitando una solución técnica a la problemática.
•Compromiso: La interventoría revisará la situación y verificará las pruebas hidráulicas para garantizar que el flujo de agua ingrese correctamente a los sumideros.

e. Cámaras Pendientes (Sector Tanque de EMSANPABLO)
•Compromiso: El Alcalde solicita priorizar la terminación de las cámaras pendientes en esta zona. Por lo que la Interventoría manifiesta que las cámaras se trabajarán en este sector utilizando concreto con acelerante para lograr la resistencia requerida a los 7 días.

f. Sector El Matadero
•Estado: Se informa que la cámara proyectada para este sector ya se encuentra construida y finalizada.


g. Coordinación Institucional
•Reparaciones: Se programará una reunión entre el Gerente de EMSANPABLO y el contratista de obra para articulación de atención de los daños ocasionados en los diferentes frentes, agilizar las reparaciones necesarias y evitar mayores afectaciones a la comunidad.

h. Cronograma de obra: Se revisó la ejecución y se mantiene lo programado: actividades en el Municipio durante septiembre y en el sector de La Playa para octubre. Se revisan valores y porcentajes programados y ejecutados a la fecha.

i. Separador en Avenida de los Estudiantes: Debido a que las obras del alcantarillado van a afectar el separador existente, se proyectará un nuevo separador vial. Para esto se elaborará un nuevo Análisis de Precios Unitarios (APU) y se realizará la respectiva consulta ante el Ministerio de Vivienda.

CORREOS RECIBIDOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Septiembre 7 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORÍA	Respuesta Integral al Oficio N.° 14 - radicado 110-1902-235 del 3 de septiembre de 2026, "Subsanaciones pendientes - Informe del mes de junio de 2026 (Oficios 11, 12 y 13). Subsanación y radicación de las versiones definitivas corregidas.	* Respuesta Integral al Oficio N.° 14 - radicado 110-1902-235 del 3 de septiembre de 2026, "Subsanaciones pendientes - Informe del mes de junio de 2026 (Oficios 11, 12 y 13). Subsanación y radicación de las versiones definitivas corregidas. * ANEXOS CM-001-2026 RADICADO 024-2026.zip



Respuesta Integral al Oficio N.° 14 - radicado 110-1902-235 del 3 de septiembre de 2026, "Subsanaciones pendientes - Informe del mes de junio de 2026 (Oficios 11, 12 y 13). Subsanación y radicación de las versiones definitivas corregidas. Recibidos ×

CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA
para planeacion, alcaldia, mi

lun, 7 sept, 10:50 a.m.

Cordial saludo


Respetado señor alcalde y supervisión del contrato:

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual esa Entidad formuló observaciones a la documentación radicada, el suscrito, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 —interventoría del Contrato N.° CM-001-2026—, procede a dar respuesta en el mismo orden y numeración de las carpetas observadas, y a radicar las versiones definitivas.

2	Septiembre 10 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	envio informe final	* FRENTE 1.docx * FRENTE 2.docx * INFORME_INTERVENTORIA_JUNIO_2026_CM001_v4 * INFORME_SEMANAL_1 * CRONOGRAMA_INICIAL



3	Septiembre 22 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	informes semanales correspondientes a las semanas 9,10,11 y 12	* INFORME_SEMANAL_ 9_v1 * INFORME_SEMANAL_ 10_v1 * INFORME_SEMANAL_ 11_v1 * INFORME_SEMANAL_ 12_v1



4	Septiembre 22 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	cronograma actualizado a semana 12	* Cronograma actualizado



5	Septiembre 22 de 2026	CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	SOLICITUD DE GIRO DEL ANTICIPO (15 %) Y RADICACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO ANTICIPO, CONFORME A LAS CLÁUSULAS 6 Y 8 DEL CONTRATO	23. PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO LP 005 DE 2025



SOLICITUD DE GIRO DEL ANTICIPO (15 %) Y RADICACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO ANTICIPO, CONFORME A LAS CLÁUSULAS 6 Y 8 DEL CONTRATO. Recibidos ×

OBRA **CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025** mar, 22 sept, 5:31 p.m. (hace 8 días)
para mi, alcaldia, planeacion

CORDIAL SALUDO

El CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025, identificado con NIT 902.032.263-1, en calidad de contratista del contrato de la referencia, suscrito el dieciocho (18) de marzo de 2026, y de conformidad con la CLÁUSULA 6 – ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, según la cual "el anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega", se permite SOLICITAR formalmente el giro del anticipo pactado, equivalente al quince por ciento (15 %) del valor del contrato, por la suma de $5.455.431.384,00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE), y para tal efecto radica la Cuenta de Cobro de Anticipo con sus soportes.

6	Septiembre 30 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	informe Mensual 2 correspondiente al mes de julio de 2026	* 02_INFORME_MENSUAL_JULIO_2026.rar


informe Mensual 2 correspondiente al mes de julio de 2026 Recibidos ×

CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA 12:14 p.m. (hace 5 horas)
para mí, alcaldia, planeacion

02_INFORME_MENSUAL_JULIO_2026.rar

Cordial saludo.
Por medio de la presente se entrega el informe mensual Nro. 2 correspondiente al periodo del 01_07_26 al 31_07_26

CORREOS ENVIADOS A CONTRATISTAS

	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Septiembre 1 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	Acta de reunión 14 Alcantarillado y PTAR	* ACTA REUNIÓN 14 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO.PDF


Acta de reunión 14 Alcantarillado y PTAR

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> mar, 1 sept, 5:03 p.m.
para consorcioalcantarilladon, CONSORCIO

Cordial saludo.

Remito proyección del Acta de la reunión 14 del proyecto de la referencia.
Tenemos pendientes las Actas firmadas desde la número 9 por favor.

Atenta a comentarios,

Gracias,

Lorena Chaves M.

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

2	Septiembre 4 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	Oficio No. 15 Interventoría Alcantarillado y PTAR – Pendientes Informe Junio	* OFICIO 15 INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y PTAR – PENDIENTES INFORME JUNIO

Oficio No. 15 Interventoría Alcantarillado y PTAR - Pendientes Informe Junio

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> vie, 4 sept, 8:14 a.m.
para CONSORCIO, Planeacion, Alcaldia

Cordial saludo.

Remitimos Oficio No. 15 con el consolidado de los documentos pendientes por subsanar y completar del Informe correspondiente al mes de Junio del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

Quedamos atentos a su respuesta.

Lorena Chaves M.
Apoyo a la Supervisiòn
Secretaría de Planeación
Municipio de San Pablo - Nariño

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



3	Septiembre 4 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	Programación Reunión Presencial en obra Alcantarillado casco urbano y PTAR sept 10 9:30 a.m.	Sin anexos

Programación Reunión Presencial en obra Alcantarillado casco urbano y PTAR sept 10 9:30 a.m.

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> vie, 4 sept, 9:23 a.m.
para consorcioalcantarilladon, CONSORCIO, Planeacion, Alcaldia

Cordial saludo.

Como seguimiento del PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", se programa visita a los frentes de obra activos y reunión presencial indelegable el día jueves 10 de septiembre a las 9:30 a.m.

Lugar de reunión: Despacho alcaldía municipio de San Pablo.

Se espera puntual asistencia.

Por favor confirmar asistencia por este medio.

4	Septiembre 4 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	Acta de reunión 15 Alcantarillado y PTAR agosto 31 de 2026	* ACTA DE REUNIÓN No. 15 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO AGOSTO 31 DE 2026

Acta de reunión 15 Alcantarillado y PTAR agosto 31 de 2026

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> vie, 4 sept, 10:16 a.m.
para consorcioalcantarilladon, CONSORCIO

Cordial saludo.
remito para revisión y firmas el Acta de la reunión No 15 de fecha agosto 31 de 2026.
Por favor están pendientes las actas firmadas desde la No. 9 .

Atenta a comentarios,

gracias,

Lorena Chaves m.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



5	Septiembre 21 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	Acta de reunión 16 Septiembre 10 de 2026	* ACTA DE REUNIÓN No. 16 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO SEPTIEMBRE 10 DE 2026


Acta de reunión 16 Septiembre 10 de 2026

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> lun, 21 sept, 8:00 a.m. (hace 12 días)
para CONSORCIO


Cordial saludo.
Remito para revisión y firma el Acta de reunión 16 realizada el pasado 10 de septiembre de 2026.
Quedo atenta a comentarios.

Gracias.

Lorena Chaves M.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail — Agregar a Drive

6	Septiembre 21 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	Oficio No. 16 Interventoría Alcantarillado y PTAR - Observaciones Informe julio	* OFICIO 16 INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y PTAR - INFORME JULIO (AG 25) * INFORME JULIO SST con observaciones.pdf *INFORME_LOCALIZACION_Y_REPLANTEO_LP004-2025 con observaciones * INFORME_MENSUAL_02-2026-07-31-Interventoria_Julio con observaciones



Oficio No. 16 Interventoria Alcantarillado y PTAR - Observaciones Informe julio

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> lun, 21 sept, 11:24 a.m. (hace 12 días)
para CONSORCIO, Alcaldia, Planeacion

Cordial saludo.
Remitimos Oficio No. 16 con observaciones a la documentación recibida correspondiente al mes de julio de 2026.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

7	Septiembre 24 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	Re: INFORMES SEMANALES 1 A 8 EDITABLES	Sin anexo


Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> jue, 24 sept, 9:18 p.m. (hace 9 días)
para CONSORCIO

Hola buenas noches


Por favor revisar las cantidades desde el informe semanal 4 hasta el informe 12, se debió mover alguna fórmula.
Quedo pendiente para poder remitir al ministerio.
enviar con firma por fa.

gracias,

8	Septiembre 28 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	Acta de reunión y visita de Obra No. 17 - Septiembre 23 Alcantarillado y PTAR	* ACTA DE REUNIÓN No. 17 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO SEPTIEMBRE 23 DE 2026



9	Septiembre 28 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	Programación Reunión Presencial Alcantarillado casco urbano y PTAR sept 28 2:00 p.m.	Sin Anexo

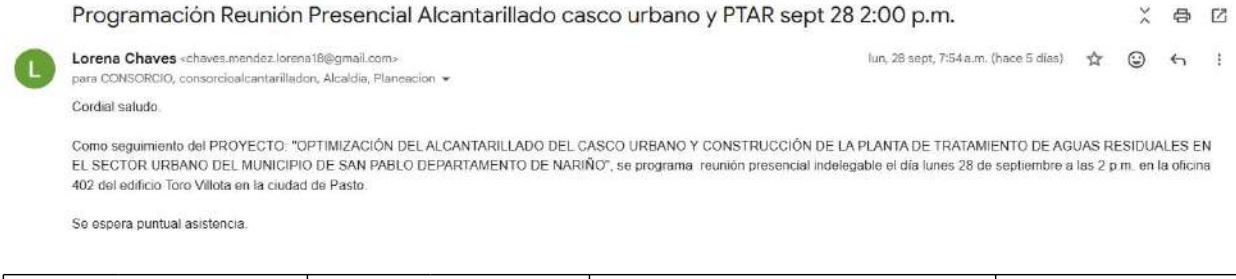

10	Septuiembre 29 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	Re: Programación Reunión Presencial Alcantarillado casco urbano y PTAR sept 28 2:00 p.m. (Acta)	* ACTA DE REUNIÓN No. 18 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO SEPTIEMBRE 23 DE 2026



7, MESAS TÉCNICAS CON MINISTERIO DE VIVIENDA	* Septiembre 15: donde se realiza la presentación del Informe No. 2 del avance del proyecto con corte hasta la semana 12. con fecha Septiembre 13.



8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRÓXIMO PERIODO	**CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORIA** 1. Se ejecutarán las actividades de intervención en la red de alcantarillado en los siguientes frentes de obra simultáneos: •Perímetro plaza de mercado P36 P38 P84 P85 P86 P38 P56 P117 P119 2. Consolidar y entregar balance actualizado de cantidades de obra, modificaciones y mayores valores proyectados. 3. Dar cierre a observaciones y mantener al día la documentación técnica, administrativa, ambiental, SST, social y financiera. 4. Presentar Análisis hidráulico con alternativa consolidada para la zona del viaducto y aliviadero en el sector de La Playa. 5. Implementar propuesta para medidas de manejo de escorrentías en zona puntual del municipio. 6. Reducir la brecha frente a la programación y recuperar el atraso físico mediante frentes y rendimientos controlados. 7. Fortalecer señalización, cerramientos, paleteros y registros fotográficos diarios.

9. CONCLUSIONES O JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	* La obra se encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance del 7,95%, frente a un porcentaje programado del 9,20%, mostrando un atraso del 1,25%. * En la ejecución del proyecto se han encontrado ciertas condiciones de trabajo que han impedido la intervención en algunos tramos, los cuales requieren de una directriz especial por parte del Ministerio para su tratamiento. * El Encargo Fiduciario del Proyecto se contrató con Aval Fiduciaria S.A. y se encuentra en ejecución desde el 11 de septiembre de 2026. Se envía documentación al Ministerio para el trámite del Primer desembolso.

RESPONSABLE:

FIRMA:	
NOMBRE:	MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN
CARGO:	ALCALDE MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO
FECHA:	OCTUBRE 2 DE 2026 DE 2026
