Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2026

Radicado/oficio/solicitud que responde:	FE_INT_0007_F2_TEC_COM_0341

Ingeniero:
FREDY LEANDRO ESPEJO FANDIÑO
Gerente de Proyectos (E)
Vicepresidencia de Estructuración
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Calle 24A # 59 – 42
Bogotá D.C.

Proyecto: CONTRATO NO. VE-531-2026, CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA INTEGRAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA INTEGRAL A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA REALIZAR LA CONEXIÓN FÉRREA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO Y PUERTO GAITÁN."
Asunto: Contrato consultoría VE-891-2025. Lote 1. Traslado respuesta del Consultor a solicitud de ajuste de programación
ID: CFL-ANI-78597

Respetado ingeniero Freddy Leandro Espejo,

En atención al Radicado ANI No. 20262000366471 del 22 de septiembre de 2026, mediante el cual la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI solicitó ajustar la programación de entrega de los productos 18 al 28 hasta el 15 de diciembre de 2026, esta Interventoría informa lo siguiente:

Mediante comunicación CFL-CFM-78565 del 23 de septiembre de 2026, esta Interventoría dio traslado al Consorcio Férreo del Meta HE del requerimiento efectuado por la ANI y solicitó revisar y actualizar la programación conforme con lo requerido por la Entidad. En respuesta a la solicitud de la ANI, mediante comunicación FE_INT_0007_F2_TEC_COM_0341 del 24 de septiembre de 2026, el Consultor manifestó su aceptación del ajuste solicitado y remitió la versión actualizada del Programa Detallado de Trabajo (PDT), proyectando la radicación de los productos 18 al 28 al 15 de diciembre de 2026.

El Consultor precisó igualmente que dicho ajuste se efectúa en atención a la solicitud formulada por la ANI y dejó consignadas en su comunicación las consideraciones técnicas y contractuales

relacionadas con la programación, los tiempos previamente sustentados y los ciclos contractuales de revisión, observación y subsanación. Al respecto, esta Interventoría, una vez revisada la documentación remitida por el Consultor, manifiesta que el Programa Detallado de Trabajo (PDT) cumple con lo solicitado por la entidad, en consecuencia, se da traslado de la documentación y de las consideraciones expuestas a la ANI, para que se continúe con el trámite de solicitud de prórroga del consultor.

Atentamente,



ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
Representante Legal
CONSORCIO FÉRREO DEL LLANO BC

Anexo: Oficio_ FE_INT_0007_F2_TEC_COM_0341
Anexo_ PDT Estructuración Corredor Ferreo Villavicencio 31-12-2026_VF

Copia: Notificación de correspondencia: contactenos@ani.gov.co
Freddy Espejo. Gerente Férreo (e): fespejo@ani.gov.co
Lorena Puerto. Contratista Líder: ypuerto@ani.gov.co
Sergio Rodríguez. Contratista Líder: sarodriguez@ani.gov.co
Jessica Duarte: jduarte@ani.gov.co
Ingrid Ubaque: iubaque@ani.gov.co

Ordenó	Elaboró
APA	CEC/AMA

Docusign Envelope ID: C2D97065-8FBB-8E68-811C-D1DFDA841DB2

FE_INT_0007_F2_TEC_COM_0341

Bogotá D.C, 24 de septiembre de 2026

Señor
ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
Director de interventoría
CONSORCIO FÉRREO DEL LLANO BC
ferreodelllano@gmail.com
Bogotá D.C

Ref: Contrato de consultoría No VE-891 DE 2025: cuyo objeto es **"**Estructuración Técnica Integral a Nivel de Factibilidad de la Infraestructura Ferroviaria para Realizar la Conexión Férrea entre los Municipios de Villavicencio y Puerto López.".

Asunto: Respuesta a la comunicación CFL-CFM-78565 del 23 de septiembre de 2026 (Traslado Radicado ANI No. 20262000366471) y remisión del Programa Detallado de Trabajo (PDT) ajustado para los Productos 18 al 28.

Reciban un cordial saludo:

En atención a su comunicación **CFL-CFM-78565** de fecha 23 de septiembre de 2026, mediante la cual esa Interventoría traslada el Radicado **ANI No. 20262000366471 del 22 de septiembre de 2026** y requiere al Consultor ajustar la programación de entrega de los productos 18 al 28 adelantando su radicación al 15 de diciembre de 2026, el CONSORCIO FÉRREO DEL META HE se permite manifestar lo siguiente

1. Aceptación del ajuste en espíritu de colaboración

El **CONSORCIO FÉRREO DEL META HE**, en un espíritu de estricta colaboración y con el propósito de viabilizar los trámites administrativos, presupuestales y de cierre fiscal de la Entidad, acepta ajustar el **Programa Detallado de Trabajo (PDT)** para proyectar la radicación de los productos 18 al 28 al 15 de diciembre de 2026.

2. Preservación del sustento técnico y de la línea base requerida

No obstante, resulta necesario dejar expresa constancia de que el presente ajuste de la programación se efectúa exclusivamente en atención a la solicitud formulada por la ANI para facilitar la gestión del Otrosí y los tiempos de revisión institucionales. Lo anterior no implica la aceptación ni el reconocimiento de que los tiempos técnicamente requeridos para el desarrollo, articulación interdisciplinaria y consolidación de los productos sean inferiores a aquellos sustentados por el Consultor en el PDT y avalados por la Interventoría en el **Oficio CFL-CFM-ANI-78425 del 9 de septiembre de 2026**, donde se verificó una necesidad técnica de extensión de plazo de ciento un (101) días calendario sustentada en la fecha de aprobación de la Fase I.

En consecuencia, este ajuste operacional no constituye renuncia a las consideraciones de orden técnico, metodológico y de secuencia lógica de la ruta crítica previamente expuestas por el Consultor.

Docusign Envelope ID: C2D97065-8FBB-8E68-811C-D1DFDA841DB2

3. Inalterabilidad de los términos contractuales y ciclos de revisión

Alineados con lo manifestado expresamente por la Entidad en su comunicación, en el sentido de que la solicitud "*no implica modificación de las obligaciones, productos o alcances contractualmente establecidos*", dejamos constancia de que la reprogramación al 15 de diciembre de 2026 no modifica los términos contractuales, procedimientos, etapas ni plazos previstos para la revisión, evaluación y aprobación de entregables por parte de la Interventoría y la ANI, manteniéndose vigentes las reglas contractuales sobre ciclos de observación y subsanación.

4. Remisión de la programación ajustada


En virtud de lo anterior, procedemos a adjuntar la versión ajustada del **Programa Detallado de Trabajo (PDT)** en los términos solicitados por la ANI, dejando a salvo todas las consideraciones técnicas, contractuales y de plazo previamente presentadas por el Consultor.

Cordialmente,

Firmado por:
Javier Lancheros
FCE550250AD6439...

JAVIER EDUARDO LANCHEROS JIMENEZ
Director de proyectos
CONSORCIO FÉRREO DEL META HE
javier.lancheros@egis-group.com
Anexos: PDT Estructuración Corredor Férreo Villavicencio 31-12-2026_VF (PDF mpp)
C.C *contactenos@ani.gov.co*
fespejo@ani.gov.co
ypuerto@ani.gov.co
iubaque@ani.gov.co
jduarte@ani.gov.co
sarodriguez@ani.gov.co

Id	Modo de tarea	Tipo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
0		**Duración fija**	**20260814 Estructurador Corredor ferreo el Meta HE V**	**244 días**	**mié 31/12/25**	**jue 31/12/26**	**$ 16.252.239.247,00**	
1		**Duración fija**	**PRELIMINARES**	**69 días**	**mié 31/12/25**	**lun 13/04/26**	**$ 0,00**	
11		**Duración fija**	**ESTRUCTURACION TECNICA INTEGRAL**	**195 días**	**jue 12/03/26**	**jue 31/12/26**	**$ 16.252.239.247,00**	
12		**Duración fija**	**FASE 1 - Debida diligencia y propuesta de estructuración técnica integral**	**97 días**	**jue 12/03/26**	**jue 6/08/26**	**$ 631.998.288,00**	
31		**Duración fija**	**HITOS MONTO AGOTABLE**	**5 días**	**jue 6/08/26**	**vie 14/08/26**	**$ 0,00**	
37		**Duración fija**	**DESARROLLO MONTO AGOTABLE**	**131 días**	**vie 29/05/26**	**vie 11/12/26**	**$ 2.207.832.568,00**	
38		Duración fija	Permisos terceros	45 días	vie 29/05/26	mié 5/08/26	$ 0,00	6CC+51 días
39		Duración fija	Predios	45 días	vie 29/05/26	mié 5/08/26	$ 0,00	6CC+51 días
40		**Duración fija**	**Topografía**	**46 días**	**jue 20/08/26**	**vie 23/10/26**	**$ 563.602.932,00**	
49		**Duración fija**	**Exploración geotecnica**	**50 días**	**jue 3/09/26**	**vie 13/11/26**	**$ 934.064.517,00**	
54		**Duración fija**	**Predial**	**63 días**	**mar 1/09/26**	**mar 1/12/26**	**$ 140.931.700,00**	
58		**Duración fija**	**Ambiental**	**70 días**	**mar 1/09/26**	**vie 11/12/26**	**$ 569.233.419,00**	
62		Duración fija	Hito finalización monto agotable	0 días	vie 11/12/26	vie 11/12/26	$ 0,00	41;42;43;44;4
63		**Duración fija**	**FASE 2 - Estructuración técnica integral a nivel de factibilidad de la infraestructura ferroviaria**	**88 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 13.412.408.112,00**	
64		Duración fija	Inicio Fase II	0 días	jue 6/08/26	jue 6/08/26	$ 0,00	30;27
65		**Duración fija**	**Geotécnia, Geología y Geomorfología - Preliminar**	**20 días**	**jue 6/08/26**	**lun 7/09/26**	**$ 912.886.416,00**	
75		**Duración fija**	**Demanda y análisis logísticos y estudio de movilida**	**50 días**	**jue 6/08/26**	**mar 20/10/26**	**$ 702.220.320,00**	
101		**Duración fija**	**Preliminar Obligaciones adicionales del Estructurador Técnico E.T.**	**50 días**	**jue 6/08/26**	**mar 20/10/26**	**$ 0,00**	
108		**Duración fija**	**Topografía**	**50 días**	**jue 6/08/26**	**mar 20/10/26**	**$ 421.332.192,00**	
115		**Duración fija**	**Interferencias con redes y estudios de hidrológicos e hidráulicos**	**70 días**	**jue 6/08/26**	**jue 19/11/26**	**$ 702.220.320,00**	
116		Duración fija	inicio	0 días	jue 6/08/26	jue 6/08/26	$ 0,00	30;27
117		**Duración fija**	**Hidrología**	**50 días**	**lun 10/08/26**	**mar 20/10/26**	**$ 140.444.064,00**	
126		**Duración fija**	**Hidráulica**	**70 días**	**lun 10/08/26**	**jue 19/11/26**	**$ 561.776.256,00**	
139		**Duración fija**	**Interfererencia de redes**	**70 días**	**lun 10/08/26**	**jue 19/11/26**	**$ 0,00**	
148		**Duración fija**	**Geotécnia, Geología y Geomorfología - Final**	**70 días**	**jue 6/08/26**	**jue 19/11/26**	**$ 842.664.384,00**	
157		**Duración fija**	**Diseño Geométrico preliminar**	**70 días**	**jue 6/08/26**	**jue 19/11/26**	**$ 421.332.192,00**	
171		**Duración fija**	**BIM No. 1**	**71 días**	**jue 6/08/26**	**jue 19/11/26**	**$ 421.332.192,00**	
177		**Duración fija**	**Superestructura ferroviaria**	**70 días**	**jue 6/08/26**	**jue 19/11/26**	**$ 210.666.096,00**	
185		**Duración fija**	**Estudios de componente de Ordenamiento Territor**	**70 días**	**jue 6/08/26**	**jue 19/11/26**	**$ 421.332.192,00**	
196		**Duración fija**	**Diseño estructural**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 1.263.996.576,00**	
208		**Duración fija**	**Diseño de Centros intermodales, urbanismo y estudios de patrimonio**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 351.110.160,00**	
221		**Duración fija**	**Diseño geométrico definitivo a nivel de factibilidad (Geométrico, redes, hidrología, hidráulica y estructuras) y diseño de intersecciones**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 1.544.884.704,00**	
230		**Duración fija**	**Estudios Socio ambientales**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 912.886.416,00**	
285		**Duración fija**	**Estudios Prediales**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 702.220.320,00**	
294		**Duración fija**	**Inserción de infraestructura (estaciones de pasajeros, centros de transferencia de carga, urbanismo, patios y talleres, centros intermodales, depósitos y urbanismo**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 983.108.448,00**	
304		**Duración fija**	**Componentes ferroviarios (Sistemas, RAMS, Material rodante y Vía férrea, Control de tráfico**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 631.998.288,00**	
316		**Duración fija**	**Análisis de factibilidad (gestión documental, POP, PMP, CAPEX, OPEX, cronograma**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 421.332.192,00**	
333		**Duración fija**	**BIM No. 2**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 1.193.774.544,00**	
340		**Duración fija**	**Estudios adicionales del Estructurador Técnico E.T**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 70.222.032,00**	
348		**Duración fija**	**Informe final**	**87 días**	**jue 6/08/26**	**mar 15/12/26**	**$ 280.888.128,00**	
357		Duración fija	AJUSTE AL PESO	0 días	mar 15/12/26	mar 15/12/26	$ 279,00	356
358		Duración fija	ENTREGA ESTUDIOS DEFINITIVOS	11 días	mié 16/12/26	jue 31/12/26	$ 0,00	357
359		Duración fija	FIN	0 días	jue 31/12/26	jue 31/12/26	$ 0,00	357;358

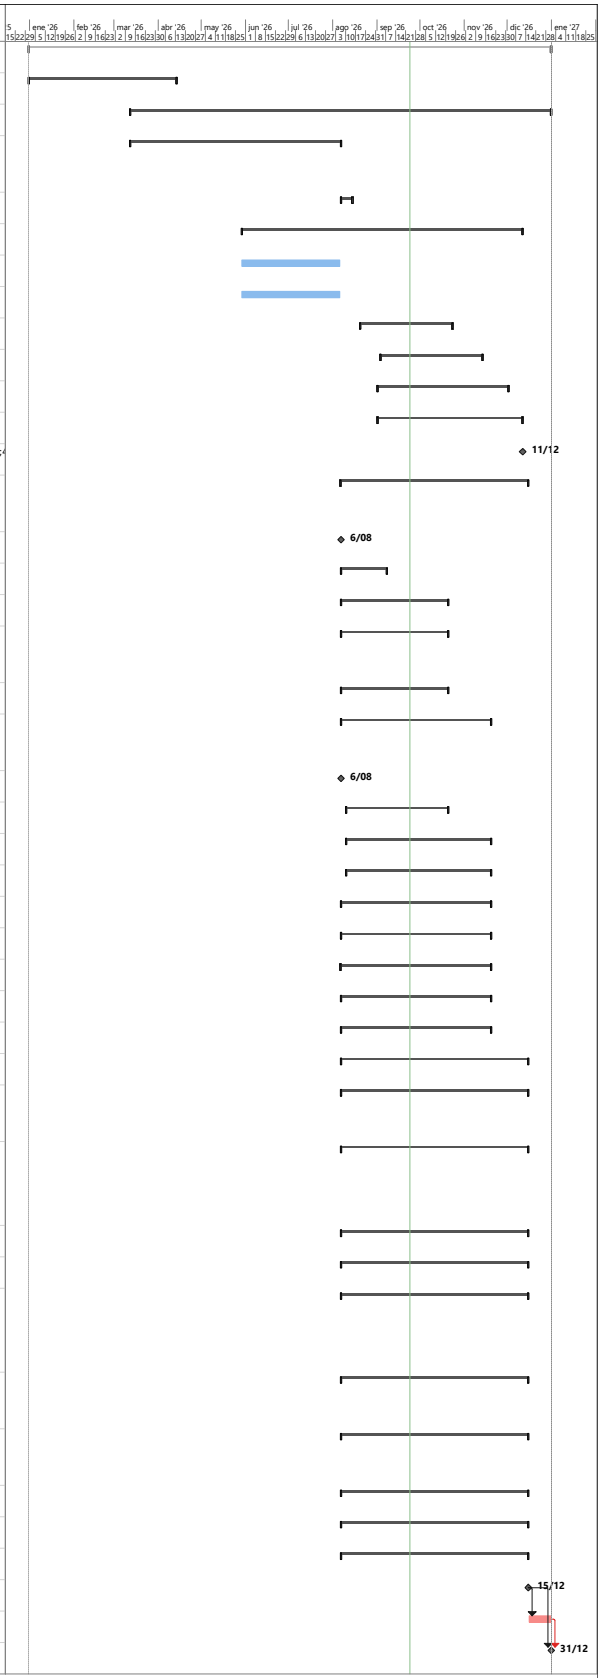

Proyecto: 20260814 Estructurad
Fecha: jue 24/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
