

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
0		**0**	**Programacion inicial BH**	**424 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/10/27**	**$ 15.209.007.829,00**	**86%**	**62%**	**$ 388.036.311,02**	**2,55**	**$ 304.314.854,70**	**2**
1		**1**	**CONTRATO 1276-2025. REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓNDE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZATU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEHÁBITAT.**	**424 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/10/27**	**$ 15.209.007.829,00**	**86%**	**62%**	**$ 388.036.311,02**	**2,55**	**$ 304.314.854,70**	**2**
2		2	Acta de Inicio de la consultoria	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26	$ 0,00	100%	100%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
3		**2**	**ETAPA 1**	**164 días**	**lun 9/02/26**	**jue 8/10/26**	**$ 1.000.586.159,00**	**87%**	**64%**	**$ 388.036.311,02**	**38,78**	**$ 304.314.854,70**	**30,41**
4		**3**	**FASE 1 - FACTIBILIDAD**	**127 días**	**lun 9/02/26**	**mar 18/08/26**	**$ 250.846.950,09**	**100%**	**100%**	**$ 250.846.950,09**	**100**	**$ 250.846.950,09**	**100**
5		**4**	**GESTIÓN NORMATIVA Y TRÁMITES ANTE ENTIDADES**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 15.677.934,39**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,39**	**100**	**$ 15.677.934,39**	**100**
6		**5**	**solicitud de lineamientos, determinantes y consulta de normatividad vigente.**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
7		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
8		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
9		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
10		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
11		**5**	**solicitud de documentos, certificados, cartografía y demás documentos.**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
12		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
13		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
14		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
15		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
16		**5**	**Estudio de títulos y gestión predial**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
17		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
18		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
19		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
20		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
21		**5**	**Informe de solicitudes y gestiones realizadas**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
22		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
23		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
24		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
25		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
26		**5**	**Expediente de radicados y matriz de trazabilidad**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,87**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,87**	**100**	**$ 3.135.586,87**	**100**
27		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
28		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
29		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
30		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
31		**4**	**MOVIMIENTOS DE MASA**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
32		**5**	**Consulta al IDIGER sobre condicionamientos y restricciones por riesgo**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
33		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
34		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
35		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
36		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
37		**5**	**Recopilación de información e insumos para el estudio de movimientos en masa.**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
38		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
39		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
40		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
41		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
42		**4**	**AVENIDAS TORRENCIALES**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**




Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
43		**5**	**Consulta al IDIGER sobre condicionamientos y restricciones por riesgo.**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
44		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
45		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
46		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
47		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
48		**5**	**Recopilación de información, cartografía e insumos del estudio.**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
49		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
50		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
51		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
52		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
53		**4**	**INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
54		**5**	**Consulta al IDIGER sobre condicionamientos y restricciones por riesgo.**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
55		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
56		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
57		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
58		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
59		**5**	**Recopilación de información, cartografía e insumos del estudio.**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
60		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
61		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
62		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
63		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
64		**4**	**TOPOGRÁFICO Y SIG**	**43 días**	**lun 9/02/26**	**jue 9/04/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
65		**5**	**Localización General con amarres al IGAC**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 1.959.741,79**	**100%**	**100%**	**$ 1.959.741,79**	**100**	**$ 1.959.741,79**	**100**
66		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
67		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
68		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
69		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 979.870,90	100%	100%	$ 979.870,90	100	$ 979.870,90	100
70		**5**	**Levantamiento de elementos existentes**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 1.959.741,79**	**100%**	**100%**	**$ 1.959.741,79**	**100**	**$ 1.959.741,79**	**100**
71		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
72		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
73		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
74		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 979.870,90	100%	100%	$ 979.870,90	100	$ 979.870,90	100
75		**5**	**Levantamiento predial**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 1.959.741,80**	**100%**	**100%**	**$ 1.959.741,80**	**100**	**$ 1.959.741,80**	**100**
76		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 326.623,64	100%	100%	$ 326.623,64	100	$ 326.623,64	100
77		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
78		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
79		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 979.870,90	100%	100%	$ 979.870,90	100	$ 979.870,90	100
80		**5**	**Levantamiento redes externas**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 1.959.741,80**	**100%**	**100%**	**$ 1.959.741,80**	**100**	**$ 1.959.741,80**	**100**
81		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 326.623,64	100%	100%	$ 326.623,64	100	$ 326.623,64	100
82		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
83		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
84		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 979.870,90	100%	100%	$ 979.870,90	100	$ 979.870,90	100
85		**5**	**Levantamiento vial**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 1.959.741,80**	**100%**	**100%**	**$ 1.959.741,80**	**100**	**$ 1.959.741,80**	**100**
86		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 326.623,64	100%	100%	$ 326.623,64	100	$ 326.623,64	100
87		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
88		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
89		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 979.870,90	100%	100%	$ 979.870,90	100	$ 979.870,90	100
90		**5**	**Levantamiento ambiental**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 1.959.741,80**	**100%**	**100%**	**$ 1.959.741,80**	**100**	**$ 1.959.741,80**	**100**
91		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 326.623,64	100%	100%	$ 326.623,64	100	$ 326.623,64	100

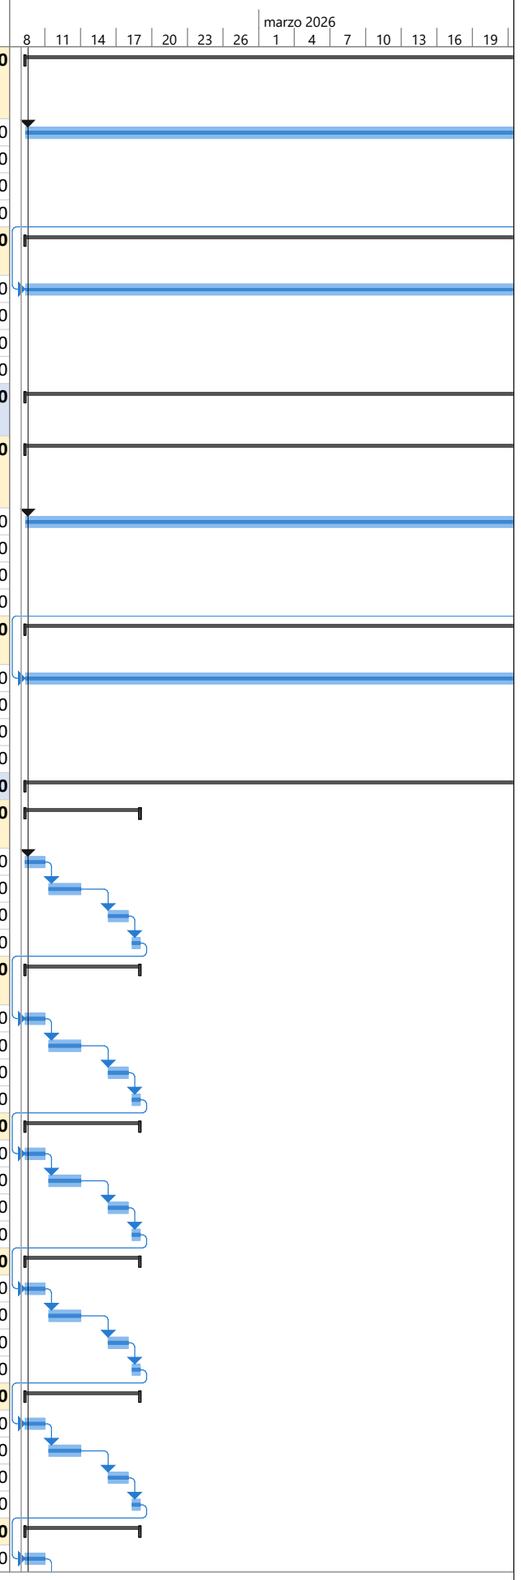


Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
92		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
93		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
94		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 979.870,90	100%	100%	$ 979.870,90	100	$ 979.870,90	100
95		**5**	**Cartografía preliminar**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 1.959.741,80**	**100%**	**100%**	**$ 1.959.741,80**	**100**	**$ 1.959.741,80**	**100**
96		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 326.623,64	100%	100%	$ 326.623,64	100	$ 326.623,64	100
97		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
98		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
99		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 979.870,90	100%	100%	$ 979.870,90	100	$ 979.870,90	100
100		**5**	**Informe Topográfico Factibilidad**	**43 días**	**lun 9/02/26**	**jue 9/04/26**	**$ 1.959.741,80**	**100%**	**100%**	**$ 1.959.741,80**	**100**	**$ 1.959.741,80**	**100**
101		6	Entrega	37 días	lun 9/02/26	mié 1/04/26	$ 326.623,64	100%	100%	$ 326.623,64	100	$ 326.623,64	100
102		6	Revisión	3 días	jue 2/04/26	lun 6/04/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
103		6	Subsanación	2 días	mar 7/04/26	mié 8/04/26	$ 326.623,63	100%	100%	$ 326.623,63	100	$ 326.623,63	100
104		6	Aprobación	1 día	jue 9/04/26	jue 9/04/26	$ 979.870,90	100%	100%	$ 979.870,90	100	$ 979.870,90	100
105		**4**	**ARQUITECTÓNICO**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
106		**5**	**Entrega de la metodología de diseño del componente arquitectónico, urbano y paisajístico.**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
107		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
108		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
109		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
110		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
111		**5**	**Entrega del Informe de recopilación y análisis de información del componente arquitectónico, urbano y paisajístico.**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
112		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
113		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
114		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
115		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
116		**4**	**COMPONENTE VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
117		**5**	**Entrega de Recopilación y análisis de información (RAI)**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.919.483,59**	**100%**	**100%**	**$ 3.919.483,59**	**100**	**$ 3.919.483,59**	**100**
118		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
119		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
120		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
121		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.959.741,80	100%	100%	$ 1.959.741,80	100	$ 1.959.741,80	100
122		**5**	**Entrega de Metodología del Estudio de Tránsito**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.919.483,59**	**100%**	**100%**	**$ 3.919.483,59**	**100**	**$ 3.919.483,59**	**100**
123		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
124		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
125		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
126		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.959.741,80	100%	100%	$ 1.959.741,80	100	$ 1.959.741,80	100
127		**5**	**Entrega de Informe de recopilación vias**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.919.483,60**	**100%**	**100%**	**$ 3.919.483,60**	**100**	**$ 3.919.483,60**	**100**
128		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
129		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
130		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
131		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.959.741,80	100%	100%	$ 1.959.741,80	100	$ 1.959.741,80	100
132		**5**	**Informe técnico de factibilidad geométrico**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.919.483,60**	**100%**	**100%**	**$ 3.919.483,60**	**100**	**$ 3.919.483,60**	**100**
133		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
134		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
135		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
136		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.959.741,80	100%	100%	$ 1.959.741,80	100	$ 1.959.741,80	100
137		**4**	**PAVIMENTOS**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
138		**5**	**Entrega de la Planeación**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.135.586,87**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,87**	**100**	**$ 3.135.586,87**	**100**
139		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100

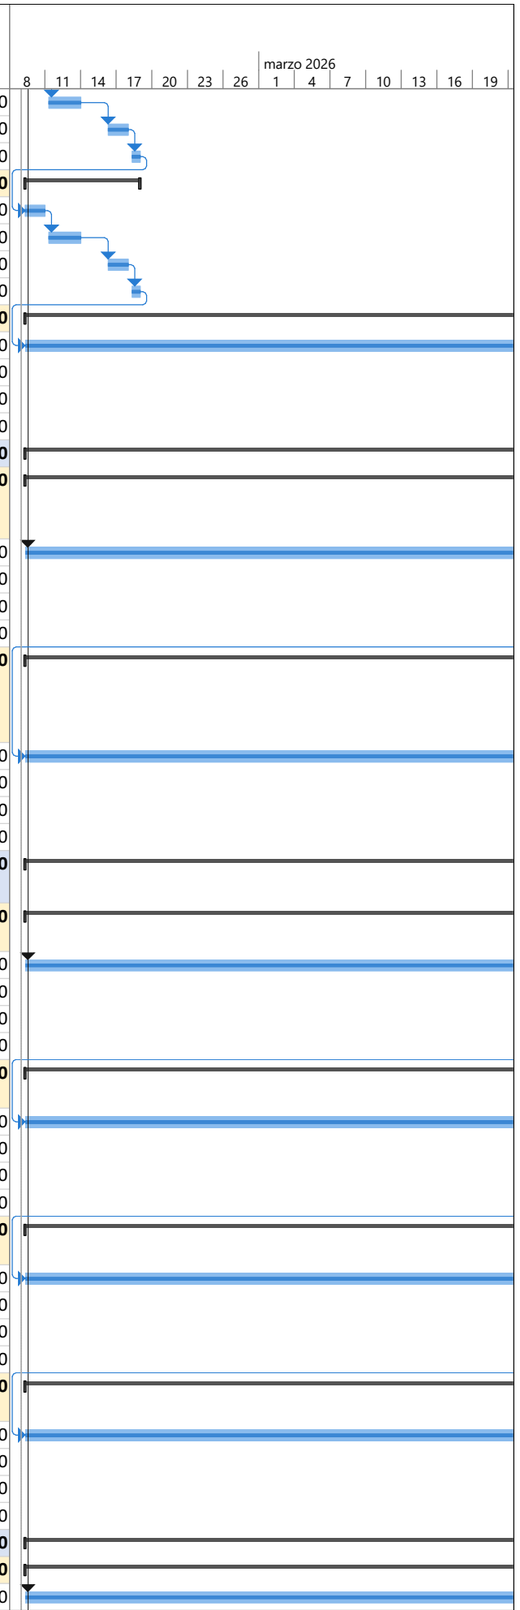


Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
140		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
141		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
142		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.567.793,43	100%	100%	$ 1.567.793,43	100	$ 1.567.793,43	100
143		**5**	**Entrega del diagnostico**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.135.586,87**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,87**	**100**	**$ 3.135.586,87**	**100**
144		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
145		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
146		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
147		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.567.793,43	100%	100%	$ 1.567.793,43	100	$ 1.567.793,43	100
148		**5**	**Entrega de investigacion**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
149		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
150		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
151		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
152		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.567.793,43	100%	100%	$ 1.567.793,43	100	$ 1.567.793,43	100
153		**5**	**Entrega de la metodologia del diseño**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
154		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
155		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
156		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
157		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.567.793,43	100%	100%	$ 1.567.793,43	100	$ 1.567.793,43	100
158		**5**	**Entrega de evaluacion**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
159		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
160		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
161		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
162		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.567.793,43	100%	100%	$ 1.567.793,43	100	$ 1.567.793,43	100
163		**4**	**REDES HIDROSANITARAS, SECAS Y GAS**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
164		**5**	**Entrega de los Informe de recopilación y análisis del componente hidrosanitario**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,87**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,87**	**100**	**$ 3.135.586,87**	**100**
165		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
166		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
167		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
168		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
169		**5**	**Entrega Investigación de redes redes hidrosanitario**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,87**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,87**	**100**	**$ 3.135.586,87**	**100**
170		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
171		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
172		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
173		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
174		**5**	**Entrega del Documento Técnico de Factibilidad del componente hidrosanitario**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
175		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
176		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
177		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
178		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
179		**5**	**Entrega Informe recopilación y análisis redes secas**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
180		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
181		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
182		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
183		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
184		**5**	**Entrega Documento técnico de soporte redes secas**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 3.135.586,88**	**100%**	**100%**	**$ 3.135.586,88**	**100**	**$ 3.135.586,88**	**100**
185		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
186		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 522.597,81	100%	100%	$ 522.597,81	100	$ 522.597,81	100
187		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 522.597,82	100%	100%	$ 522.597,82	100	$ 522.597,82	100
188		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 1.567.793,44	100%	100%	$ 1.567.793,44	100	$ 1.567.793,44	100
189		**4**	**ESTRUCTURAS**	**72 días**	**lun 9/02/26**	**vie 22/05/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**

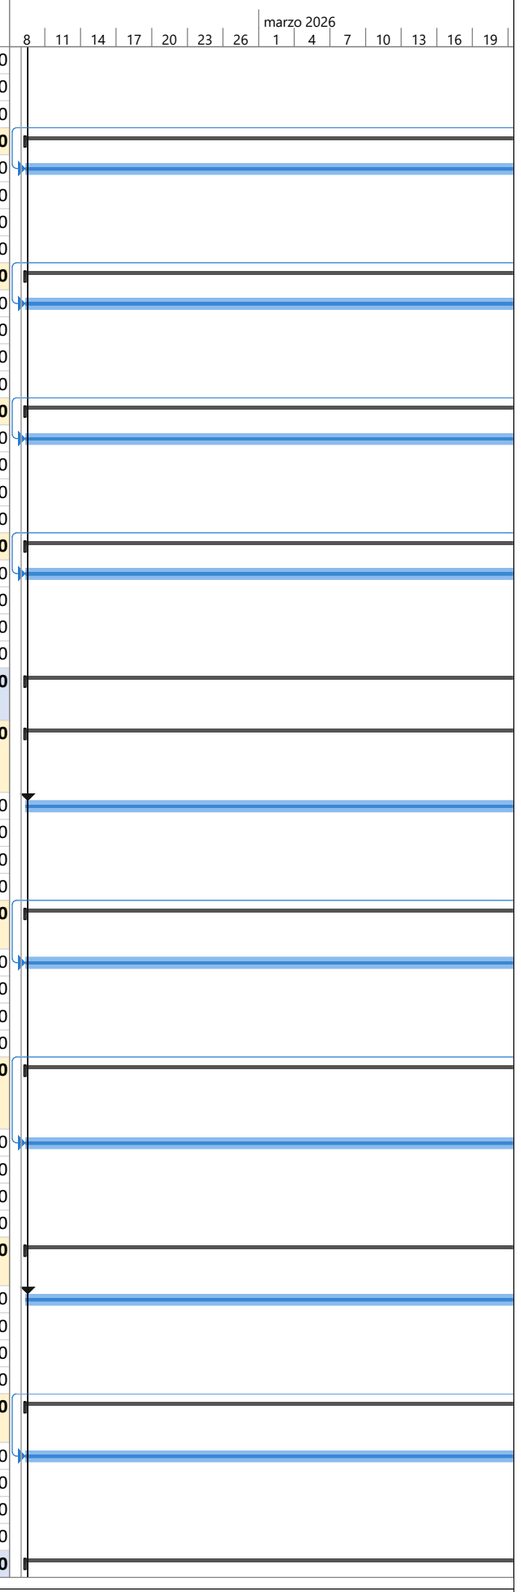


Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
190		5	**Informe Docum tecnico de factibilidad**	**72 días**	**lun 9/02/26**	**vie 22/05/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
191		6	Entrega	66 días	lun 9/02/26	mié 13/05/26	$ 2.612.989,07	100%	100%	$ 2.612.989,07	100	$ 2.612.989,07	100
192		6	Revisión	3 días	jue 14/05/26	mar 19/05/26	$ 2.612.989,06	100%	100%	$ 2.612.989,06	100	$ 2.612.989,06	100
193		6	Subsanación	2 días	mié 20/05/26	jue 21/05/26	$ 2.612.989,06	100%	100%	$ 2.612.989,06	100	$ 2.612.989,06	100
194		6	Aprobación	1 día	vie 22/05/26	vie 22/05/26	$ 7.838.967,19	100%	100%	$ 7.838.967,19	100	$ 7.838.967,19	100
195		4	**ARQUEOLOGÍA**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
196		5	**Entrega del documento con el Diagnóstico Arqueológico.**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 5.225.978,13**	**100%**	**100%**	**$ 5.225.978,13**	**100**	**$ 5.225.978,13**	**100**
197		6	Entrega	57 días	lun 9/02/26	mié 29/04/26	$ 870.996,36	100%	100%	$ 870.996,36	100	$ 870.996,36	100
198		6	Revisión	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	$ 870.996,36	100%	100%	$ 870.996,36	100	$ 870.996,36	100
199		6	Subsanación	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26	$ 870.996,35	100%	100%	$ 870.996,35	100	$ 870.996,35	100
200		6	Aprobación	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	$ 2.612.989,06	100%	100%	$ 2.612.989,06	100	$ 2.612.989,06	100
201		5	**Insumos para registro ICANH**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 5.225.978,13**	**100%**	**100%**	**$ 5.225.978,13**	**100**	**$ 5.225.978,13**	**100**
202		6	Entrega	57 días	lun 9/02/26	mié 29/04/26	$ 870.996,36	100%	100%	$ 870.996,36	100	$ 870.996,36	100
203		6	Revisión	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	$ 870.996,36	100%	100%	$ 870.996,36	100	$ 870.996,36	100
204		6	Subsanación	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26	$ 870.996,35	100%	100%	$ 870.996,35	100	$ 870.996,35	100
205		6	Aprobación	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	$ 2.612.989,06	100%	100%	$ 2.612.989,06	100	$ 2.612.989,06	100
206		5	**Registro ICANH**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 5.225.978,12**	**100%**	**100%**	**$ 5.225.978,12**	**100**	**$ 5.225.978,12**	**100**
207		6	Entrega	57 días	lun 9/02/26	mié 29/04/26	$ 870.996,36	100%	100%	$ 870.996,36	100	$ 870.996,36	100
208		6	Revisión	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	$ 870.996,35	100%	100%	$ 870.996,35	100	$ 870.996,35	100
209		6	Subsanación	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26	$ 870.996,35	100%	100%	$ 870.996,35	100	$ 870.996,35	100
210		6	Aprobación	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	$ 2.612.989,06	100%	100%	$ 2.612.989,06	100	$ 2.612.989,06	100
211		4	**PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
212		5	**Entrega de presupuesto general en su versión No. 1**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
213		6	Entrega	57 días	lun 9/02/26	mié 29/04/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
214		6	Revisión	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
215		6	Subsanación	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
216		6	Aprobación	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
217		5	**Cronograma Estudios y Diseños**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
218		6	Entrega	57 días	lun 9/02/26	mié 29/04/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
219		6	Revisión	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
220		6	Subsanación	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
221		6	Aprobación	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
222		4	**GEOTÉCNICO**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
223		5	**Entrega de la planeación del proyecto**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.919.483,59**	**100%**	**100%**	**$ 3.919.483,59**	**100**	**$ 3.919.483,59**	**100**
224		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
225		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
226		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
227		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.959.741,80	100%	100%	$ 1.959.741,80	100	$ 1.959.741,80	100
228		5	**Entrega de Investigación**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.919.483,59**	**100%**	**100%**	**$ 3.919.483,59**	**100**	**$ 3.919.483,59**	**100**
229		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
230		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
231		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
232		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.959.741,80	100%	100%	$ 1.959.741,80	100	$ 1.959.741,80	100
233		5	**Entrega de Plan de exploracion**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.919.483,60**	**100%**	**100%**	**$ 3.919.483,60**	**100**	**$ 3.919.483,60**	**100**
234		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
235		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
236		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
237		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.959.741,80	100%	100%	$ 1.959.741,80	100	$ 1.959.741,80	100
238		5	**Entrega de Estudio de factibilidad**	**67 días**	**lun 9/02/26**	**jue 14/05/26**	**$ 3.919.483,60**	**100%**	**100%**	**$ 3.919.483,60**	**100**	**$ 3.919.483,60**	**100**
239		6	Entrega	61 días	lun 9/02/26	mié 6/05/26	$ 653.247,26	100%	100%	$ 653.247,26	100	$ 653.247,26	100
240		6	Revisión	3 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
241		6	Subsanación	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$ 653.247,27	100%	100%	$ 653.247,27	100	$ 653.247,27	100
242		6	Aprobación	1 día	jue 14/05/26	jue 14/05/26	$ 1.959.741,80	100%	100%	$ 1.959.741,80	100	$ 1.959.741,80	100

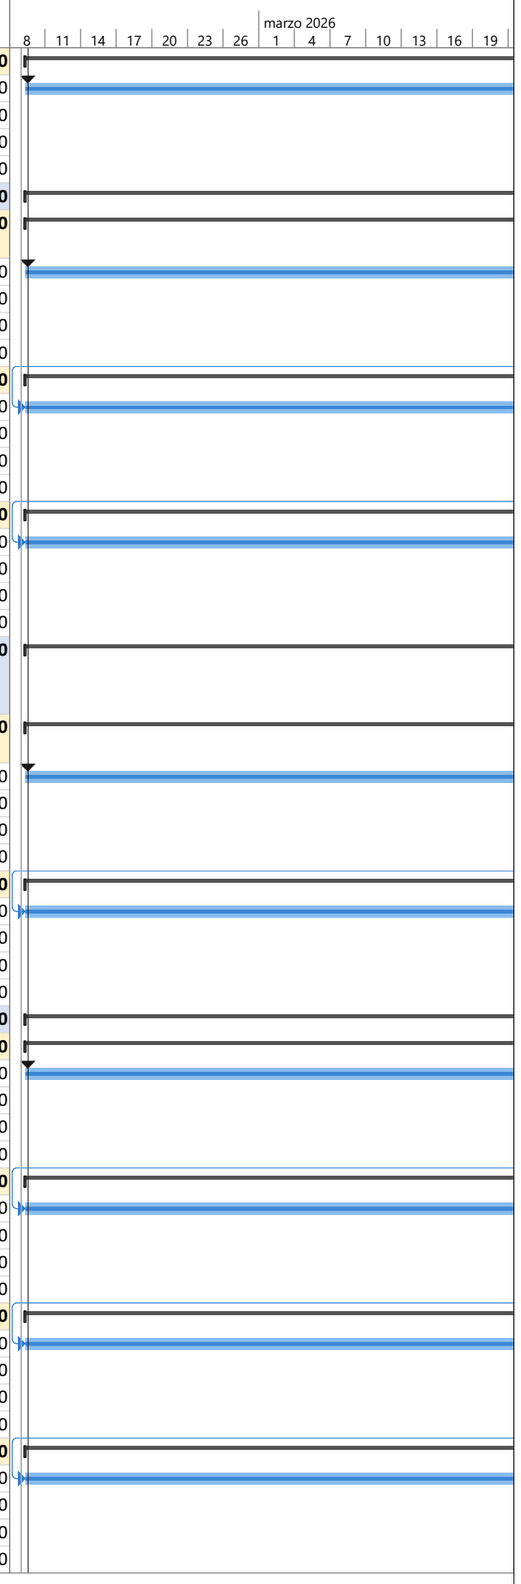

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
243		**4**	**BIM**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
244		**5**	**Plan de Ejecución BIM (BEP)**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
245		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
246		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
247		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
248		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
249		**5**	**Configuración CDE**	**126 días**	**lun 9/02/26**	**vie 14/08/26**	**$ 7.838.967,19**	**100%**	**100%**	**$ 7.838.967,19**	**100**	**$ 7.838.967,19**	**100**
250		6	Entrega	120 días	lun 9/02/26	mié 5/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
251		6	Revisión	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
252		6	Subsanación	2 días	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$ 1.306.494,53	100%	100%	$ 1.306.494,53	100	$ 1.306.494,53	100
253		6	Aprobación	1 día	vie 14/08/26	vie 14/08/26	$ 3.919.483,60	100%	100%	$ 3.919.483,60	100	$ 3.919.483,60	100
254		**4**	**SOCIAL**	**43 días**	**lun 9/02/26**	**jue 9/04/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
255		**5**	**Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana por intervención.**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 2.239.704,92**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,92**	**100**	**$ 2.239.704,92**	**100**
256		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
257		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
258		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
259		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
260		**5**	**Avance de Caracterización Social por intervención.**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
261		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
262		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
263		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
264		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
265		**5**	**Implementación y funcionamiento del Punto de Atención a la Ciudadanía – PAC.**	**8 días**	**jue 19/02/26**	**lun 2/03/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
266		6	Entrega	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
267		6	Revisión	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
268		6	Subsanación	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
269		6	Aprobación	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
270		**5**	**Reunión de inicio de la Etapa 1 por intervención.**	**5 días**	**mar 3/03/26**	**lun 9/03/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
271		6	Entrega	1 día	mar 3/03/26	mar 3/03/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
272		6	Revisión	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
273		6	Subsanación	1 día	vie 6/03/26	vie 6/03/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
274		6	Aprobación	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
275		**5**	**Diligenciamiento Bitácora social.**	**30 días**	**jue 19/02/26**	**jue 2/04/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
276		6	Entrega	24 días	jue 19/02/26	mié 25/03/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
277		6	Revisión	3 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
278		6	Subsanación	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
279		6	Aprobación	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
280		**5**	**Conformación y funcionamiento del Comité Mi Hábitat.**	**8 días**	**jue 19/02/26**	**lun 2/03/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
281		6	Entrega	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
282		6	Revisión	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
283		6	Subsanación	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
284		6	Aprobación	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
285		**5**	**Programa de Información y Servicio a la Ciudadanía y gestión de PQRS.**	**43 días**	**lun 9/02/26**	**jue 9/04/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
286		6	Entrega	37 días	lun 9/02/26	mié 1/04/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
287		6	Revisión	3 días	jue 2/04/26	lun 6/04/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
288		6	Subsanación	2 días	mar 7/04/26	mié 8/04/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
289		6	Aprobación	1 día	jue 9/04/26	jue 9/04/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
290		**4**	**AMBIENTAL, SST Y FORESTAL**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 15.677.934,38**	**100%**	**100%**	**$ 15.677.934,38**	**100**	**$ 15.677.934,38**	**100**
291		**5**	**Acta de Inicio**	**0 días**	**lun 9/02/26**	**lun 9/02/26**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
292		6	Entrega	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26	$ 0,00	100%	100%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
293		6	Revisión	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26	$ 0,00	100%	100%	$ 0,00	0	$ 0,00	0

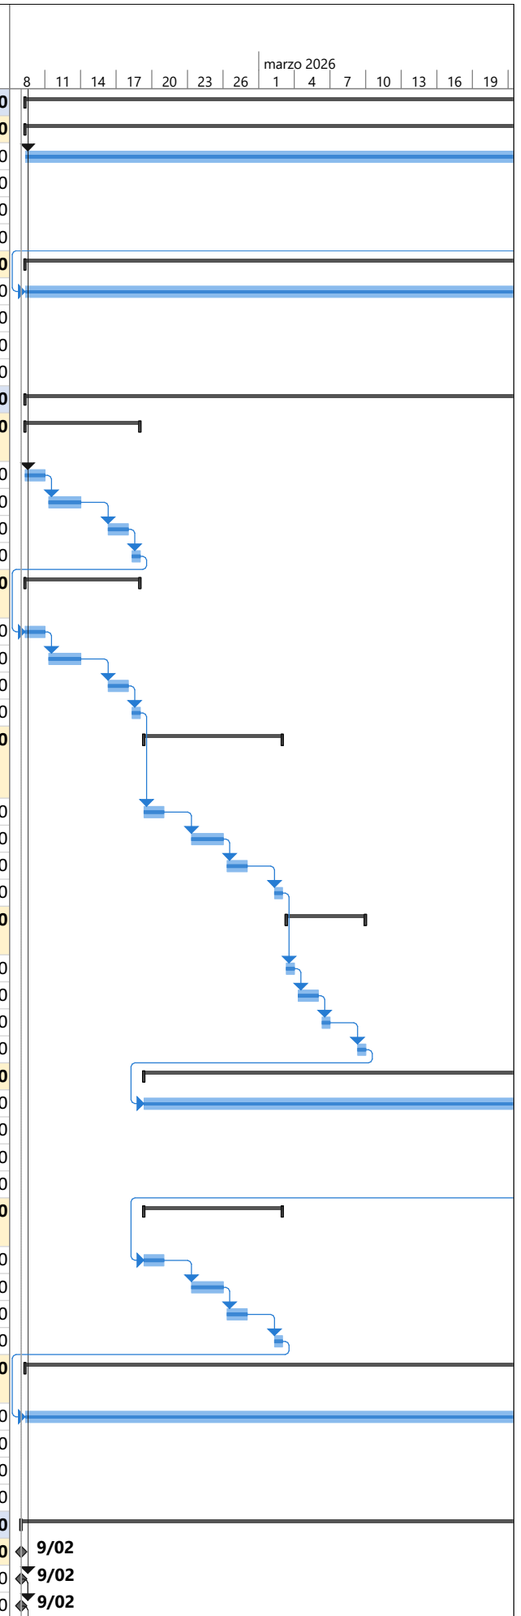

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
294		6	Subsanación	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26	$ 0,00	100%	100%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
295		6	Aprobación	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26	$ 0,00	100%	100%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
296		**5**	**Copia acta de comité de inicio Ambiental / SST**	**5 días**	**lun 9/02/26**	**vie 13/02/26**	**$ 2.239.704,92**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,92**	**100**	**$ 2.239.704,92**	**100**
297		6	Entrega	1 día	lun 9/02/26	lun 9/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
298		6	Revisión	2 días	mar 10/02/26	mié 11/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
299		6	Subsanación	1 día	jue 12/02/26	jue 12/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
300		6	Aprobación	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
301		**5**	**Cronograma**	**63 días**	**lun 9/02/26**	**vie 8/05/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
302		6	Entrega	57 días	lun 9/02/26	mié 29/04/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
303		6	Revisión	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
304		6	Subsanación	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
305		6	Aprobación	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
306		**5**	**Diagnóstico - Línea Base Ambiental.**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
307		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
308		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
309		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
310		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
311		**5**	**Identificacion de determinantes ambientales, tramites y permisos**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
312		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
313		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
314		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
315		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
316		**5**	**Informe de etapa de recopilación, análisis y revisión de información existente.**	**8 días**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
317		6	Entrega	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
318		6	Revisión	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
319		6	Subsanación	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
320		6	Aprobación	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
321		**5**	**Gestión documental y personal Ambiental, SST y Forestal**	**38 días**	**lun 9/02/26**	**jue 2/04/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
322		6	Entrega	32 días	lun 9/02/26	mié 25/03/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
323		6	Revisión	3 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
324		6	Subsanación	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
325		6	Aprobación	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
326		**5**	**Seguimiento Fase 1**	**38 días**	**lun 9/02/26**	**jue 2/04/26**	**$ 2.239.704,91**	**100%**	**100%**	**$ 2.239.704,91**	**100**	**$ 2.239.704,91**	**100**
327		6	Entrega	32 días	lun 9/02/26	mié 25/03/26	$ 373.284,16	100%	100%	$ 373.284,16	100	$ 373.284,16	100
328		6	Revisión	3 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
329		6	Subsanación	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	$ 373.284,15	100%	100%	$ 373.284,15	100	$ 373.284,15	100
330		6	Aprobación	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	$ 1.119.852,45	100%	100%	$ 1.119.852,45	100	$ 1.119.852,45	100
331		4	**INFORME DE CIERRE FASE 1**	**0 días**	**mar 18/08/26**	**mar 18/08/26**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
332		4	**CIERRE FASE 1**	**0 días**	**mar 18/08/26**	**mar 18/08/26**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
333		**3**	**FASE 2-ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**108 días**	**vie 10/04/26**	**lun 21/09/26**	**$ 485.284.287,09**	**87%**	**50%**	**$ 73.573.422,44**	**15,16**	**$ 44.211.982,35**	**9,11**
334		**4**	**GESTIÓN NORMATIVA Y TRÁMITES ANTE ENTIDADES**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	$ 30.330.267,94	**86%**	**57%**	**$ 4.598.338,90**	**15,16**	**$ 3.066.727,10**	**10,11**
335		**5**	**Gestión y trámite de permisos, vistos buenos y aprobaciones.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,32**	**86%**	**86%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 1.533.363,55**	**15,17**
336		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	91%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 1.533.363,55	91
337		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
338		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
339		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
340		**5**	**Informe de solicitudes y gestiones realizadas.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,31**	**86%**	**0%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
341		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	0%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 0,00	0
342		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
343		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0

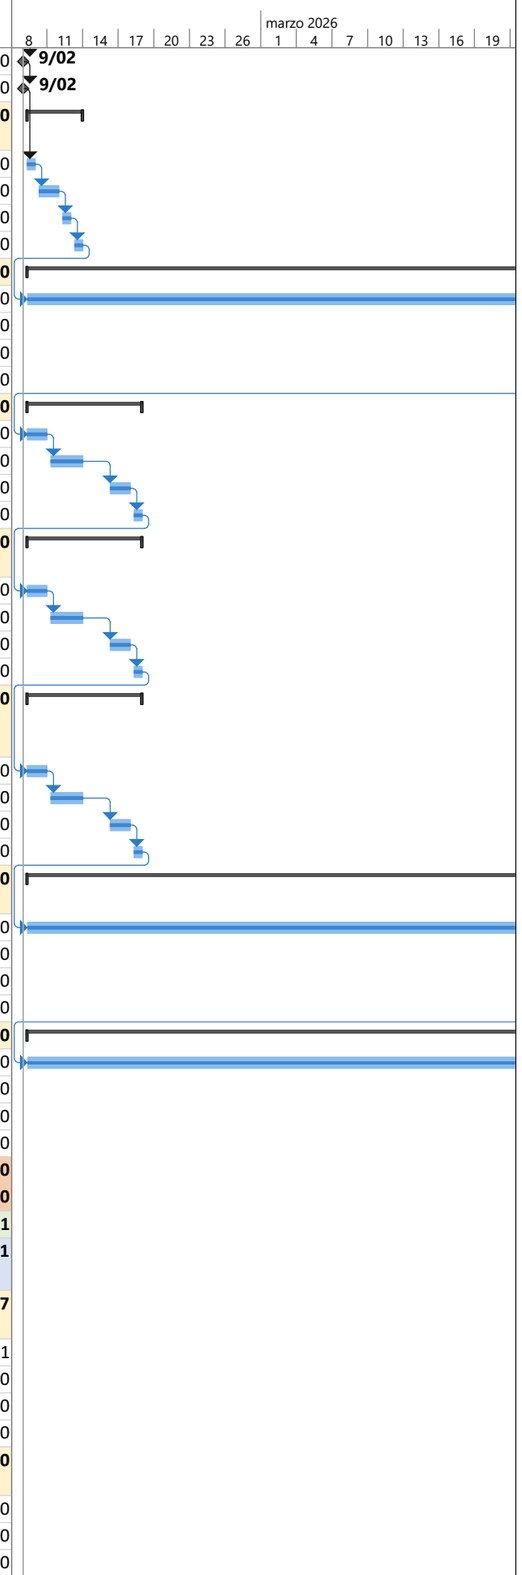

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
344		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
345		**5**	**Expediente actualizado de radicados y respuestas de entidades.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,31**	**86%**	**86%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 1.533.363,55**	**15,17**
346		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	91%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 1.533.363,55	91
347		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
348		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
349		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
350		**4**	**MOVIMIENTOS DE MASA**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	$ 30.330.267,94	**86%**	**94%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 5.055.044,66**	**16,67**
351		**5**	**Documento técnico del estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**94%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 5.055.044,66**	**16,67**
352		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 5.055.044,66	91%	100%	$ 4.598.338,89	90,97	$ 5.055.044,66	100
353		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
354		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 5.055.044,65	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
355		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 15.165.133,97	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
356		**4**	**AVENIDAS TORRENCIALES**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**94%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 5.055.044,66**	**16,67**
357		**5**	**Documento técnico con el contenido desarrollado del estudio técnico de para zonificación de amenaza por avenidas torrenciales y sus medidas de mitigación**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**94%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 5.055.044,66**	**16,67**
358		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 5.055.044,66	91%	100%	$ 4.598.338,89	90,97	$ 5.055.044,66	100
359		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
360		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 5.055.044,65	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
361		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 15.165.133,97	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
362		**4**	**INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**94%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 5.055.044,66**	**16,67**
363		**5**	**Documento técnico con el contenido desarrollado del estudio técnico de para para estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**94%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 5.055.044,66**	**16,67**
364		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 5.055.044,66	91%	100%	$ 4.598.338,89	90,97	$ 5.055.044,66	100
365		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
366		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 5.055.044,65	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
367		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 15.165.133,97	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
368		**4**	**TOPOGRÁFICO Y SIG (MÁS CADENERO)**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	$ 30.330.267,94	**86%**	**70%**	**$ 4.598.338,90**	**15,16**	**$ 3.740.733,06**	**12,33**
369		**5**	**Cartografía Final**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,32**	**86%**	**70%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 1.246.911,02**	**12,33**
370		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	74%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 1.246.911,02	74
371		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
372		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
373		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
374		**5**	**Informe Topográfico Definitivo**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,31**	**86%**	**70%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 1.246.911,02**	**12,33**
375		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	74%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 1.246.911,02	74
376		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
377		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
378		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
379		**5**	**Georreferenciación**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,31**	**86%**	**70%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 1.246.911,02**	**12,33**
380		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	74%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 1.246.911,02	74
381		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
382		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
383		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
384		**4**	**ARQUITECTÓNICO**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	$ 30.330.267,94	**86%**	**49%**	**$ 4.598.338,90**	**15,16**	**$ 2.628.623,23**	**8,67**
385		**5**	**Entrega del esquema general del proyecto del componente arquitectónico, urbano y paisajístico**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,32**	**86%**	**49%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 876.207,74**	**8,67**
386		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	52%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 876.207,74	52
387		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
388		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
389		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
390		**5**	**Entrega del documento técnico de diseño**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,31**	**86%**	**49%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 876.207,74**	**8,67**
391		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	52%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 876.207,74	52
392		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
393		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
394		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
395		**5**	**Entrega del documento técnico de diseño del componente paisajistico**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,31**	**86%**	**49%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 876.207,74**	**8,67**
396		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	52%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 876.207,74	52
397		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
398		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
399		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
400		**4**	**COMPONENTE VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**27%**	**$ 4.598.338,92**	**15,16**	**$ 1.465.962,96**	**4,83**
401		**5**	**Entrega de Estudio de tránsito**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 6.066.053,58**	**86%**	**27%**	**$ 919.667,78**	**15,16**	**$ 293.192,59**	**4,83**
402		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.011.008,93	91%	29%	$ 919.667,78	90,97	$ 293.192,59	29
403		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
404		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
405		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.033.026,79	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
406		**5**	**Entrega de Cálculo TPD**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 6.066.053,59**	**86%**	**27%**	**$ 919.667,79**	**15,16**	**$ 293.192,59**	**4,83**
407		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.011.008,94	91%	29%	$ 919.667,79	90,97	$ 293.192,59	29
408		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
409		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
410		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.033.026,79	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
411		**5**	**Entrega de diseño de señalización**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 6.066.053,59**	**86%**	**27%**	**$ 919.667,79**	**15,16**	**$ 293.192,59**	**4,83**
412		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.011.008,94	91%	29%	$ 919.667,79	90,97	$ 293.192,59	29
413		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
414		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
415		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.033.026,79	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
416		**5**	**Entrega de diseño de semaforización**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 6.066.053,59**	**86%**	**27%**	**$ 919.667,79**	**15,16**	**$ 293.192,59**	**4,83**
417		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.011.008,94	91%	29%	$ 919.667,79	90,97	$ 293.192,59	29
418		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
419		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
420		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.033.026,79	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
421		**5**	**Entrega de diseño geometrico**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 6.066.053,59**	**86%**	**27%**	**$ 919.667,79**	**15,16**	**$ 293.192,59**	**4,83**
422		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.011.008,94	91%	29%	$ 919.667,79	90,97	$ 293.192,59	29
423		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
424		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.011.008,93	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
425		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.033.026,79	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
426		**4**	**PAVIMENTO**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**27%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 1.465.962,95**	**4,83**
427		**5**	**Entrega de diseño definitivo**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**27%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 1.465.962,95**	**4,83**
428		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 5.055.044,66	91%	29%	$ 4.598.338,89	90,97	$ 1.465.962,95	29
429		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
430		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 5.055.044,65	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
431		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 15.165.133,97	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
432		**4**	**REDES HIDROSANITARAS, SECAS Y GAS**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**51%**	**$ 4.598.338,91**	**15,16**	**$ 2.754.999,35**	**9,08**
433		**5**	**Entrega del diseño definitivo de redes hidrosanitaria**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,99**	**86%**	**58%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 770.894,31**	**10,17**
434		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	61%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 770.894,31	61
435		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,17	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
436		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
437		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
438		**5**	**Entrega de diseño SUDS redes hidrosanitaria**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,99**	**86%**	**58%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 770.894,31**	**10,17**
439		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	61%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 770.894,31	61

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
440		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,17	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
441		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
442		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
443		**5**	**Entrega del diseño definitivo de redes secas**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,98**	**86%**	**45%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 606.605,36**	**8**
444		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	48%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 606.605,36	48
445		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
446		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
447		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
448		**5**	**Entrega de Apéndice construcción redes secas**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,98**	**86%**	**45%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 606.605,36**	**8**
449		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	48%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 606.605,36	48
450		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
451		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
452		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
453		**4**	**ESTRUCTURAS**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**0%**	**$ 4.598.338,91**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
454		**5**	**Entrega de Intervencio**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,99**	**86%**	**0%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
455		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	0%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 0,00	0
456		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,17	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
457		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
458		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
459		**5**	**Entrega de Diseño estructural**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,99**	**86%**	**0%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
460		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	0%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 0,00	0
461		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,17	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
462		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
463		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
464		**5**	**Entrega de planos**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,98**	**86%**	**0%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
465		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	0%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 0,00	0
466		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
467		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
468		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
469		**5**	**Entrega de memorias de calculo**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,98**	**86%**	**0%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
470		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	0%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 0,00	0
471		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
472		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
473		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
474		**4**	**ARQUEOLOGÍA**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**70%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 3.740.733,05**	**12,33**
475		**5**	**Entrega de Prospección arqueológica**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,94**	**86%**	**70%**	**$ 4.598.338,89**	**15,16**	**$ 3.740.733,05**	**12,33**
476		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 5.055.044,66	91%	74%	$ 4.598.338,89	90,97	$ 3.740.733,05	74
477		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
478		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 5.055.044,65	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
479		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 15.165.133,97	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
480		**4**	**PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,95**	**86%**	**0%**	**$ 4.598.338,90**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
481		**5**	**Entrega de presupuesto general definitivo en su versión No. 2**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 15.165.133,97**	**86%**	**0%**	**$ 2.299.169,45**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
482		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 2.527.522,33	91%	0%	$ 2.299.169,45	90,97	$ 0,00	0
483		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
484		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
485		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 7.582.566,98	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
486		**5**	**Entega de Cronograma definitivo de obra**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 15.165.133,98**	**86%**	**0%**	**$ 2.299.169,46**	**15,16**	**$ 0,00**	**0**
487		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 2.527.522,34	91%	0%	$ 2.299.169,46	90,97	$ 0,00	0
488		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
489		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
490		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 7.582.566,98	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
491		**4**	**GEOTÉCNICO**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,95**	**86%**	**12%**	**$ 4.598.338,91**	**15,16**	**$ 657.155,81**	**2,17**

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
492		**5**	**Entrega de exploración**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,99**	**86%**	**12%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 164.288,95**	**2,17**
493		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	13%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 164.288,95	13
494		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,17	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
495		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
496		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
497		**5**	**Entega informe de avance 1**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,99**	**86%**	**12%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 164.288,95**	**2,17**
498		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	13%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 164.288,95	13
499		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,17	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
500		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
501		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
502		**5**	**Entega informe de avance 2**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,99**	**86%**	**12%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 164.288,95**	**2,17**
503		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	13%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 164.288,95	13
504		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,17	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
505		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
506		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
507		**5**	**Entrega de Estudios Definitivos**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 7.582.566,98**	**86%**	**12%**	**$ 1.149.584,73**	**15,16**	**$ 164.288,95**	**2,17**
508		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.263.761,17	91%	13%	$ 1.149.584,73	90,97	$ 164.288,95	13
509		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
510		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.263.761,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
511		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 3.791.283,49	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
512		**4**	**BIM**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,95**	**86%**	**12%**	**$ 4.598.338,90**	**15,16**	**$ 657.155,81**	**2,17**
513		**5**	**Modelos BIM de diseño por componente**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,32**	**86%**	**12%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 219.051,94**	**2,17**
514		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	13%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 219.051,94	13
515		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
516		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
517		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
518		**5**	**Modelo federado / coordinación interdisciplinaria**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,32**	**86%**	**12%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 219.051,94**	**2,17**
519		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	13%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 219.051,94	13
520		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
521		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
522		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
523		**5**	**Gestión de información**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 10.110.089,31**	**86%**	**12%**	**$ 1.532.779,63**	**15,16**	**$ 219.051,94**	**2,17**
524		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 1.685.014,89	91%	13%	$ 1.532.779,63	90,97	$ 219.051,94	13
525		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
526		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 1.685.014,88	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
527		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 5.055.044,66	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
528		**4**	**SOCIAL**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,95**	**94%**	**94%**	**$ 4.598.338,92**	**15,16**	**$ 5.055.044,69**	**16,67**
529		**5**	**Atención y funcionamiento del punto de atención a la ciudadanía - PAC (volantes informativos - punto PAC)**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 5.055.044,66**	**94%**	**94%**	**$ 766.389,82**	**15,16**	**$ 842.507,45**	**16,67**
530		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 842.507,45	100%	100%	$ 766.389,82	90,97	$ 842.507,45	100
531		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
532		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
533		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
534		**5**	**Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana por intervención.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 5.055.044,66**	**94%**	**94%**	**$ 766.389,82**	**15,16**	**$ 842.507,45**	**16,67**
535		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 842.507,45	100%	100%	$ 766.389,82	90,97	$ 842.507,45	100
536		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
537		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
538		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
539		**5**	**Conformación y funcionamiento del Comité Mi Hábitat.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 5.055.044,66**	**94%**	**94%**	**$ 766.389,82**	**15,16**	**$ 842.507,45**	**16,67**
540		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 842.507,45	100%	100%	$ 766.389,82	90,97	$ 842.507,45	100
541		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
542		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
543		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
544		**5**	**Documento caracterización social**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 5.055.044,66**	**94%**	**94%**	**$ 766.389,82**	**15,16**	**$ 842.507,45**	**16,67**
545		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 842.507,45	100%	100%	$ 766.389,82	90,97	$ 842.507,45	100
546		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
547		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
548		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
549		**5**	**Recorrido de reconocimiento y verificación territorial**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 5.055.044,66**	**94%**	**94%**	**$ 766.389,82**	**15,16**	**$ 842.507,45**	**16,67**
550		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 842.507,45	100%	100%	$ 766.389,82	90,97	$ 842.507,45	100
551		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
552		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
553		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
554		**5**	**Seguimiento social de la Fase 2**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 5.055.044,65**	**94%**	**94%**	**$ 766.389,81**	**15,16**	**$ 842.507,44**	**16,67**
555		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 842.507,44	100%	100%	$ 766.389,81	90,97	$ 842.507,44	100
556		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
557		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 842.507,44	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
558		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 2.527.522,33	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
559		**4**	**AMBIENTAL, SST Y FORESTAL**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 30.330.267,95**	**89%**	**71%**	**$ 4.598.338,90**	**15,16**	**$ 3.813.750,37**	**12,57**
560		**5**	**Diligenciamiento Matriz de aspectos e impactos ambientales.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,78**	**86%**	**55%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 325.769,55**	**9,67**
561		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	91%	58%	$ 510.926,54	90,97	$ 325.769,55	58
562		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
563		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
564		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
565		**5**	**Programa de Manejo Ambiental de RCD**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,78**	**94%**	**94%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 561.671,63**	**16,67**
566		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	100%	100%	$ 510.926,54	90,97	$ 561.671,63	100
567		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
568		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
569		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
570		**5**	**Manejo ambiental de obra - mao**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,77**	**86%**	**58%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 342.619,69**	**10,17**
571		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	91%	61%	$ 510.926,54	90,97	$ 342.619,69	61
572		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
573		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,62	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
574		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
575		**5**	**Elaboración cronogramas de implementación y capacitación**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,77**	**86%**	**45%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 269.602,38**	**8**
576		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	91%	48%	$ 510.926,54	90,97	$ 269.602,38	48
577		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
578		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,62	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
579		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
580		**5**	**Censo e Inventario Forestal al 100 %**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,77**	**94%**	**94%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 561.671,63**	**16,67**
581		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	100%	100%	$ 510.926,54	90,97	$ 561.671,63	100
582		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
583		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,62	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
584		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
585		**5**	**Diagnóstico preliminar Forestal y de Fauna**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,77**	**94%**	**94%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 561.671,63**	**16,67**
586		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	100%	100%	$ 510.926,54	90,97	$ 561.671,63	100
587		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
588		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,62	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
589		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
590		**5**	**Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SG SST.**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,77**	**86%**	**58%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 342.619,69**	**10,17**
591		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	91%	61%	$ 510.926,54	90,97	$ 342.619,69	61
592		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
593		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,62	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
594		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
595		**5**	**Gestión del riesgo, emergencias y bioseguridad**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,77**	**86%**	**58%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 342.619,69**	**10,17**
596		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	91%	61%	$ 510.926,54	90,97	$ 342.619,69	61
597		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
598		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,62	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
599		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
600		**5**	**Seguimiento Fase 2**	**107 días**	**vie 10/04/26**	**vie 18/09/26**	**$ 3.370.029,77**	**86%**	**85%**	**$ 510.926,54**	**15,16**	**$ 505.504,47**	**15**
601		6	Entrega	101 días	vie 10/04/26	jue 10/09/26	$ 561.671,63	91%	90%	$ 510.926,54	90,97	$ 505.504,47	90
602		6	Revisión	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 561.671,63	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
603		6	Subsanación	2 días	mié 16/09/26	jue 17/09/26	$ 561.671,62	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
604		6	Aprobación	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 1.685.014,89	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
605		4	**INFORME DE CIERRE FASE 2**	**0 días**	**vie 18/09/26**	**vie 18/09/26**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
606		4	**CIERRE FASE 2**	**0 días**	**lun 21/09/26**	**lun 21/09/26**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
607		**3**	**FASE 3 - APROBACIONES Y ALISTAMIENTO**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 264.454.921,82**	**53%**	**12%**	**$ 63.615.938,49**	**24,06**	**$ 9.255.922,26**	**3,5**
608		**4**	**GESTIÓN NORMATIVA Y TRÁMITES ANTE ENTIDADES**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**8%**	**$ 2.893.649,59**	**17,51**	**$ 550.947,75**	**3,33**
609		**5**	**Seguimiento a permisos, vistos buenos y aprobaciones.**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 5.509.477,53**	**52%**	**12%**	**$ 1.829.318,71**	**33,2**	**$ 413.210,81**	**7,5**
610		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 2.754.738,76	66%	15%	$ 1.829.318,71	66,41	$ 413.210,81	15
611		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
612		**5**	**Informe de avances y gestiones realizadas.**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 5.509.477,54**	**52%**	**0%**	**$ 532.165,44**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
613		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 918.246,25	58%	0%	$ 532.165,44	57,95	$ 0,00	0
614		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 918.246,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
615		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 918.246,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
616		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
617		**5**	**Expediente final de radicados, respuestas y aprobaciones.**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 5.509.477,54**	**52%**	**14%**	**$ 532.165,44**	**9,66**	**$ 137.736,94**	**2,5**
618		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 918.246,25	58%	15%	$ 532.165,44	57,95	$ 137.736,94	15
619		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 918.246,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
620		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 918.246,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
621		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
622		**4**	**MOVIMIENTOS DE MASA**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**90%**	**$ 1.596.496,33**	**9,66**	**$ 2.754.738,77**	**16,67**
623		**5**	**Radicación del estudio final ante el IDIGER.**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**90%**	**$ 1.596.496,33**	**9,66**	**$ 2.754.738,77**	**16,67**
624		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 2.754.738,77	58%	100%	$ 1.596.496,33	57,95	$ 2.754.738,77	100
625		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
626		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
627		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
628		**4**	**AVENIDAS TORRENCIALES**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**90%**	**$ 1.596.496,33**	**9,66**	**$ 2.754.738,77**	**16,67**
629		**5**	**Radicación del estudio final ante el IDIGER.**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**90%**	**$ 1.596.496,33**	**9,66**	**$ 2.754.738,77**	**16,67**
630		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 2.754.738,77	58%	100%	$ 1.596.496,33	57,95	$ 2.754.738,77	100
631		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
632		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
633		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
634		**4**	**INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**90%**	**$ 1.596.496,33**	**9,66**	**$ 2.754.738,77**	**16,67**
635		**5**	**Radicación del estudio final ante el IDIGER.**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**90%**	**$ 1.596.496,33**	**9,66**	**$ 2.754.738,77**	**16,67**
636		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 2.754.738,77	58%	100%	$ 1.596.496,33	57,95	$ 2.754.738,77	100
637		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
638		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
639		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
640		**4**	**TOPOGRÁFICO Y SIG (MÁS CADENERO)**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
641		**5**	**Ajustes Finales, Compilación de Aprobaciones y Documentación Final**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
642		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 8.264.216,31	66%	0%	$ 5.487.956,14	66,41	$ 0,00	0
643		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
644		**4**	**ARQUITECTÓNICO**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
645		**5**	**Entrega del documento arquitectónico, urbano y paisajístico.**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
646		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 8.264.216,31	66%	0%	$ 5.487.956,14	66,41	$ 0,00	0
647		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
648		**4**	**COMPONENTE VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
649		**5**	**Aprobaciones Finales Vias, Transporte y Movilidad**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
650		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 8.264.216,31	66%	0%	$ 5.487.956,14	66,41	$ 0,00	0
651		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
652		**4**	**PAVIMENTO**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
653		**5**	**Aprobaciones Finales Pavimentos**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
654		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 8.264.216,31	66%	0%	$ 5.487.956,14	66,41	$ 0,00	0
655		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
656		**4**	**REDES HIDROSANITARAS, SECAS Y GAS**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
657		**5**	**Aprobaciones Finales redes hidrosanitarias**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 8.264.216,31**	**52%**	**0%**	**$ 2.743.978,07**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
658		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 4.132.108,16	66%	0%	$ 2.743.978,08	66,41	$ 0,00	0
659		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 4.132.108,15	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
660		**5**	**Aprobaciones Finales redes secas**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 8.264.216,30**	**52%**	**0%**	**$ 2.743.978,07**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
661		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 4.132.108,15	66%	0%	$ 2.743.978,07	66,41	$ 0,00	0
662		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 4.132.108,15	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
663		**4**	**ESTRUCTURAS**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
664		**5**	**Ajustes Finales, Compilación de Aprobaciones y Documentación Final**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,61**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
665		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 8.264.216,31	66%	0%	$ 5.487.956,14	66,41	$ 0,00	0
666		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
667		**4**	**ARQUEOLOGÍA**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**52%**	**0%**	**$ 1.596.496,33**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
668		**5**	**Ejecución PMA**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**52%**	**0%**	**$ 1.596.496,33**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
669		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 2.754.738,77	58%	0%	$ 1.596.496,33	57,95	$ 0,00	0
670		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
671		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 2.754.738,78	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
672		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,30	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
673		**4**	**PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
674		**5**	**Aprobaciones Finales costos, y programación**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
675		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 8.264.216,31	66%	0%	$ 5.487.956,14	66,41	$ 0,00	0
676		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,31	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
677		**4**	**GEOTÉCNICO**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
678		**5**	**Ajustes Finales, Compilación de Aprobaciones y Documentación Final**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**52%**	**0%**	**$ 5.487.956,14**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
679		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 8.264.216,31	66%	0%	$ 5.487.956,14	66,41	$ 0,00	0
680		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 8.264.216,31	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
681		**4**	**BIM**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**52%**	**0%**	**$ 1.596.496,34**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
682		**5**	**Control de calidadd**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 8.264.216,31**	**52%**	**0%**	**$ 798.248,17**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
683		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 1.377.369,39	58%	0%	$ 798.248,17	57,95	$ 0,00	0
684		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 1.377.369,38	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
685		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 1.377.369,38	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
686		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 4.132.108,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
687		**5**	**Entregables finales BIM**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 8.264.216,31**	**52%**	**0%**	**$ 798.248,17**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**

Id	Modo de tarea	Nivel de esqu	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	PROGRAMADO	% completado	CPTP	% programado	Costo real	% EJECUTADO
688		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 1.377.369,39	58%	0%	$ 798.248,17	57,95	$ 0,00	0
689		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 1.377.369,38	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
690		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 1.377.369,38	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
691		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 4.132.108,16	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
692		**4**	**SOCIAL**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**56%**	**0%**	**$ 4.645.355,21**	**28,11**	**$ 0,00**	**0**
693		**5**	**Implementación y funcionamiento del Punto de Atención a la Ciudadanía – PAC.**	**8 días**	**vie 10/07/26**	**jue 23/07/26**	**$ 3.305.686,53**	**100%**	**0%**	**$ 3.305.686,53**	**100**	**$ 0,00**	**0**
694		6	Entrega	2 días	vie 10/07/26	mar 14/07/26	$ 550.947,76	100%	0%	$ 550.947,76	100	$ 0,00	0
695		6	Revisión	3 días	mié 15/07/26	vie 17/07/26	$ 550.947,76	100%	0%	$ 550.947,76	100	$ 0,00	0
696		6	Subsanación	2 días	mar 21/07/26	mié 22/07/26	$ 550.947,75	100%	0%	$ 550.947,75	100	$ 0,00	0
697		6	Aprobación	1 día	jue 23/07/26	jue 23/07/26	$ 1.652.843,26	100%	0%	$ 1.652.843,26	100	$ 0,00	0
698		**5**	**Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana por intervención.**	**52 días**	**vie 10/07/26**	**vie 25/09/26**	**$ 3.305.686,53**	**61%**	**0%**	**$ 381.770,87**	**11,55**	**$ 0,00**	**0**
699		6	Entrega	46 días	vie 10/07/26	jue 17/09/26	$ 550.947,76	69%	0%	$ 381.770,87	69,29	$ 0,00	0
700		6	Revisión	3 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26	$ 550.947,76	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
701		6	Subsanación	2 días	mié 23/09/26	jue 24/09/26	$ 550.947,75	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
702		6	Aprobación	1 día	vie 25/09/26	vie 25/09/26	$ 1.652.843,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
703		**5**	**Conformación y funcionamiento del Comité Mi Hábitat.**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 3.305.686,52**	**52%**	**0%**	**$ 319.299,27**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
704		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 550.947,76	58%	0%	$ 319.299,27	57,95	$ 0,00	0
705		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 550.947,75	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
706		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 550.947,75	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
707		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 1.652.843,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
708		**5**	**Matriz de actores, potencialidades, retos y oportunidades por intervención**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 3.305.686,52**	**52%**	**0%**	**$ 319.299,27**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
709		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 550.947,76	58%	0%	$ 319.299,27	57,95	$ 0,00	0
710		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 550.947,75	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
711		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 550.947,75	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
712		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 1.652.843,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
713		**5**	**Seguimiento social de la Fase 3**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 3.305.686,52**	**52%**	**0%**	**$ 319.299,27**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
714		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 550.947,76	58%	0%	$ 319.299,27	57,95	$ 0,00	0
715		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 550.947,75	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
716		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 550.947,75	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
717		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 1.652.843,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
718		**4**	**AMBIENTAL, SST Y FORESTAL**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 16.528.432,62**	**52%**	**4%**	**$ 4.190.802,88**	**25,36**	**$ 440.758,20**	**2,67**
719		**5**	**Aprobación de documentos definitivos Ambiental–SST**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 5.509.477,54**	**52%**	**13%**	**$ 1.829.318,71**	**33,2**	**$ 440.758,20**	**8**
720		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 2.754.738,77	66%	16%	$ 1.829.318,71	66,41	$ 440.758,20	16
721		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
722		**5**	**Documentos técnicos Ambientales para construcción**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 5.509.477,54**	**52%**	**0%**	**$ 1.829.318,71**	**33,2**	**$ 0,00**	**0**
723		6	Entrega	48 días	vie 10/07/26	lun 21/09/26	$ 2.754.738,77	66%	0%	$ 1.829.318,71	66,41	$ 0,00	0
724		6	Aprobación	13 días	mar 22/09/26	jue 8/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
725		**5**	**Seguimiento Fase 3**	**61 días**	**vie 10/07/26**	**jue 8/10/26**	**$ 5.509.477,54**	**52%**	**0%**	**$ 532.165,45**	**9,66**	**$ 0,00**	**0**
726		6	Entrega	55 días	vie 10/07/26	mié 30/09/26	$ 918.246,26	58%	0%	$ 532.165,45	57,95	$ 0,00	0
727		6	Revisión	3 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	$ 918.246,26	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
728		6	Subsanación	2 días	mar 6/10/26	mié 7/10/26	$ 918.246,25	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
729		6	Aprobación	1 día	jue 8/10/26	jue 8/10/26	$ 2.754.738,77	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
730		4	**INFORME DE CIERRE FASE 3**	**0 días**	**jue 8/10/26**	**jue 8/10/26**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
731		4	**CIERRE FASE 3**	**0 días**	**jue 8/10/26**	**jue 8/10/26**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
732		3	**CIERRE ETAPA 1**	**0 días**	**jue 8/10/26**	**jue 8/10/26**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
733		**2**	**ETAPA 2**	**260 días**	**vie 9/10/26**	**vie 8/10/27**	**$ 14.208.421.670,00**	**0%**	**0%**	**$ 0,00**	**0**	**$ 0,00**	**0**
734		3	Frentes de trabajos	260 días	vie 9/10/26	vie 8/10/27	$ 14.208.421.670,00	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
735		3	Acta de finalizacion del proyecto	0 días	vie 8/10/27	vie 8/10/27	$ 0,00	0%	0%	$ 0,00	0	$ 0,00	0
