HABITAT343-GER-071-26 - REMISIÓN INFORME SEMANAL No 27

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2026-44994
Fecha: 2026-08-20 08:17:20
Anexos: 2 ADJUNTOS Folios: 1
Asunto: EMAIL - CONREVITALIZATUESPACIO/HABITAT34
Destino: SUB.INTERVENCIONES
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

From: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO <consorciorevitalizatuespacio@gmail.com> 8/19/2
To: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Diego Oliveros <diego.oliveros@habitatbogota.gov.co>, Eveli <evelin.pena@habitatbogota.gov.co>, Laura Mantilla Villa <laura.mantilla@habitatbogota.gov.co>
Cc: Angela Maria Ramirez <angela.ramirez@grupoarca.com.co>, Alfredo Moncada <alfredo.moncada@grupoarca.com.co>, Diana Monroy <diana.monroy@grupoarca.com.co>, Juan Alejandro Cardona Romero <juan.cardona@grupoarca.com.co>

Señores:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Arq Camilo Torres

Director de Operaciones

Bogotá D. C.

REFERENCIA: CONTRATO 1266-2025- GRUPO 1: **" REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-GRUPO 1"**

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL No 27

Cordialmente,

--

COORDINACIÓN TÉCNICA
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO
AV. CARRERA 28 No. 37 — 56 BOGOTÁ D.C.
TEL: 4721130-7048874-7040057 Cel 310 2144320
consorciorevitalizatuespacio@gmail.com

Bogotá D.C. 19 de agosto de 2026

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Arq Camilo Torres
Director de Operaciones
Bogotá D. C.
Correo: diego.oliveros@habitatbogota.gov.co

REFERENCIA: HABITAT 1266-2025- GRUPO 1: "REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-GRUPO 1".

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL No 27

Respetados Señores,

Para su revisión y fines pertinentes, conforme con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el Informe Semanal de Interventoría No. 27, correspondiente al periodo del 10 de julio al 16 de agosto de 2026.

Agradecemos de antemano la atención prestada, y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ÁNGELA MARIA RAMIREZ SALGADO
Directora Interventoría
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

Anexo: Informe semanal No 27

BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	19/8/2026	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**10/8/2026**	AL	**16/8/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA Interventoría INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT – LOTES/GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 – GRUPO 1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y NOMBRE DEL POLÍGONO	No 1. Polígono De Revitalización (PR) Usaquén / Toberín No 2. Polígono De Revitalización (PR) Britalia No 3. Polígono De Revitalización (PR) Engativá
PROYECTO DE INVERSIÓN	7883: Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá D.C.

CONTRATO DE Interventoría			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	1325 de 2025		CONTRATO No.:	1266 de 2025	
PLAZO INICIAL:	20 meses		PLAZO INICIAL:	20 meses	
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de febrero de 2026		FECHA DE	9 de febrero de 2026	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	-		**FECHA DE	-	
**FECHA DE REINICIO	-		**FECHA DE	-	
PRORROGA			PRORROGA		
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de octubre de 2027		FECHA DE	8 de octubre de 2027	
PRORROGA			PRORROGA		
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de octubre de 2027		FECHA DE	8 de octubre de 2027	
PLAZO ACTUALIZADO:	606		PLAZO	606	
PLAZO TRANSCURRIDO:	188 EQUIVALE AL	31%	PLAZO	188 EQUIVALE AL	31%
VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$ 1.615.307.812,00		VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$ 13.039.072.632,00	
VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$ 1.615.307.812,00		VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$ 13.039.072.632,00	
VALOR ANTICIPO	$ -		VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR AMORTIZADO	$ -		VALOR AMORTIZADO	$ -	
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -		VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.615.307.812,00		VALOR	$ 13.039.072.632,00	
PAGO No. 1	$ 10.078.952,00		PAGO No. 1	$ 147.674.814,00	
PAGO No. 2	$ 13.744.025,00		PAGO No. 2	$ -	
PAGO No. 3	$ 36.650.733,00		PAGO No. 3	$ -	
PAGO No. 4	$ 13.744.025,00		PAGO No. 4	$ -	
PAGO No. 5	$ 13.744.025,00		PAGO No. 5	$ -	
VALOR PAGADO:	**$ 87.961.760,00**		**VALOR PAGADO:**	**$ 147.674.814,00**	
VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	-		VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	$ -	
VALOR POR PAGAR:	$ 1.527.346.052,00		VALOR POR PAGAR:	$ 12.891.397.818,00	
% FINANCIERO PAGADO	5,45%		% FINANCIERO	1,13%	
LÍDER:	*ANGELA MARIA RAMIREZ SALGADO*		SUPERVISOR:	*Director de Operaciones: CAMILO TORRES*	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, prórrogas y pagos.

2. CONTROL DE HITOS.


ÍTEM	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN CONTRATO			
	ACTA DE INICIO CONTRATO	09-02-26		
	LEGALIZACIÓN ACTA DE INICIO			
	Entrega de los documentos de ingreso para aprobación del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1	10-02-26	10-02-26	0
	Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 1.	16-02-26	13-02-26	0
	Inicio del trámite de verificación y armonización de intervenciones en las zonas de influencia del proyecto por parte de entidades del orden Distrital y/o Nacional, según aplique.	18-02-26	17-02-26	0
	ETAPA 1 - FASE 1	09-02-26		
	Entrega del Informe topográfico de la Fase 1 de la Etapa 1 con sus respectivos anexos.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de la metodología de diseño del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del Informe de recopilación y análisis de información del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de la metodología de elaboración de estudios de tránsito y movilidad.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del Informe de recopilación y análisis de información del componente de vías, transporte y movilidad.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los informes preliminares y los documentos técnicos de soporte del componente hidrosanitario	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del informe de inspección de redes del componente hidrosanitario	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los informes preliminares y los documentos técnicos de soporte de redes secas y de gas.	02-04-26	30-03-26	0
	Entrega del documento con el Diagnóstico Arqueológico.	02-04-26	26-03-26	0
	Entrega de las cantidades estimadas, los precios vigentes soportados y el presupuesto general desglosado por componentes técnicos en su	02-04-26	01-04-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente geotécnico.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente de pavimentos.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente Ambiental y SST.	02-04-26	30-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente Social.	02-04-26	24-03-26	0
	FINALIZACIÓN FASE 1_ ETAPA 1	08-04-26	08-04-26	0
	ETAPA 1 - FASE 2	09-04-26	09-04-26	0
	Entrega del informe de avance a las consultas realizadas a entidades y la matriz de trazabilidad. – Apéndice 02.	01-07-26	09-04-26	0
	Entrega del Informe topográfico de la Fase 2 de la Etapa 1 con sus respectivos anexos.	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega del esquema general del proyecto del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	08-05-26	03-07-26	0
	Entrega del Estudio de Tránsito y movilidad	08-05-26	08-05-26	0
	Entrega del cálculo del Tránsito Promedio Diario (TPD)	08-05-26	08-05-26	0
	Entrega de los diseños de señalización	01-07-26	08-05-26	0
	Entrega del informe técnico definitivo de la geometría vial	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega del diseño definitivo de redes hidrosanitarias y/o estructuras hidráulicas	01-07-26	26-06-26	0
	Entrega del diseño definitivo de Tipología de SUDS.	01-07-26	03-07-26	0
	Entrega de los Documentos Técnicos definitivos de redes secas y de gas.	01-07-26	26-06-26	0
	Entrega del documento técnico de soporte definitivo con todos los componentes de diseño incluidos en el alcance del proceso – Apéndice 07.	01-07-26	30-06-26	0
	Entrega del documento técnico de soporte definitivo para el componente de estructuras.	01-07-26	03-07-26	0
	Entrega del documento con la Prospección Arqueológica.	01-07-26	26-06-26	0
	Entrega de las cantidades estimadas, los Análisis de Precios Unitarios (APUs) y el presupuesto total para la ejecución de la obra en su versión	01-07-26	30-07-26	0
	Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 2. (Alistamiento y Obra).	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente geotécnico.	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente Social.	01-07-26	08-07-26	0

BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	19/8/2026	PERIODO No.	27	DEL	10/8/2026	AL	16/8/2026

	Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente de pavimentos	01-07-26	23-06-26	0
	Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente Ambiental y SST.	01-07-26	03-07-26	0
	FINALIZACIÓN FASE 2_ ETAPA 1	08-07-26		0
	ETAPA 1 - FASE 3	09-07-26		0
	Entrega de las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 2	16-07-26	15-07-26	1
	Entrega del informe definitivo con las consultas realizadas a entidades y la matriz de trazabilidad - Apéndice 02.	29-09-26		En proceso
	Entrega del documento técnico de soporte final del componente arquitectónico, urbano y paisajístico Apéndice 04.	29-09-26		En proceso
	Entrega de informe con las aprobaciones de la SDM	29-09-26		En proceso
	Entrega de la No objeción de la Intervención, por parte de la EAAB.	29-09-26		En proceso
	Entrega de las aprobaciones de Fotometría (UAESP) y Factibilidad (Enel – Codensa) de redes eléctricas.	29-09-26		En proceso
	Entrega del documento que contemple el informe Final de las actividades de Prospección Arqueológica y la propuesta de Plan de Manejo	29-09-26		En proceso
	Entrega de las cantidades estimadas, los Análisis de Precios Unitarios (APUs) y el presupuesto total para la ejecución de la obra en su versión	29-09-26		En proceso
	Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 2, versión definitiva. (Obra)	29-09-26		En proceso
	Entrega del Plan de compras de la Etapa 2, versión definitiva. (Obra)	29-09-26		En proceso
	Entrega de los productos de la fase de aprobaciones del componente geotécnico.	29-09-26		En proceso
	Entrega, complementación y ajuste de los diseños definitivos del componente de pavimentos.	29-09-26		En proceso
	Entrega, complementación y ajuste de los diseños definitivos del componente Ambiental y SST.	29-09-26		En proceso
	FINALIZACIÓN FASE 2_ ETAPA 1	08-10-26		En proceso
Plazo del proyecto en días		606		

3. CURVA "S" SEGUIMIENTO SEMANAL GENERAL

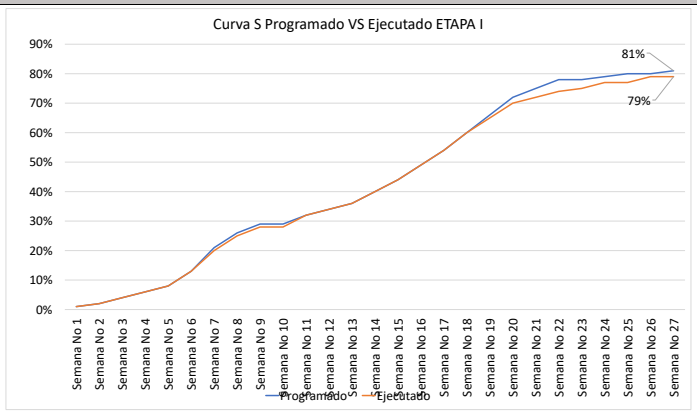

Porcentajes de avance a corte del 17 de agosto de 2026, correspondientes al consolidado para la Etapa 1. Se completó el 100% de avance de la Fase 1, se tiene para la Fase 2, un avance ejecutado del 98%, respecto al 100% programado, y se tiene para la fase 3 un avance ejecutado del 12%, respecto al 16% programado

Total etapa 1 acumulado:
Programado: 81%
Ejecutado: 79%
Diferencia: 2%

Total Fase 2 de la Etapa 1:
Programado: 100%
Ejecutado: 98%
Diferencia: 2%

Total Fase 3 de la Etapa 1:
Programado: 16%
Ejecutado: 12%
Diferencia: 4%

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

A la fecha no se han identificado situaciones problemáticas

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
No aplica para el periodo		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica para el periodo del presente informe

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

Actividades Técnicas:

Durante el presente periodo, se realizaron las siguientes actividades:

- El 10-08-2026 el contratista hace la entrega a la Interventoría, del informe mensual de junio por medio del comunicado No POL2026-216-2026.
- El 11-08-2026, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo con la EAAB en Zona 2, con el ing. José Eduardo González Corredor. En la reunión, el Contratista presentó la propuesta de intervención en el sector Quirigua, que incluye el diseño de un SUDS (Jardín de Bioretención). Al respecto, la Entidad solicito concretar el diseño de la conexión de drenaje del SUDS hacia el pozo PMCI130990 del sistema pluvial, sobre el cual se debe realizar el estado y presentar el análisis estructural de la conexión a realizar. Se requiere presentar diseño de drenajes en zona de pacificación frente al Colegio, y realizar apiques durante la construcción para evitar daños en el acueducto existente bajo la zona de andén en la carrera 92.
- El 12-08-2026 la interventoría envió el comunicado No HABITAT343-GER-068-26 a la SDHT con la entrega del informe semanal No 26 de interventoría.
- El 12-08-2026 atendiendo la solicitud de la SDHT se envían mediante correo electrónico, los últimos oficios remitidos al contratista con las observaciones de la Interventoría a los entregables de estudios y diseños de la Fase 2 de la Etapa 1.
- El 12-08-2026 el contratista remitió el comunicado No POL2026-217-2026 entregando las respuestas a las observaciones al diseño de señalización.
- El 13-08-2026 el contratista emite el comunicado No POL2026-219-2026 con la entrega del ajuste al componente de informe de metodologías, acorde a los requerimientos solicitados en mesa de trabajo del día 05 de agosto de 2026 con la SDM, en donde se solicitó tener en cuenta el concepto técnico SI-CT-002-2023 Versión 1.0 lineamientos para gestionar los estudios de tránsito y transporte (ETT) de instrumentos de malla vial.
- El 11-08-2026, se realizaron mesas de trabajo para presentar comentarios de interventoría a los diseños de pavimentos, geotecnia, redes y topografía.
- El 17-08-2026 se llevó a cabo mesa de trabajo para revisar diseños de paisajismo presentados.

En el siguiente cuadro se presenta el estado de las entregas correspondientes a la Fase 2 de la Etapa 1 del Contrato 1266 de 2025:

BOGOTÁ
Secretaría Distrital del Hábitat

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	19/8/2026	PERIODO No.	27	DEL	10/8/2026	AL	16/8/2026

ESTADO ENTREGAS ETAPA 1 - FASE 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS

ÍTEM	COMPONENTE	ENTREGA		OBSERVACIONES INTERVENTORÍA		ENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTO		OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (SEGUNDA ENTREGA	
		OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA
1.	Componente de topografía	POL2026-156-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-090-26	9-jul.-26	POL2026-183-2026	21-jul.-26	HABITAT343-TEC-119-26	5-ago.-26
2.	Componente de verificación normativa	POL2026-164-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-102-26	16-jul.-26	POL2026-201-2026	31-jul.-26	En revision	
3.	Componente de diseño arquitectónico y urbano	POL2026-154-2026	26-jun.-26	Mesa de trabajo	3-jul.-26	POL2026-185-2026 Urbanismo POL2026-213-2026	21/07/2026 09/08/2026	Mesa de trabajo HABITAT343-TEC-112-26 En revisión	23/07/2026 28/07/2026
	Paisajismo	POL2026-154-2026	26-jun.-26	Revisión de campo HABITAT343-TEC-095-26	7/07/2026 16/07/2026	POL2026-209-2026 POL2026-221-2026	6/08/2026 17/08/2026	Mesa de trabajo 17-08-2026 En revisión	
4.	Componente de vías, transporte y movilidad	POL2026-121-2026	11-may.-26	Mesa de trabajo	1-jul.-26				
	Estudio de Tránsito	POL2026-150-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-075-26	2-jul.-26	POL2026-181-2026	21-jul.-26	HABITAT343-TEC-120-26	31-jul.-26
	Diseño Geométrico	POL2026-149-2026 POL2026-166-2026	26/06/2026 08/07/2026	HABITAT343-TEC-086-26 HABITAT343-TEC-089-26	6/07/2026 9/07/2026	POL2026-187-2026 POL2026-212-2026	23/07/2026 9/08/2026	HABITAT343-TEC-105-26 HABITAT343-TEC-106-26 En revisión	24/07/2026 29/07/2026
	Señalización	POL2026-165-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-101-26	16/07/2026 03-08-2026	POL2026-217-2026	12-ago.-26	En revision	
5.	Componente de geotecnia	POL2026-167-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-100-26	16-jul.-26	POL2026-199-2026	31-jul.-26	Mesa de trabajo 11-08-2026	
6.	Componente de mitigación de riesgos	POL2026-159-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-097-26	16-jul.-26	POL2026-205-2026	4-ago.-26	En revisión	
7.	Componente de pavimentos	POL2026-161-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-096-26	16-jul.-26	POL2026-198-2026	31-jul.-26	Mesa de trabajo 11-08-2026	
8.	Componente de redes hidrosanitarias, secas y de gas								
	Informe Técnico Diseño SUDS	POL2026-150-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-076-26	3-jul.-26	POL2026-188-2026 POL2026-207-2026 POL2026-220-2026	23/07/2026 5/08/2026 18/8/2026	HABITAT343-TEC-106-26 Planimetría esquemática En revisión	24/07/2026
	Diseño Redes Hidrosanitarias	POL2026-160-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-093-26 HABITAT343-TEC-115-26 (Zona 1)	14/07/2026 29/07/2026	POL2026-215-2026	9-ago.-26	En revisión	
	Diseño Redes Secas	POL2026-157-2026	30-jun.-26	HABITAT343-TEC-082-26	3-jul.-26	POL2026-189-2026	27-jun.-26	HABITAT343-TEC-118-26	31-jul.-26
9.	Componente de estructuras	POL2026-152-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-078-26	3-jul.-26	POL2026-214-2026	9-ago.-26	En revisión	
10.	Componente de arqueología. Radicado en ICANH el 02-07-2026	POL2026-158-2026	30-jun.-26	HABITAT343-TEC-087-26 En espera comentarios	8-jul.-26	POL2026-189-2026 PMA	30-jul.-26	HABITAT343-TEC-117-26 Se aprueba PMA para radicar en el ICANH	31-jul.-26
11.	Componente BIM para la coordinación de los diseños y actividades de obra.	POL2026-169-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-103-26	16-jul.-26	POL2026-201-2026	31-jul.-26	En revision	
12.	Componente de presupuesto, programación y especificaciones técnicas para la construcción. para entrega el 30-06-2026	POL2026-168-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-099-26	16-ene.-00	POL2026-210-2026	10-ago.-26	Pendiente versión actualizada	
13.	Componente ambiental y SST								
	Entrega De Matriz De Identificación De Riesgos Y Evaluación De Peligros	POL2026-146-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-077-26	3-jul.-26	POL2026-186-2026 POL2026-195-2026 POL2026-206-2026	22/07/2026 30/07/2026 05/08/2026	HABITAT343-TEC-107-26 HABITAT343-TEC-123-26 Aprobación condicionada	27/07/2026 06/08/2026
	Entrega Final Manejo Ambiental De Obra Mao	POL2026-151-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-080-26	3-jul.-26	POL2026-184-2026 POL2026-219-2026	22/07/2026 13/08/2026	HABITAT343-TEC-107-26 En revisión	27-jul.-26
	Entrega Matriz De Aspectos E Impactos Ambientales	POL2026-153-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-081-26	3-jul.-26	POL2026-184-2026 POL2026-194-2026 POL2026-219-2026	22/07/2026 30/07/2026 13/08/2026	HABITAT343-TEC-107-26 HABITAT343-TEC-122-26 En revisión	27/07/2026 05/08/2026
	Entrega Inventrio Forestal	POL2026-155-2026	30-jun.-26	HABITAT343-TEC-079-26 mesa de trabajo 07-07-	3-jul.-26	POL2026-181-2026	21-jul.-26	HABITAT343-TEC-114-26	29-jul.-26
14.	Componente social y de participación ciudadana. Entregado el 26-06-2026 con POL2026-152-2026								
	Entrega Caracterización Social Final Y Matriz De Impactos	POL2026-118-2026	11-may.-26	HABITAT343-GER-061-26	12-may.-26	POL2026-200-2026	31-jul.-26	HABITAT343-TEC-126-26	14-ago.-26
	Identificación De Impactos Y Matriz De Impactos	POL2026-131-2026	8-may.-26	Remitido a SDHT con VB SDHT remite comentarios	6/07/2026 25/07/2026				
	Entrega Programa De Generación De Empleo	POL2026-142-2026	23-jun.-26	HABITAT343-TEC-074-26	1-jul.-26	POL2026-178-2026	14-jul.-26	Remitido a SDHT con VB	21-jul.-26

AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST

Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- El 12-08-2026 el contratista remitió el comunicado No POL2026-218-2026 entregando las respuestas a las observaciones del MAO y las observaciones matriz de aspectos e impactos ambientales.
- Desde el componente SST de la Interventoría se indica que fueron atendidas las observaciones por lo que se da visto bueno al documento. La información correspondiente al componente Ambiental del MAO y la Matriz de Aspectos E Impactos Ambientales, se encuentra en revisión de la Interventoría.
- Se encuentra pendiente la entrega por parte del Contratista del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Incluye protocolo de bioseguridad), atendiendo comentarios de la Interventoría.

AVANCE GESTIÓN SOCIAL

Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- El día viernes 14 de agosto, se llevó a cabo reunión de seguimiento social entre profesionales sociales de SDHT y de interventoría.
- Teniendo en cuenta recepción de versión final de documentos de caracterización, se llevó a cabo revisión con remisión de observaciones a los documentos por polígono.
- Polígono Usaquén (Corredor comercial y del cuidado 8 F-G): De acuerdo a metodología recibida, la próxima reunión con Comité Mi Hábitat estaría programada para el jueves 20 de agosto, a las 4:00 p.m. Sin embargo, no se ha notificado a la comunidad
- Polígono Suba (Red Peatonal Calle 137 y Parque Vecinal San José): De acuerdo a metodología recibida, la próxima reunión con Comité Mi Hábitat estaría programada para el viernes 21 de agosto, a las 8:30 a.m. Sin embargo, no se ha notificado a la comunidad
- Polígono Engativá (Cruce Seguro Colegio Simón Bolívar Sede A): De acuerdo a metodología recibida, la próxima reunión con Comité Mi Hábitat estaría programada para el viernes 21 de agosto, a las 5:00 p.m. Sin embargo, no se ha notificado a la comunidad

BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	19/8/2026	**PERIODO No.**	**27**	DEL	**10/8/2026**	AL	**16/8/2026**

FOTO: COMITÉ DE SGUIMIENTO SOCIAL - 14 DE AGOSTO 2026



AVANCE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:


Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- El 13-08-2026 la interventoría radico la cuenta de cobro No 6 correspondiente a valor fijo del mes de junio.
- El 14-08-2026 la SDHT rechazó la radicación de la cuenta No 6 de interventoría debido a ajuste interno del sistema.

8. PMT

El 13-08-2026 el contratista emite el comunicado No POL2026-219-2026 con la entrega del ajuste al componente de informe de metodologías, acorde a los requerimientos solicitados en mesa de trabajo del día 05 de agosto de 2026 con la SDM, en donde se solicitó tener en cuenta el concepto técnico SI-CT-002-2023 Versión 1.0 lineamientos para gestionar los estudios de tránsito y transporte (ETT) de instrumentos de malla vial.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



MESA DE TRABAJO CON EAAN EN ZONA 2
SECTOR QUIRIGUA 15-08-2026



LABORES DE INSPECCIÓN PARA UBICACIÓN EN CAMPO DE POZO PMCI130990
SISTEMA PLUVIAL SECTOR QUIRIGUA 15-08-2026



LABORES DE INSPECCIÓN PARA UBICACIÓN EN CAMPO DE POZO PMCI130990
SISTEMA PLUVIAL SECTOR QUIRIGUA 15-08-2026

FIRMA DIRECTOR DE Interventoría
NOMBRE: ANGELA MARIA RAMIREZ SALGADO

FIRMA APOYO SUPERVISOR
NOMBRE APOYO SUPERVISOR: DIEGO FELIPE OLIVEROS PINEDA
