CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 3

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, ENERO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 3

Página: 1 de

DIA	15	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	3	DEL	27 DE DICIEMBRE	AL	3 DE ENERO 2024
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES				
ACTIVIDADES PRELIMINARES	100%	0,47%	Desminte de Bajante existente Desmonte de ventaneria Desmonte de Cabinas en axero inoxidabel Desmonte de estructura metalica Desmonte en angulo en peldaño de escalera Desmonte de cielo raso	Desmonte de ventaria; esta actividad no es clara en los planos y no estan idenficada la ventaria a desmontar. Desmonte de cabinas en acero inoxidable esta actividad no es clara en los planos. Las actividades exteriores no se han iniciado hasta no recibir la autorizacion de instalacion de cerramiento.
CAP 2. ACEROS			Ácero de 60.000psi Malla electrosoldada	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 3	ACUMULADO
	$ 6.550.417.531,15	SEMANAL	27.934.018,10	6.522.483.513,05		0,69%	1,29%
		% semanal	0,41%				
		ACUMULADO	30.067.564,90				
		% acumulado	0,47%				

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
MIERCOLES	4/01/2024	4	3	2	9,00
JUEVES	5/01/2024	4	3	2	9,00
VIERNES	6/01/2024	4	3	2	9,00
SABADO	7/01/2024	4	2	0	6,00
DOMINGO	8/01/2024	0	0	2	2,00
LUNES	9/01/2024	0	2	2	4,00
MARTES	10/01/2024	4	2	2	8,00
MIERCOLES	11/01/2024	4	2	2	8,00


PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	4/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	5/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	6/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	7/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	8/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	9/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	10/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	11/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	

NO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

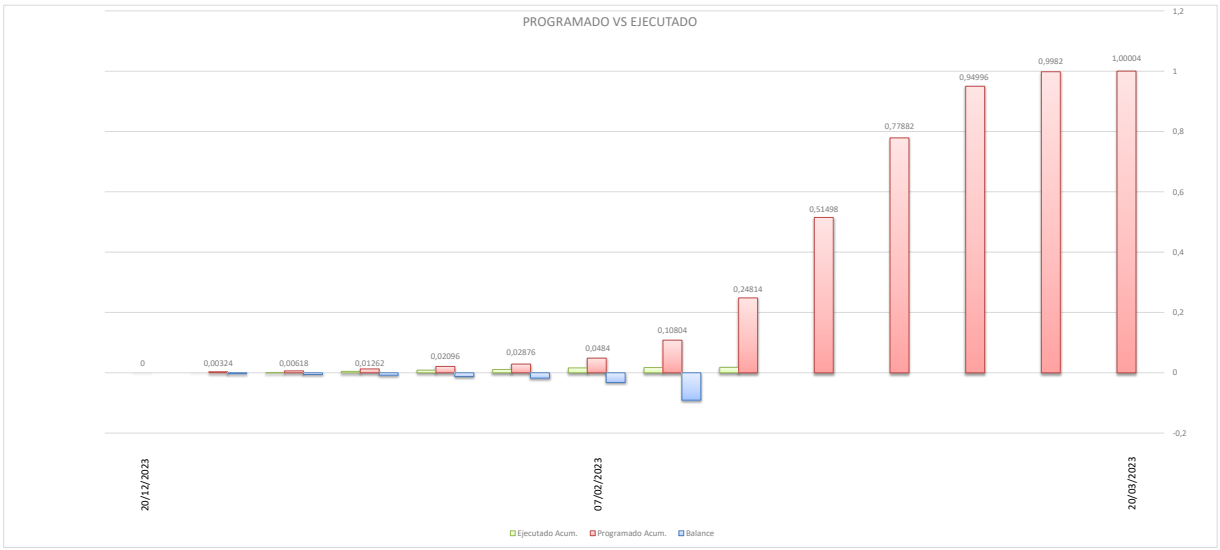

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fecha	20/12/2023	27/12/2023	3/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	7/02/2024	14/02/2024					20/03/2024
Progr. Semanal		0,32%	0,29%	0,64%	0,83%	0,78%	1,96%	5,96%	14,01%	26,68%	26,38%	17,11%	4,82%	0,18%
Programado Acum.	0%	0,32%	0,62%	1,26%	2,10%	2,88%	4,84%	10,80%	24,81%	51,50%	77,88%	95,00%	99,82%	100,00%
Ejec. Semanal		0,00%	0,41%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%					
Ejecutado Acum.		0,00%	0,47%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%					
Balance		-0,32%	-0,15%	-0,79%	-2,10%	-2,88%	-4,84%	-10,80%	-24,34%					

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 3

Página: 1 de

DIA	15	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	3	DEL	27 DE DICIEMBRE	AL	3 DE ENERO 2024

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Actividades en campo	4. Las actividades ejecutadas para este periodo son las siguientes: **CAPITULO PRELIMINARES** -Demolicion enchape de piso- 2 nivel -Demolición de mesones -Desmonte de aparatos sanitarios Desmonte puertas con marcos -Desmonte impermeabilización manto asfaltico -Desmonte piso de caucho -Desmolición de guardaescoba en mortero, concreto o ceramica -Desmonte silla Auditorio -Desmonte alfombra tráfico pesado -Desmonte de revestimiento en madera	Para este periodo el contratista de obra a dado inicio a actividades cuya programacion estaba estipulada para la primera semana de febrero, esto con el fin de contrasestar los atrasos ocasionados por la NO entrega total del espacio fisico. Fecha de entrega de espacio: 28 de diciembre de 2023 El dia 5 de enero se realiza comité de obra No.2 y en el orden del dia se enmarca lo siguiente: -.El entidad tiene como compromiso entregar aclaraciones frente a temas de diseño el dia 9 de enero a la interventoria, para posteriormente dar comunicado al contratista de obra. -El contratista de obra manifiesta que la entrega de la sede se realiza hasta el dia 28 de diciembre y que por lo tanto el retraso de obra no es atribuible a su falta de operatividad. -El contratista de obra solicita aprobacion para la instalacion del cerramiento y campamento de obra. -El contratista de obra manifiesta que tiene inquietudes frente a actividades que no se encuentran registradas en el presupuesto de obra y que son necesarios para el cumplimiento y el buen funcionamiento del teatro. -Se realizara de manera conjunta entre contratista de obra e interventoria, el listado de actividades que se requieren para el manejo de obra No Prevista.	
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Gestión de comunicaciones	COMITÉ DE OBRA No 3 - el 12 de enero. Se realizo solicitud ante la brigada 13 para la instalacion del cerramiento sobre la calla 106- no se realizo comité de obra		
Interventoría- Listado de personal	A la fecha se cuenta con el listado de personal emitido por esta interventoria y dirigido al basem		
Contratista-Listado de personal	Reporte de listado radicado por el contratista según datos informados a la inteventoria		
Gestion de comunicación-y cumplimiento de SGSST	Para este periodo el contratista de obra cuenta con 10 trabajadores operativos (1 maestro y nueve ayudantes) Adicionalmente se cuenta en campo con El Residente de obra, La Residente SST y el Director de obra en el área administrativa		
ASPECTOS FINANCIEROS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Anticipo-contratista de obra	al dia 3 de enero se ha realizado el deposito del anticipo por parte de la entidad contratante.		
ASPECTOS SST	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Charlas de Seguirdad	A la fecha no se realizan activiades por parte del contratista		
Documentación SST de contratista	A la fecha no se ha recibido por parte del contratista informacionde 2 personas		
Trabajos de alto riesgo	no se ha dado inicio a actividades de alturas		
ASPECTOS AMBIENTALES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Disposicion final	a la fecha no se han realizado actividades de demolicion ni desmonten que requieran disposicion final		
Punto ecologico	el contratista de obra no ha realizado la instalacion de los elementos ecologico		
Acopio material	a la fecha el contratista no ha realizado puntos de acopio		

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 3

Código:		**Versión:**	**Fecha de Emisión:**	**Página:**	
SEMANA N°	3 **DEL**	27 DE DICIEMBRE DE 2023	**AL**	3 DE ENERO 2024	
FECHA INICIO :	9/12/2020	**FECHA TERMINO :**	3/02/2021		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS - BIC**	**NIT O C.C.**	**860524168 8**	**CONTRATO N°**	**314**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901.759.617-0**	**CONTRATO N°**	**272**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





UBICACIÓN:	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**
ACTIVIDAD	Visita coronel villegas y coronel Sanchez,- revision de traslado de sillas auditorio	**ACTIVIDAD**	Acopio de elementos desmontados-silla-alfombra-puertas de madera- revestimiento de madera	**ACTIVIDAD**	Acopio de elementos desmontados-silla-alfombra-puertas de madera- revestimiento de madera








UBICACIÓN:	**wc camerinos 2 piso**	**UBICACIÓN:**	**Acceso auditorio-Nivel 1**	**UBICACIÓN:**	**Auditorio-Mezannine**
ACTIVIDAD	Desmonte de aparatos sanitarios	**ACTIVIDAD**	Desmonte piso laminado	**ACTIVIDAD**	Desmonte de alfombra









UBICACIÓN:	**Distribuidor 2 piso**	**UBICACIÓN:**	**Distribuidor**	**UBICACIÓN:**	**Terrazas de 2 piso**
ACTIVIDAD	Desmonte de puertas y marcos	**ACTIVIDAD**	Demolición de enchape de piso	**ACTIVIDAD**	Desmonte de Manto asfaltico




UBICACIÓN:	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**Tarima**	**UBICACIÓN:**	**Distribuidor 2 piso**
ACTIVIDAD	Desmonte de revestimiento en madera	**ACTIVIDAD**	Desmonte de Piso de caucho	**ACTIVIDAD**	Demolicion guarda escoba en concreto




UBICACIÓN:	**parqueadero**
ACTIVIDAD	Salida de llas desmontadas. Personal del Basem

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL					INFORME SEMANAL	
Código:		**Versión:**		**Fecha de Emisión:**		**Página:**
SEMANA N°	2	**DEL**	03 DE ENERO	**AL**	09 DE ENERO	
FECHA INICIO :	20/12/2023	**FECHA TERMINO :**	18 DE MARZO			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS**	**NIT O C.C.**	**860 524 16-8**	**CONTRATO N°**	**314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901 759 617 - 0**	**CONTRATO N°**	**272-CENANCINGENIEROS-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	AUDITORIO DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE ESPUMA INSTALADA EN PAREDES DEL AUDITORIO**



UBICACIÓN:	AUDITORIO DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE MADERA DE PAREDES DEL AUDITORIO**



UBICACIÓN:	AUDITORIO DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE MARCOS DE PUERTAS**



UBICACIÓN:	AUDITORIO TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE DESMONTE DE SANITARIOS Y MUEBLES DE LAVAMANOS.**



UBICACIÓN:	AUDITORIO DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE ALFOMBRA DESMONTADA DE PISOS Y PAREDES**



UBICACIÓN:	TERRAZA TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**DESMONTE DE MANTO ASFALTICO Y ACOPIO EN TERRAZAS**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL | | |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

30am 8 Enero de 2024 Clima: Soleado

Personal INT

- Ing SST Sobnyi Benavides.
- Arq. Alejandro Cepeda.

Personal de Obra.

- Arq. Jhonel. Rodriguez - Director de Obra.
- Herlin Montenegro - Almacenista.
- Jurs Muñoz - Ayudante.
- Leonardo Zapata - Ayudante.

• Actividades del Dia: Se da continuidad optimalización al desmonte de sillas auditorio.

·00am • Ingresa coronel Villegas, y Sanchez para la revisión del espacio (cafeteria) donde se estan ubicando las sillas desmontadas. El Ing. Solicito permiso para dejar las frente a la cafeteria mientras encuentran un espacio acorde para trasbordar. Esta interventoria informa que es de importancia realizar la Salida total de las sillas para poder dar continuidad a las actividades de desmonte de alfombras. adicionalmente, se solicito tener cuidado con el piso de madera ya que se estan arrastrando los elementos y podrian ocacionarle (pisos) daños al piso y al cual solo se le debe realizar un mantenimiento.

·30 am. Se da inicio al Desmonte de alfombra del auditorio. Sector Oriental - Nose puede continuar la actividad ya que no se ha realizado el retiro de las sillas. por parte de la entidad.

Dpm. Se da inicio a la actividad de desmonte de Rieles con marco. - Se revisa conteo de unidades y se verifica en. Sitio.

Desde el área SGSTA se solicito al contratista el uso de tapabocas, gafas y guantes, ya que iniciaron con el desmonte de la alfombra y por salud de los trabajadores y evitar enfermedades respiratorias, es importante el uso de los EPP.

7:30 am 4 Enero /2024. Clima.
Personal Int. Soleado.
-Arq. Alejandra Cepeda M - Residente
-Solanyi Benavides - Residente SISOMA
Personal Contratista
-Arq. Jeorel Rodriguez - D.O.
-Ing. Jonathan Navarro - Residente.
-Herlin Montenegro - Almacenista
-Luis Arcia - Ayudante. / Leonardo Zapata - Ayudante
-Ayudantes - Yosneider Machado / Maestro Yemer Bood
*Actividades Ejecutadas:
-Se evidencia que por parte de la Entidad NO se ha realizado el retiro del mobiliario desmontado en el auditorio desde el dia 2 de Enero. esta ubicado en el lobby, cafetera y area de acceso al teatro, obstaculizando el paso y la continuidad de las actividades de desmonte de puertas en madera, desmonte de alfombra y desmonte de revestimiento de madera. La Interventoria emite comunicado - Oficio y se escribe via chat al Coronel villegas para solicitar el traslado de los elementos.
12:41 m - No se tiene respuesta aún del Coronel.
*Se comienza actividad desmonte de impermeabilizante asfaltico en cubierta del segundo piso.
*Se comienza el desmonte de piso caucho en escenario.
*Se continua con desmonte revestimiento muro en madera

Arq. Alejandra C.
Residente de obra.

Solanyi Benavides
R.I SISOMA

00 am 5 enero del 2024
Personal Interventoria
- Arq. Alejandra Cepeda M - Residente
- Ing. Solanyi Benavides C. - Residente SISOMA

Powered by CamScanner

8:00 am Personal Contratista
- Ing Jonathan Navarro - Residente
- Herlin Montenegro - Almacenista
- Luis Murcia - Ayudante
- Leonardo Zapata - Ayudante
- Yosnerder Machado - Ayudante
- Yeiner Boada - Maestro
-

clima Soleado

* Actividades Ejecutadas
- Aun sigue en obra el mobiliario desmontado desde el 2 de enero (sillas), se encuentran ubicados en el lobby, cafeteria y area de acceso al teatro.
- Desmonte de alfombra
- Corte de tornillos en el suelo con polidora.
- desmonte de manto asfaltico en cubierta

A las 11:30 am el cabo tirado encargado del teatro Patria evacua 100 sillas con personal del batallon, se encuentran sacando las que estan en el auditorio del costado de la pared para poder iniciar a levantar la alfombra del piso y la pared, en total se llevan 102 sillas.

CP Tirado Jornal
- desmonte de impermeabilizacion manto asfaltico en cubiertas
- Se continua con desmonte revestimiento muro en madera

4:00 pm - Se tiene proyecta retirar 204 sillas con el personal del batallon, se encuentran retirando las que estan en la mitad del teatro.

Solangi Benavides Resi. Int SSTA — Pos. SST. — Pos. Amb.

7:30 am 6 Enero / 2024.
Personal interventora.
- Arq. Alejandra Cepeda M. - Residente
- Ing. Solangi Benavides C. - SISO MA
Personal Contratista.

Powered by CamScanner

- Ing. Jonathan Navarro Gutierrez - Residente
- Ing. Esnerieth Arias Salcedo - Ambiental

Personal Operativo

- Herlin Montenegro - Maestro
- Yeimer Boada - Contratista mano de obra.
- Leonardo Tapata - Ayudante
- Luis Murcia - Ayudante
- Gabriel Mancosalva - Ayudante
- Yosman Andres - Ayudante

8:30 am - Inician con actividades de orden y aseo, acopio de tapetes dobbados cerca a la entrada del teatro
- Enrollan el manto asfaltico en cada placa lo acopian.
- Inicia a terminar de levantar el tapete del metanine, donde tambaen hay sillas, la actividad se realiza con cuidado.
- Se evidencia el no retiro de las sillas por parte de la entidad contratante, esta actividad trae atraso en varias actividades como desmonte en reventimiento en reparación de piso tamizado entre otras.
- Se evidencia que se encuentra personal del batallón ante de iniciar labores en la obra, se deja constancia que apertaciones o perdidas de herramienta no es responsabilidad del contratista.
- En la noche anterior se llevaron 88 sillas, con el Personal del batallon, el dia de ayer habian informado el traslado de 204 de las ~~sillas~~ sdo sacaron 88 Unidades. CP ~~Firma Supervisor~~

12:00 pm El batallon evacua hay 142 sillas de ~~las~~ con apoyo del personal del batallón. CP ~~Firma~~

Sobanyi Benavides
Res. Inter. SSTA

7:30 am. 9 Enero /2024. Clima: Soleado.

Personal Contratista.

- Arq. Jarel Rodriguez D.O
- Olga Londoño SST.
- Jonathan Navarro Residente
- Maestro de Obra y Ayudantes (8 personas).

Actividades Ejecutadas:

1. Se evidencia que en la zona de Camerino se encuentra el desmonte del mueble de madera de uno de los sectores. Esta actividad no fue realizada por el personal del contratista de Obra. Este evento se notificara al encargado del teatro, ya que despues de la hora (5:00pm) ingresa personal del batallón a las zonas del Teatro.
2. Se da inicio a actividades de desmonte de Sanitarios de 1er y 2nivel.
3. Se da inicio a actividades de demolicion de enchape de piso en 2do nivel. - Hall de acceso y escaleras.
4. Se continua con el desmonte de marcos y puertas en 2do y 1nivel.
5. Se continua con desmonte de alfombra en el area de Mezzanine.
6. Se comienza desmonte de mesones en baños.
7. Se vuelve a evidencia que el no retiro de las sillas de auditorio que estan acopiadas en la entrada de teatro, nos atrasan actividades de demolición de enchape de piso y demolición de guarda escoba, por parte de contratista sugiere al personal de batallón retirar.
8. Se desmontan 10 aparatos sanitarios, 7 lavamano y 2 mesones, 1 orinal

Residente de obra

Jonathan Navarro

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	10	MM	01	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
ANGELA MARIA MORALES GARCIA	52.436.935	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	20	12	2023			
JISELD SOLANYI BENAVIDES CONTRERAS	1.121.842.928	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	10	MM	01	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	86052416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
LUIS HEDINSON MURCIA ELAZQUEZ	79.829.910	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
LEONARDO DE JESUS ZAPATA SUAREZ	1.099.543.134	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA MANO DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

NFORME SEMANAL DE GESTION HSE

OBJETIVO

Mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con la normatividad legal vigente e ir ejecutando actividades programadas, con el fin de preservar en óptimas condiciones las áreas y/o puestos de trabajo con el fin de mantener un equilibrio entre el estado de salud físico, mental y social de los trabajadores, a través no solo de la identificación de peligros, sino de la continua valoración de riegos que permita la implementación oportuna de medidas de control que prevengan accidentes y enfermedades laborales.

PERIODO DE GESTION: Periodo del 03 al 08 de enero de 2024

INFORMACIÓN DE PROYECTO

1. PROYECTO: RESTRUCTURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO PATRIA

2. RESIDENTE HSE: Olga Lucía Londoño S

3. CONTRATISTA: Y&H

- Se hicieron inspecciones diarias para verificar el uso de casco con barbuquejo, overoles de trabajo y botas con punta
- Inspección de Epp al momento de utilizar maquinas como cortadoras y taladros (uso de gafas de seguridad).
- Se verifico la asistencia del personal en obra.
- Se Realizó Inspección De Contratistas

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL

RESIDENTE HSE: Olga Lucía Londoño S.

PERIODO DE GESTION: del 03 al 09 de enero de 2024

RECORD DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

OBRA	TOTAL DIAS	NÚMERO INCIDENTES		NÚMERO ACCIDENTES	DIAS SIN INCIDENTES	DIAS SIN ACCIDENTES	RECORD ANTERIOR INCIDENTES	RECORD ANTERIOR ACCIDENTES
Y&H S.A.S.	6	0		0	6	6	0	0

Observaciones: para la semana del 3 al 8 de enero 2024 no se presentan incidentes y/o accientes trabajo.

SUSPENCIONES A PERSONAL POR INCUMPLIMIENTOS SST

CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES
Y&H S.A.S.	(Remodelación del teatro patria Bogotá).	No se han suspendido actividades por incumplimientos frente al Sistema de Seguridad y Salud para el Trabajo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA

ACTIVIDAD

	No	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE PERMISO	CONTRATISTA	ACTIVIDAD
PERMISOS DE TRABAJO	**1**	Orden y aseo del personal		Y&H S.A.S.	El personal que la bora en el proyecto hace cambio de la ropa de trabajo
	2	Desmonte de silleteria		Y&H S.A.S.	Se realiza el desmonte de toda la silleteria del teatro

	FECHA	TEMA	CONTRATISTA	PERSONAL	HORAS	N°DE PERSONAS CONOVOCADOS	OBSERVACIONES
CAPACITACION	**03 al 08**		Y&H S.A.S.	**6**	**9**	**6**	

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA

ACTIVIDAD A REALIZAR	MATERIALES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
retiro de silleteria	destornillador y	Retirar toda la silletería del teatro	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, protectores auditivos de copa y tapa bocas

GESTION HSE	
ACTIVIDAD EJECUTADA	**SOPORTE**

CUADRO DE ASISTENCIA AL PERSONAL POR CARGOS

DIA	DIRECTOR	RESIDENTE	RESIDEN. SST	ALMACENISTA	OFICIAL	OPERARIOS	VIGILANCIA	TOTAL X DIAS
Del 3 al 09 enero	1	1	0	1	1	5	0	8

CUADRO DE INGRESOS

FECHA DE INGRESOS	Operarios	RESIDENTE	SST	EMPLEADOR	CANTIDAD	OBSERVACION
1/3/2024	6			NA	6	ingresan 6 personas
				NA		
				NA		
				NA		
				NA		
				NA		

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	REGISTRO FOTOGRAFICO
	GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

PERIODO DE GESTION: Periodo del 03 al 08 de enero de 2024

1. ENCUESTAS JURAMENTADAS

CONTRATISTAS	No de trabajadores por contratista	# PERSONAS DESINFECCION Y TOMA TEMPERTURA AL INGRESO	# PERSONAS DESINFECCION Y TOMA TEMPERTURA A LA SALIDA	# ENCUESTAS REALIZADAS					# ENCUESTAS REALIZADAS SIN NOVEDAD	# ENCUESTAS REALIZADAS CON NOVEDAD	# PERSONAS CON SEGUMIENTO	CASOS SOSPECHOSO
				S1	S2	S3	S4	S5				
Y&H S.A.S.	6	0	0	0	0	0			0	0	0	0

2 CAPACITACIÓN

CONTRATISTA	TEMA	FECHA	DURACIÓN	ASISTENTES	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA / OBSERVACIONES
Y&H S.A.S.					

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD


TIVIDADES DE PROTOCOLO BIOSEGURIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
Lavado de manos en los tiempos	X		
Desinfeccion de herramienta	X		
Aseo a los baños			
Desinfección de áreas			
Lavado de ropa de trabajo.	X		


REGISTRO FOTOGRAFICO
GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD Y AMBIENTAL

PERIODO DE GESTION: Periodo del 03 al 08 de enero de 2024

PROYECTO TEATRO PATRIA

DESMONTE DE SILLAS

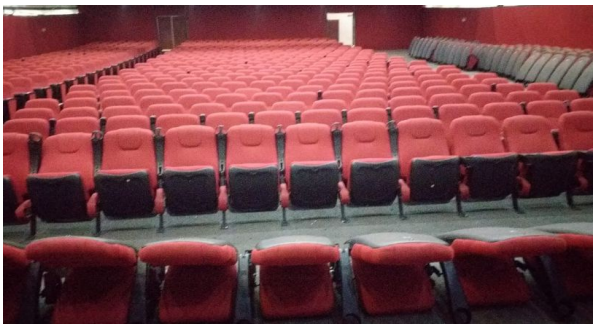

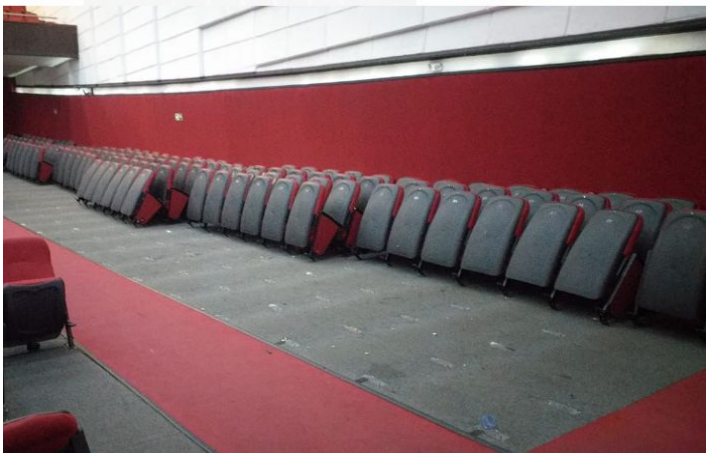

AMBIENTAL

PAUSAS ACTIVAS, CHARLAS Y CAPACITACIÓN

RECIBIR MATERIAL

EQUIPOS DE EMERGENCIA
ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS CON CORRECCIÓN
ORDEN Y ASEO

PERIODO DE GESTION: Periodo del 03 al 08 de enero de 2024

REPORTE GENERAL DE ACCIDENTALIDAD

Año	2024				
Mes ENERO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
No. de Accidentes	0	0			
Incidentes	0	0			
Enfermedades laborales	0	0			

INFORMACION DE ACCIDENTE

No.	NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	OBRA/ADMON	FECHA DE AT	DIAS DE INCACIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION ACCIDENTE
