CONTRATO DE INTERVENTORÍA- No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 4

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, ENERO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 4

Página: 1 de

DIA	9	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	4	DEL	3 DE ENERO	AL	9 DE ENERO
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES				
ACTIVIDADES PRELIMINARES	100%	0,47%	Desmonte de canal en lamina existente Desminte de Bajante existente Desmonte de ventaneria Desmonte de Cabinas en axero inoxidabel Desmonte de estructura metalica Desmonte en angulo en peldaño de escalera Desmonte de cielo raso	Desmonte de ventaria; esta actividad no es clara en los planos y no estan idenficada la ventaria a desmontar. Desmonte de cabinas en acero inoxidable esta actividad no es clara en los planos. Las actividades exteriores no se han iniciado hasta no recibir la autorizacion de instalacion de cerramiento.
CAP 2. ACEROS			Acero de 60.000psi Malla electrosoldada	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 4	ACUMULADO
	$ 6.550.417.531,15	SEMANAL	25.311.661,53	6.525.105.869,62		0,83%	2,12%
		% semanal	0,39%				
		ACUMULADO	$55.379.226,43				
		% acumulado	0,80%				


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
MIERCOLES	11/01/2024	9	3	2	14,00
JUEVES	12/01/2024	9	3	2	14,00
VIERNES	13/01/2024	9	3	2	14,00
SABADO	14/01/2024	9	2	0	11,00
DOMINGO	15/01/2024	0	0	2	2,00
LUNES	16/01/2024	9	3	2	14,00
MARTES	17/01/2024	9	3	2	14,00
MIERCOLES	18/01/2024	9	3	2	14,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO					

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	12/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	13/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	14/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	15/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO
	16/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	17/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	18/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

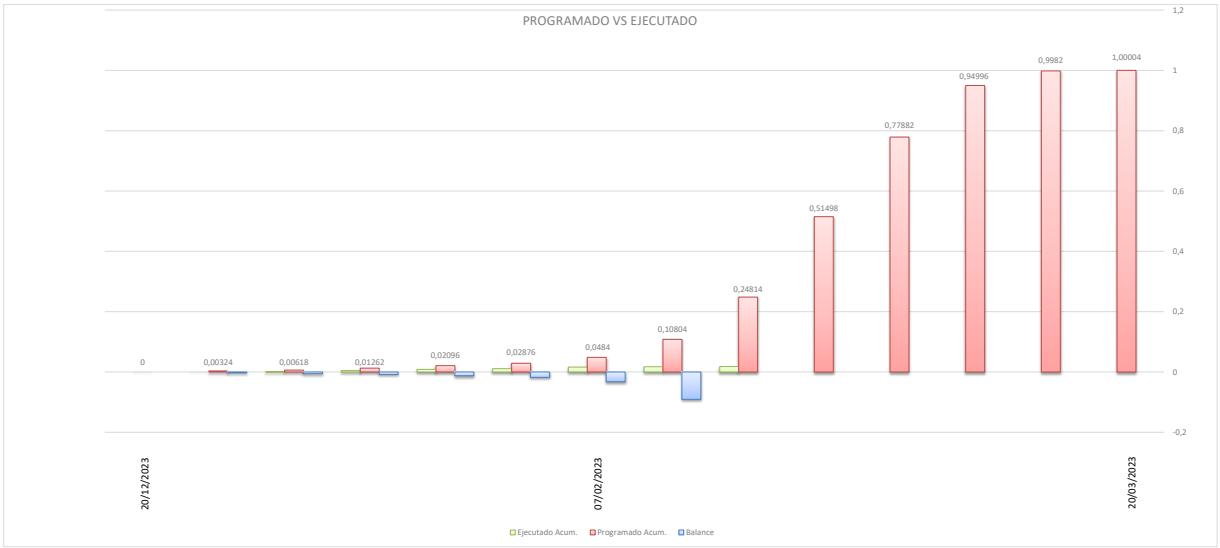

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fecha	20/12/2023	27/12/2023	3/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	7/02/2024	14/02/2024					20/03/2024
Progr. Semanal		0,32%	0,29%	0,64%	0,83%	0,78%	1,96%	5,96%	14,01%	26,68%	26,38%	17,11%	4,82%	0,18%
Programado Acum.	0%	0,32%	0,62%	1,26%	2,10%	2,88%	4,84%	10,80%	24,81%	51,50%	77,88%	95,00%	99,82%	100,00%
Ejec. Semanal		0,00%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%					
Ejecutado Acum.		0,00%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%					
Balance		-0,32%	0,18%	-0,46%	-1,30%	-2,88%	-4,84%	-10,80%	-24,01%					

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 4

Página: 1 de

DIA	9	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	4	DEL	3 DE ENERO	AL	9 DE ENERO

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Actividades en campo	Para este periodo el contratista de obra continnua con las actividades del capitulo preliminares: **CAPITULO PRELIMINARES** -Demolicion enchape de piso- 2 nivel -Demolici+on de enchape de muros -Demolición de mesones -Desmonte de aparatos sanitarios -Desmonte de estructuras en madera seccion variable –Desmolición de guardaescoba en mortero, concreto o ceramica -Demolicón de albardilla	El dia 12 de enero se realizo comité de obra No.3 y en el orden del dia se enmarca lo siguiente: -.Se presentan la supervisión del contrato: el MY Nasrala y SM Gildardo, La interventora: Directora de interventoria, Residente de interventoria y Sesidente SST y por parte del Contratista de obra: el Director de obra, el residente de obra y la residente SST. - Se informa a la supervisión respecto a los atrasos ocasionados por no retiro del mobiliario desmontado por parte del contratista desde el pasado 2 de enero y las activiades que estan detenidas en los sectores donde se encuentra el mobiliario. -Mediante recorrido de obra se informa a la supervision que hay actividades las cuales no se encuentran incluidas en el ppto y las cuales son necesarias para la ejecucion optima de las actividades contractuales. -Se solicita al a la supervisión mesa de trabajo para aclarar inquietudes respecto a la planimetria suministrada por la entidad. Se informa por parte de la supervisión que en el trascurso de la proxima semana informaran con quien se puede comunicar para la elaboracion de la mesa. -Se reunen Directora de interventoria, director de obra y Coronel Ruiz comandante de la brigada 13 para definir el tema de la implementacion del cerramiento y campamento de obra. La directriz del coronel es que por parte del contratista de obra se realice un plano mas detallado, donde se evidencien el distanciamiento perimetral necesario para el montaje del mismo. -El contratista de obra emite el dia 12 de enero en horas de la tarde el oficio correspondiente a la solicitud del Coronel Ruiz; esta interventoria remite dicha informacion el dia 15 al encargado del teatro el Cabo Monterrosa con quien ya se habia adelantado el tramite el pasado 10 de enero y quien ya habia solicitado aprobacion para la implementacion del campamento y cerramiento frente al Comandante de la Brigada 13 el BG Rodolfo Morales Franco. -Se adjunta acta de comite y lista de asistencia.	
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	**OBSERVACIONES**
Gestión de comunicaciones	COMITÉ DE OBRA No 4 - el 19 de enero. Se realizo solicitud NUEVAMENTE ante la brigada 13 para la instalacion del cerramiento sobre la calla 106- no se realizo comité de obra		
Interventoría- Listado de personal	A la fecha se cuenta con el listado de personal emitido por esta interventoria y dirigido al basem		
Contratista-Listado de personal	Reporte de listado radicado por el contratista según datos informados a la inteventoria		
Gestion de comunicación-y cumplimiento de SGSST	Para este periodo el contratista de obra cuenta con 10 trabajadores operativos (1 maestro y nueve ayudantes) Adicionalmente se cuenta en campo con El Residente de obra, La Residente SST y el Director de obra en el área administrativa		
ASPECTOS FINANCIEROS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Anticipo-contratista de obra	al dia 9 de enero se ha realizado el deposito del anticipo por parte de la entidad contratante.		
ASPECTOS SST	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Charlas de Seguirdad	A la fecha no se realizan activiades por parte del contratista		
Documentación SST de contratista	A la fecha no se ha recibido por parte del contratista informacion de 9 personas		
Trabajos de alto riesgo	no se ha dado inicio a actividades de alturas		
ASPECTOS AMBIENTALES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Disposicion final	a la fecha no se han realizado actividades de demolicion ni desmonten que requieran disposicion final		
Punto ecologico	el contratista de obra no ha realizado la instalacion de los elementos ecologico		
Acopio material	a la fecha el contratista no ha realizado puntos de acopio		

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 4

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	3	DEL	27 DE DICIEMBRE DE 2023	AL	3 DE ENERO 2024	
FECHA INICIO :	9/12/2020	FECHA TERMINO :	3/02/2021			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO









UBICACIÓN:	PARQUEADERO	UBICACIÓN:	AUDITORIO	UBICACIÓN:	DISTRIBUIDORES
ACTIVIDAD	Ingreso de material para campamento y dotacion	ACTIVIDAD	Visita Coronel villegas para recoleccion de elementos sanitarios desmontados	ACTIVIDAD	Demolicion de enchapes de piso








UBICACIÓN:	ALOJAMMIENTO 2 PISO	UBICACIÓN:	wc mujeres/hombres 2 piso	UBICACIÓN:	Terrazas
ACTIVIDAD	Demolicion enchape de piso	ACTIVIDAD	Demolicion enchape de muro	ACTIVIDAD	Demolicion de albardillas- Se evidencia que el enchape de pasacha se encuentra desprendido






UBICACIÓN:	CUARTO DE SONIDO	UBICACIÓN:	wc discapacitados	UBICACIÓN:	wc hombres y mujers
ACTIVIDAD	Demolición de capa de pintura	ACTIVIDAD	demolicion de muros en ladrillo	ACTIVIDAD	Demolicion muro en dry wall





UBICACIÓN:	CAFETERIA	UBICACIÓN:	TEATRO	UBICACIÓN:	PARQUEADERO
ACTIVIDAD	DESMONTE DE MUEBLES DE MADERA SECCION VARIABLE	ACTIVIDAD	VISITA SUPERVISION-COMITÉ DE OBRA 5	ACTIVIDAD	S.E.I DE ELEMENTOS ESTRUCURALES PARA CERRAMIENTO EN POLISOMBRA




UBICACIÓN:	parqueadero
ACTIVIDAD	REVISIÓN DE AREA PARA DISPOSIÓN DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO DE OBRA-ACOMPALAMIENTO DE LA

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL | | |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	4	DEL	10 DE ENERO	AL	16 DE ENERO	
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	18/03/2024			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO N°	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO N°	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	VISITA SUPERVISION DEL CENAC, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA



UBICACIÓN:	TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	REVISITA SUPERVISION DEL CENAC, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA




UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	USO DE ESCALERAS EN MADERA NO PERMITIDAS




UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA AL PERSONAL OPERATIVO




UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	USO DE LOS EPP EN ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PISO.





UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN CON CINTA AMARILLA EN LAS PUERTAS Y RUTAS DE CIRCULACIÓN DE PERSONAL

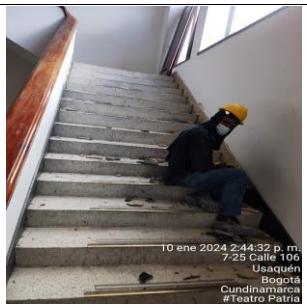

UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	USO DE LOS EPP Y DOTACION DEL PERSONAL OPERATIVO



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	LLEGA A OBRA COLOMBINAS PARA SEÑALIZACION EN LA OBRA





UBICACIÓN:	ENTREGA ACCESORIOS AL CORONEL VILLEGAS
COMENTARIOS:	SE ENTREGA AL BATALLON 3 LAVAMANOS CON SU SISTEMA INALAMBRICO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

7:30am 10 de Enero /2024.

Personal Contratista

- Arq. Leonel Rodriguez DO
- Olga Londoño SST
- Ing. Jonathan Navarro – Residente
- Maestro de obra y Ayudantes (8)
- Almacenista (1)

Personal Interventoria.

- Arq. Alejandra Cepeda – Residente
- Ing. Solanyi Benavides C. – SST

Actividades

- Demolición de Piso del acceso al mezanine Segundo nivel,
- Demolición de guarda escoba del acceso al mezanine y escalera.
- Desmonte de piso laminado del acceso al distribuidor del auditorio primer piso.

2:30 p.m - Visita del Coronel Villegas para revisión de elementos desmontados, tales como aparatos Sanitarios, Puertas y marcos de madera y espejos. El coronel informa que se lleva tres (3) lavamanos con sensor y los 2 espejos de los baños del Segundo y tercer piso del área de dormitorios.

- En las hora de la mañana se evidencio que el teatro patria por el personal de batallón fue abierto a las 7:40 am, donde el personal de contratista perdio todo este tiempo.
- Se hace entrega de la llave del candado de Acceso del teatro al contratista para Sacar copia y devolver la Original al Cabo Montenegro.

R.I.

NKA

7:30 11 de Enero /2024. clima:
Soleado.

① Personal Contratista.
- Arq. Leonel Rodriguez.
- Olga Jaramo SST.
- Ing. Jonathan Navarro - Residente
- Maestro de Obra y Ayudantes (8).
- Almacenista (1).

② Personal Interventoria.
- Arq. Alejandra Cepeda M. - Residente.
- Ing. Sobeyi Benavides C - SST.

Actividades ejecutadas.
- Se da continuidad al demolición de piso enchape en 2do piso.
- Se continúa con la demolición de guarda-escoba en concreto/mortero en área de escaleras.
- Se inicia con demolicuones de muros E=9S en baños. de 1er nivel / vestibulo. y
- Se da inicio de demolición de enchape/muro en. w.c discapacitados. 1 Nivel.
- Se hace revisión en obras de los desmontes de divisiones en acero inoxidable y se procede. con las retiros a area de Acopio.

* La interventoria continua a la espera de la respuesta por parte del encargado (Monterrosa) para la aprovación. del Suministo e Instalacion del Componente y (Corte) Cerramiento de Obra.
* Se comunica al coronel Villegas del desmante. de los divisions de acero inoxidable para su revisión y posible retiro por parte del personal del batallón.
- Quedo en informar el dia de mañana antes del comite de Obra.

30 am. 12 de Enero /2024. Clima: Soleado.

Personal Contratista.
- Arquitecto Jearel Rodriguez.
- Residente Anas.
- Maestro y Ayudantes.
- Almacenista
- Ing. Jonathan Navarro - Residente.

Personal Interventoría.
- Arq. Alejandra Cepeda M. / Residente.
- Ing. Sobeyi Benavides C / SST.

Actividades.
- El personal de obra se encuentra realizando examenes medicos. y estan ingresando a sitio a partir de las 8:00 am
- NOTA: Se evidencia el inicio de la Jornada de Trabajo. que se ha realizado el retiro de las divisiones de baño en acero inoxidable por parte del personal del batallón. Esta actividad no fue informada a esta interventoría ni al personal del contratista de obra. Se deja informado que el personal de obra cuenta con elementos y equipos dentro de las instalaciones del Teatro, los cuales no se encuentran seguros. debido a las fechas emitidas anteriormente; por lo anterior el contratista informa que realizara cambio de candados y instalara mayor seguridad en las puertas de acceso hasta que se le notifique el (abast) comunicado de Instalación del campamento de obra.
- Se continua con actividades de demolición de enchape de paso 1er nivel. (Distribuidor).
- Desmonten de puerta y marco Deposito Cafeteria.
- Desmonte de marco de Alojamiento.
- Demolición Guardaescoba de mortero / concreto
- Demolicion de muro divisorio / Alojamientos / Superboo
- Se realiza comite de obra / visita técnica con la Supervicion del contrato - Ing Nasrala - Interventoría

VKA

Powered by CamScanner

y Contratista de Obra - Se realiza acta de reunión No 3.

R.I. Solanyi Benavides R.I SSTA

- 7:30 am 13 de enero 2024

Personal Contratista

* Ing. Olga Londoño - Profesional SST

Personal Interventoría

* Ing. Solanyi Benavides - Residente SSTA

Personal operativo

* Maestro y 3 ayudantes

Clima: Soleado

Actividades

- Se realiza el inicio de la demolición del piso de la habitación del alojamiento del segundo piso.
- El personal operativo del contratista que no estuvo en obra, se encontraban realizando el curso de alturas.

Solanyi Benavides
Pro. Interven. SSTA.

7:30 am 15 de enero 2024

* Personal contratista
- Ing. Jonathan Navarro - Residente
- Ing. Olga Londoño - Profesional SST
- Maestro y 7 ayudantes

* Personal interventoría
- Arq. Alejandra Cepeda - Residente
- Ing. Solanyi Benavides - Residente SSTA

Powered by CamScanner

7:43am. Entre el dia Sabado y el dia Domingo se realizo retiro de las sillas desmontadas, ubicadas en el vestibulo y la cafeteria. El cabo Monterrosa informa que el dia Sabado se trasladaron. 224 unidades y el Dia domingo.

2:41 pm Se hace entrega al Soldado Olivares de la bailadora encontrada en el area de taquilla.

oliveres pena Jose Diomedes

- Actividades

* Se realiza desmonte de muebles en madera del area de Cafeteria, Se toman medidas. En la bahia central hay muro de mampostera que toca demoler.
* Se continua con la demolición del enchape de piso del vestibulo y la cafeteria.
* Se continua con la demolición de enchape de muro del antiguo wc. de discapacitados.
* Se hace revisión de area de baños 2 piso, donde se identifica que en los planos no se evidencia el desmonte ni de espejos ni de mesones-lavamanos. Se da la Orden al residente de realizar el desmonte ya que en esa area se realizara el montaje de las nuevas cafeterias.

*demolición de enchape de muro 2: piso en baños

Jonathan Xl. Residente de obra

EJ

7:30am 16 de Enero | 2024. Oficina Soledad.

Personal Contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- SST. / Subcontratista
- Maestro, oficiales (2), (5) Ayudantes.
- Almacenista.

Personal Interventoria.
- Residente Interventoria.
- Residente SST.

Actividades ejecutadas.

→ Se dispone a realizar la implementación del cerramiento - Canecos y pedestales en madera rollizo - Sobre el área del Parqueadero. La actividad se detiene por parte del My David encargado del área de Seguridad del Parqueadero de la Brigada 13, informa que no se tiene aprobación de la implementación y del cerramiento. Se Solicita trasladar nuevamente los elementos montados al interior del Teatro. Se Solicita al cabo Monterrosa. la colaboración frente al tema ya que el día 15 había informado verbalmente que se podía realizar la instalación de los elementos (campamento y cerramiento) ya que se tenía una pre-aprobación.

- Se socializa la situación presentada frente al coronel Ruiz. comandante de la brigada 13 quien informa que no se puede realizar la actividad ya que se esta realizando la obra del parqueadero y que no se puede intervenir en la zona donde se pretendía instalar el campamento de Obra. ni el cerramiento. Por lo anterior, Solicita replantear la zona de ubicación del campamento y la nueva delimitación del cerramiento de Obra.

Powered by CamScanner

-Se continuan con actividades de demolición de enchape en 2 piso.

Jonathan M.
Residente de obra

7:30 am. 17 de Enero / 2024 Clima: Soleado.

personal Int.
-Arq. Residente - Alejandra Cepeda
-Ing. SST. - Solanyi Benavides.
Personal Contratista.
- Director de Obra - Jhonel Rodriguez.
- Residente Ingeniero. - Jonathan Navarro.
- Residente SST. - Olga.
- Almacenista, Maestro (1), Obreros (2), Ayudantes. (5)

-Actividades Ejecutadas:

- Se continua con actividades de demolición de enchape de muros. en barras de 2 piso.
- Se continua con actividades de demolición de alborolillas en terraza del piso 3 y 4.
- Se inicia con la demolición de capa de pintura del cuarto de Sonido y las antepechos de las terrazas de 3 y 4 piso.

-Nota: En las terrazas se evidencia que durante la actividad se presenta que la capa de pañete se encuentra suelta y se puede desprender manualmente, por lo anterior, se es necesario informar a la Supervisión ya que en esa area no se contempla el Suministro de pañete impermeabilizado el cual es necesario para la nueva capa de estuco y pintura.

- Durante visita Técnica y Comite de Obra, se realiza durante la gestión frente a la Brigada 13 / Coronel Ruiz la Solicitud para la revisión de la implementación del Campamento de Obra. No se toman ninguna decisión e informan que mediante reunión virtual a

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	16	MM	01	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
ANGELA MARIA MORALES GARCIA	52.436.935	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	20	12	2023			
JISELD SOLANYI BENAVIDES CONTRERAS	1.121.842.928	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	16	MM	01	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
LUIS HEDINSON MURCIA ELAZQUEZ	79.829.910	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
LEONARDO DE JESUS ZAPATA SUAREZ	1.099.543.134	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA MANO DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSNEIDER MACHADO RAMOS	1.004825489	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	04	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1.130.275.511	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	09	01	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	09	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24			
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
JENNIFER ANDREA GUAYACUNDO BARRAGAN	1.018.512.109	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	15	01	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

NFORME SEMANAL DE GESTION HSE

OBJETIVO

Mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con la normatividad legal vigente e ir ejecutando actividades programadas, con el fin de preservar en óptimas condiciones las áreas y/o puestos de trabajo con el fin de mantener un equilibrio entre el estado de salud físico, mental y social de los trabajadores, a través no solo de la identificación de peligros, sino de la continua valoración de riegos que permita la implementación oportuna de medidas de control que prevengan accidentes y enfermedades laborales.

PERIODO DE GESTION: Periodo del 09 al 16 de enero de 2024

INFORMACIÓN DE PROYECTO

1. PROYECTO: RESTRUCTURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO PATRIA

2. RESIDENTE HSE: Olga Lucía Londoño S

3. CONTRATISTA: Y&H

- Se hicieron inspecciones diarias para verificar el uso de casco con barbuquejo, overoles de trabajo y botas con punta
- Inspección de Epp al momento de utilizar maquinas como cortadoras y taladros (uso de gafas de seguridad).
- Se verifico el orden diario para tomar medidas según el caso.
- Se verifico la asistencia del personal en obra.
- Se hizo inspección de máquina.
- Se Realizó Inspección De Contratistas

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL

RESIDENTE HSE: Olga Lucía Londoño S.

PERIODO DE GESTION: del 09 al 16 de septiembre de 2024

RECORD DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

OBRA	TOTAL DIAS	NÚMERO INCIDENTES		NÚMERO ACCIDENTES	DIAS SIN INCIDENTES	DIAS SIN ACCIDENTES	RECORD ANTERIOR INCIDENTES	RECORD ANTERIOR ACCIDENTES
Y&H S.A.S.	7	0		0	7	7	0	0

Observaciones: para la semana del 01 al 07 de septiembre de 2023, no se presentan incidentes y/o accientes trabajo.

SUSPENCIONES A PERSONAL POR INCUMPLIMIENTOS SST

CONTRATISTA	OBRA	OBSERVACIONES
Y&H S.A.S.	(Remodelación del teatro patria Bogotá).	No se han suspendido actividades por incumplimientos frente al Sistema de Seguridad y Salud para el Trabajo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA

ACTIVIDAD

	No	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE PERMISO	CONTRATISTA	ACTIVIDAD
PERMISOS DE TRABAJO	**1**	Orden y aseo del personal		Y&H S.A.S.	El personal que la bora en el proyecto hace cambio de la ropa de trabajo
	2	Mantenimiento e inspección de herramientas		Y&H S.A.S.	Se hace desinfección a las herramientas que no son electricas.
	3	Demolición de columnas de la zona A con compresor		Y&H S.A.S.	Se hace demolición en suelo del segundo piso, escaleras y baños del primer piso y se procede a sacar en escombro
	4	Retiro de escombro		Y&H S.A.S.	se recoge el escombro y es llevado en volquetas a un botadero certificado
	5	Retiro de la silleteria		Ejercito	Se realza retiro de las sillas por parte del ejercito, esta actividad fue ralizada sabado en la tarde y domingo
	6	Campamentos provisionales		CCT2023 e INTERVENTORIA	Se procede a tomas como campamento los camerinos del sotano para adecuación de los puestos de trabajo del personal
	7	Orden y aseo en campamento		Y&H S.A.S.	Se realiza brigada de aseo de las areas de trabajo al finalizar cada jornada laboral
	8				

	9						
INSPECCIONES	Del 09-01/16/23	Formato de evaluación	Inspeccion preoperacional		Cumple		
	Del 09-01/16/23	Formato de asistencia	Inspeccion preoperacional		Cumple		
	Del 09-01/16/23	Rotomartillos	Inspeccion preoperacional		Cumple		
CAPACITACION	**FECHA**	**TEMA**	**CONTRATISTA**	**PERSONAL**	**HORAS**	**N°DE PERSONAS CONOVOCADOS**	**OBSERVACIONES**
	9-Jan	Charla de riesgo Psicosocial	CCT2023	**8**	**15 min**	**8**	**Ninguna**
	12-Jan	Pausas Activas de estiramiento, brazos, manos, y cabeza	CCT2023	**8**	**15 min**	**8**	**Ninguna**
	15-Jan	Manejo de herraminetas y aseo	Y&H S.A.S.	10	**15 min**	**10**	
	15-Jan	Capcitación de INDUCCIÓN	CCT2023	3	**40 min**	**3**	**Ninguna**
	16-Jan	Capcitación de INDUCCIÓN	Y&H S.A.S.	11	**40 min**	**11**	**Ninguna**

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA

ACTIVIDAD A REALIZAR	MATERIALES	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	MEDIDAS PREVENTIVAS
Demolición de planca	Rotomartillo	Se deben demoler piso de los niveles 1 y 2, demoler muros del primer piso	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, protectores auditivos de copa y tapa bocas
Retiro de escombro	Manualmente con valdes y carretillas	Se empieza con el retiro del escombro se deja en areas asignadas mientras se hace el retiro definitivo	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas adecuadas

GESTION HSE	
ACTIVIDAD EJECUTADA	**SOPORTE**
Se realizan las charlas de riesgo psicosocial	soportes fisico
Verificación de documentación del personal que ingreso	La documentación esta en una AZ
Capacitación de Inducción al personal	soportes fisico

CUADRO DE ASISTENCIA AL PERSONAL POR CARGOS

DIA	DIRECTOR	RESIDENTE	RESIDEN. SST	ALMACENISTA	OFICIAL	OPERARIOS	VIGILANCIA	TOTAL X DIAS
Del 9 al 16 enero	1	1	1	1	1	7	0	12

CUADRO DE INGRESOS

FECHA DE INGRESOS	Operarios	RESIDENTE	SST	EMPLEADOR	CANTIDAD	OBSERVACION
1/9/2024	4			NA	8	
	6	1	1	NA	7	
	5	1	1	NA	7	Se retira una persona de Construc C
	~~5~~	1	1	NA	7	
	5	1	1	NA	7	
	5	1	1	NA	7	

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	REGISTRO FOTOGRAFICO
	GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

PERIODO DE GESTION: Periodo del 09 al 16 de enero de 2024

1. ENCUESTAS JURAMENTADAS

CONTRATISTAS	No de trabajadores por contratista	# PERSONAS DESINFECCION Y TOMA TEMPERTURA AL INGRESO	# PERSONAS DESINFECCION Y TOMA TEMPERTURA A LA SALIDA	# ENCUESTAS REALIZADAS					# ENCUESTAS REALIZADAS SIN NOVEDAD	# ENCUESTAS REALIZADAS CON NOVEDAD	# PERSONAS CON SEGUMIENTO	CASOS SOSPECHOSO
				S1	S2	S3	S4	S5				
Y&H S.A.S.	8	0	0	0	0	0			0	0	0	0

2 CAPACITACIÓN

CONTRATISTA	TEMA	FECHA	DURACIÓN	ASISTENTES	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA / OBSERVACIONES
Y&H S.A.S.					

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

TIVIDADES DE PROTOCOLO BIOSEGURIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
Lavado de manos en los tiempos	X		
Desinfeccion de herramienta	X		
Aseo a los baños			
Desinfección de áreas			
Lavado de ropa de trabajo.	X		

REGISTRO FOTOGRAFICO
GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD Y AMBIENTAL

PERIODO DE GESTION: Periodo del 09 al 16 de enero de 2024

PROYECTO TEATRO PATRIA

DEMOLICIONES



AMBIENTAL

PAUSAS ACTIVAS, CHARLAS Y CAPACITACIÓN



RECIBIR MATERIAL

EQUIPOS DE EMERGENCIA

ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS CON CORRECCIÓN





ORDEN Y ASEO





PERIODO DE GESTION: Periodo del 09 al 16 de enero de 2024

REPORTE GENERAL DE ACCIDENTALIDAD

Año	2024				
Mes ENERO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
No. de Accidentes	0	0	0		
Incidentes	0	0	0		
Enfermedades laborales	0	0	0		

INFORMACION DE ACCIDENTE

No.	NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	OBRA/ADMON	FECHA DE AT	DIAS DE INCACIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION ACCIDENTE
