CONTRATO DE INTERVENTORÍA- No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 5

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, ENERO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 5

Página: 1 de

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	5	DEL	17 DE ENERO	AL	23 DE ENERO
FECHA INICIO :	20/12/2024	FECHA TERMINO :	17 DE MARZO		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES				
ACTIVIDADES PRELIMINARES	100%	0,34%	EXCAVACION MANUAL EXCAVACION MECANICA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA REGATA PARA TUBERIA DE AGUA DESMONTE CIELO RASO CURVO DESMONTE EXTRACTOR EOLICO S.E.I DE TANQUE EN CONCRETO S.E.I. DE ANCLAJES MURO EN BLOQUE No. 5 S.E.I. DE ACOPLAMIENTO S.E.I DE CHEQUE RANURADO SOPORTE VERTICAL SENCILLO PARA TUBERIA DESMONTE LUMINARIA PAÑETE LISO MURO S.E.I DE ALFOMBRA S.E.I. DE ENCHAPE DE PISO	DEBIDO A LOS RETRASOS POR ENTREGAS DE ESPACIOS, POR TRASLADO DE MOBILIARIO, POR RETRASOS EN EL INGRESO DEL PERSONAL, APROBACIÓN E INSTALACION DE CAMPAMENTO Y POR DEFINICION EN TEMAS DE DISEÑO (REUNION CON EL EQUIPO DEL CENAC)
CAP 2. ACEROS			Acero de 60.000psi Malla electrosoldada	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I-U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 4	ACUMULADO
	$ 6.550.417.531,15	SEMANAL	22.282.419,81	6.528.135.111,34		0,78%	2,91%
		% semanal	0,34%				
		ACUMULADO	$77.661.646,24				
		% acumulado	1,19%				


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
MIERCOLES	18/01/2024	9	3	2	14,00
JUEVES	12/01/2024	9	3	2	14,00
VIERNES	13/01/2024	9	3	2	14,00
SABADO	14/01/2024	9	2	0	11,00
DOMINGO	15/01/2024	0	0	2	2,00
LUNES	16/01/2024	9	3	2	14,00
MARTES	17/01/2024	9	3	2	14,00
MIERCOLES	24/01/2024	9	3	2	14,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO					

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	18/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	12/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	13/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	14/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO
	15/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	16/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	17/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	24/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

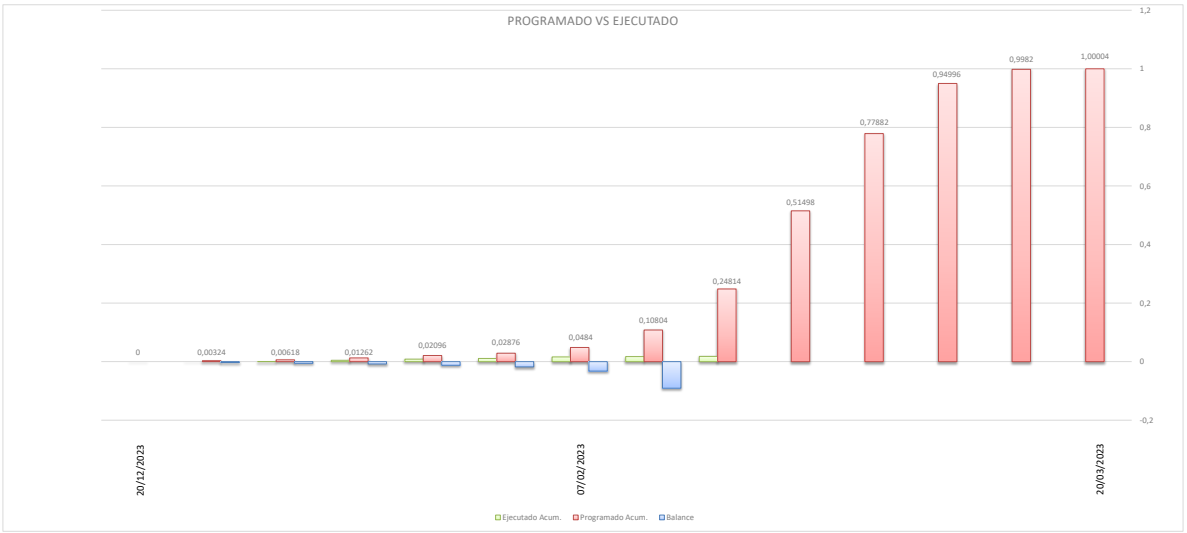

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fecha	20/12/2023	27/12/2023	3/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	7/02/2024	14/02/2024					20/03/2024
Progr. Semanal		0,32%	0,29%	0,64%	0,83%	0,78%	1,96%	5,96%	14,01%	26,68%	26,38%	17,11%	4,82%	0,18%
Programado Acum.	0%	0,32%	0,62%	1,26%	2,10%	2,88%	4,84%	10,80%	24,81%	51,50%	77,88%	95,00%	99,82%	100,00%
Ejec. Semanal		0,00%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%	0,34%					
Ejecutado Acum.		0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00%	0,00%	1,19%					
Balance		-0,32%	0,57%	-0,07%	-0,91%	-1,69%	-4,84%	-10,80%	-23,62%					

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 5

Página: 1 de

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	5	DEL	17 DE ENERO	AL	23 DE ENERO

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Actividades en campo	Para este periodo el contratista de obra continua con las actividades del capitulo preliminares: **CAPITULO PRELIMINARES** -Demolicion enchape de piso- 2 nivel -Demolicion de enchape de muros -Desmonte de aparatos sanitarios -Desmonte de estructuras en madera seccion variable --Desmolición de guardaescoba en mortero, concreto o ceramica -Demolición de albardilla -Desmonte de revestimiento en madera -Demolicion de mezannine en madera -Montaje de pedestales en madera rolliza para cerramiento de obra sobra la calle 106	.Para este periodo se evidencia que el dia 14 de enero se realizo el retiro total del mobiliario (sillas demmontadaas desde el 2 de enero) por parte del personal del batallón.	
		El dia 17 de enero se realizo comité de obra No.4 y en el orden del dia se enmarca lo siguiente: -.Se presentan la supervisión del contrato: el MY Nasrala y SM Gildardo, La interventora: Directora de interventoria, Residente de interventoria y Residente SST y por parte del Contratista de obra: el Director de obra, el Residente de obra y la Residente SST. -Mediante visita de los nombrados se dirigen a la oficina del Coronel Ruiz (Brigada 13) para dar solucion frente a la situacion de la instalacion del campamento y cerramineto de obra que seria ubicado en la bahia adjunta al teatro patria sobre la calle 106 y la autorizacion de acceso del personal de obra por la guardia de la calle 106. Sin embargo, NO se pudo concluir las solicitudes realizadas por el contratista de obra y esta interventoria. Se informa por parte de la supervisión que se realizará reunión virtul a las 7pm.	
		El dia 18 de enero se realiza vistita de campo con el General Morales, el Coronel Ruiz, el My Nasrala (supervisor del contrato), El Director de obra y la Residente de interventoria. Se revisó la situacion ocasionada debido a la implementación de cerramiento y campamento de obra en el parqueadero de la Brigada 13, donde por la realizacion de la reparacion de la placa asfaltica se hace imposible el montaje en esta zona, por lo que se sugiere realizar la instalacion sobre la Bahia vehicular ubicada sobre la Calle 106. Se le dan las debidas indicaciones al General Morales sobre la implementacion y se informa que sobre esta área se requiere el permiso otorgado por movilidad (PMT); el Coronel Ruiz informa que su asesor le indica que no se requiere el permiso ya que la Bahia hace parte de los predios del Batallón. Sin embargo, la residente de interventoria y el director de obra indican que si es necesario por el cruce de peatones y vehiculos a la area destinada para el campamento de obra. El General Morales le solicita al Coronel Ruiz la colaboración para poder realiar el montanje sobre esta area. El Coronel Ruiz solicita a esta interventoria la documentación correspondiente al listado de todo el personal de obra, copia del contrato de obra y ubicacion del cerramiento y campamento de obra (plano), para gestionar la solicitud de aprobacion de implementacion del campamento y cerramiento y el ingreso del personal por la calle 106.	
		. El dia 19 de enero se realiza retiro de escombros por parte del contratista de obra- se realiza 1 solo viaje ya que no se permite por parte del batallón mas ingresos de vehiculos de carga. - Se realiza visita conjunta con el especialista por parte del contratista de obra para la implentacion del PMT. Se informa las condiciones y los transitos vehiculares y peatonales que se deribarian a causa de la instalación del cerramiento de obra sobre la bahia de la cll 106. El especialista Informa que es necesario el PMT debido a las nuevas circulaciones que se deberian realizar en el área. Esta interventoria solicita al contratista el concepto técnico del especialista para escalarlo a la supervision del contrato.	
		7. El dia 22 de enero se presenta retraso de aproximadamente 1 hora y media para el ingreso del personal por la cll 102, lo anterior, debido a la perdida del listado del personal consignado por esta interventoria en la guardia desde el pasado sabado 13 de enero. Estas circustancias ocasionan retrasos en las actividades y perdida de tiempo por parte del personal ya que esta condicion se ha venido presentando a lo largo de la ejecución del contratos de obra. - Esta interventoria se dirige ante el Sargento Viseprimero Zabala para gestionar el permiso de ingreso del personal por la cll 106. El SV Zabala informa que esta a la espera del estudio de seguriad y el reporte de antecedentes disciplinarios del personal de obra emitido por el Basem. Esta interventoria, realiza la entrega de los antecedentes disciplinarios al Cabo Monterrosa para la celeridad de la gestion y se le solicita la aprobación del listado por la cll 102 mientras se da la autorizacion de ingreso por la Cll 106 por parte de la Brigada 13.	

ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	**OBSERVACIONES**
Gestión de comunicaciones	COMITÉ DE OBRA No 5 - el 17 de enero. Se realizo solicitud NUEVAMENTE ante la brigada 13 para la instalacion del cerramiento sobre la calla 106- no se realizo comité de obra		
Interventoría- Listado de personal	A la fecha se cuenta con el listado de personal emitido por esta interventoria y dirigido al basem		
Contratista-Listado de personal	Reporte de listado radicado por el contratista según datos informados a la inteventoria		
Gestion de comunicación-y cumplimiento de SGSST	Para este periodo el contratista de obra cuenta con 10 trabajadores operativos (1 maestro y nueve ayudantes) Adicionalmente se cuenta en campo con El Residente de obra, La Residente SST y el Director de obra en el área administrativa		
ASPECTOS FINANCIEROS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Anticipo-contratista de obra	al dia 23 de enero se ha realizado el deposito del anticipo por parte de la entidad contratante.		
ASPECTOS SST	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Charlas de Seguirdad	A la fecha no se realizan activiades por parte del contratista		
Documentación SST de contratista	A la fecha no se ha recibido por parte del contratista informacion de 9 personas		
Trabajos de alto riesgo	no se ha dado inicio a actividades de alturas		
ASPECTOS AMBIENTALES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Disposicion final	a la fecha no se han realizado actividades de demolicion ni desmonten que requieran disposicion final		
Punto ecologico	el contratista de obra no ha realizado la instalacion de los elementos ecologico		
Acopio material	a la fecha el contratista no ha realizado puntos de acopio		

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 5

Código:		**Versión:**	**Fecha de Emisión:**		**Página:**
SEMANA N°	5 **DEL**	17 DE ENERO	**AL**	123 DE ENERO	
FECHA INICIO :	20 DE DICIEMBRE	**FECHA TERMINO :**	17 DE MARZO		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	**NIT O C.C.**	860524168 8	**CONTRATO N°**	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617-0	**CONTRATO N°**	272

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO










UBICACIÓN:	**PARQUEADERO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**DISTRIBUIDORES**
ACTIVIDAD	Ingreso de material para campamento y dotacion	**ACTIVIDAD**	Visita Coronel villegas para recoleccion de elementos sanitarios desmontados	**ACTIVIDAD**	Demolicion de enchapes de piso





UBICACIÓN:	**CAFETERIA**	**UBICACIÓN:**	**ESCALERA EMERGENCIA**	**UBICACIÓN:**	**WC MUJERES 2 PISO**
ACTIVIDAD	Demolicion enchape de piso	**ACTIVIDAD**	DEMOLICION ESCALERA	**ACTIVIDAD**	CONTINUAN DEMOLICION BALOS- ENCHAPE DE MUROS









UBICACIÓN:	**WC 2 PISO**	**UBICACIÓN:**	**MEZANNINE**	**UBICACIÓN:**	**CAMERINOS**
ACTIVIDAD	DESMONTES DE MARCOS Y SANITARIOS	**ACTIVIDAD**	DESMONTE DE ELEMENTOS EN MADERA SECCION VARIABLE	**ACTIVIDAD**	DEMOLICION DE PISO EN MADERA








UBICACIÓN:	**CUARTO DE SONIDA-NORTE**	**UBICACIÓN:**	**VESTIBULO**	**UBICACIÓN:**	**DISTRIBUIDR**
ACTIVIDAD	DEMOLICION DE CAPA DE PINTURA	**ACTIVIDAD**	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO	**ACTIVIDAD**	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO

 		 		 	
UBICACIÓN:	**TERRASAS 3 PISO**	**UBICACIÓN:**	**3 PISO**	**UBICACIÓN:**	**SOTANO**
ACTIVIDAD	DEMOLICION DE CAPA DE PINTURA-PAÑETE DESPRENDIDO	**ACTIVIDAD**	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO	**ACTIVIDAD**	DEMONSTE DE REVESTIMIENTO DE MADERA
 				 	
UBICACIÓN:	**ALOJAMIENTO**	**UBICACIÓN:**	**CAFETERIA**	**UBICACIÓN:**	**PARQUEADERO**
ACTIVIDAD	DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA	**ACTIVIDAD**	DESMONTE DE PUERTA-CORTINA METALICA	**ACTIVIDAD**	S.E.i DE ELEMENTOS ESTRUCURALES PARA CERRAMIENTO EN POLISOMBRA
 					
UBICACIÓN:	**parqueadero**	**UBICACIÓN:**		**UBICACIÓN:**	
ACTIVIDAD	SOLICITUD DE REUNION PARA DEFINICION DE ESPACIO DE LA 106 COMO ZONA DE CAMPAMENTO	**ACTIVIDAD**		**ACTIVIDAD**	

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**			**Página:**
SEMANA N°	5	**DEL**	17 DE ENERO			**AL**		23 DE ENERO
FECHA INICIO :	20/12/2023		**FECHA TERMINO :**	18 DE MARZO				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS**	**NIT O C.C.**	**860 524 16-8**	**CONTRATO N°**	**314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901 759 617 - 0**	**CONTRATO N°**	**272-CENANCINGENIEROS-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	INSTALACIONES INTERNAS DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIOS DE RESIDUOS**



UBICACIÓN:	INSTALACIONES INTERNAS DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE RCD.**



UBICACIÓN:	COSTADO SUR DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**RECOLECCION DE RESIDUOS DE DEMOLICION EN VOLQUETA**



UBICACIÓN:	AUDITORIO TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE ALFOMBRA**



UBICACIÓN:	AUDITORIO DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE ACCESORIOS DESMONTADOS**



UBICACIÓN:	CAMERINO TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE MADERA DESMONTADA**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	5	DEL	17 DE ENERO	AL		23 DE ENERO
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	18/03/2024			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO N°	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO N°	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	INSTALACIONES INTERNAS TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO DE OBRA



UBICACIÓN:	INSTALACIONES INTERNAS TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO DE OBRA



UBICACIÓN:	CAMERINOS DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	COMITÉ DE OBRA CON LA SUPERVISION



UBICACIÓN:	RECORRIDO E3XTERNO DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	RECORRIDO CON SUPERVISION PARA REVISAR TEMA DEL CERRAMIENTO



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL DE OBRA



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES Y CHARLAS AL PERSONAL



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	INSTALACION DE LINEAS DE VIDA EN LA ESTRUCTURA EN MADERA PARA DESMONTAR EL CIELO RASO.



UBICACIÓN:	COSTADO ORIENTE DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	DEMOLICION DE ESCALERAS EN CONCRETO, USO DE EPCC Y LINEAS DE VIDA.



UBICACIÓN:	BAHIA PARQUEAADERO CALLE 106
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION PROVISIONAL PARA EL CERRAMIENTO DE OBRA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

-Se continuan con actividades de demolición de enchape en 2 piso.

Jorlat Hanel M.
Residente de obra

7:30 am. 17 de Enero / 2024 Clima: Soleado.

personal Int.
- Arq. Residente - Olgnidra Cepeda
- Ing. SST. - Solanyi Benavides.

Personal Contratista.
- Director de Obra - Jhonel Rodriguez.
- Residente Ingeniero. - Jonathan Navarro.
- Residente SST. - Olga.
- Almacenista, Maestro (1), Obreros (2), Ayudantes. (5)

-Actividades Ejecutadas:

- Se continua con actividades de demolición de enchape de muros. en barras de 2 piso.
- Se continua con actividades de demolición de alboradillas en terraza del piso 3 y 4.
- Se inicia con la demolición de capa de pintura del cuarto de Sonido y los antepechos de las terrazas de 3 y 4 piso.

-Nota: En las terrazas se evidencia que durante la actividad se presenta que la capa de pañete se encuentra Suelta y se puede desprender manualmente, por lo anterior, se es necesario informar a la Supervisión ya que en esa area no se contempla el Suministro de pañete impermeabilizado el cual es necesario para la nueva capa de estuco y pintura.

- Durante visita Técnica y Comite de Obra, se realiza durante la gestión frente a la Brigada 13 / Coronel Ruiz la Solicitud para la revisión de la implementación del Campamento de Obra. No se toman ninguna decisión e informan que mediante reunión virtual a

Powered by CamScanner

los 7pm determinan el proceder frente al campamento.

Desde el área SSTA se ha evidenciado que hace falta instalar señalización en acopios de residuos, se ha evidenciado personal de obra que no usa las gafas de seguridad cuando estan en actividades de demolición con cincel.

- La SST del contratista se retira del proyecto el miercoles a medio dia, renunciando al contratista.

Sobayi Benavides
Rs. Interv. SSTA

R.I.

7:30m. 18 de Enero /2024. Clima: Soleado.

personal. Interventoria.
- Ing. SST. Sobayi Benavides.
- Arq. Residente Alejandra Cepeda

Personal Contratista.
- Director de Obra - Leonel Rodriguez.
- Ing. Residente - Jonathan Navarro.
- Residente SST - Olga.
- Almacenista - Maestro (1), Obreros (2), Ayudantes (5)

Actividades ejecutadas:
- Se continua con la demolición de la capa de pintura
- Se evidencia que una vez demolida la albardilla de la terraza de cubierta, el enchape que recubre el antepecho (Fachada) Se encuentra suelto.- Se debe socializar ante la Supervisión ya que la actividad para esta area corresponde al cambio de las piezas en mal estado y/o deterioradas, igualmente que el enchape del muro de fachada del 3piso.
- Se da inicio a demolición de enchape de PSO

en cuarto de Sonido.
- Se realiza demolición del mezzanine en madera.
- Demolición de guardaescoba en el cuarto de Sonido.

R.T. Residente de obra.

12 30 m Se realiza visita de campo con el General , el Coronel Ruiz de Supervisión del contrato, interventoria y contratista. Se le informa al General que debido a las obras de reparcheo que se van a realizar en el parqueadero no se puede realizar la instalación e Implementación del Cerramiento y campamento de obra; por lo que por parte del personal del batallón se le notifica que una de las posibilidades es instalar el campamento de Obra en la bahia exterior del Teatro Patria, para lo que el contratista e interventoria informa que para esta zona es importante implementar un PMT debido al cruce de circulación entre el peatonal y los vehiculos que deben ingresar al campamento. Por su parte, el Coronel Ruiz informo que para su asesoria se le habia notificado que no es necesario la implementación del PMT ya que la bahia hace parte de los terrenos del batallón. Sin embargo esta interventoria Sugiere al contratista de Obra realizar ela consulta con el especialista de transito y asi generar el concepto Técnico.
- El Coronel Ruiz indica que se debe instalar el campamento y cerramiento en esta area y que es necesario realizarle el envio de la información correspondiente del personal y vehiculos para realizar el tramite de Ingreso por la Calle 106.-

30pm. Se realiza envio de Solicitud de Ingreso del personal e Implementación del Campamento y Cerramiento de

Powered by CamScanner

Obra. El coronel Ruiz solicita hacerle llegar la información remitida al Sargento Viceprimero Zabala para el trámite correspondiente. Esta interventoría realizará dicha gestión.

7:00am 19 de Enero 2024. Clima: Soleado.

- Personal Contratista.
- Director de Obra - Leonel Rodriguez.
- Residente de Obra - Jhonatan Navarro.
- Residente SST - Olga Londoño. - SST obra.
- Almacenista, Maestro (1), Oficial (1) Ayudante (9)

Actividades realizadas:

- Se realiza ingreso de volqueta para recolección de escombros. - El batallón No 13. Solicita que se señalice y se deje limpio el espacio donde se ubicara la volqueta. - Solo se realiza 1 un viaje de material de demolición ya que solo se le permitio el ingreso hasta el medio día.
- Se realiza instalación de cerramiento con polisombra sobre el arden costado Sur del teatro
- Se inicia actividad de demolición de enchape de piso en el arden costado Sur del teato. (junto a tanque).
- Se da inicio al desmonte de revestimiento de madera. y guarda escoba en el area de Sotano.
- Se continua con la demolición de enchape de muro en baño de Alojamientos. y enchape de piso
- Se inicia demolición de Piso del 3 nivel y demolición de guardescoba
- Se continua con el desmonte de pañete de antepechos de terraza.

Powered by CamScanner

- Se continua con eb demolición de la capa de pintura del cuarto costado norte de 3 piso - muro de fachada.
- Se continua con la demolición de enchape de muro de los baños del 3 piso
- Hace falta señalización en obra como en Puntos de acopio de residuos de escombro y desmontes de elementos de puertas marcos y sanitarios.
- Se evidencia que el personal de obra usa los Elementos de Protección Personal adecuados para las actividades de obra.

Sebastián Bravido
Rs. Interven. SSTA

RS.

7:30am 29 de Enero / 2024. clima. Parcialmente nublado.

Personal contratista.
- Residente de Obra
- Apoyo SST.
- Almacenista, Maestro (1), Obrero (1) Ayudantes (9)

(Activio) Personal Interventoria.
- Residente Interventoria.

Actividades Realizadas
- Se realiza la instalación de la madera rolliza en el costado Norte y Oriente del Teatro patria. para la posterior instalación de la teja de zinc para el cerramiento. de Obra. - Se deja Señalizado con cinta de peligro para evitar el paso de los peatones.
- Se continua con la demolición dela escalera exterior.

RS.

Powered by CamScanner

2:39pm NOTA: El día Viernes 19 de Enero se presenta por parte del contratista de Obra el especialista de PMT para realizar la revisión de las condiciones viales y peatonales para la implementación del cerramiento y campamento de obra que se instalará sobre la bahía de la Cll 106.
-El análisis del especialista indica que se requiere la implementación debido al cruce de peatones y vehículos al ingreso de camiones (volquetas) al campamento de Obra. Esta interventoría solicita al contratista remitir soporte técnico para escalarlo a la entidad contratante.

PRJ. JONATHAN C.
Residente de obra

8:40am 22 de Enero 2024. Clima: Soleado.
-Personal de Obra.
Director de Obra
-Residente de Obra
Residente SST. - Apoyo SST.
-Almacenista, Maestro (1) Obreros (11) A
-Personal Interventoría.
-Residente Interventoría
-Residente SST.
El personal de Obra se encuentra desde las 7:00am en el acceso de la Cll 102 donde por razones desconocidas no se encuentra el listado del personal. El Cabo Valderrama informa que el encargado de la Seguridad Militar el Cabo Acosta se dirige a la guardia para realizar el ingreso del personal pero se tardo 1 y 30 minutos en realizar esta labor ya que se encontraba desayunando. Esta interventoría deja constancia que así como el día de hoy 22 de enero

Se presento inconvenientes en el ingreso, ya son varias las ocasiones que se ha repetido esta Situación y los cuales acarrea tiempos muertos en obra y/o Retrasos para la ejecución de las actividades.

* es de aclarar que se perdio 1,30 hora media por trabajadores que reflejada en dia de trabajo 18 hora, y esto dividido en 8 horas laborales, seria 2,25 días perdido
✓ Se continua con demolición de escalera exterior
✓ Se continua con demolición de enchape de Piso
✓ Se continua con demolición de enchape de muro
✓ demolición de angulo en escalera exterior
✓ Se continua con demolición de muro en ladrillo
Se continua con dismonte de aparatos Sanitarios.
✓ dismonte de revestimiento de madera en cerramiento
✓ dismonte de cielo raso en madera

Jonathan M.
Residente de obra.

Actividades Ejecutadas:
- Se continua con la demolición de la escalera exterior
- Se continua con la demolición de muro en mampostería del wc-mujeres 2 piso.
- Se continua con la demolición del alero exterior junto a tanque de Agua.- Se evidencia que la Subbase esta desprendida, lo que indica que es necesario un Sobrepiso o mortero de nivelación para la instalación de la nueva enchape.
- Se revisan medidas de Seguridad en estructura de cubierta para realizar la actividad de desmonte de cielo raso.- revisión arcol SST de los partes.- Se da inicio a la actividad.

7:00am 23 de Enero /2024. Clima. Soleado

* Personal Contratista
Director de Obra
Residente de Obra
Residente SST - Apoyo SST.
- Almacenista, Maestro, Obreros (11)
* Personal Interventoría
- Residente Interventoría
- Residente SST.
- Actividades Ejecutadas.

- Se continua con la demolición de escaleras exteriores
- Se continua con la demolición de la Caseta del Tanque de Agua.
- Se continua con el desmonte del cielo raso flotante del area de Auditorio.
- En el espacio exterior se continua con el montaje de las listones del cerramiento.

Nota: Se informa que No habra comite de Obra - Se realizará el dia viernes. 26 de Enero.

R.S.

7:30 am. 24 de Enero /2024. Clima = Soleado

- Personal Contratista.
Director de Obra
Residente de Obra.
Residente SST / Apoyo SST.
Residente Ambiental.
Almacenista, Maestro (1) Obreros (11)
Actividades Ejecutadas:

- Se continua con el desmonte del cielo raso flotante del auditorio - por parte del área SST se verifica el sistema de Seguridad para continuar con la labor.

Powered by CamScanner

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	23	MM	01	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
ANGELA MARIA MORALES GARCIA	52.436.935	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	20	12	2023			
JISELD SOLANYI BENAVIDES CONTRERAS	1.121.842.928	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	23	MM	01	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
LUIS HEDINSON MURCIA VELAZQUEZ	79.829.910	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
LEONARDO DE JESUS ZAPATA SUAREZ	1.099.543.134	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA MANO DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSNEIDER MACHADO RAMOS	1.004825489	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	04	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1.130.275.511	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	09	01	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	09	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24			
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
JENNIFER ANDREA GUAYACUNDO BARRAGAN	1.018.512.109	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	17	01	24	18	01	24
JOSE LUIS MANCILLA JULIO	1.002.275.995	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	SURA	18	01	24			
JUAN JOSE LOPEZ CAJAMARCA	80.229.344	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	19	01	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

				SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		FECHA:05: MAR 22 VERSION:001		
				EPP																				
FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CASCO CON BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	RESPIRADOR REUTILIZABLE	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE CARNAZA	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA	PONCHO IMPERMEABLE	PETO DE CARNAZA	OVEROL TALLA			INICIAL	REPOSICION	OBSERVACIONES (OTRAS ESPECIFICACIONES DEL EPP)	FIRMA DEL TRABAJADOR
																PANTALON	BUZO	BOTA				
15-1-24	[illegible]	1026[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1064[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1043[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1098[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1122[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1002[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1004[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1007[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1004[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	7987[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
"	[illegible]	1099[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/										
12	JUAN LOPEZ	8022[illegible]	SST	/	/	/				/			/										

NOTA: RECIBO LOS ELEMENTOS Y ME RESPONSABILIZO DEL CUIDADO Y USO DE LOS MISMOS. PARA SU REPOSICION SE ENTREGA EL ELEMENTO A REPONER

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	19/01/2023
		VERSIÓN	0
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: CENAC TEATRO | FECHA | 18-1-24

CONTRATISTAS: YH CONSTRUOBRAS

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	Jeancarlos Cuello Palomino	7:00	Jeancarlos	<17:00	Jeancarlos
2	Yoneider Machado Ramos	7:00	Yoneider M.R	17:00	Yoneider M.R.
3	Edurso Jair Palomino	7:00	EdursonP	17:00	EdursonP
4	Jorge Luis Barabin Escorcia	7:00	jorge Luis	17:00	jorge Luis
5	Yeimer Javier Robles	7:00		17:00	
6	Jose Luis Morcillo Julio	7:00	Jose morcilla	17:00	Jose morcilla
7	Yoshan andres Tejada Diaz	7:00	Yoshan Diaz	17:00	Yoshan Diaz
8	Jamir A.	7:00		17:00	
9	LUIS H MURCIA	7:00AM		17:00	
10	Leonardo Zapata	7:00AM		17:00	
11	Yaricelis	7:00		17:00	
12					
13					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	19/01/2023
		VERSIÓN	0
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: CENAC TEATRO | FECHA | 17-1-24

CONTRATISTAS: YH CONSTRUOBRAS

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	Jeancarlos Cuello Palomino	7:00	Jeancarlos	17:00	Jeancarlos
2	Yoneider Machado Ramos	7:00	Yoneider M.R	17:00	Yoneider M.R
3	Edurso Jair Palomino	7:00	Edurso	17:00	Edurso
4	Jorge Luis Barabin Escorcia	7:00	jorge Luis	17:00	jorge Luis
5	Yeimer Javier Robles	7:00		17:00	
6	Jose Luis Morcillo Julio	7:00	Jose morcilla	17:00	Jose morcilla
7	Yoshan andres Tejada Diaz	7:00	Yoshan Diaz	17:00	Yoshan Diaz
8	Jamir A.	7:00		17:00	
9	LUIS H MURCIA	7:00AM		17:00	
10	Leonardo Zapata	7:00AM		17:00	
11	Yaricelis	7:00		17:00	
12					
13					

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	19/01/2023
		VERSIÓN	0
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: CENAC TEATRO FECHA 20-1-24

CONTRATISTAS: YH CONSTRUOBRAS

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	Jeancarlos Cuello Polanco	7:00	Jeancarlos	<17:00	Jeancarlos
2	Yonnelber Machado Ramos	7:00	Yonnelber M.R.	17:00	Yonnelber M.R.
3	Edwerson Jair Palomeque	7:00	Edwerson	17:00	Edwerson Jair
4	Jorge Luis Barbia Escorcia	7:00	Jorge Luis	17:00	Jorge Luis
5	Yeimer Banda Robles	7:00		17:00	
6	Jose Luis Manrilla Julio	7:00	Jose Manrilla	17:00	Jose Manrilla
7	Yoiner Andres Tapia Diaz	7:00	Yoiner Diaz	17:00	Yoiner Diaz
8	Javier A. Luis S.	7:00		17:00	
9	LUIS H MURCIA	7:00		17:00	
10	Leonardo Zapata	7:00AM		17:00	
11	Yanneiber	7:00		17:00	
12					
13					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	19/01/2023
		VERSIÓN	0
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: CENAC TEATRO FECHA 19-1-24

CONTRATISTAS: YH CONSTRUOBRAS

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	Jeancarlos Cuello Polanco	7:00	Jeancarlos	17:00	Jeancarlos
2	Yonnelber Machado Ramos	7:00	Yonnelber M.R.	17:00	Yonnelber M.R.
3	Edwerson Jair Palomeque	7:00	Edwerson	17:00	Edwerson
4	Jorge Luis Barbia Escorcia	7:00	Jorge Luis	17:00	Jorge Luis
5	Yeimer Banda Robles	7:00		17:00	
6	Jose Luis Manrilla Julio	7:00	Jose Manrilla	17:00	Jose Manrilla
7	Yoiner Andres Tapia Diaz	7:00	Yoiner Diaz	17:00	Yoiner Diaz
8	Javier A. Luis S.	7:00		17:00	
9	LUIS H MURCIA	7:00		17:00	
10	Leonardo Zapata	7:00AM	N/ASISTIO	17:00	N ASIST
11	Yanneiber	7:00		17:00	
12					
13					

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	19/01/2023
		VERSIÓN	0
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: CENAC TEATRO | FECHA | 16-1-24

CONTRATISTAS: YH CONSTRUOBRAS

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	Jean Carlos Gutt Bolaños	7:00	Jeancarlos	< 17:00	Jeancarlos
2	Yosneider Machado Ramos	7:00 AM	Yosneider M. R.	17:00	Yosneider M. R.
3	Edwerson Jair Palomeque	7:00 AM	Edwerson J.	17:00	Edwerson J.
4	Jorge Luis Sarabia Escorcia	7:00	Jorge Luis	17:00	Jorge Luis
5	Yeimer Zoraida robles	7:00		17:00	
6	Jose Luis Meraida Solis	7:00	Jose Meraida	17:00	Jose Meraida
7	Yosman andres Tarazona Diaz	7:00	Yosman Diaz	17:00	Yosman Diaz
8	Javier alberto Luis	7:00	Luis S.	17:00	Luis S.
9	LUIS H MURCIA	7:00		17:00	
10	Leonardo Zapata	7:00 AM		17:00	
11	Yamir Maraca	7:00		17:00	
12					
13					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	19/01/2023
		VERSIÓN	0
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: CENAC TEATRO | FECHA | 15-1-24

CONTRATISTAS: YH CONSTRUOBRAS

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	Jean Carlos Gutt Bolaños	7:00	Jeancarlos	17:00	Jeancarlos
2	Yosneider Machado Ramos	7:00	Yosneider M. R	17:00	Yosneider M. R.
3	Edwerson Jair Palomeque	7:00	Edwerson J.	17:00	Edwerson J.
4	Jorge Luis Sarabia Escorcia	7:00	Jorge Luis	17:00	Jorge Luis
5	Yeimer Zoraida robles	7:00		17:00	
6	Jose Luis Meraida Solis	7:00	Jose Meraida	17:00	Jose Meraida
7	Yosman andres Tarazona Diaz	7:00	Yosman Diaz	17:00	Yosman Diaz
8	Javier alberto Luis	7:00		17:00	Luis S.
9	LUIS H MURCIA	7:00		17:00	
10	Leonardo Zapata	7:00 AM		17:00	
11	Yamir Maraca	7:00		17:00	
12					
13					

Powered by CamScanner
