CONTRATO DE INTERVENTORÍA- No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 6

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, ENERO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 6

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	6	DEL	24 DE ENERO	AL	30 DE ENERO
FECHA INICIO :	20/12/2024	FECHA TERMINO :	17 DE MARZO		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES				
ACTIVIDADES PRELIMINARES	100%	0,34%	Excavacion manual de material heterogeneo Excavacion manual de material comun Desmonte de tejas de cubierta Mantenimiento de estructuras en madera Mantenimiento de mueble de madera -camerinos Desmonte, mantenimiento y reinstalación de muebles en madera	Debido a la tardanza en la aprobacion de espacio exterior (bahia) y permiso de ingreso de las volquetas al area de parqueadero del B13 para la salida de escombros y elementos desmontados. La no salida de materiales en el area de acopio (auditorio-distribuidos) obstaculizada la ejecucion de actividades prograda para este periodo
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%		Suministro e instalacion de tanque de concreto, Suministro e instalacion de anclajes 1/2"	Definicion de toma de desiciones respecto a la elaboración del tanque nuevo
M-6 MAMPOSTERÍA	200%		Muro en bloque No.5 Muro en dry wall 1 cara	
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%		Punto de agua fria de 1/2"	
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	100%		Suministro e instalación de valcula mariposa con supervisor de 4" Suministro e instalación de soporte tipo pera de 3" Suministro e instalación de acoplamiento tipo coupling flexible de 4" y de 2" Suministro e instalación de cheque ranurado de 3" Suministro e instalacion de expanción antivibratorio de 2 1/2"	Definicion de toma de desiciones respecto al sistema de red de incendios
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100%		Desmonte general de aparatos electricos a la vista Desmonte de luminaria	Debido a la salida y evacuacion de escombros en la zona de acopio.
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%		Pañete liso interior Panete liso impermeabilizado	Actualización de la informacion respecto a áreas de auditorio y camerinos/sotanos
CB-10 CUBIERTAS	100%		Canal en lamina galvanizada cal. 20	
PA-12 PISOS - ACABADOS	100%		Alistado de piso mortero 1:3	Debido a la salida y evacuacion de escombros en la zona de acopio.
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100%		Mantenimiento genral de enchapes de muro S.E.I de ceramica de pared flat blanco	Debido a la salida y evacuacion de escombros en la zona de acopio.
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	100%		Replanteo de redes de voz y datos	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 6	ACUMULADO
	$ 6.550.417.531,15	SEMANAL	33.907.959,85	6.516.509.571,30		1,96%	4,86%
		% semanal	0,52%				
		ACUMULADO	$111.569.606,09				
		% acumulado	1,70%				


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
MIERCOLES	24/01/2024	9	3	2	14,00
JUEVES	25/01/2024	9	3	2	14,00
VIERNES	26/01/2024	9	3	2	14,00
SABADO	27/01/2024	9	2	0	11,00
DOMINGO	28/01/2024	0	0	2	2,00
LUNES	29/01/2024	9	3	2	14,00
MARTES	30/01/2024	9	3	2	14,00
MIERCOLES	31/01/2024	9	3	2	14,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO					

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	24/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	25/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	26/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	27/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO
	28/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	29/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	30/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	31/01/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

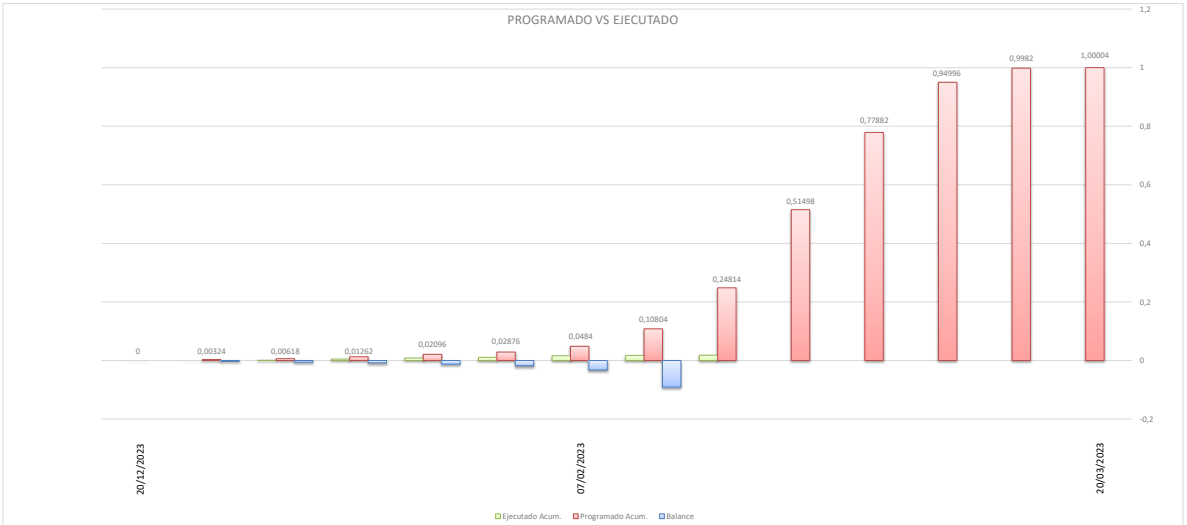

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fecha	20/12/2023	27/12/2023	3/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	7/02/2024	14/02/2024					20/03/2024
Progr. Semanal		0,32%	0,29%	0,64%	0,83%	0,78%	1,96%	5,96%	14,01%	26,68%	26,38%	17,11%	4,82%	0,18%
Programado Acum.	0%	0,32%	0,62%	1,26%	2,10%	2,88%	4,84%	10,80%	24,81%	51,50%	77,88%	95,00%	99,82%	100,00%
Ejec. Semanal		0,00%	0,05%	0,41%	0,39%	0,34%	0,52%	0,00%	0,52%					
Ejecutado Acum.		0,00%	0,46%	0,47%	0,80%	1,19%	1,70%	0,00%	1,70%					
Balance		-0,32%	-0,16%	-0,79%	-1,30%	-1,69%	-3,14%	-10,80%	-23,11%					

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL No. 6							
Página: 1 de				DIA	23	MES	2		AÑO	2024					
SEMANA N°	6	DEL	24 DE ENERO				AL	30 DE ENERO							

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Actividades en campo	3. Para este periodo el contratista de obra continua con las actividades del capitulo preliminares: **CAPITULO PRELIMINARES** -Demolicion enchape de piso- anden exterior -Demolición de muro en ladrillo -Desmonte de cielo raso flotante -Desmonte de cielo raso curvo -Se continua con demolicion de escalera exterior -Demolición de edificación-caseta tanque	2.Para este periodo se recibe autorización apartir del dia 24 de enero del ingreso del personal operativo y administrativo de la obra por parte del B13- ingreso calle 106. Se permite ingreso de 3 vehiculos segun disponibilidad y No se permite autorización de ingreso de motos.	
		4. El dia 24 de enero NO se realiza comité de obra No 5. Se reprograma para el dia viernes 26 de enero a las 2pm	
		5. El dia 25 de enero se notifica por parte de la supervisión que se realizará reunion con el equipo de diseño para aclarar las dudas surgidas debido al analisis e interpretacion del cruce de informacion planos/presupuesto. Dicha reunion se realizara el dia miercoles 31 de enero a las 2pm	
		6. El dia 26 de enero se da comité de obra NO 5 donde la supervisión mediante comunicación telefonica notifica que habra un nuevo apoyo a la supervisión y que quedará a cargo de las gestiones internas. Ingreso de la Ingeniera Laura. - Se realizá gestión frente a la oficina de Ingenieros de la B13 para aprobación de la instalación del cerramiento y campamento de obra en la bahia exterior del Teatro patria sobre la calle 106. Se hace entrega de oficio por parte de la brigada. -Debido a que una vez mas no se tiene respuesta aclaratoria por parte de la supervisión del contrato frente a las observaciones de diseño emitidas por el contratista y remitidas por esta interventoria a la supervisión, el contratista de obra solicita a la interventoria suspensión del contrato de obra.	
		7. El dia 27 de enro se continuan con actividades de desmonte de cielo raso, demolicion de escalera exterior y teminacion de demolicion de edificacion.	
		8. El dia 29 de enero esta interventoria remite al contratista de obra formatos diligenciados para proceso de PMT ante movilidad. Se radican el dia martes 30 de enero.	
		9. Se solicita al contratista de obra dar continuidad al cerramiento en teja de zinc sobre la bahia de la call 106.	
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	**OBSERVACIONES**
Gestión de comunicaciones	COMITÉ DE OBRA No 6 - el 31 de enero. Se realizo COMITÉ DE DISEÑO EN LAS INSTALACIONES DEL COING		
Interventoría- Listado de personal	A la fecha se cuenta con el listado de personal emitido por esta interventoria y dirigido al basem		
Contratista-Listado de personal	Reporte de listado radicado por el contratista según datos informados a la inteventoria		
Gestion de comunicación-y cumplimiento de SGSST	Para este periodo el contratista de obra cuenta con 10 trabajadores operativos (1 maestro y nueve ayudantes) Adicionalmente se cuenta en campo con El Residente de obra, La Residente SST y el Director de obra en el área administrativa		
ASPECTOS FINANCIEROS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Anticipo-contratista de obra	al dia 31 de enero se ha realizado el deposito del anticipo por parte de la entidad contratante.		
ASPECTOS SST	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Charlas de Seguirdad	A la fecha no se realizan activiades por parte del contratista		
Documentación SST de contratista	A la fecha no se ha recibido por parte del contratista informacion de 9 personas		
Trabajos de alto riesgo	no se ha dado inicio a actividades de alturas		
ASPECTOS AMBIENTALES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Disposicion final	a la fecha no se han realizado actividades de demolicion ni desmonten que requieran disposicion final		
Punto ecologico	el contratista de obra no ha realizado la instalacion de los elementos ecologico		
Acopio material	a la fecha el contratista no ha realizado puntos de acopio		



REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL												
INFORME SEMANAL No. 6												
Código:				**Versión:**		**Fecha de Emisión:**				**Página:**		
SEMANA N°	6	**DEL**	24 DE ENERO					**AL**	31 DE ENERO			
FECHA INICIO :	20 DE DICIEMBRE		**FECHA TERMINO :**	17 DE MARZO								
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA												
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**											
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS - BIC**			**NIT O C.C.**	**860524168 8**			**CONTRATO N°**	**314**			
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**			**NIT O C.C.**	**901.759.617-0**			**CONTRATO N°**	**272**			

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO







UBICACIÓN:	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**PARQUEADERO CALLE 106**
ACTIVIDAD	DESMONTE DE CIELO RASO FLOTANTE	**ACTIVIDAD**	ZONA DE ACOPIO	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CERRAMIENTO








UBICACIÓN:	**EXTEERIOR**	**UBICACIÓN:**	**TANQUE DE AGUA**	**UBICACIÓN:**	**TERRAZAS**
ACTIVIDAD	DEMOLICION ESCALERA DE EMERGENCIA	**ACTIVIDAD**	DEMOLICION DE CASETA EXISTENTE	**ACTIVIDAD**	ORDEN Y LIMPIEZA








UBICACIÓN:	**DISTRIBUIDOR**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**WC 2 PISO**
ACTIVIDAD	ESCOMBRO DE DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS	**ACTIVIDAD**	DESMONTE DE CIELO RASO CURVO	**ACTIVIDAD**	DEMOLICION DE MUROS EN LARILLO






UBICACIÓN:	**3 PISO**	**UBICACIÓN:**	**ESCALERAS A 3 NIVEL**	**UBICACIÓN:**	**CAFETERIA**
ACTIVIDAD	DESMONTE DE VENTANERIA	**ACTIVIDAD**	DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA	**ACTIVIDAD**	DESMONTE DE PUERTA CORTINA METALICA

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**			**Página:**
SEMANA N°	6	**DEL**	24 DE ENERO			**AL**		30 DE ENERO
FECHA INICIO :	20/12/2023		**FECHA TERMINO :**	18 DE MARZO				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS**	**NIT O C.C.**	**860 524 16-8**	**CONTRATO N°**	**314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901 759 617 - 0**	**CONTRATO N°**	**272-CENANCINGENIEROS-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	INSTALACIONES INTERNAS DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO**




UBICACIÓN:	INSTALACIONES INTERNAS DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ORDEN Y ASEO EN AREAS DE TRABAJO**



UBICACIÓN:	COSTADO SUR DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE RCD**



UBICACIÓN:	COSTADO ORIENTE TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**SE INSTALA SEÑALIZACION EN PUNTOS DE ACOPIO**

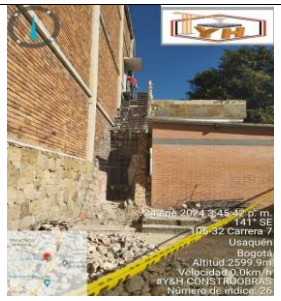

UBICACIÓN:	COSTADO SUR DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**SE INSTALA SEÑALIZACION EN PUNTOS DE ACOPIO**



UBICACIÓN:	CAMERINO TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE RCD**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL | | |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

7:00am. 23 de Enero/2024. Clima. Soleado

* Personal Contratista
Director de Obra
Residente de Obra
Residente SST - Apoyo SST.
- Almacenista, Maestro, Obreros (11)

* Personal Interventoría
- Residente Interventoría
- Residente SST.
- Actividades Ejecutadas.

- Se continua con la demolición de escaleras exteriores
- Se continua con la demolición de la caseta del Tanque de Agua.
- Se continua con el desmonte del cielo raso flotante del área de Auditorio.
- En el espacio exterior se continua con el montaje de las listones del cerramiento.

Nota: Se informa que No habra comite de Obra - Se realizará el dia viernes. 26 de Enero.

R.S

7:30 am. 24 de Enero/2024. Clima=Soleado

- Personal Contratista.
Director de Obra
Residente de Obra.
Residente SST / Apoyo SST.
Residente Ambiental.
Almacenista, Maestro (1) Obreros (11)
Actividades Ejecutadas:
- Se continua con el desmonte del cielo razo flotante del auditorio - por parte del área SST se verifica el sistema de Seguridad para continuar con la labor.

Powered by CamScanner

-Se da Continuidad a la demolición dela escalera exterior, igualmente se revisa el sistema de Seguridad de los trabajadores.
-Se evidencia que el contratista de Obra incorpora la Señalización dentro y fuera del Teatro
-Se realiza desmonte de ventanería en el area de Alojamiento.
*No se realiza comite de obra.-Se trasbda al viernes 26 de Enero.

RI.

7:00am 25 de Enero /2024 Chiva=Soleado.

Personal Contratista.
-Director de Obra
Residente de Obra
-Residente SST, Apoyo SST.
Almacenista - Maestro (1) Oficios (11)
-Personal Interventoría
Residente de Interventoría
Residente SST.

Actividades Ejecutadas.
-Debido que la Supervisión no ha confirmado la reunión con el equipo de diseño por parte del CENAC, no se pueden avanzar en las actividades ya que la información suministrada en los planos no es clara; el contratista de obra informa que es muy difícil continuar ya que no tiene el alcance de las actividades definidas. Esté interventoría una vez más solicita a la Dirección de Interventoría solicitar la mesa de trabajo con el equipo de CENAC, ya que el contratista emitió comunicado con las observaciones encontradas en campo y que no corresponde a la planimetría entregada por la Entidad.

Powered by CamScanner

* Se continua con el desmonte del cielo raso flotante del Auditorio.
* Se continua con la demolicion de la escalera exterior.
* Se continua con la demolicion dela caseta del tanque.
* Se colocan listones en la fachada del teatro para poder proceder con el cerramiento sobre la 7a.

- Sidney Bernardo Res. Interven. SST/A

RJ.

7:30am 26 de Enero 2024. Clima = Soleado.

Personal Contratista.
Director de Obra
Residente de Obra
Residente SST, Apoyo SST.
Almacenista - Maestro (1), Obreros (11).
Personal Interventoría
Residente Interventoría
Residente SST.

Actividades Ejecutadas.

~~Director de Obra~~
~~Residente de Obra~~
~~Residente SST / Apoyo SST.~~
~~(Resi) / Almacenista, Maestro (1) Obreros (11).~~
~~Actividades~~
~~Personal~~

- Teniendo en cuenta que en parqueadero del batallón se estan realizando actividades de demolición de capa asfaltica, se solicita al area SST del contratista instalar la señalización o delimitar el espacio del sitio. / Acceso al teatro.

Powered by CamScanner

- Se continua con el desmonte del cielo raso - Auditorio
- Se evidencia que tanto el teatro-Auditorio - vestibulo/distribuidor y area exterior Escalera. Se encuentra escombro el cual se solicita al contratista realizar la labor lo más pronto posible
- Se continua con demolición de escalera exterior.
- Se continua con demolición de Caseta / Tanque de Agua.
- Se evidencia que en el baño de mujeres del Segundo nivel No se encuentra ninguna columna como se identifica en los planos., adicionalmente el muro divisorio presenta una dimension mayor - un doble muro - Igualmente se presenta esta Situación en el baño de hombres.
- Se da inicio a desmonte de Cielo raso curvo costado Sur.
- Se realiza comité de Obra No. 5.- No se presenta la Supervisión y se informa al contratista que va a ingresar el nuevo personal de Apoyo - Ing. Laura.
- Se realiza gestión frente a la BIS para la aprobación del espacio de la Rampa de la Cll 106.
- La documentación la entrega el BIS mediante la Oficina de Ingenieros a las 6pm.
- El contratista de Obra Solicita Suspensión del Contrato hasta tanto no se de respuesta a las observaciones emitidas y remitidas a la Supervisión del contrato.
- Emite Oficio de Solicitud.

Powered by CamScanner

7:30 27 de Enero /2024 Clima-Soleado.
Personal Contratista.
Residente SST.
Almacenista, Maestro (1) Oficiales (11)
Personal Interventoria.
Residente Interventoria.
Actividades Ejecutadas.
- Se continua con la demolición de la escalera exterior.
- Se continua con desmonte de cielo raso arco y cielo raso descolgado.
- Se finaliza con la demolición de la caseta del Tanque de Agua.

RI.

7:00am 29. de Enero /2024. Clima: Soleado.
Personal Contratista
Director de Obra
Residente de Obra. / Residente SST y Apoyo SST.
Almacenista - Maestro (1) Oficial (11)
Personal Interventoria..
Residente Interventoria.-
Residente SST.
Actividades Ejecutadas
*Se continua con actividades de desmonte de cielo raso arco costado norte
* Se realiza salida de escombro y madera
* Se continua con actividades de desmonte de estructura de cielo raso flotante.
* Se continua con la revisión del panel acustico para su desmonte costado Sur.
- Se Solicita al encargado de la carpa/funeraria su traslado debido a la instalación del Cerramiento y el cual no se debe quedar dentro del Campamento de obra

7:00am 30 de Enero /2024. Clima: Soleado

Personal Contratista.

Director de Obra, Residente, Residente SST, Apoyo SST. Almacenista, Maestro (1) Obreros (11).

Personal Interventoria.

-Residente Int., Residente SST.

Actividades Ejecutadas:

- Por parte del area SST. Se realiza verificación de los trabajos en alturas/alto riesgo, arnejes., lineas de vida, equipos de protección contra caida elementos de protección personal - Actividad de desmonte de estructura en madera de cielo raso flotante.

11.00am Se presenta visita a las instalaciones del Coronel Rincón Subdirector de la CENAC. - Se realiza recorrido y se informa del avance de Obra. No se dejan compromisos.

- Se continua a la espera de la respuesta por parte de la Supervisión de las observaciones de diseño.
- Se deja constancia que teniendo en cuenta que no se ha dado continuidad con la instalación del cerramiento el contratista de obra informa que no se realizará retiro de escombros hasta no tener la radicación de los documentos para la Solicitud del PMT.
- Del area de la Cota del tanque de Agua esta pendiente el retiro de la bomba y tablero. - El elemento queda cubierto con una tela/protección.

Res. Res. SST-MA

31 de Enero /2024. Clima = Nublado.

Personal Contratista

- Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST /Apoyo
- Almacenista Maestro (1) Obreros (11)

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	30	MM	01	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
ANGELA MARIA MORALES GARCIA	52.436.935	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	20	12	2023			
JISELD SOLANYI BENAVIDES CONTRERAS	1.121.842.928	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	30	MM	01	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
LUIS HEDINSON MURCIA VELAZQUEZ	79.829.910	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
LEONARDO DE JESUS ZAPATA SUAREZ	1.099.543.134	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA MANO DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSNEIDER MACHADO RAMOS	1.004825489	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	04	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1.130.275.511	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	09	01	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	09	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24			
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
JENNIFER ANDREA GUAYACUNDO BARRAGAN	1.018.512.109	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	17	01	24	18	01	24
JOSE LUIS MANCILLA JULIO	1.002.275.995	AYUDANTE DE OBRA	COOSALUD	PORVENIR	SURA	18	01	24			
JUAN JOSE LOPEZ CAJAMARCA	80.229.344	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	19	01	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, GABRIEL ANGEL MANOSALVA mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.064.712.262 expedida en CURUMANI.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 5 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA

Nombre GABRIEL ANGEL MANOSALVA

CC. 1.064.712262 expedida en CURUMANI

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, LUIS HEDINSON YURIDIA VELASQUEZ mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.829.910 expedida en BOGOTA.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 6 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA

Nombre LUIS HEDINSON YURIDIA VELASQUEZ

CC. 79.829 910 expedida en BOGOTA

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.043.844.401 expedida en CAMPO DE LA CRUZ

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 16 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	____
Terminación Obra	____
Terminación de Contrato	____

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA Jeancarlos

Nombre Jeancarlos

CC. 1.043.844401 expedida en CAMPO DE LA CRUZ

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.098.821.481 expedida en BUCARAMANGA

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 16 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	____
Terminación Obra	____
Terminación de Contrato	____

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA

Nombre JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ

CC. 1.098.821.481 expedida en BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, JOSE LUIS MANCILLA JULIO mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.002 275.995 expedida en HAHIRES.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 18-ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☒	Auxilio de transporte	☒
Dotaciones	☒	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA José Mancilla

Nombre JOSE LUIS MANCILLA JULIO

CC. 1.002.275.995 expedida en HAHIRES.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, Juan José López Cajamarca mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 80229344 expedida en Bogotá.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 19 de enero 2024 hasta el Día 27 de enero Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de Enero del año 2024



FIRMA _____

Nombre Juan José López Cajamarca

CC. 80229344 expedida en Bogotá

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, YOSNEIDER MACHADO RAMOS mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.004.825.489 expedida en Cúcuta.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 4 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA Yosneider Machado R.

Nombre YOSNEIDER MACHADO RAMOS

CC. 1.004825489 expedida en Cúcuta

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, JORGE LUIS SAAVEDRA ESCORCIA mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.127.587.970 expedida en RIOHACHA,

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 6 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA Jorge Luis

Nombre JORGE LUIS SAAVEDRA ESCORCIA

CC. 1.127.587.970 expedida en RIOHACHA

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.130.275.511. expedida en BARRANQUILLA

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 7 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA Edinson Palomeque

Nombre EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ

CC. 1.130.275.511 expedida en BARRANQUILLA.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, Yoshan Andres Tamayo Diaz mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.004.808.897. expedida en Los Patios.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 06 de enero 2024 hasta el Día 27 de enero Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de enero del año 2024



FIRMA Yoshan Diaz

Nombre Yoshan Andres Tamayo Diaz

CC. 1.004.808.897 expedida en Los Patios.

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, LEONARDO ZAPATA SUAREZ mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.099.543.134 expedida en GIRARDOTA.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 10-1-24 2024 hasta el Día 27-1-24 Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	____
Terminación Obra	____
Terminación de Contrato	____

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA _____

Nombre LEONARDO ZAPATA

CC. 1.099.543.134 expedida en GIRARDOTA

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901445490-4	Y YH CONSTRUOBRAS SAS	MANZ 22 A LOT 3 PARTEALTA PALMERAS	3124435072	yhconstruobrassas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	29/01/2024	74276463	$469.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	6	300	0	46.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	14.000	0		0		0	6	100	0	14.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	6	1.100	0	186.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	55.600	0	0	0	0	6	400	0	56.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	105.000				105.000	6	600	105.600			1.050	105.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	60.400	6	400	60.800	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	60.400	60.800
Pensión	2	241.200	242.700
Riesgos Laborales	1	105.000	105.600
CCF	1	60.400	60.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	467.000	469.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901445490-4	Y YH CONSTRUOBRAS SAS		MANZ 22 A LOT 3 PARTEALTA PALMERAS	3124435072	yhconstruobrassas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2023-12	E	29/01/2024	74276463	$469.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026562467	BOADA ROBLES YEIMER	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1099543134	ZAPATA SUAREZ LEONARDO DE JESUS	1	0			S	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS041	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF22	173.334	7.000	0	0	0	0	0
3	CC	79829910	MURCIA VELASQUEZ LUIS HEDINSON	1	0			S	X																230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS041	173.334	7.000	14-11	173.334	5	12.100	CCF22	173.334	7.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO) REMATES	**CODIGO: VERSION: 02 FECHA: 20-02-2022**

PROYECTO: TEATRO PATRIA	**CONSECUTIVO ATS: 2**
FECHA DE INICIO: 22/01/24	**HORA INICIAL; 07:00**
FECHA DE FINALIZACION ; 27/01/24	**HORA FINAL : 17:00**
UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL TRABAJO: TEATRO PATRIA Y ZONA ALEDAÑAS	**NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS : 9**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

DEMOLICION Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA PARA SU REMODELACIÓN INCLUYE DEMOLICIÓN DE ESCALERA, CERRAMIENTO, CARGUE Y DESCARGUE MANUAL Y MECANICO DE ESCOMBROS, DESMONTAJE DE CIELO RASO, DESMONTAJE DE RECUBRIMIENTO EN MADERA DE LAS PAREDES.

MARCAR SI, NO, N/A (no aplica), SEGÚN CORRESPONDA

1.- ¿ El RIESGO más crítico de la actividad fue identificado?	SI	6.- ¿ Evaluó la aplicación de bloqueos físicos requeridos para energías peligrosas?	SI
2.- ¿Se evaluó las condiciones de trabajo (Ej.: Ruido, Espacio disponible, Iluminación, Temperatura, Desniveles, Polvo, Etc.)?	SI	7.- ¿Evaluó el riesgo de incendio, vías de escape disponibles y recursos para la atención de este? ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	SI
3.- ¿Se identificó los aspectos ambientales: derrames de liquidos, sustancias peligrosas, contaminación del aire, generación de residuos?	SI	8.- ¿Para trabajos en altura se evaluó: escalas, escaleras, accesos, líneas de vida, plataformas, andamios, atrapa soga, soga o cordel de perlón?	SI
4.- ¿Las herramientas, equipos e instalaciones eléctricas, están en condiciones de ser usadas según estándares establecidos?	SI	9.- ¿Los andamios se encuentran certificados?	N/A
5.- ¿ El personal está capacitado para realizar la actividad?	SI	10.-¿ Para trabajos en caliente se cuenta con equipo de extinción de incendio? ¿El equipo de extinción se encuentra en buenas condiciones?	SI

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

Procedimientos	SI	NO	Procedimientos	SI	NO
Trabajo en alturas	X		Espacios Confinados		N/A
Trabajos en caliente	X		Otro Cual:		N/A

CONSIDERACIONES ADICIONALES

¿Se requiere entrenamiento especial?	**SI**	~~**NO**~~
Especifique:		
¿Las condiciones climáticas pueden afectar el trabajo?	**SI**	**NO**

lluvias torrenciales tormenda electrica nundaciones endavales ro:ALTAS TEMPERATURAS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	BARRA, PALAS, PORRO Y/O MACETA, CARRETILLAS, HERRAMIENTAS MENORES
Eléctricas	PULIDORA, TALADRO ROTOMARTILLO, SIERRA CIRCULAR
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos	Responsables de las acciones o procedimientos requeridos
*Ingreso del personal a la obra	*CONDICIONES DE SEGURIDAD: LOCATIVO: Superficies irregulares con diferenciia de nivel, condiciones de orden y aseo , caida de objetos	*Caidas al mismo nivel, fracturas, lesiones incapacitantes.	* Uso seguro del sendero peatonal.	contratista oficiales ayudantes inspectora SST
Inspeccion de equipos y herramientas a utilizar	*CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVO: Almacenamiento y superficies de trabajo condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas al mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes	* Inspeccion y firma de equipos, firma de ATS	contratista oficiales ayudantes inspectora SST
	BIOLOGICOS: Virus, Bacterias, covid 19	problemas respiratorios, desorden del sistema nervioso, diarrea, dolor de cabeza, escalofrio, vomito, dolor de estomago	cumplir con los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, uso de proteccion respiratoria, distanciamiento control de roedores, orden y aseo en los lugares de trabajo	contratista oficiales ayudantes inspectora SST
inspeccionar area de trabajo	* Condiciones locativas irregularidades en el area de trabajo, condiciones de orden y aseo	* caidas al mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes	* charla preoperacional, pausas activas, uso de elementos de proteccion personal: casco con barbuquejo, botas de sseguridad con puntera, dotacion de trabajo(camiza manga larga y pantalon de overol)	contratista oficiales ayudantes inspectora SST
	biomecanico: Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales) esfuerzo, manipulacion manual de cargas, movimiento repetitivo	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares	charla de capacitacion de levantmiento de cargas, inspeccion de elementos y equipos de trabajo	contratista oficiales ayudantes inspectora SST
	quimico: polvos organicos e inorganicos liquido rocios	problemas respiratorios y visuales	uso de epps (casco, guantes, botas de seguridad, punteras, protector respiratorio)	contratista oficiales ayudantes inspectora SST
alistamiento y selección de materiales y herramientas	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) capacitacion sobre traciego de material charla sobre levantamiento manual de cargas, charla sobre comunicación en equipo	contratista oficiales ayudantes
	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* charlas preoperacional, manipulacion de cargas, comunicación acertiva, pausas activas, uso de elementos de proteccion personal: casco con barbuquejo, botas de sseguridad con puntera, dotacion de trabajo(camiza manga larga y pantalon de overol)	contratista oficiales ayudantes
Desmontaje de cielo raso	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitivos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas,	contratista oficiales ayudantes
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* orden y aseo en las areas de trabajo	contratista oficiales ayudantes

	condiciones de seguridad trabajo en alturas	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, muerte	Inspección diaria del equipo de trabajo en alturas y elementos de protección personal Ubicación punto de anclaje Elaboración de AST e implementación de controles Permiso de Trabajo en alturas	contratista oficiales ayudantes
Desmontaje de recubrimiento en madera de paredes	condiciones de seguridad trabajo en alturas	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, muerte	Inspección diaria del equipo de trabajo en alturas y elementos de protección personal Ubicación punto de anclaje Elaboración de AST e implementación de controles Permiso de Trabajo en alturas	contratista oficiales ayudantes
	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas	contratista oficiales ayudantes
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* orden y aseo en las areas de trabajo	contratista oficiales ayudantes
	*FISICO: ruido intermitente de impacto, golpes con herramientas.	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas	contratista oficiales ayudantes
	*Ubicación inadecuada de objetos falta de orden y aseo, herramienta.	* Caidas, esguinces y lesiones varias.	*Mantener el aera de trabajo en orden y aseo	contratista oficiales ayudantes
	*Estructuras o instalaciones en desnivel, adecuacion de senderos peatonales, orden y aseo incluye adecuación de residuos en general.	* Caidas, esguinces y lesiones varias.	*Respetar señalizaciones, uso de senderos peatonales y uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo	contratista oficiales ayudantes
Adecuación e instalacion de cerramiento	condiciones de seguridad trabajo a la interperie	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, lesiones, laseraciones, rasguños, machucones, pellizcos	Inspección diaria de herramientas, equipos y elementos de protección personal Elaboración de AST e implementación de controles	contratista oficiales ayudantes
	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas.	contratista oficiales ayudantes
	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo	contratista oficiales ayudantes
	*FISICO: ruido intermitente de impacto, golpes con herramientas.	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas	contratista oficiales ayudantes
orden y aseo en las areas de trabajo	condiciones de seguridad orden y aseo	*Caida de personas, fracturas, lesiones incapacitantes.	*Al terminar las actividades las areas de trabjo deben quedar en orden y aseo.	contratista oficiales ayudantes inspectora SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD

ELEMENTO	SI	NO	NA	ELEMENTO	SI	NO	NA	ELEMENTO	SI	NO	NA
BOTAS DE SEGURIDAD CON	X			PROTECCION AUDITIVA	X			GUANTES DE CARNAZA	X		
BOTAS DE CAUCHO CON				PROTECCION RESPIRATORIA	X			GUANTES DE NITRILO			
MONOGAFAS DE SEGURIDAD	X			CASCO CON BARBUQUEJO	X			ROPA DE TRABAJO OVEROL	X		

*** Todo trabajo debe poseer un análisis de riesgo antes de iniciar la tarea.**

PERMISO PARA ATS

CONSECUTIVO ATS:

FIRMA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	BOADA ROBLES YEIMER	1026562467	OFICIAL							
2	MANOSALVA VELASQUEZ GABRIEL ANGEL	1094712262	OFICIAL							
3	JEAN CARLOS QUETTE PALOMINO	1043844401	AYUDANTE							
4	JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1066821481	OFICIAL							
5	JORGE LUIS BARABIA ESCORCIA	1127567670	AYUDANTE							
6	JOSE LUIS MANCILLA JULIO	1002278995	AYUDANTE							
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1004808087	AYUDANTE							
8	EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1130275811	OFICIAL							
9	YOSNEIDER MACHADO RAMOS	1004825489	AYUDANTE							
10	LUIS HEDINSON MURCIA VELASQUEZ	79820910	AYUDANTE							
11	[illegible]	1095545134	AYUDANTE							
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

AUTORIZACION: Cualquiera de las partes responsables de la actividad puede suspender este ats, si considera que existe una variacion significativa como: temperatura, contaminantes atmosferico, lluvias etc. O en caso de no estar cumpliendo con las medidas de seguridad contempladas

FIRMAS ENCARGADO

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE							
FIRMA	GABRIEL MANCILLA	GABRIEL MANCILLA	GABRIEL MANCILLA	GABRIEL M	GAB M.	G. MANC.	

FIRMAS JEFE INMEDIATO

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	Y. BOADA	Y. BOADA	Y. BOADA	
FIRMA							

FIRMAS INSPECTOR SST

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	JUAN J. LOPEZ C.	JUAN JOSE LOPEZ C.	JUAN JOSE LOPEZ C.	J. LOPEZ	J. LOPEZ	J. LOPEZ	
FIRMA							

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	VERSION: 02
	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 20-08-2022

PROYECTO TEATRO PATRIA	NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS
FECHA DE INICIO : 20/01/24	FECHA DE FINALIZACION: 21/01/24
HORA INICIAL: 07:00	HORA FINAL17:00

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 20 mts.

TIPO DE TRABAJO	RUTINARIO X	OCASIONAL	SIMULTANEO CON OTRAS TAREAS DE ALTO RIESGO
SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR:	Andamio	Escalera X	Elevador Personal / Grua con Canasta

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR DIA

LUNES: NO SE LABORA.

MARTES: DESHANTELAMIENTO Y DESMONTE DEL CIELO RASO

MIERCOLES: DEMOLICIÓN DE ESCALERA Y DESMONTE

JUEVES: DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE TECHO (CIELO RASO)

VIERNES: DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRA ELECTRICO Y ESCALERA

SABADO: DEMOLICION Y DESMONTAJE.

DOMINGO:

TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA TAREA , LOS SIGUIENTES EPP Y LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (CONVENCIONES, SI- NO)

ELEMENTOS A UTILIZAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CASCO CON BARBUQUEJO		✓	✓	✓	✓	✓	
GAFAS DE SEGURIDAD		✓	✓	✓	✓	✓	
GUANTES ANTIDESLIZANTES		✓	✓	✓	✓	✓	
PROTECCION AUDITIVA		✓	✓	✓	✓	✓	
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		✓	✓	✓		✓	
BOTAS ANTIDESLIZANTES							
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO		✓	✓	✓	✓	✓	
ESLINGA EN Y CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS		✓	✓	✓	✓	✓	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO							
MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO		✓	✓	✓	✓	✓	
LINEA DE VIDA VERTICAL		✓	✓	✓	✓	✓	
LINEA DE VIDA HORIZONTAL		✓	✓	✓	✓	✓	
SISTEMAS DE ANCLAJE							
OTRO(S) :							

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

HERRAMIENTAS MENORES, MANILAS

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se ha realizado la evaluación de riesgos e identificación de peligros en el area de trabajo		✓	✓	✓	✓	✓	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo		✓	✓	✓	✓	✓	
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos tabajadores o ejecutores		✓	✓	✓	✓	✓	
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓	
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓	✓	
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia		✓	✓	✓	✓	✓	
Se cuenta con plan de rescate en alturas		✓	✓	✓	✓	✓	
Los trabajadores realizan el permiso de trabajo en el lugar a intervenir		✓	✓	✓	✓	✓	
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse		✓	✓	✓	✓	✓	
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a lineas y/o equipos electricos energizados		✓	✓	✓	✓	✓	

Powered by CamScanner

En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados) o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NOTA: ESTE PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SE VERIFICA A DIARIO

CONVENCIONES: SI , NO , NA

Item	EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Los arnés tiene la ficha de identificación del fabricante con el registro de las inspecciones realizadas?		✓	✓	✓	✓	✓	
2	Las correas de los equipo son ajustables?		✓	✓	✓	✓	✓	
4	Los arnés son cosido y las costuras son de hilo de color diferentes a las cintas del arnés y se encuentran en buen estado?		✓		✓	✓	✓	
5	Los equipos está equipadoss con los puntos de conexión necesarios?		✓	✓	✓	✓	✓	
6	Las eslingas se encuentra sin manchas de Pintura, sin quemaduras y sin Perforaciones?		✓	✓	✓	✓	✓	
7	Los absorbedor de energia de la eslinga (Sin manchas de Pintura, quemaduras, ni Perforaciones)?		✓	✓	✓	✓	✓	
8	Mosquetones / ganchos con doble seguro, libre de roturas, desgaste o abrasión?		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Las cuerdas o guayas de la linea de vida se encuentra libre de roturas, desgaste o abrasión?		✓	✓	✓	✓	✓	
Item	**SISTEMAS DE ACCESO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
1	El soporte o base es de buena calidad, estable y esta nivelada?		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Los soportes, diagonales, escaleras y tuberias están libres de daños, agujeros o defectos		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, materiales, etc.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Los tablones usados son de madera de 2" de grosor		✓	✓	✓	✓	✓	
6	Están libres de partiduras, astilladuras o cualquier defecto		✓	✓	✓	✓	✓	
7	Están amarrados cada uno en sus extremos para prevenir desplazamientos.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (mínimo 2 tablones de 25 cms)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	Están los largueros de la escaleras en buen estado?		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Están los travesaños en buen estado?		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	El ángulo de la escalera está correcto?		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	La escalera está amarrada a una estructura que soporte fijo y seguro?		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

OBSERVACIONES:

PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO:
		VERSION: 02
	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 20-08-2022

FIRMA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	AFILIACIONES			CURSO ALTURAS		22-1-24	23-1-24	24-1-24	25-1-24	26-1-24	27-1-24	
				ARL	EPS	AFP	SI	NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	BOADA ROBLES YEIMER	1026562467	OFICIAL	/	/	/	/								
2	MANOSALVA VELASQUEZ GABRIEL ANGEL	1064712282	OFICIAL	/	/	/	/								
3	JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1043844401	AYUDANTE	/	/	/	/								
4	JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1098821481	OFICIAL	/	/	/	/								
5	JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1127587970	AYUDANTE	/	/	/	/								
6	JOSE LUIS MANCILLA JULIO	1002275995	AYUDANTE	/	/	/	/								
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1004808987	AYUDANTE	/	/	/	/								
8	EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1130275511	OFICIAL	/	/	/	/								
9	YOSNEIDER MACHADO RAMOS	1004825489	AYUDANTE	/	/	/	/								
10	LUIS HEDINSON MURCIA VELASQUEZ	79829910	AYUDANTE	/	/	/	/								
11															
12															
13															
14															
15															

AUTORIZACION: Cualquiera de las partes responsables de la actividad puedde suspender este permiso, si considera que existe una variacion significativa como: temperatura, contaminantes atmosferico, lluvias etc. O en caso de no estar cumpliendo con las medidas de seguridad contempladas

RESPONSABLE COORDINADOR DE ALTURAS

FECHA 22-1-24	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE JUAN LOPEZ	JUAN LOPEZ	JUAN LOPEZ	JUAN LOPEZ	JUAN LOPEZ	JUAN LOPEZ	JUAN LOPEZ	
FIRMA							

LIDER EJECUTANTE

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	
FIRMA							

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE ALTURAS

CODIGO:
VERDION: 01
FECHA: 20-03-2023

Equipo: ARNES CUERPO COMPLETO	Equipo: ESLINGA	Equipo:
Marca del Equipo: ALTAFUERZA	Marca del Equipo: JOSAFG	Marca del Equipo:
Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación
Serial: 17	Serial: 433	Serial:
No. Interno:	No. Interno: 2	No. Interno:
PROYECTO: VENAC	25-1-23	26-1-23	27-1-24	29-1-24	30-1-24	fecha	fecha

Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR ARNES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		/			/			/			/			/								
	Cintas deshilachadas		/			/			/			/			/								
	Desgastadas		/			/			/			/			/								
	Talladuras		/			/			/			/			/								
	Hay torsión (fibras duras o deformadas).		/			/			/			/			/								
	contaminación excesiva por suciedad.		/			/			/			/			/								
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		/			/			/			/			/								
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/			/			/			/			/								
	Degradación por U.V. (pèrdida de color y superficie		/			/			/			/			/								
	Ataque por sustancias químicas		/			/			/			/			/								
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		/			/			/			/			/								
	Otros		/			/			/			/											
Costuras	Abiertas		/			/			/			/			X								
	Hebras sueltas		/			/			/			/			X								
	Reventadas		/			/			/			/			X								
	Otros		/			/			/			/			X								
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y	Desgaste en los extremos		/			/			/			/			X								
	Corrosión		/			/			/			/			X								
	Deformación		/			/			/			/			X								
	Fisuras, golpes, hundimientos.		/			/			/			/			X								
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		/			/			/			/			X								
	Otros		/			/			/			/											
	ESLINGA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Absorbedor	Agujeros		/			/			/			/			X								
	Rasgaduras		/			/			/			/			X								
	Costuras Sueltas o reventadas.		/			/			/			/			X								
	Deterioro		/			/			/			/			X								
	Hebras rotas		/			/			/			/			X								
	Contaminación por Suciedad		/			/			/			/			X								
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		/			/			/			/			X								
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/			/			/			/			X								
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		/			/			/			/			X								
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		/			/			/			/			X								
	Cintas deshilachadas		/			/			/			/			X								
	Desgastadas		/			/			/			/			X								
	Talladuras		/			/			/			/			X								
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		/			/			/			/			X								
	contaminación excesiva por suciedad		/			/			/			/			X								
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		/			/			/			/			X								
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/			/			/			/			X								
	Degradación por U.V. (pèrdida de color y superficie		/			/			/			/			X								
	Ataque por sustancias químicas		/			/			/			/			X								
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		/			/			/			/			X								
	Otros																						
Partes Metálicas Herrajes,	Desgaste en los extremos		/			/			/			/			X								
	Corrosión		/			/			/			/			X								
	Deformación		/			/			/			/			X								
	Fisuras, golpes, hundimientos.		/			/			/			/			X								
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		/			/			/			/			X								
	Otros																						
	LINEA DE VIDA																						
	desgaste en los extremos		/			/			/			/			/								
	corrosion																						
	deformacion																						
OTRO			/			/			/			/			/								

	26-1-24	26-1-23	27-1-24	29-1-24	30-1-24	fecha	fecha
NOMBRE PERSONA QUE LO UTILIZA E INSPECCIONA	Edison P.	Edison P.	Edison	Edison P	Edison
FIRMA					
NOMBRE INSPECTOR SST	J. Lopez	J. Lopez	J. Lopez	J. Lopez	J. Lopez
FIRMA					

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE ALTURAS

CODIGO:
VERDION: 01
FECHA: 20-03-2023

Equipo: ARNES CUERPO COMPLETO	Equipo: ESLINGA	Equipo:	
Marca del Equipo: [illegible]	Marca del Equipo: ZOSAFE	Marca del Equipo:	
Fecha de fabricación 1 2021	Fecha de fabricación 4-24	Fecha de fabricación	
Serial: 19	Serial: 15	Serial:	
No. Interno: 5	No. Interno: 4 5	No. Interno:	
PROYECTO: CENAC	23-1-24	24-1-24	25-1-24	26-1-24	27-1-24	29-1-24	30-1-24

Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR ARNES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		X			X			X			X			X			X			X	
	Cintas deshilachadas		X			X			X			X			X			X			X	
	Desgastadas		X			X			X			X			X			X			X	
	Talladuras		X			X			X			X			X			X			X	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas).		X			X			X			X			X			X			X	
	contaminación excesiva por suciedad.		X			X			X			X			X			X			X	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X			X			X			X	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X			X			X	
	Degradación por U.V. (pèrdida de color y superficie		X			X			X			X			X			X			X	
	Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X			X			X			X	
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X			X			X			X	
	Otros																					
Costuras	Abiertas		X			X			X			X			X			X			X	
	Hebras sueltas		X			X			X			X			X			X			X	
	Reventadas		X			X			X			X			X			X			X	
	Otros		X			X			X			X			X			X			X	
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y	Desgaste en los extremos		X			X			X			X			X			X			X	
	Corrosión		X			X			X			X			X			X			X	
	Deformación		X			X			X			X			X			X			X	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X			X			X			X	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X			X			X			X	
	Otros		X			X			X			X			X			X			X	
	ESLINGA	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
Absorbedor	Agujeros		X			X			X			X			X			X			X	
	Rasgaduras		X			X			X			X			X			X			X	
	Costuras Sueltas o reventadas.		X			X			X			X			X			X			X	
	Deterioro		X			X			X			X			X			X			X	
	Hebras rotas		X			X			X			X			X			X			X	
	Contaminación por Suciedad		X			X			X			X			X			X			X	
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X			X			X			X			X			X			X	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X			X			X	
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		X			X			X			X			X			X			X	
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		X			X			X			X			X			X			X	
	Cintas deshilachadas		X			X			X			X			X			X			X	
	Desgastadas		X			X			X			X			X			X			X	
	Talladuras		X			X			X			X			X			X			X	
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		X			X			X			X			X			X			X	
	contaminación excesiva por suciedad		X			X			X			X			X			X			X	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X			X			X			X	
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X			X			X	
	Degradación por U.V. (pèrdida de color y superficie		X			X			X			X			X			X			X	
	Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X			X			X			X	
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X			X			X			X	
	Otros																					
Partes Metálicas Herrajes,	Desgaste en los extremos		X			X			X			X			X			X			X	
	Corrosión		X			X			X			X			X			X			X	
	Deformación		X			X			X			X			X			X			X	
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X			X			X			X	
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X			X			X			X	
	Otros		X			X			X			X			X			X			X	
	LINEA DE VIDA																					
	desgaste en los extremos		|			|			|			|			|			|			|	
	corrosion																					
	deformacion																					
OTRO																						
		23-1-24			24/01/24			25-1-24			26-1-24			27-1-24			29-1-24			30-1-24		
NOMBRE PERSONA QUE LO UTILIZA E INSPECCIONA					Jorge L Sarabia			Jorge L Sarabia			Jorge L Sarabia			Jorge L Sarabia			Jorge L Sarabia			Jorge L Sarabia		
FIRMA					Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis		
NOMBRE INSPECTOR SST		J. López			J. López			J. López			J. López			J. López			J. López			J. López		
FIRMA																						

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE ALTURAS

CODIGO:
VERSION: 01
FECHA: 20-03-2023

Equipo: ARNES CUERPO COMPLETO	Equipo: ESLINGA	Equipo:
Marca del Equipo: DELTAPLUS	Marca del Equipo: 3M DBI SALA	Marca del Equipo:
Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación
Serial: 130	Serial: 428	Serial:
No. Interno: 6	No. Interno: 6	No. Interno:
PROYECTO: CENAC.	25-1-23	fecha

Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR ARNES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		/																			
	Cintas deshilachadas		/																			
	Desgastadas		/																			
	Talladuras		/																			
	Hay torsión (fibras duras o deformadas).		/																			
	contaminación excesiva por suciedad.		/																			
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		/																			
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/																			
	Degradación por U.V. (pèrdida de color y superficie		/																			
	Ataque por sustancias químicas		/																			
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		/																			
	Otros																					
Costuras	Abiertas		/																			
	Hebras sueltas		/																			
	Reventadas		/																			
	Otros		/																			
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y	Desgaste en los extremos		/																			
	Corrosión		/																			
	Deformación		/																			
	Fisuras, golpes, hundimientos.		/																			
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		/																			
	Otros																					
	ESLINGA	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
Absorbedor	Agujeros		/																			
	Rasgaduras		/																			
	Costuras Sueltas o reventadas.		/																			
	Deterioro		/																			
	Hebras rotas		/																			
	Contaminación por Suciedad		/																			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		/																			
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/																			
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		/																			
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		/																			
	Cintas deshilachadas		/																			
	Desgastadas		/																			
	Talladuras		/																			
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		/																			
	contaminación excesiva por suciedad		/																			
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		/																			
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/																			
	Degradación por U.V. (pèrdida de color y superficie		/																			
	Ataque por sustancias químicas		/																			
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		/																			
	Otros																					
Partes Metálicas Herrajes,	Desgaste en los extremos		/																			
	Corrosión		/																			
	Deformación		/																			
	Fisuras, golpes, hundimientos.		/																			
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		/																			
	Otros																					
	LINEA DE VIDA																					
	desgaste en los extremos		/																			
	corrosion		/																			
	deformacion		/																			
OTRO																						
		25-1-23			fecha			fecha			fecha			fecha			fecha			fecha		
NOMBRE PERSONA QUE LO UTILIZA E INSPECCIONA		YEIMER BECERRA																				
FIRMA																						
NOMBRE INSPECTOR SST		J. LOPEZ																				
FIRMA																						

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE ALTURAS

CODIGO:
VERDION: 01
FECHA: 20-03-2023

Equipo: ARNES CUERPO COMPLETO	Equipo: ESLINGA	Equipo:	
Marca del Equipo: Guardian	Marca del Equipo: 705476	Marca del Equipo:	
Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación	
Serial: 18	Serial: 21410 /430	Serial:	
No. Interno:	No. Interno: 1	No. Interno:	
PROYECTO: CENAC	23-1-24	24-1-24	25-1-24	26-1-24	27-1-24	29-1-24	fecha

Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR ARNES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		/			/			/			/			/			/				
	Cintas deshilachadas		/			/			/			/			/			/				
	Desgastadas		/			/			/			/			/			/				
	Talladuras		/			/			/			/			/			/				
	Hay torsión (fibras duras o deformadas).		/			/			/			/			/			/				
	contaminación excesiva por suciedad.		/			/			/			/			/			/				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		/			/			/			/			/			/				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/			/			/			/			/			/				
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie		/			/			/			/			/			/				
	Ataque por sustancias químicas		/			/			/			/			/			/				
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		/			/			/			/			/			/				
	Otros											/			/			/				
Costuras	Abiertas		/			/			/			/			/			/				
	Hebras sueltas		/			/			/			/			/			/				
	Reventadas		/			/			/			/			/			/				
	Otros		/			/			/			/			/			/				
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y	Desgaste en los extremos		/			/			/			/			/			/				
	Corrosión		/			/			/			/			/			/				
	Deformación		/			/			/			/			/			/				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		/			/			/			/			/			/				
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		/			/			/			/			/			/				
	Otros		/			/			/			/			/			/				
	ESLINGA	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
Absorbedor	Agujeros		/			/			/			/			/			/				
	Rasgaduras		/			/			/			/			/			/				
	Costuras Sueltas o reventadas.		/			/			/			/			/			/				
	Deterioro		/			/			/			/			/			/				
	Hebras rotas		/			/			/			/			/			/				
	Contaminación por Suciedad		/			/			/			/			/			/				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		/			/			/			/			/			/				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/			/			/			/			/			/				
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		/			/			/			/			/			/				
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		/			/			/			/			/			/				
	Cintas deshilachadas		/			/			/			/			/			/				
	Desgastadas		/			/			/			/			/			/				
	Talladuras		/			/			/			/			/			/				
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		/			/			/			/			/			/				
	contaminación excesiva por suciedad		/			/			/			/			/			/				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		/			/			/			/			/			/				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		/			/			/			/			/			/				
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie		/			/			/			/			/			/				
	Ataque por sustancias químicas		/			/			/			/			/			/				
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		/			/			/			/			/			/				
	Otros		/			/			/			/			/			/				
Partes Metálicas Herrajes,	Desgaste en los extremos		/			/			/			/			/			/				
	Corrosión		/			/			/			/			/			/				
	Deformación		/			/			/			/			/			/				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		/			/			/			/			/			/				
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		/			/			/			/			/			/				
	Otros											/			/			/				
	LINEA DE VIDA		/			/			/			/			/			/				
	desgaste en los extremos		/			/			/			/			/			/				
			/			/			/			/			/			/				
	corrosion		/			/			/			/			/			/				
	deformacion		/			/			/			/			/			/				
OTRO			/			/			/			/			/			/				

	23-1-24	24-1-24	25-1-24	26-1-24	27-1-24	29-1-24	fecha
NOMBRE PERSONA QUE LO UTILIZA E INSPECCIONA	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	
FIRMA	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	
NOMBRE INSPECTOR SST	J. Lopez	J. Lopez	J. Lopez	J. Lopez	J. Lopez	J. Lopez	
FIRMA							

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE ALTURAS

CODIGO:
VERDION: 01
FECHA: 20-03-2023

Equipo: ARNES CUERPO COMPLETO			Equipo: ESLINGA																				
Marca del Equipo: ALTAPOINT			Marca del Equipo: PROTECTA																				
Fecha de fabricación 4766			Fecha de fabricación 23/08/																				
Serial: 05			Serial: 19110 1671																				
No. Interno: 3			No. Interno:																				
PROYECTO: CENAC			27-1-24			fecha			fecha			fecha			fecha			fecha			fecha		
Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR ARNES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		X																				
	Cintas deshilachadas		X																				
	Desgastadas		X																				
	Talladuras		X																				
	Hay torsión (fibras duras o deformadas).		X																				
	contaminación excesiva por suciedad.		X																				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X																				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X																				
	Degradación por U.V. (pèrdida de color y superficie		X																				
	Ataque por sustancias químicas		X																				
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X																				
	Otros																						
Costuras	Abiertas		X																				
	Hebras sueltas		X																				
	Reventadas		X																				
	Otros		X																				
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y	Desgaste en los extremos		X																				
	Corrosión		X																				
	Deformación		X																				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X																				
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X																				
	Otros																						
ESLINGA		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Absorbedor	Agujeros		X																				
	Rasgaduras		X																				
	Costuras Sueltas o reventadas.		X																				
	Deterioro		X																				
	Hebras rotas		X																				
	Contaminación por Suciedad		X																				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X																				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X																				
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		X																				
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		X																				
	Cintas deshilachadas		X																				
	Desgastadas		X																				
	Talladuras		X																				
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		X																				
	contaminación excesiva por suciedad		X																				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X																				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X																				
	Degradación por U.V. (pèrdida de color y superficie		X																				
	Ataque por sustancias químicas		X																				
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X																				
	Otros																						
Partes Metálicas Herrajes,	Desgaste en los extremos		X																				
	Corrosión		X																				
	Deformación		X																				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X																				
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X																				
	Otros																						
LINEA DE VIDA																							
desgaste en los extremos																							
corrosion																							
deformacion																							
OTRO																							
					27-1-24			fecha			fecha			fecha			fecha			fecha			fecha	
NOMBRE PERSONA QUE LO UTILIZA E INSPECCIONA					Luis Mora																		
FIRMA																							
NOMBRE INSPECTOR SST					Luis																		
FIRMA																							

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE ALTURAS

CODIGO:
VERDION: 01
FECHA: 20-03-2023

Equipo: ARNES CURPO COMPLETO	Equipo: ESLINGA	Equipo:	
Marca del Equipo: ALPHAJOICA	Marca del Equipo: INSAFE	Marca del Equipo:	
Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación	
Serial: 03	Serial: 430	Serial:	
No. Interno: 4	No. Interno: 4	No. Interno:	
PROYECTO: CENAC	23-1-24	24-1-24	25-1-24	27-1-24	29-1-24	30-1-24	fecha

Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR ARNES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		X			X			X			X			X			X				
	Cintas deshilachadas		X			X			X			X			X			X				
	Desgastadas		X			X			X			X			X			X				
	Talladuras		X			X			X			X			X			X				
	Hay torsión (fibras duras o deformadas).		X			X			X			X			X			X				
	contaminación excesiva por suciedad		X			X			X			X			X			X				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X			X			X				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X			X				
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie		X			X			X			X			X			X				
	Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X			X			X				
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X			X			X				
	Otros																					
Costuras	Abiertas		X			X			X			X			X			X				
	Hebras sueltas		X			X			X			X			X			X				
	Reventadas		X			X			X			X			X			X				
	Otros		X			X			X			X			X			X				
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y	Desgaste en los extremos		X			X			X			X			X			X				
	Corrosión		X			X			X			X			X			X				
	Deformación		X			X			X			X			X			X				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X			X			X				
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X			X			X				
	Otros																					
	ESLINGA	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
Absorbedor	Agujeros		X			X			X			X			X			X				
	Rasgaduras		X			X			X			X			X			X				
	Costuras Sueltas o reventadas.		X			X			X			X			X			X				
	Deterioro		X			X			X			X			X			X				
	Hebras rotas		X			X			X			X			X			X				
	Contaminación por Suciedad		X			X			X			X			X			X				
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X			X			X			X			X			X				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X			X				
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		X			X			X			X			X			X				
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		X			X			X			X			X			X				
	Cintas deshilachadas		X			X			X			X			X			X				
	Desgastadas		X			X			X			X			X			X				
	Talladuras		X			X			X			X			X			X				
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		X			X			X			X			X			X				
	contaminación excesiva por suciedad		X			X			X			X			X			X				
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X			X			X				
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X			X				
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie		X			X			X			X			X			X				
	Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X			X			X				
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X			X			X				
	Otros																					
Partes Metálicas Herrajes,	Desgaste en los extremos		X			X			X			X			X			X				
	Corrosión		X			X			X			X			X			X				
	Deformación		X			X			X			X			X			X				
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X			X			X				
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X			X			X				
	Otros		X			X			X			X			X			X				
	LINEA DE VIDA																					
	desgaste en los extremos																					
	corrosion																					
	deformacion																					
OTRO																						
		23/01/24			24-1-24			25-1-24			27-1-24			29-1-24			30-1-24			fecha		
NOMBRE PERSONA QUE LO UTILIZA E INSPECCIONA		Gabriel			Marcos			Marcos			Marcos			Marcos			Marcos					
FIRMA																						
NOMBRE INSPECTOR SST		J. Lopez			J. Lopez			J. Lopez			J. Lopez			J. Lopez			J. Lopez					
FIRMA																						

Powered by CamScanner

				SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		FECHA:05: MAR 22 VERSION:001		
				EPP																				
FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	CASCO CON BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	RESPIRADOR REUTILIZABLE	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE CARNAZA	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA	PONCHO IMPERMEABLE	PETO DE CARNAZA	OVEROL TALLA PANTALON	OVEROL TALLA BUZO	OVEROL TALLA BOTA	INICIAL	REPOSICION	OBSERVACIONES (OTRAS ESPECIFICACIONES DEL EPP)	FIRMA DEL TRABAJADOR
15-1-24	[illegible]	1026362402	[illegible]	/	/	/				/			/				/		/			
"	[illegible]	1064711762	[illegible]	/	/	/				/			/				/		/			
"	[illegible]	1043844440	AUX.	/	/	/				/			/				/		/		GUANTES/GAFAS	
"	[illegible]	1098221481	AUXILIA	/	/	/				/			/				/		/		GUANTES	
"	[illegible]	1127582780	[illegible]	/	/	/				/			/				/		/		GUANTES	
"	[illegible]	1002735995	AUX	/	/	/				/			/				/		/		GUANTES	
"	[illegible]	1004[illegible]	AUX.	/	/	/				/			/				/		/		GUANTES	
"	[illegible]	1007[illegible]	[illegible]	/	/	/				/			/				/		/		GUANTES	
"	[illegible]	1004[illegible]	AUXILIA	/	/	/				/			/				/		/		GUANTES	
"	[illegible]	79876910	AUX.	/	/	/				/			/				/		/		GUANTES	
"	[illegible]	1094543131	AUX	/	/	/				/			/				/		/		[illegible]	
12	[illegible]	80226344	SST	/	/	/				/			/						/			

NOTA: RECIBO LOS ELEMENTOS Y ME RESPONSABILIZO DEL CUIDADO Y USO DE LOS MISMOS. PARA SU REPOSICION SE ENTREGA EL ELEMENTO A REPONER

REPOSICIÓN DEL 22 AL 27 DE ENERO

Powered by CamScanner

FT-SST-140 PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

Área de Trabajo y/o Proyecto: CURSO BASICO TEATRO

Marca de Equipo: BOSCH

Marque con una X según corresponda; B: bueno M: malo N.T: no tiene

N°	ITEM	Lunes			Martes			Miercoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
		día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día 15	mes 1	año 24	día 26	mes 1	año 24	día 27	mes 1	año 24	día	mes	año
		B	M	N.T	B	M	N.T	B	M	N.T	B	M	N.T	B	M	N.T	B	M	N.T	B	M	N.T
1	Estado de la carcaza										/			/			/					
2	Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)										/			/			/					
3	Estado de instalación del disco (insertación)										/			/			/					
4	Estado de las marcas de posición para 45° y 0°										/			/			/					
5	Estado e instalación del mango										/			/			/					
6	Estado del interruptor de encendido y apagado										/			/			/					
7	Estado de la guía de la guarda										/			/			/					
8	Estado del disco										/			/			/					
9	Estado general de la sierra (fisuras, rupturas, aseo, etc.)										/			/			/					
10	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor										/			/			/					
11	Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados										/			/			/					
	El equipo se puede utilizar?	SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐		SI ☒	NO ☐		SI ☒	NO ☐		SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐	
	OBSERVACIONES																					

Con mi firma que aparece en este documento, autorizo B&H CONSTRUOBRAS S.A.S de manera previa, expresa e inequívoca, el tratamiento de mis datos personales aquí consignados. Así mismo, declaro que conozco y acepto los lineamientos contenidos en la Política de Tratamiento Protección de Datos Personales que la organización ha adoptado

TRABAJADOR ENCARGADO DE EJECUTAR LA LABOR

NOMBRE OPERADOR/CEDULA GABRIEL MANOSALVA							
NOMBRE OPERADOR/CEDULA JEIFER BOADA							
NOMBRE OPERADOR/CEDULA JAVIER ESMITH.							
NOMBRE OPERADOR/CEDULA							

INSPECTOR SISO CONTRATISTA

NOMBRE LEGIBLE				Juan Lopez	J. López	T. Lopez	
CEDULA				80229344			

FIRMA DEL ENCARGADO

NOMBRE LEGIBLE							
CEDULA							

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SUPERVISOR YEIMER BOADA
INSPECCIONADO POR: GABRIEL MANOSALVA.
SEMANA DEL 22 **AL** 27 **DE** ENERO **20** 2024

SERIE:
MODELO::
MARCA:



DESCRIPCION	APLICA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Se verificó el voltaje de la pulidora? *																	
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra)																	
Estado de insertación del disco *																	
Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada) *																	
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.																	
Estado del swicthe de encendido y automático.																	
Estado de la guía de la pulidora y de la guarda. *																	
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo. *																	
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado																	
Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).																	
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).																	
Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador. *																	
Nombre operador/CC. Al firmar declaro que me encuentro en adecuadas condiciones de salud para trabajar. GABRIEL MANOSALVA	Firma diaria																
Nombre operador/CC. Al firmar declaro que me encuentro en adecuadas condiciones de salud para trabajar. YEIMER BOADA	Firma diaria																
Nombre operador/CC. Al firmar declaro que me encuentro en adecuadas condiciones de salud para trabajar. LUIS MURCIA	Firma diaria																
Nombre operador/CC. Al firmar declaro que me encuentro en adecuadas condiciones de salud para trabajar.	Firma diaria																
Inspector SISO contratista JUAN JOSE LOPEZ CAJAMARCA	Firma diaria																

B : BUEN ESTADO **M : MAL ESTADO**

B.

*** = Si no cumple Inhabilita el equipo para trabajar**

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No: FT-SST-060	
	SG-SST	
LISTADO PERSONAL DEL PROYECTO		Fecha: Enero 10 de 2024
		Versión: 001
		Pagina 1

CONTRATO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO BOGOTÁ

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION	TELEFONO	CARGO	EMPRESA CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA	CURSO TRABAJO EN ALTURAS		FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AREA	RH	EPS	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION	ALERGICO (A)	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	CIUDAD	NOMBRE DE LA PERSONA PARA AVISO EN CASO DE EMERGENCIA	PARENTESCO	TELÉFONO
						FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO															
1	JOSE LEONEL ROFRIGUEZ	79.387.420		ARQ. RESIDENTE	CONSORCIO CENAC	N/A	N/A	27-dic-23	ACTIVO	ADM Y OPERATIVA	OP	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	CAFAM	NO	joseleo64@hotmail.com	Km 1.5 variante cota Chia Conjunto Palo de Agua	COTA	Margarita Salas	Esposa	3105586466
2	JONATHAN NAVARRO	1.065.657.611	3167116074	ING. RESIDENTE	CONSORCIO CENAC	N/A	N/A	9-ene-24	ACTIVO	ADM Y OPERATIVA	A-	SANITAS	PORVENIR	SURA	CAFAM	NO	jonathannavarro19@hotmail.com	Cll 150A # 45-50 apto 404	Bogotá	Shelsy Pedraza	Compañera	3203908627
3	OLGA LUCÍA LONDOÑO S	52.192.680	3114866260	SST RESIDENTE	CONSORCIO CENAC	27/03/2024	28/03/2024	9-ene-24	ACTIVO	ADM Y OPERATIVA	OP	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	CAFAM	NO	olonsa1@gmail.com	Cra 32#17-198 t 4 apto 102	Soacha C.V	Angelita Emperatriz Salcedo	Madre	3204434796
4	HERLIN MONTENEGRO	72.241.066	3137164058	ALMACENISTA	CONSORCIO CENAC	16/06/2023	15/12/2024	27-dic-23	ACTIVO	OPERATIVA	OP	SALUD TOTAL	FONDO N A	SURA	CAFAM	NO	montenegro.roa@gmail.com	Cra 1A #5-18 SUR	MADRID	Sandra Juliana Celis	Compañera	3208177786
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
