CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 8

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, FEBRERO 2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 8

Página: 1 de

DIA	15	MES	2	AÑO	2024

SEMANA N°	8	DEL	8 de enero	AL	14 de febrero
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS					ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA			PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES						
	1.04	100,00% DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros).	100%	70%	DEL CAPITULO PRELIMINARES HACEN FALTA ACTIVIDADES DE: DESMONTE CUBIERTA, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN MADERA, MANTENIMIENTO DE CIELO RASO, MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN MADERAS	NO SE HA AVANZADO DEBIDO A FALTA DE ACLARACION EN LOS DISEÑOS Y ADICIONALMENTE POR LOS ATRASOS OCACIONADES POR PARTE DE TERCEROS-ENTREGA DE ESPACIOS, SALIDA DE SILLAS, INGRESOS AL TEATRO.
	1.07	100,00% DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	100%	100%	ACTIVIDADES DEL CAPITULO DE CIMIENTOS, CAPITULO DE INSTALACIONES SANITARIAS E HIDROSANITARIAS	NO SE HA AVANZADO DEBIDO A FALTA DE ACLARACION EN LOS DISEÑOS Y ADICIONALMENTE POR LOS ATRASOS OCACIONADES POR PARTE DE TERCEROS-ENTREGA DE ESPACIOS, SALIDA DE SILLAS, INGRESOS AL TEATRO.
	1.23	100,00% DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros).	100%	100%	ACTIVIDADES DEL CAPITULO ELECTRICO	NO SE HA AVANZADO DEBIDO A FALTA DE ACLARACION EN LOS DISEÑOS Y ADICIONALMENTE POR LOS ATRASOS OCACIONADES POR PARTE DE TERCEROS-ENTREGA DE ESPACIOS, SALIDA DE SILLAS, INGRESOS AL TEATRO.
	1.32	100,00% DESMONTE REVESTIMIENTO MURO EN MADERA. (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	100%	100%		
TOTALES						

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 8	ACUMULADO
	$ 6.550.417.531,15	SEMANAL	32.792.520,12	6.517.625.011,03		14,01%	24,83%
		% semanal	0,50%				
		ACUMULADO	152.419.240,84				
		% acumulado	2,33%				

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
MIERCOLES	8/02/2024	11	3	2	16,00
JUEVES	9/02/2024	11	3	2	16,00
VIERNES	10/02/2024	11	4	2	17,00
SABADO	11/02/2024	11	3	2	16,00
DOMINGO	12/02/2024	0	0	0	0,00
LUNES	13/02/2024	11	3	2	16,00
MARTES	14/02/2024	11	3	2	16,00
MIERCOLES	15/02/2024	12	3	2	17,00

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	8/02/2024	SOLEADO	LLUVIA	
	9/02/2024	SOLEADO	LLUVIA	
	10/02/2024	SOLEADO	LLUVIA	
	11/02/2024	NUBLADO	LLUVIA	
	12/02/2024			NO
	13/02/2024	NUBLADO	LLUVIA	
	14/02/2024	LLUVIA	LLUVIA	
	15/02/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

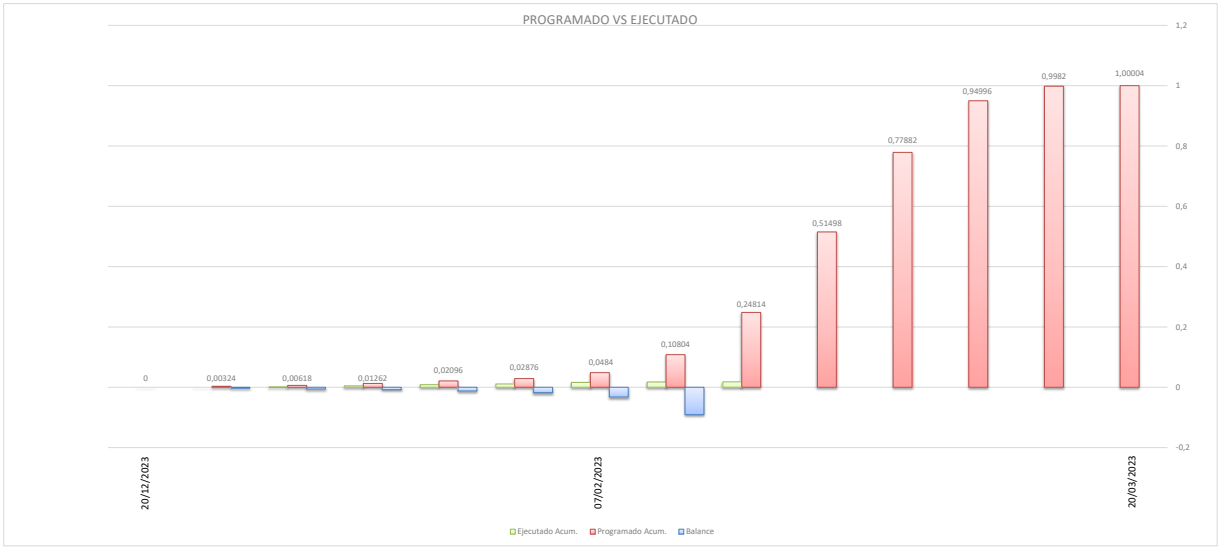

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fecha	20/12/2023	27/12/2023	3/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	7/02/2024	14/02/2024					20/03/2024
Progr. Semanal		0,32%	0,29%	0,64%	0,83%	0,78%	1,96%	5,96%	14,01%	26,68%	26,38%	17,11%	4,82%	0,18%
Programado Acum.	0%	0,32%	0,62%	1,26%	2,10%	2,88%	4,84%	10,80%	24,81%	51,50%	77,88%	95,00%	99,82%	100,00%
Ejec. Semanal		0,00%	0,05%	0,41%	0,39%	0,24%	0,52%	0,12%	0,50%					
Ejecutado Acum.		0,00%	0,05%	0,46%	0,85%	1,09%	1,61%	1,73%	2,33%					
Balance		-0,32%	-0,57%	-0,80%	-1,25%	-1,79%	-3,23%	-9,07%	-22,48%					

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 8

Página: 1 de				DIA	15	MES	2	AÑO	2024
SEMANA N°	8	**DEL**	8 de enero			**AL**	14 de febrero		

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Demolicion enchape de piso	Se realiza la demolicion del enchape de piso del area de sotano		
Demolicicion muro en ladrillo	Se realiza la demolicion del muro lateral de la escalera exterior		
Demolicion de guarda escobas	Se realiza demolicion del guarda escoba de area de sotano-camerinos		
Actividades - NO PREVISTAS	Se realiza mesa de trabajo en conjunto con el contratista de obra-del 2do grupo de NPs, se realizan observaciones y se solicita reporte de justificacion de los mismos.		
PMT	Se emite aprobacion del Plan de PMT- la interventoria escala a aprobación y el plano a la supervisión del contrato		
Desmonte de revestimiento de madera	Teniendo en cuenta la observacion realizada por el equipo de diseño mediante comité el dia 31 de enero, se realiza desmonte de paneles de madera del area de auditorio y se toma como item el revestimiento de madera para su cuantificación.		
Orden y aseo	El contratista de obra realiza limpieza y levantamiento de escombros del area de auditorio.		
OBSERVACIONES: A la fecha 14 de febrero se sontinua sin definición de las observaciones emitidas desde el pasado 15 de enero y las cuales son de importancia para la continuidad de la ejecuciones			
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Gestión de comunicaciones	Se realiza comité en instalaciones del Teatro Patria en conjunto con los profesionales del COING, CENAC, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA. A fecha 15 de febrero se emite por parte de esta interventoria trabajado en conjunto con el contratista de obra la primera versión del Balance de Obra No. 1 A la fecha no se tiene respuesta por parte del COING de las observaciones emitidas el pasado 31 de enero de 2024		
Interventoría- Listado de personal	A la fecha No se ha actualizado el listado del personal de obra- Se continua con el documento radicado en el Basem con fecha de 12 de febrero de 2024		
Contratista-Listado de personal	Reporte de listado radicado por el contratista según datos informados a la inteventoria	El contratista de obra a cumplido con con los protocolos solicitados por el B13 para el ingreso del personal.	
Gestion de comunicación-y cumplimiento de SGSST	Solicitud de actuaizacion de listado de ingreso de personal. Solicitud de la revisión del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo		
ASPECTOS FINANCIEROS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Anticipo-contratista de obra	A la fecha 14 de febrero no se ha realizado el deposito del anticipo por parte de la entidad contratante.		
ASPECTOS SST	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Charlas de Seguirdad	Se realizan charlas de seguridad diarias, dirigidas por el inspector SST del subcontratista y pausas activas.	La interventoria constantemente realiza seguimiento al contratista verificando que a medida que avanza la obra se de cumplimiento a lo requerido según lo estipula la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la Resolución 0312 del 2019 y la Resolución 1072 del 2015 y demas que lo rigen.	
Documentación SST de contratista	El contratista de obra envio por correo electrónico a interventoria la documentación referente del área SST y Ambiental con sus evidenciaas, a lo cual se le realizo la respectiva revisión y se le sociaizan las observaciones en campo y se subsanan por parte del contratista para su respectiva aprobación.		
Trabajos de alto riesgo	Se realizan trabajos en altura en el desmonte del cielo raso curvo y se revisan en campo los permisos de trabajo en alturas, los Analisis de Trabajo Seguro ATS y se verifican los cursos de altura en el ministerio de trabajo y corroborando con el cntro de enrenamiento, cumpliendo con la resolucion 4272 de 2021.		
ASPECTOS AMBIENTALES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Disposicion final	La interventoria cuenta con los documentos de la escombrera GRECO SAS	El contratista de obra entrega la documentacion ambiental de la escombrera GRECO SAS, entidad encarga de darle manejo de disposición final de residuos de escombro.	
Punto ecologico	El contratista de obra ha instalado un punto ecologico en cajas con las bolsas del color que corresponde, verde, negra y blanca, según la resolucion 2184 del 2019.	Se hara seguimiento en obra sobre la adecuada casificacion de los residuos y se solicitara al contrtista de obra adecuar las canecas plasticas señalizado y con el color correspondiente.	
Acopio material	La interventoria hace seguimiento a los acopios de materiales y residuos.	El contratista de obra ha instalado la señalización de los acopios, cumple con el cubrimiento adecuado de ellos, cumpliendo con el Plan de Manejo Ambiental PMA ofertado.	

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 8

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	8	DEL	8 DE FEBRERO	AL	15 DE FEBRERO	
FECHA INICIO :	9/12/2020	FECHA TERMINO :	3/02/2021			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272


VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN:	TANQUE DE AGUA
ACTIVIDAD	REPLANTEO- DIMENSIONES NO COINCIDEN CON ESPACIO EN TERRENO



UBICACIÓN:	TANQUE DE AGUA
ACTIVIDAD	DEMOICION PLACA SUPERIOR DEL TANQUE DE AGUA



UBICACIÓN:	TANQUE DE AGUA
ACTIVIDAD	DESMONTE TABLERO ELECTRICO-BOMBA TANQUE DE AGUA



UBICACIÓN:	TANQUE DE AGUA
ACTIVIDAD	EVACUACION 42 CUBOS DE AGUA



UBICACIÓN:	DISTRIBUIDOR 1 PISO
ACTIVIDAD	SALIDA DE ESCOMBRO-DEMOLICION DE PISOS



UBICACIÓN:	CAFETERIA
ACTIVIDAD	ACOPIO DE BOMBA -TANQUE- EL PERSONAL DELBASEN RETIRARON LOS EQUIPOS EL DIA



UBICACIÓN:	MEZANNINE-COSTADO NORTE
ACTIVIDAD	DEMOLICION DE PLACA



UBICACIÓN:	SOTANO
ACTIVIDAD	ESTRUCTURA DE TARIMA A LA VISTA-REVISION



UBICACIÓN:	SOTANO
ACTIVIDAD	DESMONTE DE REVESTIMIENTO EN MADERA Y MUEBLES DE CAMERINO



UBICACIÓN:	AUDITORIO
ACTIVIDAD	VISITA ALTO MANDO-GEENERAL SEPULVEDA



UBICACIÓN:	AUDITORIO
ACTIVIDAD	SALIDA DE MATERIAL DESMONTADO-ESTRUCTURA DE MADERA DEL CIELO RASO



UBICACIÓN:	SOTANO
ACTIVIDAD	REVISION DE CONDICIONES LOCATIVAS



UBICACIÓN:	MEZANNINE COSTADO SUR
ACTIVIDAD	REVISION DE EQUIPOS Y CONDICIONES DEL ESPACIO PARA FUTURA DEMOLICION



UBICACIÓN:	MEZANNINE COSTADO SUR
ACTIVIDAD	EQUIPOS EXISTENTES



UBICACIÓN:	AUDITORIO
ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE AUDITORIO

UBICACIÓN:	TANQUE DE AGUA	UBICACIÓN:	ESCALERAS EXTERIORES	UBICACIÓN:	ZONA DE ACOPIO
ACTIVIDAD	REVISION CONDICIONES CONSTRUCTUVAS TANQUE	ACTIVIDAD	REVISION TABLEROS ELECTRICOS Y CONDICION DE TRASLADO	ACTIVIDAD	SALIDA DE MATERIALES DESMONTADOS


UBICACIÓN:	AUDITORIO	UBICACIÓN:	AUDITORIO	UBICACIÓN:	CERRAMIENTO
ACTIVIDAD	SE CONTINUA CON LIMPIEZA DE ESPACIOS DE AUDITORIO	ACTIVIDAD	Se culmina con actividades de desmonte de panel acustico	ACTIVIDAD	ZONA DE ACOPIO DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y DEMOLIDOS

UBICACIÓN:	VESTIBULO	UBICACIÓN:	TERRAZA 2 PISO	UBICACIÓN:	MEZANNINE
ACTIVIDAD	DESMONTE DUCTERIA ELECTRICA EN MALAS CONDICIONES	ACTIVIDAD	APOSAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS- NECESIDAD DE DEMOLICION DEL MORTERO DE NIVELACIÓN PARA INSTALACION DEL NUEVO IMPERMEABILIZANTE.	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE AREA DE MEZANNINE

UBICACIÓN:	CERRAMIENTO	UBICACIÓN:	SOTANO	UBICACIÓN:	SOTANO
ACTIVIDAD	SALIDA DE MATERIAL DE ESCOMBRO	ACTIVIDAD	SE CONTINNUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTE DE REVESTIMINETO DE MADERA	ACTIVIDAD	DESMONTE DE MOBILIARO

UBICACIÓN:	ESCALERA EXTERIOR	UBICACIÓN:	SOTANO	UBICACIÓN:	VESTIBULO
ACTIVIDAD	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO Y DESMONTE DE PUERTA CORREDIZA	ACTIVIDAD	ESTRUCTURA EN MAL ESTADO-SE REQUIERE TRATAMIENTO A LA MADERA	ACTIVIDAD	SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS

UBICACIÓN:	TERRAZZA 2 PISO	UBICACIÓN:	CAFETERIA	UBICACIÓN:	MEZANNINE
ACTIVIDAD	VISITA CON EL EQUIPO DEL COING-CENAC-CONTRATISTA-E INTERVENTORIA PARA REVISION DE OBSERVACIONES DE DISEÑO	ACTIVIDAD	VISITA CON EL EQUIPO DEL COING-CENAC-CONTRATISTA-E INTERVENTORIA PARA REVISION DE OBSERVACIONES DE DISEÑO	ACTIVIDAD	VISITA CON EL EQUIPO DEL COING-CENAC-CONTRATISTA-E INTERVENTORIA PARA REVISION DE OBSERVACIONES DE DISEÑO

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**			**Página:**
SEMANA N°	8	**DEL**	08 DE FEBRERO			**AL**		14 DE FEBRERO
FECHA INICIO :	20/12/2023		**FECHA TERMINO :**	18/03/2024				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS**	**NIT O C.C.**	**860 524 16-8**	**CONTRATO N°**	**314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901 759 617 - 0**	**CONTRATO N°**	**272-CENANCINGENIEROS-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	COSTADO NORTE DENTRO DEL CERRAMIENTO
COMENTARIOS:	**RETIRO DE MADERA**



UBICACIÓN:	COSTADO SUR DENTRO DEL BATALLON TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**SEÑALIZACION ACOPIO DE RCD**



UBICACIÓN:	COSTADO NORTE CALLE 106 TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE ARENA DE PEÑA PROTEGIDA**



UBICACIÓN:	COSTADO NORTE CALLE 106 TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE MADERA**



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ORDEN Y ASEO**




UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ACOPIO DE RCD**



UBICACIÓN:	COSTADO NORTE CALLE 106 TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**CARGUE DE MADERA**



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**RETIRO DE RESIDUOS**



UBICACIÓN:	COSTADO NORTE CALLE 106 TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**EQUIPOS Y MAQUINARIA**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL	
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**			**Página:**	
SEMANA N°	8	**DEL**	08 DE FEBRERO			**AL**	14 DE FEBRERO		
FECHA INICIO :	20/12/2023		**FECHA TERMINO :**	18/03/2024					


I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS**	**NIT O C.C.**	**860 524 16-8**	**CONTRATO N°**	**314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901 759 617 - 0**	**CONTRATO N°**	**272-CENANCINGENIEROS-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	COSTADO SUR TEATRO PATRIA DENTRO DEL BATALLON
COMENTARIOS:	**SEÑALIZACIÓN**

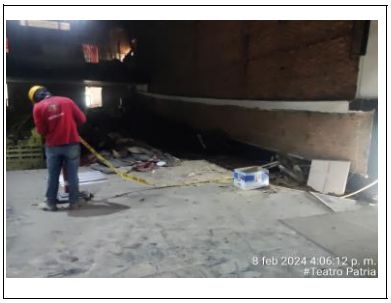

UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN**



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**RECORRIDO INGENIEROS CENAC**



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**COMITÉ DE OBRA**



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**UBICACIÓN DE LA CAMILLA CERCA A CAMPAMENTO**



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**EXTINTORES VIGENTES**



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**CAPACITACIONES Y CHARLAS AL PERSONAL**



UBICACIÓN:	PARTE INTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**ARMADO Y VERIFICACION DE ANDAMIOS**



UBICACIÓN:	CUBIERTA TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**TRABAJO EN ALTURAS POR DESMONTE DE CIELO RAZO**



UBICACIÓN:	PARTE EXTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**SEÑALIZACION**



UBICACIÓN:	PARTE EXTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**SEÑALIZACION**



UBICACIÓN:	PARTE EXTERNA DEL TEATRO PATRIA
COMENTARIOS:	**SEÑALIZACION**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

Actividades Ejecutadas.
Nota: el Apoyo SST renuncio de su puesto de trabajo - las actividades seguiran igualmente supervisadas por la residente sst del contratista de Obra.
- Se da inicio actividades de demolicion de tanque de Agua.
- No se ha dado Salida al agua existente al del tanque. Se solicita realizar la excavacion para continuar con la actividad oportunamente.
- Se evidencia llegada de mobiliario de Oficinas / contenedor
- Se da inicio a la demolición de la placa de concreto del area de mezzanine. del camerino costado Norte.
- Se realiza viajes (2) de escombros para apoyo al batallón de Caballeria.
- Se realiza desmonte de Andamio.
- Se evidencia ingreso de 16m3 de Arena de Peña. Se Solicita al contratista proteger el material. y dejarlo señalizado. para evitar Su contaminacion.
- Se Solicita Orden y aseo en el area. de distribuidor.

PL. SST.

- Se solicito retiro de la bomba del tanque del agua y la iluminación desmontada al Cabo Monterrosa quien notifica que se realizara el retiro el día 09 de febrero.

Salomé Peñaranda C.
Ing. Interven. SST-MA

7:00 am	8 de Febrero /2024.	Clima Nublado
	Personal Contratista.	
	- Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST	
	- Almacenista, Maestro (1) Obreros (11).	
	Personal Interventoria.	
	Residente Interventoria	
	Residente SST	

Powered by CamScanner

- Actividades Ejecutadas
- El contratista de Obra continua con la Demolición de la Capa Superior del Tanque del Agua.
- Se realiza replanteo Segun la información encontrada en la planimetria.- Se evidencia que en el plano no se tiene referenciado lo Siguiente: 3 Cajas de Suministro (costado norte) 1 caja electrica (costado oriental) y 1 caja de polo a tierra (costado Sur). Las dimensiones solicitadas no corresponden con la localización en terreno. Se debe evaluar si se profundiza la dimensión y Si Se deben trasladar las cajas de Suministro en primera Instancia.- Se debe solicitar revisión por el CONTO. para el rediseño y el nuevo planteamiento estructural.
- Se continua con actividades de demolicion de placa de concreto Mezzanine costado NORTE.- Se evidencia que cuenta con dos (2) Camas de hierro.
- Se da continuidad al al desmonte de revestimiento de madera del area de Sotano.

NOTA: A la fecha no se cuenta con respuesta por parte del CONTO de las observacions emitidas el dia 31 de Enero en 2da Instancia. mediante Comite de Dise en las instalaciones del CENAC.

- Se continua con actividades de trasiego de material al area de acopio exterior.

RT.

7:15 am. | 9 de Febrero /2024 | Clima: Soleado

Personal Contratista

Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST Almacenista, Maestro (1) Obreros (11)

Personal Interventoría
- Residente de Interventoria, Residente SST.
Actividade Ejecutadas:
* Teniendo en cuenta que el dia de ayer 8 de febrero por parte del coronel Villegas. / Basem se nos notifico en horas de la Noche la visita a las instalaciones de General Sepulveda el dia Jueves a las 8:00 am.
- Se encuentra en Sitio personal de la CENAC - Supervisión del contrato - personal olel IBASEM - Coronel Villegas y Cabo Monterrosa, personal del contratista de obra y personal de Interventoría. Se encontraban en teatro a la espera del Coronel. Sepulveda. Teniendo en cuenta que siendo las. 11:00 am y en Ausencia del visitante se realiza recorrido de Obra con la Supervisión y una vez más se socializa los multiples observaciones frente a las actividades que se mencionan contractualmente pero que no se evidencia en la plenitud.

2:00pm Se realiza comite de Obra No 8 - Contratista e Interventoria y Supervisión del contrato.

SRJ.

7:00am 10 de Febrero/2024 Clima: Soleado.
Personal Contratista.
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST.
Almacenista, Maestro (1) Obreros (11).
Personal Interventoria.
Residente Interventoría, Residente SST.
- Actividades Ejecutadas
- Se da continuidad a actividades de demolición de la placa Superior del Tanque.
- Se da continuidad con trasteqo de materiales

a zona de Acopio / Exterior.
-Por parte del contratista se realiza visita de inspección con el especialista electrico. donde manifiesta que se debe realizar una Solicitud ante la entidad CODENSA para la eliminación de Sellos de Seguridad de los tableros ubicados en el area exterior bajo zona de escalera.. Dicha información es necesaria para realizar la revisión y determinar los recorridos del cableado y saber a que edificaciones abastece dentro del Teatro; esto con el fin de tener las herramientas para poder realizar el destapado de los tableros.
-Se evidencia que en la terraza del 2 nivel se presentan aposamientas de agua en el costado Norte.- esto indica que es necesario realizar la demolición del mortero existente (ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA CONTRACTUALMENTE) para poder dar paso al S.T.I del manto asfaltico impermeabilizado Solicitado, esto con el fin de prevenir futuras filtraciones de agua.

Alejandra Reyes

7:30am. 12 de Febrero./2024 Clima: Soleado
Personal Contratista.
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST.
Almacenista, Maestro (1) Obreros (11).
Personal Interventoria
Residente Interventoria, Residente SST.
Actividades ejecutadas
-Se continua con traslado de materiales desmontados y demolidos a area de acopio exterior.
-Se realiza salida de material, madera y escombro (2 viajes).

Powered by CamScanner

- Se realiza por parte del contratista, capacitación y/o charla de Salud y Seguridad en el trabajo.
- Se realiza mesa de trabajo con el contratista de Obra. para revisión de balance No 1.
- A la fecha no se tiene respuesta por parte del comité Sobre observaciones emitidas desde el pasado 31 de enero.
- Se continua con desmonte de revestimiento de madera de muros y cielos del área de Sotano
- Se realiza desmonte de mobiliario de comunes-Sotano.
- Se da Inicio a demolición de muro en ladrillo de la escalera exterior de emergencia - Se realiza desmonte de puerta corrediza de canto técnico.
- Se evidencia que la estructura de tarima cuenta con elementos fisurados - Se requiere realizar tratamiento (inmunizados) y cambio de piezas en deterioro.

R.S.

7:00 13 de Febrero /2024. Clima: Soleada

Personal Contratista.

Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST.

Almacenista, Maestro (1) Oficios (12).

Personal Interventoria.

Residente Interventoria, Residente SST.

Actividades Ejecutadas.

- Se termina con actividad de demolición de escalera-muro en ladrillo.
- Se continua con demolición placa Superior de Tanque de Agua.
- Se continua con limpieza de area de Auditorio - Salida de material desmontado.

- Se termina con la demolición del concreto / placa de mezzanine. - hierros expuestos - contaminados.
- Se realiza limpieza de area mezzanine / escombros
- Se realiza demolición de piso - ceramica en area de Sotano - Cuartos
- Se realiza desmonte de espejos de area de Sotano (3 und). / Se debe verificar ya que no esta el reemplazo de estos elementos en el presupuesto.
- Se da inicio a demolición de mortero de nivelación red de terraza 2 piso. / Ac
- En las terrazas se evidencia que el diametro de las bajantes son insuficientes, es necesario realizar el cambio de la ductería. Información se notificara a la Supervisión.

PRL.

Olma Soleado

7:15 am. 14 de Febrero / 2024.

Personal Contratista

Director de obra, Residente de Obra, Residente SST.

Almacenista, Maestro (1) Oberas (12).

Personal Interventoria.

Residente Interventoria, Residente SST.

Actividades Realizadas.

- Se realiza recorrido de Obra en compañia delos profesionales del COING, CENAC, CONTRATISTA DE OBRA Y INTERVENTORIA.
- En el recorrido se notifica nuevamente al personal de los hallazgos encontrados debido a las demoliciones Desmontes de los elementos solicitados.
- Sotano = Se notifica la necesidad de realizar cambio de viga estructural en madera de la terraza y realizar tratamiento de impregnacion de la estructura

- Se informa de la necesidad del cambio del mobiliario y no de realizar un mantenimiento.
- Se informa de la presencia de humedad en muros y pisos y se solicita contemplar el tratamiento de impermeabilizacion.

* Area de baños hombres 1er piso: Se notifica la necesidad de desmontar 2 und. de lavamanos y desmontar el espejo en su totalidad. esto debido a la apertura del vano/paso para unir los dos unidades sanitarias existentes.
* Nuevas Unidades Sanitarias Mujeres: Se informa que en la planimetria se evidencia continuidad de los muros en el area superior del muro costado Sur./ventanas. el personal del CONIC informa que se dejen los ventanas existente y no se realice el levantamiento de los muros.
* Se identifica. en area de terrazas que es necesario el cambio de enchape de (~~Pintura y~~ de) muro en areas de fachada. costado Oriental.
* Se realiza revisión de las dimensiones del tanque de Agua. y se evidencia que el espacio requerido para el nuevo tanque no cabria en el espacio existente, por la existencia de cinco ejes adjuntos. Por parte del CONIC- informan que enviaran al especialista estructural el dia. 16 de Febrero para su revisión y concepto.
* Se revisa el espacio dela escalera de emergencia ayo espacio. referenciar que los apoyos principales se encuentran ubicados donde existen los tableros electricos.- Se informa que hay que realizar Solicitud de eliminación de Seguros frente a la entidad CODENSA. y realizar cortes. de energia para la revisión de recorridos de Cableado y Suministro de las edificaciones adjuntas.

NOTA: Se informa que todas las actividades NO PREVISTAS se encuentra en el listado x capitulo en el balance NO. 1. y se acbra que es una 1era Versión debido a las multiples necesidades que se requieren Implementar para la

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código:
		Versión: / Pág.
		Vigente desde:

FECHA	15 DE FEBRERO 2024	INFORME No	8	DEL	8/02/2024	AL	14/02/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	$ 524.033.402,49

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
07/022024	1	Se presneta un accidente de trabajo, donde el colaborador estaba armando una puerta en madera y al recoger otro oezado de manera se clava una puntilla en la bota y esta traspaso el pie.
08/022024	1	Se recibe el comunicado CONTRATO234-2023-CENACTEATRO-079-2024 el 08 de febrero de 2024 sobre la carta del SG-SST del consorcio A CRUZ y la interventoria da respuesta mediante el comunicado INP-CEN-314-2023-098 el 13 de febrero.
8/02/2024	1	Se realiza retiro de 1 viaje de madera para un total de 16 m3 en la volqueta de placa SMN 003, con destino a la empresa MAAT, el cargue se realiza de manera manual
10/022024	1	Se recibe el comunicado CONTRATO234-2023-CENACTEATRO-080-2024 el 10 de febrero de 2024 sobre entrega de llaves al cliente.
12/02/2024	1	Se envia comunicado al contratista de obra, dando alcance al comunciado INP-CEN-314-2023-093 sobre el documento de aprobacion del personal para el ingreso a obra por la guardia 13 de la calle 106, mediante el comunicado INP-CEN-314-2023-095 el 12 de febrero.
12/02/2024	1	Se envia comunicado al contratista de obra, solicitando el informe bimensual ambiental a corte del 20 de febrero, mediante el comunicado INP-CEN-314-2023-096 el 12 de febrero.
12/02/2024	1	Se realiza retiro de 1 viaje de escombro para un total de 7 m3 en la volqueta de placa AEB528, con destino a la solicitud realizada por el Batallon de Caballeria se realiza el cargue por medio del bocato
13/02/2024	1	Ingresa 100 bultos de cemento y 2000 bloques Nº 5
14/02/2024	1	Se realiza retiro de 1 viaje de madera para un total de 16 m3 en la volqueta de placa SRO 028, con destino a la empresa MAAT, el cargue se realiza de manera manual
14/02/2024	1	Se realiza retiro de 1 viaje de madera para un total de 16 m3 en la volqueta de placa TMA 7657, con destino a la empresa MAAT, el cargue se realiza de manera manual
15/02/2024	1	El contratista de obra queda a paz y salvo del profesional JUAN JOSE LOPEZ CAJAMARCA quien se retiro el 05 de febrero.
15/02/2024	1	El contratista de obra se encuentra a paz y salvo de pagos de nomina con el personal activo en obra.
15/02/2024	ACTIVIDADES CONTRATISTA DE OBRA	El contratista de obra realiza las siguientes actividades: - Se hicieron inspecciones diarias a la ropa de trabajoy EPP. - Inspección de Epp al momento de utilizar maquina minicargador (uso de gafas de seguridad). - Se hace inspección al personal de sub contratista para verificar el uso de los EPP - Se verifico la asistencia del personal en obra.
15/02/2024	ACTIVIDADES SUB-CONTRATISTA DE OBRA	El subcontratista de obra realiza las siguientes actividades: - Orden y aseo del personal. - Mantenimiento e inspeccion de herramientas. - Demolicion de tanque de agua. - Retiro y acopio de escombro. - Orden y aseo en campamento. - Desmontaje de estructura en madera. - Orden y aseo a la obra especialmente teatro.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista		
Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
La importancia del descanso	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 3 en total
Charla trabajo en equipo	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 3 en total
Charla socializacion del punto de encuentro en la obra	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 3 en total
Video que hacer en caso de un sismo	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 3 en total
Charla la importancia de realizar pausas activas	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 3 en total
Pausas activas fisicas	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 3 en total
Resolucion 4272 del 2021	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 11 en total
Tiempo de hacer un reporte de accidentes	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 11 en total
Charla reporte ante la ARL 48 horas	1	Se realiza para el personal operativo 09 en total
Charla cuidado de manos y pies	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 9 en total
Charla cuidado de la cabeza	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 9 en total
Ropa limpia de trabajo y estilo de vida saludable	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 9 en total
La importancia de llegar a tiempo al trabajo y de reportar la novedad en caso de llegar tarde	1	Se realiza para el personal profesional administrativo 9 en total
Total capacitaciones	**13**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (m3)							
	Escombro (m3)	**Porcentaje cumplimiento RCD (m3)**	**Agua (m3)**	**Madera (m3)**	**Gravilla (m3)**	**Arena (m3)**	**Otros (m3)**
Semanal	7	0	0	48	0	0	0
Mensual (acumulada)	63	0	0	23	0	16	0
Total proyecto	**70**	**0**	**0**	**71**	**0**	**0**	**0**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
Noº. 1-1 Manejo de emisiones atmosfericas y ruido	1	Las emisiones atmosfericas que se generan de las volquetas que han ingresado a obra a realizar el retiro de escombros cumplen con la revision tecnico-mecanica vigente. Se realizan actividades de desmonte cielo raso curvo y demolicion de tanque. El acopio de los RCD de las demoliciones se encuentran dentro del auditorio y en el area externa dentro del cerramiento. Las vias de acceso al audiltorio se encuentran libres de escombros.
Noº. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	No se encuentran sumideros cercanos al teatro que se deban proteger. El teatro cuenta con suministro de agua potable y se tiene previsto la instalacion de medidores para el pago de los servicios publicos.
Noº. 1-3. Manejo de residuos solidos.	1	Se acopian los residuos en el auditorio, cada tipo de residuo tiene un punto destinado de almacenamiento para no mezclarlos. El contratista de obra ha instalado puntos ecologicos en obra. Los residuos como madera en la semana se retiran 48 m3 y se entregan a la empresa MAAT
Noº. 1-4. Señalizaciòn.	1	Los puntos de acopio se han señalizado. Se instala señalizacion en los frentes de trabajo con señales restrictivas, de obligación de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales. Se instala cerramiento en teja de zinc en el costado norte de la bahia de parqueaderos sobre la calle 106 y dentro del batallon se realiza con polisombra verde y parales.
Noº. 1-5. Instalacion y operación de campamentos.	1	Se cuenta con campamentos en containers en la zona del cerramiento en la calle 106.

Noº. 1-6. Manejo operaciòn de maquinaria, equipos y vehiculos.	1	Los equipos que el contratista esta realizando uso en obra son 2 roto-martillos, 1 pulidora, 1 cierra circular., maquinaria amarilla minicargador tipo bobcat. Se realizan inspecciones a los equipos. El 31 de enero ingresan a obra la siguiente maquinaria trompo mezclador, un compactador tipo canguro y rana aun no se usan en obra.
Noº. 1-7. Manejo recolecciòn, transporte y disposicion de RCD.	1	Durante la semana del informe se realizan 1 viaje donado al batallon de Caballeria para una via rural que presenta fallas geologicas por las lluvias.
Noº. 1-8. Manejo de materiales de construccion no petreos.	1	El acopio de arena de peña se protege con plastico.
Noº. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Aun no ingresa materiales granulares a obra.
Noº. 1-10. Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias quimicas.	1	No se han generado residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias quimicas.
Noº. 1-17 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	No se han generado residuos peligrosos.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	4	13	20	25,00	75,00

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	2	0	2
Total proyecto	**0**	**2**	**0**	**2**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	1	0
Total proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

Para la semana del infrome en obra esta el siguiente personal:
11 operativos
1 maestro
1 Almacenista
1 oficial
El subcontratista aun no tiene el inspector SST, se encuentra en proceso de contratacion.
4 Profesionales administrativos.
En la semana del informe no se han presentado casos de afectacion respiratoria.
Durante la semana no se presentaron accidentes de trabajo.
Para la semana del informe ingresa un oficial a obra.

ELABORO



JISELD SOLANYI BENAVIDES
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.1.121.842.928
INPLAYCO S.A.S

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	14	MM	02	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
ANGELA MARIA MORALES GARCIA	52.436.935	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	20	12	2023			
JISELD SOLANYI BENAVIDES CONTRERAS	1.121.842.928	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	20	12	2023			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	14	MM	02	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
LUIS HEDINSON MURCIA ELAZQUEZ	79.829.910	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
LEONARDO DE JESUS ZAPATA SUAREZ	1.099.543.134	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	28	12	23			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA MANO DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSNEIDER MACHADO RAMOS	1.004825489	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	04	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1.130.275.511	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	09	01	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	09	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24			
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
JENNIFER ANDREA GUAYACUNDO BARRAGAN	1.018.512.109	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	15	01	24	16	01	24
JOSÉ LUIS MANCILLA JULIO	1.002.275.995	AYUDANTE	COOSALUD	PORVENIR	SURA	09	01	24			
JUAN JOSE LOPEZ CAJAMARCA	80.229.334	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	19	01	24	05	02	24
JULIO CESAR GONZALEZ	72290173	OFICIAL	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	14	02	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

CONSTRUCTORA A CRUZ

Registro de Asistencia a capacitación

Codigo	F CA SG SST 42A
Versión	1
Fecha	31/07/2023

Datos de la capacitación

Nombre Expositor:	Olga Lucía Londoño S		
Objetivo:	Induccion.		
Fecha:	14/02/2024	Duración:	1 hora.

Temas a tratar

Induccion, Riesgos, peligros, punto de encuentro.

Asistentes

Id.	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
1	Julio Cesar Gonzalez Ruiz	oficial	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Powered by CamScanner

Evaluación de inducción

En los siguientes recuadros marque con una x la respuesta correcta



A quien se reporta una condición insegura		¿como lo prevenimos?	
	Jefe directo		Orden y aseo
X	Encargado Seguridad		Almacenamiento correcto
	A todos		Señalización en áreas peligro
		X	Todas las anteriores



A quien se debe reportar condición con caída objeto		¿como lo prevenimos?	
	Jefe directo		No realizar actividad
X	Encargado se seguridad	Y	Informar condición
	A todos		Realizar protección contra caída
			Todas las anteriores



La imagen CORRESPONDE AL RIESGO		¿como lo prevenimos?
Medio ambiente		Separación de basuras
		Ahorrando agua
		Ahorrando energía
	X	Todas las anteriores

TABLA DE CALIFICACION DE EVALUACION		
14	10	GANA
9	7	DEBE MEJORAR
6	1	PIERDE

PERSONA QUE EVALUA

NOMBRE	CC	FIRMA	FECHA
Luis Vargas R	72-280177		14-02-2024

Powered by CamScanner

Evaluación de inducción

En los siguientes recuadros marque con una x la respuesta correcta según lo que muestra cada una de las imágenes



La imagen CORRESPONDE AL RIESGO	¿como lo prevenimos?	
VIAL X		Reporte oportuna condición
	X	Respetar señalización
		Autos en buen estados
		Todas las anteriores



La imagen CORRESPONDE AL RIESGO	¿como lo prevenimos?	
Locativo X		Cumpliendo normas de seguridad
		Almacenamiento correcto
		Señalización en áreas peligro
	X	Todas las anteriores

NOMBRE	CC	FIRMA	FECHA
Julio J Cuesta K	72'210 173		14-02-2024

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código:	FO CC SG SST
		Fecha de elaboración:	15/12/2023
	SISTEMA DE GESTION DE SST	Página:	2 de 4
ANEXO No.	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	Elaboró:	OLLS

En los siguientes recuadros marque con una x la respuesta correcta según lo que muestra cada una de las imágenes



La imagen CORRESPONDE AL RIESGO	¿Cómo lo prevenimos?	
Eléctrico X		Reporte oportuna condición
		Respetar señalización
		No dáñalos partes eléctricas
	X	Todas las anteriores



La imagen CORRESPONDE AL RIESGO	¿Cómo lo prevenimos?	
PSICOLABORAL X		Reporte oportuno
		Respeto a los compañeros
		Cumplimiento de norma
	X	Todas las anteriores




La imagen CORRESPONDE AL RIESGO	¿Cómo lo prevenimos?	
Físico	X	Uso de epp
		Estándar de seguridad
		Reporte de condiciones
		Todas las anteriores

NOMBRE	CC	FIRMA	FECHA
Julio Cesar Gonzalez	72'210173		14. 02 - 2024


Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST	Código:	FO CC SG SST
		Fecha de elaboración:	15/12/2023
	SISTEMA DE GESTION DE SST	Página:	1 de 4
ANEXO No.	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	Elaboró:	OLLS

1. En los siguientes recuadros marque con una x la respuesta correcta según lo que muestra cada una de las imágenes



La imagen muestra un accidentes o un incidente		¿A quién se debe reportar?	
X	accidente		Jefe inmediato
		X	Encargada de seguridad
	incidente		A todos
			Ninguno

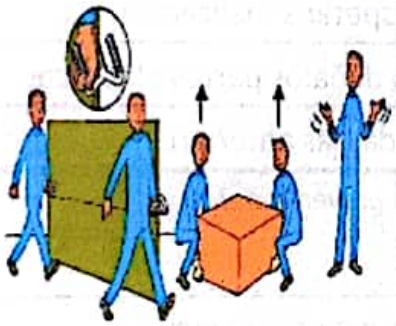

La imagen CORRESPONDE AL RIESGO		¿Cómo lo prevenimos?	
X	Ergonómico o biomecánico		Realizando pausas activas
		X	Cumpliendo normas de levantamiento de cargas
			Cumpliendo normas de transporte y almacenamiento
			Con todas las anteriores



La imagen CORRESPONDE AL RIESGO		¿Cómo lo prevenimos?	
Químico	X		Uso de EPP
			Conociendo hoja de seguridad
			Almacenamiento correcto
		X	Todas las anteriores



ı imagen a que riesgo orresponde		¿Cómo lo prevenimos?	
			Orden y aseo
			Separación de residuos
ológico	X		Fumigaciones
		X	Todas las anteriores

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA A CRUZ

CHARLAS DE 5 MINUTOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-FO-16
VERSIÓN: 01
FECHA: 31/07/2023

Proyecto y Frente		
CONSORCIO TEATRO 2024		
Responsable		
Olga Lucía Londoño S		
Semana	**Hoja**	**De**
31 ENERO AL 09 DE FEBRERO	1	1

Nº	Temas	Nº	Temas
1	Cuidado del cuerpo	5	El casco de seguridad puede salvarle la vida
2	Mantenimieto de herramientas	6	estilos de vida saludable
3	mirar siempre antes de actuar	7	La importancia del descanso
4	Uso de EPP en obra	8	Trabajo en equipo

Nº	Nombres y apellidos del trabajador	Tema Nº 1			Tema Nº 2			Tema Nº 3			Tema Nº 4			Tema Nº 5			Tema Nº 6			Tema Nº 7			Tema Nº 8		
		día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año
		31	1	24	1	2	24	3	2	24	5	2	24	6	2	23	7	2	24	8	2	24	9	2	24
1	JOSE LEONEL RODRIGUEZ																								
2	JONATHAN NAVARRO																								
3	HERLIN MONTENEGRO																								
4	ESNERIETH ARIAS																								
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA A CRUZ

CHARLAS DE 5 MINUTOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-FO-16
VERSIÓN: 01
FECHA: 31/07/2023

Proyecto y Frente		
CONSORCIO TEATRO 2024		
Responsable		
Olga Lucía Londoño S		
Semana	**Hoja**	**De**
12 FEBRERO AL 20 DE FEBRERO	1	1

Nº	Temas	Nº	Temas
1	SOCIALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENVUENTRO EN LA OBRA	5	PAUSAS ACTIVAS MENTALES
2	VIDEO DE QUE HACER EN CASO DE SISMO	6	MANEJO DE CELULAR CON ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
3	LA IMPORTANCIA DE REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	7	MANTENIMENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
4	PAUSAS ACTIVAS FISICAS	8	ATIENDA LAS RECOMENDACIONES MEDICAS DADAS POR LA IPS

Nº	Nombres y apellidos del trabajador	Tema Nº 1			Tema Nº 2			Tema Nº 3			Tema Nº 4			Tema Nº 5			Tema Nº 6			Tema Nº 7			Tema Nº 8		
		día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año
		12	1	24	13	2	24	14	2	24	15	2	24	16	2	23	17	2	24	19	2	24	20	2	24
1	JOSE LEONEL RODRIGUEZ																								
2	JONATHAN NAVARRO																								
3	HERLIN MONTENEGRO																								
4	ESNERIETH ARIAS																								
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									

Powered by CamScanner

CONTRATO No. 272-CENACINGENIEROS-2023 CONTRATO CIVIL DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRAS Y ENTREGA AENTIDADES CONSORCIO CENAC TEATRO 2023.

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

EL SUSCRITO Juan José López Cajahuica MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 80229344 EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE Bogotá EN MI CONDICIÓN COLABORADOR DE YH Construobras SAS CON NIT 901445390, CERTIFICO QUE **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS** CON NIT 901759617-0, EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA DE LA OBRAARRIBA REFERENCIADA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO DE PAGOS POR SUELDOS, JORNALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, PRESTACIONES DE LEY Y/O, TODO LO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD PRESTADA POR MI, EN DESARROLLO DEL CONTRATO 272-CENACINGENIEROS-202 CUYO OBJETO ES ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRAS Y ENTREGA A ENTIDADES ZONAS DE CESION PREDIO SAN LUIS GONZAGA, Y QUE NI **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023** SAS NI EL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, NO TIENEN PENDIENTE COMPROMISO LABORAL NIECONOMICO CONMIGO Y/O CON LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO.

SE FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, A LOS 10 DIAS DEL MES DE Febrero DE 2024.

FIRMA:

NOMBRE COMPLETO: JUAN JOSE LOPEZ CAJAHUICA
CEDULA: 80229344 BTA
CELULAR: 316-2114119



HUELLA

Powered by CamScanner

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, Juan José López Cajamarca mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 80229344 expedida en Bogotá.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 19 de enero 2024 hasta el Día 27 de enero Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de Enero del año 2024



FIRMA _____

Nombre Juan José López Cajamarca

CC. 80229344 expedida en Bogotá

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, LEONARDO ZAPATA SUAREZ mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.099.543.134 expedida en CHIRIGUANA.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 10-1-24 2024 hasta el Día 27-1-24 Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA

Nombre LEONARDO ZAPATA

CC. 1.099.543.134 expedida en CHIRIGUANA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, Yoshan Andres Tamayo Diaz mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.004.808.897. expedida en Los Patios.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 06 de enero 2024 hasta el Día 27 de enero Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de enero del año 2024



FIRMA Yoshan Diaz

Nombre Yoshan Andres Tamayo Diaz

CC. 1.004.808.897 expedida en Los Patios.

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, Yosneider Machado Ramos mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.004.825.489 expedida en Cucuta.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 4 de Enero 2024 hasta el Día 27 de Enero Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de Enero del año 2024



FIRMA Yosneider Machado R.

Nombre Yosneider Machado Ramos

CC. 1.004825489 expedida en Cucuta

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.130.275.511. expedida en BARRANQUILLA

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 7 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☒	Auxilio de transporte	☒
Dotaciones	☒	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA Edinson Palomeque

Nombre EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ

CC. 1.130.275.511 expedida en BARRANQUILLA.

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.127.587.970 expedida en RIOHACHA.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 6 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA Jorge Luis

Nombre JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA

CC. 1.127.587.970. expedida en RIOHACHA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, JOSE LUIS MANCILLA JULIO mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.002 275.995 expedida en MAHATES.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 19-ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA José Mancilla

Nombre JOSE LUIS MANCILLA JULIO

CC. 1.002.275.995 expedida en MAHATES.

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.098.821.481 expedida en BUCARAMANGA

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 16 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA

Nombre JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ

CC. 1.098.821.481 expedida en BUCARAMANGA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.043.844.401 expedida en CAMPO DE LA CRUZ

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 16 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA Jeancarlos

Nombre Jeancarlos

CC. 1.043.844401 expedida en CAMPO DE LA CRUZ

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, LUIS HEDINSON YURIDA VELASQUEZ mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 79.829.910 expedida en Bogotá.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 6 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA

Nombre LUIS HEDINSON YURIDA VELASQUEZ

CC. 79.829.910 expedida en Bogotá

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	PAZ Y SALVO CONSTRATISTA	Fecha:	09/01/2024
		Versión:	Versión 01
		Código:	SG-FO-032

Yo, GABRIEL ANGEL HANOSALVA mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.064.712.262 expedida en CURUMANI.

HAGO CONSTAR:

Que he prestado mis servicios a el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** desde el Día 5 DE ENERO 2024 hasta el Día 27 DE ENERO Año 2024.

Que durante la ejecución y terminación de las obras, el **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS,** me pagó todos los salarios y prestaciones sociales que me correspondieron.

Declaro que el **CONTRATISTA** queda a **PAZ y SALVO** conmigo por todo concepto de:

Salario	☑	Auxilio de transporte	☑
Dotaciones	☑	Recargos Nocturnos	☐
Horas extras	☐	Festivos	☐
Dominicales	☐	Auxilio de Cesantías	☐
Prima de Servicios	☐	Vacaciones	☐
Riesgos Laborales	☐		
Cotizaciones a Seguridad social (Salud, Pensión)	☐		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier Acción Judicial contra él o contra la empresa **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 SAS**, y/o al Ejercito Nacional de Colombia derivado del contrato de trabajo a que se refiere la presente transacción,

CAUSA DE MI RETIRO:

Renuncia Voluntaria	___
Terminación Obra	___
Terminación de Contrato	___

Para constancia de lo anterior firma a los 27 días del mes de ENERO del año 2024



FIRMA

Nombre GABRIEL ANGEL HANOSALVA

CC. 1.064.712262 expedida en CURUMANI

CONSTRUCTORA A CRUZ	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Código : SG-FO- 01 Versión: 01

Centro /Obra de trabajo :	TEATRO PATRIA
Área de Trabajo:	TEATRO PATRIA INTERNAMENTE Y ZONAS EXTERNA
Empresa cliente :	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023
Responsable del proyecto :	ARQ JOSE LEONEL RODRIGUEZ
Lider del proyecto :	ARQ JOSE LEONEL RODRIGUEZ
Responsable SST :	Olga Lucia Londoño S

Trabajo a Realizar:	Trasladar escombro a la volqueta
Autorizado Por:	ARQ JOSE LEONEL RODRIGUEZ
Fecha de elavoracion de ATS :	5/02/2024
Fecha de Ejecución:	5,6,7,8,9 Y 10
Fecha de Cierre:	10/02/2024

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo				Trabajos Considerados Peligrosos	
Saltarin	☐	Serruchos, hojas de corte.	☐	Trabajos en caliente	☐
Minicargador	☒	Combas, barretas, lampas.	☐	Trabajos en altura	☐
Barretones	☐	Cinceles, puntas	☐	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	☐
Taladros	☐	Otros:		Trabajos en espacios confinados	☐
Canguro	☐			Trabajos en equipos energizados	☐
Sierras	☐			Trabajo de Izaje	☐
Alicates, destornilladores	☒			Trabajo con sustancias químicas peligrosas	☐

TABLA IV. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Niveles de probabilidad		Nivel de exposición			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA - 40	MA - 30	A - 20	A - 10
	6	MA - 24	A - 18	A - 12	M - 6
	2	M - 8	M - 6	B - 4	B - 2
	1	B - 4	B - 3	B - 2	B - 1

#	Tarea	Peligro	Consecuencia	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
1	CHARLAS DE 5 MINUTOS Y PAUSAS ACTIVAS	Caidas al mismo nivel, golpes	Desgarre muscular, dolor en los musculos, espamos, estrés	Biomecanico	Bajo	Hacer estiramientos de piernas, brazos, manos, cuello, parte del tronco
2	MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Inhalación de químicos	Quemaduras internas y externas que pueden afectar las vias respiratorias e irritación en los ojos	Quimico	Bajo	En el momento de hacer la limpieza de las herramientas es importante usar todos elementos de protección personal, como gafas, guantes, y tapaboca y su respectiva ropa de trabajo, verificar que las maquinas electricas esten desconectadas, se recomienda limpiarlas con un trapo humedo con la mezcla de alcohol y agua, dejar secar y no conectar de manera inmediata.
		Intoxicación	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, malestar general, irritación en los ojos	Quimico	Bajo	Usar en todo momento el tapaboca, las gafas de seguridad y un overol antifluidos
		Contaminación	Adquirir gripa se deja el virus en el ambiente	Biologico	Bajo	Todo el personal sin excepción debe utilizar todo el tiempo sus elementos de protección como son su ropa de trabajo, gafas, tapaboca y gafas, no prestar su herramienta, tratar de usar siempre la misma maquina y en cambios hacer la debida desinfección, se recomienda que las persona que tengan cabello largo tengas su cabello recogido, evitar todo contacto fisico con las demas personas y mantener una distancia de dos metros entre cada trabajador.
3	RECIBIR MATERIAL	Caidas a distinto nivel	Dolores lumbares. - Heridas en manos. - Golpes, fracturas, emelomas	Biomecanicos	Bajo	Usoar el andamio, verificar que quede bien armado y usar los elementos de protección.
		Atropellamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Biomecanico	Bajo	Capacitación en manejo seguro de maquinaria pesada, hacer estiramientos y hacer pausas activas
		Volcamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Mecánico	Bajo	Firmar los permisos y preoperacional, verificar el vehiculo antes de la operación, usar los elementos de protección personal, botas, protectores auditivos de copa, gafas, casco y ropa de trabajo
		Inhalación de particulas del recebo	Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos, alteraciones lumbares por posturas incomodas, estrés	Fisico: polvos inorgánicos	Bajo	Uso de protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad, adoptar buenas posturas
		Volcamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Mecánico	Bajo	Firmar los permisos y preoperacional, verificar el vehiculo antes de la operación, usar los elementos de protección personal, botas, protectores auditivos de copa, gafas, casco y ropa de trabajo

Powered by CamScanner

4	TRANSLADO DE MATERIAL RCD CON MINICARGADOR	Atropellamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Biomecanico	Bajo	Capacitación en manejo seguro de maquinaria pesada, hacer estiramientos y hacer pausas activas
		Volcamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Mecánico	Bajo	Firmar los permisos y preoperacional, verificar el vehiculo antes de la operación, usar los elementos de protección personal, botas, protectores uditivos de copa, gafas, casco y ropa de trabajo
		Inhalación de particulas del recebo	Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos, alteraciones lumbares por posturas incomodas, estrés	Fisico: polvos inorgánicos	Bajo	Uso de protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad, adoptar buenas posturas
5	ORDEN Y ASEO	Inhalación de partículas al barrer, exposición a golpes y desgarre muscular	Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos, alteraciones lumbares por posturas incomodas, estrés	Químico y Fisico: polvos inorgánicos	Bajo	Uso de protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad, adoptar buenas posturas
		Caidas al mismo nivel, caida de elementos, malas posturas, estrés	Raspones, ematomas, fracturas	Biomecanico	Bajo	Tomar todas las precausiones al momento de hacer la señalizazción tomando buenas posturas y haciendolo de forma segura.
6	SEÑALIZACIÓN	Caidas al mismo nivel, caida de elementos, malas posturas, estrés	Raspones, ematomas, fracturas	Biomecanico	Bajo	Tomar todas las precausiones al momento de hacer la señalizazción tomando buenas posturas y haciendolo de forma segura.
7	INGRESO Y PERMANENCIA EN PROTECTO	Asonadas, Bombas,atentados, atropellamiento	Raspones, ematomas, fracturas, heridas traumaticas y muerte	seguridad publica	medio	Verificación de ingreso del personal, mantener areas de ingreso señalizadas al personal esterno de la obra
8	EJECUCION DE LA TAREA	Presion en hacer las labores de forma rapida	Estrés, Espasmos musculares, cefaleas	Psicosocial	Bajo	Hacer cronograma de actividades para que no se genere retrasos

Relacion de (EPP) . Elementos de proteccion personal o elementos de proteccion adicionales			
1 Ropa de trabajo	2 Casco con barbuquejo	3 Guantes	4 Gafas
7 Arnes de cuerpo entero	8 Linea de vida	9 Anclajes tie off	10 Eslingas con absorbedor
13 Careta	14 Protectores auditivos de inserción y copa	15 Respiradores con filtro	16 Botas de seguridad
19 Overol antifluidos	20	21	22

He leído y comprendido el contenido de esta EVALUACIÓN DE RIESGOS conozco , comprendo y estoy de acuerdo en seguir los requerimientos detallados y especificados en este documento.

Tenga presente que si usted se queda a laborar despes de los horarios establecidos debe informar al residente de SST, para que este pueda verificar cuales son las necesidades y mirar si le pueden ser suministradas por la constructora, si usted no avisa con tiempo prudencial esta asumiendo la resposabilidad de lo que pueda pasarle dentro del proyecto.

	Participantes operativos y administrativos							
	Nombre y Apellidos	Documento	Firmas validación diaria de ATS					
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	HERLIN MONTENEGRO	72.241.066							
2									
3									
4									
5									
16									

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA A CRUZ	FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Código : SG-FO- 01 Versión: 01

Centro /Obra de trabajo :	TEATRO PATRIA
Área de Trabajo:	TEATRO PATRIA INTERNAMENTE Y ZONAS EXTERNA
Empresa cliente :	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023
Responsable del proyecto :	ARQ JOSE LEONEL RODRIGUEZ
Líder del proyecto :	ARQ JOSE LEONEL RODRIGUEZ
Responsable SST :	Olga Lucia Londoño S

Trabajo a Realizar:	Trasladar escombro a la volqueta
Autorizado Por:	ARQ JOSE LEONEL RODRIGUEZ
Fecha de elavoracion de ATS :	12/02/2024
Fecha de Ejecución:	12,13,14,15,16 Y 17
Fecha de Cierre:	17/02/2024

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo				Trabajos Considerados Peligrosos	
Saltarin	☐	Serruchos, hojas de corte.	☐	Trabajos en caliente	☐
Minicargador	☒	Combas, barretas, lampas.	☐	Trabajos en altura	☐
Barretones	☐	Cinceles, puntas	☐	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	☐
Taladros	☐	Otros:		Trabajos en espacios confinados	☐
Canguro	☐			Trabajos en equipos energizados	☐
Sierras	☐			Trabajo de izaje	☐
Alicates, destornilladores	☒			Trabajo con sustancias químicas peligrosas	☐

TABLA IV. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Niveles de probabilidad		Nivel de exposición			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA - 40	MA - 30	A - 20	A - 10
	6	MA - 24	A - 18	A - 12	M - 6
	2	M - 8	M - 6	B - 4	B - 2
	1	B - 4	B - 3	B - 2	B - 1

#	Tarea	Peligro	Consecuencia	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
1	CHARLAS DE 5 MINUTOS Y PAUSAS ACTIVAS	Caidas al mismo nivel, golpes	Desgarre muscular, dolor en los musculos, espamos, estrés	Biomecanico	Bajo	Hacer estiramientos de piernas, brazos, manos, cuello, parte del tronco
3	MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Inhalación de quimicos	Quemaduras internas y externas que pueden afectar las vias respiratorias e irritación en los ojos	Quimico	Bajo	En el momento de hacer la limpieza de las herramientas es importante usar todos elementos de protección personal, como gafas, guantes, y tapaboca y su respectiva ropa de trabajo, verificar que las maquinas electricas esten desconectadas, se recomienda limpiarlas con un trapo humedo con la mezcla de alcohol y agua, dejar secar y no conectar de manera inmediata.
		Intoxicación	Cefalea, alteraciones asociadas a estrés, malestar general, irritación en los ojos	Quimico	Bajo	Usar en todo momento el tapaboca, las gafas de seguridad y un overol antifluidos
		Contaminación	Adquirir gripa se deja el virus en el ambiente	Biologico	Bajo	Todo el personal sin excepción debe utilizar todo el tiempo sus elementos de protección como son su ropa de trabajo, gafas, tapaboca y gafas, no prestar su herramienta, tratar de usar siempre la misma maquina y en cambios hacer la debida desinfección, se recomienda que las persona que tengan cabello largo tengas su cabello recogido, evitar todo contacto fisico con las demas personas y mantener una distancia de dos metros entre cada trabajador.
12	RECIBIR MATERIAL	Caidas a distinto nivel	Dolores lumbares. - Heridas en manos. - Golpes, fracturas, ematomas	Biomecanicos	Bajo	Usoar el andamio, verificar que quede bien armado y usar los elementos de protección.
		Atropellamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Biomecanico	Bajo	Capacitación en manejo seguro de maquinaria pesada, hacer estiramientos y hacer pausas activas
		Volcamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Mecánico	Bajo	Firmar los permisos y preoperacional, verificar el vehiculo antes de la operación, usar los elemenios de protección personal, botas, protectores uditivos de copa, gafas, casco y ropa de trabajo
		Contaminación	Adquirir gripa se deja el virus en el ambiente	Biologico	Bajo	Todo el personal sin excepción debe utilizar todo el tiempo sus elementos de protección como son su ropa de trabajo, gafas, tapaboca y gafas, no prestar su herramienta, tratar de usar siempre la misma maquina y en cambios hacer la debida desinfección, se recomienda que las persona que tengan cabello largo tengas su cabello recogido, evitar todo contacto fisico con las demas personas y mantener una distancia de dos metros entre cada trabajador.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

		Inhalación de partículas del recebo	Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos, alteraciones lumbares por posturas incomodas, estrés	Físico: polvos inorgánicos	Bajo	Uso de protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad, adoptar buenas posturas
13	TRANSLADO DE MATERIAL RCD CON MINICARGADOR	Caidas a distinto nivel	Dolores lumbares. - Heridas en manos. - Golpes, fracturas, ematomas	Biomecanicos	Bajo	Al bajar del minicargador se debe tener la precaución que este la pala abajo y el minicargador apagado. Usar los elementos de protección personal.
		Atropellamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Biomecanico	Bajo	Capacitación en manejo seguro de maquinaria pesada, hacer estiramientos y hacer pausas activas
		Volcamientos	Lesiones osteomusculares por y lesiones musculo esqueléticas (desgarros, distensiones, etc.)	Mecánico	Bajo	Firmar los permisos y preoperacional, verificar el vehiculo antes de la operación, usar los elementos de protección personal, botas, protectores uditivos de copa, gafas, casco y ropa de trabajo
		Inhalación de partículas del recebo	Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos, alteraciones lumbares por posturas incomodas, estrés	Físico: Ruido fuerte	Bajo	Uso de protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad, adoptar buenas posturas, tapaboca industrial de manera permanente
		Contaminación	Adquirir gripa se deja el virus en el ambiente	Biologico	Bajo	Todo el personal sin excepción debe utilizar todo el tiempo sus elementos de protección como son su ropa de trabajo, gafas, tapaboca y gafas, no prestar su herramienta, tratar de usar siempre la misma maquina y en cambios hacer la debida desinfección, se recomienda que las persona que tengan cabello largo tengas su cabello recogido, evitar todo contacto físico con las demas personas y mantener una distancia de dos metros entre cada trabajador.
		Ruido constante	El ruido constante genera incomodidades, estrés, y tammbien hipoacusia	Físico: polvos inorgánicos	Bajo	Uso de protección auditiva de copa y el suso completo de los elementos de protección personal.
14	ORDEN Y ASEO	Inhalación de partículas al barrer, exposición a golpes y desgarre muscular	Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos, alteraciones lumbares por posturas incomodas, estrés	Quimico y Físico: polvos inorgánicos	Bajo	Uso de protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad, adoptar buenas posturas, tapaboca industrial de manera permanente
		Contaminación	Adquirir gripa se deja el virus en el ambiente	Biologico	Bajo	Todo el personal sin excepción debe utilizar todo el tiempo sus elementos de protección como son su ropa de trabajo, gafas, tapaboca y gafas, no prestar su herramienta, tratar de usar siempre la misma maquina y en cambios hacer la debida desinfección, se recomienda que las persona que tengan cabello largo tengas su cabello recogido, evitar todo contacto físico con las demas personas y mantener una distancia de dos metros entre cada trabajador.
		Caidas al mismo nivel, caida de elementos, malas posturas, estrés	Raspones, ematomas, fracturas	Biomecanico	Bajo	Tomar todas las precausiones al momento de hacer la señalización tomando buenas posturas y haciendolo de forma segura.
17	SEÑALIZACIÓN	Inhalación de partículas del recebo	Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos, alteraciones lumbares por posturas incomodas, estrés	Físico: Ruido fuerte	Bajo	Uso de protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad, adoptar buenas posturas, tapaboca industrial de manera permanente
		Caidas al mismo nivel, caida de elementos, malas posturas, estrés	Raspones, ematomas, fracturas	Biomecanico	Bajo	Tomar todas las precausiones al momento de hacer la señalización tomando buenas posturas y haciendolo de forma segura.
18	EJECUCION DE LA TAREA	Presion en hacer las labores de forma rapida	Estrés, Espasmos musculares, cefaleas	Psicosocial	Bajo	Hacer cronograma de actividades para que no se genere retrasos

Relacion de (EPP) . Elementos de proteccion personal o elementos de proteccion adicionales			
1 Ropa de trabajo	2 Casco con barbuquejo	3 Guantes	4 Gafas
7 Arnes de cuerpo entero	8 Linea de vida	9 Anclajes tie off	10 Eslingas con absorbedor
13 Careta	14 Protectores auditivos de insercion y copa	15 Respiradores con filtro	16 Botas de seguridad
19 Overol antifluidos	20	21	22

He leído y comprendido el contenido de esta EVALUACIÓN DE RIESGOS conozco , comprendo y estoy de acuerdo en seguir los requerimientos detallados y especificados en este documento.

Tenga presente que si usted se queda a laborar despes de los horarios establecidos debe informar al residente de SST, para que este pueda verificar cuales son las necesidades y mirar si le pueden ser suministradas por la constructora, si usted no avisa con tiempo prudencial esta asumiendo la resposabilidad de lo que pueda pasarle dentro del proyecto.

	Participantes operativos y administrativos								
	Nombre y Apellidos	Documento	Firmas validación diaria de ATS						
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	HERLIN MONTENEGRO	72.241.066							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA A CRUZ

PREOPERACIONAL MINICARGADOR

CODIGO:	SG-FO-040
VERSIÓN:	1
FECHA:	23/08/2023

PROYECTO: CONSORCIO TEATRO PATRIA 2023		MARCA: NEW HOLLAND	
MODELO: NO TIENE		SERIE: NEM484557	
DESCRIPICIÓN DEL AREA DE OPERACIÓN:		FECHA VENCIMIENTO EXTINTOR:	mar-24
VALIDO DESDE:	5/02/2024	VALIDO HASTA:	10/02/2024
HORA DE INICIO:	7:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	5:00 p.m.

De acuerdo al tipo de trabajo a ejecutar y los equipos utilizados verifique la siguiente información colocando SI cuando cumple, NO cuando no cumple y N/A cuando no aplica el concepto.

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	Arnés.	X	Guantes.	X	Gafas de Seguridad.		Mosquetón
	Línea de vida.	X	Botas de Seguridad.	X	Pantalón y Camisa manga Larga.	X	Puntos de Anclaje
	Eslingas en Y	X	Casco de Seguridad con barbuquejo.	X	Protector Auditivo	X	Líneas de vida
	Eslinga de posicionamiento o restricción				Otros	Cuáles?	Andamios

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Análisis de Trabajo Seguro	si	X	No		2. Se requieren permisos adicionales?	si		No	X

CONVENCINES:	BUENO			B			MALO				M				NO APLICA						N/A						
LISTA DE CHEQUEO DIARIA	LUNES				MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES			
ASPECTO A EVALUAR	B	M	N/A		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A				
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS	✓						✓																			
	DE TRABAJO TRASERAS	✓						✓																			
	DIRECCIONALES	✓						✓																			
	DE PARQUEO	✓						✓																			
CABINA	PROTECCIÓN ANTIVUELCO	✓						✓																			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓						✓																			
	EXTINTOR	✓						✓																			
	INDICADORES (HIDRAULICO, TEMPERATURA MOTOR, CORRIENTE Y ACEITE)	✓						✓																			
	TUBO DE ESCAPE	✓						✓																			
	ESTADO DEL ASIENTO	✓						✓																			
	ALARMA DE RETROCESO	✓						✓																			
	PITO	✓						✓																			
	APOYOS DE ACCESO	✓						✓																			
	ESTADO PALANCAS DE MANDO	✓						✓																			
	ESTADO DE PEDALES	✓						✓																			
	FRENOS DE EMERGENCIA, SERVICIO.	✓						✓																			
ESTADO MECANICO	DIRECCIÓN SIN VIBRACIÓN Y RUIDOS RAROS	✓						✓																			
	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS DE ACEITE	✓						✓																			
	ESTADO DEL BALDE (PASADORES)	✓						✓																			
	ESTADO DEL BRAZO (PASADORES, MANGUERAS OPERACIÓN)	✓						✓																			
	ESTADO DE LOS GASTOS DE ESTABILIZACIÓN	✓						✓																			
	FRENOS (BALDE BRAZO)	✓						✓																			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓						✓																			
	ESTADO BALDE GRAZOS	✓						✓																			
LLANTAS	ESTADO SIN ABULTAMIENTOS, CORTADAS, LISAS)	✓						✓																			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO >5mm	✓						✓																			

FIRMAS DE PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON MINICARGADOR Y FIRMA DE RESIDENTE SST

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	LUNES FIRMA	MARTES FIRMA	MIERC. FIRMA	JUEVES FIRMA	VIERNES FIRMA	SABADO FIRMA	DOMINGO FIRMA	OBSERVACIONES
HERLIN MONTENEGRO	72241066	OPERADOR								
OLGA LUCÍA LONDOÑO S	52192680	RESIDENTE SST								

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA A CRUZ

PREOPERACIONAL MINICARGADOR

CODIGO:	SG-FO-040
VERSIÓN:	1
FECHA:	23/08/2023

PROYECTO: TEATRO PATRIA		**MARCA:** NEW HOLLAND	
MODELO: NO TIENE		**SERIE:** NEM 484557	
DESCRIPICIÓN DEL AREA DE OPERACIÓN:	llevar escombro a la volqueta	**FECHA VENCIMIENTO EXTINTOR:**	mar-24
VALIDO DESDE:	12/02/2024	**VALIDO HASTA:**	17/02/2024
HORA DE INICIO:	7:00 a.m.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	5:00 p.m.

De acuerdo al tipo de trabajo a ejecutar y los equipos utilizados verifique la siguiente información colocando SI cuando cumple, NO cuando no cumple y N/A cuando no aplica el concepto.

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	Arnés.	X	Guantes.	X	Gafas de Seguridad.		Mosquetón
	Línea de vida.	X	Botas de Seguridad.	X	Pantalón y Camisa manga Larga.	X	Puntos de Anclaje
	Eslingas en Y	X	Casco de Seguridad con barbuquejo.	X	Protector Auditivo	X	Líneas de vida
	Eslinga de posicionamiento o restricción				Otros Cuáles?		Andamios

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Análisis de Trabajo Seguro	si	X	No		2. Se requieren permisos adicionales?	si		No	X	

CONVENCINES:	BUENO	B	MALO	M	NO APLICA	N/A

LISTA DE CHEQUEO DIARIA		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
ASPECTO A EVALUAR		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS	✓									✓												
	DE TRABAJO TRASERAS	✓									✓												
	DIRECCIONALES	✓									✓												
	DE PARQUEO	✓									✓												
CABINA	PROTECCIÓN ANTIVUELCO	✓									✓												
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓									✓												
	EXTINTOR	✓									✓												
	INDICADORES (HIDRAULICO, TEMPERATURA MOTOR, CORRIENTE Y ACEITE)	✓									✓												
	TUBO DE ESCAPE	✓									✓												
	ESTADO DEL ASIENTO	✓									✓												
	ALARMA DE RETROCESO	✓									✓												
	PITO	✓									✓												
	APOYOS DE ACCESO	✓									✓												
	ESTADO PALANCAS DE MANDO	✓									✓												
	ESTADO DE PEDALES	✓									✓												
	FRENOS DE EMERGENCIA, SERVICIO.	✓									✓												
ESTADO MECANICO	DIRECCIÓN SIN VIBRACIÓN Y RUIDOS RAROS	✓									✓												
	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS DE ACEITE	✓									✓												
	ESTADO DEL BALDE (PASADORES)	✓									✓												
	ESTADO DEL BRAZO (PASADORES, MANGUERAS OPERACIÓN)	✓									✓												
	ESTADO DE LOS GASTOS DE ESTABILIZACIÓN	✓									✓												
	FRENOS (BALDE BRAZO)	✓									✓												
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓									✓												
	ESTADO BALDE GRAZOS	✓									✓												
LLANTAS	ESTADO SIN ABULTAMIENTOS, CORTADAS, LISAS)	✓									✓												
	HUELLAS EN BUEN ESTADO >5mm	✓									✓												

FIRMAS DE PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON MINICARGADOR Y FIRMA DE RESIDENTE SST

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	LUNES FIRMA	MARTES FIRMA	MIERC. FIRMA	JUEVES FIRMA	VIERNES FIRMA	SABADO FIRMA	DOMINGO FIRMA	OBSERVACIONES
HERLIN MONTENEGRO	72241066	OPERADOR								
OLGA LUCÍA LONDOÑO S	52192680	RESIDENTE SST								

Powered by CamScanner

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Documentos volqueta placa SRO 028

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018705950

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SRO028	MACK	CV713	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.000	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	20000 - 2

NÚMERO DE MOTOR: 6T06545552M62489222 — REG: N — VIN: ******

NUMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 8XGAG11C07V068321 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CASAS GOMEZ LUIS ANTONIO — IDENTIFICACIÓN: C.C. 79690041

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
01260100574576	I	12/07/2007	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
28/12/2007	05/07/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTO MCPAL FACATATIVA



LT01007274360

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.020.838.695
MORENO GONZALEZ
APELLIDOS
MAICOL IVAN
NOMBRES




Maicol Moreno
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-1999
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-FEB-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-60884167-M-1020838695-20170217 0053738007A 1 48100031

PIN AMBIENTAL 1216

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1020838695



NOMBRE

MAICOL IVAN MORENO GONZALEZ

FECHA DE NACIMIENTO

29-01-1999

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

20-08-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTA D.C.

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	15-08-2029	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	20-08-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMION, BUSETA Y BUS.	20-08-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0300748274

Servicios Integrales 00947 2.0-2 04/22

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	11	14	2023	11	15	2024	11	14

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
86820241 - 600008355	SRO028	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	12000	2008

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	MACK	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: CV713	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
6T06545552M62489222	8XGAG11C07V068321	NA	20,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUIS ANTONIO CASAS GOMEZ	3114994603	CC	79690041	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	609	13158	86820241	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 981.500	$ 510.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.493.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [1]

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.14 11:36:17 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 166644369

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: PREVICAR 197

NIT: 900094539

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-003-001

Fecha de expedición: 2023/06/22

Fecha de vencimiento: 2024/06/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRO028

CLASE: VOLQUETA

MARCA: MACK

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12000

NRO. MOTOR: 6T06545552M62489222

NRO. CHASIS: 8XGAG11C07V068321

VIN:

LÍNEA: CV713

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS A. CASAS G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

YONATHAN CAMILO CRUZ CORTES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900677174	3	EXCAVANDO AGS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Calle 164a # 8g - 77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6716341	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	20240118143011681269	9461759351	E	2024/01/18	2024/01/18	BANCO AV VILLAS	0	$3,207,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1024597539	FARIAS ALEJANDRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1000850764	GALINDO ANGEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	80085222	GALINDO ANGEL	230301	30	$1,190,000	$190,400	EPS005	30	$1,190,000	$47,600	CCF21	30	$1,190,000	$47,600	14-23	30	$1,190,000	$82,900	30	$0	$0
4	CC	1000575219	GALINDO JOHN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$63,667	$2,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
5	CC	52316261	LEGUIZAMON LIGIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1020816450	MORENO LUIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	80415807	MORENO LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1020838695	MORENO MAICOL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1020796494	QUINTERO LADY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1072646977	SALAMANCA WILLIAM	231001	26	$1,005,334	$160,900	EPS017	26	$1,005,334	$40,300	CCF21	26	$1,005,334	$40,300	14-23	26	$1,005,334	$70,000	26	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					**$10,354,001**	**$1,656,700**			**$10,354,001**	**$414,300**			**$10,379,001**	**$415,300**			**$10,354,001**	**$721,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,656,700	$0	$0	$1,656,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,900	$0	$0	$160,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,124,600	$0	$0	$1,124,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$721,200	$0	$0	$721,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$721,200	$0	$0	$721,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$415,300	$0	$0	$415,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	$415,300	$0	$0	$415,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$414,300	$0	$0	$414,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$181,100	$0	$0	$181,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$140,400	$0	$0	$140,400
TOTAL				**10**	**$3,207,500**	**$0**	**$0**	**$3,207,500**

2024/01/18 03:52 PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 164714784

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: PREVICAR 197

NIT:	900094539	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-003-001
Fecha de expedición:	2023/02/15	**Fecha de vencimiento:**	2024/02/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	BVL216	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2006
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10831	**NRO. MOTOR:**	35125761
NRO. CHASIS:	1HTWYAHT26J227123	**VIN:**	
LÍNEA:	7600 6X4		
COLOR:	BLANCO		


NOMBRE PROPIETARIO: SANDRA P. GONZALEZ B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

YONATHAN CAMILO CRUZ CORTES


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.020.808.429
AVILA GONZALEZ
APELLIDOS
JOHAN SEBASTIAN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1995
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-JUL-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

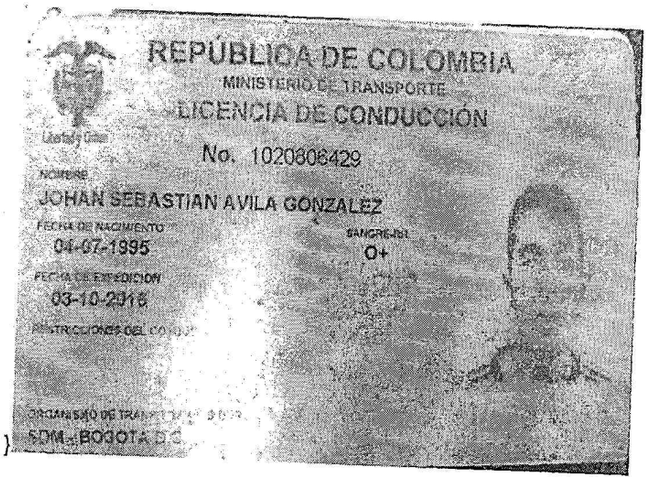

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1020806429
NOMBRE
JOHAN SEBASTIAN AVILA GONZALEZ
FECHA DE NACIMIENTO
04-07-1995
GRUPO SANGRE-RH
O+
FECHA DE EXPEDICION
03-10-2018
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRANSITO Y SEDE
SDM - BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	16-08-2023	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	16-08-2023	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	16-08-2022	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
1.004001389692

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008492243

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
BVL216	INTERNATIONAL	7600 6X4	2006

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	19000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
3512575I	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	1HTWYAHT26J227123	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

GONZALEZ BUITRAGO SANDRA PATRICIA — C.C. 52415182

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
01204070519757	I	07/09/2005	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/09/2005	01/12/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

LT01004183207

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	11	22	2023	11	23	2024	11	22

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
86820595 - 600008709	BVL216	CARGA O MIXTOS	PARTICULAR	10831	2006

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	7600 6X4	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35125761	1HTWYAHT26J227123	NA	19,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANDRA PATRICIA GONZALEZ BUITRAGO	3134036432	CC	52415182	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	609	13158	86820595	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 981.500	$ 510.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.493.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1)

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.22 11:20:28 -05:00

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

SuAporte | Factura

Fecha creación reporte: 2024-01-29, 03:36:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 68537716

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2024

Fecha limite de pago: 2024-02-08

PAGADA 29/01/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN SEBASTIAN AVILA GONZALEZ				
Documento	CC1020806429	**Dirección**	CL 132 NORTE #151 - 26		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142123838		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020806429	AVILA GONZALEZ JOHAN SEBASTIAN	57	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 90.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000	$ 0	$ 461.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

Documentos volqueta placa TMA 757

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDIC (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2024-01-25	2024-01-26	2025-01-25

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
14289408187400	TMA757	CARGA O MIXTO	PUBLICO	8300	1976

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FORD	VOLCO

LÍNEA VEHICUL: LN 7000

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
BVB90828CM	R71BVB90828		18.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CORREDOR COLMENARES, EDER YAMEL	3115173400	CC	1014218248	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales, en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tralarries y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 910, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030002894

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TMA757	FORD	LN 7000	1976

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.300	BLANCO CREMA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	18000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
BVB90628CM	S	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
R71BVB90828	N	R71BVB90828	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

CORREDOR COLMENARES EDER YAMEL — C.C. 1014218248

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VR	FECHA IMPORT.	PUERTAS
0308	I	05/03/1993	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
13/06/1977	13/09/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID



LTO7002604190

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que SOLUCION EMPRESARIAL LEON SAS con documento NIT 900752116, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) EDGAR IVAN LOPEZ VANEGAS con documento CC 1012445250 como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7913966461	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2024	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2024
Fecha Pago	2024/02/02	Número de Autorización	432871215

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS008 - COMPENSAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF22 - COLSUBSIDIO	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/08/2023
		VERSIÓN	1
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: Teatro patria	FECHA	9/02/2024

CONTRATISTAS: Y&H CONSTRUOBRAS S.A.S.

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	BOADA ROBLES YEIMER	7:00		17:00	
2	GABRIEL A MANOSALVA	7:00		17:00	
3	JAVIER ALBERTO ESMITH	X	INCAPCITADO	X	INCAPCITADO
4	JEAN CARLOS GUETTE	7:00		17:00	
5	JORGE LUIS SARABIA	7:00		17:00	
6	JOSE LUIS MANCILLA	7:00		17:00	
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO	7:00		17:00	
8	EDISON JAIR PALOMEQUE	7:00		17:00	
9	YOSNEIDER CAMACHO	7:00		17:00	
10	LUIS EDINSON MURCIA	X	INCAPCITADO	X	INCAPCITADO
11	LEONARDO ZAPATA	X	SE DEVOLVIO	X	SE DEVOLVIO
12					
13					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/08/2023
		VERSIÓN	1
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: Teatro patria	FECHA	10/02/2024

CONTRATISTAS: Y&H CONSTRUOBRAS S.A.S.

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	BOADA ROBLES YEIMER	7:00		12:00	
2	GABRIEL A MANOSALVA	7:00		12:00	
3	JAVIER ALBERTO ESMITH	X	INCAPCITADO	X	INCAPCITADO
4	JEAN CARLOS GUETTE	7:00		12:00	
5	JORGE LUIS SANABRIA	7:00		12:00	
6	JOSE LUIS MANCILLA	7:00		12:00	
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO	7:00		12:00	
8	EDISON JAIR PALOMEQUE	7:00		12:00	
9	YOSNEIDER CAMACHO	7:00		12:00	
10	LUIS EDINSON MURCIA	X	INCAPCITADO	X	INCAPCITADO
11	LEONARDO ZAPATA				

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/08/2023
		VERSIÓN	1
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: Teatro patria	FECHA	12/02/2024

CONTRATISTAS: Y&H CONSTRUOBRAS S.A.S.

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	BOADA ROBLES YEIMER	7:00		17:00	
2	GABRIEL A MANOSALVA	7:00		17:00	
3	JAVIER ALBERTO ESMITH	7:00		17:00	
4	JEAN CARLOS GUETTE	7:00		17:00	
5	JORGE LUIS SARABIA	7:00	Jorge Luis	17:00	Jorge Luis
6	JOSE LUIS MANCILLA	7:00	Jose Mancilla	17:00	Jose Mancilla
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO	7:00		17:00	
8	EDISON JAIR PALOMEQUE	7:00		17:00	
9	YOSNEIDER CAMACHO	7:00	Yosneider M.R.	17:00	Yosneider M.R.
10	LUIS EDINSON MURCIA	7:00	PARQUE SAN LUIS GONZAGA.		
11	LEONARDO ZAPATA	PARQUE SAN LUIS GONZAGA.			
12					
13					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/08/2023
		VERSIÓN	1
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: Teatro patria	FECHA	13/02/2024

CONTRATISTAS: Y&H CONSTRUOBRAS S.A.S.

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	BOADA ROBLES YEIMER	7:00		12:00	
2	GABRIEL A MANOSALVA	7:00		12:00	
3	JAVIER ALBERTO ESMITH	7:00		12:00	
4	JEAN CARLOS GUETTE	7:00		12:00	
5	JORGE LUIS SANABRIA	7:00	Jorge Luis	12:00	Jorge Luis
6	JOSE LUIS MANCILLA	7:00	Jose Mancilla	12:00	Jose Mancilla
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO	7:00		12:00	
8	EDISON JAIR PALOMEQUE	7:00		12:00	
9	YOSNEIDER CAMACHO	7:00	Yosneider M.R.	12:00	Yosneider M.R.
10	LUIS EDINSON MURCIA	7:00		12:00	
11	LEONARDO ZAPATA	7:00		12:00	
12					
13					

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/08/2023
		VERSIÓN	1
		CÓDIGO	SG-FO-19

PROYECTO: Teatro patria	FECHA	14/02/2024

CONTRATISTAS: Y&H CONSTRUOBRAS S.A.S.

REGISTRO INGRESO Y SALIDA

No.	NOMBRES	HORA DE INGRESO	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	BOADA ROBLES YEIMER	7:00		17:00	
2	GABRIEL A MANOSALVA	7:00		17:00	
3	JAVIER ALBERTO ESMITH	7:00		17:00	
4	JEAN CARLOS GUETTE	7:00		17:00	
5	JORGE LUIS SARABIA	7:00	Jorge Luis	17:00	Jorge Luis
6	JOSE LUIS MANCILLA	7:00	Jose Mancilla	17:00	Jose Mancilla
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO	7:00		17:00	
8	EDISON JAIR PALOMEQUE	7:00		17:00	
9	YOSNEIDER CAMACHO	7:00		17:00	
10	LUIS EDINSON MURCIA	7:00		17:00	
11	LEONARDO ZAPATA	7:00		17:00	
12	JULIO CESAR GONZALEZ.	7:00		17:00	
13					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/08/2023
		VERSIÓN	1
		CÓDIGO	SG-FO-19

Powered by CamScanner

CHARLAS DE 5 MINUTOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: FR-SST-015
VERSIÓN: 02
FECHA: 09/01/2024

Proyecto y Frente		
CENAC		
Responsable		
Juan José López C.		
Semana	**Hoja**	**De**
5-2-24 al 13-2-24	1	1

Nº	Temas	Nº	Temas
1	Socialización de RIS.	5	Cuidado de manos y pies.
2	Autocuidado	6	Cuidado de la cabeza.
3	Resolución 4272.	7	Ropa limpia de trabajo y estilo de vida saludable.
4	Reporte ante la ARL. 48 horas.	8	La importancia de llegar a tiempo al trabajo y de reportar la novedad en caso de llegar tarde.

Nº	Nombres y apellidos del trabajador	Tema Nº 1 día	mes	año	Tema Nº 2 día	mes	año	Tema Nº 3 día	mes	año	Tema Nº 4 día	mes	año	Tema Nº 5 día	mes	año	Tema Nº 6 día	mes	año	Tema Nº 7 día	mes	año	Tema Nº 8 día	mes	año
		5	2	24	6	2	24	07	02	24	08	02	24	09	02	24	10	02	24	12	02	24	13	02	24
1	Luis H Murcia																								
2	Jose L. Marcillo Julio	Jose Moncilla			Jose Moncilla			Jose Moncilla			Jose Moncilla			Jose Moncilla			Jose Moncilla			Jose Moncilla			Jose Moncilla		
3		Gabriel H.																							
4	Jeancarlos Gelt	Jeancarlos			Jeancarlos			Jeancarlos			Jeancarlos			Jeancarlos			Jeancarlos			Jeancarlos			Jeancarlos		
5	Yosneider Machado R	Yosneider MR			Yosneider MR			Yosneider MR			Yosneider MR			Yosneider MR			Yosneider MR			Yosneider MR			Yosneider MR		
6	yosman andres T.	yosman Diaz			yosman Diaz						yosman Diaz			yosman Diaz			yosman Diaz			yosman Diaz			yosman Diaz		
7	Jenivi																								
8	Jorge Luis Sarabia	Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis		
9	Edwson Polanegue	Edwson			Edwson			Edwson			Edwson			Edwson			Edwson			Edwson			Edwson		
10	Leonardo Zapata																								
11	Jeiver Bohada																								
12																									
13																									
14																									
15																									

Powered by CamScanner

CHARLAS DE 5 MINUTOS DE SEGURIDAD

CÓDIGO: SG-FO-16
VERSIÓN: 01
FECHA: 31/07/2023

Proyecto y Frente		
CONSORCIO TEATRO 2024		
Responsable		
Olga Lucía Londoño S		
Semana	**Hoja**	**De**
14 FEBRERO AL 21 DE FEBRERO	1	1

Nº	Temas	Nº	Temas
1	SOCIALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENVUENTRO EN LA OBRA	5	PAUSAS ACTIVAS MENTALES
2	VIDEO DE QUE HACER EN CASO DE SISMO	6	MANEJO DE CELULAR CON ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
3	LA IMPORTANCIA DE REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	7	MANTENIMENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
4	PAUSAS ACTIVAS FISICAS	8	ATIENDA LAS RECOMENDACIONES MEDICAS DADAS POR LA IPS

Nº	Nombres y apellidos del trabajador	Tema Nº 1			Tema Nº 2			Tema Nº 3			Tema Nº 4			Tema Nº 5			Tema Nº 6			Tema Nº 7			Tema Nº 8		
		día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año	día	mes	año
		14	2	24	15	2	24	16	2	24	17	2	24	18	2	23	19	2	24	20	2	24	21	2	24
1	BOADA ROBLES YEIMER																								
2	MANOSALVA VELASQUEZ GABRIEL A																								
3	JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ																								
4	JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO																								
5	JORGE LUIS SANABRIA ESCORCIA																								
6	JOSE LUIS MANCILLA JULIO																								
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ																								
8	EDISON JAIR PALOMEQUE DIAZ																								
9	YOSNEIDER CAMACHO RAMOS																								
10	LUIS EDINSON MURCIA VELASQUEZ																								
11	LEONARDO ZAPATA SUAREZ																								
12	JULIO CESAR GONZALEZ																								
13																									
14																									
15																									

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3
		FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: JULIO CESAR GONZALEZ	CARGO: OFICIAL OFICIAL
IDENTIFICACION: 72290173	FECHA DE INGRESO: 14/02/20245

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	14/02/2024	Camiseta, casco, botas, gafas, tapaoidos	Yeimer Boada	

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3 FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Luis Murcia.	CARGO: Ayudante.
IDENTIFICACION: 79 829910.	FECHA DE INGRESO: 26/12/23

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1.	09/02/24.	Guantes tapabocas.	Yeimer Boada.	

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3 FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Yosneider. Camacho. CARGO: Ayudante.

IDENTIFICACION: 1004825489. FECHA DE INGRESO: 09/01/2024.

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	09/02/24.	Guantes tapabocas.	Yeimer Borda	Yosneider MR.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3
		FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Edison Palomeque.	CARGO: Ayudante.
IDENTIFICACION: 1130725511	FECHA DE INGRESO: 09-01/2024

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1.	09/02/24.	Guantes y tapabocas	Yeimer Boada	Edison Palomeque
2	13/02/24.	Tapabocas.	Olga Lucia Londoño	Edinson Jiménez
3	14/02/24	Tapabocas Guantes.	Yeimer.	Edinson Jiménez

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3 FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Jose L. Tranquilla.	CARGO: Ayudante.
IDENTIFICACION: 1002275995.	FECHA DE INGRESO: 09-01-2024

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	09/02/24.	Guantes. tapabocas.	Yeimer Bacca.	Jose Monsilla
2	13/02/24.	Tapabocas.	Olga Lucia Londoño	Jose Moncilla

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3
		FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Jorge Sarabia. CARGO: Ayudante.

IDENTIFICACION: 1127587470. FECHA DE INGRESO: 09-01-2024

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	09/02/24.	Guantes tapabocas.	Yeimer Borda.	Jorge Luis

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3
		FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Jean Carlos Guette.	CARGO: oficial.
IDENTIFICACION: 1043844401.	FECHA DE INGRESO: 09-01-2024

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	09/02/24	(Jean) Guantes tapabocas.	Yeimer Bocck.	

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3 FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Javier . Esmith.	CARGO: 1098882148l
IDENTIFICACION: ofiacl.	FECHA DE INGRESO: 09-01-2024

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	09/02/24.	Guantes nitrilo.	Yeimer Boada.	

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3 FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: GABRIEL MANOSALVA.	CARGO: OFICIAL.
IDENTIFICACION: 1064712262.	FECHA DE INGRESO: 09-01-2024

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1.	09/02/24	Guantes nitrilo.	Oteimer Borda.	

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3 FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Yosman. Tamayo.	CARGO: Ayudante.
IDENTIFICACION: 1004089871.	FECHA DE INGRESO: 09/01/2024.

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1.	09/02/24.	Guantes. nitrilo.	Yelmer Boada.	yosman Tamay.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y EPP	VERSION: 3 FECHA: 02/02/2024

NOMBRE Y APELLIDO: Leonardo. Zapata.	CARGO: Ayudante.
IDENTIFICACION: 1009543134.	FECHA DE INGRESO: 26/12/23.

En el cumplimiento al articulo 230 del código sustantivo del trabajo se hace entrega de los siguientes elementos de protección personal, en virtud de lo anterior, el trabajador firma confirma que se ha realizado la entrega de forma física.

ITEM	FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO ENTREGADO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	09/02/24.	Guantes. tapabocas.	Yeimer Bonda	
2	13/02/24.	Tapabocas.	Olga lucia londoño	

Powered by CamScanner

	ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)	CODIGO: FR-SST-01 VERSION: 03 FECHA: 06-02-2024

PROYECTO: TEATRO PATRIA	**CONSECUTIVO ATS: semana 07**
FECHA DE INICIO: 05/02/2024	**HORA INICIAL: 7:00 am**
FECHA DE FINALIZACION: 10/02/2024	**HORA FINAL: 5:00 pm**
UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL TRABAJO: Mesanines de ubicados en primer piso demolición de pisos y muros	**NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 11**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Se retira techo en yeso y madera que conforma la estructura, esto con ayuda de lineas de vida equipos para trabajo seguro en alturas, manilas y andamios, se realiza retiro de materiales como madera, tapetes, escombro con ayuda manual y con el minicargador usado pero una persona competente y certificada, se hace demolición en diferntes areas del teatro como son los mesanines y en la parte exterior como el tanque de agua.

MARCAR SI, NO, N/A (no aplica), SEGÚN CORRESPONDA

1.- ¿ El RIESGO más crítico de la actividad fue identificado?	SI	6.- ¿ Evaluó la aplicación de bloqueos físicos requeridos para energías peligrosas?	N/A
2.- ¿Se evaluó las condiciones de trabajo (Ej.: Ruido, Espacio disponible, Iluminación, Temperatura, Desniveles, Polvo, Etc.)?	SI	7.- ¿Evaluó el riesgo de incendio, vías de escape disponibles y recursos para la atención de este? ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	SI
3.- ¿Se identificó los aspectos ambientales: derrames de liquidos, sustancias peligrosas, contaminación del aire, generación de residuos?	SI	8.- ¿Para trabajos en altura se evaluó: escalas, escaleras, accesos, líneas de vida, plataformas, andamios, atrapa soga, soga o cordel de perlón?	SI
4.- ¿Las herramientas, equipos e instalaciones eléctricas, están en condiciones de ser usadas según estándares establecidos?	SI	9.- ¿Los andamios se encuentran certificados?	SI
5.- ¿ El personal está capacitado para realizar la actividad?	SI	10.-¿ Para trabajos en caliente se cuenta con equipo de extinción de incendio? ¿El equipo de extinción se encuentra en buenas condiciones?	NO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

Procedimientos	SI	NO	Procedimientos	SI	NO
Trabajo en alturas	X		Espacios Confinados		X
Trabajos en caliente	X		Otro Cual:		

CONSIDERACIONES ADICIONALES

¿Se requiere entrenamiento especial?	**SI**	**NO X**
Especifique: N/A		
¿Las condiciones climáticas pueden afectar el trabajo?	**SI**	**NO X**

lluvias torrenciales NO tormenda electrica NO inundaciones NO vendavales NO otro: _____

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	MARTILLO, BARRETON, DESTORNILLADOR
Eléctricas	SIERRA, PULIDORA, ROTOMARTILLOS
Neumáticas	NO
Hidráulicas	NO
Mecánicas	ANDAMIO

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos	Responsables de las acciones o procedimientos requeridos
*Ingreso del personal a la obra	*CONDICIONES DE SEGURIDAD: LOCATIVO: Superficies irregulares con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo , caida de objetos	*Caidas al mismo nivel, fracturas, lesiones incapacitantes.	* Uso seguro del sendero peatonal.	contratista oficiales ayudantes SST
Inspeccion de equipos y herramientas a utilizar	*CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVO: Almacenamiento y superficies de trabajo condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas al mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes	* Inspeccion y firma de equipos, firma de ATS	contratista oficiales ayudantes SST
	BIOLOGICOS: Virus, Bacterias,	problemas respiratorios, desorden del sistema nervioso, diarrea, dolor de cabeza, escalofrio, vomito, dolor de estomago	cumplir con los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, uso de proteccion respiratoria, distanciamiento control de roedores, orden y aseo en los lugares de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
inspeccionar area de trabajo	* Condiciones locativas irregularidades en el area de trabajo, condiciones de orden y aseo	* caidas al mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes	* charla preoperacional, pausas activas, uso de elementos de proteccion personal: casco con barbuquejo, botas de sseguridad con puntera, dotacion de trabajo(camiza manga larga y pantalon de overol)	contratista oficiales ayudantes SST
	biomecanico: Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales) esfuerzo, manipulacion manual de cargas, movimiento repetitivo	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares	charla de capacitacion de levantmiento de cargas, inspeccion de elementos y equipos de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
	quimico: polvos organicos e inorganicos liquido rocios	problemas respiratorios y visuales	uso de epps (casco, guantes, botas de seguridad, punteras, protector respiratorio)	contratista oficiales ayudantes SST
Inspección equipo y procedimiento para trabajo en alturas	condiciones de seguridad trabajo en alturas	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, muerte	Inspección diaria del equipo de trabajo en alturas y elementos de protección personal Ubicación punto de anclaje Elaboración de AST e implementación de controles Permiso de Trabajo en alturas	contratista oficiales ayudantes SST
alistamiento y selección de materiales (Madera, tapetes, hierro, alfombra y escombro)	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) capacitacion sobre traciego de material charla sobre levantamiento manual de cargas, charla sobre comunicación en equipo	contratista oficiales ayudantes SST
	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* charlas preoperacional, manipulacion de cargas, comunicación acertiva, pausas activas, uso de elementos de proteccion personal: casco con barbuquejo, botas de sseguridad con puntera, dotacion de trabajo(camiza manga larga y pantalon de overol)	contratista oficiales ayudantes SST
	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) capacitacion sobre traciego de material charla sobre levantamiento manual de cargas, charla sobre comunicación en equipo	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad trabajo en alturas	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, muerte	Inspección diaria del equipo de trabajo en alturas y elementos de protección personal Ubicación punto de anclaje Elaboración de AST e implementación de controles Permiso de Trabajo en alturas	contratista oficiales ayudantes SST

Powered by CamScanner

Armado de andamios	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* orden y aseo en las areas de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
	*Ubicación inadecuada de objetos falta de orden y aseo, herramienta.	* Caidas, esguinces y lesiones varias.	*Mantener el aera de trabajo en orden y aseo	contratista oficiales ayudantes
	*CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en alturas	*Caidas a distinto nivel, fracturas, muerte,	*Uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, arnes, eslinga, botas y ropa de trabajo. *El trabajador debe estar anclado mientras este usando el andamio.	contratista oficiales ayudantes SST
	*FISICO: ruido intermitente de impacto, golpes con herramientas.	Hipoacusia o afecciones auditivas	*Uso obligatorio de protector auditivo de inserción y copa.	contratista oficiales ayudantes SST
Desinstalación de muros y madera en techo	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas,	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* orden y aseo en las areas de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad trabajo en alturas	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, muerte	Inspección diaria del equipo de trabajo en alturas y elementos de protección personal Ubicación punto de anclaje Elaboración de AST e implementación de controles Permiso de Trabajo en alturas	contratista oficiales ayudantes SST
Retiro de escombros	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas,	contratista oficiales ayudantes SST
	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* orden y aseo en las areas de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
	*FISICO: ruido frecuente con herramienta como el rotomartillo	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre manejo adecuado de las herramientas	contratista oficiales ayudantes SST

Powered by CamScanner

	*Ubicación inadecuada de objetos falta de orden y aseo, herramienta.	* Caidas, esguinces y lesiones varias.	*Mantener el aera de trabajo en orden y aseo	contratista oficiales ayudantes SST
orden y aseo en las areas de trabajo	condiciones de seguridad orden y aseo	*Caida de personas, fracturas, lesiones incapacitantes.	*Al terminar las actividades las areas de trabjo deben quedar en orden y aseo.	contratista oficiales ayudantes inspectora SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD

ELEMENTO	SI	NO	NA	ELEMENTO	SI	NO	NA	ELEMENTO	SI	NO	NA
BOTAS DE SEGURIDAD CON	x			PROTECCION AUDITIVA	x			GUANTES DE CARNAZA		x	
BOTAS DE CAUCHO CON			x	PROTECCION RESPIRATORIA	x			GUANTES DE NITRILO	x		
MONOGAFAS DE SEGURIDAD	x			CASCO CON BARBUQUEJO	x			ROPA DE TRABAJO OVEROL	x		

*** Todo trabajo debe poseer un análisis de riesgo antes de iniciar la tarea.**

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA ATS	CODIGO VERSION: 01 FECHA: 29-02-2023 PAG 1 DE 2

FIRMA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

N°	CONSECUTIVO ATS:			5-2-24	6-2-24	07/02/24	08/02/24	09/02/24	10/02/24	
	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	BOADA ROBLES YEIMER	1026562467	OFICIAL							
2	MANOSALVA VELASQUEZ GABRIEL ANGEL	1064712262	OFICIAL							
3	JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1043644401	AYUDANTE							
4	JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1096821481	OFICIAL							
5	JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1127587970	AYUDANTE							
6	JOSE LUIS MANCILLA JULIO	1002275995	AYUDANTE							
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1004808987	AYUDANTE							
8	EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1130275511	OFICIAL							
9	YOSNEIDER MACHADO RAMOS	1004825489	AYUDANTE							
10	LUIS HEDINSON MURCIA VELASQUEZ	79829910	AYUDANTE							
11	LEONARDO ZAPATA SUAREZ	1099543134	AYUDANTE							
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

AUTORIZACION: Cualquiera de las partes responsables de la actividad puede suspender este ats, si considera que existe una variacion significativa como: temperatura, contaminantes atmosferico, lluvias etc. O en caso de no estar cumpliendo con las medidas de seguridad contempladas

FIRMAS ENCARGADO

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	GABRIEL MANOSALVA	GABRIEL MANOSALVA	GABRIEL MANOSALVA	GABRIEL M	GABRIEL M	GABRIEL M	
FIRMA							

FIRMAS JEFE INMEDIATO

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER B	YEIMER B	YEIMER B.	
FIRMA							

FIRMAS INSPECTOR SST

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	JUAN J. LOPEZ	JUAN J. LOPEZ	OLGA LUCIA LONDOÑO	OLGA L. LONDOÑO	OLGA LUCIA	OLGA LUCIA.	
FIRMA							

Powered by CamScanner

	ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)	CODIGO: FR-SST-01 VERSION: 03 FECHA: 06-02-2024

PROYECTO: TEATRO PATRIA	**CONSECUTIVO ATS: semana 07**
FECHA DE INICIO: 12/02/2024	**HORA INICIAL: 7:00 am**
FECHA DE FINALIZACION: 17/02/2024	**HORA FINAL: 5:00 pm**
UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL TRABAJO: Todas las areas del teatro patri internas y externa	**NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 11**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Se retira todo el escombro y madera, madera comprimida y demas que se dejara en la parte externa del cerramiento, se continua con demoliciones en sotanos, muro de escaleras externas, muro de la parte de taquilla, retiro de materiales y escombro con volquetas, retiro de madera de los camerinos del sotano.

MARCAR SI, NO, N/A (no aplica), SEGÚN CORRESPONDA

1.- ¿ El RIESGO más crítico de la actividad fue identificado?	SI	6.- ¿ Evaluó la aplicación de bloqueos físicos requeridos para energías peligrosas?	N/A
2.- ¿Se evaluó las condiciones de trabajo (Ej.: Ruido, Espacio disponible, Iluminación, Temperatura, Desniveles, Polvo, Etc.)?	SI	7.- ¿Evaluó el riesgo de incendio, vías de escape disponibles y recursos para la atención de este? ¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	SI
3.- ¿Se identificó los aspectos ambientales: derrames de liquidos, sustancias peligrosas, contaminación del aire, generación de residuos?	SI	8.- ¿Para trabajos en altura se evaluó: escalas, escaleras, accesos, líneas de vida, plataformas, andamios, atrapa soga, soga o cordel de perlón?	SI
4.- ¿Las herramientas, equipos e instalaciones eléctricas, están en condiciones de ser usadas según estándares establecidos?	SI	9.- ¿Los andamios se encuentran certificados?	SI
5.- ¿ El personal está capacitado para realizar la actividad?	SI	10.-¿ Para trabajos en caliente se cuenta con equipo de extinción de incendio? ¿El equipo de extinción se encuentra en buenas condiciones?	NO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y PERMISOS REQUERIDOS

Procedimientos	SI	NO	Procedimientos	SI	NO
Trabajo en alturas	X		Espacios Confinados		X
Trabajos en caliente	X		Otro Cual:		

CONSIDERACIONES ADICIONALES

¿Se requiere entrenamiento especial?	**SI**	**NO X**
Especifique: N/A		
¿Las condiciones climáticas pueden afectar el trabajo?	**SI**	**NO X**

lluvias torrenciales NO tormenda electrica NO inundaciones NO vendavales NO otro: _____

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	MARTILLO, BARRETON, DESTORNILLADOR
Eléctricas	SIERRA, PULIDORA, ROTOMARTILLOS
Neumáticas	NO
Hidráulicas	NO
Mecánicas	ANDAMIO
Otras	TALADROS INHALAMBRICO

Powered by CamScanner

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos	Responsables de las acciones o procedimientos requeridos
*Ingreso del personal a la obra	*CONDICIONES DE SEGURIDAD: LOCATIVO: Superficies irregulares con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo , caida de objetos	*Caidas al mismo nivel, fracturas, lesiones incapacitantes.	* Uso seguro del sendero peatonal.	contratista oficiales ayudantes SST
Inspeccion de equipos y herramientas a utilizar	*CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVO: Almacenamiento y superficies de trabajo condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas al mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes	* Inspeccion y firma de equipos, firma de ATS	contratista oficiales ayudantes SST
	BIOLOGICOS: Virus, Bacterias,	problemas respiratorios, desorden del sistema nervioso, diarrea, dolor de cabeza, escalofrio, vomito, dolor de estomago	cumplir con los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, uso de proteccion respiratoria, distanciamiento control de roedores, orden y aseo en los lugares de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
Inspeccionar area de trabajo	* Condiciones locativas irregularidades en el area de trabajo, condiciones de orden y aseo	* caidas al mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes	* charla preoperacional, pausas activas, uso de elementos de proteccion personal: casco con barbuquejo, botas de sseguridad con puntera, dotacion de trabajo(camiza manga larga y pantalon de overol)	contratista oficiales ayudantes SST
	biomecanico: Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales) esfuerzo, manipulacion manual de cargas, movimiento repetitivo	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares	charla de capacitacion de levantmiento de cargas, inspeccion de elementos y equipos de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
	quimico: polvos organicos e inorganicos liquido rocios	problemas respiratorios y visuales	uso de epps (casco, guantes, botas de seguridad, punteras, protector respiratorio)	contratista oficiales ayudantes SST
Inspección equipo y procedimiento para trabajo en alturas	condiciones de seguridad trabajo en alturas	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, muerte	Inspección diaria del equipo de trabajo en alturas y elementos de protección personal Ubicación punto de anclaje Elaboración de AST e implementación de controles y firmar permiso de Trabajo en alturas	contratista oficiales ayudantes SST
alistamiento y selección de materiales (Madera, madera comprimida, hierro, y escombro)	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) capacitacion sobre traciogo de material charla sobre levantamiento manual de cargas, charla sobre comunicación en equipo	contratista oficiales ayudantes SST
	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* charlas preoperacional, manipulacion de cargas, comunicación acertiva, pausas activas, uso de elementos de proteccion personal: casco con barbuquejo, botas de sseguridad con puntera, dotacion de trabajo(camiza manga larga y pantalon de overol)	contratista oficiales ayudantes SST

Powered by CamScanner

Armado de andamios	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) capacitacion sobre traciego de material charla sobre levantamiento manual de cargas, charla sobre comunicación en equipo	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad trabajo en alturas	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, muerte	Inspección diaria del equipo de trabajo en alturas y elementos de protección personal Ubicación punto de anclaje Elaboración de AST e implementación de controles Permiso de Trabajo en alturas	contratista oficiales ayudantes SST
	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* orden y aseo en las areas de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
	*Ubicación inadecuada de objetos falta de orden y aseo, herramienta.	* Caidas, esguinces y lesiones varias.	*Mantener el aera de trabajo en orden y aseo	contratista oficiales ayudantes
	*CONDICIONES DE SEGURIDAD Trabajo en alturas	*Caidas a distinto nivel, fracturas, muerte,	*Uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, arnes, eslinga, botas y ropa de trabajo. *El trabajador debe estar anclado mientras este usando el andamio.	contratista oficiales ayudantes SST
	*FISICO: ruido intermitente de impacto, golpes con herramientas.	Hipoacusia o afecciones auditivas	*Uso obligatorio de protector auditivo de inserción y copa.	contratista oficiales ayudantes SST
Desinstalación de muros y madera en los camerinos del sotano	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas,	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* orden y aseo en las areas de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad trabajo en alturas	caida a distinto y al mismo nivel, fracturas, muerte	Inspección diaria del equipo de trabajo en alturas y elementos de protección personal Ubicación punto de anclaje Elaboración de AST e implementación de controles Permiso de Trabajo en alturas	contratista oficiales ayudantes SST
	biomecanicos: manipulacion manual de cargas, movimientos repetitovos esfuerzo, Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre levantamiento manual de cargas,	contratista oficiales ayudantes SST

Powered by CamScanner

Retiro de escombros, madera, madera comprimida, hierro y manto asfaltico	*RADIACIONES IONIZANTES: rayos x, gama, beta y alfa.	*Cansancio *Quemaduras por altas temperaturas.	* Pausas activas. *Uso de bloqueador solar. * uso de EPP (casco con barbuquejo, guantes, protector respiratorio, protector auditivo de inserción, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo.	contratista oficiales ayudantes SST
	condiciones de seguridad Locativo (almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)	* caidas a distinto y mismo nivel, laceraciones, lesiones incapacitantes, fracturas, contuciones, golpes	* orden y aseo en las areas de trabajo	contratista oficiales ayudantes SST
	*FISICO: ruido frecuente con herramienta como el rotomartillo	lesiones musculares, lumbalgia, lesiones osteomusculares, lesiones incapacitantes, contuciones, punciones	uso de epps (casco, guantes adecuados para la actividad, botas de seguridad punteras, protector respiratorio) charla sobre manejo adecuado de las herramientas	contratista oficiales ayudantes SST
	*Ubicación inadecuada de objetos falta de orden y aseo, herramienta.	* Caidas, esguinces y lesiones varias.	*Mantener el aera de trabajo en orden y aseo	contratista oficiales ayudantes SST
orden y aseo en las areas de trabajo	condiciones de seguridad orden y aseo	*Caida de personas, fracturas, lesiones incapacitantes.	*Al terminar las actividades las areas de trabjo deben quedar en orden y aseo.	contratista oficiales ayudantes inspectora SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD

ELEMENTO	SI	NO	NA	ELEMENTO	SI	NO	NA	ELEMENTO	SI	NO	NA
BOTAS DE SEGURIDAD CON	x			PROTECCION AUDITIVA	x			GUANTES DE CARNAZA		x	
BOTAS DE CAUCHO CON			x	PROTECCION RESPIRATORIA	x			GUANTES DE NITRILO	x		
MONOGAFAS DE SEGURIDAD	x			CASCO CON BARBUQUEJO	x			ROPA DE TRABAJO OVEROL	x		

*** Todo trabajo debe poseer un análisis de riesgo antes de iniciar la tarea.**

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA ATS	CODIGO: FR-SST-01 VERSION: 03 FECHA: 06-02-2024

FIRMA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

N°	CONSECUTIVO ATS:									
	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	BOADA ROBLES YEIMER	1026562467	OFICIAL							
2	MANOSALVA VELASQUEZ GABRIEL ANGEL	1064712262	OFICIAL							
3	JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	10966821481	OFICIAL							
4	JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1043844401	OFIAL							
5	JORGE LUIS SANABRIA ESCORCIA	1127587970	AYUDANTE							
6	JOSE LUIS MANCILLA JULIO	1002275995	AYUDANTE							
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1004808987	AYUDANTE							
8	EDISON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1130725511	AYUDANTE							
9	YOSNEIDER CAMACHO RAMOS	1004825489	AYUDANTE							
10	LUIS EDINSON MURCIA VELASQUEZ	79829910	AYUDANTE							
11	LEONARDO ZAPATA SUAREZ	1099543134	AYUDANTE							
12	JULIO CESAR GOLVEZ	72295173	OFICIAL							
13										
14										
15										

AUTORIZACION: Cualquiera de las partes responsables de la actividad puede suspender este ats, si considera que existe una variacion significativa como: temperatura, contaminantes atmosferico, lluvias etc. O en caso de no estar cumpliendo con las medidas de seguridad contempladas

FIRMAS ENCARGADO

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	Gabriel Manosalva	Gabriel Manosalva	Gabriel Manosalva	Gabriel Manosalva	Gabriel Manosalva	Gabriel Manosalva	
FIRMA							

FIRMAS JEFE INMEDIATO

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	Yeimer Boada	Yeimer Boada	Yeimer Boada	Yeimer Boada	Yeimer Boada	Yeimer Boada	
FIRMA							

FIRMAS INSPECTOR SST

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	Olga Lucia Londoño S.	Olga Lucia Londoño S.	Olga Lucia Londoño S.	Olga Lucia Londoño S.	Olga Lucia Londoño S.	Olga Lucia Londoño S.	
FIRMA							

Powered by CamScanner

	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE ALTURAS	CODIGO: VERDION: 01 FECHA: 20-03-2023

Equipo: ARNES CURPO COMPLETO		Equipo: ESLINGA												Equipo:									
Marca del Equipo:		Marca del Equipo:												Marca del Equipo:									
Fecha de fabricación		Fecha de fabricación												Fecha de fabricación									
Serial:		Serial:												Serial:									
No. Interno:		No. Interno:												No. Interno:									
PROYECTO:																							
Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR ARNES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cintas / Correas	Hoyos o agujeros																						
	Cintas deshilachadas																						
	Desgastadas																						
	Talladuras																						
	Hay torsión (fibras duras o deformadas).																						
	contaminación excesiva por suciedad.																						
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.																						
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																						
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie																						
	Ataque por sustancias químicas																						
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.																						
	Otros																						
Costuras	Abiertas																						
	Hebras sueltas																						
	Reventadas																						
	Otros																						
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y	Desgaste en los extremos																						
	Corrosión																						
	Deformación																						
	Fisuras, golpes, hundimientos.																						
	Aristas, bordes filosos o arrugados.																						
	Otros																						
	ESLINGA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Absorbedor	Agujeros																						
	Rasgaduras																						
	Costuras Sueltas o reventadas.																						
	Deterioro																						
	Hebras rotas																						
	Contaminación por Suciedad																						
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.																						
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																						
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.																						
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros																						
	Cintas deshilachadas																						
	Desgastadas																						
	Talladuras																						
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)																						
	contaminación excesiva por suciedad																						
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.																						
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.																						
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie																						
	Ataque por sustancias químicas																						
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.																						
	Otros																						
Partes Metálicas Herrajes,	Desgaste en los extremos																						
	Corrosión																						
	Deformación																						
	Fisuras, golpes, hundimientos.																						
	Aristas, bordes filosos o arrugados.																						
	Otros																						
	LINEA DE VIDA																						
	desgaste en los extremos																						
	corrosion																						
	deformacion																						
OTRO																							
		1-2-24			2-2-24			5-2-24			6-2-24			07/02/24			09/02/24			fecha			
NOMBRE PERSONA QUE LO UTILIZA E INSPECCIONA		G.HANO			G.HANO						G.HANO			G.HANO			G.HANO						
FIRMA																							
NOMBRE INSPECTOR SST		J.LOPEZ			J.LOPEZ			J.LOPEZ			J.LOPEZ			Olga Londoño			Olga Londoño						
FIRMA																							

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE ALTURAS

CODIGO:
VERDION: 01
FECHA: 20-03-2023

Equipo: ARNES CUERPO COMPLETO	Equipo: ESLINGA		Equipo:	
Marca del Equipo: FIRMA WORK	Marca del Equipo: TRAPE-		Marca del Equipo:	
Fecha de fabricación 2021	Fecha de fabricación 439		Fecha de fabricación	
Serial: 19	Serial: 5		Serial:	
No. Interno: 3	No. Interno:		No. Interno:	
PROYECTO: CESAC				

Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR ARNES	1-2-24			2-2-24			3-2-24			5-2-24			6-2-24			01/02/24			08/02/24		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		X			X			X			X		X			X			X		
	Cintas deshilachadas		X			X			X			X		X			X			X		
	Desgastadas		X			X			X			X		X			X			X		
	Talladuras		X			X			X			X		X			X			X		
	Hay torsión (fibras duras o deformadas).		X			X			X			X		X			X			X		
	contaminación excesiva por suciedad.		X			X			X			X		X			X			X		
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X		X			X			X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X		X			X			X		
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie		X			X			X			X		X			X			X		
	Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X		X			X			X		
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X		X			X			X		
	Otros																					
Costuras	Abiertas																					
	Hebras sueltas		X			X			X			X		X			X			X		
	Reventadas		X			X			X			X		X			X			X		
	Otros		X			X			X			X		X			X			X		
Partes Metálicas Herrajes, hebillas y	Desgaste en los extremos		X			X			X			X		X			X			X		
	Corrosión		X			X			X			X		X			X			X		
	Deformación		X			X			X			X		X			X			X		
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X		X			X			X		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X		X			X			X		
	Otros																					
	ESLINGA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Absorbedor	Agujeros		X			X			X			X		X			X			X		
	Rasgaduras		X			X			X			X		X			X			X		
	Costuras Sueltas o reventadas.		X			X			X			X		X			X			X		
	Deterioro		X			X			X			X		X			X			X		
	Hebras rotas		X			X			X			X		X			X			X		
	Contaminación por Suciedad		X			X			X			X		X			X			X		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X			X			X			X		X			X			X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X		X			X			X		
	Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		X			X			X			X		X			X			X		
Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		X			X			X			X		X			X			X		
	Cintas deshilachadas		X			X			X			X		X			X			X		
	Desgastadas		X			X			X			X		X			X			X		
	Talladuras		X			X			X			X		X			X			X		
	Hay torsión (fibras duras o deformadas)		X			X			X			X		X			X			X		
	contaminación excesiva por suciedad		X			X			X			X		X			X			X		
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X		X			X			X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X		X			X			X		
	Degradación por U.V. (pérdida de color y superficie		X			X			X			X		X			X			X		
	Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X		X			X			X		
	Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X		X			X			X		
	Otros																					
Partes Metálicas Herrajes	Desgaste en los extremos		X			X			X			X		X			X			X		
	Corrosión		X			X			X			X		X			X			X		
	Deformación		X			X			X			X		X			X			X		
	Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X		X			X			X		
	Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X		X			X			X		
	Otros																					
	LINEA DE VIDA		X			X			X			X		X			X			X		
	desgaste en los extremos		X			X			X			X		X			X			X		
	corrosion		X			X			X			X		X			X			X		
	deformacion		X			X			X			X		X			X			X		
OTRO																						

		1-2-24			2-2-24			3-2-24			5-2-24			6-2-24			01/02/24			08-02/24		
NOMBRE PERSONA QUE LO UTILIZA E INSPECCIONA		JORGE LUIS			JORGE LUIS			JORGE LUIS			JORGE LUIS			JORGE LUIS			JORGE LUIS			JORGE LUIS		
FIRMA		Jorge Luis						Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis			Jorge Luis		
NOMBRE INSPECTOR SST		J. LOPEZ			J. LOPEZ			J. LOPEZ			J. LOPEZ			J. LOPEZ								
FIRMA																						

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SST-05
Fecha de vigencia: 9/02/2024
Versión: 2

Lugar: Tearo Patria Fecha: 13-17/02/24

Actividad:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUNES			MARTES 13/02/24			MIÉRCOLES 14/02/24			JUEVES 15/02/24			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
		ARNES																					
SERIAL:	Reata y correas	Se evidencian cambios de textura, deshilachadas, corrosión, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas.																					
	Argollas	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, desgaste de costuras entre unión de argolla y correas.																					
MARCA:	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosión excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes																					
FECHA DE FABRICACION:	Anillos y partes metálicas	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, presentan oxido.																					
	Costuras	Costuras, estado de hebillas y pasadores, presentan hilachas , hilos sueltos , desgaste , quemaduras o corrosión .																					
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA																					
SERIAL:	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachadas, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas																					
MARCA:	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en mal estado, oxidado.																					
FECHA DE FABRICACION:	Absorvedor	Presenta desgaste , ruptura , deformación o se encuentra con desiongación																					
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																					
SERIAL:	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas , deshilachadas, cortes , quemaduras.																					
MARCA: FECHA DE FABRICACION:	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado.																					
		ANCLAJE - TIE OFF																					
SERIAL: MARCA:	Reata	Cambios de textura, deshilachadas, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas																					
FECHA DE FABRICACION:	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada.																					
		MOSQUETON																					
SERIAL:	Seguro	seguro automático cierra y ajusta con normalidad																					
MARCA:	Ejes	Se encuentra libre de oxido , corrosión , deformación, fisuras , superficies porosas, seguros libres de trabas , distorsiones u obstrucciones																					
		CASCO																					
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión																					
		CUERDAS /LINEAS DE VIDA																					
SERIAL:	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas , deshilachadas, cortes , quemaduras.																					
FECHA DE FABRICACION:	Ganchos o mosquetones/ ojal	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado.																					

Los nombres y firmas mencionadas a continuación deben ser del personal ejecutor de la actividad en alturas y quien realiza uso de los equipos de protección contra caidas y del coordinador de alturas. Quienes realizan la inspección visual en conjunto antes de cada uso

Inspeccionado por			Firmas diaria del grupo quien realiza la inspección						
Nombre y apellido	# Documento	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Operador: Jhuin Sotelo L.	1099821481	OF							
Coordinador: Dra Lucia Londoño S.	52192680.	SST -							

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES YH	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA**	Código: FR-SST-05 Fecha de vigencia: 9/02/2024 Versión: 1

Lugar: Tearo Patria Fecha: 13-17/02/24.

Actividad:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUNES			MARTES 13/02/24			MIÉRCOLES 14/02/24			JUEVES 15/02/24			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
ARNES																							
SERIAL:	Reata y correas	Se evidencian cambios de textura, deshilachadas, corrosión, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas				X			X			X											
MARCA:	Argollas	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, desgaste de costuras entre unión de argolla y correas.				X			X			X											
	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosión excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes				X			X			X											
FECHA DE FABRICACION:	Anillos y partes metálicas	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, presentan oxido.				X			X			X											
	Costuras	Costuras, estado de hebillas y pasadores, presentan hilachas , hilos sueltos , desgaste , quemaduras o corrosión .				X			X			X											
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA																							
SERIAL:	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachadas, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas				X			X			X											
MARCA:	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en mal estado, oxidado.				X			X			X											
FECHA DE FABRICACION:	Absorvedor	Presenta desgaste , ruptura , deformación o se encuentra con destorgación				X			X			X											
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																							
SERIAL:	Cuerda / lazo	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas , deshilachadas, cortes , quemaduras.																					
MARCA:	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado.																					
FECHA DE FABRICACION:																							
ANCLAJE - TIE OFF																							
SERIAL:	Reata	Cambios de textura, deshilachados, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas				X			X			X											
MARCA:	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada.				X			X			X											
FECHA DE FABRICACION:																							
MOSQUETON																							
SERIAL:	Seguro	seguro automático cierra y ajusta con normalidad																					
MARCA:	Ejes	Se encuentra libre de oxido , corrosión , deformación, fisuras , superficies porosas, seguros libres de trabas , distorsiones u obstrucciones																					
CASCO																							
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, malla suspensión				X			X			X											
CUERDAS ALINEAS DE VIDA																							
SERIAL:	Cuerda / lazo	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas , deshilachadas, cortes , quemaduras.				X			X			X											
FECHA DE FABRICACION:	Ganchos o mosquetones/ ojal	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado.				X			X			X											

Los nombres y firmas mencionadas a continuación deben ser del personal ejecutor de la actividad en alturas y quien realiza uso de los equipos de protección contra caídas y del coordinador de alturas. Quienes realizan la inspección visual en conjunto antes de cada uso

Inspeccionado por			Firmas diaria del grupo quien realiza la inspección						
Nombre y apellido	# Documento	Cargo	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Operador: Yobi. Ll Montaño	1064712162	OI							
Coordinador: Olga Lucía Londoño	52442080	SST.							

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SST-05
Fecha de vigencia: 9/02/2024
Versión: 2

Lugar: Tearo Patria Fecha: 13/7/02/24.

Actividad:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO	ELEMENTO	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUNES			MARTES 13/02/24			MIÉRCOLES 14/02/24			JUEVES 15/02/24			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
		ARNES																					
SERIAL:	Reata y correas	Se evidencian cambios de textura, deshilachadas, corrosión, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas.					X			X			X										
	Argollas	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, desgaste de costuras entre unión de argolla y correas.					X			X			X										
MARCA:	Hebillas, pasadores	Barras externas y centrales rectas, deslizamiento de reata, corrosión excesiva, desgaste en extremos, daños en costura o fibra, deformaciones, funcionamiento inadecuado de resortes					X			X			X										
FECHA DE FABRICACION:	Anillos y partes metálicas	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, presentan oxido.					X			X			X										
	Costuras	Costuras, estado de hebillas y pasadores, presentan hilachas , hilos sueltos , desgaste , quemaduras o corrosión .					X			X			X										
		ESLINGA CON ABSORVEDOR DE ENERGIA																					
SERIAL:	Reata	Costuras sueltas en zona de absorción, cambios de textura, deshilachadas, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas					X			X			X										
MARCA:	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en mal estado, oxidado.					X			X			X										
FECHA DE FABRICACION:	Absorvedor	Presenta desgaste , ruptura , deformación o se encuentra con desiongación					X			X			X										
		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO																					
SERIAL:	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas , deshilachadas, cortes , quemaduras.																					
MARCA:	Ganchos o mosquetones	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado.																					
FECHA DE FABRICACION:																							
		ANCLAJE - TIE OFF																					
SERIAL:	Reata	Cambios de textura, deshilachadas, surcos en bordes, cortes, desgarres, abrasiones, quemaduras, decoloración, hebras sueltas, costuras rotas					X			X			X										
MARCA:																							
FECHA DE FABRICACION:	Argolla	Deformaciones, fisuras, corrosión excesiva, bordes rugosos o afilados, costura apropiada.					X			X			X										
		MOSQUETON																					
SERIAL:	Seguro	seguro automático cierra y ajusta con normalidad																					
MARCA:	Ejes	Se encuentra libre de oxido , corrosión , deformación, fisuras , superficies porosas, seguros libres de trabas , distorsiones u obstrucciones																					
		CASCO																					
	Casco	Araña, tafilete, barbuquejo en mal estado, mala suspensión					X			X			X										
		CUERDAS /LINEAS DE VIDA																					
SERIAL:	Cuerda / laso	Desgastes o abrasiones, hebras sueltas , deshilachadas, cortes , quemaduras.					X			X			X										
FECHA DE FABRICACION:	Ganchos o mosquetones/ ojal	Deformaciones, fisuras, corrosiones y superficies porosas, cerradura libre de trabas, distorsiones u obstrucciones, seguro en buen estado.					X			X			X										

Los nombres y firmas mencionadas a continuación deben ser del personal ejecutor de la actividad en alturas y quien realiza uso de los equipos de protección contra caídas y del coordinador de alturas. Quienes realizan la inspección visual en conjunto antes de cada uso

Inspeccionado por				Firmas diaria del grupo quien realiza la inspección						
	Nombre y apellido	# Documento	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Operador:	Jorge Luis Sarabia Escorcia	1121581970	Ayudante		Jorge Luis	Jorge Luis	Jorge Luis			
Coordinador:	Olga Lucía Londoño	52142680	SST.							

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SUPERVISOR GABRIEL MANOSALVA. SERIE: NO TIENE.
INSPECCIONADO POR: Olga Lucía Landinos MODELO:: NO TIENE.
SEMANA DEL 12 AL 17 DE Febrero 2024. MARCA:



DESCRIPCION	APLICA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Se verificó el voltaje de la pulidora? *	✓				✓				✓								
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra)	✓				✓				✓								
Estado de insertación del disco *	✓				✓				✓								
Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada) *	✓				✓				✓								
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.	✓				✓				✓								
Estado del swicthe de encendido y automático.	✓				✓				✓								
Estado de la guía de la pulidora y de la guarda. *	✓				✓				✓								
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo. *	✓				✓				✓								
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado	✓				✓				✓								
Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).	✓				✓				✓								
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza, camisa larga con puño abotonado, botas con punteras de acero).	✓				✓				✓								
Instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador. *		✓							✓								No se usa para temas de altura.
Nombre operador/CC. Al firmar declaro que me encuentro en adecuadas condiciones de salud para trabajar. GABRIEL MANOSALVA.	Firma diaria																
Nombre operador/CC. Al firmar declaro que me encuentro en adecuadas condiciones de salud para trabajar.	Firma diaria																
Nombre operador/CC. Al firmar declaro que me encuentro en adecuadas condiciones de salud para trabajar.	Firma diaria																
Nombre operador/CC. Al firmar declaro que me encuentro en adecuadas condiciones de salud para trabajar.	Firma diaria																
Inspector ~~SISO~~ contratista	Firma diaria																

B : BUEN ESTADO ✓ M : MAL ESTADO

* = Si no cumple Inhabilita el equipo para trabajar

Powered by CamScanner

INSPECCION DE ANDAMIOS

Código: F-SST-52
Versión: 02
Pagina: 1 de 1

Area: Muro escaleras externas. Fecha: 13/02/2024

Nombre y Apellidos del Inspector: Olga Lucía Londoño S.

ITEMNS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACION Y/O ACCION DE MEJORA
1	El coordinador de trabajo en alturas y el trabajador autorizado diligenciaron el permiso de trabajo.	✓			
2	El trabajador autorizado (Capacitado) utiliza correctamente el equipo de protección contra caídas.	✓			
3	Se hizo la prueba de funcionamiento del andamio antes de iniciar la tarea.	✓			
4	Esta asegurado la base del andamio.	✓			
5	Módulos o cuerpo del andamio en perfecto estado.	✓			
6	Se encuentran las plataformas del andamio libres de grasas u otros materiales.	✓			
7	Están instalados en una base segura.	✓			
8	El sistema de fijación es el adecuado (Roscas, pines, alambres amarrados).	✓			
9	Existen líneas de vida para ascender y descender del andamio.			✓	
10	El andamio esta retirado de líneas o redes de energía.	✓			
11	El área de trabajo esta libre de tormentas eléctricas.	✓			
12	Las partes del andamio (pines, crucetas, marcos) están libres de oxido, roturas, grietas.	✓			
13	Los andamios se aseguran a la estructura.			✓	
14	La superficie esta plan y nivelada.	✓			
15	La base se nivela con material resistente al peso.	✓			
16	Las crucetas están derechas, sin fisuras.	✓			
17	Las crucetas son dos por sección.	✓			
18	Las crucetas tienen la misma longitud.	✓			
19	Los tablones son resistentes al peso de trabajo.	✓			Son plataformas metalicas.
20	Los tablones están libres de fisuras-torcidos.	✓			
21	Los tablones tienen el espesor requerido.	✓			
Firma del Inspector:					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del area):					

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL PARA TALADROS DEMOLEDORES	CODIGO:	SG-FO-04
		VERSION:	01
		FECHA:	09/02/2024

PROYECTO: TEATRO PATRIA

FECHA: DESDE 12/02/2024 HASTA 17/02/2024

TALADRO No: DW 25907 HK. **MARCA:** DEWALT. **REFERENCIA:** N/A.

TALADRO No: N/O TIENE. **MARCA:** — **REFERENCIA:** —

COLOR: AMARILLO. **AREA DE TRABAJO:** TANQUE DE AGUA

√ : FUNCIONA CORRECTAMENTE R:FUNCIONA PERO SE TIENE QUE MEJORAR X: NO FUNCIONA

LISTA DE CHEQUEO

ESTADO DEL MOTOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
COMPONENTES						
EL CABLE DE ALIMENTACION ESTA COMPLETO Y EN BUEN ESTADO	✓	✓	✓			
LA CARCAZA ESTACOMPLETA., AJUSTADA Y SIN GOLPES	✓	✓	✓			
ESTADO DE ACCESORIOS PORTA BROCAS-MANDRIL	✓	✓	✓			
EL INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE ESTA EN BUEN ESTADO	✓	✓	✓			
EL PORTABROCAS SDS ESTA EN BUEN ESTADO	✓	✓	✓			
EL BOTON DE BLOQUEO ESTA EN BUEN ESTADO Y ES FUNCIONAL	✓	✓	✓			
TIENE EL MANGO LATERAL MULTIPOSICION EN BUEN ESTADO	✓	✓	✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓	✓	✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓	✓	✓			

En caso de presentar una "X" en la columna "M" en los elementos en negrita, el equipo no se puede autorizar para trabajar, elabore una tarjeta suspensión por condiciones inseguras, retire el equipo, márquelo con una cinta de papel con la frase "NO APTO PARA OPERAR", hasta que se solucione la condición. En caso de presentar una "X" en la columna "M" en los elementos sin negrita, el equipo se puede autorizar para trabajar, elabore una tarjeta CACI por condiciones inseguras y solicite que se solucione la condición en el menor tiempo posible.

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION						
AUTORIZADO PARA LABORAR	SI (X) NO ( )	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO ( )	SI (X) NO ( )	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO ( )
NOMBRE OPERARIO. JEAN CARLOS GUETTE P.	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos			
NOMBRE OPERARIO.						
NOMBRE OPERARIO.						
NOMBRE OPERARIO.						
NOMBRE OPERARIO.						
NOMBRE OPERARIO.						
RESIDENTE OBRA SST. Olga Lucía Londoño S CC: 52192680						

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL PARA TALADROS DEMOLEDORES	CODIGO:	SG-FO-04
		VERSION:	01
		FECHA:	09/02/2024

PROYECTO: TEATRO PATRIA

FECHA: DESDE 5/02/2024 **HASTA** 10/02/2024

TALADRO No: DW 25907HK. **MARCA:** DEWALT. **REFERENCIA:** N/A.

TALADRO No: / **MARCA:** / **REFERENCIA:** /

COLOR: AMARILLO. **AREA DE TRABAJO:** TANQUE DE AGUA

√ : FUNCIONA CORRECTAMENTE R:FUNCIONA PERO SE TIENE QUE MEJORAR X: NO FUNCIONA

LISTA DE CHEQUEO

ESTADO DEL MOTOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
COMPONENTES						
EL CABLE DE ALIMENTACION ESTA COMPLETO Y EN BUEN ESTADO			√	√	√	
LA CARCAZA ESTACOMPLETA., AJUSTADA Y SIN GOLPES			√	√	√	
ESTADO DE ACCESORIOS PORTA BROCAS-MANDRIL			√	√	√	
EL INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE ESTA EN BUEN ESTADO			√	√	√	
EL PORTABROCAS SDS ESTA EN BUEN ESTADO			√	√	√	
EL BOTON DE BLOQUEO ESTA EN BUEN ESTADO Y ES FUNCIONAL			√	√	√	
TIENE EL MANGO LATERAL MULTIPOSICION EN BUEN ESTADO			√	√	√	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			√	√	√	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			√	√	√	
			√	√	√	

En caso de presentar una "X" en la columna "M" en los elementos en negrita, el equipo no se puede autorizar para trabajar, elabore una tarjeta suspensión por condiciones inseguras, retire el equipo, márquelo con una cinta de papel con la frase "NO APTO PARA OPERAR", hasta que se solucione la condición. En caso de presentar una "X" en la columna "M" en los elementos sin negrita, el equipo se puede autorizar para trabajar, elabore una tarjeta CACI por condiciones inseguras y solicite que se solucione la condición en el menor tiempo posible.

FIRMAS DE REVISION Y APROBACION						
AUTORIZADO PARA LABORAR	SI(X) NO( )	SI( ) NO( )	SI( ) NO( )	SI(X) NO( )	SI( ) NO( )	SI( ) NO( )
NOMBRE OPERARIO. JEAN CARLOS GUETTE.	/	/	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos	Jeancarlos
NOMBRE OPERARIO.	/	/	/	/	/	/
NOMBRE OPERARIO.	/	/	/	/	/	/
NOMBRE OPERARIO.	/	/	/	/	/	/
NOMBRE OPERARIO.	/	/	/	/	/	/
NOMBRE OPERARIO.	/	/	/	/	/	/
RESIDENTE OBRA SST. Olga Lucía Londoño S CC: 52192680						

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: FR-SST-002	
		VERSION: 03	hoja 1 de 3
	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 2-02-2024	

PROYECTO: TEATRO PATRIA	NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 12
FECHA DE INICIO: 12/02/2024	FECHA DE FINALIZACION: 17/02/2024
HORA INICIAL: 7:00 AM	HORA FINAL: 5:00 PM

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 12 mts. Aprox

TIPO DE TRABAJO	RUTINARIO	X	OCASIONAL		SIMULTANEO CON OTRAS TAREAS DE ALTO	
SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR:	Andamio	X	Escalera	Elevador Personal		Grua con Canasta

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR DIA

LUNES:	No se realizo actividad en alturas
MARTES:	Limpieza de estructura metalica
MIERCOLES:	Limpieza de estructura metalica
JUEVES:	Limpieza de estructura metalica
VIERNES:	
SABADO:	
DOMINGO:	

TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA TAREA , LOS SIGUIENTES EPP Y LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (CONVENCIONES, SI- NO)

ELEMENTOS A UTILIZAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CASCO CON BARBUQUEJO		SI	SI	SI			
GAFAS DE SEGURIDAD		SI	SI	SI			
GUANTES ANTIDESLIZANTES		SI	SI	SI			
PROTECCION AUDITIVA		SI	SI	SI			
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		SI	SI	SI			
BOTAS ANTIDESLIZANTES		SI	SI	SI			
ARNES DE CUERPO COMPLETO		SI	SI	SI			
ESLINGA EN Y CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS		SI	SI	SI			
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SI	SI	SI			
MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO		NO	NO	NO			
LINEA DE VIDA VERTICAL		SI	SI	SI			
LINEA DE VIDA HORIZONTAL		SI	SI	SI			
SISTEMAS DE ANCLAJE		SI	SI	SI			
OTRO(S) : ANDAMIOS TUBULARES							

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

DESTORNILLADOR, SIERRA, MACETA, MARTILLO Y MANILAS

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se ha realizado la evaluación de riesgos e identificación de peligros en el area de trabajo		X	X	X			
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo		X	X	X			
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos tabajadores o ejecutores		X	X	X			
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones		X	X	X			
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones		X	X	X			
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia		X	X	X			
Se cuenta con plan de rescate en alturas		X	X	X			
Los trabajadores realizan el permiso de trabajo en el lugar a intervenir		X	X	X			
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse		X	X	X			
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanias a lineas y/o equipos electricos energizados		N/A	N/A	N/A			
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados) o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales.		N/A	N/A	N/A			

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: FR-SST-002	
		VERSION: 03	hoja 2 de 3
	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 2-02-2024	

NOTA: ESTE PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SE VERIFICA A DIARIO

CONVENCIONES: SI , NO , NA

Item	EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Los arnés tiene la ficha de identificación del fabricante con el registro de las inspecciones realizadas?		SI	SI	SI			
2	Las correas de los equipo son ajustables?		SI	SI	SI			
4	Los arnés son cosido y las costuras son de hilo de color diferentes a las cintas del arnés y se encuentran en buen estado?		SI	SI	SI			
5	Los equipos está equipadoss con los puntos de conexión necesarios?		SI	SI	SI			
6	Las eslingas se encuentra sin manchas de Pintura, sin quemaduras y sin Perforaciones?		SI	SI	SI			
7	Los absorbedor de energia de la eslinga (Sin manchas de Pintura, quemaduras, ni Perforaciones)?		SI	SI	SI			
8	Mosquetones / ganchos con doble seguro, libre de roturas, desgaste o abrasión?		SI	SI	SI			
9	Las cuerdas o guayas de la linea de vida se encuentra libre de roturas, desgaste o abrasión?		SI	SI	SI			
Item	**SISTEMAS DE ACCESO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**
1	El soporte o base es de buena calidad, estable y esta nivelada?		SI	SI	SI			
2	Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos		SI	SI	SI			
4	Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, materiales, etc.		SI	SI	SI			
5	Los tablones usados son de madera de 2" de grosor		NO	NO	NO			
6	Están libres de partiduras, astilladuras o cualquier defecto		SI	SI	SI			
7	Están amarrados cada uno en sus extremos para prevenir desplazamientos.		SI	SI	SI			
8	La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados		NO	NO	NO			
9	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (mínimo 2 tablones de 25 cms)		SI	SI	SI			
10	Están los largueros de la escaleras en buen estado?		N/A	N/A	N/A			
11	Están los travesaños en buen estado?		N/A	N/A	N/A			
12	El ángulo de la escalera está correcto?		N/A	N/A	N/A			
13	La escalera está amarrada a una estructura que soporte fijo y seguro?		N/A	N/A	N/A			

OBSERVACIONES: LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO SON METALICAS Y NO EN MADERA_____

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: FR-SST-002
		VERSION: 03 — hoja 3 de 3
	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 2-02-2024

FIRMA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	AFILIACIONES			CURSO ALTURAS		12/02/2024	13/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	17/02/2024	FECHA
				ARL	EPS	AFP	SI	NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	BOADA ROBLES YEIMER	1026562467	OFICIAL	X	X	X	X								
2	MANOSALVA VELASQUEZ GABRIEL ANG	1064712262	OFICIAL	X	X	X	X								
3	JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	10988821481	OFICIAL	X	X	X	X								
4	JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1043844401	OFIAL	X	X	X	X								
5	JORGE LUIS SANABRIA ESCORCIA	1127587970	AYUDANTE	X	X	X	X			Jorge Luis	Jorge Luis	Jorge Luis			
6	JOSE LUIS MANCILLA JULIO	1002275995	AYUDANTE	X	X	X	X								
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1004808987	AYUDANTE	X	X	X	X								
8	EDISON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1130725511	AYUDANTE	X	X	X	X								
9	YOSNEIDER CAMACHO RAMOS	1004825489	AYUDANTE	X	X	X	X								
10	LUIS EDINSON MURCIA VELASQUEZ	79829910	AYUDANTE	X	X	X	X								
11															
12															
13															
14															
15															

AUTORIZACION: Cualquiera de las partes responsables de la actividad puedde suspender este permiso, si considera que existe una variacion significativa como: temperatura, contaminantes atmosferico, lluvias etc. O en caso de no estar cumpliendo con las medidas de seguridad contempladas

RESPONSABLE COORDINADOR DE ALTURAS

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	OLGA LUCÍA LONDOÑO	OLGA LUCÍA LONDOÑO	OLGA LUCÍA LONDOÑO	OLGA LUCÍA LONDOÑO			
FIRMA							

FIRMA DEL CONTRATISTA

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	
FIRMA							

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: FR-SST-002	
		VERSION: 03	hoja 1 de 3
	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 2-02-2024	

PROYECTO: TEATRO PATRIA	NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS: 12
FECHA DE INICIO: 05/02/2024	FECHA DE FINALIZACION: 10/02/2024
HORA INICIAL: 7:00 AM	HORA FINAL: 5:00 PM

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 20 mts. Aprox

TIPO DE TRABAJO	RUTINARIO	X	OCASIONAL		SIMULTANEO CON OTRAS TAREAS DE ALTO	
SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR:	Andamio	X	Escalera	Elevador Personal	Grua con Canasta	

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR DIA

LUNES: Terminar de desistalar recubrimiento en yeso a los costados de las paredes y desinstalación de madera en techo.

MARTES: Terminar de desistalar recubrimiento en yeso a los costados de las paredes y desinstalación de madera en techo.

MIERCOLES: Terminar de desistalar recubrimiento en yeso a los costados de las paredes y desinstalación de madera en techo.

JUEVES: Terminar de desinstalar estrutura en madera del techo de las partes laterales y central

VIERNES: Terminar de desinstalar estrutura en madera del techo de las partes laterales y central

SABADO: Terminar de desinstalar estrutura en madera del techo de las partes laterales y central

DOMINGO: N/A

TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS Y REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA TAREA , LOS SIGUIENTES EPP Y LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (CONVENCIONES, SI- NO)

ELEMENTOS A UTILIZAR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CASCO CON BARBUQUEJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
GAFAS DE SEGURIDAD	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
PROTECCION AUDITIVA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
PROTECCION RESPIRATORIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
ARNES DE CUERPO COMPLETO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
ESLINGA EN Y CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
LINEA DE VIDA VERTICAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LINEA DE VIDA HORIZONTAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
SISTEMAS DE ANCLAJE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
OTRO(S) : ANDAMIOS TUBULARES							

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

DESTORNILLADOR, SIERRA, MACETA, MARTILLO Y MANILAS

PREPARACION DEL AREA (MARQUE CON X)	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se ha realizado la evaluación de riesgos e identificación de peligros en el area de trabajo	X	X	X	X	X	X	
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo	X	X	X	X	X	X	
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos tabajadores o ejecutores	X	X	X	X	X	X	
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	X	X	X	X	X	X	
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones	X	X	X	X	X	X	
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia	X	X	X	X	X	X	
Se cuenta con plan de rescate en alturas	X	X	X	X	X	X	
Los trabajadores realizan el permiso de trabajo en el lugar a intervenir	X	X	X	X	X	X	
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse	X	X	X	X	X	X	
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanias a lineas y/o equipos electricos energizados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados) o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO: FR-SST-002	
		VERSION: 03	hoja 2 de 3
	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 2-02-2024	

NOTA: ESTE PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SE VERIFICA A DIARIO

CONVENCIONES: SI , NO , NA

Item	EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Los arnés tiene la ficha de identificación del fabricante con el registro de las inspecciones realizadas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	Las correas de los equipo son ajustables?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	Los arnés son cosido y las costuras son de hilo de color diferentes a las cintas del arnés y se encuentran en buen estado?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5	Los equipos está equipadoss con los puntos de conexión necesarios?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	Las eslingas se encuentra sin manchas de Pintura, sin quemaduras y sin Perforaciones?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	Los absorbedor de energia de la eslinga (Sin manchas de Pintura, quemaduras, ni Perforaciones)?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	Mosquetones / ganchos con doble seguro, libre de roturas, desgaste o abrasión?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	Las cuerdas o guayas de la linea de vida se encuentra libre de roturas, desgaste o abrasión?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Item	SISTEMAS DE ACCESO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	El soporte o base es de buena calidad, estable y esta nivelada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, materiales, etc.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5	Los tablones usados son de madera de 2" de grosor	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
6	Están libres de partiduras, astilladuras o cualquier defecto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	Están amarrados cada uno en sus extremos para prevenir desplazamientos.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
9	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (mínimo 2 tablones de 25 cms)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	Están los largueros de la escaleras en buen estado?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Están los travesaños en buen estado?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	El ángulo de la escalera está correcto?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	La escalera está amarrada a una estructura que soporte fijo y seguro?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

OBSERVACIONES: LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO SON METALICAS Y NO EN MADERA_____

Powered by CamScanner

	PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO:
		VERSION: 02
	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 20-08-2022

FIRMA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ACTIVIDAD

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	AFILIACIONES			CURSO ALTURAS		5-2-24	6-2-24	07/02/24	08/02/24	09/02/24	FECHA	FECHA
				ARL	EPS	AFP	SI	NO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	BOADA ROBLES YEIMER	1026562467	OFICIAL	✓	✓	✓	✓								
2	MANOSALVA VELASQUEZ GABRIEL ANGEL	1064712262	OFICIAL	✓	✓	✓	✓								
3	JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1043844401	AYUDANTE	✓	✓	✓	✓								
4	JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1098821481	OFICIAL	✓	✓	✓	✓								
5	JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1127587970	AYUDANTE	✓	✓	✓	✓								
6	JOSE LUIS MANCILLA JULIO	1002275995	AYUDANTE	✓	✓	✓	✓								
7	YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1004808987	AYUDANTE	✓	✓	✓	✓								
8	EDINSON JAIR PALOMEQUE DIAZ	1130275511	OFICIAL	✓	✓	✓	✓								
9	YOSNEIDER MACHADO RAMOS	1004825489	AYUDANTE	✓	✓	✓	✓								
10	LUIS HEDINSON MURCIA VELASQUEZ	79829910	AYUDANTE	✓	✓	✓	✓								
11															
12															
13															
14															
15															

AUTORIZACION: Cualquiera de las partes responsables de la actividad puedde suspender este permiso, si considera que existe una variacion significativa como: temperatura, contaminantes atmosferico, lluvias etc. O en caso de no estar cumpliendo con las medidas de seguridad contempladas

RESPONSABLE COORDINADOR DE ALTURAS

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE JUAN LOPEZ	JUAN LOPES	JUAN LOPES	Olga Lucía Londoño	Olga Lucía Londoño			
FIRMA							

LIDER EJECUTANTE

FECHA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRE	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA	YEIMER BOADA				
FIRMA							

Powered by CamScanner
