CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 312-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 18 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, AGOSTO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 18

Página: 1 de

DIA	1	MES	8	AÑO	2024

SEMANA N°	18	DEL	12 DE AGOSTO 2024	AL	118DE AGOSTO 2024		
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	98,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES
C-2 CIMIENTOS	95%	80,00%	PEDESTAL EN CONCRETO	SE EVIDENCIA QUE DONDE ESTA UBICADo EL PRIMER PEDESTAL SE ENCUNTRAN TUBERIA ELECTRICA Y TAMBIEN SE ENCUENTRAN LOS TABLEROS ELECTRICOS, ESTA INFORMACIÓN SE LE PASO A LA SUPERVISIÓN PARA SU TRAMITE ANTE EL BASEMIENEL PARA EL PODER DE RETIRO DE DE SEGUROS DEL TABLERO ELECTRICO
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100%	90,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100%	0,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	90,00%	TAPA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	SE ESPERA LA LIBERACION DEL ESPACIO (PODA DEL ARBOL EXISTENTE PARA LA INCIACION DEL LEVANTAMIENTO DE MUROS DEL CUARTO DE BOMBAS - TANQUE. ADICIONALMENTE SE SOLICITO INFORMACIÓN DE INGRESO Y UBICACION DE LA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE BOMBAS.
M-6 MAMPOSTERÍA	100%	90,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	95,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	17%	90,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100%	90,00%	CORTE DE SELLOS TABLEROS ELECTRICOS	SE CONTINUA A LA ESPERA DE LA SOLICITUD DE PODER ANTE LA ENTIDAD PUBLICA ENEL POR PARTE DEL BASEM Y/O SUPERVISIÓN
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	100,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100%	98,00%		
CR-11 CIELORASOS	0%	0,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100%	10,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100%	0,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	0%	0,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100%	40,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0%	0,00%	ESCALERA DE EMERGENCIA	NO SE HA DADO INICIO A LA ACTIVIDAD DE S.E.I. DE ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA. LO ANTERIOR, DEBIDO AL ATRASO DEL TRAMITE DE PODER FRENTE A LA ENTIDAD PUBLICA POR PARTE DEL ENCARGADO (BASEM/SUPERVISIÓN). SE INFORMA QUE EL MATERIAL DISPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ELEMENTO SE ENCUENTRA EN SITIO DESDE EL PASADO MES DE MAYO.
CE-18 CERRADURAS	0%	0,00%		
PI-19 PINTURA	0%	0,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100%	50,00%		LOS EQUIPOS ESPECIAALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FABRICACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	0%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO				
TOTALES	56%	40,84%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 18	ACUMULADO
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$81.241.638,25	$ 5.605.913.319,26	2,17%	24,32%
		% semanal	1,04%	AVANCE DE OBRA		4,00%
		ACUMULADO	$2.215.033.981,52			
		% acumulado	28,32%			

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base al la nueva programacion de obra el contratista presenta un avance del 4,00%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	12/08/2024	21	4	2	27,00
MARTES	13/08/2024	21	4	2	27,00
MIERCOLES	14/08/2024	21	5	3	29,00
JUEVES	15/08/2024	21	4	2	27,00
VIERNES	16/08/2024	21	4	2	27,00
SABADO	17/08/2024	21	1	1	23,00
DOMINGO	18/08/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)

FECHA	MAÑANA	TARDE	
12/08/2024	LLOVIZZNA	SOLEADO	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
13/08/2024	LLOVIZNA	SOLEADO	
14/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO
15/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
16/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
17/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
18/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 18

Página: 1 de	DIA	1	MES	8	AÑO	2024

SEMANA N°	18	DEL	12 DE AGOSTO 2024	AL	118DE AGOSTO 2024

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



Semana	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Fecha	28/02/2024	6/03/2024	SUSPENSIÓN No. 1 PROGRAMACIÓN AJUSTADA	2/07/2024	9/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	6/08/2024	13/08/2024	20/08/2024	27/08/2024	3/09/2024	10/09/2024
Progr. Semanal	26,38%	17,11%		1,58%	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%	1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%
Programado Acum.	77,88%	94,99%		10,66%	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%	22,14%	24,32%	27,37%	30,48%	33,81%	37,02%
Ejec. Semanal	7,43%	2,75%		9,03%	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%	1,31%	1,04%				
Ejecutado Acum.	9,73%	12,48%		19,10%	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%	27,18%	28,32%				
Balance	0,00%	-82,51%		8,44%	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%	5,04%	4,01%	-27,37%	-30,48%	-33,81%	

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES				EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA	OBSERVACIONES				
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.					
OBRA CIVIL	Se realiza excavacion manual en area de escaleras de emergencia para instalacion de ductos electricos.					
	Se da inicio a la nivelacion del piso del auditorio, la actividad se ejecuta completamente en el trascurso de la semana					
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	Se continua con la excavación manual para la construccion de los pedestales en concreto. El contratista informa que se dara incio a la construcción de la escalera en la semna 19.					
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	Se solicita al contratista de obra realizar la entrega delas pruebas de resistencia de concreto marcadas a los 7,14, 21 y 28 dias de los muros y la base de de tanque de almacenamiento					
	La interventoria se encuentra a la espera de lla respuesta por parte del coing de la ubicación de la puerta y el ingreso del cuarto de bombas. A la fecha no se tiene respuesta.					
	El sabado 17 se realiza poda controlada. Se solicita a la supervisión realizar el tramite ante quien corresponda para el levantameinto del material sobrante.					
MAMPOSTERIA	El contratista de obra se encuentra a la espera de la ubicación de la puerta de acceso y el elemento de ingreso al cuarto de bombas para poder dar inicio con el levantamiento de la mamposteria.					
REDES ELECTRICAS	A la fecha se continua a la espera del poder autenticado entregado por la oficina del Basem, para poder tramitar la solicitud de retiro de sellos del tablero electrico del teatro patria. Se recuerda que esta actividad, retrasa actividades tales como: Construccion de pedestal en concreto y construccion de escalera de emergencia.					
	Adicionalmente continuamos a la espera de la entrega del recibo de energia pago por parte del basem y/o supervisión del contrato.					
	Se continuan con actividades de escavación manual para zanja de ducteria electrica para el tanque de almacenamiento.					
FACHADAS	La supervisión del contrato informa que no se entregará diseño de fachada y que por lo tanto solo se debe realizar mantenimiento					
	el contratista a la fecha no ha entregado los NPs necesarios para la actividad de mantenimiento de las fachadas de ladrillo del teatro patria. Las actividades deben revisarse por esta interventoria para determinar el ajuste al balance de obra.					
ENCHAPES	El contratista de obra da inicio al enchape de pisos del area de cafetines del 2 nivel					
	El contratista de obra suministra las muestras de enchape de muro para las fachadas. Durante dos reuniones con la supervisión del contrato NO se definio el acabado. El retraso retrasa el proceso de solicitud del insumo.					
SISTEMA ACUSTICO	La muestra de la chapilla para el panel acustico se encuentra en campo desde el pasado 5 de agosto y a la fecha no se ha definido por parte del encargado (supervisión/coing). Se recuerda que la fabricacion de los elementos se demoran entre 100 y 120 dias para su fabricación y que por lo tanto de no escogerse dde manera urgente se incurriria en el incumplimiento de los tiempo para la entrega a termino del proyecto.					
PISOS	El contratista de obra realiza el mantenimiento de la tarima en un 70%. Las actividades de acabado se realizrán una vez el teatro se encuentre en una ejecucion aproximada del 98% total					
SILLAS	el contratista de obra No ha presentado el replanteo de la ubicación de las sillas para su aprobación. Se aclara que ya se verificio en sitio y se acordo la modulacion y la espacialidad de las sillas.					
ORDEN Y ASEO	Se evidencia que el contratista de obra realiza levantamiento de escombros y limpieza general del teatro.					

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL | | |

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 18

Código:		Versión:		Fecha de Emisión: 9 DE JULIO		Página:
SEMANA N°	18	DEL	12 DE AGOSTO 2024	AL	18 DE AGOSTO 2024	
FECHA INICIO :	9/12/2020	FECHA TERMINO :	3/02/2021			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO








UBICACIÓN:	AUDITORIO	UBICACIÓN:	TARIMA	UBICACIÓN:	EXTERIOR Y DISTRIBUIDOR
ACTIVIDAD	NIVELACIÓN PISO	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PISO EN MADERA	ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELO RAZO








UBICACIÓN:	EXTERIOR	UBICACIÓN:	ESCALERAS CAMERINOS	UBICACIÓN:	ESCALERAS CAMERINOS
ACTIVIDAD	INSTALACION DE MALLA	ACTIVIDAD	NIVELACIONDE HUELLAS Y CONTA HUELLAS	ACTIVIDAD	INSTALACION DE ANCLAJES








UBICACIÓN:	CAFETINES	UBICACIÓN:	AUDITORIO	UBICACIÓN:	WC HOMBRES 1 PISO
ACTIVIDAD	INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO	ACTIVIDAD	DILATACIONES DE PISO	ACTIVIDAD	DESMONTE DE SANITARIOS







UBICACIÓN:	CAMERINO-MEZANNINE	UBICACIÓN:	EXTERIOR	UBICACIÓN:	EXTERIOR
ACTIVIDAD	INSTALACION DE ETERBOARD	ACTIVIDAD	EXCAVACIONES MANUALES REDES ELECTRICAS	ACTIVIDAD	EXCAVACION MANUAL PARA PEDESTALES ESCALERAS DE EMERGENCIA

INFORME SEMANAL No. 18

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, AGOSTO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL N°18	
Página: 1 de			DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023	

SEMANA N°	18	DEL	12 DE AGOSTO DE 2024	AL	18 DE AGOSTO DE 2024
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	99,00%	98,00%	MANTEMIMIENTO DE MONUMENTO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO
C-2 CIMIENTOS	100%	98,00%	PEDESTAL EN CONCRETO	1- SE EVIDENCIA QUE DONDE ESTA UBICADO EL PRIMER PEDESTAL SE ENCUNTRAN TUBERIA ELECTRICA Y TAMBIEN SE ENCUENTRAN LOS TABLEROS ELECTRICOS, ESTA INFORMACIÓN SE LE PASO A LA INTERVENTORIA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. SE ESTA A LA ESPERA DEL TRAMITE ANTE ENEL CONDENSA PARA EL RETIRO DE LOS SELLOS DEL MEDIDOR. PARA ESTE INFORME NO TENEMOS RESPUESTA DE ESTA SOLITUD
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	88%	95,00%	CAJA DE INSPECCIÓN	1- SE EVIDENCIA ATRASO EN ESTA ACTIVIDAD
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0%	0,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	26%	90,00%		
M-6 MAMPOSTERÍA	91%	100,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	72%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	83%	90,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	12%	20,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	98%	98,00%		
CB-10 CUBIERTAS	21%	36,00%		
CR-11 CIELORASOS	0%	5,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	0%	75,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	2%	6,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	0%	3,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	37%	349,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL N°18

Página: 1 de	DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

SEMANA N°	18	DEL	12 DE AGOSTO DE 2024	AL	18 DE AGOSTO DE 2024

ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0%	0,00%		
CE-18 CERRADURAS	0%	0,00%		
PI-19 PINTURA	0%	0,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	37%	40,00%		
OE-21 OBRAS EXTERIORES	0%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	1%	0,00%		
TOTALES	31%	52,12%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A LA	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	PROGRAMADO	EJECUTADO
	6.376.826.519,54	0,00	6.376.826.519,54	SEMANA 18	$ 169.841.293,24	$ 81.241.638,25
Costo directo	5.237.209.690,82	0,00	5.237.209.690,82			
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.781,24		$ 7.820.947.300,78	ACUMULADO	$ 1.901.666.404,47	$ 2.215.033.981,52
Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-))	NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 4 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN			PORCENTAJE	24,32%	28,32%
				ADELANTO	4,00%	

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL - ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	PERSONAL - OPERATIVO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	MAESTRO	3
RESIDENTE DE OBRA	1	OFICIAL	4
SST	1	AYUDANTE	14
AMBIENTAL	1		
ALMACENISTA	1		
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	TOTAL PERSONAL OPERATIVO	21

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	12/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	SI [ ] NO [X]
	13/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	14/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	15/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	16/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	17/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	18/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO ___ ___

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

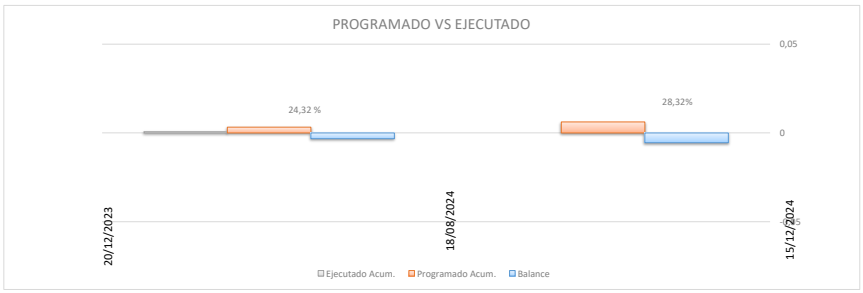

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL Nº18

Página: 1 de

DIA	15	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2023								
SEMANA N°		18	**DEL**	12 DE AGOSTO DE 2024				**AL**	18 DE AGOSTO DE 2024				
Semana	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Fecha	**14/07/2024**	**21/07/2024**	**28/07/2024**	**4/08/2024**	**11/08/2024**	**18/08/2024**	**25/08/2024**	**1/09/2024**	**8/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**
Progr. Semanal	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%	1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%
Programado Acum.	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%	22,14%	24,32%	27,37%	30,48%	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%
Ejec. Semanal	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%	1,31%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acum.	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%	27,28%	28,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Balance	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%	5,14%	4,00%	-27,37%	-30,48%	-33,81%	-37,02%	-40,43%	-44,54%	-49,99%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 24,32 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 28,32 % esto para un adelanto del 4%

2-las actividades de esta semana son : mantenimiento piso de madera tarima, remate de pañete y carteras de vanos de puerta y ventanas, alistado de piso en auditorio, dilataciones y anclajes, colocación de malla de gallinero, instalación de tableta villade leyva en cafetines y baños del segundo piso, alistado de escalera del primer piso al segundo piso, del sotano al primer piso de camerino, de camerino a segundo piso de camerino y escalera de terraza del segundo piso a auditorio, se sigue con la instalación de la red contraincendio, demolición de enchape de piso en baño de hombre primer piso, desmonte de aparato sanitario en baño de hombre primer piso, se sigue con la instalaciones electricas en todo el teatro.


3- aún no se reciben las actas de comité se le pide encarecidamente a la interventoria remitirla al contratista para ver los compromisos adquiridos. se pide nuevamente que envien las actas N° 12, 13 , 14, 15, 16 y 17 . se le pide mas celeridad en las entregas de las actas. a la fecha no tenemos aprobación de los informes semanales por parte de la interventoría.

4- Se le sugiere a la interentoria que aún no tenemos respuesta a cerca de las observaciones del acabado de la caseta del cuarto de bomba y puerta de acceso al cuarto de bomba, . también no se tiene respuesta a la observación del poder para el tramité ante enel codensa para el retiro de sello del medidor, no tenemos respuesta a los enchapes que se va instalar en las fachadas, tampoco tenemos respuesta de la chapilla que se va instalar en los paneles acustico de muro y cielo raso. ttampoco se tiene respuesta del punto de conexión de datos.estas actividades traes consecuencia y atraso en la obra por parte del contratista.

REALIZÓ

FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL														





UBICACIÓN:	CAFETINES
COMENTARIOS:	ECHAPE DE PISO



UBICACIÓN:	
COMENTARIOS:	




UBICACIÓN:	BAÑO DE HOMBRE PRIMER PISO
COMENTARIOS:	DESMONTE DE APARATO SANITARIO



UBICACIÓN:	EXTERIOR
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE MALLA

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:	Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	18	DEL	12 DE AGOSTO	AL	18 DE AGOSTO
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO N°	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO N°	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ASEO BANOS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS
COMENTARIOS:	RECOLECCION DE ESCOMBROS



UBICACIÓN:	COSTADO SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	CLASIFICACION DE RCD



UBICACIÓN:	COSTADO SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	CLASIFICACION RESIDUOS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:	Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	18	DEL	12 DE AGOSTO	AL	18 DE AGOSTO
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO N°	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO N°	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ASEO BANOS



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS
COMENTARIOS:	RECOLECCION DE ESCOMBROS



UBICACIÓN:	COSTADO SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	CLASIFICACION DE RCD



UBICACIÓN:	COSTADO SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	CLASIFICACION RESIDUOS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

12.08.24

Clima: Lluvias ligeras
Personal Contratista
Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista
Maestro, Inspectores sst (2) Operativos (16) 22
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST/HSE
Se realiza acompañamiento a personal del Cenac a recorrido en la obra, se comienzan actividades de Demolición del piso al interior del teatro, se inicia instalación de Perfilería para de Drywall en el techo del Foyer del teatro a su ingreso.
Se da inicio a actividades de nivelación en área de Auditorio. Se revisa porque en el área Central el espesor aumentaría debido a las condiciones y pendiente del auditorio.. Se evidencia instalación de ductería hidraulica en área de escalera fachada Norte. A la fecha no tenemos respuesta frente a la visita por parte de la Supervisión para la definición de la chapilla del panel Acustico.

Arq. Residente SST Ing. Residente Inter. SST/HSE

*Se realiza acta de reunión - visita Supervisión Ing. Laura.

13.08.24

Clima: Soleado.
Personal Contratista
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista, Maestro, Inspectores SST (2) Operativos (22)
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST
El contratista de Obra presenta las muestras Seleccionadas para el enchape de fachada. (antepechos y muros)
Se informa que se presentarán en comité de obra a la Supervisión para la definición de los acabados.
Se evidencia continuación de las labores de nivelación del auditorio. Adicionalmente, el personal de

Powered by CamScanner

Cielo raso continua con la instalación de la estructura para el montaje de la lamina en el area de Acceso sobre la fachada Oriental. el contratista informa que montara la estructura seguidamente en el area de distribuidor y vestibulo y mezanine del auditorio y posteriormente instalará la lamina. los trabajos en alturas son supervisados por el personal SST y no se ocurre en ningun en ningun incidente en Obra.
A la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del Posem para la entrega del poder solicitado desde el pasado 11 de Julio.
a la fecha no se cuenta con respuesta por parte de la Supervisión frente a la ubicación de ingreso de la puerta del cuarto de bombas y ingreso al mismo (escalera) ubicación y elemento.

Ing. Residente Interventoria

14.08.24
Clima: Soleado.
Personal Contratista
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista, maestro, Inspectores (2) Operarios.
Personal Interventoria.
Residente Interventoria, Director Interventoria, Residente SST.
- Se realiza comite de Obra No. 27. Se presentan la Supervisora Ing. Laura Vera y el Arq. Nelson Plazas. - Se realiza acta y posterior se realiza recorrido de obra.
- La interventoria solicita a la Supervisión agilidad ante el tramite de Solicitud del poder del personal electrico para el proceso ante Enel, adicionalmente se reverda

la importancia de la definición de los acabados arquitectónicos y de fachada. (enchape). La Supervisión. Informa que el dueño del teatro es quien debe definir los acabados. Se le informa al encargado Cabo Monterrosa para realizar la Definición de los elementos. Se continua con actividades de nivelación en piso de auditorio, mantenimiento de piso en madera de terminado. (Se solicita al contratista realizar la protección correspondiente, mientras se le da el acabado final al piso). Se evidencia la instalación de los gabinetes de RCI - Se Solicita al contratista darle terminado a los muros de mampostería del área de distribución.

Las actividades en alturas - Instalación de estructura para cielo raso se realizan sin ningún inconveniente. Se realiza acompañamiento al recorrido después del comité de obra se continúan trabajos en alturas de hidráulicos, y Instalación de parrilla de drywall para techos en el exterior del teatro durante la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes trabajos en obra

Firmado e Interventoría RI.

15.08.24.

Clima: Soleado.

Personal Contratista - Residente Obra, Residente SST - Operarios
Residente Interventoría - Residente SST.

Se continúan con actividades de Nivelación de piso del auditorio. El contratista informa que el día 16 de por terminada la actividad. para dar comienzo a la marcación de dilataciones. Se evidencia excavación manual en el área de pedestales y zanjas para tubería eléctrica para el tanque de Agua. Las actividades de alturas - Instalación de estructura para cielo raso se presenta

Sin ningun Inconveniente.
- Continuamos a la espera de la entrega del poder para dar tramite ante Enel. A la fecha tampoco se ha presentado el encargado para la definición del enchape y chapilla del panel acustico.
Se continuan con actividades de TSA hidraulicos durante la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes en obra

Firmado e Interventoria

16.08.24.
Clima: Soleado.
Personal Contratista.
Residente de Obra, Residente SST., Almacenista, Maestro, Inspectores (2) Operarios.
Personal Interventoría.
Residente Interventoria, Residente de SST.
A la fecha esta interventoria no tiene respuesta por parte de la Supervisión en cuanto a la ubicación de la puerta y el ingreso-escalera al cuarto de Bombas. Lo anterior junto con el árbol no permite el levantamiento de la mamposteria.
- Tampoco se ha dado respuesta del poder por parte del Sasem. ni la entrega del recibo de la luz.
- El contratista de obra da termino a la nivelación del area de auditoria. y al estructuramiento del cielo raso del area de distribuidor y vestibulo
- Adicionalmente se evidencia que la nivelación a las huellas de las escaleras interiores en el tramo bajo.
- En el exterior no se ha avanzado con la excavación manual para las nuevas escaleras de acceso

Powered by CamScanner

-Se Solicita al contratista de obra Incrementar el personal y presentar la programación de los trabajos realizados para la instalación del Sistema Acustico. Tambien se Solicita el replanteo de la ubicación de la Silleteria del auditorio.

Se genera oficio al contratista por encontrar personal en obra sin EPP ni pago de seguridad del grupo Molino SAS el señor Luis Molina a quien se le realiza retroalimentación de los requisitos para el ingreso a obra pero el señor es poco receptivo por lo cual se le solicita retirarse de la obra

Ricardo Z. Betancourt.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	18	MM	08	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTMA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			

OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			**ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN**			**FECHA DE ENTRADA**			**FECHA DE SALIDA**		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
SUBCONTRATISTA Y&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24			
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24			
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			

SUBCONTRATISTA FACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código:	
		Versión:	Pág.
		Vigente desde:	

FECHA	20 DE AGOSTO 2024	INFORME No	18	DEL	12/08/2024	AL	18/08/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones pre operacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
inspecciones pre operacionales	15	mezcladora, elementos para trabajos en alturas y de andamios, Inspección de herramientas manuales, rotomartillo, compactador y equipos eléctricos, Inspecciones locativas, tronzadora, pulidora, taladro, andamio, escaleras, pistola de fijación, y equipos de EPCC.
Instalación de malla en el piso del teatro, Recoger escombro proveniente de la demolición del piso externo y interno del teatro, Armado de andamios, corte de alambre, corte de hierro, corte de madera, Pañete interno y externo del teatro, demolición de muros internos, compacta miento de material con el compactador canguro en zona externa del teatro, fundir vigas, pegar bloques, mezclar cemento, amarre de hierro y encoframiento.	1	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad,pausas activas, ATS, Inspeccion preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectoresauditivos de copa y tapa bocas, Uso de Elementos de Protección Contra Caidas (EPCC).
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC	1	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajoy herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales. Inspección de equipos.
Traslado de tableros eléctricos Mantenimiento e inspecciones de Herramientas de menores, extensiones y equipos eléctricos Corte y Doblaje de tuberías en EMT y PVC Pruebas de amperios en cuarto de subestación de energía Instalación de Cableado eléctrico Orden y Aseo	1	Firma de ATS e inspecciones de equipos eléctricos y herramientas menores, de ATS, de permiso para trabajos en caliente, de trabajos en Alturas, Preoperacional depulidora, taladros, escaleras, de inspección de herramienta menor, extensiones eléctricas.
Alistamiento de pisos como: picarlo, barrerlo, recoger material con pala y moverlo en carretillas a los sitios de acopio de escombro, realizar instalación de estructura para fundir pisos.	1	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectoresauditivos de copa y tapa bocas
Se cambian maderas que ya no son útiles y realiza limpieza del piso de madera, se pule	1	Firma de ATS e inspecciones de equipos eléctricos y herramientas menores, de ATS, de permiso para trabajos en caliente, de trabajos en Alturas, Preoperacional depulidora, taladros, escaleras, de inspección de herramienta menor, extensiones eléctricas.
Armado de andamios, Instalación de perfilería para instalación de láminas en superboard en la parte externa del teatro	1	Señalización del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectoresauditivos de copa y tapa bocas.
Retiro de escombros, recibir materia de recebo	1	Firmar los permisos correspondientes ATS ypreoperacional de minicargador

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
*Socialización del nuevo formato de trabajo de alto riesgo. *Prevención en cuidado de manos, uso de epps como guantes. *Socialización de la importancia de orden y aseo en el sitio de trabajo. * Cuidados respiratorios, entrega de mascarilla. *Sensibilización pienso antes de actuar factores de riesgo en el trabajo.	5	Se realiza para personal administrativo y operativo
Orden y Aseo Políticas de la empresa. Copasst Campaña Riesgos y Peligros Comité convivencia Laboral	5	Se realiza para personal administrativo y operativo
Pensar antes de actuar 1. identifico, 2. compruebo, 3. me aseguro, 4. analizo y 5. aplico	1	Se realiza para personal administrativo y operativo
Objetivos de QHSE	1	Se realiza para personal administrativo y operativo
Socialización ATS Prevención cuidado de manos, uso de epps como guantes. Uso de epps para el riesgo físico, ruido por el martillo. Orden y aseo en el sitio de trabajopreviene accidentes. Sensibilización pienso antes de actuar factores de riesgo en el trabajo.	5	Se realiza para personal administrativo y operativo
Total, capacitaciones	**17**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	7	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	42	0	0	1500	0	8	14
Total, proyecto	**490**	**0**	**0**	**1500**	**0**	**24**	**14**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra pajon), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizó seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizó limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	1	•Se realizó jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto.
No. 1-4. Señalización.	1	•Se instaló señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo a las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelantó jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (m3) Semana: 0 Retiro de RCD (m3) Acumulado: 490
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	4	25	32	12,13	87.87

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, instalación de perfilería en el techo parte externa e interna del teatro, se termina de fundir el interior del teatro y de quemar el piso, para esta semana se culmina con un total de 7 profesionales y 25 operarios en obra con un porcentaje de 12.0 personal femenino y 88.0 personal masculino, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de EPP, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S
