CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 312-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No.20 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, AGOSTO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 20

Página: 1 de

DIA	1	MES	8	AÑO	2024

SEMANA N°	20	DEL	26 DE AGOSTO 2024	AL	1 DE SEPTIEMBRE 2024		
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	98,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100%	95,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100%	0,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	80,00%	S. E.I. DE PUNTOS DE ANCLAJE DE CUBIERTA	ACTIVIDAD QUE SE REVISARA DENTRO DEL BALANCE No.12 PARA SU EJECUCIÓN
M-6 MAMPOSTERÍA	100%	90,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	95,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	17%	90,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100%	90,00%	CORTE DE SELLOS TABLEROS ELECTRICOS	SE REALIZO ENTREGA DEL PODER POR PARTE DEL BASEM EL PASADO 29 DE AGOSTO. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA ENTIDAD CODENSA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	100,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100%	98,00%	INSTALACION DE EXTRACTORES EOLICOS	
CR-11 CIELORASOS	100%	30,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100%	30,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100%	30,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100%	50,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100%	40,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100%	60,00%		LAS SILLAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PRODUCIÓN
CE-18 CERRADURAS	0%	0,00%		
PI-19 PINTURA	0%	0,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100%	50,00%		LOS EQUIPOS ESPECIALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FABRICACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	0%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO				
TOTALES	69%	49,04%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$249.442.625,10	$ 5.244.553.497,45
		% semanal	3,19%	
		ACUMULADO	$2.576.393.803,33	
		% acumulado	32,94%	

AVANCE DE INVERSION	SEMANA 20	ACUMULADO
	3,11%	30,48%
AVANCE DE OBRA		2,46%

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base al la nueva programacion de obra el contratista presenta un avance del 2,46%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	26/08/2024	27	4	2	33,00
MARTES	27/08/2024	27	4	2	33,00
MIERCOLES	28/08/2024	27	5	3	35,00
JUEVES	29/08/2024	27	4	2	33,00
VIERNES	30/08/2024	27	4	2	33,00
SABADO	31/08/2024	27	1	1	29,00
DOMINGO	1/09/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)

FECHA	MAÑANA	TARDE	
26/08/2024	LLOVIZNA	SOLEADO	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
27/08/2024	LLOVIZNA	SOLEADO	
28/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO
29/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
30/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
31/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
1/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR %EJECUCION Vs PROGRAMADO)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 20

Página: 1 de

DIA	1	MES	8	AÑO	2024

SEMANA Nº		20		DEL	26 DE AGOSTO 2024				AL	1 DE SEPTIEMBRE 2024					
Semana	**10**	**11**		**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
Fecha	**28/02/2024**	**6/03/2024**	**SUSPENSIÓN No. 1 PROGRAMACIÓN AJUSTADA**	**7/06/2024**	**14/06/2024**	**21/06/2024**	**28/06/2024**	**5/07/2024**	**12/07/2024**	**19/07/2024**	**26/07/2024**	**2/08/2024**	**9/08/2024**	**16/08/2024**
Progr. Semanal	26,38%	17,11%		1,58%	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%	1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%
Programado Acum.	77,88%	94,99%		10,66%	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%	22,14%	24,32%	27,37%	30,48%	33,81%	37,02%
Ejec. Semanal	7,43%	2,75%		9,03%	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%	1,31%	1,04%	1,43%	3,19%		
Ejecutado Acum.	9,73%	12,48%		19,10%	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%	27,18%	29,75%	32,94%	32,94%		
Balance	0,00%	-82,51%		8,44%	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%	5,04%	5,43%	5,57%	2,46%	-33,81%	

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.		
OBRA CIVIL	Se realiza actividades de demolicion de piso en area adjunto al tanque de agua		
	El contratista de obra realiza actividades de dilataciones en piso en area de vestibulo y terrazas de 2 y 3 piso		
	Se realiza demolicion de contrapiso en area de baños de hombres del 1er piso debido a que durante trabajos de redes hidrosanitarias se evidencio la cristalizacion de la tuberia existente, lo que indica que el contratista de obra deberá realizar el remplazo total de los ductos hidrosanitarios de esta area.		
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	La interventoria se encuentra a la espera de la respuesta por parte del coing de la ubicación de la puerta y el ingreso del cuarto de bombas. Durante visita por parte de la supervisión y el equipo de apoyo de diseño el pasado 28 de agosto no se dio respuesta a las observciones frente a la situacion presentada en el area de tanque de almacenamiento. Se espera respuesta por parte del Arq. Camilo (Coing) en la semana 21		
MAMPOSTERIA	El contratista de obra se encuentra a la espera de la ubicación de la puerta de acceso y el elemento de ingreso al cuarto de bombas para poder dar inicio con el levantamiento de la mamposteria.		
REDES HIDROSANITARIAS	El contratista de obra presenta un avance de instalacion de las redes hidrosanitarias en un 95%. En la semana 21 s realizaran las pruebas de presion del sistema.		
SISTEMA RCI	El contratista de obra realiza la instalacion de los gabinetes de la red contra incendios en el area de primer piso. se le suguiere		
REDES ELECTRICAS	El dia 29 de agosto se hace entrega por parte del Basem el poder autenticado para el tramite de retiro de sellos ante la entidad ENEL. Adicionalmente realizan entrega de recibo de pago (archivo digital- MY. Bejarano)		
	el contratista de obra continua con actividades de intalacion de redes electricas en el area de fachada y ducteria de comunicación entre subestación y tanque de almacenamiento		
CIELO RASO	Durante visita de la supervisión y el apoyo de diseño, se informo por parte del contratista de obra que para el cielo raso del auditorio se sugeria instalar el panel acustico en en angulo de 45 grados para asi dar recubrimiento a la estructura de pie de amigo existente. El apoyo informa que se remittira la solicitud al dseñador para dar respuesta.		
	El contratista de obra informa al apoyo de la supervisión q se sugiere darle una acabado diferente al cielo raso del vestibulo donde se realice un descolgado al cielo raso. Igualmente el apoyo del diseñador informará al diseñador para dar respuesta. La interventoria sugiere realizar la intervencion como se plasma en los planos entregados por el Coing.		
FACHADAS	El cocntratista informa que el enchape aprobado llegara en la semana 21 aproximadamente		
	Se continua a la espera de la entregada de los NPs necesarios para la actividad de mantenimiento de las fachadas de ladrillo del teatro patria. Las actividades deben revisarse por esta interventoria para determinar el ajuste al balance de obra.		
	Durante visita de la supervisión y el apoyo de diseño, se informo por parte del contratista de obra que la rampa presentada en el diseño entregado no cumple con la norma minima para el desplazamiento de personas con disapacidad, por lo tantose sugirio el replanteo de la misma y realizarse en sentido norte-sur para dar cumplimiento a la normatividad. El apoyo infomó que notificaria al diseñador para realizar el diseño y entregar el nuevo planteamiento.		
ENCHAPES	El contratista de obra da inicio al enchape de pisos del area de baño de mujeres del 1er nivel		
SISTEMA ACUSTICO	Se da ingreso al personal de sistema acustico y comienzan con actividades de montaje de andamios para instalacion de estructuración del sistema		
	Se realizará visita a planta de produccion en la semana 21		
TAPETE	El contratista de obra informa que el tapete seleccionado ya se encuentra en su totalidad en bogota. Por lo tanto esta interventoria realizará visita a bodega para su revisión y confirmación en la semana 21.		
	Mediante comité de obra No. 19 el contratista de obra realiza entrega de muestra de tapete tipo royo para area de escaleras que conducen al los sotanos. La interventoria sugiere para la instalacion la muestra de color gris oscuro, pero se notificara a la supervisión del contrato para su definición final. en la semana 21.		
SILLAS	el contratista de obra No ha presentado el replanteo de la ubicación de las sillas para su aprobación. Se aclara que ya se verificio en sitio y se acordo la modulacion y la espacialidad de las sillas.		
	Se solicita al contratista visita a fabrica para la revisión del proceso de tapizado de la silleteria.del auditorio. La vista se realizara en la semana 20		
EQUIPOS ESPECIALES	El contratista de obra informa a la interventoria que los equipos de bomba para el tanque de almacenamiento ya se concluyo con la etapa de fabricación. La interventoria solicita al contratista el soporte de trasporte/envio del equipo para evisión de fecha de ingreso e instalacion a campo.		
ORDEN Y ASEO	Se evidencia que el contratista de obra realiza levantamiento de escombros y limpieza general del teatro.		
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Gestión de comunicaciones	1. Se realiza comite de obra No. 19 2. se entreg informe semanal No. 19 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a internet, y la respuesta de la ubicación de la puerta del cuarto de bombas y sus acabados. 4. se espera respuesta de diseño de rampa de acceso-costad oriental.		
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales		
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.		
	La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de obra civil para dar avance a las ejecuciones de acabados de piso, cielo raso y enchapes.		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 20

Página: 1 de

DIA	1	MES	8	AÑO	2024

SEMANA N°	20	DEL	26 DE AGOSTO 2024	AL	1 DE SEPTIEMBRE 2024

ASPECTOS FINANCIEROS	ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA	OBSERVACIONES
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y a la fecha no se ha efectuado el pago.	
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de $917.126.075,82. el 5 de septiembre del año en curso. Con corte a semana 20- al 2 de septiembre	
COMPRA DE INSUMOS	El contratista de obra emite informe de plan de manejo de anticipo del mes de agosto.	

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 20

Código:		Versión:	Fecha de Emisión: 9 DE JULIO		Página:	
SEMANA N°	20	DEL	26 DE AGOSTO 2024	AL	1 DE SEPTIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	9/12/2020	FECHA TERMINO :	3/02/2021			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO








UBICACIÓN:	AUDITORIO	UBICACIÓN:	BAÑOS HOMBRES	UBICACIÓN:	ESCALERA DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD	INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL	ACTIVIDAD	CAMBIO DE TUBERIA EXISTENTE-TUBERIA CRISTALIZADA.	ACTIVIDAD	MONTAJE D ESTRUCTURAS METALICAS





UBICACIÓN:	DISTRIBUIDOR	UBICACIÓN:	MEZANNINE	UBICACIÓN:	FACHADA SUR
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN CIELO RASO	ACTIVIDAD	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PANELES ACUSTICOS	ACTIVIDAD	CONSTRUCCION DE CAJA ELECTRICA







UBICACIÓN:	BAÑO HOMBRES	UBICACIÓN:	FACHADA NORTE	UBICACIÓN:	DISTRIBUIDOR 1ER PISO
ACTIVIDAD	NSTALACIÓN DE TUBERIA Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE PRESIÓN	ACTIVIDAD	REGATAS PARA INSTALACION DE DUCTOS ELECTRICOS	ACTIVIDAD	INSTALACION DE GABINETES RED DE INCENDIOS






UBICACIÓN:	VESTIBULO	UBICACIÓN:	VESTIBULO	UBICACIÓN:	3ER PISO CUARTO NORTE
ACTIVIDAD	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	ACTIVIDAD	INSTALACION DE CIELO RASO	ACTIVIDAD	INSTALACCION REDES ELECTRICAS





UBICACIÓN:	SOTANO	UBICACIÓN:	DISTRIBUIDOR	UBICACIÓN:	FACHADA SUR
ACTIVIDAD	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO	ACTIVIDAD	PAÑETE EN MURO COSTADO NORTE	ACTIVIDAD	FUNDIDA DE PEDESTALES PARA ESCALERA DE EMERGENCIA

					
UBICACIÓN:	**ESCALERAS EXTERIORES**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS MUJERES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE PLATINAS PARA PEDESTALES DE ESCALERAS	**ACTIVIDAD**	INSTALLACION DE ENCHAPE DE PISO	**ACTIVIDAD**	ESTRUCTURA DE CIELO RASO
					
UBICACIÓN:	**CAMERINOS**	**UBICACIÓN:**	**TEATRO**	**UBICACIÓN:**	**CAMPAMENTO**
ACTIVIDAD	INSTALLACION DE DUCTOS ELECTRICOS	**ACTIVIDAD**	VISITA DE EQUIPO DE APOYO DE DISEÑO Y SUPERVISION DEL CONTRATO	**ACTIVIDAD**	COMITÉ DE OBRA No. 19

INFORME SEMANAL No. 20

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, AGOSTO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL N°20	
Página: 1 de			DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023	

SEMANA N°	20	DEL	26 DE AGOSTO DE 2024	AL	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	81,00%	97,00%	MANTEMMIENTO DE MONUMENTO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	97%	99,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0%	0,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	33%	91,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA	
M-6 MAMPOSTERÍA	83%	90,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	92%	95,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	19%	65,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	98,00%		
CB-10 CUBIERTAS	62%	70,00%	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EOLICOS EN CUBIERTA INCLUYE TRABAJOS DE CANAL Y SELLO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA.	
CR-11 CIELORASOS	0%	30,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	2%	76,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	21%	20,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	0%	5,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	57%	40,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL				INFORME SEMANAL N°20			
Página: 1 de		DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

SEMANA N°	20	DEL	26 DE AGOSTO DE 2024		AL	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO			0%	0,00%		
CE-18 CERRADURAS			0%	0,00%		
PI-19 PINTURA			0%	0,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES			45%	60,00%		
OE-21 OBRAS EXTERIORES			0%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL			0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS			0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO			1%	0,00%		
TOTALES			36%	45,44%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO ANTICIPO	VR. POR EJECUTAR DEL ANTICIPO	AVANCE DE INVERSION	PROGRAMADO	EJECUTADO
	6.376.826.519,54	2.742.213.368,36	3.634.613.151,18	SEMANA 20	$ 243.510.558,42	$ 249.442.625,10
Costo directo	5.237.209.690,82		5.237.209.690,82			
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.781,24	$ 7.820.947.300,78		ACUMULADO	$ 2.384.020.147,28	$ 2.576.393.803,33
Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-))	NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 2,46 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN			PORCENTAJE	30,48%	32,94%
				ADELANTO	2,46%	

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL - ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	PERSONAL - OPERATIVO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	MAESTRO	3
RESIDENTE DE OBRA	1	OFICIAL	4
SST	1	AYUDANTE	19
AMBIENTAL	1	FABRICACIÓN	12
ALMACENISTA	1		
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	TOTAL PERSONAL OPERATIVO	38

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	26/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	27/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	SI [ ] NO [X]
	28/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	29/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	30/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	31/08/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	1/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

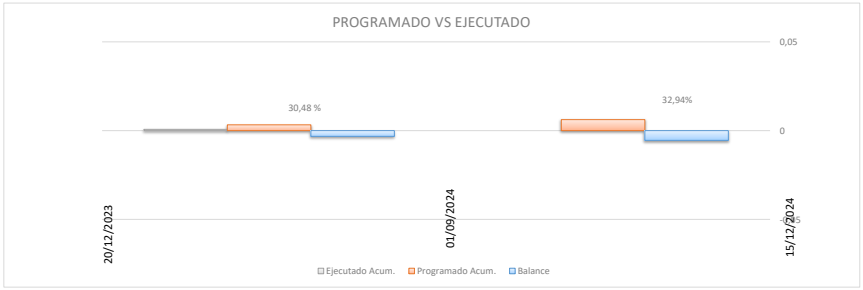

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL N°20

Página: 1 de

DIA	15	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2023								
SEMANA N°		20	**DEL**	26 DE AGOSTO DE 2024				**AL**	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Semana	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Fecha	**14/07/2024**	**21/07/2024**	**28/07/2024**	**4/08/2024**	**11/08/2024**	**18/08/2024**	**25/08/2024**	**1/09/2024**	**8/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**
Progr. Semanal	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%	1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%
Programado Acum.	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%	22,14%	24,32%	27,33%	30,48%	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%
Ejec. Semanal	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%	1,31%	1,04%	1,43%	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acum.	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%	27,28%	28,32%	29,75%	32,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Balance	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%	5,14%	4,00%	2,42%	2,46%	-33,81%	-37,02%	-40,43%	-44,54%	-49,99%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 30,48 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 32,94 % esto para un adelanto del 2,46%

2-las actividades de esta semana son : llegada de material a obra para soporte de la estructura de los paneles acustico, se continua con la instalación de redcontraincedios, se continua con la fabricación de la silleteria, resane de muros , resanes de las regatas eléctrica, colocación de los ganites de redcontraincendios, se continua con la instalación de baldosa grano de marmol, se trazan maestra para alistado de piso exterior, se hacen dilataciones en el primer y segundo piso, se continua con la instalación de estructura para cielo rasos , se conitnua con las instalaciones eléctricas, sacada de RCD , orden y aseo, se conitnua con la fabricación de las divisiones en acero inoxidable.

3- aún no se reciben las actas de comité se le pide encarecidamente a la interventoria remitirla al contratista para ver los compromisos adquiridos. se pide nuevamente que envien las actas N° 12, 13 , 14, 15, 16, 17 , 18 ,19 y 20 . se le pide mas celeridad en las entregas de las actas. a la fecha no tenemos aprobación de los informes semanales por parte de la interventoría.

4- Se le sugiere a la interentoria que aún no tenemos respuesta a cerca de las observaciones del acabado de la caseta del cuarto de bomba y puerta de acceso al cuarto de bomba, . también no se tiene respuesta a la observación del poder para el tramité ante enel codensa para el retiro de sello del medidor, hasta esta semana el dia jueves 22 de agosto del presente año la interventoría le notifica al contratista de obra el color de los enchapes que se van instalar en fachada, también se le notifica al contratista el color de la chapilla que se va utilizar en los paneles acustico. estas activiades traen atraso al contratista de obra en la instalación del enchape de fachada y la fabricación de los paneles acustico.

REALIZÓ

FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL													



UBICACIÓN:	FACHADA SUR
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE CAJAS ELECTRICAS



UBICACIÓN:	LLEGADA DE MATERIAL A LA OBRA
COMENTARIOS:	GRANITOS FUNDIDO





UBICACIÓN:	BAÑOS DE HOMBRES
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE TUBERIA Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS



UBICACIÓN:	INSTALACIONES ELECTRICAS
COMENTARIOS:	FACHADA NORTE


ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**			**Página:**
SEMANA N°	20	**DEL**	26 DE AGOSTO			**AL**		01 DE SEPTIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023		**FECHA TERMINO :**	15/12/2024				

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS**	**NIT O C.C.**	**860 524 16-8**	**CONTRATO Nº**	**314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901 759 617 - 0**	**CONTRATO Nº**	**272-CENANCINGENIEROS-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

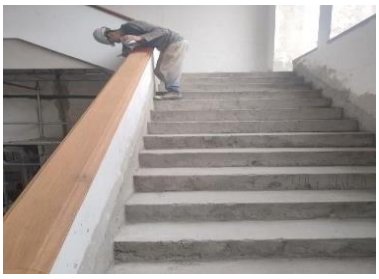

UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**ORDEN Y ASEO**



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**SENALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**SENALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**SENALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	**ASEO BAÑOS**



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**JORNADA DE ASEO AREAS DE TRABAJO**



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	**JORNADA DE ASEO AREAS DE TRABAJO**



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	**JORNADA DE ASEO AREAS DE TRABAJO**



UBICACIÓN:	COSTADO SUROCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**JORNADA DE ASEO AREAS DE TRABAJO**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	20	DEL	26 DE AGOSTO	AL		01 DE SEPTIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO N°	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO N°	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS OBRA CIVIL



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS HIDRAULICOS



UBICACIÓN:	ZONA OCIDENTAL DEL TEATRO EXTERIOR
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS HIDRAULICOS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	ZONA NORORIENTAL DEL TEATRO
COMENTARIOS:	RECORRIDO DE OBRA CON LA CENAC



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	RECORRIDO DE OBRA CON LA CENAC



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	COMITÉ DE OBRA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 BITACORA

23.08.24

Clima: Soleado

Personal contratista

Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Topógrafo, Inspectores (3) Operativos 19

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST HSE

Se corrige el encerramiento en polisombra que colinda con el parqueadero, se realizan actividades de izaje en los apoyos y puntos de acopio, no se presentaron accidentes ni incidentes en obra. Se evidencia personal del Austico pero estan realizando inducción, aún no ingresa personal a campo y se espera que el SST. Verifique la Documentación. Deben ingresar el día lunes con los permisos de altura. Se Solicita al contratista realizar riego en el área del tanque. A la fecha No se ha dado respuesta por parte del Dueño de la Solicitud del Poder y Recibo de luz. Angela Z. Inter. SST HSE

26.08.24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista Topógrafo, Inspectores SST (3) Operativos 26

Ingresa Personal del contratista HKS Ingeniería empresa encargada de la auditoría del tanque, se amplia socialización de excavaciones y riesgo en el área del tanque, continúan actividades los trabajadores con sus respectivos EPP. Las actividades de Austica NO se dan por iniciadas, Solo se evidencia dos personas en campo y estan realizando labores de campamento, el residente informa que se el personal se encuentra realizando aseo de alturas. Se Solicita al contratista que los apoyos de SST. Se encuentren en los frentes en la ejecución de las actividades ya que se evidencia que el apoyo hidraulica no se presento en Sitio. El Cabo Montenrosa emite poder pero falta autenticarlo por parte del Capitán. Angela Z Inf. SST HSE

NKA

27.08.24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra Residente SST, Almacenista

Locativo, Inspectores SST (3) Operativos 19

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SSTMA

los trabajadores de la empresa HKS Ingeniería no se presentaron puesto que estan realizando curso de alturas, se autoriza al contratista para que en la instalacion de la gatería del drywall puedan utilizar los ramos metálicos contodas las medidas de seguridad, no se presentaron accidentes ni incidentes en obra. Se realizan trabajos de estructura de cielo raso en area de mezanine auditorio. Se realiza pañete liso en muros de distribuidor primer nivel. Se termina de realizar el armado de hierros de los pedestales de la escalera de emergencia. y Se comienza a formaletear para fundir.

R.I Residente SST

28.08.24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista

Locativo, Inspectores SST (3) operativos 21

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SSTMA

En recorrido de obra se evidencian las diferentes actividades de obra en alturas con el personal de acustica y drywall se continuan actividades a nivel de obra civil, pisos y sotano todos con sus respectivos epp, se hace llamado de atención al personal SST de hidraulicos por segunda vez, no prestar apoyo al personal de obra con trabajos en alturas, no se presentaron accidentes ni incidentes laborales. Se continua con estructurado para cielo raso en auditorio-mezanine. Se realiza fundida de pedestales. y Se termina con el pañete liso en area

de distribuidor. Se da inicio a actividades de enchape de piso en area de baños mujeres 1er Piso. Se Termina con la Demolición de las dos puertas del Acceso principal. El equipo de redes hidrosanitarias inician con la apertura en muro para la instalación de los gabinetes de RCI en area de Auditorio. Se continua con la instalación de (Super) Drywall en area de Distribuidor. En el area de Comercio Norte se termina la instalación de ductos electricos. No se ha entregado el poder por el tasem.

Ingeglo Z/Interventoria
Delegado SST RCI

29.08-24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista

Puesto Inspectores SST (3), Aprendices 24

Personal Interventoría

Director Interventoría, Residente Interventoría, Residente SST

Se asiste a comité de obra, con el contratista, y personal del area, se hace acompañamiento en recorrido de obra, se hacen recomendaciones para la construccion de la rampa acordes a normatividad actual, se realiza acompañamiento en el area de baños portátiles de la obra se continuan las actividades en altura de acustica, hidraulicos RCI y demas obras a nivel, todos con los EPP correspondientes, en este numero no se han presentado accidentes ni incidentes laborales. Durante la visita por parte de la supervisión y el apoyo de Disco, Se realizaron las Sugerencias de mejora para las areas de rampa de Acceso, Instalacion de cielo descargado en area de Vestibulo, revisión de la instalación del panel acustico debido a la existencia de pies de Amigos en la base de la estructura de cubierta. Adicionalmente, Se informo de la ubicación de la puerta del cuarto de bombas y el suministro de la escalera para el acceso al mismo.

A lo anterior, el Arq. de Apoyo informa que las Sugerencias por parte del contratista de obra deberán ser revisadas por el Diseñador del proyecto y que ellos no podrían definir las Situaciones encontradas. En la visita Sob se definio el granitos para las áreas de Antepecho en el costado interior. de las terrazas y se definio que la instalación del enchape de fachada debe ir en Sentido Horizontal. Se hace entrega del Documento/poder por parte del Coronel Villeas. La Interventoria hace entrega del recibo de pago de la luz y el poder autenticado al contratista.

Ingrid Z Interventoria
RS.

30.08.24
Clima: Soleado
Personal Contratista
Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Fausto
Inspectores SST(3) Operativos 24
Personal Contratista
Residente Interventoría, Residente SSTMA
En recorrido en obra, se observo trabajos en alturas, y a nivel todos cuentan con sus epp y epcc, durante el dia no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo. Se evidencia personal de Sistema anticaidas, del personal en campo solo pueden realizar trabajos de alturas 2 personal, el resto del personal no esta autorizado por el area SST de la Interventoria. Se solicita al apoyo del area SST del Equipo de redes hidraulicas estar presente en las actividades a ejecutar. El area SST de la Interventoria realizará llamado de atención por no estar presente en actividades de alturas. Se evidencia que el contratista de obra dio por terminada la instalación de la estructura del cielo en el Sotano.

Ingrid Z. Interventoria
RS

31.08.24
Clima: Soleado
Personal Contratista
Residente Contratista, Almacenista, Fausto

Inspectores SST (3) Operativos 18
Personal Interventoría
Residente Interventoría
Se continuan con actividades a nivel, no se realizaron trabajos de alto riesgo, en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes laborales, se informa por parte del apoyo SST del contratista que se realizo visita por parte del instalador del piso y deja la muestra del tapete tipo rollo para el area de escalera de Sotano. El contratista continua con actividades de instalación de cielo raso y adiltaciones en piso tanto el area de vestibulo, distribuidor y terrazas de 2 y 3 piso.

RS

Claudia Z Inter SSTMA

02.09.24
Clima: Soleado
Personal Contratista
Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Apuntador
Inspectores SST (3) Operativos 21
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SSTMA
En recorrido de obra se evidencian actividades en altura por parte del contratista de acustico, trabajo en caliente y altura por particulas Temax, todos con sus EPCC y los trabajos a nivel con sus EPP en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes laborales. El contratista de obra en conjunto con la Interventoria realizan mesa de trabajo para entrega de Corte de obra No 2. Se remite memorias y acta a las 3:00pm al director de Interventoría para tramite ante Supervision. el contratista informa que la volqueta con material programado para el dia de hoy no pudo realizar la salida por obstrucciones en vias. Adicionalmente se evidencia que el contratista cuenta con poco personal en horas de la tarde.

RS.

Claudia Z Inter SSTMA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	01	MM	09	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTMA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			

OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

Página: 1 de

DIA		MES		AÑO	

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA
SUBCONTRATISTA Y&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24			
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24			
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			

SUBCONTRATISTA FACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código:	
		Versión:	Pág.
		Vigente desde:	

FECHA	03 DE SEPTIEMBRE 2024	INFORME No	20	DEL	26/08/2024	AL	01/09/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	15	mezcladora, elementos para trabajos en alturas y de andamios, Inspección de herramientas manuales, rotomartillo, compactador y equipos eléctricos, Inspecciones locativas, tronzadora, pulidora, taladro, andamio, escaleras, pistola de fijación, y equipos de EPCC.
Inspecciones de herramientas, armado de andamios, instalación de perfilería, orden y aseo	4	Firmar ATS, preoperacional de inspecciones de pistolas de fijación, inspecciones de EPCC, charlas de 5 minutos y pausas activas.
Se realiza pañete de paredes con andamios, corte de piso del teatro zona interna, Recoger escombro provenientede la demolición del piso externo y interno del teatro, Armado de andamios, corte de alambre, corte de hierro, corte de madera, armado de estructura y fundir vigas, pegar bloques, realizar mezclar cemento, amarre de hierro y encoframiento	1	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad,pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectoresauditivos de copa y tapa bocas, Uso de Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC).
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC	5	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajoy herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales. Inspección de equipos
Proceso de lijar, pulir, y encerar pasamanos de Madera desde piso 2 hasta piso 1 Orden y Aseo	1	Firmar ATS, preoperacional de inspecciones de pistolas de fijación, inspecciones de EPCC, charlas de 5 minutos y pausas activas.
Mantenimiento e inspecciones de Herramientas menores, extensiones y equipos eléctricos Instalación de circuitos (Cableado eléctrico para red contraincendios) Corte, Doblaje e instalación de tuberías en EMT, PVC y cajas eléctricas. Regatas y pasantes en paredes y pisos de concreto Orden y Aseo	8	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectoresauditivos de copa y tapa bocas.
Alistamiento de pisos como: barrerlo, recoger material con pala y moverlo en carretillas a los sitios de acopio de escombro, realizar instalación de estructura para fundir pisos.	1	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectoresauditivos de copa y tapa bocas.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
La importancia del trabajo en equipo cuidados con la pulidora para cortar el piso. Todos podemos prevenir accidentes enel trabajo. Socialización ATS, puntos ecológicos no arrojar basuras en gabinetes. El orden y el aseo es responsabilidad de todos.	7	Se realiza para personal administrativo y operativo
Seguridad en el uso de escaleras Levantamiento de objetos Aseo en el trabajo Protección para la cabeza Protección para ojos	5	Se realiza para personal administrativo y operativo
cuidado de manos. La importancia del trabajo en equipo cuidados con la pulidora. Todos podemos prevenir accidentes en el trabajo. Porque hacer pausas activas. Prevención en manos por golpes con objetos.	5	Se realiza para personal administrativo y operativo
Total, capacitaciones	**17**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	7	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	7	0	0	0	0	8	14
Total, proyecto	**514**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	1	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	1	•Se realizo jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizo limpieza y orden de los puntos ecológicos.
No. 1-4. Señalización.	1	•Se instalo señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo a las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (m3) Semana: 7 Retiro de RCD (m3) Acumulado: 514
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	4	28	35	10,13	89.87

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, ingresan los subcontratistas de acústica HK3 Y METEX para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, para esta semana se culmina con un total de 7 profesionales y 28 operarios en obra con un porcentaje de 10.13% personal femenino y 89.87% personal masculino, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de EPP, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S
