CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 312-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No.21 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 21

Página: 1 de	DIA	1	MES	8	AÑO	2024

SEMANA N°	21	DEL	2 DE SEPTIEMBRE 2024	AL	8 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	98,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100%	95,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100%	0,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	80,00%	S. E.I. DE PUNTOS DE ANCLAJE DE CUBIERTA	ACTIVIDAD QUE SE REVISARA DENTRO DEL BALANCE No.12 PARA SU EJECUCIÓN
M-6 MAMPOSTERÍA	100%	90,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	95,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	17%	90,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100%	90,00%	CORTE DE SELLOS TABLEROS ELECTRICOS	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA ENTIDAD CODENSA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	100,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100%	98,00%	INSTALACION DE EXTRACTORES EOLICOS	
CR-11 CIELORASOS	100%	30,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100%	30,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100%	30,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100%	50,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100%	40,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100%	60,00%		LAS SILLAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PRODUCIÓN
CE-18 CERRADURAS	0%	0,00%		
PI-19 PINTURA	0%	0,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100%	50,00%		LOS EQUIPOS ESPECIALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FABRICACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	0%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO				
TOTALES	69%	49,04%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$248.556.466,97	$ 4.995.997.030,48
		% semanal	3,18%	
		ACUMULADO	$2.824.950.270,30	
		% acumulado	36,12%	

AVANCE DE INVERSION	SEMANA 21	ACUMULADO
	3,32%	33,81%
AVANCE DE OBRA	2,31%	

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base al la nueva programacion de obra el contratista presenta un avance del 2,31%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS/FABRICACIÓN	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	2/09/2024	33	4	2	39,00
MARTES	3/09/2024	33	4	2	39,00
MIERCOLES	4/09/2024	0	0	0	0,00
JUEVES	5/09/2024	0	0	0	0,00
VIERNES	6/09/2024	33	4	3	40,00
SABADO	7/09/2024	33	2	1	36,00
DOMINGO	8/09/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	
	2/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	3/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	4/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	5/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	6/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO
	7/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	8/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 21

Página: 1 de

DIA	1	MES	8	AÑO	2024

SEMANA N°		21		DEL	2 DE SEPTIEMBRE 2024					AL	8 DE SEPTIEMBRE 2024				
Semana	**10**	**11**		**12**	**13**	**14**	**15**	**16**		**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
Fecha	**28/02/2024**	**6/03/2024**	**SUSPENSIÓN No. 1 PROGRAMACIÓN AJUSTADA**	**7/07/2024**	**14/07/2024**	**21/07/2024**	**28/07/2024**	**4/08/2024**		**11/08/2024**	**18/08/2024**	**25/08/2024**	**1/09/2024**	**8/09/2024**	**15/09/2024**
Progr. Semanal	26,38%	17,11%		1,58%	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%		1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%
Programado Acum.	77,88%	94,99%		10,66%	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%		22,14%	24,32%	27,37%	30,48%	33,81%	37,02%
Ejec. Semanal	7,43%	2,75%		9,03%	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%		1,31%	1,04%	1,43%	3,19%	3,18%	
Ejecutado Acum.	9,73%	12,48%		19,10%	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%		27,28%	28,32%	29,75%	32,94%	36,12%	
Balance	0,00%	-82,51%		8,44%	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%		5,14%	4,00%	2,38%	2,46%	2,31%	

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.		
OBRA CIVIL	Se continua con actividades de relleno de sub-base y compactacion en area de las escaleras exteriores-fachada oriental		
	El contratista de obra realiza fundida de concreto en escalera exxterior-fachada oriental		
	se realiza construccion de caja electrica de 60x60 para coneciones de tanque de almacenamiento		
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	El dia 6 de septiembre se realiza visita tecnica por parte del arq. Diseñador Camilo (coing) y la supervisión del contrato, donde se dio la directriz de realizar la puerta de ingreso al cuarto de bombas sobre la fachada norte del tanuqe de almacenamiento, adicional a ello informo de la indtalacion de una escalera (metalico o de concreto) para el acceso igualmente en la fachada norte. Adicionalmente, notificó que el acabado tanto del tanque de almacenamiento como el cuarto de bombas deberia ser en fachaleta. El Arq. Camilo informa que enviara el diseño de lo mencionado anteriormente para su ejecución.		
MAMPOSTERIA	El contratista de obra se encuentra a la espera de la ubicación de la puerta de acceso y el elemento de ingreso al cuarto de bombas para poder dar inicio con el levantamiento de la mamposteria.		
REDES HIDROSANITARIAS	El contratista de obra presenta un avance de instalacion de las redes hidrosanitarias en un 95%.		
SISTEMA RCI	El contratista de obra realiza la demolicion del muro para la indtalacion del gabinete de la red de incendios del 2 nivel		
CIELO RASO	El dia 6 de septiembre se realiza visita tecnica por parte del arq. Diseñador Camilo (coing) y la supervisión del contrato, donde se dio la autorización para la instalación del panel acustico an las fachadas norte-sur en la parte superior en una posicion e 45 grados para el recubrimiento de los pies de amigos como base de la estructura de cubierta.		
	El dia 6 de septiembre se realiza visita tecnica por parte del arq. Diseñador Camilo (coing) y la supervisión del contrato, donde se informa que el diseño del cielo raso continua como esta establecido en el plano inicial.		
FACHADAS	El cocntratista informa que el enchape aprobado llegara en la semana 22 aproximadamente		
	Se continua a la espera de la entregada de los NPs necesarios para la actividad de mantenimiento de las fachadas de ladrillo del teatro patria. Las actividades deben revisarse por esta interventoria para determinar el ajuste al balance de obra.		
	El dia 6 de septiembre se realiza visita tecnica por parte del arq. Diseñador Camilo (coing) y la supervisión del contrato, donde se informa que el diseño de la rampa de acceso para discapacitados debera realizarse en sentido norte-sur sobre la fachada oriental con el fin de cumplir con la normatividad y una pendiente del 6%. Adicional a ello el arquitecto camilo solicito realizar el desarrollo de la rampa en dos sentidos y realizar un acabado de los bordillos con el mismo enchape de la fachada oriental. (gris oscuro). El arq. camilo enviara a esta intervetoria el plano de diseño de la rampa.		
ENCHAPES	El contratista de obra da inicio a la instalacion de guarda escobas en enchape en area de cafetines		
SISTEMA ACUSTICO	Se continua con la instalación de la estructura de soporte para e panel acustico del area de mezannine y zona baja del auditorio (costado oriental).		
	Debido al paro camionero nacional se traslada la visita a planta de fabricacion para la semana 22		
TAPETE	Debido al paro camionero nacional se traslada la visita a planta de fabricacion para la semana 22		
	El dia 6 de septiembre se realiza visita tecnica por parte del arq. Diseñador Camilo (coing) y la supervisión del contrato, donde se entrega las muestras del tapete tipo royo para el area de escaleras de camerino a sotano. En conjunto se selecciono la gris oscura.		
SILLAS	el contratista de obra No ha presentado el replanteo de la ubicación de las sillas para su aprobación. Se aclara que ya se verificio en sitio y se acordo la modulacion y la espacialidad de las sillas.		
	Debido al paro camionero nacional se traslada la visita a planta de fabricacion para la semana 22		
ORDEN Y ASEO	Se evidencia que el contratista de obra realiza levantamiento de escombros y limpieza general del teatro.		
NOTA	**DEBIDO AL PARO DE CAMIONEROS SE EVIDENCIA QUE EL PERSONAL NO HA PODIDO CONTINUAR CON LAS EJECUCIONES DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL, POR LO TANTO EL PROCENTAJE PRECENTADO ES DEBIDO A LAS POCAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y A LA PRODUCCION DE SILLAS, SUMINISTRO DE TAPETE Y CULMINACION DE PRODUCCIÓN DE LA BOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.**		
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**	**OBSERVACIONES**	
Gestión de comunicaciones	1. Se realiza comite de obra No. 20 2. se entrega informe semanal No. 20 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a internet, y la respuesta de la ubicación de la puerta del cuarto de bombas y sus acabados. 4. se espera respuesta de diseño de rampa de acceso-costado oriental.		
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales		
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.		
	La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de obra civil para dar avance a las ejecuciones de acabados de piso, cielo raso y enchapes.		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 21

Página: 1 de	DIA	1	MES	8	AÑO	2024

SEMANA N°	21	DEL	2 DE SEPTIEMBRE 2024	AL	8 DE SEPTIEMBRE 2024

ASPECTOS FINANCIEROS	ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA	OBSERVACIONES
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y a la fecha no se ha efectuado el pago.	
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de $917.126.075,82. el 5 de septiembre del año en curso. Con corte a semana 20- al 2 de septiembre	
COMPRA DE INSUMOS	El contratista de obra emite informe de plan de manejo de anticipo del mes de agosto.	

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 21

Código:		Versión:		Fecha de Emisión: 9 DE JULIO		Página:	
SEMANA N°	21	DEL	2 DE SEPTIEMBRE 2024	AL	8 DE SEPTIEMBRE 2024		
FECHA INICIO :	9/12/2020	FECHA TERMINO :	3/02/2021				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO








UBICACIÓN:	ESCALERA EXTERIOR	UBICACIÓN:	ESCALERA EXTERIOR	UBICACIÓN:	ESCALERA DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD	RELLENO DE SUB BASE	ACTIVIDAD	FUNDIDA DE ESCALERA EN CONCRETO	ACTIVIDAD	MONTAJE D ESTRUCTURAS METALICAS








UBICACIÓN:	CAFETIN NORTE Y WC MIXTO (2 PISO)	UBICACIÓN:	MEZANNINE	UBICACIÓN:	AUDITORIO
ACTIVIDAD	INSTALACION DE GUARDA ESCOBA Y FUNDIDA DE MEDIA CAÑA	ACTIVIDAD	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PANELES ACUSTICOS	ACTIVIDAD	FABRICACION PANELES ACUSTICOS





UBICACIÓN:	AUDITORIO	UBICACIÓN:	EXTERIOR	UBICACIÓN:	BAÑOS HOMBRES 1ER PISO
ACTIVIDAD	REVISION ESTRUCTURA PARA CIELO RASO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCION CAJA ELECTRICA	ACTIVIDAD	REVISION DE TUBERIA SANITARIA






UBICACIÓN:	ESCALERA DE EMERGENCIA	UBICACIÓN:	ESCALERA DE EMERGENCIA	UBICACIÓN:	TEATRO
ACTIVIDAD	INICIO DE CONSTRUCCION DE ESCALERA METALICA	ACTIVIDAD	INSTALACION DE PFILES LATERALES	ACTIVIDAD	VISITA DE DISEÑADOR DE PROYECTO

INFORME SEMANAL No. 21

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL Nº21	
Página: 1 de			DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023	
SEMANA N°	21	DEL	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			AL	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	15/12/2024					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	81,00%	97,00%	MANTEMMIENTO DE MONUMENTO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	98%	99,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0%	0,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	35%	92,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA	
M-6 MAMPOSTERÍA	83%	90,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	92%	95,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	25%	70,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	100,00%		
CB-10 CUBIERTAS	62%	70,00%	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EOLICOS EN CUBIERTA INCLUYE TRABAJOS DE CANAL Y SELLO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA.	
CR-11 CIELORASOS	0%	35,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	4%	76,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	28%	30,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	0%	5,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	57%	40,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL					INFORME SEMANAL N°21		
Página: 1 de		DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

SEMANA N°	21	DEL	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		AL	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO			0%	0,00%		
CE-18 CERRADURAS			0%	0,00%		
PI-19 PINTURA			2%	3,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES			45%	60,00%		
OE-21 OBRAS EXTERIORES			0%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL			0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS			0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO			2%	0,00%		
TOTALES			37%	46,48%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO ANTICIPO	VR. POR EJECUTAR DEL ANTICIPO	AVANCE DE INVERSION	PROGRAMADO	EJECUTADO
	6.376.826.519,54	2.742.213.368,36	**3.634.613.151,18**			
Costo directo	**5.237.209.690,82**		**5.237.209.690,82**	**SEMANA 20**	$ 259.934.171,72	$ 248.556.466,97
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	**$ 1.444.120.781,24**	**$**	**7.820.947.300,78**	**ACUMULADO**	$ 2.643.954.319,00	$ 2.824.950.270,30
Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-))	NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 2,31 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN			**PORCENTAJE**	33,81%	36,12%
				ADELANTO	**2,31%**	

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL - ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	PERSONAL - OPERATIVO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	MAESTRO	3
RESIDENTE DE OBRA	1	OFICIAL	4
SST	1	AYUDANTE	14
AMBIENTAL	0	FABRICACIÓN	12
ALMACENISTA	1		
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	TOTAL PERSONAL OPERATIVO	33

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	2/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	3/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	SI [ ] NO [X]
	4/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	5/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	6/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	7/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	8/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

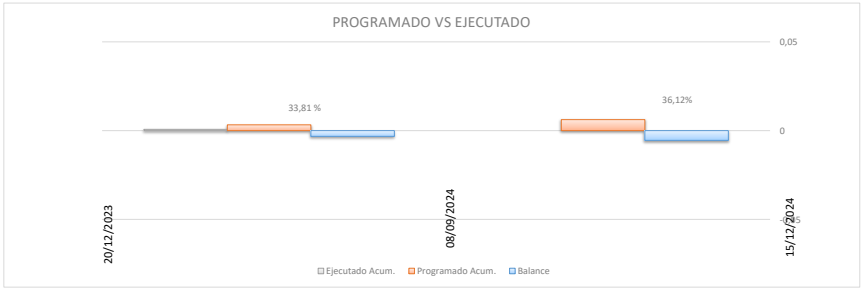

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL N°21

Página: 1 de

DIA	15	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2023								
SEMANA N°		21	**DEL**	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**AL**	08 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Semana	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Fecha	**14/07/2024**	**21/07/2024**	**28/07/2024**	**4/08/2024**	**11/08/2024**	**18/08/2024**	**25/08/2024**	**1/09/2024**	**8/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**
Progr. Semanal	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%	1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%
Programado Acum.	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%	22,14%	24,32%	27,33%	30,48%	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%
Ejec. Semanal	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%	1,31%	1,04%	1,43%	3,19%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acum.	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%	27,28%	28,32%	29,75%	32,94%	36,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Balance	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%	5,14%	4,00%	2,42%	2,46%	2,31%	-37,02%	-40,43%	-44,54%	-49,99%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 33,81 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 36,12% esto para un adelanto del 2,31%

2-las actividades de esta semana son : Se continua con la instalaciones eléctricas, se continua con las instalaciones hidraulicas y hidrosanitarias, se continua con la redcontraincendio, instalación de gabinetes, se comienza a colocar estructura de soporte de los paneles acustico, se comienza con la instalción de estructura de cielo raso, se hacen resane a regatas, se realiza dilaciones en las terrazas, se continua con colocación de cielo raso en superboard, se comienza con estuco en el sotano, se comienza a colocar dilaciones en el segundo piso , se hacen medias cañas en los baños, se avanza con la escalera de emergencia.

3- aún no se reciben las actas de comité se le pide encarecidamente a la interventoria remitirla al contratista para ver los compromisos adquiridos. se pide nuevamente que envien las actas N° 12, 13 , 14, 15, 16, 17 , 18 ,19 , 20 y 21 . se le pide mas celeridad en las entregas de las actas. a la fecha no tenemos aprobación de los informes semanales por parte de la interventoría.

4- para esta semana tuvimos un atraso en los materiales por desorden en el orden publico, donde los transportadores de materiales petreos, cementos y otros elementos no pudieron llegar a obra. Este paro nacional atraso toda la semana la ejecución de la obra.

REALIZÓ

FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL													




UBICACIÓN:	AUDITORIO
COMENTARIOS:	FABRICACIÓN DE ALFOMBRA




UBICACIÓN:	AUDITORIO
COMENTARIOS:	FABRICACIÓN DE SILLAS




UBICACIÓN:	BAÑOS Y CAFETINES
COMENTARIOS:	MEDIASCAÑAS




UBICACIÓN:	AUDITORIO
COMENTARIOS:	ESTRUCTURA PARA PANELES ACUSTICO

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA Nº	21	DEL	2 DE SEPTIEMBRE	AL		08 DE SEPTIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	RECOLECCIÓN DE RCD



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO OBRA



UBICACIÓN:	NOR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO AREAS DE TRABAJO



UBICACIÓN:	NOR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO AREAS DE TRABAJO



UBICACIÓN:	COSTADO SUROCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO AREAS DE TRABAJO

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA Nº	21	DEL	2 DE SEPTIEMBRE	AL	8 DE SEPTIEMBRE	
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023


VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TYEATRO
COMENTARIOS:	RECORRIDO DE OBRA



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	RECORRIDO DE OBRA

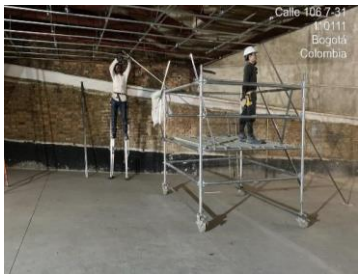

UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	USO DE ZANCOS Y ANDAMIOS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	CHARLAS Y CAPACITACIONES



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	CHARLAS Y CAPACITACIONES



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	REPOSICION DE EPP

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 BITACORA

Inspectores sst (3). Operativos 18
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente sstma
Se continuan con actividades a nivel, no se realizaron trabajos de alto riesgo, en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes laborales, se informa por parte del apoyo SST del contratista que se realizo visita por parte del instalador del piso y dejo la muestra del tapete tipo rollo para el area de escalera de Sotano. El contratista continua con actividades de instalación de cielo raso y adiciones en piso tanto en area de vestibulo, distribuidor y terrazas de 2 y 3 piso.

RS

Residente sstma

02.09.24
Clima: Soleado
Personal Contratista
Residente de obra, Residente sst, Almacenista, Apostador
Inspectores sst (3) Operativos 21
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente sstma
En recorrido de obra se evidencian actividades en altura por parte del contratista de acustico, trabajo en caliente y altura por portatil Tema, todos con sus EPCC y los trabajos a nivel con sus EPP en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes laborales. El contratista de obra en conjunto con la Interventoria realizan mesa de trabajo para entrega de Corte de obra No 2. Se remite memorias y acta a las 3:00pm al director de Interventoría para tramite ante Supervision. el contratista informa que la volqueta con material programado para el dia de hoy no pudo realizar la salida por obstrucciones en vias. Adicionalmente se evidencia que el contratista cuenta con poco personal en horas de la tarde.

RS.

Residente sstma

03.09.24

Clima: Soleado
Personal Contratista
Director de obra, Residente de obra, Residente SSTMA, Almacenista
Puesto, Inspectores (3) SST, Operativos 25.
Personal. Interventoría
Residente Interventoría, Residente SSTMA

Se retira recorrido de obra, se continuan actividades de trabajo en alturas con el personal de acustica y cocina, asi como de trabajo en caliente, las otras actividades estan a nivel obra civil, hidraulicos, y electricos, por solicitud de Interventoría se envia el personal de obra para sus casas por el paro camionero, no hay transporte y la seguridad es compleja las actividades son desarrolladas hasta las 2pm
Se Solicita al contratista de obra trasladar las visitas de Inspección a las plantas de producción - Sillas - tapetes - panel acustico para la Semana 22, debido a la imposibilidad de trasladarse hasta Madrid y cota por el paro nacional.

Alejandro Reyes Vigilante Z Inter SSTMA

04.09.24.

No se trabajo por paro camionero

Vigilante Z Inter SSTMA

05.09.24

No se trabajo por paro camionero

Vigilante Z Inter SSTMA

06.09.24

Clima: Soleado
Personal Contratista
Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista
Puesto, Inspectores SST (3), Operativos 22

Scanned with CamScanner

Personal Interventoría

Director Interventoría, Residente Interventoría, Residente SST/SA

En recorrido de obra se evidenciaron los trabajos en alturas y en ejecución del subcontratista Vatex y HKS Ingeniería se realizo acompañamiento a personal de la empresa. Se realiza visita por parte de la Supervisión del contrato y el Arq. Camilo (Supervisor-Cliente) quien mediante recorrido informa lo siguiente; ① La puerta del cuarto de Bombas quedara en la fachada Norte y se deberá realizar una escalera en 2 secciones con descanso - (Metalico o en Concreto); el acabado tanto del Tanque como el cuarto de bombas sera en fachaleta y la altura sera de 2.10/2.30 aprox. ② Aprueba la instalación del Panel acustico en la parte Superior en las fachadas Norte y Sur en un angulo de 45° para cubrir las pies de Amigos de la estructura de Cubierta. ③ El cielo raso del Vestibulo queda igual que el diseño inicial. ④ La rampa de Acceso Sera en 2 Secciones con bordillo central y sobre el mismo encerramiento de fachada. El Arq. Camilo remitira Diseño de tanque y rampa para su desarrollo.

Angelo Z Interventoría
RJ.

9.09.24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Topografos Inspectores SST (3) Operativos 15

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST/SA

Se recibe envio de ICD para disposicion Final, se continua actividades de trabajo en alturas por parte del contratista Vatex y HKS Ingeniería, se recibe jornada de aseo en las diferentes obras

-El personal de Acustica realiza montaje de muestra de panel de cielo raso para su revisión. -El panel de muro no cumple con la especificación se debe cambiar la muestra para revisar el acabado real. El contratista da inicio a actividades de fundida de media cana en baño de mujeres del primer piso y en el baño mixto del 2 nivel.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

FECHA DE REPORTE	DD	09	MM	09	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
SUBCONTRATISTA Y&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTA FACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	31	07	2024
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	27	07	2024
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE JOAQUIN MENDOZA HERNANDEZ	8.539.714	AYUDANTE	COODSALUD	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de	**DIA**		**MES**		**AÑO**	

SUBCONTRATISTA OSWALDO CHAPARRO PISOS												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	79.323.582	ENCARGADO	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	15	07	24			
EDISON OSWALDO CHAPARRO LOAIZA	1.013.679.750	OFICIAL	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CARLOS ARTURO GUERRERO FERNANDEZ	1.024.552.963	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ REYES	1.033.767.086	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	03	08	24			
SUBCONTRATISTA GRUPO MOLINA S.A.S. PISO MADERAS												
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL									
LUIS ALBERTO MAYORQUIN AMADO	1.023.860.838	OFICIAL	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31	07	24			
LUIS MOLINA		ENCARGADO										
SUBCONTRATISTA METEX ESTRUCTURA METALICA												
JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24			
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24			
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24			
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24			
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24			
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código:	
		Versión:	Pág.
		Vigente desde:	

FECHA	14 DE SEPTIEMBRE 2024	INFORME No	21	DEL	2/09/2024	AL	08/09/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	14	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, Pistolas de fijación, zancos, Inspecciones locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras, roscadora.
Se realiza pañete de paredes con andamios, corte de piso del teatro zona interna, Recoger escombro proveniente de la demolición del piso externo y interno del teatro, Armado de andamios, corte de alambre, corte de hierro, corte de madera, armado de estructura y fundir vigas, pegar bloques, realizar mezclar cemento, amarre de hierro y encoframiento.	9	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas, Uso de Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC).
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tuberia PVC	5	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales.
Alistamiento de pisos como: orden y aseo, recoger material con pala y trasiego en carretillas a los sitios de acopio de escombro, realizar instalación de estructura para fundir pisos.	3	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Mantenimiento e inspecciones de Herramientas menores, extensiones y equipos eléctricos Corte, Doblaje e instalación de tuberías en EMT, PVC y cajas eléctricas. Regatas y pasantes en paredes y pisos de concreto Orden y Aseo	8	Firma de ATS e inspecciones de equipos eléctricos, extensiones eléctricas, escaleras y herramientas menores, de trabajos en Alturas, de permiso para trabajos en caliente, de preoperacional de taladros, rotomartillo y pulidoras.
Se realiza armado de andamios, inspecciones de equipos EPCC, instalación de perfilería.	3	Firmar ATS, permiso de trabajo en caliente, inspecciones de EPCC, charlas de 5 minutos y pausas activas.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
Socialización ATS, factores de riesgo y como se previenen. Orden y aseo en los sitios de trabajo. Uso de epp como el casco con barbuquejo, guantes. Socialización ingreso de obra, reporte de personal. La importancia de las gafas de seguridad. Una cualidad del compañero, empatía en el trabajo.	7	Se realiza para personal administrativo y operativo
Primeros Auxilios Cables de electricidad elevados Seguridad con la electricidad ICCT Resbalones, Tropezones y Caídas	4	Se realiza para personal administrativo y operativo
Manejo de herramientas, trabajo seguro en alturas, requerimiento de claridad, trabajo en caliente	4	Se realiza para personal administrativo y operativo
cuidados con la pulidora para cortar el piso. Todos podemos prevenir accidentes en el trabajo. Socialización ATS, puntos ecológicos no arrojar basuras en gabinetes.	4	Se realiza para personal administrativo y operativo
Total, capacitaciones	**19**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	25	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	25	0	0	0	0	8	14
Total, proyecto	**539**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	1	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	1	•Se realizo jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizo limpieza y orden de los puntos de acopio temporal
No. 1-4. Señalización.	1	•Se instalo señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (m3) Semana: 25 Retiro de RCD (m3) Acumulado: 539
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	6	26	35	10,1	89.9

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

En la presente semana se asiste a comité de obra, asi como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, para lo cual ingresa personal del subcontratista Metex, para esta semana se culmina con un total de 9 profesionales y 26 operarios en obra con un porcentaje de 10.1% personal femenino y 89.9% personal masculino, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, se realiza la disposicion de 25m3 de RCD, se realizaron jornadas de orden y aseo en puntos de acopio, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de EPP, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S
