CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 312-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No.23 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 23

Página: 1 de

DIA	27	MES	9	AÑO	2024

SEMANA N°	23	DEL	16 DE SEPTIEMBRE 2024	AL	22 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	98,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100%	98,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100%	80,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	95,00%	S. E.I. DE PUNTOS DE ANCLAJE DE CUBIERTA	ACTIVIDAD QUE SE REVISARA DENTRO DEL BALANCE No.12 PARA SU EJECUCIÓN
M-6 MAMPOSTERÍA	100%	90,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	95,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	17%	95,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100%	90,00%	CORTE DE SELLOS TABLEROS ELECTRICOS	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA ENTIDAD CODENSA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	100,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100%	98,00%	INSTALACION DE EXTRACTORES EOLICOS	
CR-11 CIELORASOS	100%	50,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100%	50,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100%	40,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100%	50,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100%	50,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100%	60,00%		LAS SILLAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PRODUCIÓN
CE-18 CERRADURAS	0%	0,00%		
PI-19 PINTURA	0%	0,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100%	50,00%		LOS EQUIPOS ESPECIALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRASPORTACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	100%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	100%	30,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	100%	0,00%	S.E.I. Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO A 12	LA SUPERVISIÓN A LA FECHA NO HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN
TOTALES	81%	56,76%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 23	ACUMULADO
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$196.267.709,02	$ 4.037.467.561,95		3,40%	40,43%
		% semanal	2,51%		AVANCE DE OBRA	7,95%	
		ACUMULADO	$3.783.479.738,84				
		% acumulado	48,38%				

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base al la nueva programacion de obra el contratista presenta un avance del 7,95%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS/FABRICACIÓN	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	16/09/2024	45	4	2	51,00
MARTES	17/09/2024	45	4	2	51,00
MIERCOLES	18/09/2024	45	5	3	53,00
JUEVES	19/09/2024	45	4	2	51,00
VIERNES	20/09/2024	45	4	2	51,00
SABADO	21/09/2024	45	2	1	48,00
DOMINGO	22/09/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	16/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	17/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	18/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	19/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	NO
	20/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	21/09/2024	LLOVIIZNA	SOLEADO	
	22/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

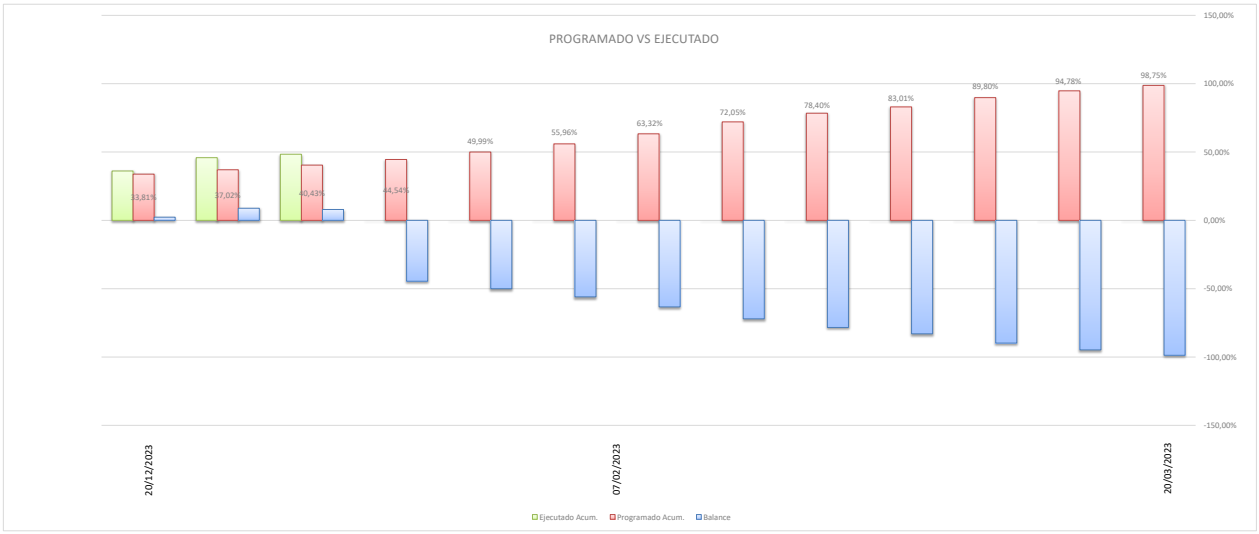

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 23

Página: 1 de

DIA	27	MES	9	AÑO	2024

SEMANA Nº		23		DEL	16 DE SEPTIEMBRE 2024				AL	22 DE SEPTIEMBRE 2024				
Semana	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
Fecha	**8/09/2024**	**15/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**27/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**
Progr. Semanal	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%
Programado Acum.	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%
Ejec. Semanal	3,18%	9,75%	2,51%											
Ejecutado Acum.	36,12%	45,87%	48,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Balance	2,31%	8,85%	7,95%	-44,54%	-49,99%	-55,96%	-63,32%	-72,05%	-78,40%	-83,01%	-89,80%	-94,78%	-98,75%	-99,83%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.		
OBRA CIVIL	Se realiza fundida de andenes en el costado sur junto a excalera de emergencia		
	Se realizan resanes del las regatas electtricas e hidrosanitarias		
	El contratista de obra realiza la fundida del piso del sotano bajo su costo(2da vez)		
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	El dia 17 de septiembre se recibe via chat plano de diseño del cuarto de bombas y el desarrollo de la rampa de acceso-fachada oriental		
	A la fecha el contratista de obra no ha dado inicio al desarrollo del cuarto de bombas		
ESCALERAS DE EMERGENCIA	El contratista de obra avanza el cordon de soldadura de las huellas de la escalera		
REDES ELECTRICAS	Se evidencia poco personal de la red electrica. Se solicita al contratista el incremento del personal para dar continuidad a las actividades de conexiones electricas.		
	El contratista cuenta con un avance aproximado de las actividades electricas en un 80%. La interventoria solicita al contratista de obra notificar la fecha de ingreso de las luminarias requerias para el teatro para su recibo y aprobación.		
REDES HIDROSANITARIAS	El contratista de obra presenta un avance de instalacion de las redes hidrosanitarias en un 95%.		
SISTEMA RCI	El contratista de obra programa las puebas de la red para la semana 24		
CIELO RASO	El contratista de obra cubre son lamina de dry wall el cielo del area bajo mezannine y vestibulo- falta acabado		
	El contratista de obra realiza instalacion de estructura y lamina de dry wall del area de distribuidor del 2do piso		
	La interveноria solicita al contratista de obra el incremento del personal de la cuadrilla de cielos rasos teniendo en cuenta que desde hace mas de 2 semanas hay espacios tales como (sotano, baños mujeres 1er piso, ingreso peatonal/fachada principal), los cuales ya deberian estar en etapa de acabado.		
FACHADAS	A la fecha el enchape de fachadas no ha ingresado a campo		
	El dia 17 de septiembre se recibe via chat plano de diseño del cuarto de bombas y el desarrollo de la rampa de acceso-fachada oriental		
ENCHAPES	El contratista de obra continua con destronque de piso en el area de cafetin norte.		
	El contratista de obra continua con la instalacion del enchape de muro del baño de mujeres del 1er piso		
	Se continua con la fundida del piso de granito blanco del distribuidor del 1er piso		
	Se continua con destronque de piso en el distribuidor del 2do nivel		
	El contratista continua con la instalacion del enchape de piso del area de tercer piso.-cuarto tecnico y adjuntos.		
	La interventoria solicita al contratista realizar el levantamiento de los escombros del baño del alistamiento sur antes de continuar con la instalacion del enchape de piso		
	Se realiza fundida de boca-puertas		
SISTEMA ACUSTICO	El contratista de obra continua con la instalacion del protector aislante en los muros sur y oriental del auditorio.		
	Se evidencia quedan inicio a la instalacion del sistema en el area del cielo raso-costado oriental.		
	La interventoria solicita al contratista de obra notificar las fechas de ingreso a campo del material faltante del sistema acustico.		
TAPETE	Se realiza visita técnica a bodega de almacenamiento del proveedor del tapete y se verifica el suministro total de insumo. Se verifica especificacion y tono seleccionado. El insumo debe llegar a campo en la tercera semana del mes de octubre.		
SILLAS	el contratista de obra No ha presentado el replanteo de la ubicación de las sillas para su aprobación. Se aclara que ya se verificio en sitio y se acordo la modulacion y la espacialidad de las sillas.		
	El contratista de obra presenta muestra de luz led para piso. La interventoria la aprueba.		
	Se solicita al contratista de obra programar visita a planta de produccion para revision del sistema de confeccion de la silleteria del auditorio.		
EQUIPOS ESPECIALES	El contratista de obra notifica a la interventoria de la ruta de trasporte de los equipos. Llegada a sitio en la ultima semana del mes de noviembre.		
VOZ Y DATOS	La interventoria solicita al contratista de obra notificar el proceso de adqusicion de los equipos para su revisión y aprobación. A la fecha no se han suministrados la documentación respecto a la compra del insumo.		
	A la feca no se ha tenido respuesta por parte del encargado del coing de la ubicación del punto de conexión de la fibra optica.		
ORDEN Y ASEO	Se evidencia que el contratista de obra realiza levantamiento de escombros y limpieza general del teatro.		
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
Gestión de comunicaciones	1. Se realiza comite de obra No. 22 2. se entrega informe semanal No. 22 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a fibra optica.		
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales		
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.		
	La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de obra civil para dar avance a las ejecuciones de acabados de piso, cielo raso y enchapes y pintura.		
NOTA	La interventoria reitera al contratista de obra realizar el incremento del personal en los diferentes frente de obra; lo anterior, teniendo en cuenta que la etapa de ejecucion se encuntra en la recta final y ya se deben estar dando acabados a las diferentes areas.		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL													
												INFORME SEMANAL No. 23	
Página: 1 de							**DIA**	**27**	**MES**	**9**	**AÑO**	**2024**	
SEMANA Nº	23		**DEL**	16 DE SEPTIEMBRE 2024						**AL**	22 DE SEPTIEMBRE 2024		
ASPECTOS FINANCIEROS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**												
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y a la fecha no se ha efectuado el pago.												
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de $917.126.075,82. el 5 de septiembre del año en curso. Con corte a semana 20- al 2 de septiembre												
ACTA DE CORTE No. 3	El contratista de obra emite corte de obra No. 3 para revisión de la interventoria el pasado 16 de septiembre. Al dia viernes 21 esta interventoria continua realizando observaciones a la entrega.												
COMPRA DE INSUMOS	El contratista de obra emite informe de plan de manejo de anticipo del mes de septiembre												

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 23

Código:			**Versión:**			**Página:**	
SEMANA N°	23	**DEL**	16 DE SEPTIEMBRE 2024		**AL**	22 DE SEPTIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	9/12/2020	**FECHA TERMINO :**	3/02/2021				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	**NIT O C.C.**	860524168 8	**CONTRATO N°**	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617-0	**CONTRATO N°**	272

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO









UBICACIÓN:	**EXTERIOR**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS MUJERES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**DISTRIBUIDOR 1ER PISO**
ACTIVIDAD	FUNDIDA DE ANDENES	**ACTIVIDAD**	INICIO DE INSTALACION DE ENCHAPE DE MURO	**ACTIVIDAD**	FUNDIDA PISO GRANITO BLANCO








UBICACIÓN:	**DISTRIBUIDOR 2DO PISO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**DISTRIBUDOR 2DO PISO**
ACTIVIDAD	DESTRONCADA DE PISO	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE ELEMENTO AISLANTE-FRESCASA	**ACTIVIDAD**	FUNDIDA BOCA-PUERTAS









UBICACIÓN:	**DISTRIBUIDOR 2DO PISO**	**UBICACIÓN:**	**BAÑO HOMBRES**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS 2DO PISO**
ACTIVIDAD	INSTALACION ESTRUCTURA CIELO RASO	**ACTIVIDAD**	REGATAS-CONEXIÓN ELECTRICA	**ACTIVIDAD**	INSTALACIÓN ENCHAPE DE MURO






UBICACIÓN:	**BAÑO MUJERES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**EXTERIOR**	**UBICACIÓN:**	**3ER PISO- CUARTO NORTE**
ACTIVIDAD	RESANES REGATAS HIDRAULICAS	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DUCTERIA ELECTRICA PARA TANQUE DE AMACENAMIENTO	**ACTIVIDAD**	INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO




UBICACIÓN:	**ESCALERAS DE EMERGENCIA**	**UBICACIÓN:**	**SOTANO**	**UBICACIÓN:**	**DISTRIBUIDOR 1ER PISO**
ACTIVIDAD	CORDON DE SOLDADURA HUELLAS	**ACTIVIDAD**	ALISTADO DE PISO (POR CUENTA DEL CONTRATISTA)	**ACTIVIDAD**	FUNDIDA PISO GRANITO BLANCO

				 	
UBICACIÓN:	**DISTRIBUIDOR 2 PISO**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS HOMBRES 2DO PISO**	**UBICACIÓN:**	**3ER PISO CUARTO SUR**
ACTIVIDAD	DESTRONCADA DE PISO	**ACTIVIDAD**	RESANES REGATAS ELECTRICAS	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE PISO
  		 		 	
UBICACIÓN:	**CUARTO DE SONIDO**	**UBICACIÓN:**	**TEATRO**	**UBICACIÓN:**	**TEATRO**
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN PISO GRANITO BLANCO	**ACTIVIDAD**	INGRESO DE PUERTAS DE SEGURIDAD	**ACTIVIDAD**	INGRESO MATERIAL ACUSTICO
 		 			
UBICACIÓN:	**DISTRIBUIDOR 2 PISO**	**UBICACIÓN:**	**CAFETIN NORTE**	**UBICACIÓN:**	**RAMPA DE ACCESO**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE LAMINA EN DRY WALL	**ACTIVIDAD**	PULIDA DE PISO	**ACTIVIDAD**	EXCAVACION PARA BORDILLOS

INFORME SEMANAL No. 23

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL Nº23	
Página: 1 de			DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023	

SEMANA N°	23	DEL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	81,00%	97,00%	MANTEMIMIENTO DE MONUMENTO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	98%	99,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	0%	0,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	41%	92,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA	
M-6 MAMPOSTERÍA	92%	100,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	92%	95,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	45%	70,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	100,00%		
CB-10 CUBIERTAS	65%	75,00%	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EOLICOS EN CUBIERTA INCLUYE TRABAJOS DE CANAL Y SELLO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA.	
CR-11 CIELORASOS	0%	35,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	9%	77,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	41%	50,00%	MANTEMIENTO GENERAL DE MURO	
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	0%	5,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	57%	40,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL					INFORME SEMANAL N°23		
Página: 1 de		DIA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

SEMANA N°	23	DEL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024		AL	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO			0%	0,00%		
CE-18 CERRADURAS			0%	0,00%		
PI-19 PINTURA			2%	3,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES			52%	60,00%		
OE-21 OBRAS EXTERIORES			0%	63,00%		
AG-22 ASEO GENERAL			0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS			0%	0,00%		
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO			8%	0,00%	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS T	POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONECIÓN DE LA FIBRA
TOTALES			39%	50,44%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO ANTICIPO	VR. POR EJECUTAR DEL ANTICIPO	AVANCE DE INVERSION	PROGRAMADO	EJECUTADO
	6.376.826.519,54	2.742.213.368,36	**3.634.613.151,18**			
Costo directo	**5.237.209.690,82**		**5.237.209.690,82**	**SEMANA 23**	$ 266.190.804,91	$ 196.267.709,02
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	**$ 1.444.120.781,24**	**$ 7.820.947.300,78**		**ACUMULADO**	$ 3.161.716.330,15	$ 3.783.479.738,84
Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-))	NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 48,38 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN			**PORCENTAJE**	40,43%	48,38%
				ADELANTO	**7,95%**	

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL - ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	PERSONAL - OPERATIVO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	ENCARGADO	5
RESIDENTE DE OBRA	1	OFICIAL	8
SST	1	AYUDANTE	20
AMBIENTAL	1	FABRICACIÓN	12
ALMACENISTA	1		
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	TOTAL PERSONAL OPERATIVO	45

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	16/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	17/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	SI [ ] NO [X]
	18/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	19/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	20/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	21/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	22/09/2024	SOLEADO	SOLEADO	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO: 70%

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

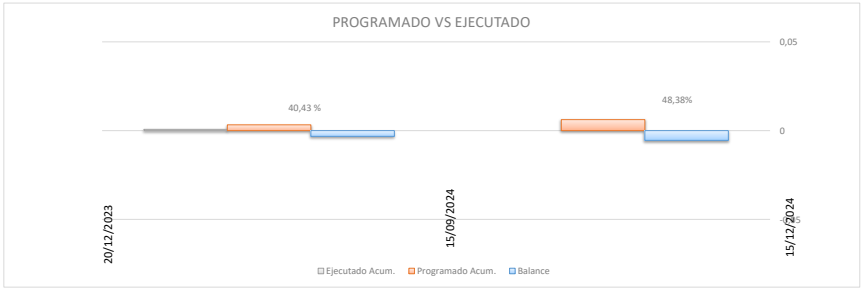

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL N°23

Página: 1 de

DIA	15	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2023

SEMANA N°		23	**DEL**	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024				**AL**	22 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
Semana	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Fecha	**14/07/2024**	**21/07/2024**	**28/07/2024**	**4/08/2024**	**11/08/2024**	**18/08/2024**	**25/08/2024**	**1/09/2024**	**8/09/2024**	**15/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**
Progr. Semanal	2,36%	2,61%	2,41%	2,11%	1,99%	2,17%	3,05%	3,11%	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%
Programado Acum.	13,02%	15,63%	18,04%	20,15%	22,14%	24,32%	27,33%	30,48%	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%
Ejec. Semanal	2,22%	2,31%	0,29%	2,05%	1,31%	1,04%	1,43%	3,19%	3,18%	9,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejecutado Acum.	21,32%	23,63%	23,92%	25,97%	27,28%	28,32%	29,75%	32,94%	36,12%	45,87%	0,00%	0,00%	0,00%
Balance	8,30%	8,00%	5,88%	5,82%	5,14%	4,00%	2,42%	2,46%	2,31%	8,85%	-40,43%	-44,54%	-49,99%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 40,43 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 48,38% esto para un adelanto del 7,95%

2-las actividades de esta semana son :Se continua con las instalaciones de la redes contraincendio, se conitnua con las instalaciones eléctricas, se conitnua con las instalaciones de tableta grano marmol tercer piso, se continua con las pulidas de los pisos, se funde granito en el primer piso, se colocan dilaciones en broncen, se conitnua con resane y estuco en muros de sotano y camerinos, se continua con la instalaciones de cielo raso en la triple altura, se comienza con los enchapen de los muros en los baño de mujeres, se continua con las instalaciones de cielo y raso y muros acusticos. se conitnua con la tapa de arriba de la tarima. llegada materiales a la obra como son las puertas de emergencia, se continua con la resoldadda de la escalera de emergencia.

3- aún no se reciben las actas de comité se le pide encarecidamente a la interventoria remitirla al contratista para ver los compromisos adquiridos. se pide nuevamente que envien las actas N° 12, 13 , 14, 15, 16, 17 , 18 ,19 , 20 , 21 y 22 . se le pide mas celeridad en las entregas de las actas.

4- hasta la fecha no tenemos los informes bimensuale y informes semanales aprobados por la interventoria, se le pide mas celeridad en a las aprobaciones de los informes

REALIZÓ

FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL													





UBICACIÓN:	FACHADA SUR
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE ANDENES




UBICACIÓN:	SEGUNDO PISO
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE BOCA PUERTAS




UBICACIÓN:	PRIMER PISO
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE GRANITO




UBICACIÓN:	PRIMER PISO
COMENTARIOS:	BAÑO DE MUJERES

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:	Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA Nº	23	DEL 9 DE SEPTIEMBRE		AL	22 DE SEPTIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	16/12/2024		

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ASEO BAÑOS



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO



UBICACIÓN:	NOR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	ORDEN Y ASEO OBRA



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION Y DEMARCACION



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	CAMPAMENTOS CONTRATISTA

UBICACIÓN:	COSTADO SUROCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SEÑALIZACION Y DEMARCACION

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL | | |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

16.09.24

Clima: Calido sin lluvias

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista

Apoyo, Inspectores SST (3), Operativos 25, Punto Fabricacion

12.

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST/SA

En recorrido de obra con la residente SST del contratista se evidencia trabajo en alturas, trabajo en caliente por parte de Alfer y HMS Ingenieros, las actividades restantes son a nivel y todos los trabajadores cuentan con sus respectivos EPP, en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes. Se evidencia que el contratista continua con actividades de montaje de escaleras de emergencia. Durante recorrido se solicita al contratista de obra el incremento del personal de cielo raso. ya que se evidencia que en varias areas se puede avanzar ya que se encuentra estructurado. El sistema acustico, continua con la instalación de los perfiles de Muro/Estructura. Residente Interventoría SST/SA

17.09.20

Clima: Calido

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista Soldador, Inspector de SST (2) Operativos 26, Fabricacion 12. Operativos

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST/SA

En la presente jornada se evidencia la falta de un inspector en del area electrica, la cual se encuentra en el medio, ya el control de su trabajo lo asume su vigia de seguridad, en el resto de sus contratistas se encuentran realizando actividades a nivel, alturas y trabajo en caliente, se revisan permisos de trabajo, ATS e inspecciones realizadas a equipos y herramientas no se presentaron incidentes ni accidentes laborales. El contratista continua con la instalación del enchape de muro en el wc/mujeres del 1er piso, se solicita revisar las cotas de los piezas, el contratista informa que el mm que se requiere para los empates no esta contemplado en el presupuesto, Sin embargo ellos van a correr con ese insumo. Se evidencia resanes en regatas sanitarias, se da inicio de actividades de estuco y tro nuevo de pintura en muro de acceso a baños 1er Piso. Se Terminan la instalación del Soporte metalico en cubierta para instalación de cielo raso. Residente Interventoría SST/SA

18.09.24

Clima: Calido

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista Yacoto, Inspectores SST (3), Operativos 29, en Punto de Fabrica 12 operativos

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST-MA, Director Interventoría

Se asiste a comité de obra y luego acompañamiento a recorrido de obra, con personal de la linea, contratista e Interventoría, todo el personal con epp, en lo corrido se continuan TDA y TC no se presentaron accidentes ni incidentes En el area exterior, se evidencia instalación de ductos electricos para conexión de tanque de almacenamiento. Se realiza comité de obra y recorrido, donde se evidencia los avances en los diferentes frentes de trabajo.

Ingeniero Residente SST-MA

19.09.24

Clima: Calido

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista Yacoto, Inspectores SST(3), Operativos 34, Punto de Fabrica 12

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST-MA

En recorrido de obra, todos los trabajadores cuentan con sus epp. Se continua con la Soldadura de las huellas de la escalera de emergencia. Se evidencia que el contratista realiza fundida de piso en el area de Sotano bajo Su costo, lo anterior, es debido a que el alistado de piso realizado no recistio la humedad del espacio y se quebro por lo tanto no Servia para la posterior instalación de la ceramica. Se evidencia que dar inicio a la escavación del area para los bordillos de la rampa de acceso en la fachada principal. Se le Solicita nuevamente al contratista incrementar el personal de Cielo raso y el carpintero para realizar avances en las

areas de aseos de los baños comunes y baños 1er Piso, Adicionalmente se solicita celeridad con el arreglo del pantal de madera del Mezzanine en el auditorio. El contratista continua con la instalación del enchape de piso del 3er Nivel, Se le recomienda evacuar el escombro del bajo del alojamiento sur antes de continuar con la actividad.

20.09.24
Clima: Soleado
Personal Contratista:
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista
Apoyo Inspector SST (2) Operativos, Fabricación (12)
Personal Interventoría.
Residente Interventoría, Residente SST
Se evidencia que el contratista continua con montaje de Andamio para inicio de estructura en area de vestíbulo en cielo raso, continuan con la fundida del piso Granito blanco en area de distribuidor 1er Piso. La interventoría solicita al contratista la revisión de la instalación del enchape de muro en el baño de mujeres 1er piso (muro oriente y Sur). El contratista continua con actividades de destronque de piso en el distribuidor de 2° Piso. En el auditorio se evidencia que continuan con la estructuración del Sistema acustico en el muro Sur del auditorio. En la escalera de emergencia continuan con trabajos de Soldadura. El contratista da inicio a la instalación del enchape de piso del 3er piso, Se le recuerda al contratista evacuar el escombro del bajo costado Sur, antes de continuar con la instalación. Ingresan a Campo los puertas de Emergencia - embalajes. Se le solicita al contratista dar prioridad al area de Sotano

Pisos - cielos - iluminación para utilizar el espacio como almacenaje de insumos (puertas/material acustico entre otros). Ingresa a campo material de Sistema acustico = cielo raso y panel acustico ranurado (Aprox 200 m2.)

21.09.24.
Clima Soleado.
Personal contratista.
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista Apoyos SST (2) Operativos , Fabricación (12)
Personal Interventoria.
Residente Interventoria, Residente SST
El contratista continua con actividades de destronque de paso en area del cafetin norte. Se le Solicita al contratista dar celeridad a las actividades correspondientes del baño de hombres por Piso. (En este espacio Se requiere el desmonte de los divisiones de baño para poder realizar el remplazo de los piezas de enchape afectadas, adicional/norte Se debe iniciar con el aislado de paso.
El contratista continua con actividades de estructuración en el area del auditorio. Se le Solicita al contratista dar celeridad con las actividades de cielo raso, en Sotano baños y vestibulo. Se realiza aseo

23.09.24
Clima: Soleado
Personal Contratista
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Almacenista apoyos SST (2) Operativos , Fabricación (12)
Personal Interventoria
Residente Interventoria, Residente SST.
Se evidencia las siguientes actividades: Continuando.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

Página: 1 de

DIA	MES	AÑO

FECHA DE REPORTE	DD	22	MM	09	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
	N° DE C.C.	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE												
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITH ARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

DIA **MES** **AÑO**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTA Y&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTA FACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	31	07	2024
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	27	07	2024
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE JOAQUIN MENDOZA HERNANDEZ	8.539.714	AYUDANTE	COODSALUD	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			

DIA **MES** **AÑO**

SUBCONTRATISTA OSWALDO CHAPARRO PISOS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	79.323.582	ENCARGADO	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	15	07	24			
EDISON OSWALDO CHAPARRO LOAIZA	1.013.679.750	OFICIAL	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CARLOS ARTURO GUERRERO FERNANDEZ	1.024.552.963	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ REYES	1.033.767.086	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	03	08	24			
SUBCONTRATISTA GRUPO MOLINA S.A.S. PISO MADERAS											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSPECTOR SST	SALUD TOTAL								
LUIS ALBERTO MAYORQUIN AMADO	1.023.860.838	OFICIAL	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31	07	24			
LUIS MOLINA		ENCARGADO									
SUBCONTRATISTA METEX ESTRUCTURA METALICA											

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24			
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24			
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24			
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24			
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24			
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código: Versión: Pág. Vigente desde:

FECHA	17 DE SEPTIEMBRE 2024	INFORME No	23	DEL	16/09/2024	AL	22/09/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	12	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, equipo de soldadura, locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras.
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC	9	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, Inspección de equipos. Lecturas hojas de seguridad de productos químicos
Mantenimiento e inspecciones de Herramientas menores, extensiones y equipos eléctricos Corte, Doblaje, prolongación e instalación de tuberías en EMT, PVC, cajas eléctricas, derivación de cableado eléctrico. Arme y Desarme de andamios. Regatas en paredes Orden y Aseo	9	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales.
Alistamiento de pisos como: orden y aseo, recoger material con pala y trasiego en carretillas a los sitios de acopio de escombro, realizar instalación de estructura para fundir pisos.	3	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Mantenimiento e inspecciones de Herramientas menores, extensiones y equipos eléctricos Corte, Doblaje e instalación de tuberías en EMT, PVC y cajas eléctricas. Regatas y pasantes en paredes y pisos de concreto Orden y Aseo	8	Firma de ATS e inspecciones de equipos eléctricos, extensiones eléctricas, escaleras y herramientas menores, de trabajos en Alturas, de permiso para trabajos en caliente, de preoperacional de taladros, rotomartillo y pulidoras.
Se realiza armado de andamios, inspecciones de equipos EPCC, instalación de perfilería.	3	Firmar ATS, permiso de trabajo en caliente, inspecciones de EPCC, charlas de 5 minutos y pausas activas.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
Socialización ATS, factores de riesgo y como se previenen. Orden y aseo en los sitios de trabajo. Uso de epp como el casco con barbuquejo, guantes. Socialización ingreso de obra, reporte de personal. La importancia de las gafas de seguridad. Una cualidad del compañero, empatía en el trabajo.	7	Se realiza para personal administrativo y operativo
Primeros Auxilios Cables de electricidad elevados Seguridad con la electricidad ICCT Resbalones, Tropezones y Caídas	4	Se realiza para personal administrativo y operativo
Manejo de herramientas, trabajo seguro en alturas, requerimiento de claridad, trabajo en caliente	4	Se realiza para personal administrativo y operativo
cuidados con la pulidora para cortar el piso. Todos podemos prevenir accidentes en el trabajo. Socialización ATS, puntos ecológicos no arrojar basuras en gabinetes.	4	Se realiza para personal administrativo y operativo
Total, capacitaciones	**19**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	35	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	60	0	0	0	0	8	14
Total, proyecto	**574**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	1	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	1	•Se realizo jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizo limpieza y orden de los puntos de acopio temporal
No. 1-4. Señalización.	1	•Se instalo señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (t) Semana: 35 Retiro de RCD (t) Acumulado: 574
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	5	32	40	8.2	91.8

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

En la presente semana se asiste a comité de obra, asi como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, ingresa nuevo personal del subcontratista Metex y HK3 ingenieria, para esta semana se culmina con un total de 8 profesionales y 32 operarios en obra y 12 en planta para un total de 44 operativos, con un porcentaje de 8.2% personal femenino y 91.8% personal masculino, al igual que la semana pasada se mantiene el promedio, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, no se realiza disposicion de RCD, se realizaron jornadas de orden y aseo en puntos de acopio, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de EPP, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S
